

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**COMPROBANTE DE PAGO N° 1437**

Fecha: 05/09/2023

Asiento N° 4150

Compromiso N° 309

Retención N° 001-010-000021306

3BCE BDE CREDITO Cta Cte No 76210011

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA**

**USD 18,774.56**

LA SUMA DE: **DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO Dolares 56/100 Ctsv**

PUYO, 05 de Septiembre del 2023

**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA.- PAGO DE LA PLANILLA UNICA DE ORDEN DE TRABAJO DEL PROYECTO ASFALTO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HAST ABSCISA 13+100) L=4.5KM. PARROQUIA VERACRUZ CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA.

Usuario: ALE

**DOCUMENTOS**

Fecha	Documento	No	Autorización	Valor
04/09/2023	FACTURA	001100000000030	I302268971117	21,402.05

**DOCUMENTOS BANCARIOS**

No	Beneficiario	Valor
CTA 3001525739	YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA	18,774.56

**TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD 18,774.56**

**APLICACION CONTABLE**

Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IVA	2,293.08	
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	19,108.97	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	18,774.56	
1.1.1.03.01.009	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / BDE CREDITO		18,774.56
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS		18,774.56
2.1.3.75.01.112	IMPUESTO A LA RENTA 1.75%		334.41
2.1.3.81.14.001	CXP IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI		2,293.08
<b>SUMAN o PASAN USD</b>		<b>40,176.61</b>	<b>40,176.61</b>

**APLICACION PRESUPUESTARIA**

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D511.519.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS		19,108.97	18,774.56
<b>TOTAL GASTOS USD</b>	<b>0.00</b>	<b>19,108.97</b>	<b>18,774.56</b>

LCDO. ANDRE GRANDA.  
Prefecto Provincial

LCDA. MARILU ORDOÑEZ.  
Directora Financiera E.

LCDO. MARCELO CUEVA.  
Jefe De Contabilidad E.

ING. GABRIEL SOS  
Tesorero



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 20-9-2023

Hora: 10:46:34

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: SOSA ESPINEL GABRIEL ALEJANDRO 76210011

Num. Ced o Ruc:1600789133001

Institución Pública: GAD. PROV. PASTAZA/BDE CREDITO							# Cta.: 76210011	
Fecha de Transferencia : 2023-09-06 00:00:00.0								
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	# Ced.Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado	Observacion
BANECUADOR B.P.	3001525739	12,232.12	1600789133001	YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA	1	06-09-2023 17:24:12	ACREDITADA	COMPROBANTE DE PAGO 1436
BANECUADOR B.P.	3001525739	18,774.56	1600789133001	YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA	1	06-09-2023 17:24:12	ACREDITADA	COMPROBANTE DE PAGO 1437
BANECUADOR B.P.	3001525739	46,685.30	1600789133001	YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA	1	06-09-2023 17:24:12	ACREDITADA	COMPROBANTE DE PAGO 1438
BANECUADOR B.P.	3001525739	2,899.26	1600789133001	YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA	1	06-09-2023 17:24:12	ACREDITADA	COMPROBANTE DE PAGO 1439
BANECUADOR B.P.	3001525739	1,265.05	1600789133001	YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA	1	06-09-2023 17:24:12	ACREDITADA	COMPROBANTE DE PAGO 1440
BANECUADOR B.P.	3001525739	78,096.21	1600789133001	YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA	1	06-09-2023 17:24:12	ACREDITADA	COMPROBANTE DE PAGO 1441
<b>Total:</b>		<b>159,952.50</b>	<b>Reg.:6</b>					

[Atrás](#)



Orden de Pago Nro. GADPPZ-GADPPZ-2023-0272-GOP

Puyo, 05 de septiembre de 2023

**PARA:** Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes  
**Directora Financiera (E)**

**ASUNTO:** ORDEN DE PAGO A FAVOR DE YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA

De mi consideración:

En conformidad con la solicitud orden de pago Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-0283-SOLOP del 05 de septiembre del 2023, considerando que la Dirección Financiera ha realizado el control previo del trámite del **“PAGO DE LA PLANILLA UNICA DE ORDEN DE TRABAJO DEL PROYECTO ASFALTO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM , PARROQUIA VERACRUZ ,CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**, autorizo proceda con el pago en observancia de las disposiciones legales, a favor de **YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA** , por el valor de 18,774.56 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*


Lcdo. André Mauricio Granda Garrido  
**PREFECTO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA**

Anexos:

- solicitud\_orden\_de\_pago\_nro.\_gadppz-financiero-2023-0283-solop.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Abg. Jazmin Paola Rea Sangoquiza - Asistente Administrativo 2 --> Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes - Directora Financiera (E)





GOBIERNO DE  
**PASTAZA**

*El Gobierno del Azuero*

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
**PROVINCIAL DE PASTAZA**

Dirección: Francisco de Orellana y 27 de Febrero

Teléfono: 032885380 / Fax: 032886179

E-mail: financiero@pastaza.gob.ec

Web: www.pastaza.gob.ec

Contribuyente Especial: 590

RUC: 1660000170001

COMPROBANTE DE RETENCION

Nº 001-010-000021306

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202307166000017000120010100000213061438914219

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

07/09/2023 10:00:28

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0509202307166000017000120010100000213061438914219

Razon Social / Nombres y Apellidos: YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA

RUC/CI: 1600789133001

Fecha Emisión: 05 de Septiembre del 2023

Guía de Remisión:

Número de Documento	Cód. SRI	Descrip. Reten.	% Reten.	Base Retención	Valor Retenido
001-100-000000030	346	1.75% IMPUESTO A LA RENTA	1.75	19,108.97	334.41
001-100-000000030	731	100% SRI RESOLUCION 074 075	100.00	2,293.08	2,293.08
				Total	2,627.49

Información Adicional:

Dirección:

Teléfono:



R.U.C.: 1600789133001

FACTURA

No. 001-100-000000030

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202301160078913300120011000000000302268971117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2023 12:20:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202301160078913300120011000000000302268971117

YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA

Dirección Matriz: Barrio: LIBERTAD Calle: JAVIER VARGAS Intersección: FRANCISCO DE ORELLANA

Dirección Sucursal: Barrio: LIBERTAD Calle: JAVIER VARGAS Intersección: FRANCISCO DE ORELLANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Identificación 1660000170001

Fecha 04/09/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
POT		1.00	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICA DE ORDEN DE TRABAJO DEL "ASFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA", COTO-GADPPZ-004-2022		19108.97	0.00	0.00	0.00	19108.97

Información Adicional	
Telefono:	032792130
Email:	mariluordonez@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21402.05

SUBTOTAL 12%	19108.97
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19108.97
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2293.08
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21402.05
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**Compromiso No: 309**

Transacción No: 1410

Fecha: 10/02/2023

Proveedor: YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA

Identificación: Ruc 1600789133001

**DETALLE:**

YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA.- ASFALTO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HAST ABSCISA 13+100) L=4.5KM. PARROQUIA VERACRUZ CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA.

RIGO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
05.01.D511.519.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	372,974.30	5,548,718.94
Total =>	372,974.30	5,548,718.94





Firmado electrónicamente por:  
FRANCISCO RIGOBERTO  
GREFA RIVADENEYRA

Jefe De Presupuesto (e)

31/08/2023 15:30

Página 1/1





**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5925-M**

**Puyo, 14 de agosto de 2023**

**PARA:** Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes  
**Directora Financiera (E)**

**ASUNTO:** TRÁMITE DE PAGO DE LA PLANILLA RUBROS NUEVOS (COSTO + PORCENTAJE) DEL PROCESO : "ASFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM"

En referencia al Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2023-8415-M, de fecha 09 de agosto de 2023; suscrito por el ingeniero Vinicio Alarcón – Analista de Unidad Vial (Administrador de Contrato); hago hincapié lo siguiente:

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado 408-17 Administrador del contrato, que indica: *“El administrador del contrato velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sí para lograr el éxito del proyecto.- Es función del administrador del contrato establecer un sistema que evalúe el logro de los objetivos, mediante el cual pueda obtenerse información sobre su estado. Esto con el fin de tomar oportunamente acciones correctivas o para informar a las autoridades de la entidad sobre el desarrollo del proyecto”*

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado **408-18** Jefe de Fiscalización, indica: *“El Jefe de Fiscalización establecerá un sistema para asegurar la correcta ejecución de la obra, mediante el control de la calidad, el avance físico y el avance financiero de la obra. Dichos controles conllevan una evaluación mensual, de los aspectos mencionados y la comunicación de resultados a los mandos superiores, incluyendo los problemas surgidos, especialmente cuando afectan las condiciones pactadas en relación al plazo, presupuesto y calidad de la obra.- El Jefe de Fiscalización, se asegurará de que la obra se ejecute de conformidad con las bases establecidas en los estudios de preinversión, es decir, de acuerdo con el diseño definitivo, las especificaciones y demás normas técnicas aplicables, para lograr obtener del proyecto los beneficios esperados”*.

Con estos antecedentes, adjunto al presente la Planilla de Rubros Nuevos (con todos los anexos), de la Consultoría: **“ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA LA ABSCISA 13+100) L=4.5KM”**, documentos que han sido revisados y aprobados por el Administrador de Contrato y Fiscalizador Externo; por lo que, en base a los informes anexos, se determina como viable y procedente realizar el pago de \$ 19.108,97 USD (DIESCINUEVE MIL CIENTO OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 97/100), a favor de la ingeniera Ximena Alexandra Yerovi Muñoz – Contratista, de acuerdo al siguiente detalle:

<b>VALOR TOITAL RUBROS NUEVOS</b>	<b>\$ 19.108,97 USD</b>
-----------------------------------	-------------------------



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5925-M

Puyo, 14 de agosto de 2023

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas  
**DIRECTOR DE FISCALIZACION**

Referencias:

- GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2023-8415-M

Anexos:

- anexo\_fotografico0806904001691603329.rar
- anexos\_volumenes\_de\_obra.rar
- conformidad\_ambiental0440410001691603348.rar
- documentacion\_cruzada0197734001691603355.rar
- facturas0875177001691603361.rar
- iess0642780001691603368.rar
- informe\_administrador\_costo+\_porcentaje.rar
- informe\_de\_fiscalizacion0104846001691603392.rar
- memorandum\_de\_fiscalizacion.rar
- planilla0304039001691603406.rar

Copia:

Sr. Mgs. Jorge Luis Nuñez Meneses - **Director de Obras Públicas** / Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaria Ejecutiva 2 /**

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Jomara Daniela Martínez Moya - Asistente Administrativo 1

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Dirigido a: JEFE(A) DE PRESUPUESTO



Pastaza

Fecha:

14 AGO 2023

Ejecutar el control previo al compromiso verificando disponibilidad presupuestaria, y emitir certificación financiera, conforme a las Leyes y Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL



Pastaza

Fecha:

14 AGO 2023

Ejecutar el control previo y efectuar la contabilización, conforme leyes y Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL



Pastaza


Fecha:

14 AGO 2023

Ejecutar el control previo al pago conforme leyes y reglamentos vigentes.



JAIR FERNANDO  
LEDESMA BASTIDAS



GOBIERNO DE  
**PASTAZA**  
El Gobierno del Aromo

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN  
Pastaza  
Fecha: **10 AGO 2023**  
Recibido: SM  
Número: 8415 Hora: 10:08

Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2023-8415-M

Puyo, 09 de agosto de 2023

**PARA:** Sr. Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas  
Director de Fiscalización

**ASUNTO:** TRÁMITE DE PAGO DE LA PLANILLA RUBROS NUEVOS (COSTO + PORCENTAJE) DEL PROCESO : "ASFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM"

En relación al **Memorando No 013-FIBOM-JM-2023**, de fecha 08 de mayo de 2023, enviado por el Ing. Juan Manuel Guacho - FISCALIZADOR EXTERNO, del proyecto "**ASFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM**", en el cual solicita el trámite de pago de la planilla de Rubros Nuevos (Costo + Porcentaje).

De acuerdo a los Art(s). 70. de la LOSNCP; 121. del RLOSNCP; 408-16 y 408-17 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS (Acuerdo 039-CG), en lo que refiere a la "**ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO**", en atribuciones exclusivas y únicas a lo que la Ley señala para mi designación como Administrador de Contrato; en relación al contrato "**ASFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM**", a la presente fecha una vez que el Ing. Fiscalizador ha procedido a remitir la **PLANILLA DE RUBROS NUEVOS (COSTO + PORCENTAJE) (19.108,97 USD)**, con un **VALOR TOTAL A PAGAR DE 19.108,97 USD Dólares Americanos SIN IVA**, una vez revisada la información me permito manifestar la conformidad de la documentación adjunta para su debido proceso.

En virtud de lo expuesto y en cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas en el **CONTRATO**, solicito por medio de su persona **SE PROCEDA CON EL PAGO de la PLANILLA DE RUBROS NUEVOS (COSTO + PORCENTAJE)** a favor de **ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ**, Contratista responsable de la obra.

Adjunto información original para su debido proceso (cinco ejemplares para que se entregue en las distintas dependencias)

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

1.75% = 334,41 //  
Benef = 18.774,56 //



**Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2023-8415-M**

**Puyo, 09 de agosto de 2023**

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Hector Vinicio Alarcon Yepez  
**JEFE DE UNIDAD VIAL**

Anexos:

- anexo\_fotografico0806904001691603329.rar
- anexos\_volumenes\_de\_obra.rar
- conformidad\_ambiental0440410001691603348.rar
- documentacion\_cruzada0197734001691603355.rar
- facturas0875177001691603361.rar
- icess0642780001691603368.rar
- informe\_administrador\_costo+\_porcentaje.rar
- informe\_de\_fiscalizacion0104846001691603392.rar
- memorandum\_de\_fiscalizacion.rar
- planilla0304039001691603406.rar



HECTOR VINICIO  
ALARCON YEPEZ

## INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA

### PLANILLA COSTO + PORCENTAJE

Período de Ejecución: 04/03/2023 al 31/03/2023

#### A) ANTECEDENTES:

Con fecha 30 del mes de junio del 2022, el GAD Provincial de Pastaza suscribe con la ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ, el contrato para la ejecución de la obra: "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

Mediante Contrato por Cotización de Obra N° COTO – GADPPz – 004 - 2022 según CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA se designa al Ing. Héctor Vinicio Alarcón Yépez como Administrador del Contrato de Obra: "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

Con **Oficio ACB-022-2022**, de fecha 29 de septiembre de 2022, la Ing. Ximena Yerovi Muñoz – CONSTRATISTA de la Obra "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", solicita la autorización de la creación de **RUBROS NUEVOS (COSTO MÁS PORCENTAJE)**, de los rubros como: Desalajo de material distancia > 500m, Tubería PVC alcantarillado D=600mm (pasos de alcantarilla), entre otros.

Con **OFICIO: 023-FIBO-JG-2022**, de fecha 18 de noviembre 2022, el ING. JUAN MANUEL GUACHO - FISCALIZADOR EXTERNO, de la Obra "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", presenta el informe de incrementos y rubros nuevos para continuar con el trámite respectivo.

Con **Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2022-5882-M**, de fecha 07 de diciembre de 2022, el Ing. Héctor Vinicio Alarcón – ADMINISTRADOR DE CONTRATO, realiza la solicitud de partida presupuestaria para la orden de trabajo del proyecto "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", al Ing. Daniel Aníbal Ramos Campaña - DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

Con **Memorando Nro. GADPPZ-PRESUPUESTO-2023-0619-M**, de fecha 28 de febrero de 2023, el Lcdo. Jorge Marcelo Cueva Romero - JEFE DE PRESUPUESTO (E), entrega la **CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 73** de fecha 28/02/2023, para el proyecto "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", al Ing. Daniel Aníbal Ramos Campaña - DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

Con fecha 01 de marzo de 2023 se firma el **Formulario de Orden de Trabajo** para Rubros nuevos (Costo+Porcentaje).

#### B) DATOS GENERALES CONTRATO PRINCIPAL:

<b>Código del proceso de contratación:</b>	COTO – GADPPz – 004 - 2022
<b>Objeto del contrato:</b>	"ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"
<b>Monto del contrato:</b>	\$ 956,686.70 USD sin incluir IVA
<b>Fecha de suscripción:</b>	30 de junio de 2022
<b>Monto del anticipo:</b>	\$ 382,674.68 USD
<b>Fecha de inicio de plazo:</b>	23 de agosto de 2022
<b>Fecha de terminación contractual:</b>	19 de febrero de 2023
<b>Contratista:</b>	Ing. Ximena Alexandra Yerovi Muñoz
<b>Administrador de Contrato:</b>	Ing. Héctor Vinicio Alarcón Yépez

#### C) PLAZOS Y AVANCE

##### C.1 PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL:

Plazo total inicial: 180 días.

Plazo corto + porcentaje: 30 días.

**C.2 AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA DE LA PLANILLA**

Fecha de aprobación:	17 de febrero de 2023
Días de ampliación aprobados:	60 días
Motivación:	Precipitaciones altas, 16 días, Plazo por lluvias justificadas técnica y legalmente Incremento de Volúmenes de obra, 44 días, Incremento En Trabajos De Excavación, Limpieza De Derrumbes Y Estabilización De Mesa De Vía

**C.3 PARALIZACIONES EN EL MES A PLANILLAR**

Fecha de suspensión:	
Fecha de reinicio:	

**C.4 REPROGRAMACIONES**

No.	Fecha	Motivación
1	23 agosto de 2022	Reprogramado a la fecha de inicio de obra.
2	20 de febrero de 2023	Reprogramación ampliación de plazo

**C.5 CONTRATOS COMPLEMENTARIOS**

No.	Fecha de suscripción	Código de contrato	Monto	Motivación
1	10 de febrero de 2023		76.378,40 usd	Para cumplir el objeto del contrato es necesario que exista contrato complementario

**D) DESARROLLO DEL PLANILLAJE**

PLANILLA N°	MONTO LÍQUIDO A PAGAR (\$)	ANTICIPO DEVENGADO (\$)	OBSERVACIONES
PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE	19,108.97		TRAMITADA
<b>TOTAL:</b>	<b>19,108.97</b>		

MONTO DE AVANCE ECONOMICO TOTAL (\$)	19,108.97
TOTAL ANTICIPO DEVENGADO	
% DE AVANCE TOTAL	99.99
MULTA PLANILLA COSTO + PORCENTAJE	

**E) ANÁLISIS DEL PERÍODO DE PLANILLAJE****E.1 ANÁLISIS DE PLANILLAJE**

ÍTEM	PARÁMETRO DE CUMPLIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
A	Avance de obra de acuerdo al cronograma	X		
B	Retardo parcial en el período de la planilla		X	
C	Disposiciones del Administrador	X		
D	Disposiciones del Fiscalizador	X		
E	Cumplimiento de especificaciones técnicas	X		
F	Utilización de maquinaria ofertada	X		
G	Asistencia a las reuniones	X		
H	Asistencia del personal ofertado	X		
I	Obstaculización de trabajos a otros contratistas o al contratante		X	

J	Demora en la presentación de planillas a Fiscalización		X	
K	Normativa de Seguridad Industrial y Seguro Ocupacional	X		
L	Normativa de Manejo Ambiental	X		

E.2 ANÁLISIS DE MULTAS (del periodo planillado)

ÍTEM	DETALLE DEL OBJETO DE SANCIÓN	MONTO BASE PARA CÁLCULO	%	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	No. DE DÍAS	VALOR DE LA MULTA
A							
B							
C							
D							
TOTAL DE MULTAS EN ESTE PERÍODO DE PLANILLAJE:							

F) CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN

GARANTÍA TÉCNICA	VIGENTE
SEGURO SOCIAL	SI CUMPLE

En virtud del presente informe y en calidad de Administrador de Obra, **SE APRUEBA Y SE SOLICITA** se proceda con el pago de la Planilla de Costo + Porcentaje, con el siguiente detalle.

PORCENTAJE DE AVANCE PARCIAL EN ESTE PERÍODO (%)	99.99
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO (%)	99.99
VALOR TOTAL PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE (\$)	19,108.97
VALOR TOTAL REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA (\$)	
VALOR TOTAL PLANILLA EXCEDENTES (\$)	
VALOR TOTAL REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE EXCEDENTES (\$)	
DEVENGACIÓN DEL ANTICIPO EN ESTE PERÍODO (\$)	
DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTAS PARA ESTA PLANILLA (\$)	
<b>VALOR LIQUIDO A PAGAR (\$)</b>	<b>19,108.97</b>

SON: Diecinueve mil ciento ocho dólares con 97/100 centavos.

TODAS LAS RETENCIONES TRIBUTARIAS SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL GADPPZ.

Atentamente,







HECTOR VINICIO  
ALARCÓN YEPEZ

Ing. Vinicio Alarcón

**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**



INFORME Y ORDEN DE CAMBIO  
 - PROYECTOS -

COSTO MÁS PORCENTAJE N°:	001	FECHA:	01/03/2023	
NOMBRE DEL PROYECTO:	"ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"			
CONTRATISTA:	ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ			
FISCALIZADOR EXTERNO:	ING. JUAN MANUEL GUACHO GUACHO			
OBJETIVO:	Se dispone ejecutar los siguientes trabajos:			
MONTO AUTORIZADO		PARCIAL	ACUMULADOS	
	Rubros Nuevos (2%)	\$ 19.111,50 / (1.99)%	\$ (....)%	
	Incremento de Volumen (5%)	\$ (....)%	\$ (....)%	
	Contrato complementario (8%)	\$ (....)%	\$ (....)%	
JUSTIFICACIÓN	Inexistencia en el Contrato Principal			
	Inconsistencia Presupuesto del Rubro	Para cumplir el objeto del contrato es necesario que existan una orden de trabajo		
MODALIDAD DE CONTRATOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGÚN LA LOSNCP	CONTRATO COMPLEMENTARIO		CUMPLE	NO CUMPLE
	Prevista en el Art. 85 y 86, en el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivada, presentadas con su ejecución, las sumas de los contratos referidos no podrán exceder del 8% del valor del contrato principal.			
	DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA		CUMPLE	NO CUMPLE
	Prevista en el Art. 88, que da la posibilidad de pagar cantidades diferentes a las previstas en el contrato, sin necesidad de suscribir un contrato complementario, siempre y cuando se mantengan los planos y especificaciones del contrato y hasta el 5% del contrato principal.			
	COSTO MÁS PORCENTAJE		CUMPLE	X NO CUMPLE
	Para la ejecución de rubros nuevos a través de la modalidad de costo más porcentaje, y con el límite de hasta el 2% del valor del contrato principal, en las situaciones previstas en el artículo 89 de la LOSNCP, se observará el siguiente procedimiento.			
INSUMOS PREVISTOS	Se anexa presupuesto: SI			
	Análisis de precios: SI			
	Informe de Fiscalización, OFICIO: 023-FIBO-JG-2022, de Fecha: 18/11/2022	Informe de Administrador Contrato, Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2022-5882-M, de fecha 07/12/2022		
COSTOS INDIRECTOS	Los que constan en el contrato principal, esto es 17 %			
FORMA DE PAGO	Global			
RECOMENDACIONES	Se anexa informes y justificativos técnicos.			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (Art. 90 LOSNCP)	CERTIFICADO / COMPROMISO N°	COMPROMISO No: 73 / Transacción No: 75	PARTIDA PRESUPUESTARIA N°	05.01.D505.505.750105.000.000
	FECHA:	28/02/2023		
<p><b>NOTA:</b> De conformidad con el artículo 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los Fiscalizadores y Administradores de los contratos, certifican con su firma que, verificaron y garantizan por ser de su única responsabilidad, el cumplimiento de veracidad y legalidad de las motivaciones, valores autorizados, documentación técnica, justificativos y comprobatorios, y de las modificaciones contractuales autorizadas, garantizando que las mismas, no afectan la calidad, cantidad y mejora el avance físico y financiero, la ejecución del contrato y proyectos programados conforme a lo que determina la Ley.</p>				
 JUAN MANUEL GUACHO GUACHO		 HECTOR VINICIO ALARCÓN YEPEZ		
ING. JUAN MANUEL GUACHO GUACHO FISCALIZADOR EXTERNO		ING. HÉCTOR VINICIO ALARCÓN YÉPEZ ADMINISTRADOR DE CONTRATO		
 ADÁN MARINO MONTESDEOCA		 XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ		
ING. ADÁN MARIÑO MONTESDEOCA DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN SUBROGANTE / DELEGADO PREFECTOPROVINCIAL DE PASTAZA		ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ CONTRATISTA		

JUAN MANUEL GUACHO

INGENIERO CIVIL



CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN

**MEMORÁNDUM No 013-FIBOM-JM-2023**

**FECHA:** Puyo, 08 de mayo del 2023

**DE:** FISCALIZADOR EXTERNO

**PARA:** ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Solicito proceder con el trámite para cancelar a favor de la Srta. Ing. Ximena Alexandra Yerovi Muñoz, de la obra "CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA". conforme al siguiente detalle:

DETALLE	VALOR USD
PLANILLA DE RUBROS NUEVOS	\$ 19,108.97
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 19,108.97</b>

Particular que remito para los fines pertinentes

Atentamente:



Firma electrónica por  
JUAN MANUEL GUACHO  
GUACHO

Ing. Juan Manuel Guacho

**FISCALIZADOR EXTERNO**

Recibido  
08 - Mayo - 2023

- # PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE
-



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**  
**FISCALIZACION EXTERNA**  
**PLANILLA COSTO + PORCENTAJE LIQUIDACION**

OBRA: ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM. PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA. PARRAL ACUMULADO

FECHA DE CONTRATO: jueves, 30 de junio de 2022. INGENIERO: ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ. CONTRATISTA: V. PLANILLA COSTO-%PORCENT \$ 19,108.97 \$ 19,108.97

PLAZO: 30 días a partir de la orden de inicio. PERIODO: 4-mar-23 A 31-mar-23. % DE AVANCE: 99.99%

AMPLIACIONES: 0 días. AMPLIACION: 20-feb-23 A 20-abr-23.

SUSPENSIÓN: 0 días.

TOTAL: 30 días.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	CANTIDADES			IMPORTE			
						TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL EJECUCION	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
1	TRANSPORTE DE MATERIAL DE DESALOJO	M3	11600.00	\$ 1.23	\$ 14,268.00	-	11,597.94	11,597.94	99.98%	\$	14,265.47	\$ 14,265.47
2	TUBERIA DE ALCANTARILLADO D=600MM SUMINISTRO E INSTALACION	ML	24.00	\$ 124.00	\$ 2,976.00	-	24.00	24.00	100.00%	\$	2,976.00	\$ 2,976.00
3	TUBERIA AGUA POTABLE D=90MM IMPA SUMINISTRO E INSTALACION	ML	90.00	\$ 20.75	\$ 1,867.50	-	90.00	90.00	100.00%	\$	1,867.50	\$ 1,867.50
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 19,111.50</b>				<b>100.00%</b>	<b>\$</b>	<b>19,108.97</b>	<b>\$ 19,108.97</b>

LIQUIDACION DE LA PLANILLA			
VALOR DE LA PLANILLA	\$	19,108.97	
TOTAL PLANILLADO	\$	19,108.97	
DESCUENTOS	\$		
ANTICIPO	\$		
MULTAS	\$		
TOTAL DE DESCUENTOS	\$		
SON: DIECINUEVE MIL CIENTO OCHO CON 97/100	\$	19,108.97	Saldo Anticipo

% AVANCE ECONOMICO			
Programado	Ejecutado	Esta Planilla	Planillas Anteriores
100.00%	99.99%	100.00%	0.00%
100.00%	99.99%	0.00%	0.00%



ING. JUAN GUACHO  
FISCALIZADOR



ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ  
CONTRATISTA

- **ANEXOS**
- **GRÁFICOS DE**
- **VOLÚMENES DE**
- **OBRA**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL PASTAZA



ANEXOS DE VOLUMENES DE OBRA



OBRA	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA:	FECHA:	PLANILLA N° 01
RUBRO	TRANSPORTE DE MATERIAL DE DESALOJO	ING. XIMENA YEROVI	MARZO 2023	COSTO+%
1				UNIDAD: m <sup>3</sup>

CALCULO

UBICACION CORTE 1 TALUD ABSCISA 0+960 A 1+130

ABSCISA	DISTANCIA (m)	LADO IZQUIERO		LADO DERECHO		VOLUMEN TOTAL (m <sup>3</sup> )
		AREA (m <sup>2</sup> )	VOLUMEN (m <sup>3</sup> )	AREA (m <sup>2</sup> )	VOLUMEN (m <sup>3</sup> )	
0+900		0		0.311		
20.00			0		3.11	3.11
0+920		0		0		
20.00			0		0.00	0.00
0+940		0		0		
20.00			0		0.00	0.00
0+960		0		0		
20.00			60.58		0.00	60.58
0+980		6.038		0		
20.00			330.1		0.00	330.10
1+000		26.952		0		
20.00			345.83		0.00	345.83
1+020		27.591		0		
20.00			697.45		0.00	697.45
1+040		42.154		0		
20.00			804.95		10.14	815.11
1+060		38.141		1.016		
20.00			895.28		13.55	908.83
1+080		51.187		0.329		
20.00			852.33		3.39	855.72
1+100		34.046		0		
20.00			845.41		3.01	848.42
1+120		50.495		0.301		
20.00			504.95		3.01	507.96
1+140		0		0		
SUBTOTAL 1						5672.71

UBICACION CORTE 2 TALUD ABSCISA 4+020 A 4+210

ABSCISA	DISTANCIA (m)	AREA DE CORTE (m <sup>2</sup> )	VOLUMEN (m <sup>3</sup> )	VOLUMEN ACUMULADO (m <sup>3</sup> )	OBSERVACIONES
4+000	20.00	0.00	0.00	0.00	
4+020	20.00	7.90	78.98	78.98	
4+040	20.00	31.86	397.61	476.59	
4+060	20.00	29.89	617.56	1094.15	
4+080	20.00	22.48	500.83	1594.98	
4+100	20.00	19.05	415.34	2010.32	
4+120	20.00	20.36	394.05	2404.37	
4+140	20.00	74.32	946.77	3351.14	
4+160	20.00	69.61	1439.33	4790.47	
4+180	20.00	62.53	1075.98	5866.45	
4+200	20.00	1.57	158.78	6025.23	
4+210	20.00	0.00	0.00	6025.23	
SUBTOTAL 2				6025.23	

TOTAL CONTRATADO	11,600.00	m <sup>3</sup>
TOTAL EJECUTADO	11,597.94	m <sup>3</sup>



ING. XIMENA YEROVI  
CONTRATISTA



ING. JUAN GUACHO  
FISCALIZACION

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL PASTAZA



ANEXOS DE VOLUMENES DE OBRA



OBRA	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM. PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA:	FECHA:	PLANILLA N° 01
		ING. XIMENA YEROVI	MARZO 2023	COSTO+%
RUBRO	TUBERIA DE ALCANTARILLADO D=600M SUMINISTRO E INSTALACION	UNIDAD:		
2		ml		

UBICACION INTERSECCION VIA BOBONAZA-TACULIN ABSCISA 1+315



CALCULO

ABSCISA	DETALLE	LARGO (m)	ANCHO (m)	DIAMETRO (m)	PZAS	TOTAL (m)	OBSERVACIONES
1+315	TUBERIA	24	0	0.6	0.00	24.00	
SUBTOTAL 1						24.00	

TOTAL CONTRATADO	24.00	ml
TOTAL EJECUTADO	24.00	ml



Firmado electrónicamente por:  
XIMENA ALEXANDRA  
YEROVI MUNOZ

ING. XIMENA YEROVI  
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:  
JUAN MANUEL GUACHO  
GUACHO

ING. JUAN GUACHO  
FISCALIZACION

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL PASTAZA



ANEXOS DE VOLUMENES DE OBRA



OBRA	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM. PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA:	FECHA:	PLANILLA N° 01
RUBRO	TUBERIA AGUA POTABLE D=90M SUMINISTRO E INSTALACIONX	ING. XIMENA YEROVI	MARZO 2023	COSTO=9%
3				UNIDAD: ml

UBICACION VIA BOBONAZA-TACULIN ABSCISA 0+000 a 0+200



CALCULO

ABSCISA	DETALLE	LARGO (m)	ANCHO (m)	DIAMETRO (m)	PZAS	TOTAL (m)	OBSERVACIONES
0-000 A 0-200	TUBERIA	90	0	0.09	0.00	90.00	
SUBTOTAL 1						90.00	

TOTAL CONTRATADO	90.00	ml
TOTAL EJECUTADO	90.00	ml



Firmado electrónicamente por:  
XIMENA ALEXANDRA  
YEROVI MUNOZ

ING. XIMENA YEROVI  
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:  
JUAN MANUEL GUACHO  
GUACHO

ING. JUAN GUACHO  
FISCALIZACION

# ANEXO FOTOGRAFICO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA



ANEXO FOTOGRÁFICO



<b>CONTRATO:</b>	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.		
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>FISCALIZADOR:</b>	<b>PLANILLA No UNICA</b>	<b>COSTO MAS PORCENTAJE</b>
ING. XIMENA YEROVI	ING. JUAN GUACHO	<b>UBICACIÓN:</b>	Provincia: PASTAZA Cantón: PASTAZA
<b>MONTO DEL CONTRATO:</b>	\$ 19.108,97	<b>FECHA INICIO DE OBRA:</b>	<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>
		04/03/2023	31/03/2023

RUBRO No 01: TRANSPORTE DE MATERIAL DE DESALOJO



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**



**ANEXO FOTOGRÁFICO**



<b>CONTRATO:</b>	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.		
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>FISCALIZADOR:</b>	<b>PLANILLA No UNICA</b>	<b>COSTO MAS PORCENTAJE</b>
ING. XIMENA YEROVI	ING. JUAN GUACHO	<b>UBICACIÓN:</b>	Provincia: PASTAZA Cantón: PASTAZA
<b>MONTO DEL CONTRATO:</b>	\$ 19.108,97	<b>FECHA INICIO DE OBRA:</b>	<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>
		04/03/2023	31/03/2023

**RUBRO No 02: TUBERIA DE ALCANTARILLADO D=600M SUMINISTRO E INSTALACION**



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA



ANEXO FOTOGRÁFICO



<b>CONTRATO:</b>	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.		
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>FISCALIZADOR:</b>	<b>PLANILLA No UNICA</b>	<b>COSTO MAS PORCENTAJE</b>
ING. XIMENA YEROVI	ING. JUAN GUACHO	<b>UBICACIÓN:</b>	Provincia: PASTAZA Cantón: PASTAZA
<b>MONTO DEL CONTRATO:</b>	\$ 19.108,97	<b>FECHA INICIO DE OBRA:</b>	<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>
		04/03/2023	31/03/2023

RUBRO No 03: REMOCION DE ALCANTARILLA



# INFORME DE FISCALIZACIÓN

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**FISCALIZACION EXTERNA PARA EL ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA  
HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM,  
PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**

**FISCALIZADOR EXTERNO**

**INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE RUBROS NUEVOS (C+%)**

PROYECTO:

*Fiscalización Externa para el Asfaltado vía cabeceras del Bobonaza hasta la comunidad Taculin (abscisa 8+600 hasta abscisa 13+100) L=4.5 km, parroquia Veracruz, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.*

CONTRATISTA:

*Ing. Juan Manuel Guacho Guacho*

MONTO DEL CONTRATO:

*\$ 48 891,62 USD sin incluir IVA*

ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA:

*Ing. Vinicio Alarcón Yépez*

DIRECCION DE FISCALIZACION:

*Ing. Álvaro Sosa*

PERIODO DEL INFORME:

*04 de marzo a 31 de marzo del 2023*

FECHA DE ELABORACION:

*05 de abril del 2023*

## ÍNDICE

1.	DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN .....	1
2.	DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN.....	1
3.	PERÍODO DEL INFORME .....	2
4.	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE PERÍODO .....	2
-	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE LOS DISTINTOS FRENTE DE TRABAJO: .....	2
-	CONTROL DE CALIDAD:.....	2
-	INFORME DE LAS CONDICIONES DEL CLIMA:.....	3
-	ACTIVIDADES DE LA PLANIFICACIÓN MENSUAL: .....	3
5.	AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO .....	3
6.	CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS.....	4
7.	PLANILLAS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS .....	4
-	RESUMEN DE PLANILLAS .....	4
8.	TIEMPO UTILIZADO DESDE LA FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO .....	4
9.	RESUMEN DE MONTOS EJECUTADOS PLANILLAS CONTRACTUALES .....	5
10.	RESUMEN A LA FECHA DEL PROYECTO.....	5
11.	GESTION DE LA FISCALIZACIÓN.....	5
12.	VERIFICACIONES REALIZADAS .....	8
-	VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL TÉCNICO EN OBRA.....	8
-	VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA DE ACUERDO A RUBROS EJECUTADOS.....	8
-	VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA OFERTADA, DE ACUERDO A RUBROS EJECUTADOS .....	8
-	INFORME DEL PERSONAL TÉCNICO POR PARTE DEL CONSULTOR.....	9
-	INCIDENCIAS CLIMATICAS PRODUCIDAS EN LA OBRA.....	9
-	DOCUMENTACION EMITIDA POR FISCALIZACION EXTERNA Y CONTRATISTA .....	9
-	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES .....	9
-	ENSAYOS Y PRUEBAS .....	9
13.	MULTAS, SANCIONES Y SUSPENSIONES .....	10
14.	CONCLUSIONES .....	10
15.	RECOMENDACIONES .....	11
16.	ANEXOS.....	11
	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME.....	11

## INDICE DE GRAFICOS

Gráfico 1 Monitoreo Económico Parcial.....	7
Gráfico 2 Monitoreo Económico Acumulado.....	7

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

<b>Objeto del contrato</b>	Asfaltado vía Cabeceras del Bobonaza hasta la comunidad Taculin (abscisa 8+600 hasta abscisa 13+100) L=4.5 km, parroquia Veracruz, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.
<b>Código del proceso</b>	COTO-GADPPz-004-2022
<b>Monto del contrato</b>	\$ 956 686,70 USD sin incluir IVA
<b>Fuente de financiación</b>	Banco de Desarrollo del Ecuador
<b>Fecha de suscripción</b>	30 de junio del 2022
<b>Plazo contractual</b>	180 días
<b>Monto del anticipo</b>	\$ 382 674,68 USD
<b>Fecha de entrega del anticipo</b>	20 de julio del 2022
<b>Fecha de inicio de plazo</b>	23 de agosto del 2022
<b>Fecha de terminación contractual</b>	19 de febrero del 2023
<b>Suspensión de trabajo</b>	-
<b>Ampliación de plazo</b>	60 días
<b>Fecha de terminación nuevo plazo</b>	20 de abril del 2023
<b>Contratista</b>	Ing. Ximena Alexandra Yerovi Muñoz
<b>Administrador de Contrato</b>	Ing. Vinicio Alarcón Yépez

## 2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN

<b>Objeto del contrato</b>	Fiscalización externa para el Asfaltado vía Cabeceras del Bobonaza hasta la comunidad Taculin (abscisa 8+600 hasta abscisa 13+100) L=4.5 km, parroquia Veracruz, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.
<b>Código del proceso</b>	CDC-GADPPz-015-2022
<b>Monto del contrato</b>	\$ 48 891,62 USD sin incluir IVA
<b>Fecha de suscripción contrato principal</b>	25 de julio del 2022
<b>Fecha de suscripción contrato modificadorio</b>	17 de agosto del 2022
<b>Plazo contractual</b>	180 días
<b>Monto del anticipo</b>	\$ 19 556,65
<b>Fecha de entrega del anticipo</b>	22 de agosto del 2022
<b>Fecha de inicio de trabajo</b>	23 de agosto del 2022
<b>Fecha de terminación contractual</b>	19 de febrero del 2023
<b>Suspensión de trabajo</b>	-
<b>Ampliación de plazo</b>	60 días
<b>Fecha de terminación nuevo plazo</b>	20 de abril del 2023
<b>Contratista</b>	Ing. Juan Manuel Guacho
<b>Administrador de Contrato</b>	Ing. Vinicio Alarcón Yépez

### 3. PERÍODO DEL INFORME

El periodo contractual corresponde desde el 04 de marzo a 31 de marzo, conforme a la orden de trabajo y la autorización de la partida presupuestaria para la ejecución de rubros nuevos.

### 4. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE PERÍODO

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	CANTIDADES	IMPORTE
1	TRANSPORTE DE MATERIAL DE DESALOJO	M3	11600.00	\$ 1.23	\$ 14,268.00	11,597.94	\$ 14,265.47
2	TUBERIA DE ALCANTARILLADO D=600MM SUMINISTRO E INSTALACION	ML	24.00	\$ 124.00	\$ 2,976.00	24.00	\$ 2,976.00
3	TUBERIA AGUA POTABLE D=90MM 1MPA SUMINISTRO E INSTALACION	ML	90.00	\$ 20.75	\$ 1,867.50	90.00	\$ 1,867.50
					\$ 19,111.50		\$ 19,108.97

#### - CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE LOS DISTINTOS FRENDES DE TRABAJO:

- En base la oferta presentada y cuyo formulario de cumplimiento exige la presentación de una metodología de construcción y organigrama de trabajo, se exige el cumplimiento de dicho programa adicionalmente se procura con el fin de mantener el buen avance físico del proyecto el control de los frentes de trabajo que básicamente se divide en:

<b>FRENTE DE OBRA CIVIL</b>	MAESTRO MAYOR ALBAÑILES PEONES
<b>FRENTE DE CONTROL</b>	SUPERINTENDENTE RESIDENTES TOPOGRAFO

#### - CONTROL DE CALIDAD:

- Se realizó por parte del equipo de fiscalización un seguimiento constante de las actividades ejecutadas durante el presente periodo procurando realizar las respectivas recomendaciones de ser el caso, controlando así que cada una de las actividades cumplan con las especificaciones técnicas entregadas por la entidad Contratante además de los códigos y reglamentos de construcción vigentes.
- Dentro de la ejecución in situ de cada rubro, se procedió a verificar la disponibilidad del equipo ofertado, metodología de buenas prácticas de ejecución de obra, además de que se cuente con el personal necesario y de ser el caso el incremento del mismo.

- **INFORME DE LAS CONDICIONES DEL CLIMA:**

- *En cuanto al comportamiento climático durante el presente periodo se ha dispuesto el seguimiento del mismo con información de hora de eventualidad y si tuvo o no incidencia dentro de la ejecución del proyecto.*

- **ACTIVIDADES DE LA PLANIFICACIÓN MENSUAL:**

- *Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo:*

- *Exigencia permanente que todo el personal cuente con el equipo de protección personal (EPP).*

- *Acciones de control:*

- *Verificación de la ejecución de todos los rubros, de acuerdo con la programación presentada por el Contratista.*

- *Entre las tareas proyectadas por Fiscalización son:*

- *Control del Libro de Obra*
- *Control de calidad de los materiales a ser utilizados por el constructor*
- *Control de la supervisión continua de los equipos y materiales*
- *Atención oportuna de las consultas del constructor.*
- *Exigir al constructor el cumplimiento de las leyes laborales con sus trabajadores.*
- *Exigir al constructor el uso de elementos de seguridad de los obreros a su mando.*
- *Verificar que el Residente de obra este continuamente en la obra.*
- *Vigilar que se cumplan las cláusulas del contrato.*

**5. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

*El monto total del proyecto alcanza la suma de \$ 19 111.50 USD sin incluir IVA (DIESCINUEVE MIL CIENTO ONCE CON 50/100 CTVS. DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA) equivalente al 1.99%, para el proyecdto Asfaltado vía cabeceras del Bobonaza hasta la comunidad Taculin (abscisa 8+600 hasta abscisa 13+100) L=4.5 km, parroquia Veracruz, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.*

## 6. CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

RESUMEN DE MONTOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS MENSUALMENTE m							
MONTO PROGRAMADO				MONTO EJECUTADO			
ESTE PERÍODO	%	ACUMULADO	%	ESTE PERÍODO	%	ACUMULADO	%
19 111.50	100	19 111.50	100	19 108.97	99.99	19 108.97	99.99

## 7. PLANILLAS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS

DESCRIPCIÓN	VALORES					PORCENTAJES			
	MONTO PROGRAMADO		MONTO PLANILLADO			AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL	
	MES	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO
OBRA CIVIL RUBROS NUEVOS	19 111.50	19 111.50		19 108.98	19 108.97	100 %	100 %	99.99%	99.99%
TOTALES	19 111.50			19 108.98	19 108.97	100 %	100 %	99.99%	

### -RESUMEN DE PLANILLAS

DESCRIPCION	MONTO	ACUMULADO	PORCENTAJE
PLANILLA DE RUBROS NUEVOS	19 108.97	19 108.97	99.99 %
TOTALES	19 108.97		99.99 %

## 8. TIEMPO UTILIZADO DESDE LA ORDEN DE TRABAJO

Para los trabajos en obra se realiza las verificaciones en campo correspondiente, las actividades para el presente periodo, 04 de marzo al 31 de marzo de 2023, concerniente a la Planilla de Liquidación.

	PLAZO (DIAS)
DIAS UTILIZADOS	27

## 9. RESUMEN DE MONTOS EJECUTADOS PLANILLAS CONTRACTUALES

PLANILLA	MES	MONTO DE OBRA PROGRAMADO	PORCENTAJE DE OBRA PROGRAMADO	MONTO DE OBRA EJECUTADO	PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO
1	4 de marzo / 31 de marzo del 2023	19 111.50	100%	19 108.97	99.99%
<b>TOTAL</b>		<b>19 111.50</b>	<b>100%</b>	<b>19 108.97</b>	<b>99.99%</b>

## 10. RESUMEN A LA FECHA DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	MONTO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
<b>MONTO DEL CONTRATO</b>	956 686,70	100%	
<b>CONTRATO COMPLEMENTARIO</b>	76 378,40	100%	
<b>COSTO + PORCENTAJE</b>	19 111.50	100%	
<b>MONTO EJECUTADO A MARZO DEL 2023</b>	19 108.97	99.99%	Informe mensual de acuerdo con el cronograma valorado de trabajo y programación inicial, correspondiente al rubros nuevos

## 11. GESTION DE LA FISCALIZACIÓN

*Dentro de las competencias concernientes al equipo de Fiscalización del Proyecto que están determinadas por el contrato de Consultoría y por los términos de referencia mismas que se realizan en forma permanente y rutinaria y están enfocadas básicamente a: control de la calidad de los materiales y de la ejecución de los rubros que se incorporan al proyecto; estado y número de maquinaria disponible en la ejecución de los trabajos; número y desempeño del personal del contratista; solución oportuna a los problemas que afecten a la obra, trámite de los aspectos administrativos vinculados al proyecto y rediseños según el criterio de los profesionales a cargo, informando de cada una de ellas a la entidad a través del administrador de contrato.*

*Entre las diferentes actividades relacionadas a la fiscalización se realizaron las siguientes:*

### **Control Técnico**

- *Control de Ejecución de la obra (proceso constructivo)*

*Se analiza una coherencia entre la metodología del contratista, especificaciones técnicas y normas vigentes de construcción que van relacionadas a un buen avance porcentual según el cronograma de avance de obra.*

➤ *Control de calidad de obra (materiales y acabados)*

*Se verifico cada uno de las actividades y sus componentes en este caso materiales para lo cual aquellos que son elaborados en obra son examinados en laboratorios a través de muestras y los adquiridos se exige una certificación de calidad emitido por el fabricante.*

➤ *Calidad de materiales (especificaciones técnicas)*

*Los materiales utilizados en el presente periodo son: material pétreo de mejoramiento. Fiscalización acatando lo solicitado en las especificaciones técnicas verifico que la extracción del material es de la mina Sata.*

➤ *Seguridad en obra (plan de seguridad)*

*Se realiza el control diario conjuntamente el residente de obra, el Ing. Ambiental y el encargado de seguridad industrial asignado al proyecto, tomando en cuenta los parámetros de verificación de la normativa de seguridad Industrial y salud ocupacional; y la normativa ambiental vigente. Se adjunto el informe respectivo.*

➤ *Conservación del ambiente (pma)*

*El control para la conservación del ambiente se ejecutará conjuntamente con los lineamientos de la dirección de gestión del ambiente del GADP Pastaza, de la cual en el proyecto en mención se evitará la tala excesiva de árboles, comprendido en el rubro de desbroce y desbosque, respetando los anchos de la vía. Así también controlando el uso de equipo adecuado para el mantenimiento de maquinaria y el depósito de desechos generados en obra en lugares adecuados, evitando la contaminación del suelo.*

➤ *Relacionamiento comunitario (prc)*

*En el proceso constructivo Fiscalización con el propósito de precautelar el buen desenvolvimiento del proyecto mediante su equipo técnico realiza la socialización conforme avanza la ejecución de la obra con los propietarios de los terrenos aledaños y moradores de los sectores con el fin de informar los acontecimientos y cumplimiento de los planes de trabajos.*

➤ *Control Económico*

*En el presente periodo de acuerdo a la programación inicial del cronograma valorado de trabajo la ejecución del proyecto debería alcanzar un valor de USD 19 111.50; correspondiente al 100% del monto del contrato complementario sin reajuste de precios. En el periodo en mención la inversión económica alcanzada del proyecto es de USD 19 108.98; correspondiente a un avance de obra del 99.99%, es decir, cumple con el porcentaje de avance mensual para este periodo. En conclusión, al*

ser una planilla única presentada se liquidaría el contrato complementario.

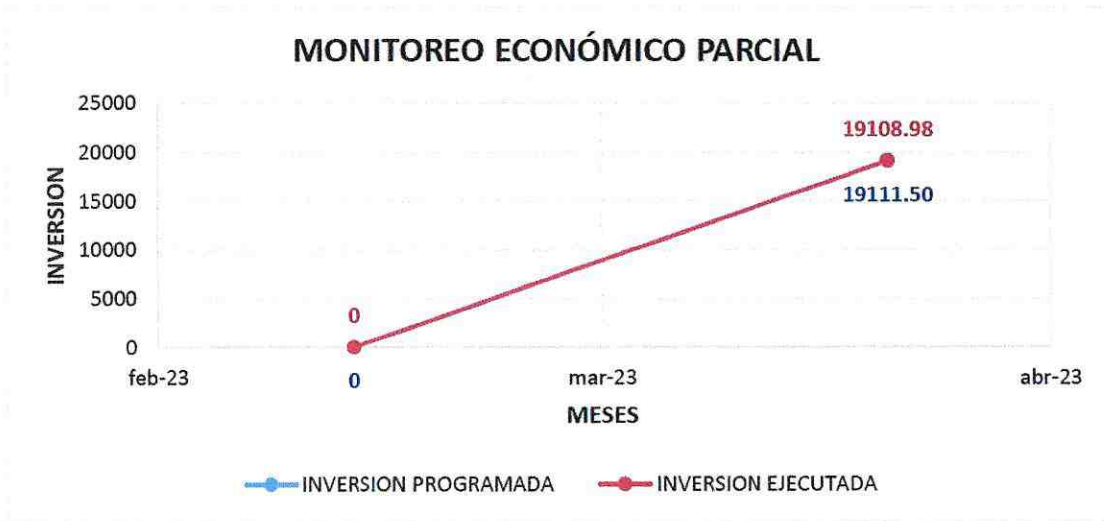


Gráfico 1 Monitoreo Económico Parcial

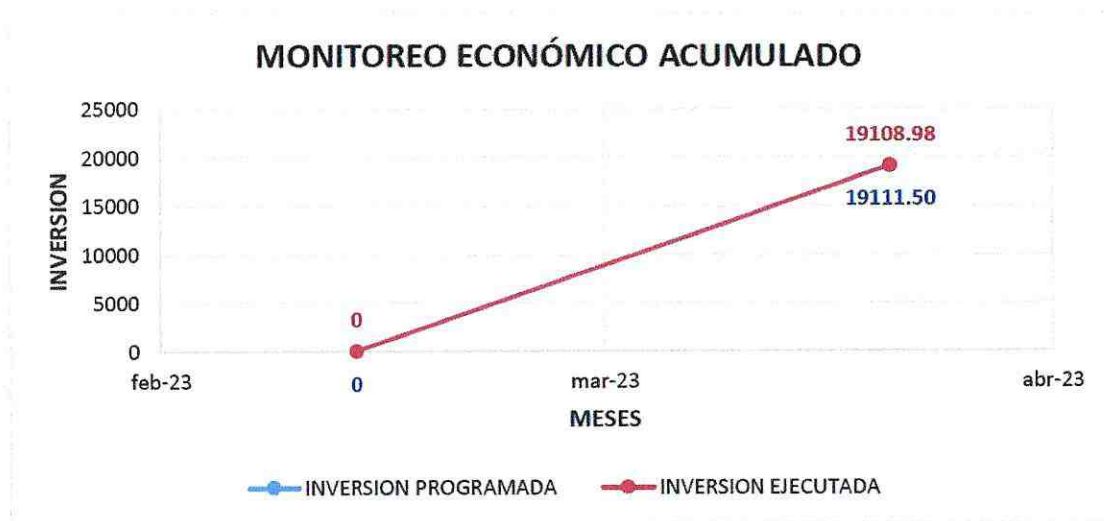


Gráfico 2 Monitoreo Económico Acumulado

➤ **Control administrativo y legal**

El libro de obra es la herramienta legal que mantiene las anotaciones de las actividades diarias realizadas en Obra. Se ha verificado el cumplimiento de mantener en obra todos los documentos establecidos en el contrato de acuerdo a los parámetros de contratación. Durante el proceso constructivo se ha verificado que el equipo técnico se mantenga en obra.

## 12. VERIFICACIONES REALIZADAS

### - VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL TÉCNICO EN OBRA

PERSONAL OFERTADO	CHECK LIST
SUPERINTENDENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
RESIDENTE DE OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>
INGENIERO AMBIENTAL	<input checked="" type="checkbox"/>
INGENIERO INDUSTRIAL	<input checked="" type="checkbox"/>
TOPÓGRAFO	<input checked="" type="checkbox"/>

### - VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA DE ACUERDO A RUBROS EJECUTADOS

PERSONAL OFERTADO	PERSONAL PRESENTE EN OBRA	HORAS TRABAJADAS	CHECK LIST
OPERADOR DE EQUIPO PESADO G1 (OP C1)	Operador excavador (3)	224	<input checked="" type="checkbox"/>
AYUDANTE MAQUINARIA (EO D2)	Ayudante de Excavadora (3)	224	<input checked="" type="checkbox"/>
MAESTRO MAYOR (EO C1)	Maestro de obra (1)	224	<input checked="" type="checkbox"/>
ALBAÑIL (EO D2)	Albañil (2)	224	<input checked="" type="checkbox"/>
PEON (EO E2)	Despachador (1), anotador (1), construcción (8)	224	<input checked="" type="checkbox"/>
CHOFER DE VOLQUETAS (CH C1)	Chofer de Volquetes con licencia tipo E (5)	224	<input checked="" type="checkbox"/>
TOPÓGRAFO (EO C1)	Topógrafo (1)	224	<input checked="" type="checkbox"/>
CADENERO (EO D2)	Cadenero (1)	224	<input checked="" type="checkbox"/>
CHOFER DE CAMION (CH C1)	Chofer camión abasto (1)	224	<input checked="" type="checkbox"/>

### - VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA OFERTADA, DE ACUERDO A RUBROS EJECUTADOS

EQUIPO Y MAQUINARIA OFERTADO	EQUIPO Y MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA	HORAS TRABAJADAS	CHECK LIST
VOLQUETAS (5)	Volquetas Beiben (1), hino(2), chevrolet (1) y hino (2).	224	<input checked="" type="checkbox"/>
EXCAVADORAS (3)	Excavadoras Hyudai 148 HP (1), Sany 153 HP (1) y caterpillar 230 HP (1).	224	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTACIÓN TOTAL (1)	Estación total Trimble M3 (1)	224	<input checked="" type="checkbox"/>
CONCRETERA 1 SACO (2)	Concretera 1 saco (2)	224	<input checked="" type="checkbox"/>
	Herramienta menor	224	<input checked="" type="checkbox"/>

- **INFORME DEL PERSONAL TÉCNICO POR PARTE DEL CONSULTOR**

NOMBRE	CEDULA	CARGO	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIONES
Guacho Guacho Juan Manuel	0604955575	Fiscalizador- director de Fiscalización	23-agos- 2022	-----	AFILIADO
Pucha Amancha Álvaro Vladimir	060455108	Residente de Fiscalización	23-agos- 2022	-----	AFILIADO
Díaz Villarruel Alex Gary	1600655862	Residente de Fiscalización- Ambiental	23-agos- 2022	-----	AFILIADO
De La Torre Henry Geovanny	0604221515	Chofer	23-agos- 2022	-----	AFILIADO
Alvarado Liliana	1600561060	Secretaria	23-agos- 2022	-----	AFILIADO

- **INCIDENCIAS CLIMATICAS PRODUCIDAS EN LA OBRA**

*El efecto climático dentro del proyecto no ha sido incidente a excepción de aquellas precipitaciones que provocaron derrumbes, no han existido afectaciones críticas dentro del proyecto ni paralizaciones por este motivo, el clima lluvioso nos ha ayudado a detectar puntos importantes de escorrentía, afluentes y crecientes para de esta manera controlarlas evitando afectaciones futuras; el monitoreo de las mismas se lleva a través de una hoja de campo que tiene concordancia con el libro de obra misma que se muestra a continuación.*

- **DOCUMENTACION EMITIDA POR FISCALIZACION EXTERNA Y CONTRATISTA**

# DE OFICIO	ASUNTO	OBSERVACIONES
015-V.A.BOBONAZA-2022	FORMULARIO DE APROBACION	EMITE ADMINISTRADOR A FISCALIZADOR
042-A-FIBO-JG-2022	AUTORIZACION ORDEN DE TRABAJO	EMITE FISCALIZADOR A CONTRATISTA
ACB-062-2023	ENTREGA DE PLANILLA C+%	EMITE CONTRATISTA A FISCALIZADOR

- **CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES**

*Uno de los principales objetivos de la Fiscalización es el control de la calidad de los materiales que intervienen en los diferentes rubros, así como el cumplimiento de las especificaciones para la ejecución de los mismos.*

- **ENSAYOS Y PRUEBAS**

- ✓ *En el periodo en mención no se han considerado multas.*

### **13. MULTAS, SANCIONES Y SUSPENSIONES**

- ✓ *En el periodo en mención no se han considerado multas.*

### **14. CONCLUSIONES**

- ✓ *La Planilla De Liquidación de Costo más Porcentaje se aprueba por parte de fiscalización externa por un valor de \$19 108.97 (Diecinueve mil ciento ocho con 97/100).*
- ✓ *La Planilla De Liquidación Costo más Porcentaje correspondiente al mes de marzo, se encuentra verificada en campo, cumpliendo con los parámetros de calidad y cantidad de acuerdo a la planificación mensual aprobada, por lo que es pertinente continuar con el trámite respectivo.*

## 15. RECOMENDACIONES

- ✓ *Es necesario realizar reuniones periódicas con el propósito de establecer metas a corto plazo y verificar los cumplimientos de los objetivos adquiridos entre las partes para que exista una mejor fluidez de la información concerniente al proyecto.*
- ✓ *Realizar la entrega de planillas mensuales durante los primeros 5 días de cada mes, para su respectivo análisis y aprobación.*

## 16. ANEXOS

### ✓ ARCHIVO FOTOGRÁFICO

*Se anexa las fotografías detalladas en cada frente de trabajo con el propósito de observar de una manera contundente el trabajo desarrollado en este periodo.*

## RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME

*NOMBRE: Ing. Juan Manuel Guacho*

*DIRECCIÓN DOMICILIO: La Primavera Calle Calpi 18 Ilapo*

*CIUDAD DOMICILIO: Riobamba*

*TELÉFONO- FAX: 032612003*

*CELULAR: 0999985643*

*CORREO ELECTRÓNICO: j.guacho@yahoo.com*



Firmado electrónicamente por:  
JUAN MANUEL GUACHO  
GUACHO

***Firma: Ing. Juan Manuel Guacho.***  
**FISCALIZADOR**

# IESS



## **CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES**

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA, representante legal de la empresa YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA con RUC Nro. 1600789133001 y dirección BARRIO LIBERTAD. LIBERTAD JAVIER VARGAS FRANCISCO DE ORELLANA . SN. FRANCISCO DE ORELLANA. FRENTE HOSTERIA TUR., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Firmado electrónicamente por:

**KARLA DENISSE  
BERMUDEZ ROLDAN**

Abg. Karla Denisse Bermúdez Roldán

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 03 de abril de 2023

Validez del Certificado 30 días



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA

abril 05 del 2023 10:21

YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000168884372

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2023-04-04
No. RUC / REGISTRO:	1600789133001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2023-04-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA - YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA			
Periodo de Pago:	2023 - 03			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

### AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2023 - 3	16	0922862834	IBARRA RIVERA JHESLY SARAY	261.85	15	NNA	53.94	11.55
2023 - 3	35	1600175812	CARRION CARRION VICENTE ARMANDO	461.70	30	NNA	95.11	0.00
2023 - 3	35	0604195263	FLOR PADILLA SOFIA LISBETH	523.70	30	NNA	107.88	0.00
2023 - 3	35	0603836305	LOPEZ BARRETO MAURICIO DEIDAN	461.70	30	NNA	95.11	0.00
2023 - 3	35	1600606972	RAMOS SILVA LUIS HUMBERTO	522.36	30	NNA	107.61	0.00
2023 - 3	68	1600789133	YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA	450.00	30	NNA	79.20	0.00
				<b>2681.31</b>			<b>538.85</b>	<b>11.55</b>



<b>Valor</b>	<b>561.17</b>
<b>Intereses por mora (+)</b>	<b>0.00</b>
<b>Seguro Salud Tiempo Parcial (+)</b>	<b>11.55</b>
<b>Honorarios Abogado (+)</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos Administrativos (+)</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal (=)</b>	<b>561.17</b>
<b>Notas de Crédito (-)</b>	<b>0.00</b>
<b>Total (=)</b>	<b>572.72</b>

#### Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.


\*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

\*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

\*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

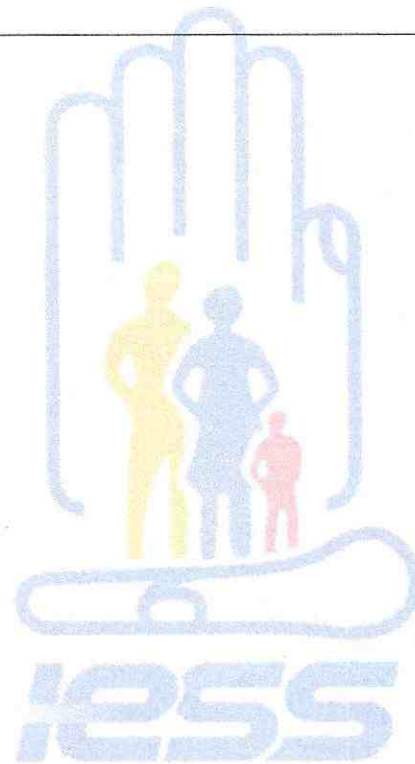



SERVICIOS FACILITO  
DE OCTUBRE

0591702324001

COMPROBANTE DE IESS

COMPROBANTE: 00000030392442

TIPO RECAUDACION: IESS (TODOS)  
REFERENCIA: 16007091330010001  
NOMBRE: YEROVI MUNOZ XIMENA ALEXANDRA  
CEDULA: 160XXXXXX3001  
NUMERO COMPROBANTE: 0000000168884372  
PERIODO: 202303  
RUBRO: PLAFI

AGENCIA: 2007 PUYO  
USUARIO: JZAMBRANO  
SEC LOC/SW: 691458/607262  
FECHA HORA: 06/04/2023 14:41:04  
CIUDAD: PASTAZA

VALOR RECAUDADO: 572.72  
COMISION: 0.57  
TOTAL: 573.29  
MENSAJE: TRANSACCION OK  
FACTURA: 001-327-000214229

Descargue su factura electrónica en  
[documentoselectronicos.facilito.com.ec](http://documentoselectronicos.facilito.com.ec)



*Johnny Zambrano G.*

**4 DE OCTUBRE**  
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

# FACTURAS

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1691703572001

FACTURA

No. 001-100-000000033

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903202301169170357200120011000000000330000007214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/03/2023 13:31:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903202301169170357200120011000000000330000007214

0903202301169170357200120011000000000330000007214

MARCO CARVAJAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CIA LTDA

MC CONSTRUCTORA

Dirección VERACRUZ VIA A MACAS  
Matriz:

Dirección VERACRUZ VIA A MACAS  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA

Identificación 1600789133001

Fecha 09/03/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
005		132.50000 0	ALQUILER DE MAQUINARIA		45.000000	0.00	0.00	0.00	5962.50
006		136.20000 0	ALQUILER DE VOLQUETE		40.000000	0.00	0.00	0.00	5448.00

Información Adicional

Email: xym8alex@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12779.76

SUBTOTAL 12%	11410.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11410.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1369.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12779.76

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

**NO TIENE LOGO**

COMPANIA DE SERVICIO Y TRANSPORTE DE ARIDOS  
JUOMAVILL CIA LTDA

JUOMAVILL CIA LTDA

Dirección Matriz: AV CESLAO MARIN Y MORONA

Dirección Sucursal: AV CESLAO MARIN Y MORONA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1691716623001

FACTURA

No. 001-012-000000055

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1403202301169171662300120010120000000551234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/03/2023 21:03:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1403202301169171662300120010120000000551234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUNOZ

Identificación: 1600789133001

Fecha: 14/03/2023 Placa / Matricula: Guía

Dirección: Javier Vargas y Francisco de Orellana

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4.01.02.02.004		1.000000	TRANSPORTE DE MATERIAL - DESALOJO		2555.680000	0.00	0.00	0.00	2555.68

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	2555.68
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2555.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2555.68
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2555.68

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1690019376001

FACTURA

No. 001-100-000000056

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0303202301169001937600120011000000000561744909511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/03/2023 21:55:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0303202301169001937600120011000000000561744909511

0303202301169001937600120011000000000561744909511

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO RIO AMAZONAS

Dirección Matriz: Ciudadela: PASTAZA Barrio: EL DORADO Calle: CONONACO Número: S/N Intersección: CONAMBO

Dirección Sucursal: Ciudadela: PASTAZA Barrio: EL DORADO Calle: CONONACO Número: S/N Intersección: CONAMBO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA

Identificación 1600789133001

Fecha 03/03/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: JAVIER VARGAS Y FCO. ORELLANA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
11		1.000000	TRANSPORTE DE UNA EXCAVADORA - DESALOJO		150.000000	0.00	0.00	0.00	150.00

Información Adicional

Telefono: 032897280  
Email: xym8alex@gmail.com  
PLACA: TDV0667

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	150.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	150.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	150.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	150.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C: 1691715279001

**FACTURA** No. 001-100-000049809

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0909202201169171527900120011000000498090004980912


**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:**

00/00/00 00:00:00

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISION:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0909202201169171527900120011000000498090004980912

**FERSAMAX**  
**FERSAMAX SA**  
 Direccion Matriz: CRISTOBAL COLON S/N Y JUAN DE VELASCO  
 Direccion establecimiento: CRISTOBAL COLON SN Y JUAN DE VELASCO  
 Teléfonos: 032893112 - 0939917348 - 0939917348  
 Email: fersamax.facturacion@gmail.com

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**AGENTE DE RETENCIÓN:** RESOLUCION No 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: YEROVI MUNOZ XIMENA ALEXANDRA

RUC / CI: 1600789133001

Fecha Emisión: 09/09/2022

Guía de Remisión:

**DIRECCION:** JAVIER VARGAS Y FRANCISCO DE ORELLANA

**CORREOELECTRONICO:**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Valor Total
MGS18650	TUBO ALCANTARILLA 650 (DI 600) 55 NOVAFORT 942346	UND	4,00	444,1000	0,00	1.776,40

**INFORMACION ADICIONAL:**

CORREO ELECTRONICO:

CONTROL: 0801E0049809

CODIGO: 00008180

REFERENCIA: 0,00

DIRECCION: JAVIER VARGAS Y FRANCISCO DE ORELLANA

FORMA\_PAGO: CONTADO 1900 00:00:00

SUBTOTAL 12% 1.776,40

SUBTOTAL 0% 0,00

SUB TOTAL No Objeto IVA 0,00

**SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.776,40**

TOTAL DESCUENTO 0,00

IVA 12% 213,17

PROPINA 0,00

**VALOR TOTAL 1.989,57**

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
20 OTROS CON UTILIZACION DEL	0		DIAS

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1691715279001

**FACTURA**

No. 001-100-000056136

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2101202301169171527900120011000000561360005613610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/02/2023 07:43:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2101202301169171527900120011000000561360005613610

FERSAMAX SA  
FERSAMAX  
Dirección Matriz: CRISTOBAL COLON S/N Y JUAN DE VELASCO  
Dirección Sucursal: CRISTOBAL COLON SN Y JUAN DE VELASCO  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI  
Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: YEROVI MUNOZ XIMENA ALEXANDRA  
Identificación: 1600789133001  
Fecha: 21/01/2023 Placa / Matrícula: Guía  
Dirección: JAVIER VARGAS Y FRANCISCO DE ORELLANA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		1.000000	SIERRA SANDFLEX 12 X 18		1.308500	0.00	0.00	0.00	1.31
		1.000000	ARCO SIERRA 12 COMANDO BT-108		3.426900	0.00	0.00	0.00	3.43
		6.000000	TUBO PRESION 90 X 1MPA EC PLASTIGAMA 926048		31.710000	0.00	0.00	0.00	190.26
		1.000000	KALIPEGA LITRO PLASTIGAMA 925468		19.104500	0.00	0.00	0.00	19.10
		2.000000	HIERRO CORRUGADO 12MM X 12MTS		15.284900	0.00	0.00	0.00	30.57

Información Adicional

RETENCION:	Agente de Retencion RESOLUCION No. 1
ARREDELECTRONICO:	sincorreo@correo.com
CONTROL:	0801E0056136
REFERENCIA:	0.00
OBSERVACIONES:	SIN ASIGNAR CORREO
VENDEDOR:	00002 CASTILLO GUAMAN WILSON DA

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	274.03

SUBTOTAL 12%	244.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	244.67
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	29.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	274.03

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# DOCUMENTACION CRUZADA

Puyo, 03 de marzo de 2023  
**Oficio N°015-V.A. BOBONAZA-2022**

ING.  
JUAN MANUEL GUACHO GUACHO  
**CONTRATISTA-FISCALIZADOR EXTERNO**

**ASUNTO:** FORMULARIO DE APROBACIÓN, CERTIFICACIÓN POA Y CERTIFICACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA LA ORDEN DE TRABAJO DE OBRA "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

De mi consideración:

Por medio del presente pongo en conocimiento para los trámites correspondientes el **FORMULARIO DE APROBACIÓN, CERTIFICACIÓN POA Y CERTIFICACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA LA ORDEN DE TRABAJO DE OBRA** del contrato cuyo objeto es: "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", en el cual consta como Contratista la Ing. Ximena Alexandra Yerovi Muñoz.

Particular que pongo en su conocimiento.

Atentamente,



Ing. Héctor Vinicio Alarcón Yépez  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

Nota: Se adjunta - FORMULARIO DE APROBACIÓN  
- CERTIFICACIÓN POA  
- CERTIFICACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA

Memorando Nro. GADPPZ-PRESUPUESTO-2023-0619-M

Puyo, 28 de febrero de 2023

**PARA:** Sr. Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña  
**Director de Obras Publicas**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA LA ORDEN DE TRABAJO DEL PROCESO COTO-GADPPz-004-2022 "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

En respuesta al Documento No. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2022-5882-M

De mi consideración:

Estimado ingeniero, adjunto al presente se servira encontrar la **CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 73** de fecha 28/02/2023, para el proyecto "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Jorge Marcelo Cueva Romero  
**JEFE DE PRESUPUESTO (E)**

Referencias:

- GADPPZ-OBRA-PUBLICAS-2022-8794-M

Anexos:

- informe\_incrementos\_y\_costos\_bobonaza-signed.pdf
- presupuesto\_costo\_mas\_porcentaje\_bobonaza-signed.pdf
- crobarras\_costo\_mas\_porcentaje\_bobonaza-signed.pdf
- analisis-10730639001670429730.pdf
- oficio\_23\_incrementos\_rubros\_nuevos-signed.pdf
- oficio\_022-\_bobonaza\_-\_hesvial-signed.pdf
- oficio\_021-\_bobonaza\_-\_hesvial-signed.pdf
- oficio\_011\_peticion\_incrementos-signed\_(1).pdf
- certificación\_poa\_nº\_747\_â\_oopp\_â\_2022..pdf
- certificacion2023.73-signed.pdf



**Memorando Nro. GADPPZ-PRESUPUESTO-2023-0619-M**

**Puyo, 28 de febrero de 2023**



Firmado electrónicamente por:  
**JORGE MARCELO CUEVA  
ROMERO**

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 73**

Transacción No: 75

Fecha: 28/02/2023

Responsable: RAMOS CAMPAÑA DANIEL ANIBAL

Identificación: Cédula 1600324378

Programa: 05 FUNCION SERVICIO CONECTIVIDAD VIALIDAD Y ENERGIA  
SubPrograma: 01 MOVILIDAD CONECTIVIDAD Y ENERGIA  
Proyecto: D505 CONSTRUCCION VIAL RURAL PROVINCIAL  
Actividad: 505 CONSTRUCCION VIAS ASFALTADAS

**DOCUMENTOS DE REFERENCIA**

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO	8794-M	13/12/2022	19,111.50	OBRAS PUBLICAS

**DETALLE:**

LA ORDEN DE TRABAJO DEL PROCESO COTO-GADPPz-004-2022 "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MARCELO

Partida Presupuestaria	Valor
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	19,111.50
Total =>	19,111.50



Firmado electrónicamente por:  
JORGE MARCELO CUEVA  
ROMERO

Jefatura De Presupuesto

Contador 1



**CERTIFICACIÓN POA N° 747 – OOPP – 2022.**

Puyo, 13 de diciembre de 2022

En referencia a lo que determina el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en el Art. 233 y Art. 234, de la Sección Cuarta, Formulación del Presupuesto, en el párrafo primero, Programación del Presupuesto en donde indica:

Art. 233.- Plazo. - "Todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos de conformidad con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los principios de la participación definidos en la Constitución y la ley."

Art. 234.- Contenido. - "Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento."

Los programas deberán formularse en función de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. A fin de hacer posible su evaluación técnica, las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán presentar programas alternativos con objetivos de corto, mediano y largo plazo. Al respecto me permito certificar que luego de la revisión del POA 2022. Aprobado, constan las siguientes actividades:

**MEGAPROGRAMA:** MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA

**PROGRAMA:** CONSTRUCCIÓN VIAL RURAL PROVINCIAL

**PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN VÍAS ASFALTADAS

DESCRIPCIÓN	PARTIDA	RUBRO SIN IVA
ORDEN DE TRABAJO DEL PROCESO "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PROVINCIA PASTAZA".	75.01.05	\$ 19.111,50 USD

Con la finalidad de cumplir los siguientes objetivos:

- ✓ **OBJETIVO GENERAL:**
  - ✓ MEJORAR LA MOVILIDAD DE LA PROVINCIA DE PASTAZA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.
- ✓ **OBJETIVO ESPECÍFICO:**
  - ✓ INCREMENTAR LA RED VIAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS.

La Dirección Financiera de conformidad con su competencia verificará la disponibilidad y la partida presupuestaria.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
**JORGE ROBERTO  
ARBOLEDA  
BASANTES**

Lcdo. Arboleda Basantes Jorge R.  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2.



**OFICIO: 042-A-FIBO-JG-2022**

Puyo, 04 de marzo 2023

Ingeniera

Ximena Yerovi Muñoz

**ADMINISTRADOR DE CONTRATO "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."**

Presente.

De mi consideración,

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez deseándole éxitos en sus funciones. En relación a la obra: **"ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."**, pongo en su conocimiento, que una vez se cuenta con la partida presupuestaria, se autoriza por parte de fiscalización la **ORDEN DE TRABAJO** para la ejecución de la modalidad de rubros nuevos (C+%), misma que se ejecutara en el periodo marzo 2023.

Por la favorable atención que se digna dar a la presente, anticipo mi más sincero agradecimiento.

Atentamente,



JUAN MANUEL GUACHO  
GUACHO

ING. JUAN MANUEL GUACHO

**FISCALIZADOR EXTERNO**

CORREO: [jguacho68@gmail.com](mailto:jguacho68@gmail.com)

TELÉFONO: 0999985643

**Oficio ACB-062-2023**

Puyo, 05 de abril de 2023

Ingeniero

JUAN MANUEL GUACHO G.

**FISCALIZADOR EXTERNO**

Presente

De mi consideración,

A través del presente, me dirijo a usted para expresarle un cordial saludo y desearle el mejor de los éxitos en las funciones que viene desarrollando.

En mi calidad de contratista del Proyecto: **ASFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASATAZA**, con código **COTO-GADPPz-004-2022**, tengo a bien entregar a usted la Planilla Única de Costo + % Porcentaje correspondiente al mes de marzo del 2023.

Pongo a su conocimiento para la revisión correspondiente, para su aprobación y tramite respectivo,

Atentamente



firmado electrónicamente por  
XIMENA ALEXANDRA  
YEROVI MUNOZ

Ing. Ximena Yerovi Muñoz

**CONSTRATISTA**

Correo: xym8alex@gmail.com

ADMINISTRADOR: ING VINICIO ALARCON  
FISCALIZADOR: ING JUAN GUACHO  
CONTRATISTA: ING XIMENA YEROVI

PROYECTO: RUBROS NUEVOS DENTRO DEL PROYECTO ASFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100)L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA -

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

No.	Rubro / Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio global
001	TRANSPORTE DE MATERIAL DE DESALOJO	M3	11,600.00	1.23	14,268.00
002	TUBERIA DE ALCANTARILLADO D = 600MM SUMINISTRO E INSTALACION	ML	24.00	124.00	2,976.00
003	TUBERIA AGUA POTABLE D = 90MM 1MPA SUMINISTRO E INSTALACION	ML	90.00	20.75	1,867.50
				<b>TOTAL:</b>	<b>19,111.50</b>

SON : DIECINUEVE MIL CIENTO ONCE DOLARES, 50/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA



INSTRUCIONES PARA VERIFICAR  
JUAN MANUEL  
GUACHO GUACHO

ELABORADO  
ING. JUAN GUACHO

ADMINISTRADOR: ING VINICIO ALARCON  
 FISCALIZADOR: ING JUAN GUACHO  
 CONTRATISTA: ING XIMENA YEROVI

PROYECTO: RUBROS NUEVOS DENTRO DEL PROYECTO ASFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100)L=4.5 KM., PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA -

**CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS**

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	PERIODOS (MESES/SEMANAS)			
						1	2	3	4
001	TRANSPORTE DE MATERIAL DE DESALOJO	M3	11,600.00	1.23	14,268.00				14,268.00
002	TUBERIA DE ALCANTARILLADO D = 600MM SUMINISTRO E INSTALACION	ML	24.00	124.00	2,976.00				2,976.00
003	TUBERIA AGUA POTABLE D = 90MM 1MPA SUMINISTRO E INSTALACION	ML	90.00	20.75	1,867.50				1,867.50
INVERSION MENSUAL						19,111.50			19,111.50
AVANCE MENSUAL (%)						100.00			100.00
INVERSION ACUMULADA AL 100% (linea e=1p)						19,111.50			19,111.50
AVANCE ACUMULADO (%)						100.00			100.00
INVERSION ACUMULADA AL 80% (linea e=0.5p)						15,289.20			15,289.20
AVANCE ACUMULADO (%)						80.00			80.00


 Firmado con el certificado:  
**JUAN MANUEL**  
**GUACHO GUACHO**

ELABORADO  
 ING JUAN GUACHO

ADMINISTRADOR: *ING VINICIO ALARCON*  
 FISCALIZADOR: *ING JUAN GUACHO*  
 CONTRATISTA: *ING XIMENA YEROVI*

PROYECTO: RUBROS NUEVOS DENTRO DEL PROYECTO ASFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100)L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA --

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

HOJA 1 DE 3

RUBRO : 001

UNIDAD: M3

DETALLE : TRANSPORTE DE MATERIAL DE DESALOJO

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.01
VOLQUETA	1.00	25.00	25.00	0.034	0.85
<b>SUBTOTAL M</b>					<b>0.86</b>
MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
CHOFER VOLQUETAS	1.00	5.62	5.62	0.034	0.19
<b>SUBTOTAL N</b>					<b>0.19</b>
MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB	
<b>SUBTOTAL O</b>				<b>0.00</b>	
TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB	
<b>SUBTOTAL P</b>				<b>0.00</b>	

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	1.05
INDIRECTOS (%)	10.00%
UTILIDAD (%)	7.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO	1.23
<b>VALOR OFERTADO</b>	<b>1.23</b>

SON: UN DOLAR, 23/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA



Firmado electrónicamente por:

**JUAN MANUEL  
GUACHO GUACHO**

ELABORADO

ING. JUAN GUACHO

ADMINISTRADOR: ING VINICIO ALARCON  
 FISCALIZADOR: ING JUAN GUACHO  
 CONTRATISTA: ING XIMENA YEROVI

PROYECTO: RUBROS NUEVOS DENTRO DEL PROYECTO ASFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100)L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA --

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

HOJA 2 DE 3

RUBRO : 002

UNIDAD: ML

DETALLE : TUBERIA DE ALCANTARILLADO D = 600MM SUMINISTRO E INSTALACION

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					1.50
<b>SUBTOTAL M</b>					<b>1.50</b>

MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL	1.00	4.29	4.29	2.500	10.73
ALBAÑIL	1.00	3.87	3.87	2.500	9.68
PEON	1.00	3.83	3.83	2.500	9.58
<b>SUBTOTAL N</b>					<b>29.99</b>

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB
TUBERIA PVC CORRUGADO D=600mm Inc. ANILLO DE CAUCHO	M	1.000	74.02	74.02
LUBRICANTE	KG	0.008	2.00	0.02
ARENA	M3	0.030	15.00	0.45
<b>SUBTOTAL O</b>				<b>74.49</b>

TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB
<b>SUBTOTAL P</b>				<b>0.00</b>

<b>TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)</b>	<b>105.98</b>
INDIRECTOS (%)	10.00% 10.60
UTILIDAD (%)	7.00% 7.42
<b>COSTO TOTAL DEL RUBRO</b>	<b>124.00</b>
<b>VALOR OFERTADO</b>	<b>124.00</b>

SON: CIENTO VEINTE Y CUATRO DOLARES, 00/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN MANUEL  
 GUACHO GUACHO**

ELABORADO  
 ING. JUAN GUACHO

ADMINISTRADOR: ING VINICIO ALARCON  
 FISCALIZADOR: ING JUAN GUACHO  
 CONTRATISTA: ING XIMENA YEROVI

PROYECTO: RUBROS NUEVOS DENTRO DEL PROYECTO ASFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100)L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA - -

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

HOJA 3 DE 3

RUBRO : 003

UNIDAD: ML

DETALLE : TUBERIA AGUA POTABLE D = 90MM 1MPA SUMINISTRO E INSTALACION

EQUIPO DESCRIPCION	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.60
<b>SUBTOTAL M</b>					<b>0.60</b>
MANO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD A	JORNAL/HR B	COSTO HORA C=AxB	RENDIMIENTO R	COSTO D=CxR
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL	1.00	4.29	4.29	1.000	4.29
ALBAÑIL	1.00	3.87	3.87	1.000	3.87
PEON	1.00	3.83	3.83	1.000	3.83
<b>SUBTOTAL N</b>					<b>11.99</b>
MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	PRECIO UNIT. B	COSTO C=AxB	
TUBERIA PRESION 90mm 1MPa E/C	M	1.000	5.15	5.15	
<b>SUBTOTAL O</b>				<b>5.15</b>	
TRANSPORTE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD A	TARIFA B	COSTO C=AxB	
<b>SUBTOTAL P</b>				<b>0.00</b>	

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)	17.74
INDIRECTOS (%)	10.00%
UTILIDAD (%)	7.00%
<b>COSTO TOTAL DEL RUBRO</b>	<b>20.75</b>

SON: VEINTE DOLARES, 75/100 CENTAVOS  
 ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN MANUEL  
 GUACHO GUACHO**

ELABORADO  
 ING. JUAN GUACHO

# CONFORMIDAD AMBIENTAL

PROVINCIA DE PASTAZA  
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

05 ABR 2023

JOSÉ RIVERA M.

09h15




JUAN GUACHO

OFICIO: 047-FIBO-JG-2023

Puyo, 04 de abril de 2023

Ingeniero  
Álvaro Sosa  
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DEL GADPPz  
Presente.



De mi consideración,

Reciba un atento y cordial saludo, a la vez desearle éxitos en las funciones a usted encomendadas, de la misma manera pongo en conocimiento que se adjunta el informe de cumplimiento ambiental del proyecto "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.", perteneciente a la planilla de avance No. 08 para que se proceda con el trámite pertinente.

Verificado en territorio lo presentado en el informe ambiental de cumplimiento remitido por el contratista, fiscalización externa emite la **CONFORMIDAD AMBIENTAL**, correspondiente al periodo 01 de marzo al 31 de marzo de 2023.

Por la atención prestada al presente anticipo mis más sinceros agradecimientos

Atentamente,



JUAN MANUEL GUACHO  
GUACHO

ING. JUAN MANUEL GUACHO

**FISCALIZADOR**

CORREO: [jguacho68@gmail.com](mailto:jguacho68@gmail.com)

TELÉFONO: 0999985643

Copia: Ing. David Yedra - Director de Gestión Ambiental del GADPPz
