

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 1474

Fecha: 11/09/2023

Asiento N° 4259

Compromiso N° 1107

Retención N° 001-010-000021339

1BCE PRINCIPAL Cta Cte No 01210014

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **AMAZONAS BUILDING S.A.**

USD 135,034.88

LA SUMA DE: **CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO Dolares 88/100 Ctvs**

PUYO, 11 de Septiembre del 2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

AMAZONAS BUILDING S.A..- PAGO DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N01 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N01 DEL PROYECTO ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

Usuario: ALE

DOCUMENTOS

Fecha	Documento	No	Autorización	Valor
08/09/2023	FACTURA	001101000000102	020000010211	153,932.89

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor
CTA 4020442268	AMAZONAS BUILDING S.A.	135,034.88
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		135,034.88

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IVA	16,492.81	
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	137,440.08	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	135,034.88	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		135,034.88
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS		135,034.88
2.1.3.75.01.112	IMPUESTO A LA RENTA 1.75%		2,405.20
2.1.3.81.14.001	CXP IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI		16,492.81
SUMAN o PASAN USD		288,967.77	288,967.77

APLICACION PRESUPUESTARIA


Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS		137,440.08	135,034.88
TOTAL GASTOS USD	0.00	137,440.08	135,034.88

LCDO. ANDRE GRANDA.
Prefecto Provincial

LCDA. MARILU ORDOÑEZ.
Directora Financiera E.

LCDO. MARCELO CUEVA.
Jefe De Contabilidad E.

ING. GABRIEL SOS
Tesorero



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 14-9-2023

Hora: 11:39:6


Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: SOSA ESPINEL GABRIEL ALEJANDRO 1210014

Num. Ref. BCE.:19053052

Institución Pública: GAD PROV PASTAZA							# Cta.: 1210014		
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado	
BANECUADOR B.P.	4020442268	135,034.88	380	1691710080001	AMAZONAS BUILDING S.A.	2	13-09-2023 17:32:45	ACREDITADA	
Total:	135,034.88	Reg.:1							

[Atrás](#)



GOBIERNO DE
PASTAZA

El Gobierno del Azuero

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA

Dirección: Francisco de Orellana y 27 de Febrero

Teléfono: 032885380 / Fax: 032886179

E-mail: financiero@pastaza.gob.ec

Web: www.pastaza.gob.ec

Contribuyente Especial: 590

RUC: 1660000170001

COMPROBANTE DE RETENCION

Nº 001-010-000021339

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1109202307166000017000120010100000213391438920214

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

12/09/2023 13:10:25

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1109202307166000017000120010100000213391438920214

Razon Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING S.A.

RUC/CI: 1691710080001

Fecha Emisión: 11 de Septiembre del 2023

Guía de Remisión:

Número de Documento	Cód. SRI	Descrip. Reten.	% Reten.	Base Retención	Valor Retenido
001-101-000000102	346	1.75% IMPUESTO A LA RENTA	1.75	137,440.08	2,405.20
001-101-000000102	731	100% SRI RESOLUCION 074 075	100.00	16,492.81	16,492.81
				Total	18,898.01

Información Adicional:

Dirección:

Teléfono:



**GOBIERNO DE
PASTAZA**
El Gobierno del Animo

Orden de Pago Nro. GADPPZ-GADPPZ-2023-0305-GOP

Puyo, 11 de septiembre de 2023

PARA: Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
Directora Financiera (E)

ASUNTO: ORDEN DE PAGO PARA AMAZONAS BUILDING S.A

De mi consideración:

De conformidad al memorando No. GADPPZ-FINANCIERO-2023-0313-SOLOP de fecha 11 de septiembre de 2023, considerando que la Dirección Financiera ha realizado el control previo del trámite de la planilla No.1 de avance de obra y reajuste provisional de la planillas No. 1 de avance del contrato suscrito para el ASFALTO DE LA VIA CURARAY –FRANCISCO DE ORELLANA –JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO –EL TRIUNFO-CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”; autorizo proceda con el pago en observancia de las disposiciones legales, a favor de AMAZONAS BUILDING S.A, por el valor de 137,440.08 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. André Mauricio Granda Garrido
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes - Directora Financiera (E)



Firmado electrónicamente por:
**ANDRÉ MAURICIO
GRANDA GARRIDO**

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-6148-M

Puyo, 12 de septiembre de 2023

PARA: Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
Directora Financiera (E)

ASUNTO: REINGRESO DE LA PLANILLA DE OBRA AVANCE 1 DEL PROYECTO:
"ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA â
JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO,
CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA"

En respuesta al memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2470-M, se reingresa la Planilla de Avance de Obra N° 1 del proyecto: **"ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA"**, una vez que la ingeniera Eryka Silva Manzano - Subdirectora de Fiscalización (Administradora de Contrato), ha subsanado la observación emitida por su dependencia, quedando en este sentido el detalle de la Planilla:

PORCENTAJE DE AVANCE PARCIAL EN ESTE PERÍODO	2,91 %
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	2,91 %
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE PLANILLA AVANCE 1	\$ 135.466,45
VALOR TOTAL DE REAJUSTE PROV. AVANCE 1	\$ 1.973,63
DEVENGACIÓN DEL ANTICIPO EN ESTE PERÍODO	-
DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTAS PARA ESTA PLANILLA	\$0.00
VALOR LIQUIDO A PAGAR:	\$ 137.440,08

En este sentido se solicita proceder con el trámite administrativo correspondiente.

Atentamente,



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-6148-M

Puyo, 12 de septiembre de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
DIRECTOR DE FISCALIZACION

Referencias:

- GADPPZ-FISCALIZACION-2023-6147-M

Anexos:

- check_list_tramites_de_pago_1-signed_plan_1_jatunpaccha-signed.pdf
- memorando_nro._gadppz-unidad-vial-2023-7221-m.pdf
- check_list_tramites_de_pago_1-signed0884746001687466014.pdf
- check_list_tramites_de_pago_1-signed0403001001687465389.pdf
- 1.1.-acta_de_cumplimiento_de_parametros.pdf
- 42_oficio_planilla_de_avance_de_obra_no._01.pdf
- comprobantepago_plani_afi_jasper_(24)0734487001687464856.pdf
- comprobantepago_plani_afi_jasper_(25)0012366001687464857.pdf
- comprobantepago_plani_afi_jasper_(26)0249370001687464857.pdf
- of._correccion_de_planilla_1.pdf
- poliza_de_fiel_cumplimiento_renovada0934037001687464857.pdf
- rubro_3_.pdf
- 001-reajuste_de_precios_planilla_1.pdf
- anexo_21.pdf
- anexo_18.pdf
- anexo_17.pdf
- anexo_17_justificativo.pdf
- anexo_100579016001680534273.pdf
- anexo_07.pdf
- anexo_04.pdf
- anexo_04_justificativo.pdf
- anexo_04_justificativo_civil_3d.pdf
- anexo_43.pdf
- anexo_42.pdf
- anexo_41.pdf
- anexo_40.pdf
- anexo_39.pdf
- anexo_38.pdf
- anexo_37.pdf
- anexo_35.pdf
- anexo_36.pdf
- anexo_44.pdf
- anexo_planita_y_perfil_lamina_01.pdf
- memo_de_pago0468651001680534559.pdf
- anexo_planita_y_perfil_lamina_02.pdf
- cronograma_valorado_de_trabajos-signed_firmado-signed.pdf
- oficio_entrega_de_planilla_de_avance_de_obra_no._01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- planilla_de_avance_principal_n_01_firmado-signed-signed.pdf
- cambio_de_adm._asfalto_curaray-signed-signed-signed_(1).pdf
- 2._acta_de_inicio_curaray-signed-signed-2-signed-signed_(2).pdf
- notificación_adm.pdf
- memorando_nro._gadppz-financiero-2023-2162-m.pdf
- anexo_22.pdf
- anexo_03.pdf
- informe_adm._obra_avance_1-signed.pdf
- 12_oficio_de_informe_cumplimiento_direccion_de_fiscalizacion.pdf
- 13_oficio_devolucion_de_planilla_de_avance_no._01.pdf
- 18_oficio_devolucion_dos_de_planilla_de_avance_no._01.pdf

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: JEFE (A) DE PRESUPUESTO

Fecha: **12 SEP 2023**

Ejecutar el control previo al compromiso verificando disponibilidad presupuestaria, y emitir certificación financiera, conforme a las leyes y Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL

Fecha: **12 SEP 2023**

Ejecutar el control previo y efectuar la contabilización, conforme leyes y Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL

Fecha: **12 SEP 2023**

Ejecutar el control previo al pago conforme leyes y reglamentos vigentes.

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-6148-M

Puyo, 12 de septiembre de 2023

- 19_oficio_entrega_de_planilla_de_avance_de_obra_no._01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- 20_oficio_entrega_de_planilla_de_fiscalizacion_no._01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- 21_oficio_entrega_tramite_permiso_ambiental_lico-gadppz-006-20220011566001680534156.pdf
- anexo_01.pdf
- anexo_02.pdf
- memorando_nro._gadppz-fiscalizacion-2023-5557-m.pdf
- informe_adm._obra_avance_1_corregido-signed.pdf
- memorando_nro._gadppz-fiscalizacion-2023-6147-m.pdf

Copia:

Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaria Ejecutiva 2** /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - Secretaria Ejecutiva 2



Firmado electrónicamente por:
**JAIR FERNANDO
LEDESMA BASTIDAS**

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-6147-M

Puyo, 12 de septiembre de 2023

PARA: Sr. Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
Director de Fiscalizacion

ASUNTO: CORRECCIÓN DE LA PLANILLA DE OBRA AVANCE 1 DEL PROYECTO:
"ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA â
JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO,
CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA"

En respuesta al Documento No. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5607-M, y en calidad de Administradora de contrato de "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA", tengo a bien realizar un alcance al Informe de Administradora de contrato y corregir el valor correspondiente al siguiente detalle:

PORCENTAJE DE AVANCE PARCIAL EN ESTE PERÍODO	2,91 %
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	2,91 %
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE PLANILLA AVANCE 1	\$ 135.466,45
VALOR TOTAL DE REAJUSTE PROV. AVANCE 1	\$ 1.973,63
DEVENGACIÓN DEL ANTICIPO EN ESTE PERÍODO	-
DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTAS PARA ESTA PLANILLA	\$0.00
VALOR LIQUIDO A PAGAR:	\$ 137.440,08

Particular que comunico para continuar con el trámite correspondiente.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eryka Mireya Silva Manzano
SUBDIRECTOR DE FISCALIZACION

Referencias:

- GADPPZ-FINANCIERO-2023-2470-M

Anexos:

- check_list_tramites_de_pago_1-signed_plan_1_jatunpaccha-signed.pdf
- memorando_nro._gadppz-fiscalizacion-2023-5557-m.pdf
- anexo_02.pdf
- anexo_01.pdf
- 21_oficio_entrega_tramite_permiso_ambiental_lico-gadppz-006-20220011566001680534156.pdf
- 20_oficio_entrega_de_planilla_de_fiscalizacion_no._01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- 19_oficio_entrega_de_planilla_de_avance_de_obra_no._01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- 18_oficio_devolucion_dos_de_planilla_de_avance_no._01.pdf
- 13_oficio_devolucion_de_planilla_de_avance_no._01.pdf
- 12_oficio_de_informe_cumplimiento_direccion_de_fiscalizacion.pdf

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA



DIRECCIÓN DE FISCALIZACION

Pastaza

12 SEP 2023

Fecha:

Recibido:

EM

Número:

Hora:



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-6147-M

Puyo, 12 de septiembre de 2023

- informe_adm._obra_avance_1-signed.pdf
- anexo_03.pdf
- anexo_22.pdf
- memorando_nro._gadppz-financiero-2023-2162-m.pdf
- notificación_adm.pdf
- 2_ acta_de_inicio_curaray-signed-signed-2-signed-signed_(2).pdf
- cambio_de_adm._asfalto_curaray-signed-signed-signed_(1).pdf
- planilla_de_avance_principal_n_01_firmado-signed-signed.pdf
- oficio_entrega_de_planilla_de_avance_de_obra_no._01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- cronograma_valorado_de_trabajos-signed_firmado-signed.pdf
- anexo_planita_y_perfil_lamina_02.pdf
- memo_de_pago0468651001680534559.pdf
- anexo_planita_y_perfil_lamina_01.pdf
- anexo_44.pdf
- anexo_36.pdf
- anexo_35.pdf
- anexo_37.pdf
- anexo_38.pdf
- anexo_39.pdf
- anexo_40.pdf
- anexo_41.pdf
- anexo_42.pdf
- anexo_43.pdf
- anexo_04_justificativo_civil_3d.pdf
- anexo_04_justificativo.pdf
- anexo_04.pdf
- anexo_07.pdf
- anexo_100579016001680534273.pdf
- anexo_17_justificativo.pdf
- anexo_17.pdf
- anexo_18.pdf
- anexo_21.pdf
- 001-reajuste_de_precios_planilla_1.pdf
- rubro_3_.pdf
- poliza_de_fiel_cumplimiento_renovada0934037001687464857.pdf
- of._correccion_de_planilla_1.pdf
- comprobantepago_plani_afi_jasper_(26)0249370001687464857.pdf
- comprobantepago_plani_afi_jasper_(25)0012366001687464857.pdf
- comprobantepago_plani_afi_jasper_(24)0734487001687464856.pdf
- 42_oficio_planilla_de_avance_de_obra_no._01.pdf
- 1.1.-acta_de_cumplimiento_de_parametros.pdf
- check_list_tramites_de_pago_1-signed0403001001687465389.pdf
- check_list_tramites_de_pago_1-signed0884746001687466014.pdf
- memorando_nro._gadppz-unidad-vial-2023-7221-m.pdf
- informe_adm._obra_avance_1_corregido-signed.pdf



Firmado electrónicamente por:
**ERYKA MIREYA SILVA
MANZANO**



INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA

PLANILLA No. 1 DE AVANCE DE OBRA
Período de Ejecución: 25/01/2023 al 28/02/2023

A) ANTECEDENTES:

Con fecha 07 de noviembre de 2022, el GAD Provincial de Pastaza suscribe con la CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A., el contrato para la ejecución de la obra: "ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Mediante RESOLUCIÓN N° 713-GADPPz-2022 según RESOLUCIÓN N° 713-GADPPz-2022 de Obra: "ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

B) DATOS GENERALES:

Código del proceso de contratación:	LICO-GADPPz-006-2022
Objeto del contrato:	"ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".
Monto del contrato:	\$ 4,650,521.23USD sin incluir IVA
07	07 de noviembre del 2022
Monto del anticipo:	-
Fecha de inicio de plazo:	25 de enero del 2023
Fecha de terminación contractual:	18 de julio de 2024
Contratista:	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A
Administrador de Contrato:	Ing. Eryka Silva M.

C) PLAZOS Y AVANCE

C.1 PLAZO DEL CONTRATO

Plazo total inicial: 540 días.



C.2 AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA DE LA PLANILLA

Fecha de aprobación:	
Días de ampliación aprobados:	
Motivación:	

C.3 PARALIZACIONES EN EL MES A PLANILLAR

Fecha de suspensión:	NINGUNA
Fecha de reinicio:	NINGUNA

C.4 REPROGRAMACIONES

No.	Fecha	Motivación
1	25 de enero 2023	Reprogramado a la fecha de inicio.
2		

C.5 CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

No.	Fecha de suscripción	Código de contrato	Monto	Motivación
1	NINGUNA		0.00	

D) DESARROLLO DEL PLANILLAJE

PLANILLA: MONTO LÍQUIDO A PAGAR: ANTICIPO DEVENGADO:

PLANILLA 1 \$ 135.466,45 USD
 REAJUSTE PROV. AVANCE 1 1.973,63 USB

TOTAL \$ 137.440,08 USD

MONTO DE AVANCE 1 ECONÓMICO TOTAL: \$ 135.466,45
 MONTO REAJUSTE PROV. AVANCE 1 1.973,63
 TOTAL ANTICIPO DEVENGADO:
 % DE AVANCE TOTAL: % **2,91**
 MULTA PLANILLA 1: \$ 0,00
 TOTAL MULTAS: \$ 0,00
 VALOR LÍQUIDO A PAGAR EN ESTA PLANILLA: \$ 137.440,08
 (VALOR TOTAL - MULTA - % DE ANTICIPO DEVENGADO)

E) ANÁLISIS DEL PERÍODO DE PLANILLAJE

E.1 ANÁLISIS DE PLANILLAJE

ÍTEM	PARÁMETRO DE CUMPLIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
A	Avance de obra de acuerdo al cronograma	X		
B	Retardo parcial en el período de la planilla		X	
C	Disposiciones del Administrador	X		
D	Disposiciones del Fiscalizador	X		
E	Cumplimiento de especificaciones técnicas	X		
F	Utilización de maquinaria ofertada	X		
G	Asistencia a las reuniones	X		
H	Asistencia del personal ofertado	X		



I	Obstaculización de trabajos a otros contratistas o al contratante		X	
J	Demora en la presentación de planillas a Fiscalización		x	
K	Normativa de Seguridad Industrial y Seguro Ocupacional	X		
L	Normativa de Manejo Ambiental	X		

E.2 ANÁLISIS DE MULTAS (del periodo planillado)

ÍTEM	DETALLE DEL OBJETO DE SANCIÓN	MONTO BASE PARA CÁLCULO	%	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	No. DE DÍAS	VALOR DE LA MULTA
A							
B							
C							
D							
TOTAL DE MULTAS EN ESTE PERÍODO DE PLANILLAJE:							

F) CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN

GARANTÍA DE BUEN USO DEL ANTICIPO	VIGENTE
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENTE
SEGURO SOCIAL	SI CUMPLE

En virtud del presente informe y en calidad de Administrador de Obra, **SE APRUEBA Y SE SOLICITA** se proceda con el pago de la **Planilla de Avance de Obra No.1**, con el siguiente detalle.

PORCENTAJE DE AVANCE PARCIAL EN ESTE PERÍODO	2,91 %
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	2,91 %
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE PLANILLA AVANCE 1	\$ 135.466,45
VALOR TOTAL DE REAJUSTE PROV. AVANCE 1	\$ 1.973,63
DEVENGACIÓN DEL ANTICIPO EN ESTE PERÍODO	-
DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTAS PARA ESTA PLANILLA	\$0.00
VALOR LIQUIDO A PAGAR:	\$ 137.440,08

SON: ciento treinta y siete mil cuatrocientos carenta 08/100 centavos de dólar.


TODAS LAS RETENCIONES TRIBUTARIAS SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL GADPPz.

Att,



Firmado electrónicamente por:
ERYKA MIREYA SILVA
MANZANO

Ing. Eryka Silva M.
ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2470-M

Puyo, 12 de septiembre de 2023

PARA: Sr. Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
Director de Fiscalizacion

ASUNTO: DEVOLCUION DE LA PLANILLA DE OBRA AVANCE 1 DEL PROYECTO:
"ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA ã
JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO,
CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA"

En respuesta al Documento No. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5607-M, adjunto la PLANILLA DE OBRA AVANCE 1 DEL PROYECTO: "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA" la misma que al realizar el control previo se encontró las siguiente observación.

1.- Por favor se requiere verificar el valor a pagar detallado en el Memorando 5137-M, con el valor de las planillas de avance y reajuste provisional.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
DIRECTORA FINANCIERA (E)

Referencias:

- GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5607-M

Anexos:

- memorando_nro._gadppz-unidad-vial-2023-7221-m.pdf
- check_list_tramites_de_pago_1-signed0884746001687466014.pdf
- check_list_tramites_de_pago_1-signed0403001001687465389.pdf
- 1.1.-acta_de_cumplimiento_de_parametros.pdf
- 42_oficio_planilla_de_avance_de_obra_no._01.pdf
- comprobantepago_plani_afi_jasper_(24)0734487001687464856.pdf
- comprobantepago_plani_afi_jasper_(25)0012366001687464857.pdf
- comprobantepago_plani_afi_jasper_(26)0249370001687464857.pdf
- of_correccion_de_planilla_1.pdf
- poliza_de_fiel_cumplimiento_renovada0934037001687464857.pdf
- rubro_3_.pdf
- 001-reajuste_de_precios_planilla_1.pdf
- anexo_21.pdf
- anexo_18.pdf
- anexo_17.pdf
- anexo_17_justificativo.pdf
- anexo_100579016001680534273.pdf
- anexo_07.pdf
- anexo_04.pdf

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCION DE FISCALIZACION



Pastaza

12 SEP 2023

Fecha:


Recibido:

JCHN

Número:

Hora:

08:31



Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2470-M

Puyo, 12 de septiembre de 2023

- anexo_04_justificativo.pdf
- anexo_04_justificativo_civil_3d.pdf
- anexo_43.pdf
- anexo_42.pdf
- anexo_41.pdf
- anexo_40.pdf
- anexo_39.pdf
- anexo_38.pdf
- anexo_37.pdf
- anexo_35.pdf
- anexo_36.pdf
- anexo_44.pdf
- anexo_planita_y_perfil_lamina_01.pdf
- memo_de_pago0468651001680534559.pdf
- anexo_planita_y_perfil_lamina_02.pdf
- cronograma_valorado_de_trabajos-signed_firmado-signed.pdf
- oficio_entrega_de_planilla_de_avance_de_obra_no_01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- planilla_de_avance_principal_n_01_firmado-signed-signed.pdf
- cambio_de_adm._asfalto_curaray-signed-signed-signed_(1).pdf
- 2_ acta_de_inicio_curaray-signed-signed-2-signed-signed_(2).pdf
- notificación_adm.pdf
- memorando_nro._gadppz-financiero-2023-2162-m.pdf
- anexo_22.pdf
- anexo_03.pdf
- informe_adm._obra_avance_1-signed.pdf
- 12_oficio_de_informe_cumplimiento_direccion_de_fiscalizacion.pdf
- 13_oficio_devolucion_de_planilla_de_avance_no_01.pdf
- 18_oficio_devolucion_dos_de_planilla_de_avance_no_01.pdf
- 19_oficio_entrega_de_planilla_de_avance_de_obra_no_01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- 20_oficio_entrega_de_planilla_de_fiscalizacion_no_01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- 21_oficio_entrega_tramite_permiso_ambiental_lico-gadppz-006-20220011566001680534156.pdf
- anexo_01.pdf
- anexo_02.pdf
- memorando_nro._gadppz-fiscalizacion-2023-5557-m.pdf
- check_list_tramites_de_pago_1-signed_plan_1_jatunpaccha-signed.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Ing. Mercy Johana Quishpi Cuenca - Contador 1



Firmado electrónicamente por:
**LIVIA MARILU
ORDONEZ PAREDES**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Compromiso No: 1107

Transacción No: 8092

Fecha: 08/09/2023

Proveedor: **AMAZONAS BUILDING S.A.**

Identificación: Ruc 1691710080001

Programa: 05 FUNCION SERVICIO CONECTIVIDAD VIALIDAD Y ENERGIA

SubPrograma: 01 MOVILIDAD CONECTIVIDAD Y ENERGIA

Proyecto: D505 CONSTRUCCION VIAL RURAL PROVINCIAL

Actividad: 505 CONSTRUCCION VIAS ASFALTADAS

DETALLE:

AMAZONAS BUILDING S.A.- ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

JOS.

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	234,724.33	361,100.03
Total =>	234,724.33	361,100.03



JOSE MAURICIO MARIN
MONTERO

TEC. JOSE MARIN
Analista De Presupuesto

R.U.C.: 1691710080001

FACTURA

No. 001-101-000000102

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0809202301169171008000120011010000001020000010211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

08/09/2023 17:08:17

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0809202301169171008000120011010000001020000010211

AMAZONBUILD SA 2023

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S A

Dirección Matriz:

BARRIO EL DORADO, AV TARQUI SN Y LOS LAURELES

Telf.:

E-mail: jinmarinm@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención RESOLUCION No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

RUC / CI: 1660000170001

Fecha Emisión: 08/09/2023

Dirección: FRANCISCO DE ORELLANA 739 Y 27 DE FEBRERO

Codigo	Descripción - Serie	Cant.	Unidad	P.Unitario	Desc.	Valor Total
\SVF-0001	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nº. 01	1.00		135,466.45	0.00	135,466.45
\SVF-0001	REAJUSTE (PROVISIONAL) PLANILLA 1	1.00		1,973.63	0.00	1,973.63

INFORMACION ADICIONAL:

Forma de pago: CREDITO 0 días

Vendedor: 00002 JENNY PUNINA

Observaciones: PLANILLA DE AVANCE Nº 1: ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO-CANTON PASTAZA, PROV. PASTAZ

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
20 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	153932.89	0	DIAS


SUBTOTAL:	137,440.08
TOTAL DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%:	137,440.08
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUB TOTAL No Objeto IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	137,440.08
IVA 12%:	16,492.81
VALOR TOTAL:	153,932.89

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA
CONTROL PREVIO**

"ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA"		OBRAS PÚBLICAS		FINANCIERO	
CONTRATISTA:	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A	TIPO DE PROCESO		TIPO DE PROCESO	
DOCUMENTO:	PAGO DE PLANILLA	CONTRATO	PLANILLA	CONTRATO	PLANILLA
CONCEPTO:	PLANILLA No. 1 DE AVANCE DE OBRA		X		
FECHA DEL DOCUMENTO:	22 de junio de 2023		X		
TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN LISTA CORTA-GADPPZ-004-2022		X		
VALOR LÍQUIDO PLANILLA + REAJUSTE (SIN IVA):	\$ 137,440.08	APLICA		APLICA	
CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS		SI	NO	SI	NO
1	Requerimiento				
2	Estudios del proyecto				
3	Informe técnico y económico				
4	Factibilidad Ambiental				
5	Certificación POA				
6	Certificación Presupuestaria				
7	Convenio				
8	Pliegos del Procedimiento				
9	Informe Técnico de Evaluación de Ofertas				
10	Resolución de Adjudicación				
11	Garantía Original de fiel Cumplimiento del contrato				
12	Garantía Original de Buen Uso del Anticipo				
13	Certificado de no Adeudar al GADPPz				
14	Documentos Personales / Representante Legal				
15	Certificación Bancaria				
16	Certificado de cumplimiento Tributario (SRI)	X			
17	RUC Actualizado	X			
18	Contrato original y disposición escrita de trabajo (proceso completo)	X			
	Planilla de Reajuste de precios del Anticipo		X		
19	Orden de Inicio de Trabajos	X		/	
20	Planilla de obra con informe de Fiscalización	X		/	
21	Anexos de Obra	X		/	
22	Cuadro de Diferencia de Cantidades		X		
23	Conformidad Ambiental	X		/	
24	Informe de avance de Obra de Administrador de contrato	X		/	
25	Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales (IESS) Planilla	X		/	
26	Certificado de no ser obra nueva		X		
27	Multa		X		
28	Autorización de la máxima Autoridad para prórroga de Plazos		X		
29	Autorización de la máxima Autoridad para Rubros Nuevos		X		
30	Certificado que no es obra nueva		X		
31	Solicitud de recepción de Obra		X		
32	Solicitud de pago del Administrador del Contrato	X		/	
33	Solicitud de pago del Director de la Unidad al Financiero	X		/	
34	Factura/Nota de Venta	X		/	
35	Validación de la factura/Nota de Venta				
36	Acta de repesion provisional				


OBSERVACIONES:

Revisado por:



Firmado electrónicamente por:
**ERYKA MIREYA SILVA
MANZANO**

ING. ERYKA SILVA M.
**ADMINISTRADOR DE LA OBRA
DEPARTAMENTO
SOLICITANTE DEL TRAMITE**



Firmado electrónicamente por:
**MERCY JOHANNA
QUISPE C UENCA**

**DEPARTAMENTO
FINANCIERO**

Fecha: **29 JUN 2023**
Recibido: *Pao Reg*
Número: **5607** Hora: **14h21**

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5607-M

Puyo, 29 de junio de 2023

PARA: Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
Directora Financiera (E)

ASUNTO: REINGRESO DE LA PLANILLA DE OBRA AVANCE 1 DEL PROYECTO:
"ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA a
JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO,
CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA"

En respuesta al Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2162-M, de fecha 09 de junio de 2023, se reingresa la Planilla de Avance N° 01 del proyecto: "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO", una vez que la ingeniera Eryka Silva - Subdirectora de Fiscalización (Administrador de Contrato), ha subsanado las observaciones emitidas por su dependencia.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
DIRECTOR DE FISCALIZACION

Referencias:
- GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5557-M

Anexos:

- anexo_03.pdf
- anexo_22.pdf
- anexo_02.pdf
- anexo_01.pdf
- 21_oficio_entrega_tramite_permiso_ambiental_lico-gadppz-006-20220011566001680534156.pdf
- 20_oficio_entrega_de_planilla_de_fiscalizacion_no_01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- 19_oficio_entrega_de_planilla_de_avance_de_obra_no_01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- 18_oficio_devolucion_dos_de_planilla_de_avance_no_01.pdf
- 13_oficio_devolucion_de_planilla_de_avance_no_01.pdf
- 12_oficio_de_informe_cumplimiento_direccion_de_fiscalizacion.pdf
- informe_adm_obra_avance_1-signed.pdf
- memorando_nro_gadppz-unidad-vial-2023-7221-m.pdf
- memorando_nro_gadppz-financiero-2023-2162-m.pdf
- notificación_adm.pdf
- 2_acta_de_inicio_curaray-signed-signed-2-signed-signed_(2).pdf
- cambio_de_adm_asfalto_curaray-signed-signed-signed_(1).pdf
- planilla_de_avance_principal_n_01_firmado-signed-signed.pdf
- oficio_entrega_de_planilla_de_avance_de_obra_no_01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- cronograma_valorado_de_trabajos-signed_firmado-signed.pdf
- anexo_planita_y_perfil_lamina_02.pdf
- memo_de_pago0468651001680534559.pdf
- anexo_planita_y_perfil_lamina_01.pdf

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL



Pastaza **29 JUN 2023**
Fecha:

Ejecutar el control previo y efectuar
La contabilización, conforme leyes y
Reglamentos vigentes

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL



Pastaza **29 JUN 2023**
Fecha:

Ejecutar el control previo al pago
Conforme leyes y reglamentos
Vigentes

1.757 = 2.405,20

Benef = 135,034,88



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5607-M

Puyo, 29 de junio de 2023

- anexo_44.pdf
- anexo_36.pdf
- anexo_35.pdf
- anexo_37.pdf
- anexo_38.pdf
- anexo_39.pdf
- anexo_40.pdf
- anexo_41.pdf
- anexo_42.pdf
- anexo_43.pdf
- anexo_04_justificativo_civil_3d.pdf
- anexo_04_justificativo.pdf
- anexo_04.pdf
- anexo_07.pdf
- anexo_100579016001680534273.pdf
- anexo_17_justificativo.pdf
- anexo_17.pdf
- anexo_18.pdf
- anexo_21.pdf
- 001-reajuste_de_precios_planilla_1.pdf
- rubro_3_.pdf
- poliza_de_fiel_cumplimiento_renovada0934037001687464857.pdf
- of._correccion_de_planilla_1.pdf
- comprobantepago_plani_afi_jasper_(26)0249370001687464857.pdf
- comprobantepago_plani_afi_jasper_(25)0012366001687464857.pdf
- comprobantepago_plani_afi_jasper_(24)0734487001687464856.pdf
- 42_oficio_planilla_de_avance_de_obra_no._01.pdf
- 1.1.-acta_de_cumplimiento_de_parametros.pdf
- check_list_tramites_de_pago_1-signed0403001001687465389.pdf
- check_list_tramites_de_pago_1-signed0884746001687466014.pdf
- memorando_nro._gadppz-fiscalizacion-2023-5557-m.pdf

Copia:

Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaria Ejecutiva 2 /**

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - Secretaria Ejecutiva 2



Firmado electrónicamente por:
**JAIR FERNANDO
LEDESMA BASTIDAS**

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5557-M

Puyo, 22 de junio de 2023

PARA: Sr. Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
Director de Fiscalización

ASUNTO: CORRECCIONES PLANILLA DE OBRA AVANCE 1: "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA â JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA"

En respuesta al Documento No. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2162-M, en donde se remiten las observaciones emitidas por la Dirección Financiera con respecto a la Planilla de Obra de Avance 1 del proyecto: "**ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO**".

Tengo a bien adjuntar las correcciones correspondientes:

1. Adjuntar el check list
2. Archivo digital en CD
3. Reajuste provisional de la planilla de Avance 1, con mayor número de decimales.
4. Acta de cumplimiento.
5. Certificado de cumplimiento del IESS.
6. Anexo de cálculo del rubro #3, en el cual se corrige la unidad.

Particular que comunico para continuar con el trámite correspondiente.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eryka Mireya Silva Manzano
SUBDIRECTOR DE FISCALIZACION

Referencias:

- GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5465-M

Anexos:

- anexo_03.pdf
- memorando_nro._gadppz-unidad-vial-2023-7221-m.pdf
- informe_adm._obra_avance_1-signed.pdf
- 12_oficio_de_informe_cumplimiento_direccion_de_fiscalizacion.pdf
- 13_oficio_devolucion_de_planilla_de_avance_no._01.pdf
- 18_oficio_devolucion_dos_de_planilla_de_avance_no._01.pdf
- 19_oficio_entrega_de_planilla_de_avance_de_obra_no._01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- 20_oficio_entrega_de_planilla_de_fiscalizacion_no._01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- 21_oficio_entrega_tramite_permiso_ambiental_lico-gadppz-006-20220011566001680534156.pdf
- anexo_01.pdf
- anexo_02.pdf



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5557-M

Puyo, 22 de junio de 2023

- anexo_22.pdf
- anexo_21.pdf
- anexo_18.pdf
- anexo_17.pdf
- anexo_17_justificativo.pdf
- anexo_100579016001680534273.pdf
- anexo_07.pdf
- anexo_04.pdf
- anexo_04_justificativo.pdf
- anexo_04_justificativo_civil_3d.pdf
- anexo_43.pdf
- anexo_42.pdf
- anexo_41.pdf
- anexo_40.pdf
- anexo_39.pdf
- anexo_38.pdf
- anexo_37.pdf
- anexo_35.pdf
- anexo_36.pdf
- anexo_44.pdf
- anexo_planita_y_perfil_lamina_01.pdf
- memo_de_pago0468651001680534559.pdf
- anexo_planita_y_perfil_lamina_02.pdf
- cronograma_valorado_de_trabajos-signed_firmado-signed.pdf
- oficio_entrega_de_planilla_de_avance_de_obra_no_01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- planilla_de_avance_principal_n_01_firmado-signed-signed.pdf
- cambio_de_adm._asfalto_curaray-signed-signed-signed_(1).pdf
- 2_acta_de_inicio_curaray-signed-signed-2-signed-signed_(2).pdf
- notificación_adm.pdf
- memorando_nro._gadppz-financiero-2023-2162-m.pdf
- 001-reajuste_de_precios_planilla_1.pdf
- 1.1.-acta_de_cumplimiento_de_parametros.pdf
- 42_oficio_planilla_de_avance_de_obra_no_01.pdf
- comprobantepago_plani_afi_jasper_(24)0734487001687464856.pdf
- comprobantepago_plani_afi_jasper_(25)0012366001687464857.pdf
- comprobantepago_plani_afi_jasper_(26)0249370001687464857.pdf
- of_correccion_de_planilla_1.pdf
- poliza_de_fiel_cumplimiento_renovada0934037001687464857.pdf
- rubro_3_.pdf
- check_list_tramites_de_pago_1-signed0403001001687465389.pdf



Firmado electrónicamente por:
**ERYKA MIREYA SILVA
MANZANO**

Puyo, 21 de junio del 2023

Ingeniera
Eryka Mireya Silva Manzano
Administrador de Contrato
Contrato LICO-GADPPz-006-2022
GAD Provincial de Pastaza
Presente. –

De mi consideración:

Mediante Contrato **LICO-GADPPz-006-2022** suscrito el 07 de noviembre del 2022, dentro del Proceso de **LCC-GADPPz-004-2022**, para la **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, entre la Compañía **AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.** y el **Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza**, con un **Anticipo del 0%**, por un monto de **USD \$ 4'650.521,23 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 23/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) SIN INCLUIR IVA**, y un **Plazo de 540 Días** contados a partir de la suscripción del **Acta de Inicio de Obra**.

En referencia al **Oficio 132 CABA/GADPPz**, de fecha 20 de junio del 2023, suscrito por el Señor **Odilo Vinicio Guevara Marín**. Esta fiscalización, una vez revisadas las correcciones solicitadas se aprueba este documento para continuar los trámites de aprobación permitentes y extiende la Planilla de Avance de Obra No. 01, del Periodo: 25 de enero al 28 de febrero del 2023.

Por la atención al presente le anticipo mis sinceros agradecimientos.

Sin otro particular por el momento, me despido.

Atentamente,



Plomado electrónicamente por:
JESSICA MARTELIA
JARAMILLO
ARMIJOS

KEYSZEN S.A.S
INGENIERIA & CONSTRUCCION
Machala - El Oro - Ecuador



Ing. Jessica Jaramillo
C.C. 0704239128
Gerente General
KEYSZEN S.A.S.
RUC 0791840462001

CC. CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03
Oficina 072 785 269
keyszen.sas@gmail.com
www.keyszen.com
Machala – El oro - Ecuador

Recibido
22/06/2023
[Signature]



AMAZONAS BUILDING S.A.

Puyo - Pastaza - Ecuador

Oficio, 132 CABA/GADPPz

Puyo, 20 de junio de 2023

Ingeniera

Jessica Mariela Jaramillo Armijos

FISCALIZADOR EXTERNO KEYSZEN S.A.S.

Presente. -

De mi consideración:

Con respecto al contrato "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", del particular debo manifestar lo siguiente:

- Adjunto se servirá encontrar la planilla de avance número 01, con los respectivos anexos y sustentos de justificación para que proceda con su revisión y autorización correspondiente, conforme lo señalado en CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO. - La forma de pago se realizará por planilla de avance mensual, una vez realizadas las correcciones solicitadas en comunicación KEYSOFICIO-039-2023 de fecha 16 de junio/2023.

Particular que comunico a ustedes para los fines legales correspondientes.

Atentamente,

Recibido
20-06-2023




ODILO VINICIO
GUEVARA MARIN

Sr. Odilo Guevara

CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

GERENTE



AMAZONAS BUILDING S.A.



EMPRESAS BUILDING AMAZONAS BUILDING S.A.
PROYECTO: "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY -
HASTA EL JATUNPACCHA, HASTA EL
FRANCISCO DE ORELLANA - EL TRIUNFO, CANTÓN
PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",
KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO",
PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

PLANTILLA DE AVANCE No. 1
28 DE FEBRERO DE 2023

PERIODO: 25 DE ENERO A
CORRAJISTAS: Amazonas Building S.A.
FISCALIZADOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
BOGOTÁ - COLOMBIA

BOGOTÁ - COLOMBIA
CORRAJISTAS: Amazonas Building S.A.
FISCALIZADOR: XXXXXXXXXXXXXXXX
BOGOTÁ - COLOMBIA



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA



REAJUSTE (PROVISIONAL) PLANILLA 1

PROYECTO: ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA 10 DE AGOSTO-CANTON PASTAZA-PROVINCIA DE PASTAZA

CONTRATISTA: CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

ANEXO: REAJUSTE (PROVISIONAL) PLANILLA 1

FECHA: 02/03/2023 POR: \$ 1,973.63

NOTA:

FORMULA POLINOMICA DE REAJUSTE

Pr=Po(0.143 B1/Bp + 0.072 C1/Cp + 0.034 COM1/COMo + 0.372 E1/Eo + 0.128 F1/Fo + 0.002 H1/Ho + 0.057 M1/Mo + 0.147 P1/Po + 0.023 T1/To + 0.022 X1/Xo)

CUADRILLA TIPO

Table with columns: DESCRIPCION, COEFICIENTE, JORNAL T.D, TOTAL, PLANILLA # 1 (nov-22, feb-23). Rows include OPERADOR EQUIPO PESADO C1, OPERADOR EQUIPO PESADO C2, SIN TITULO D2, ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3, etc.

Table with columns: DESCRIPCION, SIMBOLO, COEFICIENTE E (a), PRECIO O INDICE (b), PRECIO (I) INDICE (c), RELACION d=(c/b), TERMINO e=d*a, OBSERVACIONES. Rows include MANO DE OBRA, CEMENTO PORTLAND-SACOS, COMBUSTIBLES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCC. VIAL, etc.

Summary table with columns: VALOR DE PLANILLA (\$ 135,466.45), VALOR A REAJUSTE (Po) (\$ 135,466.45), VALOR REAJUSTADO (Pr=Po*f) (\$ 137,440.08), VALOR DE REAJUSTE PRECIOS (Pr-Po) (\$ 1,973.63).

FECHA DE CIERRE DE OFERTAS: FECHA DE REAJUSTE REAJUSTE: 1.01456915 OBSERVACIONES: Sub-indices nov-22 Sub-indices feb-23

A FAVOR DEL CONTRATISTA SON: MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES DÓLARES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

QR code and signature of JESSICA MARIELA JARAMILLO ARMIJOS, FISCALIZADOR EXTERNO.

QR code and signature of ERYKA MIREYA SILVA MANZANO, ADMINISTRADOR GADPPz.

QR code and signature of ODILIO VINICIO GUEVARA MARIN.

CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. CONTRATISTA

ACTA DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS DE PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO "ASFALTO DE LA VÍA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

En la ciudad de Puyo a los veintiocho días del mes de diciembre del 2022, comparecen en calidad de contratista AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S. A., representado legalmente por el Sr. Odilo Guevara Marín; Ing. Eryka Silva M. en calidad de Administradora de contrato con la finalidad de suscribir el Acta de Cumplimiento de Parámetros del Personal Técnico Mínimo y Equipo Mínimo requerido en la etapa precontractual de la obra antes mencionada; y así dar cumplimiento a lo determinado en la resolución Nro. RE-SERCOP-2019-0000100.

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO POR LA ENTIDAD

CANTIDAD	FUNCIÓN	NIVEL DE ESTUDIO	TITULACIÓN ACADÉMICA	EXPERIENCIA	PARTICIPACIÓN
1	SUPERINTENDENTE DE OBRA	TERCER NIVEL CON TÍTULO	INGENIERO/A CIVIL	7 AÑOS	100%
1	RESIDENTE DE OBRA 1	TERCER NIVEL CON TÍTULO	INGENIERO/A CIVIL CON LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN REGISTRADO EN EL SENESCYT	5 AÑOS	100%
1	RESIDENTE DE OBRA 2	TERCER NIVEL CON TÍTULO	INGENIERO/A CIVIL CON LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN REGISTRADO EN EL SENESCYT	5 AÑOS	100%
1	TÉCNICO AMBIENTAL	TERCER NIVEL CON TÍTULO	INGENIERO/A AMBIENTAL O A FIN, CON LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN,	3 AÑOS	50%
1	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	TERCER NIVEL CON TÍTULO	INGENIERO/A INDUSTRIAL O A FIN, ESPECIALIZADO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	2 AÑOS	50%
1	TOPOGRAFO	TERCER NIVEL CON TÍTULO	TOPOGRAF O/A INGENIERO CIVIL	1 AÑO	100%

PERSONAL MÍNIMO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA

FUNCIÓN	NOMBRE	AÑO DE TITULACIÓN ACADÉMICA	EXPERIENCIA	COMPROMISO
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. MARCO VINCENZO TAMAYO MEJIA	2002	1.- SUPERINTENDENTE DE OBRA CON EL CONSORCIO OMEGA, EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL-PLANTA DE TRATAMIENTO – ASFALTO- DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, SUB SISTEMA DE RÍO PUYO", \$ 5'152,543.30 USD	100%
RESIDENTE DE OBRA 1	ING. JONATHAN RODOLFO TORRES TAMAYO	2005	1.- RESIDENTE DE OBRA DEL PROYECTO" ASFALTADO CAMINO VECINAL KM. 14 VÍA PUYO-SAN RAMON KM. 31 VÍA AL TENA, CANTÓN SANTA CLARA Y PASTAZA \$ 3'767,743.28 USD	100%
RESIDENTE DE OBRA 2	ING. LUIS OCTAVIO	2010	1.- RESIDENTE DE OBRA DEL PROYECTO" ASFALTADO Y ADOQUINADO DE LA VÍA CHUCCHUPUNGO LA ESPERANZA ZULETA,	100%

	TIBANTA GUAMÁN		LIMITE PROVINCIAL CO PICHINCHA, CANTÓN IBARRA, LONGITUD 15.54KM \$ 4'590,355.59 USD	
TÉCNICO AMBIENTAL	ING. EDGAR RAÚL GASPATA CALO	2006	RESIDENTE AMBIENTAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TERMAS DE LA VIRGEN, UBICADO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA, OBRA CONTRATADA CON LA CONSTRUCTORA AMAZONAS BUILDING S. A. MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BAÑOS DE AGUA SANTA Y LA FISCALIZACIÓN A CARGO DEL ING. DANNY DURÁN CABERA \$ 1'150,232.93 USD	50%
TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	ING. WASHINGTON EDUARDO LASCANO COELLO	2018	ASFALTADO DEL CAMINO VECINAL TARQUI-SAN JACINTO – LOS ANGELES CON SUS RAMALES HUAGRAYACU Y CHINGUSHIMI \$ 1'344,013.54 USD	50%
TOPOGRAFO	ING. DANIELA ANALLA GOMEZ ZAMBRANO	2007	ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA \$ 1'344,013.54 USD	100%

EQUIPO E INSTRUMENTOS DISPONIBLES REQUERIDO POR LA ENTIDAD

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS
1	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	POTENCIA MÍNIMA 148 HP
2	MOTO NIVELADORA	1	CAPACIDAD MÍNIMA 140 HP
3	CAMIÓN CISTERNA	1	CAPACIDAD MÍNIMA 2000 GALONES
4	VOLQUETES	5	CAPACIDAD MÍNIMA 10M3
5	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	CAPACIDAD MÍNIMA 1000 GALONES
6	PLANTA DE ASFALTO	1	110 T/H 150 HP MÍNIMA
7	TERMINADORA DE ASFALTO	1	60 HP POTENCIA MÍNIMA
8	RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	80 HP POTENCIA MÍNIMA
9	RODILLO VIBRATORIO LISO	1	125 HP POTENCIA MÍNIMA
10	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	28 HP POTENCIA MÍNIMA
11	CONCRETERA 1 SACO	2	CAPACIDAD MÍNIMA 1 SACO
12	MINICARGADORA	1	54 HP POTENCIA MÍNIMA
13	APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	SISTEMA GPS-GNSS, ESTACION TOTAL

EQUIPO E INSTRUMENTOS DISPONIBLES PROPUESTO POR EL CONTRATISTA

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PROPIETARIO	CARACTERÍSTICAS	PLACA / FACTURA / MATRICULA
1	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	1	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.	POTENCIA 148 HP	7.1-16-000150
	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	1	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.	POTENCIA 148 HP	7.1-16-000149



	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	1	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.	POTENCIA 148 HP	7.1-16-000006
2	MOTO NIVELADORA	1	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.	POTENCIA 140 HP	6.0-16-000004
3	CAMIÓN CISTERNA.	1	COMPROMISO DE VENTA Y DISPONIBILIDAD PARA AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. POR PARTE DE VEHICENTRO S.A.	CAPACIDAD 2000 GALONES	SN
4	VOLQUETE	1	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.	CAPACIDAD 12 M3	SBD0253
	VOLQUETE	1	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.	CAPACIDAD 12 M3	VBA1052
	VOLQUETE	1	COMPROMISO DE VENTA Y DISPONIBILIDAD PARA AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. POR PARTE DE VEHICENTRO S.A.	CAPACIDAD 20 M3	SN
	VOLQUETE	1	COMPROMISO DE VENTA Y DISPONIBILIDAD PARA AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. POR PARTE DE VEHICENTRO S.A.	CAPACIDAD 20 M3	SN
5	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	COMPROMISO DE VENTA Y DISPONIBILIDAD PARA AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. POR PARTE DE VEHICENTRO S.A.	CAPACIDAD 1500 GALONES	SN
6	PLANTA ASFALTICA	1	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A	MODELO Y POTENCIA 110 SPL Y 150 IIP	15.0-17230
7	TERMINADORA DE ASFALTO (FINISHER)	1	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A	60 HP DE POTENCIA	16.0-14-000411

8	RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A	99 HP POTENCIA	001-001-000122989
9	RODILLO TANDEM VIBRATORIO LISO	1	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A	125 HP POTENCIA	8.1-16000005
10	RODILLO VIBRATORIO NEUMATICO	1	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A	28 HP POTENCIA	8.6-14-000410
11	CONCRETERA 1 SACO	1	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A	CONCRETERA DE UN SACO	0032728
	CONCRETERA 1 SACO	1	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A	CONCRETERA DE UN SACO	0000128
12	MINICARGADORA	1	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A	54 HP POTENCIA	4.5-18-000625
13	GPS	1	FACTURA AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A	MARCA SOUTH	001-002-000000095
	ESTACIÓN TOTAL	1	FACTURA AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A	MARCA SOUTH	001-002-000000095

De la documentación presentada por el contratista se puede verificar que cumple con lo determinado en la sección **4.1.2 Equipo mínimo** y **4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico** de los pliegos determinados para el presente proceso; así como también lo dispuesto en los numerales **4.1.6 Metodología y Cronograma de ejecución**; para constancia se firma tres ejemplares.



ODILO VINICIO GUEVARA MARIN

Sr. Odilo Guevara

REPRESENTANTE LEGAL DE AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S. A.



JAIME ANDRES SILVA CORDOVA

Ing. Jaime Silva

FISCALIZADOR TEMPORAL GADPPz



ERYKA MIREYA SILVA MANZANO

Ing. Eryka Silva M.

ADMINISTRADOR DE CONTRATO



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

marzo 06 del 2023 09:05

GUEVARA MARIN ODILO VINICIO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2023-02-14))

(BANCO GUAYAQUIL S.A.)

No. Comprobante: 000000166624247

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2023-02-07
No. RUC / REGISTRO:	1601710080001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2023-02-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. - AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.			
Periodo de Pago:	2023 - 01			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2023 - 1	06	1720483609	ACERO UMAQUINGA JUAN ISAAC	521.45	30	NNA	107.42	0.00
2023 - 1	06	1312506288	AMAGUAY CEDEÑO JOSE ALFREDO	691.69	30	NNA	142.49	0.00
2023 - 1	06	1600354383	BRAVO CHANGO NUBIA TATHIANA	458.36	30	NNA	94.42	0.00
2023 - 1	06	0503530610	CHASIPANTA CHASIPANTA JOSE AUGUSTO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 1	06	0503774580	CHASIPANTA CHASIPANTA JOSE PEDRO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 1	06	1600459331	GOMEZ BARROSO DAVID ALEJANDRO	451.92	26	NNA	93.10	0.00
2023 - 1	06	0604954677	GUACHO AUQUILLA JUAN CARLOS	90.00	6	NNA	18.54	0.00
2023 - 1	06	0603907080	GUAMAN CASTILLO GEREMIAS JOSE	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 1	06	1600257404	HERAS PINEDA VERONICA ANDREA	465.87	30	NNA	95.97	0.00
2023 - 1	06	0922862834	IBARRA RIVERA JHESLY SARAY	494.67	30	NNA	101.90	0.00
2023 - 1	06	1600342222	JACOME RODRIGUEZ EDWIN HUGO	691.69	30	NNA	142.49	0.00
2023 - 1	06	1600267494	JACOME RODRIGUEZ JENNY BEATRIZ	494.67	30	NNA	101.90	0.00
2023 - 1	06	1600571760	MARIN JACOME JENNYFER BRITHNEY	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 1	06	1600496770	MARIN JACOME KENYA MERYJOSEPH	450.04	30	NNA	92.71	0.00
2023 - 1	06	1600296717	MARIN MONTERO KLEVER JINSOP	680.00	30	NNA	140.08	0.00
2023 - 1	06	1600695876	MARIN PEREZ JOSE ALEXANDER	450.04	30	NNA	92.71	0.00
2023 - 1	06	1600695866	MARIN PEREZ KRISLEY KRIMINA	458.72	30	NNA	94.50	0.00
2023 - 1	06	0601716327	MIRANDA AMBI EDGAR JUVENAL	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 1	06	1600439804	MONTERO ESPINOSA KATTY JESSENIA	450.04	30	NNA	92.71	0.00
2023 - 1	06	1004325641	SOTAMINGA BELTRAN PATRICIO BOLIVAR	451.92	26	NNA	93.10	0.00
2023 - 1	06	0604593434	TAMAY GUAMAN LUIS GERARDO	521.45	30	NNA	107.42	0.00
2023 - 1	06	1600177461	TAPUY TAPUY CESAR LUIS	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 1	06	0500865159	UGSHA VEGA JOSE GREGORIO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
				10972.53			2260.36	0.00

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

	Valor	2370.09
	Intereses por mora (+)	0.00
	Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
	Honorarios Abogado (+)	0.00
	Gastos Administrativos (+)	0.00
	Subtotal (=)	2370.09
	Notas de Crédito (-)	0.00
	Total (=)	2370.09

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Quando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

En cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.





COMPROBANTE DE TRANSACCION

COMPROBANTE DE PAGO ICSS - 0000000166624247 •

Cuenta/RUC : 1691710080001 AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
Codigo/Rubro : PLANI - PAGO DE PLANILLAS
Periodo : 2023-01 Secuencia: 202302140030471
Monto : 2,370.09
Retención : 0.00
Efectivo : 2,370.66
Pagado : 2,370.66 100.00%

JM4 29791 2023-02-14 12:32:25

Si realiza el pago a partir de las 17:00, se registrará 202302140030471 190000427630493 1 en la recaudación del sgte. día hábil.

Consulte su Comp.Venta o Retención en WWW.BANCOGUAYAQUIL.COM con el No. 54689



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

marzo 15 del 2023 13:16

GUEVARA MARIN ODILO VINICIO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(DEPOSITADO)

(BANCO GUAYAQUIL S.A.)

No. Comprobante: 0000000167593605

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2023-03-06
No. RUC / REGISTRO:	1691710080001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2023-03-15
Nombre / Razón Social / Organización:	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. - AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.		
Periodo de Pago:	2023 - 02		
Forma de pago:	Fondos propios		
Reservación:			

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2023 - 2	06	1720483609	ACERO UMAQUINGA JUAN ISAAC	633.75	30	NNA	130.55	0.00	
2023 - 2	06	1312506288	AMAGUAY CEDEÑO JOSE ALFREDO	691.69	30	NNA	142.49	0.00	
2023 - 2	06	1600354383	BRAVO CHANGO NUBIA TATHIANA	510.35	30	NNA	105.13	0.00	
2023 - 2	06	0503530610	CHASIPANTA CHASIPANTA JOSE AUGUSTO	724.58	30	NNA	149.26	0.00	
2023 - 2	06	0503774580	CHASIPANTA CHASIPANTA JOSE PEDRO	560.00	30	NNA	115.36	0.00	
2023 - 2	06	1600459331	GOMEZ BARROSO DAVID ALEJANDRO	191.20	11	NNA	39.39	0.00	
2023 - 2	06	0603907080	GUAMAN CASTILLO GEREMIAS JOSE	590.79	30	NNA	121.70	0.00	
2023 - 2	06	1600257404	HERAS PINEDA VERONICA ANDREA	232.94	15	NNA	47.99	0.00	
2023 - 2	06	0322882834	IBARRA RIVERA JHESLY SARAY	634.40	30	NNA	130.69	0.00	
2023 - 2	06	1600342222	JACOME RODRIGUEZ EDWIN HUGO	691.69	30	NNA	142.49	0.00	
2023 - 2	06	1600267494	JACOME RODRIGUEZ JENNY BEATRIZ	924.09	30	NNA	190.36	0.00	
2023 - 2	06	1600671760	MARIN JACOME JENNYFER BRITHNEY	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2023 - 2	06	1600496770	MARIN JACOME KENYA MERYJOSEPH	450.04	30	NNA	92.71	0.00	
2023 - 2	06	1600296717	MARIN MONTERO KLEVER JINSOP	982.19	30	NNA	202.33	0.00	
2023 - 2	06	1600695876	MARIN PEREZ JOSE ALEXANDER	450.04	30	NNA	92.71	0.00	
2023 - 2	06	1600695868	MARIN PEREZ KRISLEY ARIANNA	458.72	30	NNA	94.50	0.00	
2023 - 2	06	0601716327	MIRANDA AMBI EDGAR JUVENAL	560.00	30	NNA	115.36	0.00	
2023 - 2	06	1600439804	MONTERO ESPINOSA KATTY JESSENIA	450.04	30	NNA	92.71	0.00	
2023 - 2	06	1004325641	SOTAMINGA BELTRAN PATRICIO BOLIVAR	1195.71	30	NNA	246.32	0.00	
2023 - 2	06	0604593434	TAMAY GUAMAN LUIS GERARDO	330.25	19	NNA	68.03	0.00	
2023 - 2	06	1600177461	TAPUY TAPUY CESAR LUIS	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2023 - 2	06	0500865159	UGSHA VEGA JOSE GREGORIO	560.00	30	NNA	115.36	0.00	
							12722.47	2620.84	0.00

	---ora (+)	
	Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
	Honorarios Abogado (+)	0.00
	Gastos Administrativos (+)	0.00
	Subtotal (=)	2748.07
	Notas de Crédito (-)	0.00
		2748.07

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmege

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



COMPROBANTE DE TRANSACCION

COMPROBANTE DE PAGO IESS - 0000000167593605

Cedula/RUC : 1691710080001 AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
Codigo/Rubro : PLANI - PAGO DE PLANILLAS
Periodo : 2023-02 Secuencia: 202303150013231
Valor : 2,748.07
Comisión : 0.57
Efectivo : 2,748.64
T.Pagado : 2,748.64 100.00%

NPK D9V41 2023-03-15 10:32:33

Si realiza el pago a partir de las 17H00, se registrará 202303150013231 190000430012531 I
en la recaudación del sgte. día hábil.

Consulte su Comp.Venta o Retencion en WWW.BANCOGUAYAQUIL.COM con el No. 54689

Este comprobante es el único documento que admite validez como comprobación de verificación de información

REV. 10.19 - 000 110005



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

abril 07 del 2023 12:35

GUEVARA MARIN ODILO VINICIO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000168931917

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2023-04-04
No. RUC / REGISTRO:	1691710080001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2023-04-17	
Nombre / Razón Social / Organización:	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. - AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.			
Periodo de Pago:	2023 - 03			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:	Ticket#2023040671002367			

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEBILA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2023 - 3	06	1720483609	ACERO UMAQUINGA JUAN ISAAC	521.45	30	NNA	107.42	0.00
2023 - 3	06	1600786873	AMAGUAY CEDEÑO CARLOS ALEXANDER	492.69	30	NNA	101.49	0.00
2023 - 3	06	1312506288	AMAGUAY CEDEÑO JOSE ALFREDO	691.69	30	NNA	142.49	0.00
2023 - 3	06	1600354383	BRAVO CHANGO NUBIA TATHIANA	198.82	13	NNA	40.92	0.00
2023 - 3	06	0503530610	CHASIPANTA CHASIPANTA JOSE AUGUSTO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 3	06	0503774580	CHASIPANTA CHASIPANTA JOSE PEDRO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 3	06	1600203267	GREFA CHIMBO AURELIO	450.04	30	NNA	92.71	0.00
2023 - 3	06	0603907080	GUAMAN CASTILLO GEREMIAS JOSE	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 3	06	0922862834	IBARRA RIVERA JHESLY SARAY	346.27	21	NNA	71.33	0.00
2023 - 3	06	1600342222	JACOME RODRIGUEZ EDWIN HUGO	691.69	30	NNA	142.49	0.00
2023 - 3	06	1600267494	JACOME RODRIGUEZ JENNY BEATRIZ	494.67	30	NNA	101.90	0.00
2023 - 3	06	1600671760	MARIN JACOME JENNYFER BRITHNEY	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 3	06	1600496770	MARIN JACOME KENYA MERYJOSEPH	450.04	30	NNA	92.71	0.00
2023 - 3	06	1600296717	MARIN MONTERO KLEVER JINSOP	680.00	30	NNA	140.08	0.00
2023 - 3	06	1600695876	MARIN PEREZ JOSE ALEXANDER	450.04	30	NNA	92.71	0.00
2023 - 3	06	1600695868	MARIN PEREZ KRISLEY ARIANNA	458.72	30	NNA	94.50	0.00
2023 - 3	06	0601716327	MIRANDA AMBI EDGAR JUVENAL	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 3	06	1600439804	MONTERO ESPINOSA KATTY JESSENIA	450.04	30	NNA	92.71	0.00
2023 - 3	06	1600573032	MUÑOZ VELASTEGUI CARLOS VICENTE	494.67	30	NNA	101.90	0.00
2023 - 3	06	1600724809	PUNINA CAIZAGUANO JENNY MARITZA	450.04	30	NNA	92.71	0.00
2023 - 3	06	1004325641	SOTAMINGA BELTRAN PATRICIO BOLIVAR	521.45	30	NNA	107.42	0.00
2023 - 3	06	1600177461	TAPUY TAPUY CESAR LUIS	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 3	06	0500866159	UGSHA VEGA JOSE GREGORIO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
				10992.12			2264.39	0.00

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

Valor	2374.32
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	2374.32
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	2374.32

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrado, Coopmego

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Imprimir

Conf Impresora

Servipagos - PagoAgil

TESS RECAUDACION EN LINEA
 OFICINA: CANAL WEB COOP CREA
 CAJA: AGENCIA RUYO
 DIRECCION: AV. SIMON BOLIVAR Y VIA A NAYON
 CAJERO: ZAMBRANO BASTIDAS KEYLA ESTEFANNY
 FECHA: 2023-04-11 10:02:37
 CODIGO: 000000166031917

Identificación: 0000000001
 Razón Social: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
 No. Comprobante: 000000166031917
 Tipo de Comprobante: PLANI
 Período: 202303
 Monto Comprobante: \$2374.32
 Fecha: 2023-04-11 10:02:37
 Efectivo: \$ 2374.32
 Comisión: \$ 0.57
 Total: \$ 2374.89

*** ORIGINAL - CLIENTE ***
 *** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA
 Factura N°: 001-041-000244825
 Matriz: AV. SIMON BOLIVAR Y VIA A NAYON
 Clave de acceso: 1104202301179139824600120 0104100024482511100
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: NORMAL
 Ruc: 1791398246001
 Contribuyente: Contrib Esp Resol. No. 00155

COMISION POR SERVICIOS
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 Ruc Cliente: 9999999999999
 Oficina: CANAL WEB COOP CREA
 Cajero: ZAMBRANO BASTIDAS KEYLA ESTEFANNY
 Fecha Transacción: 2023-04-11 10:02:37
 Comisión: \$ 0.51
 Iva 12 %: \$ 0.26
 Comisión Total: \$ 0.77

LA FACTURA SERÁ EL ÚNICO COMPROBANTE VALIDO PARA EFECTUAR CUA RECLAMO

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

Imprimir

Conf Impresora

Servipagos - PagoAgil

TESS RECAUDACION EN LINEA
 OFICINA: CANAL WEB COOP CREA
 CAJA: AGENCIA RUYO
 DIRECCION: AV. SIMON BOLIVAR Y VIA A NAYON
 CAJERO: ZAMBRANO BASTIDAS KEYLA ESTEFANNY
 FECHA: 2023-04-11 10:02:37
 CODIGO: 000000166031917

Identificación: 0000000001
 Razón Social: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
 No. Comprobante: 000000166031917
 Tipo de Comprobante: PLANI
 Período: 202303
 Monto Comprobante: \$2374.32
 Fecha: 2023-04-11 10:02:37
 Efectivo: \$ 2374.32
 Comisión: \$ 0.57
 Total: \$ 2374.89

*** ORIGINAL - CLIENTE ***
 *** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA
 Factura N°: 001-041-000244825
 Matriz: AV. SIMON BOLIVAR Y VIA A NAYON
 Clave de acceso: 1104202301179139824600120 0104100024482511100
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: NORMAL
 Ruc: 1791398246001
 Contribuyente: Contrib Esp Resol. No. 00155

COMISION POR SERVICIOS
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 Ruc Cliente: 9999999999999
 Oficina: CANAL WEB COOP CREA
 Cajero: ZAMBRANO BASTIDAS KEYLA ESTEFANNY
 Fecha Transacción: 2023-04-11 10:02:37
 Comisión: \$ 0.51
 Iva 12 %: \$ 0.06
 Comisión Total: \$ 0.57

LA FACTURA SERÁ EL ÚNICO COMPROBANTE VALIDO PARA EFECTUAR CUA RECLAMO

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Junio 06 del 2023 09:55

GUEVARA MARIN ODILO VINICIO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2023-05-09))

(BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO)

No. Comprobante: 000000170126933

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES.

Emitido en: 2023-05-08

No. RUC / REGISTRO: 1591710080001 - 0001

Fecha de Vigencia de Pago: 2023-05-15

Nombre / Razón Social / Organización: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. - AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Periodo de Pago: 2023 - 04

Forma de pago: Fondos propios

Observación:

AFILIADOS

PERIODO	RT	CIEBOLA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2023 - 4	06	1720483609	ACERO UMAQUINGA JUAN ISAAC	521.45	30	NNA	107.42	0.00	
2023 - 4	06	1590786873	AMAGUAY CEDEÑO CARLOS ALEXANDER	492.69	30	NNA	101.49	0.00	
2023 - 4	06	1312506288	AMAGUAY CEDEÑO JOSE ALFREDO	691.69	30	NNA	142.49	0.00	
2023 - 4	06	0503530810	CHASIPANTA CHASIPANTA JOSE AUGUSTO	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2023 - 4	06	0503774580	CHASIPANTA CHASIPANTA JOSE PEDRO	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2023 - 4	06	1600203267	GREFA CHIMBO AURELIO	450.04	30	NNA	92.71	0.00	
2023 - 4	06	0603907080	GUAMAN CASTILLO GEREMIAS JOSE	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2023 - 4	06	1600342222	JACOME RODRIGUEZ EDWIN HUGO	691.69	30	NNA	142.49	0.00	
2023 - 4	06	1600267494	JACOME RODRIGUEZ JENNY BEATRIZ	494.67	30	NNA	101.90	0.00	
2023 - 4	06	1600671760	MARIN JACOME JENNYFER BRITHNEY	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2023 - 4	06	1600496770	MARIN JACOME KENYA MERY JOSEPH	450.04	30	NNA	92.71	0.00	
2023 - 4	06	1600296717	MARIN MONTERO KLEVER JINSOP	680.00	30	NNA	140.08	0.00	
2023 - 4	06	1600695876	MARIN PEREZ JOSE ALEXANDER	450.04	30	NNA	92.71	0.00	
2023 - 4	06	1600695868	MARIN PEREZ KRISLEY ARIANNA	458.72	30	NNA	94.50	0.00	
2023 - 4	06	2100210505	MESTANZA LEON JORGE DAVID	691.69	30	NNA	142.49	0.00	
2023 - 4	06	0601716327	MIRANDA AMBI EDGAR JUVENAL	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2023 - 4	06	1600439804	MONTERO ESPINOSA KATTY JESSENIA	450.04	30	NNA	92.71	0.00	
2023 - 4	06	1600573032	MUNOZ VELASTEGUI CARLOS VICENTE	494.67	30	NNA	101.90	0.00	
2023 - 4	06	1600724809	PUNINA CAIZAGUANO JENNY MARITZA	450.04	30	NNA	92.71	0.00	
2023 - 4	06	1004325641	SOTAMINGA BELTRAN PATRICIO BOLIVAR	521.45	30	NNA	107.42	0.00	
2023 - 4	06	1600177461	TAPUY TAPUY CESAR LUIS	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2023 - 4	06	0500865159	UGSHA VEGA JOSE GREGORIO	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
							11138.92	2294.63	0.00

-or mora (+)	
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	2406.03
Notas de Crédito (-)	0.00
	2406.03

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmege

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Imprimir

Conf Impresora

Servipagos - Pago Agil

OPICINA: IESS RECAUDACION EN LINEA
CAJA: CANAL WEB COOP CREA
DIRECCION: AGENCIA PUNO
CAJERO: AV SIMON BOLIVAR Y VIA A TAYON
FECHA: ZAMBRANO BASTIDAS KEYLA ESTEFANNI
CODIGO: 2023-05-09 15:17:21
CODIGO: 0290092044

Identificacion: 1491710080001
Razon Social: AMAZONAS BUILDING AMAZONVILLE S.A.
No. Comprobante: 01000001170116953
Tipo de Comprobante: PLANI
Periodo: 202304
Monte Comprobante: \$2406.03

Fecha: 2023-05-09 15:17:21
Efectivo: \$ 2406.03
Comision: \$ 0.57
Total: \$ 2406.60

*** ORIGINAL - CLIENTE ***
 *** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

Factura N°: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA
Matriz: 001-041-000260409
Clave de acceso: AV SIMON BOLIVAR Y VIA A TAYON
Ambiente: 0905202301179139924600120 0104100026040909151
Emision: PRODUCCION
Ruc: NORMAL
Control/hoja/ente: 1791399246001
Control Esp Resol No: 06155

Forma de Pago: COMISION POR SERVICIOS
Cliente: EFECTIVO
Ruc Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 9999999999999999

Oficina: CANAL WEB COOP CREA
Cajero: ZAMBRANO BASTIDAS KEYLA ESTEFANNI
Fecha Transaccion: 2023-05-09 15:17:21

Comision: \$ 0.51
Iva 12 %: \$ 0.06
Comision Total: \$ 0.57

LA FACTURA SERA EL UNICO COMPROBANTE VALIDO PARA EFECTUAR CUA
 RECLAMO
 *** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA**



ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO

PROYECTO: ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

CONTRATISTA: CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

PLANILLA N°: 1 **N° RUBRO:** 3

PERIODO: 25-ene-23 - 28-feb-23 **UNIDAD:** m

Remocion de alcantarillas

DESCRIPCIÓN	ELEMENTO	LONGITUD	OBSERVACIONES
		L (m)	
Abs. 0+120.00	Tubería de acero corrugado D= 0.80 m	12.00	Diametro= 0,80 m
Abs. 0+440.00	Tubería de acero corrugado D= 1.20 m	14.00	Diametro= 1,20 m
Abs. 0+620.00	Tubería de acero corrugado D= 1,20 m	12.00	Diametro= 1,20 m
Abs. 0+780.00	Tubería de acero corrugado D= 1.20 m	12.00	Diametro= 1,20 m
Abs. 1+480.00	Tubería de acero corrugado D=0.80 m	12.00	Diametro= 0,80 m
TOTAL		62.00	

PLANILLADO ANTERIORMENTE =	m
TOTAL CONTRATADO =	243.00 m
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	62.00 m
CANTIDAD PLANILLADA =	62.00 m
EXCEDENTES =	- m



Firmado electrónicamente por:
**ODILO VINICIO
GUEVARA MARIN**



Firmado electrónicamente por:
**JESSICA MARIELA
JARAMILLO
ARMIJOS**

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
CONTRATISTA.

KEYSZEN S.A.S
FISCALIZADOR EXTERNO.

POLIZA DE SEGURO DE FIANZAS PUBLICO

ASEGURADORA DEL SUR C.A. en adelante "La Aseguradora" en virtud de la solicitud de seguro presentada por el interesado, que en adelante se denomina "El Afianzado o Contratista", y que forma parte integrante de ese contrato, se obliga a indemnizar al Asegurado, por las razones previstas en este contrato, de acuerdo a las condiciones generales, aprobadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con Resolución N°. SCVS-16-27-PR-1-123004418-22052020 del 22 de mayo de 2020 y especiales, teniendo prelación las últimas sobre las primeras.

Emitido en: AMBATO

Emisión: 02/06/2023

Agente: 16917279

RAMO		PÓLIZA NÚMERO	SUMA ASEGURADA
FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		1142619	232.536,06
VIGENCIA DEL DOCUMENTO		TIPO DE DOCUMENTO	
DESDE LAS 00:01 DE	HASTA LAS 24:00 DE	PLAZO	RENOVACION
05/06/2023	02/12/2023	180	2

EL AFIANZADO O CONTRATISTA: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S A 1691710080001
DIRECCIÓN: LUIS MOLINA SN ,Dpto. , Piso0,
TELÉFONOS: 0 032861348 0999813185

EL ASEGURADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 1660000170001
DIRECCIÓN: PASTAZA / PUYO / FRANCISCO DE ORELLANA 739 Y 27 DE FEBRERO
TELÉFONOS: 0 032885381 0999123457

OBJETO DEL CONTRATO:

ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, SEGÚN PROCESO No. LICO-GADPPz-006-2022

PRIMA	IMPUESTOS Y OTROS	TOTAL CONTADO
4.357,66	728,22	5.085,88

ESTE FOMULARIO ES UN AVISO DE COBRO

Mediante esta póliza de seguro incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, según la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, Aseguradora del Sur C.A. se obliga a favor del Beneficiario de esta póliza por los perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación afianzada hasta el monto estipulado como suma asegurada que le posea el afianzado, en caso de terminación del contrato. Esta póliza podrá ser renovada mediante petición escrita del Afianzado o Asegurado. Transcurrido el plazo/vigencia, la presente póliza quedará automáticamente caduca, cesando de hecho toda responsabilidad de la compañía aún en el caso de que no fuera devuelto el original de la misma.

En testimonio de lo acordado se firma este contrato en: AMBATO a 2 DE JUNIO DE 2023

EL ASEGURADO



Firmado electrónicamente por:
GABRIEL ALEJANDRO
SOSA ESPINEL

EL CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
ODILO VINICIO
GUEVARA MARIN

LA ASEGURADORA



Digitally signed by
RODRIGO CEVALLOS
GUEVARA
Date: 2023.06.02
11:24:53 -05:00
Reason: Firma
Electrónica
Location: Aseguradora
del Sur

ORIGINAL

MATRIZ QUITO TELS:(02)2997500 FAX:(02)2997553 - 2997588 CUENCA TELS:(07)2819721 -	IBARRA TELS:(06)640920 LOJA TELS:(07)587677 FAX:(07)560995	PORTOVIEJO TELS:(05)632647 FAX:(05)632669	MANTA TELS:(05)625751/626503 FAX:(05)623483	AMBATO TELS:(03)829299/828211 FAX:(03)828534	RIOBAMBA TELS:(03)941063 FAX:(03)965040	MACHALA TELS: (07)2985563 FAX: (07)2985561
--	--	--	--	---	--	---

CONDICIONES DE LA PÓLIZA N° 1142619

RAMO: CUMPLIMIENTO DE CO
 MONEDA: DÓLARES
 LUGAR Y FECHA: AMBATO, Noviembre 1 de 2022

VIGENCIA DE LA POLIZA DESDE: 05/06/2023 HASTA: 02/12/2023

VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE: HASTA:

LAS 00:01 H

LAS 24:00 H (Local)

ASEGURADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL TLF: 0 032885381

Cel: 0999123457

DIRECCIÓN: PASTAZA / PUYO / FRANCISCO DE ORELLANA 739 Y 27 DE FEBRERO

FIANZAS

COBERTURAS CONTRATADAS	Sumas Aseguradas hasta: USD	Deducible: Aplica el mayor de los tres		
		% Suma Asegurada	% Valor de Siniestro	Mínimo USD
Fiel Cumplimiento de Contrato	232.536,06			

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

El(La) asegurado(a) y/o el(la) solicitante declara libre y voluntariamente, que el seguro solicitado a Aseguradora del Sur C.A., ampara bienes, garantías y contratos de procedencia lícita, los mismos que no están ligados con actividades de Narcotráfico, Lavado de Activos o Financiamiento del Terrorismo. Igualmente, declara que los fondos con los cuales se pagará la prima correspondiente a este contrato de seguros tienen origen lícito y no guardan ninguna relación con las actividades mencionadas anteriormente.

AUTORIZACIÓN

Siendo conocedor de las disposiciones legales para la Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, autorizo expresamente en forma libre, voluntaria e irrevocable a Aseguradora del Sur C.A. a realizar el análisis y las verificaciones que considere necesarias para corroborar la licitud de fondos y bienes comprendidos en el contrato de seguro; así como autorizo expresa, voluntaria e irrevocablemente a todas las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado a facilitar a Aseguradora del Sur C.A. toda la información que ésta les requiera, inclusive autorizo anticipadamente el levantamiento del sigilo o velo bancario en caso de ser necesario, incluido la revisión de los buró de crédito sobre mi información de riesgos crediticios.

<https://fms.aseguradoradelsur.com/asegsur/v1/fms/uploads/bedc194c-76f0-4390-b851-44b0fbc0f318.pdf>

Direcciones:

Matriz Quito: Av. De Los Naranjos y De Las Azucenas (02) 2997-500 / Fax: (02)2467-983. Sucursal Ambato: Av. Rodrigo Pachano 13-109 y Juan Montalvo. Sector Ficoa (03)2828-211 / (03)2828-213 / (03) 2829-299. Sucursal Francisco Orellana (Coca): Calle Quito entre Guayaquil y Jorge Rodríguez (06)2883-276 / (06)2881-511. Sucursal Cuenca: Feder Proaño 365 y Honorato de Loyola, a dos cuadras de Pizza Hut. (07)2819-721 / (07)2819-964. Sucursal Ibarra: Victoria Cast Chiriboga 657 y Galo Plaza Lasso, atrás del C.C. La Plaza (06) 2630-920 / (06)2630-868. Sucursal Loja: Av. Av. Orillas Zamora y Segundo Puertas Moreno (07)2560-991 / (07)2587-677. Sucursal Machala: Av. 25 de Junio Km 2 1/2, vía a Pas. Urbanización Ciudad del Sol Mz. L1 (07)279-7087 / (07)279-7089 / 099 844 5197. Sucursal Manta: Calle M1 entre las calles y 24, diagonal al Hotel Oro Verde Manta, edificio 'Manta Business Center', planta baja. (05)2625 -751 / (05)2626-50. (05)2626-052. Sucursal Portoviejo: Av. Manabí y Granda Centeno, frente a la pista del aeropuerto (05)2563-494 / (05)2563-33 / (05)2563-508. Sucursal Riobamba: Uruguay 21-50 y Av. Daniel León Borja (03)2942-830 / (03)2941-063. Sucursal Sa Domingo: Av. Los Naranjos S/N y Av. Quito, 3er piso (frente al SRI). (02)2751-377 / (02)2762-006. Sucursal Guayaquil: Urde Circunvalación Sur #304 y Todos los Santos. (04)501-3050.

Línea de atención al cliente: teléfono: (02) 2997500 / (09)9555-3333.

Página web de la compañía: www.aseguradoradelsur.com <<http://www.aseguradoradelsur.com/>>

Dirección de correo electrónico de contacto: contacto@asur.ec <<mailto:contacto@asur.ec>>

ORIGINAL

Puyo, 16 de junio del 2023

Señor
Odilo Vinicio Guevara Marín
Gerente General
AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
Presente. –

De mi consideración:

Mediante Contrato LICO-GADPPz-006-2022 suscrito el 07 de noviembre del 2022, dentro del Proceso de LCC-GADPPz-004-2022, para la ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, entre la Compañía AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, con un Anticipo del 0%, por un monto de USD \$ 4'650.521,23 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 23/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) SIN INCLUIR IVA, y un Plazo de 540 Días contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Obra.


En referencia al OFICIO Nº GADPPz-ES-2023-005, suscrito por Ing. Eryka Silva, de fecha 14 de junio del 2023.

Adjunto subsanar el hallazgo encontrado de la Planilla de Avance de obra No. 01:

- 1.- Adjuntar el check list al Quipux
- 2.- En el expediente físico no se adjunta el cd con toda la documentación requirente.
- 3.- Se solicita se trabaje con todos los decimales para el cálculo del reajuste provisional de la planilla, en vista que al multiplicar los valores no coincide el resultado.
- 4.- Falta el acta de cumplimiento.
- 5.- Falta el certificado de cumplimiento del IESS.
- 6.- Verificar el anexo de cálculo del rubro #3, en el cual se detalla mal la unidad.
- 7.- Favor hacer entrega los anexos al mail keyszen.sas@gmail.com

Por la atención al presente le anticipo mis sinceros agradecimientos.

Sin otro particular por el momento, me despido.



Recibido
19/06/2023

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**JESSICA MARIELA
JARAMILLO
ARMIJOS**

Mg. Jessica Jaramillo
C.C. 0704239128
Gerente General
KEYSZEN S.A.S.
RUC 0791840462001



CC. Administrador del Contrato

Puyo, 14 de junio de 2023

Señor
KEYSZEN.S.A.S
CONTRATISTA
Presente. -

De mi consideración:

En calidad de Administradora de contrato del proyecto **"ASFALTADO DE LA VIA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**.

De acuerdo a Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5465-M emitido por el Director de Fiscalización quien remite las observaciones de la Dirección Financiera con respecto a la Planilla de Obra de Avance 1.

Adjunto Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5465-M, para su corrección y posterior presentación, reiterando que se deberá emitir las correcciones de manera física y digital.

Particular que comunico, para los fines pertinentes.

Atentamente.



Ing. Eryka Silva M.
ADMINISTRADORA DE CONTRATO

Cc: Odilo Guevara, REPRESENTANTE LEGAL DE AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S. A. -
CONTRATISTA

Recibido
15-06-2023
KEYSZEN S.A.S

[Handwritten signature]
15/66/2023

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5465-M

Puyo, 14 de junio de 2023

PARA: Sra. Ing. Eryka Mireya Silva Manzano
Subdirector de Fiscalización

ASUNTO: OBSERVACIONES PLANILLA DE OBRA AVANCE 1: "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA â JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA"

En alcance al Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2162-M, de fecha 09 de junio de 2023, se da a conocer las observaciones emitidas por la Dirección Financiera con respecto a la Planilla de Obra de Avance 1 del proyecto: "**ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO**".

OBSERVACIONES	
N°	DETALLE
1	Adjuntar el check list al Quipux
2	En el expediente físico no se adjunta el cd con toda la documentación requirente.
4	Se solicita se trabaje con todos los decimales para el cálculo del reajuste provisional de la planilla, en vista que al multiplicar los valores no coincide el resultado.
5	Falta el acta de cumplimiento.
6	Falta el certificado de cumplimiento del IESS.
7	Verificar el anexo de cálculo del rubro #3, en el cual se detalla mal la unidad.

Con lo expuesto, se solicita subsanar las observaciones encontradas, con el fin de dar continuidad al trámite administrativo pertinente; **adicional aquello, toda información deberá ser anexada en el Sistema de Gestión Documental Yasuni Quipux y de forma física.**

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
DIRECTOR DE FISCALIZACION

Referencias:
- GADPPZ-FINANCIERO-2023-2162-M

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5465-M

Puyo, 14 de junio de 2023

Anexos:

- anexo_03.pdf
- notificación_adm.pdf
- 2_ acta_de_inicio_curaray-signed-signed-2-signed-signed_(2).pdf
- cambio_de_adm_asfalto_curaray-signed-signed-signed_(1).pdf
- planilla_de_avance_principal_n_01_firmado-signed-signed.pdf
- oficio_entrega_de_planilla_de_avance_de_obra_no_01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- cronograma_valorado_de_trabajos-signed_firmado-signed.pdf
- anexo_planita_y_perfil_lamina_02.pdf
- memo_de_pago0468651001680534559.pdf
- anexo_planita_y_perfil_lamina_01.pdf
- anexo_44.pdf
- anexo_36.pdf
- anexo_35.pdf
- anexo_37.pdf
- anexo_38.pdf
- anexo_39.pdf
- anexo_40.pdf
- anexo_41.pdf
- anexo_42.pdf
- anexo_43.pdf
- anexo_04_justificativo_civil_3d.pdf
- anexo_04_justificativo.pdf
- anexo_04.pdf
- anexo_07.pdf
- anexo_100579016001680534273.pdf
- anexo_17_justificativo.pdf
- anexo_17.pdf
- anexo_18.pdf
- anexo_21.pdf
- anexo_22.pdf
- anexo_02.pdf
- anexo_01.pdf
- 21_oficio_entrega_tramite_permiso_ambiental_lico-gadppz-006-20220011566001680534156.pdf
- 20_oficio_entrega_de_planilla_de_fiscalizacion_no_01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- 19_oficio_entrega_de_planilla_de_avance_de_obra_no_01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- 18_oficio_devolucion_dos_de_planilla_de_avance_no_01.pdf
- 13_oficio_devolucion_de_planilla_de_avance_no_01.pdf
- 12_oficio_de_informe_cumplimiento_direccion_de_fiscalizacion.pdf
- informe_adm_obra_avance_1-signed.pdf
- memorando_nro_gadppz-unidad-vial-2023-7221-m.pdf
- memorando_nro_gadppz-financiero-2023-2162-m.pdf


Copia:

Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaria Ejecutiva 2** /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - Secretaria Ejecutiva 2



Escaneado electrónicamente por:
**JAIR FERNANDO
LEDESMA BASTIDAS**



Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2162-M

Puyo, 09 de junio de 2023

PARA: Sr. Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
Director de Fiscalización

ASUNTO: OBSERVACIONES PLANILLA DE OBRA AVANCE 1: "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA â JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA"

De mi consideración:

Estimado Director, en respuesta al Documento No. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5137-M, una vez realizado el control previo de la planilla de obra de avance 1: "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, se detalla las siguientes observaciones.

OBSERVACIONES	
Nº	DETALLE
1	Adjuntar el check list al Quipux
2	En el expediente físico no se adjunta el cd con toda la documentación requirente.
4	Se solicita se trabaje con todos los decimales para el cálculo del reajuste provisional de la planilla, en vista que al multiplicar los valores no coincide el resultado.
5	Falta el acta de cumplimiento.
6	Falta el certificado de cumplimiento del IEES.
7	Verificar el anexo de cálculo del rubro #3, en el cual se detalla mal la unidad.

Las mismas que se requieren cumplan adecuadamente para continuar con el proceso correspondiente.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Jaime Eduardo Rivadeneira Jaramillo
DIRECTOR FINANCIERO

Referencias:

- GADPPZ-CONTABILIDAD-2023-0180-M

Anexos:

- memorando_nro._gadppz-unidad-vial-2023-7221-m.pdf
- informe_adm._obra_avance_1-signed.pdf
- 12_oficio_de_informe_cumplimiento_direccion_de_fiscalizacion.pdf



Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2162-M

Puyo, 09 de junio de 2023

- 18_oficio_devolucion_dos_de_planilla_de_avance_no._01.pdf
- 19_oficio_entrega_de_planilla_de_avance_de_obra_no._01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- 20_oficio_entrega_de_planilla_de_fiscalizacion_no._01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- 21_oficio_entrega_tramite_permiso_ambiental_lico-gadppz-006-20220011566001680534156.pdf
- anexo_01.pdf
- anexo_02.pdf
- anexo_22.pdf
- anexo_21.pdf
- anexo_18.pdf
- anexo_17.pdf
- anexo_17_justificativo.pdf
- anexo_100579016001680534273.pdf
- anexo_07.pdf
- anexo_04.pdf
- anexo_04_justificativo.pdf
- anexo_04_justificativo_civil_3d.pdf
- anexo_43.pdf
- anexo_42.pdf
- anexo_41.pdf
- anexo_40.pdf
- anexo_39.pdf
- anexo_38.pdf
- anexo_37.pdf
- anexo_35.pdf
- anexo_36.pdf
- anexo_44.pdf
- anexo_planita_y_perfil_lamina_01.pdf
- memo_de_pago0468651001680534559.pdf
- anexo_planita_y_perfil_lamina_02.pdf
- cronograma_valorado_de_trabajos-signed_firmado-signed.pdf
- oficio_entrega_de_planilla_de_avance_de_obra_no._01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- planilla_de_avance_principal_n_01_firmado-signed-signed.pdf
- cambio_de_adm._asfalto_curaray-signed-signed-signed_(1).pdf
- 2_acta_de_inicio_curaray-signed-signed-2-signed-signed_(2).pdf
- notificación_adm.pdf
- anexo_03.pdf

Copia:

Srta. Ing. Mercy Johana Quishpi Cuenca - **Contador 1** /



09 MAY 2023

Recibido:

Pao Pao

Número:

5137 Hora: 10h47

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5137-M

Puyo, 09 de mayo de 2023

PARA: Sr. Téc. Jose Mauricio Marin Montero
Director Financiero (E)

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO PLANILLA DE OBRA AVANCE 1: "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA â JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA"

En referencia a los documentos: OFICIO KEYOFICIO-015-2023, de fecha 13 de marzo de 2023, suscrito por la ingeniera Jessica Jaramillo – Gerente General KEYSZEN S.AS; Memorandos Nro. GADPPZ-UNIDAD VIAL-2023-7396-M, de fecha 24 de abril de 2023, suscrito por la ingeniera Eryka Silva– Fiscalizador 1 (Administrador de Contrato), hago hincapié lo siguiente:

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado 408-17 Administrador del contrato, que indica: *“El administrador del contrato velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sí para lograr el éxito del proyecto.- Es función del administrador del contrato establecer un sistema que evalúe el logro de los objetivos, mediante el cual pueda obtenerse información sobre su estado. Esto con el fin de tomar oportunamente acciones correctivas o para informar a las autoridades de la entidad sobre el desarrollo del proyecto”*

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado **408-18** Jefe de Fiscalización, indica: *“El Jefe de Fiscalización establecerá un sistema para asegurar la correcta ejecución de la obra, mediante el control de la calidad, el avance físico y el avance financiero de la obra. Dichos controles conllevan una evaluación mensual, de los aspectos mencionados y la comunicación de resultados a los mandos superiores, incluyendo los problemas surgidos, especialmente cuando afectan las condiciones pactadas en relación al plazo, presupuesto y calidad de la obra.- El Jefe de Fiscalización, se asegurará de que la obra se ejecute de conformidad con las bases establecidas en los estudios de preinversión, es decir, de acuerdo con el diseño definitivo, las especificaciones y demás normas técnicas aplicables, para lograr obtener del proyecto los beneficios esperados”*.

Con estos antecedentes, adjunto la Planilla de Avance N° 1 y su Reajuste Provisional (con todos los anexos), del proyecto "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA", documentación que ha sido revisada y aprobada por el Administrador de Contrato y Fiscalizador; por lo que, en base a los informes anexos, se determina como viable y procedente realizar el pago de \$ 135.446,45 USD (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 45/100), a favor de **AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A** - Contratista, de acuerdo al siguiente detalle:

135.446,08



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5137-M

Puyo, 09 de mayo de 2023

PLANILLA DE AVANCE N°1	\$135.446,45 USD
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 1	\$ 1.973,63 USD
TOTAL A PAGAR	\$137.420,08 USD

135,466,45

Particular que solicito para los fines pertinentes.

137,440,08

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Álvaro Renato Sosa Castro
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

Referencias:

- GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2023-7396-M

Anexos:

- memorando_nro_gadppz-unidad-vial-2023-7221-m.pdf
- informe_adm_obra_avance_1-signed.pdf
- 12_oficio_de_informe_cumplimiento_direccion_de_fiscalizacion.pdf
- 13_oficio_devolucion_de_planilla_de_avance_no_01.pdf
- 18_oficio_devolucion_dos_de_planilla_de_avance_no_01.pdf
- 19_oficio_entrega_de_planilla_de_avance_de_obra_no_01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- 20_oficio_entrega_de_planilla_de_fiscalizacion_no_01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- 21_oficio_entrega_tramite_permiso_ambiental_lico-gadppz-006-20220011566001680534156.pdf
- anexo_01.pdf
- anexo_02.pdf
- anexo_22.pdf
- anexo_21.pdf
- anexo_18.pdf
- anexo_17.pdf
- anexo_17_justificativo.pdf
- anexo_100579016001680534273.pdf
- anexo_07.pdf
- anexo_04.pdf
- anexo_04_justificativo.pdf
- anexo_04_justificativo_civil_3d.pdf
- anexo_43.pdf
- anexo_42.pdf
- anexo_41.pdf
- anexo_40.pdf
- anexo_39.pdf
- anexo_38.pdf
- anexo_37.pdf
- anexo_35.pdf
- anexo_36.pdf
- anexo_44.pdf
- anexo_planita_y_perfil_lamina_01.pdf
- memo_de_pago0468651001680534559.pdf
- anexo_planita_y_perfil_lamina_02.pdf



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5137-M

Puyo, 09 de mayo de 2023

- cronograma_valorado_de_trabajos-signed_firmado-signed.pdf
- oficio_entrega_de_planilla_de_avance_de_obra_no._01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- planilla_de_avance_principal_n_01_firmado-signed-signed.pdf
- cambio_de_adm._asfalto_curaray-signed-signed-signed_(1).pdf
- 2_acta_de_inicio_curaray-signed-signed-2-signed-signed_(2).pdf
- notificación_adm.pdf
- anexo_03.pdf

Copia:

Sr. Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña - **Director de Obras Publicas** / Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaria Ejecutiva 2** /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Jomara Daniela Martínez Moya - Asistente Administrativo 1

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA



Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL

Pastaza

09 ABR 2023

Fecha:

Ejecutar el control previo y efectuar
La contabilización, conforme leyes y
Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA

DIRECCIÓN FINANCIERA



Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL

Pastaza

09 ABR 2023

Fecha:

Ejecutar el control previo al pago
Conforme leyes y reglamentos
Vigentes.



ALVARO RENATO SOSA
CASTRO



Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2023-7396-M

Puyo, 24 de abril de 2023

PARA: Sr. Ing. Álvaro Renato Sosa Castro
Director de Fiscalización

ASUNTO: PLANILLA DE OBRA AVANCE 1: "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA a JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA"

De mi consideración:

En relación al Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4960-M, adjunto al presente sírvase la Planilla de Avance N° 01 del Proyecto: "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", una vez que han realizado las correcciones respectivas a las observaciones.

Con lo antes expuesto solicito se proceda con el pago correspondiente con el fin de dar continuidad al trámite.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Fryka Mireya Silva Manzano
FISCALIZADOR 1

Referencias:

- GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4960-M

Anexos:

- anexo_03.pdf
- notificación_adm.pdf
- 2_acta_de_inicio_curaray-signed-signed-2-signed-signed_(2).pdf
- cambio_de_adm_asfalto_curaray-signed-signed-signed_(1).pdf
- planilla_de_avance_principal_n_01_firmado-signed-signed.pdf
- oficio_entrega_de_planilla_de_avance_de_obra_no_01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- cronograma_valorado_de_trabajos-signed_firmado-signed.pdf
- anexo_planita_y_perfil_lamina_02.pdf
- anexo_planita_y_perfil_lamina_01.pdf
- anexo_44.pdf
- anexo_36.pdf
- anexo_35.pdf
- anexo_37.pdf
- anexo_38.pdf
- anexo_39.pdf
- anexo_40.pdf

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN



Pastaza

Fecha:

26 ABR 2023

Recibido:

Número:

Hora: 11:49



Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2023-7396-M

Puyo, 24 de abril de 2023

- anexo_41.pdf
- anexo_42.pdf
- anexo_43.pdf
- anexo_04_justificativo_civil_3d.pdf
- anexo_04_justificativo.pdf
- anexo_04.pdf
- anexo_07.pdf
- anexo_100579016001680534273.pdf
- anexo_17_justificativo.pdf
- anexo_17.pdf
- anexo_18.pdf
- anexo_21.pdf
- anexo_22.pdf
- anexo_02.pdf
- anexo_01.pdf
- 21_oficio_entrega_tramite_permiso_ambiental_lico-gadppz-006-20220011566001680534156.pdf
- 20_oficio_entrega_de_planilla_de_fiscalizacion_no_01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- 19_oficio_entrega_de_planilla_de_avance_de_obra_no_01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- 18_oficio_devolucion_dos_de_planilla_de_avance_no_01.pdf
- 13_oficio_devolucion_de_planilla_de_avance_no_01.pdf
- 12_oficio_de_informe_cumplimiento_direccion_de_fiscalizacion.pdf
- informe_adm_obra_avance_1-signed.pdf
- memorando_nro._gadppz-unidad-vial-2023-7221-m.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Lcda. Ingrid Katherine Casco Robles - Asistente Administrativo 1



Firmado electrónicamente por:
MERYKA MIREYA SILVA
MANZANO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO. FISCALIZACIÓN

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°. 01

OBRA : ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA - HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

FECHA DE CONTRATO : 7 de Noviembre de 2022

CONTRATISTA : CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUJLD S.A.

PLAZO : 540 Días a partir de la orden de inicio

AMPLIACIONES : 0 Días

SUSPENSIÓN : 0 Días

TOTAL : 540 Días

FECHA DE PLANILLA : 2 de marzo de 2023

INICIO DEL PLAZO : 25 de enero de 2023

TERMINACIÓN DEL PLAZO : 18 de julio de 2024

PERÍODO : 25-Ene-23

A 28-Feb-23

CONTRATO : \$4.650.521,23

PLANILLAS : \$135.466,45

EXCEDENTES : 0,00

DE AVANCE EJECUTADO : 2,91%

DE AVANCE PROGRAMADO : 1,58%

ACUMULADO

\$135.466,45

0,00

2,91%

1,58%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	CANTIDADES				IMPORTE		
						T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
1	Desbroce, desbosque y limpieza	Ha	29,18	444,42	\$ 12.968,176		3,20	3,20	10,97%		1,422,14	1,422,14
2	Replanteo y nivelación a nivel de asfalto	km	14,59	1,383,97	\$ 20,192,122		1,60	1,60	10,97%		2,214,35	2,214,35
3	Remoción de alcantarillas	m	243,00	26,76	\$ 6.502,680		62,00	62,00	25,51%		1,659,12	1,659,12
4	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m³	68,863,54	1,02	\$ 70,240,811		3,119,20	3,119,20	4,53%		3,181,58	3,181,58
5	Excavación de cunetas de coronación	m³	613,80	1,29	\$ 791,802		-	-	0,00%		-	-
6	Excavación para cunetas y encauzamiento	m²	8,576,91	5,02	\$ 43,056,088		-	-	0,00%		-	-
7	Excavación y relleno de estructuras menores	m²	7,720,00	5,08	\$ 39,217,600		2,171,59	2,171,59	28,13%		11,031,68	11,031,68
8	Limpieza de derrumbes	m³	8,746,43	0,82	\$ 7,172,073		-	-	0,00%		-	-
9	S.C. Tubería de acero corrugado D= 0,80 m, e=2,5 mm, PM-100	m	126,00	166,33	\$ 20,957,580		-	-	0,00%		-	-
10	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2,5 mm, PM-100	m	263,00	272,20	\$ 71,588,600		49,00	49,00	18,63%		13,337,80	13,337,80
11	S.C. Tubería de acero corrugado D= 2,20 m, e=2,5 mm, PM-100	m	46,00	562,20	\$ 25,861,200		-	-	0,00%		-	-
12	Hormigón para cunetas (F'c=180 KG/CM)	m³	4,746,82	167,21	\$ 793,715,772		-	-	0,00%		-	-
13	Muro de H.S. Fc=180kg./cm2 tipo B(Cabezales)	m²	763,00	167,20	\$ 127,573,600		-	-	0,00%		-	-
14	Hormigón simple en obras de arte F'c=240 KG/CM2	m³	78,47	162,46	\$ 12,748,236		-	-	0,00%		-	-
15	Hierro estructural fy=4200 kg/cm²	kg	8,288,90	1,94	\$ 16,080,466		-	-	0,00%		-	-
16	Muro de gaviones - calibre N° 12	m³	400,00	70,12	\$ 28,048,000		-	-	0,00%		-	-
17	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m³	83,263,76	3,00	\$ 248,791,280		6,828,20	6,828,20	8,20%		20,484,60	20,484,60
18	Material de subbase clase 3	m³	21,010,98	12,44	\$ 261,376,591		1,125,00	1,125,00	5,35%		13,995,00	13,995,00
19	Material de base granular de agregados	m³	13,031,28	15,78	\$ 205,633,598		-	-	0,00%		-	-
20	Transporte material de desalojo	m³-km	8,746,43	1,02	\$ 8,921,359		-	-	0,00%		-	-
21	Transporte de material pétreo de mejoramiento	m³-km	3,309,493,83	0,25	\$ 827,373,458		225,194,04	225,194,04	6,80%		56,298,51	56,298,51
22	Transporte de material pétreo de subbase clase 3	m³-km	781,104,32	0,25	\$ 195,276,080		37,102,50	37,102,50	4,75%		9,275,63	9,275,63
23	Transporte de material pétreo de base granular de agregados	m³-km	484,450,99	0,25	\$ 121,112,748		-	-	0,00%		-	-
24	Impregnación con emulsión asfáltica	Lt	171,247,08	0,76	\$ 130,147,781		-	-	0,00%		-	-
25	C. rodadura homigón ast. Mezclado en planta, e=2"	m²	122,319,34	9,74	\$ 1,191,390,372		-	-	0,00%		-	-
26	Bordillo de H.S.(F'c=210 kg/cm² - 0,14x0,40)	m	2,000,00	14,64	\$ 29,280,000		-	-	0,00%		-	-
27	Aceras de H.S. Fc=180kg/cm² E=7cm escobillado	m²	3,000,00	19,32	\$ 57,960,000		-	-	0,00%		-	-
28	Marcas en pavimento	m	43,626,97	0,40	\$ 17,450,788		-	-	0,00%		-	-

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO. **FISCALIZACION**

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 01

OBRA : ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
 FECHA DE CONTRATO : 7 de Noviembre de 2022
 CONTRATISTA : CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
 PLAZO : 540 Días a partir de la orden de inicio
 AMPLIACIONES : 0 Días
 SUSPENSION : 0 Días
 TOTAL : 540 Días

PRECIO CONTRATO : 7.32
 CANTIDAD : 3,895.00
 UNIDAD : u
 DESCRIPCION : Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccionales y bidireccionales)

CONTRATO : \$4,650,521.23
 PLANILLAS : \$135,466.45
 EXCEDENTES : 0.00
 DE AVANCE EJECUTADO : 2.91%
 DE AVANCE PROGRAMADO : 1.58%

PARCIAL : \$4,650,521.23
 ACUMULADO : \$135,466.45

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	CANTIDADES			IMPORTANTE			
						T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
29	Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccionales y bidireccionales)	u	3,895.00	7.32	\$ 28,511,400			-	0.00%			-
30	Pancarta informativa (letrero)-con estructura	u	1.00	1,179.51	\$ 1,179,510			-	0.00%			-
31	Señales ecologicas (2.40x1.20)M	u	2.00	354.87	\$ 709,740			-	0.00%			-
32	Señales informativas (2.40x1.20)M	u	4.00	354.87	\$ 1,419,480			-	0.00%			-
33	Señales reglamentarias (0.75 x 0.75)M	u	10.00	111.50	\$ 1,115,000			-	0.00%			-
34	Señales preventivas (0.75 x 0.75)M	u	200.00	111.50	\$ 22,300,000			-	0.00%			-
35	Señales informativas y reglamentarias (0.60mx0.80m) móviles	u	4.00	78.18	\$ 312,720		4.00	4.00	100.00%		312.72	312.72
36	Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.60m) móviles	u	4.00	163.34	\$ 653,360		4.00	4.00	100.00%		653.36	653.36
37	Contenedores metálicos de 55 galones	u	4.00	17.57	\$ 70,280		4.00	4.00	100.00%		70.28	70.28
38	Kit antiderrames	u	4.00	157.50	\$ 630,000		4.00	4.00	100.00%		630.00	630.00
39	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m	1,000.00	0.32	\$ 320,000		90.00	90.00	9.00%		28.80	28.80
40	S/C Cono de seguridad con protección UV, 71cm Incl. cinta reflectiva	u	20.00	22.48	\$ 449,600		20.00	20.00	100.00%		449.60	449.60
41	Suministro de paleta de alto y siga	u	4.00	30.32	\$ 121,280		4.00	4.00	100.00%		121.28	121.28
42	Capacitación sobre preservación de recursos naturales (de 2 a 3 horas)	u	1.00	100.00	\$ 100,000		1.00	1.00	100.00%		100.00	100.00
43	Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas)	u	1.00	100.00	\$ 100,000		1.00	1.00	100.00%		100.00	100.00
44	Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 horas)	u	1.00	100.00	\$ 100,000		1.00	1.00	100.00%		100.00	100.00
DESCUENTOS:					\$ 4,650,521.23				TOTAL	\$ 0.00	\$ 135,466.45	\$ 135,466.45
Anticipo									0%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Mora 0 días									\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
VALOR A PAGARSE									\$ 0.00	\$ 135,466.45	\$ 135,466.45	\$ 135,466.45

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS DÓLARES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS



Amazon Building S.A.
 Código de Verificación del Contrato:
SUEVARA MARIN



Amazon Building S.A.
 Código de Verificación del Contrato:
**JARAMILLO
 JERMIJOS**



Amazon Building S.A.
 Código de Verificación del Contrato:
**MIRRETA SILVA
 MANZANO**

CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATISTA

KEYSZEN S.A.S.

FISCALIZADOR EXTERNO

ING. ERYKA SILVA

ADMINISTRADOR GADPPZ

Puyo, 05 de marzo del 2023

Ing. Adam Mariño
DIRECTOR DE FISCALIZACION SUBROGANTE DEL GADPPz
Presente. -



De mis consideraciones. -

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez desearle éxitos en las funciones a usted encomendadas, de la misma manera pongo en conocimiento que se adjunta el informe Ambiental de Cumplimiento del Proyecto **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA** perteneciente a la Planilla de Avance No. 01 para que se proceda con el trámite pertinente.

Verificando en territorio lo presentado en el informe Ambiental de cumplimiento remitido por el contratista, fiscalización externa emite la **CONFORMIDAD AMBIENTAL**, correspondiente al periodo **ENERO 25 DEL 2023 A FEBRERO 28 DEL 2023**


Por la atención prestada anticipo mis más sinceros agradecimientos

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
JESSICA MARIELA
JARAMILLO ARMIGOS

Ing. Jessica Jaramillo
C.C. 0704239128
GERENTE GENERAL
KEYSZEN S.A.S.
RUC 0791840462001



Archivos Adjuntos :

- 01 Oficio de Entrega Informe Ambiental Administrador de Contrato (1 hoja)
- 02 Oficio de Entrega Informe Ambiental Director de Fiscalizacion(2 hojas)
- 03 Informe Ambiental de Cumplimiento Planilla de Avance N° 01 (55 hojas)

CC. Ing. David Yadra - Director de Gestión Ambiental del GADPPz

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03
Oficina 072 785 269
keyszen.sas@gmail.com
www.keyszen.com
Machala - El Oro - Ecuador

**INFORME AMBIENTAL DE FISCALIZACION DEL PROYECTO: "ASFALTADO
DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL
KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA,
PROVINCIA DE PASTAZA"**

PERIODO: ENERO 25 DEL 2023 A FEBRERO 28 DEL 2023

1. NOMBRE DEL PROYECTO

ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

2. FICHA DEL PROYECTO

ETAPA DEL PROYECTO	Operación y mantenimiento		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA	Provincia: Pastaza	Cantón: Pastaza	Parroquia: 10 de agosto
	CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA		
TIPO DE ZONA	Rural		
CÓDIGO DEL PROYECTO	LICO-GADPPz-006-2022		
PERIODO DEL INFORME	25 de enero de 2023 al 28 de febrero de 2023		
COORDENADAS UTM			
	Este (X)		Norte (Y)
	169467		9837116
	169975		9837403
	170901		9838807
	173028		9840607
	173979		9841143
	175562		9841028
	176810		9841069
	178330		9841233
	178384		9841892
	178743		9842171
DATOS DEL OPERADOR DEL PROYECTO			
Representante legal	Ing. Jaime Guevara		
Domicilio	Francisco de Orellana y 27 de febrero, Puyo, Pastaza		
Página web	gadppz@pastaza.gob.ec	Cel:	(593) 032 994-220
DATOS DEL RESPONSABLE TÉCNICO FISCALIZACIÓN EXTERNA			
Elaborado por:	Ing. Jessica Gorozabel		
Dirección	Machala		
Correo electrónico	jessica.gorozabel@gmail.com	Cel:	0995057489
Aprobado por:	Ing. Jessica Jaramillo		
Dirección:	Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03		
Correo Electrónico	keyszen.sas@gmail.com	Cel:	072 785 269
Representante legal	Gerente de KEYSZEN S.A.S.		
PERIODO	25 de enero de 2023 al 28 de febrero de 2023		
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	4 % APROXIMADO		

INFORME AMBIENTAL DE FISCALIZACION DEL PROYECTO: "ASFALTADO DE LA VÍA
CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10
DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

PERIODO: ENERO 25 DEL 2023 A FEBRERO 28 DEL 2023



FISCALIZADOR:

KEYSZEN S.A.S.

CONTRATISTA:

CIÁ. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

PERIODO:

ENERO 25 DEL 2023 A FEBRERO 28 DEL 2023

1. OBJETIVO GENERAL

- El **Objetivo** principal, es el cumplimiento de Plan de manejo Ambiental establecido en **materia** ambiental, por parte de la contratista **AMAZONAS BUILDING S.A.**, que permitan evitar, mitigar y corregir las potenciales **afectaciones** que se pudieran presentar durante la ejecución del proyecto.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Procurar** la menor afectación e impactos ambientales negativos hacia el recurso humano y recursos naturales como suelo, agua, calidad de aire, flora y fauna.
- **Maximizar** el bienestar de la población, en función de los beneficios sociales y de **seguridad** que conllevan la ejecución del proyecto.
- **Detectar** oportunamente errores y/u omisiones en el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y dar soluciones a las diferentes situaciones que se presenten dentro de la ejecución del proyecto **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**

2. ACTIVIDADES

Las actividades de quien suscribe este informe se han desarrollado durante el periodo enero 25 del 2023 a febrero 28 del 2023.

En cumplimiento a la ejecución del proyecto **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA** sea compatible con las normas ambientales; se ha establecido el siguiente alcance:

- **Identificación** y sistematización de los potenciales riesgos ambientales que se **producirán** durante la ejecución de las actividades de constructivas del proyecto en **mención**.

3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE PROYECTO

- **Desbroce**, desbosque y limpieza
- **Replanteo** y nivelación a nivel de asfalto
- **Remoción** de alcantarillas
- **Excavación** sin clasificar (mov. de tierra)
- **Excavación** de cunetas de coronación

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03

Oficina 072 785 269

keyszen.sas@gmail.com

www.keyszen.com

Machala - El Oro - Ecuador

Durante el periodo enero 25 del 2023 a febrero 28 del 2023. En la ejecución del proyecto **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**

LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LAS MEDIDAS AMBIENTALES SE HAN CUMPLIDO

6. CONCLUSIONES

Podemos concluir en el presente informe mensual la administración del Proyecto **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA,** tiene como objetivo continuar con el cumplimiento de las medidas ambientales y así mitigar el impacto que esta obra pueda ocasionar en los moradores del sector.

En ese contexto, se recomienda continuar con la implementación del Plan de Manejo Ambiental, así como también el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad del personal.

Elaborado por:



firmado electrónicamente por:
JESSICA GISELLA
GOROZABEL ROSILLO

Jessica Gorozabel Rosillo
INGENIERO AMBIENTAL

Aprobado por:



firmado electrónicamente por:
JESSICA MARIELA
JARAMILLO ARMIJOS

Jessica Jaramillo Armijos
KEYSZEN S.A.S.
FISCALIZADOR EXTERNO



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4960-M

Puyo, 13 de abril de 2023

PARA: Sra. Ing. Eryka Mireya Silva Manzano
Fiscalizador 1

ASUNTO: OBSERVACIONES PLANILLA DE OBRA AVANCE 1: "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA â JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA"

En relación al Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2023-7221-M, de fecha 03 de abril de 2023, se procede a devolver el trámite de la Planilla de Avance N° 01 del proyecto: "ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", una vez que se ha realizado el control previo a la documentación, encontrando las siguientes observaciones:

1. Corregir unidad anexo del rubro N° 3
2. Verificar el periodo de la planilla
3. Verificar el periodo de la conformidad Ambiental

Con estos antecedentes, se solicita subsanar los hallazgos encontrado, con el fin de dar continuidad al trámite administrativo pertinente; **adicional aquello, toda información deberá ser anexada en el Sistema de Gestión Documental Yasuni Quipux.**

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Álvaro Renato Sosa Castro
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

Referencias:

- GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2023-7221-M

Anexos:

- anexo_03.pdf
- informe_adm_obra_avance_1-signed.pdf
- 12_oficio_de_informe_cumplimiento_direccion_de_fiscalizacion.pdf
- 13_oficio_devolucion_de_planilla_de_avance_no_01.pdf
- 18_oficio_devolucion_dos_de_planilla_de_avance_no_01.pdf
- 19_oficio_entrega_de_planilla_de_avance_de_obra_no_01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- 20_oficio_entrega_de_planilla_de_fiscalizacion_no_01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- 21_oficio_entrega_tramite_permiso_ambiental_lico-gadppz-006-20220011566001680534156.pdf
- anexo_01.pdf

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4960-M

Puyo, 13 de abril de 2023

- anexo_02.pdf
- anexo_22.pdf
- anexo_21.pdf
- anexo_18.pdf
- anexo_17.pdf
- anexo_17_justificativo.pdf
- anexo_100579016001680534273.pdf
- anexo_07.pdf
- anexo_04.pdf
- anexo_04_justificativo.pdf
- anexo_04_justificativo_civil_3d.pdf
- anexo_43.pdf
- anexo_42.pdf
- anexo_41.pdf
- anexo_40.pdf
- anexo_39.pdf
- anexo_38.pdf
- anexo_37.pdf
- anexo_35.pdf
- anexo_36.pdf
- anexo_44.pdf
- anexo_planita_y_perfil_lamina_01.pdf
- memo_de_pago0468651001680534559.pdf
- anexo_planita_y_perfil_lamina_02.pdf
- cronograma_valorado_de_trabajos-signed_firmado-signed.pdf
- oficio_entrega_de_planilla_de_avance_de_obra_no_01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- planilla_de_avance_principal_n_01_firmado-signed-signed.pdf
- cambio_de_adm._asfalto_curaray-signed-signed-signed_(1).pdf
- 2._acta_de_inicio_curaray-signed-signed-2-signed-signed_(2).pdf
- notificación_adm.pdf
- memorando_nro._gadppz-unidad-vial-2023-7221-m.pdf

Copia:

Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaria Ejecutiva 2** /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - Secretaria Ejecutiva 2



ALVARO RENATO SOSA
CASTRO



GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA



DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Pastaza

03 ABR 2023

Fecha:

Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2023-7221-M

Recibido: JORDAN M.

Puyo, 03 de abril de 2023

Número: _____ Hora: 11:50**PARA:** Sr. Ing. Álvaro Renato Sosa Castro
Director de Fiscalización**ASUNTO:** PLANILLA DE OBRA AVANCE 1: "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA a JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA"

De acuerdo a los Art(s). 70. de la LOSNCP; 121. del RLOSNC; 408 - 16 y 408 - 17 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS (Acuerdo 039-CG), en lo que refiere a la "ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO", en atribuciones exclusivas y únicas a lo que la Ley señala para mi designación como Administrador de Contrato; en relación al contrato "ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", a la presente fecha una vez que el Ing. Fiscalizador Externo ha procedido a remitir la **PLANILLA DE AVANCE 1** correspondiente al mes y periodo desde el **25/01/2023 al 28/02/2023** con un VALOR LIQUIDO A PAGAR de \$ 135.446,45 USD Dólares Americanos SIN IVA, con un REAJUSTE PROVISIONAL DE LA **PLANILLA N° 1** de \$1.973,63 USD Dólares Americanos SIN IVA, una vez revisada la información me permito manifestar la conformidad de la documentación adjunta para su debido proceso.

En virtud de lo expuesto y en cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas en el CONTRATO - CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO, solicito por medio de su persona **SE PROCEDA CON EL PAGO** de la **PLANILLA DE AVANCE 1** a favor del AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A Contratista responsable de la obra.

Una vez efectuada todas las correcciones necesarias requeridas es conveniente continuar con el trámite pertinente.

Adjunto información para su debido proceso.

Particular que se comunica para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eryka Mireya Silva Manzano
FISCALIZADOR 1

Anexos:

- informe_adm_obra_avance_1-signed.pdf
- 12_oficio_de_informe_cumplimiento_direccion_de_fiscalizacion.pdf
- 13_oficio_devolucion_de_planilla_de_avance_no_01.pdf
- 18_oficio_devolucion_dos_de_planilla_de_avance_no_01.pdf



Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2023-7221-M

Puyo, 03 de abril de 2023

- 19_oficio_entrega_de_planilla_de_avance_de_obra_no_01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- 20_oficio_entrega_de_planilla_de_fiscalizacion_no_01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- 21_oficio_entrega_tramite_permiso_ambiental_lico-gadppz-006-20220011566001680534156.pdf
- anexo_01.pdf
- anexo_02.pdf
- anexo_03.pdf
- anexo_04_justificativo_civil_3d.pdf
- anexo_04_justificativo.pdf
- anexo_04.pdf
- anexo_07.pdf
- anexo_100579016001680534273.pdf
- anexo_17_justificativo.pdf
- anexo_17.pdf
- anexo_18.pdf
- anexo_21.pdf
- anexo_22.pdf
- anexo_35.pdf
- anexo_36.pdf
- anexo_37.pdf
- anexo_38.pdf
- anexo_39.pdf
- anexo_40.pdf
- anexo_41.pdf
- anexo_42.pdf
- anexo_43.pdf
- anexo_44.pdf
- anexo_planita_y_perfil_lamina_01.pdf
- memo_de_pago0468651001680534559.pdf
- anexo_planita_y_perfil_lamina_02.pdf
- cronograma_valorado_de_trabajos-signed_firmado-signed.pdf
- oficio_entrega_de_planilla_de_avance_de_obra_no_01_lico-gadppz-006-2022.pdf
- planilla_de_avance_principal_n_01_firmado-signed-signed.pdf



Firmado y certificado por:
**ERYKA MIREYA SILVA
MANZANO**



OK

INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA

PLANILLA No. 1 DE AVANCE DE OBRA
Período de Ejecución: 25/01/2023 al 28/02/2023

A) ANTECEDENTES:

Con fecha 07 de noviembre de 2022, el GAD Provincial de Pastaza suscribe con la CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A., el contrato para la ejecución de la obra: "ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Mediante RESOLUCIÓN N° 713-GADPPz-2022 según RESOLUCIÓN N° 713-GADPPz-2022 de Obra: "ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

B) DATOS GENERALES:

Código del proceso de contratación:	LICO-GADPPz-006-2022
Objeto del contrato:	"ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".
Monto del contrato:	\$ 4,650,521.23USD sin incluir IVA
07	07 de noviembre del 2022
Monto del anticipo:	-
Fecha de inicio de plazo:	25 de enero del 2023
Fecha de terminación contractual:	18 de julio de 2024
Contratista:	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A
Administrador de Contrato:	Ing. Eryka Silva M.

C) PLAZOS Y AVANCE

C.1 PLAZO DEL CONTRATO

Plazo total inicial: 540 días.



C.2 AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA DE LA PLANILLA

Fecha de aprobación:	
Días de ampliación aprobados:	
Motivación:	

C.3 PARALIZACIONES EN EL MES A PLANILLAR

Fecha de suspensión:	NINGUNA
Fecha de reinicio:	NINGUNA

C.4 REPROGRAMACIONES

No.	Fecha	Motivación
1	25 de enero 2023	Reprogramado a la fecha de inicio.
2		

C.5 CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

No.	Fecha de suscripción	Código de contrato	Monto	Motivación
1	NINGUNA		0.00	

D) DESARROLLO DEL PLANILLAJE

PLANILLA: MONTO LÍQUIDO A PAGAR: ANTICIPO DEVENGADO:

PLANILLA 1 \$ 135.446,45 USD
 REAJUSTE PROV. AVANCE 1 1.973,63 USB

TOTAL \$ 135.446,45 USD

MONTO DE AVANCE 1 ECONÓMICO TOTAL: \$ 135.446,45
 MONTO REAJUSTE PROV. AVANCE 1 1.973,63
 TOTAL ANTICIPO DEVENGADO:
 % DE AVANCE TOTAL: % 2,91
 MULTA PLANILLA 1: \$ 0,00
 TOTAL MULTAS: \$ 0,00
 VALOR LÍQUIDO A PAGAR EN ESTA PLANILLA: \$ 137.440,08
 (VALOR TOTAL - MULTA - % DE ANTICIPO DEVENGADO)

E) ANÁLISIS DEL PERÍODO DE PLANILLAJE

E.1 ANÁLISIS DE PLANILLAJE

ÍTEM	PARÁMETRO DE CUMPLIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
A	Avance de obra de acuerdo al cronograma	X		
B	Retardo parcial en el período de la planilla		X	
C	Disposiciones del Administrador	X		
D	Disposiciones del Fiscalizador	X		
E	Cumplimiento de especificaciones técnicas	X		
F	Utilización de maquinaria ofertada	X		
G	Asistencia a las reuniones	X		
H	Asistencia del personal ofertado	X		

I	Obstaculización de trabajos a otros contratistas o al contratante		X	
J	Demora en la presentación de planillas a Fiscalización		X	
K	Normativa de Seguridad Industrial y Seguro Ocupacional	X		
L	Normativa de Manejo Ambiental	X		

E.2 ANÁLISIS DE MULTAS (del periodo planillado)

ÍTEM	DETALLE DEL OBJETO DE SANCIÓN	MONTO BASE PARA CÁLCULO	%	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	No. DE DÍAS	VALOR DE LA MULTA
A							
B							
C							
D							
TOTAL DE MULTAS EN ESTE PERÍODO DE PLANILLAJE:							

F) CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN

GARANTÍA DE BUEN USO DEL ANTICIPO	VIGENTE
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENTE
SEGURO SOCIAL	SI CUMPLE

En virtud del presente informe y en calidad de Administrador de Obra, **SE APRUEBA Y SE SOLICITA** se proceda con el pago de la **Planilla de Avance de Obra No.1**, con el siguiente detalle.

PORCENTAJE DE AVANCE PARCIAL EN ESTE PERÍODO	2,91 %
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	2,91 %
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE PLANILLA AVANCE 1	\$ 135.446,45
VALOR TOTAL DE REAJUSTE PROV. AVANCE 1	\$ 1.973,63
DEVENGACIÓN DEL ANTICIPO EN ESTE PERÍODO	-
DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTAS PARA ESTA PLANILLA	\$0.00
VALOR LIQUIDO A PAGAR:	\$ 137.440,08

SON: ciento treinta y siete mil cuatrocientos carenta 08/100 centavos de dólar.

TODAS LAS RETENCIONES TRIBUTARIAS SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL GADPPz.

Att,



Firmado electrónicamente por
ERYKA MIREYA SILVA
MANZANO

Ing. Eryka Silva M.
ADMINISTRADOR DE CONTRATO



OFICIO N° GADPPz-ES-2023-001

Puyo, 25 de enero de 2023

Señor

Odilo Guevara

REPRESENTANTE LEGAL DE AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S. A.

CONTRATISTA

Presente. -

De mi consideración:

Una vez revisado toda la documentación con respecto al contrato cuyo objeto es: **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, se remite el acta de inicio de obra de los trabajos a ejecutarse para dicho mantenimiento, en donde se da como fecha de inicio de la obra el **25 de enero de 2023.**

Particular que comunico, para los fines pertinentes.

Atentamente.



Firmado electrónicamente por:
**ERYKA MIREYA SILVA
MANZANO**

Ing. Eryka Silva M.

ADMINISTRADORA DE CONTRATO



ACTA DE INICIO DE OBRA
PROCESO: CODIGO-LICO-GADPPz-006-2022

En la ciudad de Puyo, a los veinticinco de enero del 2023, se procede a la entrega en sitio donde se ejecutarán los trabajos concernientes al Contrato suscrito con fecha 07 de noviembre del 2022, cuyo objeto de contratación es: **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza con su representante legal el Ing. Jaime Guevara, Prefecto de Pastaza; por otro lado, en calidad de contratista AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S. A., representado legalmente por el Sr. Odilo Guevara Marín; KEYSZEN.S.A.S. en calidad de Fiscalizador Externo y la Ing. Eryka Silva M. en calidad de Administradora de Contrato; con la finalidad de suscribir la presente Acta de inicio de obra, la misma que consta de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES. -

Con fecha 07 de noviembre del 2022 se suscribió el contrato cuyo objeto de contratación es: **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**. Los trabajos se ejecutarán en varias comunidades de la provincia de Pastaza, con sujeción a diseños, especificaciones y más documentos contractuales, por un monto de U.S.D. \$4'650.521,23 en un plazo de 540 días.

Mediante Memorando Nro. GADPPZ-PROCURADURIA-2023-4383-M con fecha 06 de enero del 2023 se recibe la NOTIFICACIÓN DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO mediante Resolución N° 713- GADPPz-2022, de fecha 01 de diciembre, Resuelve mediante el Art. 2.- DESIGNAR a la Ing. Eryka Silva M. como Administradora de Contrato.

Con fecha 25 de enero de 2023, y según las Normas de control interno de Contraloría (NCI) Art. 408-17, literal g, la Administradora de Contrato procede a la autorización de inicio de obra para dicha contratación cuyo objeto es: **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, signado con el código LICO-GADPPz-006-2022.

CLÁUSULA SEGUNDA: REVISIÓN DE DOCUMENTOS, INSPECCIÓN DE CAMPO Y ENTREGA DE SITIO EN OBRA. -

Los documentos revisados son: El Contrato, los Pliegos (condiciones particulares y Condiciones generales); las especificaciones técnicas, la oferta presentada por el contratista, presupuesto, cronograma valorado de trabajos, garantías, resolución de adjudicación y la notificación de inicio de obra.



La obra materia del contrato consta de lo siguiente:

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

No.	Rubro / Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio global
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	29.18	444.42	12,968.18
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	14.59	1,383.97	20,192.12
3	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	M	243.00	26.76	6,502.68
4	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M ³	68,863.54	1.02	70,240.81
5	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M ³	613.80	1.29	791.80
6	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M ³	8,576.91	5.02	43,056.09
7	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M ³	7,720.00	5.08	39,217.60
8	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M ³	8,746.43	0.82	7,172.07
9	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 0.80 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	126.00	166.33	20,957.58
10	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	263.00	272.20	71,588.60
11	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 2.20 M ,E=3.0 MM ,MP-100	ML	46.00	562.20	25,861.20
12	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M ³	4,746.82	167.21	793,715.77
13	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M ²	763.00	167.20	127,573.60
14	HORMIGON SIMPLE EN OBRAS DE ARTE F'C=240 KG/CM2	M ³	78.47	162.46	12,748.24
15	PIEDRO ESTRUCTURAL F'Y=4200 KG/CM2	KG	8,288.90	1.94	16,080.47
16	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M ³	400.00	70.12	28,048.00
17	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M ³	83,263.76	3.00	249,791.28
18	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M ³	21,010.98	12.44	261,376.59
19	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M ³	13,031.28	15.78	205,633.60
20	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M ³	8,746.43	1.02	8,921.36
21	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M ³ -KM	3,309,493.83	0.25	827,373.46
22	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M ³ -KM	781,104.32	0.25	195,276.08
23	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M ³ -KM	484,450.99	0.25	121,112.75
24	IMPRESIONADO CON EMULSION ASFALTICA	LT	171,247.08	0.76	130,147.78
25	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M ²	122,319.34	9.74	1,191,390.37
26	BORDILLO DE H.S.(F'C=210 KG/CM2 - 0,14X0,40)	M	2,000.00	14.64	29,280.00
27	ACERAS DE H.S. F'C=180KG/CM2 E=7CM-ESCOBILLADO	M ²	3,000.00	19.32	57,960.00
28	MARCAS EN PAVIMENTO	M	43,626.97	0.40	17,450.79
29	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	3,895.00	7.32	28,511.40
30	PAN CARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1.00	1,179.51	1,179.51
31	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	2.00	354.87	709.74
32	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	4.00	354.87	1,419.48
33	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10.00	111.50	1,115.00
34	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	200.00	111.50	22,300.00
35	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	4.00	78.18	312.72
36	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	4.00	163.34	653.36
37	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	4.00	17.57	70.28
38	KIT ANTIDERRAMES	U	4.00	157.50	630.00
39	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	1,000.00	0.32	320.00
40	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	20.00	22.48	449.60
41	SUMINISTRO DE PALETA DE ALTO Y SIGA	U	4.00	30.32	121.28
42	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	100.00	100.00
43	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	100.00	100.00
44	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	100.00	100.00
				TOTAL:	4,650,521.23

SON : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO DOLARES, 23/100 CENTAVOS
PLAZO TOTAL: 540 DIAS



En la inspección realizada al sitio donde se ejecutarán los trabajos, el Administrador, Fiscalizador y Contratista determinan la necesidad de recorrer y entregar los sitios donde se ejecutarán los trabajos de dicho mantenimiento.

Se deja constancia que las condiciones climáticas imperantes son apropiadas para realizar los trabajos y que las vías de acceso están libres de interrupción por lo que, se acuerda **iniciar los trabajos a partir del 25 de enero de 2023.**

CLÁUSULA TERCERA: PLAZO

En conformidad con lo previsto en la Cláusula Octava del contrato, el plazo previsto para ejecutar la totalidad de los trabajos es de quinientos cuarenta días (540 días), contados a partir de la fecha de suscripción de contrato, de donde la notificación por escrito de administrador de Contrato y Fiscalización llega con fecha **25 de enero de 2023**, por tanto, se inicia a partir de la misma dando como resultado los siguientes plazos contractuales:

- **Firma del contrato:** 06 de enero del 2023
- **Fecha Notificación de Administrador de Contrato:** 06 de diciembre 2022.
- **Fecha Notificación de inicio de obra:** 25 de enero de 2023
- **Fecha de inicio plazo contractual:** 25 de enero de 2023
- **Fecha de terminación de plazo contractual:** 18 de julio de 2024

Por tanto, la fecha de terminación del plazo contractual es el 03 de julio de 2024 en conformidad con el cronograma valorado de trabajos previsto en el proceso de contratación de las obras (ajustado a la fecha de inicio de obra).

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES

El contratista ejecutará las obras contratadas en los plazos y en las cantidades establecidas en el contrato, observará y cumplirá todas las leyes y reglamentos en cuanto a uso de maquinaria y personal vigentes en el país. De igual forma a disponer del personal técnico de acuerdo a lo especificado en su propuesta.

La fiscalización y administración cumplirá con todas las funciones y actividades necesarias para que la ejecución de la obra, observando los documentos precontractuales, el contrato vigente, las especificaciones técnicas, técnicas constructivas adecuadas, leyes y reglamentos vigentes en el país para este tipo de actividades.

CLÁUSULA QUINTA: DISPOSICIONES DE FISCALIZACIÓN.

Las inquietudes de tipo general que tenga el contratista, serán absueltas durante el proceso constructivo por parte de Fiscalización, caso contrario si hubiera controversias entre el Contratista y el Fiscalizador podrá intervenir el Administrador de Contrato.

Para constancia de lo actuado y por lo antes expuesto, en unidad de acto se suscribe la presente Acta de inicio de obra.



Firmado electrónicamente por:
**JESSICA MARIELA
JARAMILLO ARMIJOS**

Ing. **Jessica Mariela Jaramillo Armijos**
Representante Legal
KEYSZEN.S.A.S
FISCALIZADOR EXTERNO



Firmado electrónicamente por:
**ODILIO VINICIO
GUEVARA MARIN**

Sr. Odilio Guevara
Representante Legal
AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S. A.
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
**ERYKA NIREYA SILVA
MANZANO**

Ing. **Eryka Silva M.**
ADMINISTRADORA DE CONTRATO GADPPz

Memorando Nro. GADPPZ-PROCURADURIA-2023-4383-M

Puyo, 06 de enero de 2023

PARA: Sr. Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña
Director de Obras Publicas

ASUNTO: CAMBIO DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO: "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

En respuesta al Documento No. GADPPZ-OBRAS-PUBLICAS-2022-8665-M

se adjunta la Resolución de Cambio, Administrador de Contrato, de la obra: "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", cuyo código de proceso es LICITACIÓN DE LA OBRA GADPPz-006-2022. para la continuación del trámite correspondiente.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Alejandro Bolivar Torres Altamirano
PROCURADOR SÍNDICO (E)

Referencias:

- GADPPZ-OBRAS-PUBLICAS-2022-8665-M

Anexos:

- presupuesto_asfalto_curary_jatumpaccha_2022_completo.pdf
- sercop-dsp-2022-5216-of.pdf
- acta_de_respuestas.pdf
- acta_de_calificacion_comision.pdf
- acta_1_designacion_de_secretario_curaray-signed-signed-signed-signed0963056001660252882.pdf
- cert_presupuestaria_plurianual.pdf
- cert_poa.pdf
- cert_pac_consolidado_socce0741270001665764948.pdf
- autorizacion_lico_.pdf
- acuerdo_multipartes_lico_006-signed0164837001665764948.pdf
- acta_de_convalidacion_curaray-signed-signed-signed-signed0840089001665764947.pdf
- a_2_desagregacion_tecnologica_curaray_2022-signed-signed-signed-signed-signed0605949001665764947.pdf
- et.pdf
- estudios_y_disenos_actualizados.pdf
- estado_procesos_lico_006.pdf
- cge_informe_de_pertinencia.pdf
- certificacion_pac-signed-signed08422110016603191810088810001665765019.pdf
- certificacion_catalogo_electronico-signed04872870016603191810806138001665765018.pdf



Memorando Nro. GADPPZ-PROCURADURIA-2023-4383-M

Puyo, 06 de enero de 2023

- reporte_de_ofertas_cargadas_al_soco.pdf
- parametros_curaray_lico006.pdf
- obras-publicas-2022-5861-mcomision_lico005.pdf
- ficha_ambiental_curaray_-_jatunpacch.jpg
- equipo_asfalto_curaray_jatunpaccha_2022_completo_1_1-signed.pdf
- crobarras_asfalto_curaray_jatunpaccha_2022_completo_1_1-signed.pdf
- analisis_pu_vae_asfalto_curaray_jatunpaccha_2022_completo.pdf
- resoluciónde_inicio0089864001665765086.pdf
- resolucio_n_apro_bacion_dt.pdf
- requerimiento_curaray_2022-signed-signed-signed-signed-signed-signed0372464001665765085.pdf
- material_asfalto_curaray_jatunpaccha_2022_completo_1_1-signed.pdf
- formula_asfalto_curaray_jatunpaccha_2022_completo_1_1-signed.pdf
- cuadrilla_asfalto_curaray_jatunpaccha_2022_completo_1_1-signed.pdf
- mobra_asfalto_curaray_jatunpaccha_2022_completo_1_1-signed.pdf
- 'l2_vía_10_de_agosto_-_el_trunfo,_canton_y_provincia_pastaza.docx-signed-5-signed-signed-signed.pdf
- ppem_vae_cpc_asfalto_curaray_jatunpaccha_2022_completo_1_1-signed.pdf
- mobra_asfalto_curaray_jatunpaccha_2022_completo_1_1-signed0696815001665765104.pdf
- reclamo0086782001665765174.pdf
- c&h_ingenieria_y_proyectos_mypes0933315001665765173.pdf
- amazonas_building_amazonbuild_sa_mypes0828350001665765173.pdf
- alvarado-ortiz_constructores_cia_revisio_n_mypes0090502001665765173.pdf
- o_de_orellana_-_jatunpaccha,_hasta_km_12_via_10_de_agosto_-_el_trunfo.docx-signed-signed-signed.pdf
- notificacion_administrador_ing_roberth_quintana_lico_006-2022-signed.pdf
- obras_publicas_2022_8665-m.pdf
- cambio_de_adm__asfalto_curaray-signed-signed-signed0295437001673025564.pdf

Copia:

Sra. Ing. Lucy Cristina Carvajal Caicedo - **Secretaría Ejecutiva 2** / Sr. Ing. Álvaro Renato Sosa Castro - **Director de Fiscalización** / Sr. Ing. Jaime Andres Silva Cordova - **Analista de Unidad Vial 1** / Sra. Ing. Eryka Mireya Silva Manzano - **Fiscalizador 1** / Sra. Ing. Gabriela Tatiana Luzuriaga Rosado - **Jefe de Compras Públicas (E)** /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sr. Abg. Elvis José Yanez Lara - Abogado 1



Firmado electrónicamente por:
**ALEJANDRO BOLIVAR
TORRES ALTAMIRANO**

RESOLUCIÓN N° 713-GADPPz-2022

Ing. Jaime Guevara Blaschke
**PREFECTO DEL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

CONSIDERANDO:

Que, el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia según el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador; por lo tanto, las compras gubernamentales que realicen las entidades que integran el sector público deben tener respaldo constitucional; en tal virtud, el Art. 288 Ibídem, expresamente determina que: *“Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas”*;

Que, el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador al hablar de seguridad jurídica establece: *“la seguridad jurídica y confianza legítima se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”* el Art. 238 reconoce a los Gobiernos Autónomos Descentralizados: *“autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional”*;

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece el principio de legalidad y la obligatoriedad de sujeción al universo jurídico que regula la Administración Pública: *“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúan en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”*;

Que, el Art. 49 del COOTAD, determina que *“Prefecto o prefecta provincial. - El prefecto o prefecta provincial es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado provincial, elegido en binomio con el Viceprefecto o Viceprefecta por votación popular, de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstos en la ley de la materia electoral”* mientras que con relación a las Atribuciones del Prefecto Provincial la norma Ibídem determina: *“Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo; expedir la estructura orgánico - funcional del gobierno autónomo descentralizado provincial; nombrar y remover a los funcionarios de dirección, procurador síndico y demás servidores públicos de libre nombramiento y remoción del gobierno autónomo descentralizado provincial; suscribir contratos,*



convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado provincial, de acuerdo con la ley”;

Que, mediante segundo Suplemento del Registro Oficial No. 31 de fecha 07 de julio del 2017, la Asamblea Nacional en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República y el numeral 6 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expide el siguiente: Código Orgánico Administrativo;

Que, el Art. 39 del COA, dice: Respeto al ordenamiento jurídico y a la autoridad legítima: *Las personas cumplirán, sin necesidad de requerimiento adicional, con lo dispuesto en la Constitución, las leyes y el ordenamiento jurídico en general y las decisiones adoptadas por autoridad competente;*

Que, el Art. 44 del Código Orgánico Administrativo al respecto de las entidades públicas establece: **“Administración Pública.** La administración pública comprende las entidades del sector público previstas en la Constitución de la República” en relación a quien ejerce la máxima autoridad el Art. 47 de la norma *Ibídem* determina: “Representación legal de las administraciones públicas. La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley”;

Que, el Art. 98 Código Orgánico Administrativo determina: “Acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital, y quedará constancia en el expediente administrativo”, respecto de este ordenamiento jurídico esta Autoridad actúa con estricto apego a los requisitos de validez establecidos en el siguiente artículo de la norma citada, situación que garantiza el cumplimiento y respecto de la seguridad jurídica con la cual se actuado en el proceso de contratación”, de tal forma que el presente acto jurídico cumple con lo indicado en la normativa administrativa;

Que, el Art. 110 del COA, dice: Reglas generales de convalidación. El acto administrativo con vicios subsanables se considera convalidado cuando, previa rectificación de los vicios, conste en el expediente la declaración de la administración pública, en este sentido o por preclusión del derecho de impugnación. La convalidación se efectúa respecto del acto administrativo viciado íntegramente, por lo que no cabe la convalidación parcial. Producida la convalidación, los vicios del acto administrativo se entienden subsanados y no afectan la validez del procedimiento o del acto administrativo. **La convalidación produce efectos retroactivos desde la fecha en que se expidió el acto originalmente viciado;**



Que, el Art. 121 del COA, dice: Instrucción, orden de servicio o sumilla. Los órganos administrativos pueden dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes a través de una instrucción, orden de servicio o sumilla claras, precisas y puestas en conocimiento de la persona destinataria. Pueden constar insertas en el mismo documento al que se refieren o por separado. Para su instrumentación se puede emplear cualquier mecanismo tecnológico. Su incumplimiento no afecta la validez del acto, independientemente de la responsabilidad disciplinaria de la o el servidor público;

Que, el ACUERDO No. 039-CG NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS, 408-16 Administración del Contrato y Administración de la Obra, en su inciso final, dice: *En las organizaciones donde se cuenta con un Director de Obras Públicas o un Jefe de la unidad, éste generalmente asume las funciones de administrador del contrato o administrador de la obra. En otras entidades, con muchos proyectos, el administrador del contrato puede asumir la supervisión o manejo de varias obras;*

Que, el Art. 70 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública conforme *"Administración del contrato. - Los contratos contendrán estipulaciones específicas relacionadas con las funciones y deberes de los administradores del contrato, así como de quienes ejercerán la supervisión o fiscalización (...)"*;

Que, el Art. 22 de la LOSEP, dice: Deberes de las o los servidores públicos. - Son deberes de las y los servidores público: *b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia que emplean generalmente en la administración de sus propias actividades;*

Que, mediante Memorando Nro. GADPPZ-GADPPZ-2022-4706-M, de fecha 22 de noviembre de 2022, suscrito por el Ing. Jaime Guevara, Prefecto Provincial, para el Mgs. Alejandro Torres, Procurador Sindico (E) del GADPPz, en el cual manifiesta que, *"Señor Procurador Sindico, por requerimiento institucional dispongo se proceda al cambio de Administrador de Contrato del proyecto "ASFALTO VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA". Se designa a la Ing. Eryka Mireya Silva Manzano, en calidad de Administradora de Contrato del referido proyecto, para que actúe de conformidad con lo dispuesto en la Ley."*, por lo que mediante sumilla inserta de la Máxima Autoridad del GADPPz, Ing. Jaime Guevara Blaschke, Prefecto Provincial, dispone: *"CAMBIO DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO PROYECTO: "ASFALTO VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"*;

Por las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo, y en uso de mis atribuciones legales y Constitucionales esta Autoridad.

RESUELVE:

Art. 1.- DEJAR SIN EFECTO la designación del Ing. Robert Quintana Muñoz, como Administrador del contrato para el “ASFALTO VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”.



Art 2.- DESIGNAR a la Ing. Eryka Mireya Silva Manzano, como Administradora del contrato para la “ASFALTO VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”, desde el 22 de noviembre de 2022 en adelante, conforme a la sumilla inserta de la Máxima Autoridad del GADPPZ, en el memorando Nro. GADPPZ-GADPPZ-2022-4706-M, de fecha 22 de noviembre de 2022, a fin de que supervise la fiel ejecución del presente objeto de contratación de conformidad con los Artículos 70 y 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con el Art. 295 del Reglamento de la norma referida y el capítulo II, sección I, de la Codificación de Resoluciones en la que se realizan las Disposiciones Comunes sobre Administradores de Contratos;

Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, hoy 01 de diciembre de 2022.

Notifíquese y Cúmplase. –

 Firmado electrónicamente por:
**JAIME PATRICIO
GUEVARA
BLASCHKE**

Ing. Jaime Guevara Blaschke.
**PREFECTO DEL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA.**

Elaborado por:	Abg. Paul Benavidez G	 Firmado electrónicamente por: PAUL ANDRES BENAVIDEZ GUEVARA
Revisado por:	Mgs. Alejandro Torres	 Firmado electrónicamente por: ALEJANDRO BOLIVAR TORRES ALTAMIRANO

Puyo, 30 de marzo 2023

Ingeniera
Eryka Mireya Silva Manzano
Administrador de Contrato
Contrato LCC-GADPPz-004-2022
GAD Provincial de Pastaza
Presente. —

De mi consideración:

Mediante Contrato **LICO-GADPPz-006-2022** suscrito el 07 de noviembre del 2022, dentro del Proceso de **LCC-GADPPz-004-2022**, para el **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, entre la Compañía **AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.** y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, con un Anticipo del 0%, por un monto de **USD \$ 4'650.521,23 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 23/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) SIN INCLUIR IVA**, y un Plazo de 540 Días contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Obra.

En referencia al Oficio No. **GADPPz-ES-2023-003**, de fecha 24 de marzo del 2023. Esta fiscalización aprueba este documento para continuar los tramites de aprobación permitentes y extiende la Planilla de Avance de Obra No. 01., del Periodo: 25 de enero al 28 de febrero del 2023.

Por la atención al presente le anticipo mis sinceros agradecimientos.

Sin otro particular por el momento, me despido.

Atentamente,




Firmado electrónicamente por:
JESSICA MARIELA
JARAMILLO ARMIJOS

Ing. Jessica Jaramillo
C.C. 0704239128
Gerente General
KEYSZEN S.A.S.
RUC 0791840462001

KEYSZEN 
INGENIERIA & CONSTRUCCION
Machala - El Oro - Ecuador

CC. **AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.**
Archivo

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03
Oficina 072 785 269
keyszen.sas@gmail.com
www.keyszen.com
Machala - El Oro - Ecuador

Recibido
31/03/2023





MAZONAS BUILDING S.A.

Puyo - Pastaza - Ecuador

INFORME DE FISCALIZACIÓN

"ASFALTADO DE LA VIACURARAY -FRANCISCO DE ORELLANA-JATUN PACCHA, HASTA EL KILOMETRO
12 VIA 10 DE AGOSTO -EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO – CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA

KEYSZEN S.A.S.
FISCALIZADOR EXTERNO/

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA No.01

PROYECTO: ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO – CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA: CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A)

MONTO DEL CONTRATO: 4'650,521.23 USD./

PERIODO DEL INFORME: 25 DE ENERO DEL 2023 – 28 DE FEBRERO DEL 2023 /

FECHA DE ELABORACIÓN: 02 DE MARZO DEL 2023 ✓

CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	4
2. ASPECTOS CONTRACTUALES DE LA OBRA	5
3. PERIODO DEL INFORME.....	6
4. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO	6
5. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS Y PLUVIOMÉTRICAS EN LOS FRENTE DE OBRA ..	9
6. DESCRIPCIÓN POR FRENTE DE OBRA	13
7. OBRA EJECUTADA DURANTE EL PERÍODO Y ACUMULADA.....	17
8. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN.....	26
9. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS ADOPTADAS PARA CUMPLIR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	26
10. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.....	27
11. GESTIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DURANTE EL PERÍODO	27
12. RESUMEN DE MONTOS EJECUTADOS PLANILLAS CONTRACTUALES	28
13. RESUMEN A LA FECHA DEL PROYECTO	28
14. ACCIONES EFECTUADAS POR LA FISCALIZACIÓN.....	28
15. UTILIZACIÓN DE RECURSOS, DE EQUIPOS Y DE MANO DE OBRA	29
- INCIDENCIAS PRODUCIDAS EN LA OBRA	30
- CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES	30
- OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS.....	30
16. CONTROL DE COSTOS.....	31
17. INFORME DETALLADO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 33	
18. RESUMEN DE CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES.....	42
19. REPORTE FOTOGRÁFICO.....	42
20. INFORME DEL PERSONAL.....	50
21. CONCLUSIONES	51
22. RECOMENDACIONES.....	52
23. BIBLIOGRAFÍA.....	52
24. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME	52

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Control de plazo.....	6
Ilustración 2 Categorías de nubosidad en enero 2023 en Puyo.....	10
Ilustración 3 Probabilidad de precipitación en enero 2023 en Puyo	11
Ilustración 4 Promedio mensual de lluvia en enero 2023 en Puyo.....	11
Ilustración 5 Categorías de nubosidad en febrero 2023 en Puyo	12
Ilustración 6 Probabilidad de precipitación en febrero 2023 en Puyo.....	12
Ilustración 7 Promedio mensual de lluvia en febrero 2023 en Puyo	13
Ilustración 8 Diagrama de inversión programado vs ejecutado	32
Ilustración 9 Diagrama de avance programado vs ejecutado.....	32

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA.
CÓDIGO DEL PROCESO	LICO-GADPPz-006-2022 ✓
MONTO DEL CONTRATO	4'650,521.23 USD. ✓
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 de enero del 2023
PLAZO CONTRATUAL	540 días
FECHA INICIO DE TRABAJO	25 de enero del 2023
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	18 de julio del 2024
SUSPENSIÓN DE TRABAJO	Ninguno
AMPLIACION DE PLAZO	Ninguno
CONTRATISTA	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
GEOREFERENCIAL DEL PROYECTO	BALNEARIO DEL RÍO ARAJUNO - COMUNIDAD JATUNPACCHA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	ING. ERYKA MIREYA SILVA MANZANO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN

OBJETO DEL CONTRATO	FISCALIZACIÓN EXTERNA DEL ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO – CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA. ✓
CODIGO DEL PROCESO	LCC-GADPPz-004-2022

MONTO DEL CONTRATO	USD \$ 186,020.85
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 de enero del 2023
PLAZO CONTRACTUAL	540 días
MONTO DEL ANTICIPO	USD \$ 93,010.42
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	24 de enero del 2023
FECHA INICIO DE TRABAJO	25 de enero del 2023
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	18 de julio del 2024
AMPLIACIÓN DE PLAZO	Ninguno
FISCALIZADOR	KEYSZEN S.A.S.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	ING. ERYKA MIREYA SILVA MANZANO

2. ASPECTOS CONTRACTUALES DE LA OBRA

TIEMPO UTILIZADO DESDE LA FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO

El plazo contractual es de 540 días, de los cuales se ha utilizado 35 días desde la entrega del proyecto hasta el presente periodo que corresponde (25 de enero a 28 de febrero / 2023)

	PLAZO	PORCENTAJE
PLAZO TOTAL	540	100%
DÍAS UTILIZADOS	35	6.48%

Control de avance de plazos



Ilustración 1 Control de plazo

3. PERIODO DEL INFORME

El presente informe de avance de trabajos relacionado con la obra, recoge las actividades, eventos y circunstancias operativas ocurridas dentro del periodo: ENERO 25 – FEBRERO 28 / 2023.

4. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

El monto total del proyecto, alcanza la suma de **USD \$ 4'650,521.23** (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO DÓLARES CON 23/100 CENTAVOS) para la **CONSTRUCCIÓN DE ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO – CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA.**

TOTAL MONTO DEL PROYECTO:	USD \$ 4'650,521.23	100%
----------------------------------	----------------------------	-------------

Costo total de los diferentes rubros ejecutados

ITEMS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
1	Desbroce, desbosque y limpieza	-	1,422.14	1,422.14
2	Replanteo y nivelación a nivel de asfalto		2,214.35	2,214.35
3	Remoción de alcantarillas		1,659.12	1,659.12
4	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)		3,181.58	3,181.58
5	Excavación de cunetas de coronación			-
6	Excavación para cunetas y encauzamiento			-
7	Excavación y relleno de estructuras menores		11,031.68	11,031.68
8	Limpieza de derrumbes			-
9	S.C. Tubería de acero corrugado D= 0,80 m, e=2.5 mm, PM-100			-
10	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2.5 mm, PM-100		13,337.80	13,337.80
11	S.C. Tubería de acero corrugado D= 2,20 m, e=2.5 mm, PM-100			-
12	Hormigón para cunetas (F'c=180 KG/CM)			-
13	Muro de H.S. f'c=180kg/cm2 tipo B(Cabezales)			-
14	Hormigón simple en obras de arte F'c=240 KG/CM2			-
15	Hierro estructural fy=4200 kg/cm²			-
16	Muro de gaviones - calibre N° 12			-
17	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)		20,484.60	20,484.60
18	Material de subbase clase 3		13,995.00	13,995.00
19	Material de base granular de agregados			-
20	Transporte material de desalojo			-
21	Transporte de material pétreo de mejoramiento		56,298.51	56,298.51
22	Transporte de material pétreo de subbase clase 3		9,275.63	9,275.63
23	Transporte de material pétreo de base granular de agregados			-
24	Imprimación con emulsión asfáltica			-
25	C. rodadura hormigón asf. Mezclado en planta, e=2"			-
26	Bordillo de H.S.(f'c=210 kg/cm² - 0,14x0,40)			-
27	Aceras de H.S. f'c=180kg/cm² E=7cm escobillado			-
28	Marcas en pavimento			-
29	Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccionales y bidireccionales)			-
30	Pancarta informativa (lotero)-con estructura			-
31	Señales ecologicas (2.40x1.20)M			-
32	Señales informativas (2.40x1.20)M			-
33	Señales reglamentarias (0.75 x 0.75)M			-
34	Señales preventivas (0.75 x 0.75)M			-
35	Señales informativas y reglamentarias (0.60mx0.80m) móviles		312.72	312.72
36	Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.60m) móviles		653.36	653.36
37	Contenedores metálicos de 55 galones		70.28	70.28
38	Kit antiderrames		630.00	630.00
39	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)		28.80	28.80
40	S/C Cono de seguridad con protección UV, 71cm Incl. cinta reflectiva		449.60	449.60
41	Suministro de palota de alto y slga		121.28	121.28
42	Capacitación sobre preservación de recursos naturales (de 2 a 3 horas)		100.00	100.00
43	Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas)		100.00	100.00
44	Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 horas)		100.00	100.00

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03

Oficina 072 785 269

keyszen.sas@gmail.com

www.keyszen.com

Machala - El oro - Ecuador

		IMPORTANTE		
		T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
DESCUENTOS:	TOTAL	\$ 0.00	\$ 135,466.45	\$ 135,466.45
Anticipo	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Mora 0 días	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
VALOR A PAGARSE		\$ 0.00	\$ 135,466.45	\$ 135,466.45

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS DÓLARES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Reajuste de precios

PROYECTO: ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN: PARROQUIA 10 DE AGOSTO-CANTON PASTAZA-PROVINCIA DE PASTAZA

CONTRATISTA: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

ANEXO: REAJUSTE (PROVISIONAL) PLANILLA 1

FECHA: 02/03/2023

POR: \$ 1,973.63

NOTA:

FORMULA POLINOMICA DE REAJUSTE

$$Pr=Po(0.143 B1/Bo + 0.072 C1/Co + 0.031 COM1/COMo + 0.372 E1/Eo + 0.128 F1/Fo + 0.002 H1/Ho + 0.057 M1/Mo + 0.117 P1/Po + 0.023 T1/To + 0.022 X1/Xo)$$

CUADRILLA TIPO

DESCRIPCION	COEFICIENTE	Nov-22		PLANILLA # 1 Feb-23	
		T.D	TOTAL	T.D	TOTAL
		OPERADOR EQUIPO PESADO C1	0.059	4.29	0.25
OPERADOR EQUIPO PESADO C2	0.030	4.09	0.12	4.33	0.130
SIN TITULO D2	0.077	3.87	0.30	4.16	0.320
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3	0.000	4.30	0.00	4.55	0.000
CHOFER C1	0.302	5.62	1.70	5.95	1.797
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	0.040	4.29	0.17	4.55	0.182
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	0.003	4.00	0.01	4.33	0.013
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	0.152	3.87	0.59	4.1	0.623
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	0.337	3.83	1.26	4.05	1.365
	1.000		4.43		4.699

DESCRIPCION	SIMBOLO	COEFICIENTE E (a)	Nov-22		PLANILLA # 1 (Provisional) Feb-23		OBSERVACIONES
			PRECIO O INDICE (b)	PRECIO (I) INDICE (c)	RELACION d=(c/b)	TERMINO e=d*a	
			MANO DE OBRA	B	0.113	4.431	
CEMENTO PORTLAND-SACOS	C	0.072	185.910	210.310	1.131	0.081	Nivel Nacional
COMBUSTIBLES (PRECIOS NACIONALES SUBSIDIADOS)(O)	COM	0.034	252.130	252.130	1.000	0.034	Nivel Nacional
EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCC. VIAL	E	0.372	184.350	185.000	1.004	0.373	Nivel Nacional
BETUN PETRÓLEO (ASFALTO) (O)	F	0.128	746.200	746.200	1.000	0.128	Nivel Nacional
ACERO EN BARRAS	H	0.002	301.350	301.350	1.000	0.002	Nivel Nacional
MADERA ASERRADA, CEPILLADA Y/O ESCUADRADA (PREPAR	M	0.057	512.780	512.780	1.000	0.057	Nivel Nacional
MATERIALES PÉTREOS-TUNGURAHUA	P	0.147	221.600	214.220	0.967	0.142	Tungurahua
ALCANTARILLAS DE LÁMINAS DE METAL Y ACC.	T	0.023	202.060	202.000	1.000	0.023	Nivel Nacional
VARIOS IPC AMBATO	X	0.022	109.510	110.360	1.007	0.022	Nivel Nacional
	OK	1.000				1.015	<=FACTOR DE REAJUSTE

VALOR DE PLANILLA: \$ 135,466.45

PERIODO:

FECHA DE CIERRE DE OFERTAS:

FECHA DE REAJUSTE

REAJUSTE:

OBSERVACIONES:

1.015

Sub-Indices

Nov-22

Sub-Indices

Feb-23

VALOR A REAJUSTE (Po) \$ 135,466.45

VALOR REAJUSTADO (Pr=Po*I) \$ 137,410.08

VALOR DE REAJUSTE PRECIOS (Pr-Po) \$ 1,973.63

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03

Oficina 072 785 269

keyszen.sas@gmail.com

www.keyszen.com

Machala - El oro - Ecuador

VALOR A REAJUSTE (Po)	\$	135,466.45
VALOR REAJUSTADO (Pr=Po*f)	\$	137,440.08
VALOR DE REAJUSTE PRECIOS (Pr-Po)	\$	1,973.63

SON: MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES DÓLARES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

VALOR LÍQUIDO A PAGAR

PLANILLA DE AVANCE Nro. 01	\$ 135,466.45 USD.
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE Nro. 01	\$ 1,973.63 USD.
TOTAL A PAGAR	\$ 137,440.08 USD.

Fuentes de financiación del proyecto

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, GADPPz.

Subcontratistas

Ninguno

5. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS Y PLUVIOMÉTRICAS EN LOS FRENTE DE OBRA

ESTADO DEL TIEMPO	MAÑANA	TARDE
25/01/2023	NUBLADO	SOLEADO
26/01/2023	NUBLADO	LLUVIOSO
27/01/2023	LLUVIOSO	LLUVIOSO
28/01/2023	LLUVIOSO	NUBLADO
29/01/2023	NUBLADO	NUBLADO
30/01/2023	LLUVIOSO	NUBLADO
31/01/2023	LLUVIOSO	LLUVIOSO
01/02/2023	LLUVIOSO	SOLEADO
02/02/2023	LLUVIA FUERTE	LLUVIA FUERTE
03/02/2023	LLUVIOSO	LLUVIOSO
04/02/2023	LLUVIOSO	SOLEADO
05/02/2023	LLUVIA FUERTE	LLUVIOSO
06/02/2023	LLUVIA FUERTE	LLUVIOSO
07/02/2023	LLUVIOSO	LLUVIOSO
08/02/2023	NUBLADO	LLUVIOSO
09/02/2023	LLUVIOSO	LLUVIOSO
10/02/2023	LLUVIOSO	LLUVIOSO
11/02/2023	LLUVIA FUERTE	LLUVIOSO
12/02/2023	LLUVIOSO	LLUVIOSO
13/02/2023	LLUVIOSO	LLUVIOSO

14/02/2023	LLUVIOSO	NUBLADO
15/02/2023	LLUVIA FUERTE	LLUVIOSO
16/02/2023	SOLEADO	NUBLADO
17/02/2023	LLUVIOSO	SOLEADO
18/02/2023	NUBLADO	SOLEADO
19/02/2023	NUBLADO	LLUVIOSO
20/02/2023	LLUVIOSO	NUBLADO
21/02/2023	LLUVIOSO	LLUVIOSO
22/02/2023	LLUVIOSO	NUBLADO
23/02/2023	LLUVIOSO	NUBLADO
24/02/2023	LLUVIA FUERTE	LLUVIA FUERTE
25/02/2023	SOLEADO	NUBLADO
26/02/2023	SOLEADO	NUBLADO
27/02/2023	LLUVIOSO	NUBLADO
28/02/2023	LLUVIA FUERTE	LLUVIOSO

Nubosidad

El mes de enero del 2023, Puyo tiene nubosidad que *permanece esencialmente constante* y el porcentaje de tiempo que el cielo está *nublado* o *mayormente nublado* permanece en alrededor del 81 % durante el mes. El día más despejado del mes es el 4 de *enero*, con condiciones *despejadas*, *mayormente despejadas* o *parcialmente nubladas* el 21 % del tiempo. (Weatherspark, 2023)

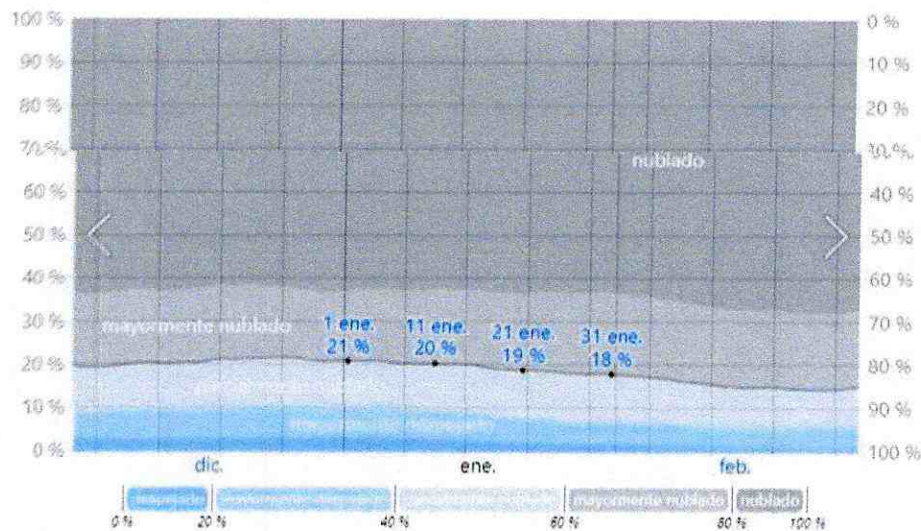


Ilustración 2 Categorías de nubosidad en enero 2023 en Puyo

Precipitación

Un día mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido o precipitación equivalente a líquido. En Puyo, la probabilidad de un día mojado durante enero aumenta gradualmente, y comienza el mes en 55 % y termina en 57 %.

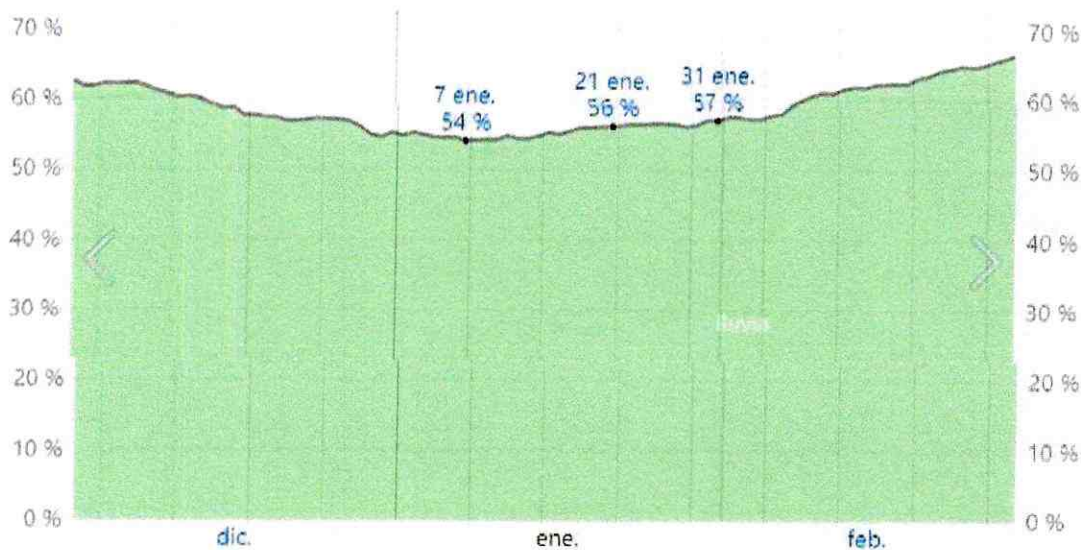


Ilustración 3 Probabilidad de precipitación en enero 2023 en Puyo

Lluvia

El promedio de lluvia durante un periodo de 31 días en una escala móvil en enero del 2023 en Puyo aumenta gradualmente, comenzando el mes con 115 milímetros, cuando rara vez excede 185 milímetros o es menos de 39 milímetros, y terminando el mes con 122 milímetros, cuando rara vez excede 195 milímetros o es menos de 46 milímetros. El promedio de la acumulación mínima de 31 días es 111 milímetros el 14 de enero. (Weatherspark, 2023)

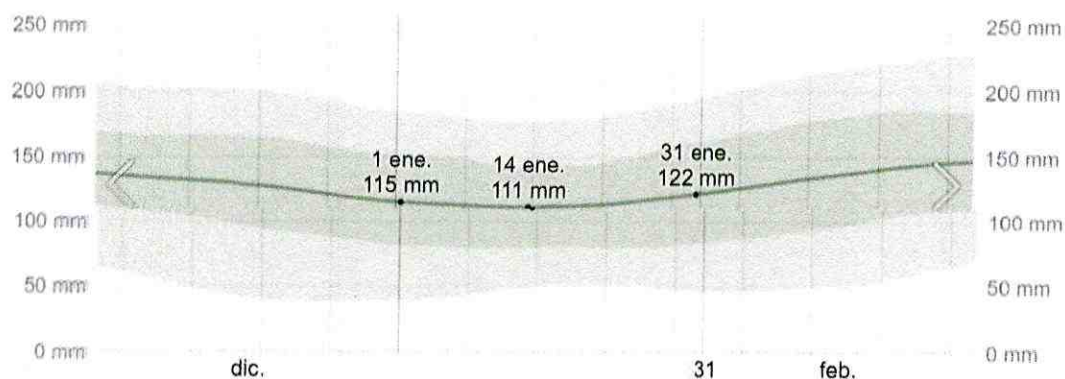


Ilustración 4 Promedio mensual de lluvia en enero 2023 en Puyo

Nubosidad

El mes de febrero, Puyo tiene nubosidad que permanece esencialmente constante y el porcentaje de tiempo que el cielo está nublado o mayormente nublado permanece en alrededor del 84 % durante el mes. El día más despejado del mes es el 1 de febrero, con condiciones despejadas, mayormente despejadas o parcialmente nubladas el 18 % del tiempo.

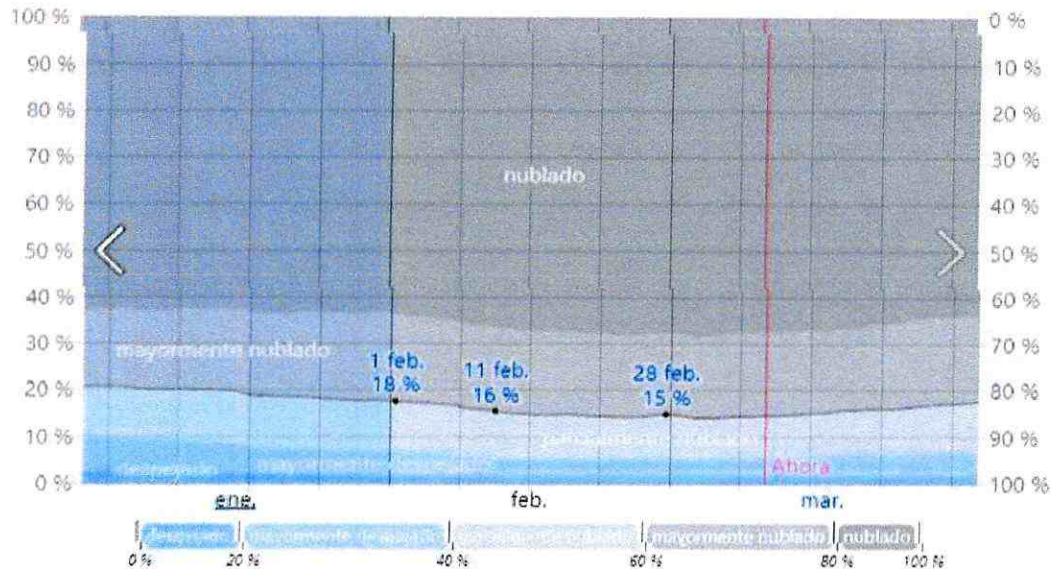


Ilustración 5 Categorías de nubosidad en febrero 2023 en Puyo

Precipitación

Un día *mojado* es un día con por lo menos 1 *milímetro* de líquido o precipitación equivalente a líquido. En Puyo, la probabilidad de un día mojado durante febrero *aumenta muy rápido*, y comienza el mes en 58 % y termina en 66 %.

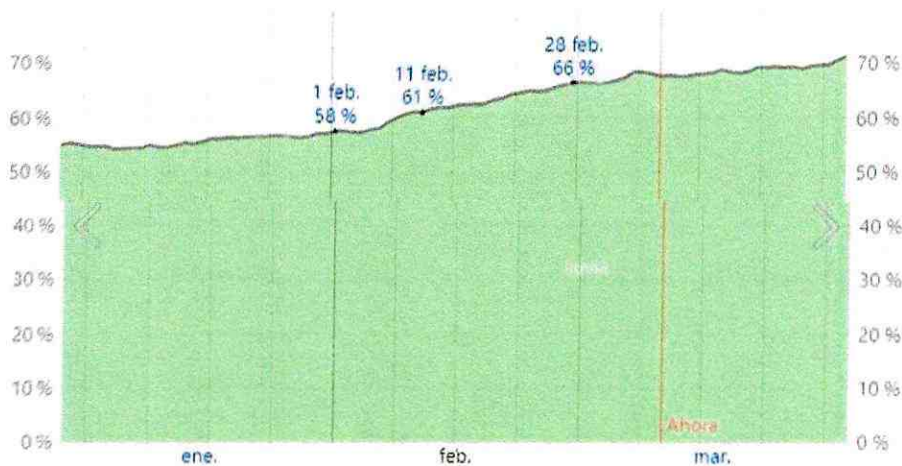


Ilustración 6 Probabilidad de precipitación en febrero 2023 en Puyo

Lluvia

El promedio de lluvia durante un periodo de 28 días en una escala móvil en febrero en Puyo *aumenta*, comenzando el mes con *123 milímetros*, cuando rara vez excede *196 milímetros* o es menos de *46 milímetros*, y terminando el mes con *148 milímetros*, cuando rara vez excede *230 milímetros* o es menos de *69 milímetros*.

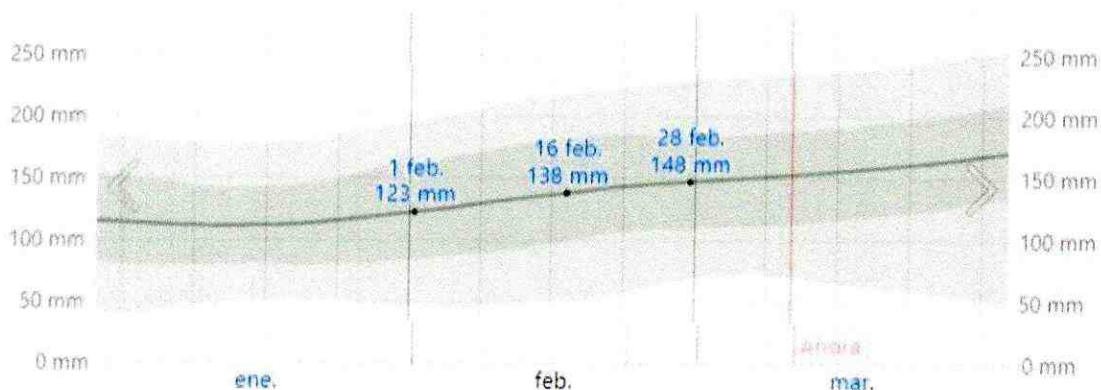


Ilustración 7 Promedio mensual de lluvia en febrero 2023 en Puyo

6. DESCRIPCIÓN POR FRENTE DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE RUBROS EN EJECUCIÓN

Desbroce, desbosque y limpieza

Replanteo y nivelación a nivel de asfalto

Remoción de alcantarillas

Excavación sin clasificar (mov. de tierra)

Excavación y relleno de estructuras menores

S.C. Tubería de acero corrugado D=1.2 m, e=2.5 mm, PM-100

Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)

Material de subbase clase 3

Transporte de material pétreo de mejoramiento

Transporte de material pétreo de subbase clase 3

Señales informativas y reglamentarias (0.60mx0.80m) móviles

Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.50m), móviles

Contenedores metálicos de 55 galones

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03

Oficina 072 785 269

keyszen.sas@gmail.com

www.keyszen.com

Machala – El oro - Ecuador

Kit antiderrames

Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)

S/C Cono de seguridad con protección UV, 71 cm Incl. Cinta reflectiva

Suministro de paleta de alto y siga

Capacitación sobre preservación de recursos naturales (de 2 a 3 horas)

Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas)

Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 horas).

Cantidades de los diferentes rubros ejecutados

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES			
		T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL
1	Desbroce, desbosque y limpieza		3.20	3.20	10.97%
2	Replanteo y nivelación a nivel de asfalto		1.60	1.60	10.97%
3	Remoción de alcantarillas		62.00	62.00	25.51%
4	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)		3,119.20	3,119.20	4.53%
5	Excavación de cunetas de coronación			-	0.00%
6	Excavación para cunetas y encauzamiento			-	0.00%
7	Excavación y relleno de estructuras menores		2,171.59	2,171.59	28.13%
8	Limpieza de derrumbos			-	0.00%
9	S.C. Tubería de acero corrugado D= 0,80 m, e=2.5 mm, PM-100			-	0.00%
10	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2.5 mm, PM-100		49.00	49.00	18.63%
11	S.C. Tubería de acero corrugado D= 2,20 m, e=2.5 mm, PM-100			-	0.00%
12	Hormigon para cunetas (F'C=180 KG/CM)			-	0.00%
13	Muro de H.S. f'c= 180kg./cm ² tipo B(Cabezalos)			-	0.00%
14	Hormigón simple en obras de arto F'C=240 KG/CM ²			-	0.00%
15	Hierro estructural fy=4200 kg/cm ²			-	0.00%
16	Muro de gaviones - calibre N° 12			-	0.00%
17	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)		6,828.20	6,828.20	8.20%
18	Material de subbase clase 3		1,125.00	1,125.00	5.35%
19	Material de base granular de agregados			-	0.00%
20	Transporte material de subbase			-	0.00%
21	Transporte de material pétreo de mejoramiento		225,194.04	225,194.04	6.80%
22	Transporte de material pétreo de subbase clase 3		37,102.50	37,102.50	4.75%
23	Transporte de material pétreo de base granular de agregados			-	0.00%
24	Imprimación con emulsión asfáltica			-	0.00%
25	C. rodadura hormigon esf. Mezclado en planta, e=2"			-	0.00%
26	Bordillo de H.S.(f'c=210 kg/cm ² - 0,14x0,40)			-	0.00%
27	Acoras de H.S. f'c=180kg/cm ² E=7cm oscobillado			-	0.00%
28	Marcas en pavimento			-	0.00%
29	Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccionales y bidireccionales)			-	0.00%
30	Pancarta informativa (letrero)-con estructura			-	0.00%
31	Señales ecologicas (2.40x1.20)M			-	0.00%
32	Señales informativas (2.40x1.20)M			-	0.00%
33	Señales reglamentarias (0.75 x 0.75)M			-	0.00%
34	Señales preventivas (0.75 x 0.75)M			-	0.00%
35	Señales informativas y reglamentarias (0.75mx0.75m) móviles		4.00	4.00	100.00%
36	Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.60m) móviles		4.00	4.00	100.00%
37	Contenedores metálicos de 55 galones		4.00	4.00	100.00%
38	Kit antiderrames		4.00	4.00	100.00%
39	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)		90.00	90.00	9.00%
40	S/C Cono de seguridad con protección UV, 71cm incl. cinta reflectiva		20.00	20.00	100.00%
41	Suministro de paleta de alto y siga		4.00	4.00	100.00%
42	Capacitación sobre preservación de recursos naturales (de 2 a 3 horas)		1.00	1.00	100.00%
43	Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas)		1.00	1.00	100.00%
44	Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 horas)		1.00	1.00	100.00%

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03

Oficina 072 785 269

keyszen.sas@gmail.com

www.keyszen.com

Machala - El oro - Ecuador

Avance físico

AVANCE PROGRAMADO	1.58 %
AVANCE EJECUTADO	2.91 %
AVANCE CONTRATO CONTRACTUAL	135,466.45 USD

Avance económico parcial y acumulado

PLANILLAS	VALORES					% PORCENTAJES			
	MONTO PROGRAMADO		MONTO PLANILLADO			AVANCE PROGRAMADO		AVANCE EJECUTADO	
	MES	ACUM	ANTERIOR	ACTUAL	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM
PLANILLA	73,296.42	73,296.42		135,466.45	135,466.45	1.58	1.58	2.91	2.91
OBRA CIVIL EXCEDENTE									
OBRA CIVIL RUBROS NUEVOS									
TOTAL	73,296.42	73,296.42	0,00	135,466.45	135,466.45	1.58	1.58	2.91	2.91

DESCRIPCION No	PLANILLA	VALOR	PORCENTAJE
CONTRATUAL 1	25 enero – 28 febrero	\$ 135,466.45	2.91 %
TOTAL		\$ 135,466.45	2.91 %

Observación: El contratista cumple con el cronograma valorado de trabajo según se anexa tabla comparativa del mes de enero y febrero.

7. OBRA EJECUTADA DURANTE EL PERÍODO Y ACUMULADA

PLANILLA N°:	1				N° RUBRO	1	
PERIODO:	25-Ene-23 - 28-Feb-23				UNIDAD:	Ha	
Desbroce, desbosque y limpieza							
TRAMO	ABSCISADO		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m ²)	CANTIDAD EJECUTADA (Ha)	OBSERVACIONES
	DESDE	HASTA					
1	0+000.00	1+800.00	1,800.00	20.00	32,000.00	3.20	
TOTAL						3.20	
PLANILLADO ANTERIORMENTE =						Ha	
TOTAL CONTRATADO =						29.18 Ha	
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =						3.20 Ha	
CANTIDAD PLANILLADA =						3.20 Ha	
EXCEDENTES =						- Ha	

PLANILLA N°:	1				N° RUBRO:	2
PERIODO:	25-Ene-23 - 28-Feb-23				UNIDAD:	km
Replanteo y nivelación a nivel de asfalto						
TRAMO	ABSCISADO		LONGITUD (m)	LONGITUD (Km)	CANTIDAD EJECUTADA A (Km)	OBSERVACIONES
	DESDE	HASTA				
1	0+000.00	1+600	1+600	1.60	1.60	
TOTAL					1.60	
PLANILLADO ANTERIORMENTE =						km
TOTAL CONTRATADO =						14.59 km
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENT						1.60 km
CANTIDAD PLANILLADA =						1.60 km
EXCEDENTES =						- km

PLANILLA N°:	1	N° RUBRO:	3										
PERIODO:	25-Ene-23 - 28-Feb-23	UNIDAD:	m										
Remoción de alcantarillas													
DESCRIPCIÓN	ELEMENTO	LONGITUD	OBSERVACIONES										
		L (m)											
Abs. 0+120.00	Tubería de acero corrugado D= 0.80 m	12.00	Diametro= 0,80 m										
Abs. 0+440.00	Tubería de acero corrugado D= 1.20 m	14.00	Diametro= 1.20 m										
Abs. 0+620.00	Tubería de acero corrugado D= 1.20 m	12.00	Diametro= 1.20 m										
Abs. 0+780.00	Tubería de acero corrugado D= 1.20 m	12.00	Diametro= 1.20 m										
Abs. 1+480.00	Tubería de acero corrugado D=0.80 m	12.00	Diametro= 0,80 m										
TOTAL		62.00											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PLANILLADO ANTERIORMENTE =</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CONTRATADO =</td> <td style="text-align: right;">243.00 m</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE =</td> <td style="text-align: right;">62.00 m</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD PLANILLADA =</td> <td style="text-align: right;">62.00 m</td> </tr> <tr> <td>EXCEDENTES =</td> <td style="text-align: right;">- m</td> </tr> </table>				PLANILLADO ANTERIORMENTE =	m	TOTAL CONTRATADO =	243.00 m	CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE =	62.00 m	CANTIDAD PLANILLADA =	62.00 m	EXCEDENTES =	- m
PLANILLADO ANTERIORMENTE =	m												
TOTAL CONTRATADO =	243.00 m												
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE =	62.00 m												
CANTIDAD PLANILLADA =	62.00 m												
EXCEDENTES =	- m												

PLANILLA N°:	1	N° RUBRO	4												
PERIODO:	25-Ene-23 - 28-Feb-23	UNIDAD:	m³												
Excavacion sin claificar (mov. De tierra)															
SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO															
EXCAVACIÓN DE CAJERAS Y TALUDES															
TRAMO	ABSCISADO		CANTIDAD EJECUTADA (m3)	VOLUMEN EXCAVADO (m3)	OBSERVACIONES										
	DESDE	HASTA													
1	0+000.00	1+600.00	3,119.20	3,119.20	Ver anexo justificativo Rubro 4										
TOTAL				3119.20											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PLANILLADO ANTERIORMENTE =</td> <td style="text-align: right;">- m³</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CONTRATADO =</td> <td style="text-align: right;">68,863.54 m³</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =</td> <td style="text-align: right;">3,119.20 m³</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD PLANILLADA =</td> <td style="text-align: right;">3,119.20 m³</td> </tr> <tr> <td>EXCEDENTES =</td> <td style="text-align: right;">- m³</td> </tr> </table>						PLANILLADO ANTERIORMENTE =	- m³	TOTAL CONTRATADO =	68,863.54 m³	CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	3,119.20 m³	CANTIDAD PLANILLADA =	3,119.20 m³	EXCEDENTES =	- m³
PLANILLADO ANTERIORMENTE =	- m³														
TOTAL CONTRATADO =	68,863.54 m³														
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	3,119.20 m³														
CANTIDAD PLANILLADA =	3,119.20 m³														
EXCEDENTES =	- m³														

PLANILLA No.	1			Nº RUBRO	4		
PERIODO:	25-Ene-23	-	28-Feb-23	UNIDAD:	m ³		
Excavación sin clasificar(mov.de tierra)							
Abs 0+000 a la 1+600							
ABSCISAS	LONGITUD (M)	CAJERAS (M2)	ÁREA CORTE(M2)	AREA CAJERAS. (M2)	ÁREA PROMEDIO (M2)	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO (M3)
0+000.00		0	2.57	2.57			
	20.00				2.04	40.80	40.80
0+020.00		1.43	0.07	1.5			
	20.00				2.13	42.60	83.40
1+560.00		1.7	1.2	2.9			
	20.00				2.36	47.20	3,067.60
1+580.00		1.58	0.23	1.81			
	20.00				2.58	51.60	3,119.20
1+600.00		1.74	1.6	3.34			
							3,119.20
SUB TOTAL EJECUTADO (M3)							3,119.20
TOTAL EJECUTADO EN PLANILLA (M3)							3,119.20

PLANILLA No.	1		Nº RUBRO	7
PERIODO:	25-Ene-23	-	28-Feb-23	UNIDAD: m ²


Excavacion y relleno de estructuras menores

ALCANTARILLA DE ACERO CORRUGADO ABCISCA 0+160					
MEJORAMIENTO SOBRE ALCANTARILLA			TUBERIA		ANCHO DE VIA (m)
LADO MAYOR(m)	LADO MENOR(m)	ALTO(m)	LARGO(m)	alto (m)	
a	b				
9.00	4.50	7.00	4.50	1.50	9.00

TUBERIA				
DIAMETRO (m)	AREA DE TUB (m ²)	VOL. TUB (m ³)	UNIDAD	VOL. TOTAL (m ³)
1.20				

GRAFICO:

COORDENADAS				
PUNTOS	x	y	TRAMOS	DISTANCIA
a	1.00	9.00	a-b	9.00
b	10.00	9.00	b-c	8.50
c	7.75	0.80	c-d	1.50
d	7.75	0.70	d-e	4.50
e	3.25	-0.70	e-f	1.50
f	3.25	0.80	f-g	8.50
g	1.00	9.00		

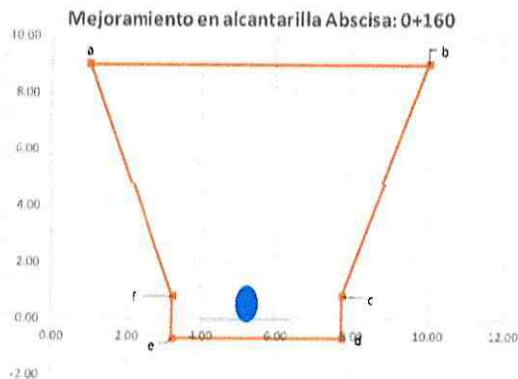

Area(m ²)	Ancho de Via (m)	Volumen relleno (m ³)	Vol. Tub. (m ³)	Vol. Total (m ³)
66.20	9.00	595.80	-10.18	585.62

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN
Excavacion y relleno Abs.160	m ³	585.62
Excavacion y relleno Abs.420	m ³	905.55
Excavacion y relleno Abs.590	m ³	633.41
Excavacion y mejoramiento debajo de tubería-	m ³	47.00
TOTAL		2171.59

TOTAL EJECUTADO (M3)

2,171.59

TOTAL EJECUTADO EN PLANILLA (M3)

2,171.59

PLANILLA I	1		Nº RUBRO	10
PERIODO:	25-Ene-23	-	28-Feb-23	UNIDAD: m

S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2.5 mm, PM-100

ALCANT.	ABSCISA	CANTIDAD EJECUTADA (m)	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA (m)	OBSERVACIONES
1	0+160.00	16.00	m	16.00	Tubería de acero
2	0+420.00	17.00	m	17.00	Tubería de acero
3	0+590.00	16.00	m	16.00	Tubería de acero
TOTAL				49.00	

PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	m
TOTAL CONTRATADO =	263.00	m
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	49.00	m
CANTIDAD PLANILLADA	49.00	m
EXCEDENTES =	-	m

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03

Oficina 072 785 269

keyszen.sas@gmail.com

www.keyszen.com

Machala - El oro - Ecuador

PLANILLA N°:	1		N° RUBRO:	17															
PERIODO:	25-Ene-23	-	28-Feb-23	UNIDAD: m³															
Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)																			
SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO																			
MEJORAMIENTO DE CAJERAS Y TERRAPLEN																			
TRAMO	ABSCISADO		CANTIDAD EJECUTADA (m3)	OBSERVA															
	DESDE	HASTA																	
1	0+000.00	1+600.00	6,828.20	Ver anexo justificativo Rubro 17															
TOTAL			6,828.20																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PLANILLADO ANTERIORMENTE =</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td>m³</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CONTRATADO =</td> <td style="text-align: right;">68,863.54</td> <td>m³</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA</td> <td style="text-align: right;">6,828.20</td> <td>m³</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD PLANILLADA =</td> <td style="text-align: right;">6,828.20</td> <td>m³</td> </tr> <tr> <td>EXCEDENTES =</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td>m³</td> </tr> </table>					PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	m³	TOTAL CONTRATADO =	68,863.54	m³	CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA	6,828.20	m³	CANTIDAD PLANILLADA =	6,828.20	m³	EXCEDENTES =	-	m³
PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	m³																	
TOTAL CONTRATADO =	68,863.54	m³																	
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA	6,828.20	m³																	
CANTIDAD PLANILLADA =	6,828.20	m³																	
EXCEDENTES =	-	m³																	

PLANILLA No.	1		N° RUBRO	17			
PERIODO:	25-Ene-23	-	28-Feb-23	UNIDAD: m³			
Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)							
Abs 0+000-1+600							
ABSCISAS	LONGITUD (M)	CAJERAS (M2)	ÁREA RELLENO (M2)	AREA T. (M2)	ÁREA PROMEDIO	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO (M3)
0+000.00	20.00	0	0	0	1.04	20.80	20.80
0+020.00	20.00	1.43	0.64	2.07	1.93	38.60	59.40
1+560.00	20.00	1.7	0.05	1.75	1.75	35.00	6,793.20
1+580.00	20.00	1.58	0.17	1.75	1.75	35.00	6,828.20
1+600.00		1.74	0	1.74			
SUB TOTAL EJECUTADO (M3)							6,828.20
TOTAL EJECUTADO EN PLANILLA (M3)							6,828.20

PLANILLA N°:	1		N° RUBRO:	18															
PERIODO:	25-Ene-23	-	28-Feb-23	UNIDAD: m³															
Material de subbase clase 3																			
TRAMO	ABSCISADO			DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA		CANTIDAD EJECUTADA (m3)	OBSERVACIONES												
	DESDE	HASTA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)														
1	0+000.00	1+000.00	1000.00	7.50	0.15	1,125.00													
TOTAL						1,125.00													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PLANILLADO ANTERIORMENTE =</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td>m³</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CONTRATADO =</td> <td style="text-align: right;">21,010.98</td> <td>m³</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA</td> <td style="text-align: right;">1,125.00</td> <td>m³</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD PLANILLADA =</td> <td style="text-align: right;">1,125.00</td> <td>m³</td> </tr> <tr> <td>EXCEDENTES =</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td>m³</td> </tr> </table>					PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	m³	TOTAL CONTRATADO =	21,010.98	m³	CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA	1,125.00	m³	CANTIDAD PLANILLADA =	1,125.00	m³	EXCEDENTES =	-	m³
PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	m³																	
TOTAL CONTRATADO =	21,010.98	m³																	
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA	1,125.00	m³																	
CANTIDAD PLANILLADA =	1,125.00	m³																	
EXCEDENTES =	-	m³																	

PLANILLA N°:	1						N° RUBRO:	21
PERIODO:	25-Ene-23			-			28-Feb-23	
UNIDAD:								m³ - km
Transporte de material pétreo de mejoramiento								
TRAMO	ABSCISADO		CANTIDAD EJECUTADA (m3)	DISTANCIA MINA - INICIO PROYECTO (Km)	CG PROYECTO (Km)	DISTANCIA TOTAL (Km)	TOTAL (Km-m3)	OBSERVACIONES
	DESDE	HASTA						
1	0+000.00	1+600.00	6,828.20	31.33	1.65	32.98	225,194.04	Cantidades detalladas on Anexo 17
SUB TOTAL							225,194.04	
PLANILLADO ANTERIORMENTE =								- m³ - km
TOTAL CONTRATADO =								3,309,493.83 m³ - km
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =								225,194.04 m³ - km
CANTIDAD PLANILLADA								225,194.04 m³ - km
EXCEDENTES =								- m³ - km

PLANILLA N°:	1						N° RUBRO:	22
PERIODO:	25-Ene-23			-			28-Feb-23	
UNIDAD:								m³ - km
Transporte de material pétreo de subbase clase 3								
TRAMO	ABSCISADO		CANTIDAD EJECUTADA (m3)	DISTANCIA MINA - INICIO PROYECTO (Km)	CG PROYECTO (Km)	DISTANCIA TOTAL (Km)	TOTAL (Km-m3)	OBSERVACIONES
	DESDE	HASTA						
1	0+000.00	1+000.00	1,125.00	31.33	1.65	32.98	37,102.50	Cantidades detalladas en Anexo 18
SUB TOTAL							37,102.50	
PLANILLADO ANTERIORMENTE =								- m³ - km
TOTAL CONTRATADO =								781,104.32 m³ - km
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =								37,102.50 m³ - km
CANTIDAD PLANILLADA								37,102.50 m³ - km
EXCEDENTES =								- m³ - km

PLANILLA N°:	1						N° RUBRO:	35	
PERIODO:	25-Ene-23			-			28-Feb-23		
UNIDAD:								u	
Señales Informativas y reglamentarias (0.60mx0.80m) móviles									
DESCRIPCIÓN DEL IMPLEMENTO							UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONE
Señales informativas y reglamentarias (0.60mx0.80m) móviles							u	4.00	
TOTAL								4.00	
PLANILLADO ANTERIORMENTE =								- u	
TOTAL CONTRATADO =								4.00 u	
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =								4.00 u	
CANTIDAD PLANILLADA								4.00 u	
EXCEDENTES =								- u	

PLANILLA N°:	1		N° RUBRO:	36
PERIODO:	25-Ene-23	-	28-Feb-23	UNIDAD: u
Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.60m) móviles				
DESCRIPCIÓN DEL IMPLEMENTO		UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONE
Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.60m) móviles		u	4.00	
TOTAL			4.00	
PLANILLADO ANTERIORMENTE =			-	u
TOTAL CONTRATADO =			4.00	u
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =			4.00	u
CANTIDAD PLANILLADA			4.00	u
EXCEDENTES =			-	u

PLANILLA N°:	1		N° RUBRO:	37
PERIODO:	25-Ene-23	-	28-Feb-23	UNIDAD: u
Contenedores metálicos de 55 galones				
DESCRIPCIÓN DEL IMPLEMENTO		UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Contenedores metálicos de 55 galones		u	4.00	
TOTAL			4.00	
PLANILLADO ANTERIORMENTE =			-	u
TOTAL CONTRATADO =			4.00	u
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =			4.00	u
CANTIDAD PLANILLADA			4.00	u
EXCEDENTES =			-	u

PLANILLA N°:	1		N° RUBRO:	38
PERIODO:	25-Ene-23	-	28-Feb-23	UNIDAD: u
Kit antiderrames				
DESCRIPCIÓN DEL IMPLEMENTO		UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Kit antiderrames		u	4.00	
TOTAL			4.00	
PLANILLADO ANTERIORMENTE =			-	u
TOTAL CONTRATADO =			4.00	u
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =			4.00	u
CANTIDAD PLANILLADA			4.00	u
EXCEDENTES =			-	u

PLANILLA N°:	1	N° RUBRO:	39															
PERIODO:	25-Ene-23 -	28-Feb-23	UNIDAD: m															
Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)																		
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	OBSERVACIONES															
Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)		90.00																
TOTAL		90.00																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PLANILLADO ANTERIORMENTE =</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CONTRATADO =</td> <td style="text-align: right;">100.00</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =</td> <td style="text-align: right;">90.00</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD PLANILLADA</td> <td style="text-align: right;">90.00</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>EXCEDENTES =</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td>m</td> </tr> </table>				PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	m	TOTAL CONTRATADO =	100.00	m	CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	90.00	m	CANTIDAD PLANILLADA	90.00	m	EXCEDENTES =	-	m
PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	m																
TOTAL CONTRATADO =	100.00	m																
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	90.00	m																
CANTIDAD PLANILLADA	90.00	m																
EXCEDENTES =	-	m																

PLANILLA N°:	1	N° RUBRO:	40															
PERIODO:	25-Ene-23 -	28-Feb-23	UNIDAD: u															
S/C Cono de seguridad con protección UV, 71cm Incl. cinta reflectiva																		
DESCRIPCIÓN DEL IMPLEMENTO		UNIDAD	CANTIDAD															
S/C Cono de seguridad con protección UV, 71cm Incl. cinta reflectiva		u	20.00															
TOTAL			20.00															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PLANILLADO ANTERIORMENTE =</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td>u</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CONTRATADO =</td> <td style="text-align: right;">20.00</td> <td>u</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =</td> <td style="text-align: right;">20.00</td> <td>u</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD PLANILLADA</td> <td style="text-align: right;">20.00</td> <td>u</td> </tr> <tr> <td>EXCEDENTES =</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td>u</td> </tr> </table>				PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	u	TOTAL CONTRATADO =	20.00	u	CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	20.00	u	CANTIDAD PLANILLADA	20.00	u	EXCEDENTES =	-	u
PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	u																
TOTAL CONTRATADO =	20.00	u																
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	20.00	u																
CANTIDAD PLANILLADA	20.00	u																
EXCEDENTES =	-	u																

PLANILLA N°:	1	N° RUBRO:	41															
PERIODO:	25-Ene-23 -	28-Feb-23	UNIDAD: u															
Suministro de paleta de alto y siga																		
DESCRIPCIÓN DEL IMPLEMENTO		UNIDAD	CANTIDAD															
Suministro de paleta de alto y siga		u	4.00															
TOTAL			4.00															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PLANILLADO ANTERIORMENTE =</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td>u</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CONTRATADO =</td> <td style="text-align: right;">4.00</td> <td>u</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =</td> <td style="text-align: right;">4.00</td> <td>u</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD PLANILLADA</td> <td style="text-align: right;">4.00</td> <td>u</td> </tr> <tr> <td>EXCEDENTES =</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td>u</td> </tr> </table>				PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	u	TOTAL CONTRATADO =	4.00	u	CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	4.00	u	CANTIDAD PLANILLADA	4.00	u	EXCEDENTES =	-	u
PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	u																
TOTAL CONTRATADO =	4.00	u																
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	4.00	u																
CANTIDAD PLANILLADA	4.00	u																
EXCEDENTES =	-	u																

PLANILLA N°:	1	N° RUBRO:	42															
PERIODO:	25-Ene-23 -	28-Feb-23	UNIDAD: u															
Capacitación sobre preservación de recursos naturales (de 2 a 3 horas)																		
DESCRIPCIÓN DEL IMPLEMENTO		UNIDAD	OBSERVACIONES															
Capacitación sobre preservación de recursos naturales (de 2 a 3 horas)		1.00																
TOTAL		1.00																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PLANILLADO ANTERIORMENTE =</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td>u</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CONTRATADO =</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td>u</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td>u</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD PLANILLADA</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td>u</td> </tr> <tr> <td>EXCEDENTES =</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td>u</td> </tr> </table>				PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	u	TOTAL CONTRATADO =	1.00	u	CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	1.00	u	CANTIDAD PLANILLADA	1.00	u	EXCEDENTES =	-	u
PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	u																
TOTAL CONTRATADO =	1.00	u																
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	1.00	u																
CANTIDAD PLANILLADA	1.00	u																
EXCEDENTES =	-	u																

PLANILLA N°:	1	N° RUBRO:	43															
PERIODO:	25-Ene-23 -	28-Feb-23	UNIDAD: u															
Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas)																		
DESCRIPCIÓN DEL IMPLEMENTO		UNIDAD	OBSERVACIONES															
Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas)		1.00																
TOTAL		1.00																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PLANILLADO ANTERIORMENTE =</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td>u</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CONTRATADO =</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td>u</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td>u</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD PLANILLADA</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td>u</td> </tr> <tr> <td>EXCEDENTES =</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td>u</td> </tr> </table>				PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	u	TOTAL CONTRATADO =	1.00	u	CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	1.00	u	CANTIDAD PLANILLADA	1.00	u	EXCEDENTES =	-	u
PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	u																
TOTAL CONTRATADO =	1.00	u																
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	1.00	u																
CANTIDAD PLANILLADA	1.00	u																
EXCEDENTES =	-	u																

PLANILLA N°:	1	N° RUBRO:	44															
PERIODO:	25-Ene-23 -	28-Feb-23	UNIDAD: u															
Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 horas)																		
DESCRIPCIÓN DEL IMPLEMENTO		UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES														
Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 horas)		u	1.00															
TOTAL			1.00															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PLANILLADO ANTERIORMENTE =</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td>u</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CONTRATADO =</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td>u</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td>u</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD PLANILLADA</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td>u</td> </tr> <tr> <td>EXCEDENTES =</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td>u</td> </tr> </table>				PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	u	TOTAL CONTRATADO =	1.00	u	CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	1.00	u	CANTIDAD PLANILLADA	1.00	u	EXCEDENTES =	-	u
PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	u																
TOTAL CONTRATADO =	1.00	u																
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	1.00	u																
CANTIDAD PLANILLADA	1.00	u																
EXCEDENTES =	-	u																

8. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN

- Se ha revisado la ejecución de los trabajos de acuerdo a las especificaciones técnicas, y a las actividades presupuestadas y al cronograma de trabajos para la construcción del proyecto.
- Se ha ejercido la supervisión continua de los equipos y materiales en el proyecto.
- Se atendió oportunamente las consultas y requerimientos del Contratista.
- Se ha controlado el avance de todos los trabajos realizados.
- Se ha vigilado el cumplimiento de todas las Normas y Reglamentos de Seguridad Industrial y Ambiental de acuerdo a las especificaciones contractuales.
- Se han aprobado los procedimientos de trabajo empleados por el Contratista.
- Se ha exigido al Contratista el cumplimiento de la Leyes Laborales y reglamentos de Seguridad Industrial, Ambiental, etc.
- Se ha verificado que el Personal Técnico y el equipo del Constructor sea idóneo y suficiente para la obra.
- Oportunamente se han dado soluciones técnicas a los problemas surgidos durante la ejecución de la obra.
- Se ha vigilado periódicamente el cumplimiento del contrato de construcción, para que el proyecto se ejecute de acuerdo a especificaciones técnicas y programas de trabajos.

9. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS ADOPTADAS PARA CUMPLIR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS

La fiscalización a partir del mes de enero del 2023, tiene su sede de oficina en la ciudad de Puyo, para el personal técnico. Se han organizado los controles de supervisión de campo, control de calidad de materiales y topografía, en acción permanente en los frentes de trabajo de la obra.

En oficina se dispone del personal técnico para el procesamiento de información y documentos en atención a todas las áreas de control técnico, financieros, actas de trabajo, programación de actividades, administrativo y contractual.

El grupo de profesionales mantiene como objetivo principal y base del cumplimiento de sus funciones, el aseguramiento permanente de calidad y los productos para la satisfacción del GAD Provincial de Pastaza y los usuarios beneficiarios del proyecto.

10. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se reporta la evidencia de charlas de seguridad, higiene y salud en el trabajo, previo al inicio de la jornada laboral, documentadas estas charlas con evidencia fotográfica. La misma que brinda información clara y precisa al personal sobre la seguridad en un ambiente laboral, para lo cual se realiza el análisis de la situación actual de la empresa y se identifica cuáles son los riesgos existentes en cada uno de los puestos de trabajo, que sirva de fundamento para el trabajo diario, y de esta manera establecer procedimientos de prevención y protección contra riesgos de trabajo.

Para minimizar los riesgos de trabajo, la fiscalización vigila que se tomen todas las medidas de seguridad, verificando que se ejecuten las obras de protección estipuladas, ya que no se permite ubicar fuera del sitio de trabajo, equipos, herramientas o materiales que interfieran con el tráfico, a fin de minimizar las molestias al público.

11. GESTIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DURANTE EL PERÍODO

Control del trabajo realizado por la maquinaria, verificando el buen estado de las misma y su óptimo rendimiento.

Verificación de Abscisas con sus respectivas áreas y volúmenes de movimientos de tierra.

Tomas fotográficas del proceso del vaciado en el sitio de la obra, del tendido y de la compactación del material pétreo de mejoramiento y subbase clase 3.

Revisión y aprobación de la Planilla No. 1 de Avance de Obra.

El contratista deberá realizar los trabajos necesarios para la protección ambiental de la obra, así como cumplir con todos los parámetros de seguridad industrial para sus trabajadores y cumplir con las obligaciones laborales.

Verificación de la colocación de señales informativas, preventivas y reglamentarias.

Revisión del uso de contenedores metálicos de 55 galones y el uso de Kit antiderrames
Comprobación de la utilización de los conos de seguridad con protección UV, que incluyen cinta reflectiva

Registro de las capacitaciones brindadas al personal sobre preservación de recursos naturales, manejo de desechos peligrosos, capacitación en seguridad y salud ocupacional.

12. RESUMEN DE MONTOS EJECUTADOS PLANILLAS CONTRACTUALES

PLANILLA	MES	MONTO DE OBRA PROGRAMADO	PORCENTAJE DE OBRA PROGRAMADO	MONTO DE OBRA EJECUTADO	PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO
Planilla de Avance No. 01	25 enero – 28 febrero / 2023	73,296.42	1.58 %	135,466.45	2.91 %
	TOTAL	73,296.42	1.58 %	135,466.45	2.91 %

13. RESUMEN A LA FECHA DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	MONTO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
MONTO DEL CONTRATO	4'650,521.23	100 %	Los trabajos se están realizando conforme al cronograma.
PLANILLAS CONTRACTUALES	135,466.45	2.91 %	
MONTO DE INCREMENTOS			
MONTO DE DECREMENTOS			
CONTRATO COMPLEMENTARIO			
COSTO + PORCENTAJE			

14. ACCIONES EFECTUADAS POR LA FISCALIZACIÓN

Las actividades y acciones efectuadas por el equipo de Fiscalización del Proyecto están determinadas por el contrato de Consultoría y por los términos de referencia. Son actividades que se realizan en forma permanente y rutinaria y están enfocadas básicamente a: control de calidad de los materiales y de la ejecución de los rubros que se incorporan al proyecto; estado y número de maquinaria disponible en la ejecución de los trabajos; número y desempeño del personal del contratista; solución de los problemas que afecten a la obra y tramite de los aspectos administrativos vinculados al proyecto.

15. UTILIZACIÓN DE RECURSOS, DE EQUIPOS Y DE MANO DE OBRA

VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL DEL CONTRATISTA

PERSONAL OFERTADO	PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA	CHECK LIST
SUPERINTENDENTE	SUPERINTENDENTE	OK
RESIDENTE	RESIDENTE	OK
INGENIERO AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	OK
TÉCNICO EN SEGURIDAD	TÉCNICO EN SEGURIDAD	OK
ING. AYUDANTE	ING. AYUDANTE	OK
TOPOGRAFO	TOPOGRAFO	OK
CADENERO	CADENERO	OK
OPERADORES	OPERADORES	OK
CHOFERES	CHOFERES	OK
MECÁNICO	MECÁNICO	OK
AYUDANTE DE MECÁNICO	AYUDANTE DE MECÁNICO	OK
INSPECTORES	INSPECTORES	OK
ALBAÑILES	ALBAÑILES	OK
SOLDADORES	SOLDADORES	OK
JORNALEROS	JORNALEROS	OK

VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA

EQUIPO Y MAQUINARIA OFERTADO	EQUIPO Y MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA	CHECK LIST
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	OK
MOTONIVELADORA	MOTONIVELADORA	OK
CAMIÓN CISTERNA	CAMIÓN CISTERNA	OK
VOLQUETES	VOLQUETES	OK
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	OK
PLANTA DE ASFALTO	PLANTA DE ASFALTO	OK
TERMINADORA DE ASFALTO	TERMINADORA DE ASFALTO	OK
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	OK
RODILLO VIBRATORIO LISO	RODILLO VIBRATORIO LISO	OK
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	OK

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03

Oficina 072 785 269

keyszen.sas@gmail.com

www.keyszen.com

Machala – El oro - Ecuador

CONCRETERA 1 SACO	CONCRETERA 1 SACO	OK
MINICARGADORA	MINICARGADORA	OK
APARATOS DE TOPOGRAFÍA	APARATOS DE TOPOGRAFÍA	OK

PERSONAL PROPUESTO POR EL FISCALIZADOR

No	FUNCIÓN	CANTIDAD	NOMBRE	COMPROMISO
1	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	1	DANNY DANIEL DURAN CABRERA	100 %
2	RESIDENTE	1	RICARDO WELLINGTON CARPIO JARAMILLO	100 %
3	INGENIERO AMBIENTAL	1	JESSICA GISSELLA GOROZABEL ROSILLO	50 %

EQUIPO E INSTRUMENTOS PROPUESTO POR EL FISCALIZADOR

No	FUNCIÓN	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS	PLACA / FACTURA / MATRÍCULA
1	CAMIONETA JAC T8	1	MODELO: FC1037D3KST LUXURY T8 AC 2.0 CD 4X4 TM DIESEL	OBC2109
2	LAPTO HP	1	CORE I7 MODELO CS3073	001-100-000003578

- INCIDENCIAS PRODUCIDAS EN LA OBRA

No se ha producido en este periodo ningún incidente grave.

- CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES

Uno de los principales objetivos de la Fiscalización es el control de la calidad de los materiales que intervienen en los diferentes rubros, así como el cumplimiento de las especificaciones para la ejecución de los rubros.

- OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

OFICIO NRO.	FECHA	ASUNTO
OFICIO: Nro. GADPPz-ES-2023-001	25 de enero del 2023	Acta de inicio de obra de los trabajos a ejecutarse
OFICIO: 001-AB-2023	25 de febrero del 2023	Entrega del informe ambiental de

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03

Oficina 072 785 269

keyszen.sas@gmail.com

www.keyszen.com

Machala – El oro - Ecuador

		cumplimiento correspondiente a la Planilla de Avance de Obra No. 01
OFICIO: Nro.111 CABA/GADPPz	02 de marzo del 2023	Planilla de avance No.1, enviado a la fiscalización para su revisión
OFICIO: KEYSOFICIO-013-2023	07 de marzo del 2023	Planilla de Avance de Obra No. 01, enviado a la compañía Amazonas Building para su corrección
OFICIO: Nro.112 CABA/GADPPz	08 de marzo del 2023	Planilla de Avance de Obra No. 01, enviado a la fiscalización para su revisión
No. GADPPz-ES-2023-003	24 de marzo del 2023	Solicita a Fiscalización se de cumplimiento respecto a zonas intervenidas sin permiso ambiental.
KEYSOFICIO-018-2023	30 de marzo del 2023	Fiscalización solicita al contratista se dé cumplimiento lo mencionado en respectivo documento para continuar los tramites de aprobación permitentes de la Planilla de Avance No. 01
No.- ERGC-AMAZON-002-2023	30 de marzo del 2023	Respuesta al oficio de KEYSOFICIO -018-2023 del 30 de marzo de 2023, se realiza la entrega de lo solicitado para los fines pertinentes. Respecto a zonas intervenidas sin permiso ambiental
KEYSOFICIO-019-2023	30 de marzo del 2023	Planilla de Avance de Obra No. 01, enviado al administrador del contrato para su aprobación.

16. CONTROL DE COSTOS

Con base en el programa de inversiones propuesto, se presenta la inversión ejecutada en el mes y la total acumulada.

INVERSIÓN PROGRAMADA	73,296.42120
AVANCE PROGRAMADO (%)	1.58
INVERSIÓN EJECUTADA	135,466.45
AVANCE EJECUTADO (%)	2.91

Control de avance económico

DESCRIPCIÓN	CRONOGRAMA VALORADO	PROGRAMADO EN EL PERÍODO	EJECUTADO EN EL PERÍODO	ACUMULADO EJECUTADO	ÍNDICES DE DESEMPEÑO
					SPI= EV/PV
VALOR	73296.42	73296.42	135466.45	135466.45	1.84
PORCENTAJE	1.58	1.58	2.91	2.91	

Nota: SPI es un índice de desempeño del cronograma que tiene la siguiente interpretación:

SPI > 1 se tiene un adelanto respecto a la línea base del proyecto.

SPI < 1 se tiene retrasos respecto a la línea base del proyecto.

SPI = 1 se tiene un avance igual al programado en la línea base del proyecto.

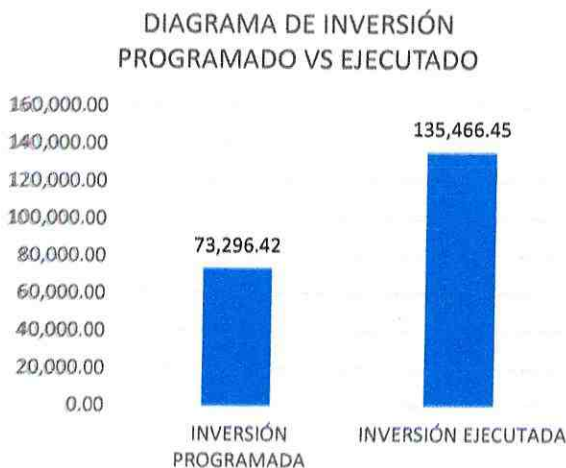


Ilustración 8 Diagrama de inversión programado vs ejecutado

DIAGRAMA DE AVANCE PROGRAMADO VS
EJECUTADO

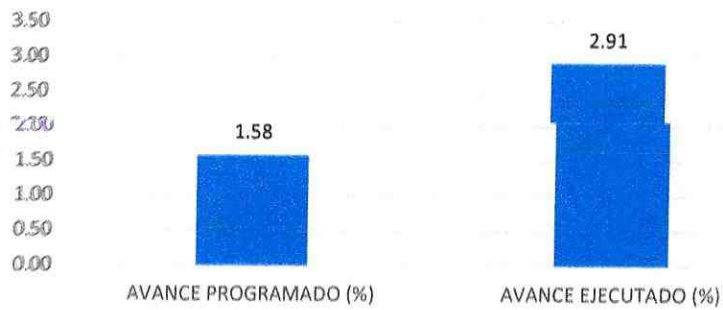


Ilustración 9 Diagrama de avance programado vs ejecutado

17. INFORME DETALLADO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

ITEM	MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> Implementar señalética Señalética de prohibición Señalética de condición obligatoria Señalética condición Segura Señalética preventiva Señalética Ambiental Señalética informativa 	X			En el frente de trabajo existe señalética.
2	<ul style="list-style-type: none"> Humedecer la vía en los días soleados para evitar material particulado, optimizando el recurso agua. 	X			Dentro de proyecto existe un tanquero el cual sirve para rociar agua y mitigar el material particulado.
3	<ul style="list-style-type: none"> Zonificar las áreas de trabajo con cinta de peligro. 	X			Los diferentes frentes de trabajo han sido zonificados por cinta de peligro, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los peatones y tránsito vehicular.
4	<ul style="list-style-type: none"> Cubrir con una lona las volquetas que trasladan material pétreo hacia el lugar de la obra. 	X			Las volquetas que operan en el proyecto son cubiertas con lonas para evitar la dispersión de material transportado.

5	<ul style="list-style-type: none"> Las vías por donde circula el equipo caminero deben estar despejadas y sin obstáculos. 	X		Las vías se encuentran libres de obstáculos.
6	<ul style="list-style-type: none"> Realizar mantenimiento regular de la maquinaria y equipo utilizado 	X		La maquinaria, herramientas y equipos se encuentran operando en buen estado, debido a que se les da el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo.
7	<ul style="list-style-type: none"> El transporte del equipo se realizará utilizando las vías de accesos existentes, considerado no causar molestias a los habitantes del costado de la vía y el posible deterioro de la misma. 	X		Los vehículos livianos y pesados que operan en el proyecto utilizan las vías de acceso, precautelando el correcto uso de las mismas con el objetivo de evitar daños.
8	<ul style="list-style-type: none"> Implementar un kit anti derrame y equipo de respuesta rápida, para combatir posibles contaminados. 	X		Dentro del proyecto existe un kit antiderrame, con el objetivo de mitigar cualquier derrame.
9	<ul style="list-style-type: none"> Se Deberá instalar de forma permanente un extintory botiquín de primeros auxilios en los vehículos y maquinaria. 	X		Los vehículos y maquinarias pesadas cuentan con un botiquín que dispone insumos básicos y un extintor operativo.
10	<ul style="list-style-type: none"> Dotar al personal que labora en el Proyecto de EPP 	X		El contratista ha dotado a sus trabajadores del EPP adecuado, según la actividad laboral asignada.

<p>11</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Implementar un área para el almacenamiento temporal de combustibles el cual deberá cumplir las siguientes características Deberá estar ubicado alejado de cuerpos hídricos y aislados. ● Los sitios de almacenamiento de combustible serán ubicados en áreas no inundables. ● La estructura será realizada con vigas de madera y cubierta de dura techo o también pueden ser hojales si las dimensiones del área se realizarán en base a la cantidad de tanques de almacenamiento a utilizar. ● El tanque de almacenamiento deberá estar protegido contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones que contaminen el ambiente y contarán con mangueras y llaves de distribución. ● El tanque de almacenamiento debe estar rodeado de un cubeto o estructura de contención impermeables técnicamente diseñada para el efecto con volumen = o mayor a 110% del tanque. ● En el área deberá implementarse un extintor para evitar cualquier riesgo de incendio ● Tener un acceso adecuado para la carga de combustible y en caso de ser necesario para la entrada del carro de los bomberos ● El área deberá estar señalizada en base a la normativa NTE INEN 2266. 	<p style="text-align: center;">X</p>		<p>En el campamento se encuentra un área destinada para el almacenamiento de combustible, la misma cuenta con piso pavimentado, bajo cubierta, kit antiderrame, señalética y extintor.</p>	
<p>12</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ubicar el material de desajuste en los sitios descritos en el ítem 7 del presente documento. ● Los cuáles han sido ubicados de acuerdo a los siguientes criterios técnicos ● Deberán encontrarse dentro del área de influencia del Proyecto. ● El terreno deberá estar desprovisto de vegetación ● Alejado de cuerpos hídricos ● Las áreas destinadas a las escombreras deberán ser estables y seguras a corto y largo plazo. 			<p>X</p>	<p>Se lo realizará cuando las actividades lo ameriten</p>

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

ITEM	MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> Implementar un área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos en el cual deberá tener las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> Estar bajo cubierta Iluminación natural En un espacio abierto cerrado El acceso a estos locales deberá ser registrado Y el personal que ingiere estará provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial Contar con señalización apropiada en lugares y formas visibles en base a la Norma nte inen 2266. Contar con el material y equipamiento para atender contingencias. Contar con sistemas de extinción contra incendios Contar con bases o piscas impermeabilizados o similares según el caso. 	X			En el campamento se encuentra un área estimada para el almacenamiento temporal de los desechos peligrosos, la misma cuenta con piso pavimentado, bajocubierta, kit antiderrame, señalética y extintor. Cabe mencionar que durante este periodo no se han realizado actividades productivas que generen desechos peligrosos.
2	<ul style="list-style-type: none"> Dotar de fundas plásticas a los conductores de volquetes y máquinas pesadas para los desechos. 	X			Constantemente se dota a los transportistas de fundas plásticas para el correcto almacenamiento de los desechos comunes.
3	<ul style="list-style-type: none"> Implementación de contenedores de colores debidamente etiquetadas para la clasificación en lavía. se deberá cumplir con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> Encontrarse bajo techo, Contenedores de 55 galones (A) El rotulado estará en un lugar visible con caracteres legibles según lo establecido en la NTE INEN 878. El nombre o denominación de los residuos con su logo respectivo y la distancia de observaciones según lo establecido en la NTE INEN ISO 3864-1 	X			En el frente de trabajo existen contenedores metálicos móviles, coloreados según el residuo y/o desecho a clasificar.

PLAN DE CAPACITACIÓN:

ITEM	MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> ● Capacitaciones al personal de trabajo sobre: ● Medidas propuestas en el MIA ● Manejo de los procedimientos de seguridad ● Trabajos en alturas ● Protecciones del ambiente ● Primeros auxilios y procedimiento en caso de emergencia ● Manejo de desechos peligrosos y no peligrosos ● Técnicas para prevenir conflictos con la comunidad 	X			<p>Todo el personal que opera en el proyecto ha sido capacitado en los temas de seguridad, salud y ambiente, de igual forma ha sido socializado el PMA.</p>

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS:

ITEM	MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> ● Realizar una reunión previa con los involucrados directos del Proyecto para darles a conocer las ventajas de implementación del Proyecto obra o actividad. 	X			<p>El proyecto y las actividades a realizarse han sido socializadas con la comunidad.</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> ● Implementación un buzón donde se recepte las quejas y sugerencias de la población. 	X			<p>El personal que se encuentra diariamente en el proyecto cuenta con hojas de registro, en las cuales las personas</p>

3	<ul style="list-style-type: none"> Participar activamente en reuniones y procesos comunales que se realiza que se realicen en el área de influencia 	X			El personal ha participado en simulacro de emergencia, dictado por el cuerpo de bomberos.
---	--	---	--	--	---

PLAN DE CONTINGENCIAS:

ITEM	MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar un plan de contingencia accesible a todo el personal en el cual se aborde la gestión de contingencia en caso de incendios, derrame, fuga o explotación 	X			El proyecto cuenta con un plan de contingencia, el mismo que ha sido socializado a los trabajadores.
2	<ul style="list-style-type: none"> Crear un comité de seguridad que actúe en caso de emergencia. 			X	Se lo realizará en él es de febrero.
3	<ul style="list-style-type: none"> Se realizará simulacros, de evaluación, incendio, derrames o fugas para agilizar los tiempos de reacción del personal y su actuación. 	X			Se lo realizará en él es de febrero.

<p>4</p>	<p>Actuar de la siguiente manera en caso de</p> <ul style="list-style-type: none"> • En caso de incendio <p>Si alguien detecta un fuego incipiente y sabe usar un extintor actúa inmediatamente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se recomienda el uso de extintores de industriales ubicados estrictamente Tipos de extintores <p>El tipo A se usará durante la combustión de sólidos comunes</p> <ul style="list-style-type: none"> - El tipo B se usará para líquidos y gases inflamables El tipo C sé para equipos eléctrico energizado y tipode para metales combustibles - Salve su vida y la de los demás abandonando el lugar de incendio - Una vez a salvo avisar a la brigada hágalosin pensar que otro ya lo han hecho - Solicité Auxilio <p>Si se encuentra Atrapado por el humo trate de salir arrastrándose o permanezcalo más cerca del suelo el humo tiende a subir y existe aire no contaminado a nivel del suelo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si el humo es muy denso curar-se con un pañuelo ropa mojada la boca y nariz manténgase cerca del suelo - Cuando se inflaman la ropa de una persona, impida que corra, el viento aviva el fuego. Cobijelo con una manta húmeday haga qué se proteja la cara y cuello. <ul style="list-style-type: none"> • En caso de explosión <ul style="list-style-type: none"> - Evacuen la zona de riesgo y proceda de acuerdo a lo establecido en el programa de contingencia -Acordeón del área y restringe el acceso a personal ajeno -Utilice el extintor adecuado - No intenté extinguir el fuego hasta que la fuga haya sido detenida de otra manera existe grave riesgo de rescisión y explosión <ul style="list-style-type: none"> • En caso de sismo o fenómeno natural <p>Antes un sismo</p> <ul style="list-style-type: none"> -Conozca las zonas de seguridad - Contar con un mapa de peligro? potencialy zonas seguras - Reciba entrenamiento en primeros auxilios y evacuación 	<p>X</p>	<p>Durante este periodo no ha existido ningún incidente y/o accidente de manera natural o antrópica, en caso de suceder se tomará en cuenta lo establecido en esta medida.</p>
----------	--	----------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Manténgase plenamente informado de cómo interrumpir de forma segura sus labores habituales o el proceso de construcción - Observe la ubicación de su área de trabajo Buscar sitios de protección contra materiales que pudieran desprenderse. - Haga una evacuación de vulnerabilidad de su entorno de trabajo para determinar los peligros potenciales - En caso de derrame o fuga - Localice el derrame o fuga - Antes de comenzar con el control o contención del derrame, debe colocarse los elementos de protección personal necesario: ropa adecuada impermeable y resistente a los productos químicos guantes protectores lentes de seguridad protección respiratoria. - Contenga con barreras, di que sí o materiales absorbentes - Colocar fluidos y desechables en recipientes de fundas para recolección de materiales contaminados - Entregar el material contaminado a un gestor calificado 				
--	--	--	--	--	--

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO:

ITEM	MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar el nivel de cumplimiento al presente PMA a través de un informe interno de cumplimiento de las medidas del plan de aprobación por la Autoridad Ambiental. 	X			Se presenta el informe correspondiente a este periodo.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Monitorear el manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos dentro del área de influencia del proyecto. 			X	La acción No Aplica, debido a que durante este periodo no se han realizado actividades que generen desechos peligrosos.

3	<ul style="list-style-type: none"> Realizar el mantenimiento de los extintores 	X			Los extintores se encuentran recargados, en buen estado y ubicados en lugares visibles y de fácil acceso.
---	---	---	--	--	---

PLAN DE REHABILITACION:

ITEM	MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> Revegetación reforestación de áreas degradadas en el proyecto con plantas nativas de la zona. 			X	La acción no aplica, debido a que el proyecto se encuentra en etapa de construcción.

PLAN DE ENTREGA Y ABANDONO:

ITEM	MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> Desmantelamiento de la infraestructura temporal existente en el área del proyecto (campamento, área de almacenamiento de combustibles y desechos peligrosos) 			X	La acción no aplica, debido a que el proyecto se encuentra en etapa de construcción.
2	<ul style="list-style-type: none"> Limpieza general del área del proyecto. 			X	La acción no aplica, debido a que el proyecto se encuentra en etapa de construcción.

18. RESUMEN DE CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES

Para determinar las sanciones establecidas en el Procedimiento de Sanciones por incumplimientos Ambientales.

Dentro del periodo evaluado 25 de enero al 28 de febrero de 2023 se encontró con un Nivel de Conformidad al 100%.

19. REPORTE FOTOGRÁFICO



Carretero en su fase inicial



Desbroce y limpieza



Medidas de cunetas



Excavación de cuneta



Descarga del material de mejoramiento



Regada del material de mejoramiento



Compactado de mejoramiento con rodillo



Medidas de ancho de vía



Carretero con material de mejoramiento



Carretero con subbase de clase 3



Armado del ármico



Colocación del ármico



Colocación de Señalización



Carretero con subbase de clase 3



Medidas de ancho de vía



Carretero con subbase de clase 3



Colocación del armico



Descarga de material de mejoramiento



Compactado de material de mejoramiento



Carretero con material de mejoramiento



Regado de material de mejoramiento



Compactado de material de mejoramiento



Carretero con material de mejoramiento



Regada de material de mejoramiento



Excavación de cunetas



Regada de material de mejoramiento



Excavación de canal



Descarga de material de mejoramiento



Compactado de material de mejoramiento



Regada de material de mejoramiento



Carretero con material de mejoramiento

20. INFORME DEL PERSONAL

Personal técnico del contratista

No	FUNCIÓN	NOMBRE	NÚMERO DE CÉDULA
1	SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. MARCO VINICIO TAMAYO MEJIA	1600086779
2	RESIDENTE DE OBRA 1	ING. JONATHAN RODOLFO TORRES TAMAYO	1600294852
3	RESIDENTE DE OBRA 2	ING. LUIS OCTAVIO TIBANTA GUAMÁN	1600153132
4	TÉCNICO AMBIENTAL	ING. EDGAR RAÚL GASPATA CALO	1600282295
5	TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	ING. WASHINGTON EDUARDO LASCANO COELLO	1600232332
6	TOPÓGRAFO	ING. DANIELA ANALIA GOMEZ ZAMBRANO	0704073212

Personal en obra

No	CARGO	NOMBRE	NÚMERO DE CÉDULA
1	OPERADOR DE EXCAVADORA	JUAN ISAAC ACERO UMAQUINGA	1720483609
2	CHOFER DE VOLQUETA	JOSE ALFREDO AMAGUAY CEDEÑO	1312506288
3	SECRETARIA	NUBIA TATHIANA BRAVO CHANGO	1600354383
4	OPERADOR DE EXCAVADORA	JOSE AUGUSTO CHASIPANTA CHASIPANTA	0503530610
5	OPERADOR DE EXCAVADORA	JOSE PEDRO CHASIPANTA CHASIPANTA	0503774580
6	CHOFER DE VOLQUETA	DAVID ALEJANDRO GOMEZ BARROSO	1600459331
7	OPERADOR DE PLANTA DE ASFALTO	GEREMIAS JOSE GUAMAN CASTILLO	0603907080
8	INGENIERA AMBIENTAL	JHESLY SARAY IBARRA RIVERA	092286234
9	CHOFER CAMIÓN	EDWIN HUGO JACOME RODRIGUEZ	1600342222

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03

Oficina 072 785 269

keyszen.sas@gmail.com

www.keyszen.com

Machala - El oro - Ecuador

10	UFFE DE TALENTO HUMANO	JENNY BEATRIZ JACOME RODRIGUEZ	1600267494
11	ADMINISTRATIVO	JENNYFER BRITHNEY MARIN JACOME	1600671760
12	ADMINISTRATIVO	KENYA MERY JOSEPH MARIN JACOME	1600496770
13	ADMINISTRADOR DE CIA AMAZONAS BUILDING AMAZON S.A.	KLEVER JINSOP MARIN MONTERO	1600296717
14	CHOFER CAMIÓN	JOSE ALEXANDER MARIN PEREZ	1600595876
15	ADMINISTRATIVO	KRISLEY ARIANNA MARIN PEREZ	1600695868
16	AYUDANTE DE TOPOGRAFÍA	EDGAR JUVENAL MIRANDA AMBI	0601716327
17	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	KATTY JESSENIA MONTERO ESPINOSA	1600439804
18	OPERADOR MOTONIVELADORA	PATRICIO BOLIVAR SOTAMINGA BELTRAN	1004325641
19	OBRERO	CESAR LUIS TAPUY TAPUY	1600177461
20	AYUDANTE DE TOPOGRAFÍA	JOSE GREGORIO UGSHA VEGA	0500865159

21. CONCLUSIONES

Esta fiscalización aprueba la presente planilla de avance de obra No. 01, que se encuentra verificada en campo, cumpliendo con los parámetros de acuerdo a la planificación mensual aprobada, por lo que es pertinente continuar con el trámite respectivo.

Hasta la presente fecha de elaboración del informe el desarrollo de la obra se lleva de manera adecuada con la respectiva utilización de los materiales según especificación técnica.

Se ha encontrado en diferentes tramos de la vía intervenida filtraciones de agua subterránea lo que ha dificultado la estabilización de la misma, por lo que ha conllevado a mejorar la estructura, mediante encauzamiento con la finalidad que no se produzcan asentamientos.

22. RECOMENDACIONES

Se deberá dar estricto cumplimiento de la normativa establecida por el Ministerio de Medio Ambiente (MAE) y el Departamento de Gestión Ambiental del GADPPz.

Mantener el número de trabajadores, equipo mínimo y personal técnico en los diferentes frentes de trabajo para mantener el avance conforme el cronograma.

23. BIBLIOGRAFÍA

Weatherspark. (enero de 2023). *Weatherspark*. Obtenido de <https://es.weatherspark.com/m/20022/1/Tiempo-promedio-en-enero-en-Puyo-Ecuador#:~:text=El%20promedio%20de%20lluvia%20durante,o%20es%20menos%20de%2046>

24. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME

Aprobado por:

Elaborado por:



DANNY DANIEL DURAN
CABRERA

Ing. Danny Duran
C.C. 0703997627
Director de Fiscalización



RICARDO WELLINGTON
CARPIO JARAMILLO

Ing. Ricardo Carpio
C.C. 0706553500
Residente

Atentamente,



JESSICA MARIELA
JARAMILLO ARMIJOS

Ing. Jessica Jaramillo
C.C. 0704239128
Gerente General
KEYSZEN S.A.S.
RUC 0791840462001

KEYSZEN **SAS**
INGENIERIA & CONSTRUCCION
Machala - El Oro - Ecuador



MAZONAS BUILDING S.A.

Puyo - Pastaza - Ecuador

PLANILLA DE AVANCE N.1

"ASFALTADO DE LA VIACURARAY -FRANCISCO DE ORELLANA-JATUN PACCHA, HASTA EL KILOMETEO
12 VIA 10 DE AGOSTO -EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA No. 1



ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

FECHA DE CONTRATO: 7 DE NOVIEMBRE DEL 2022
CONTRATISTA: CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
VALOR CONTRATO \$: 4,650,521.23
PLAZO: 540 DIAS
PERIODO: 25/01/2023 A 28/02/2023

CONCEPTO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL ECHA
VALOR PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	-	135,466.45	135,466.45
MULTAS	--	--	--
VALOR REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL	-	1,973.63	1,973.63
VALOR REAJUSTE DEFINITIVO ANTICIPO DE OBRA	-	-	-
VALOR PLANILLA TOTAL	-	137,440.08	137,440.08
ANTICIPO	-	-	-
VALOR LIQUIDO A PAGAR	-	137,440.08	137,440.08

FECHA DEL ANTICIPO: -
VALOR DEL ANTICIPO \$: -
VALOR AMORTIZADO \$: -
SALDO POR AMORTIZAR \$: -

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:



RODILLO VINICIO
GUEVARA MARIN

CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
CONTRATISTA

APROBADO POR:



JESSICA MARIELA
JARAMILLO ARMIJOS

KEYSZEN S.A.S.
FISCALIZADOR EXTERNO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO. FISCALIZACIÓN

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 01

ASFALTADO DE LA VÍA CURBÁRAY - FRANCISCO DE PRELLANA - JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

2 de marzo de 2023

25 de enero de 2023

18 de julio de 2024

25-Ene-23

OBRA : ASFALTADO DE LA VÍA CURBÁRAY - FRANCISCO DE PRELLANA - JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

FECHA DE CONTRATO : 7 de Noviembre de 2022

CONTRATISTA : CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

PLAZO : 540 Días a partir de la orden de inicio

AMPLIACIONES : 0 Días

SUSPENSIÓN : 0 Días

TOTAL : 540 Días

V. CONTRATO : \$4.650.521,23

V. PLANILLAS : \$135.466,45

V. EXCEDENTES : 0,00

% DE AVANCE EJECUTADO : 2,91%

% DE AVANCE PROGRAMADO : 1,58%

PARCIAL ACUMULADO

\$4.650.521,23

\$135.466,45

0,00

2,91%

1,58%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	CANTIDADES			IMPORTANTE			
						T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
1	Desbroce, desbroce y limpieza	Ha	29,18	444,42	\$ 12.963,176		3,20	3,20	10,97%		1,422,14	1,422,14
2	Replanteo y nivelación a nivel de asfalto	km	14,59	1.383,97	\$ 20.192,122		1,60	1,60	10,97%		2.214,35	2.214,35
3	Remoción de alcantarillas	m	243,00	26,76	\$ 6.502,680		62,00	62,00	25,51%		1.659,12	1.659,12
4	Excavación sin clasificar (mov. de tierra)	m ³	68.863,54	1,02	\$ 70.242,811		3.119,20	3.119,20	4,53%		3.181,58	3.181,58
5	Excavación de cunetas de coronación	m ³	613,80	1,29	\$ 791,802				0,00%			
6	Excavación para cunetas y encauzamiento	m ³	8.576,91	5,02	\$ 43.053,088				0,00%			
7	Excavación y relleno de estructuras menores	m ³	7.720,00	5,08	\$ 39.217,600		2.171,59	2.171,59	28,13%		11.031,68	11.031,68
8	Limpieza de derrumbes	m ³	8.746,43	0,82	\$ 7.172,073				0,00%			
9	S.C. Tubería de acero corrugado D= 0,80 m, e=2,5 mm, PM-100	m	126,00	166,33	\$ 20.957,580				0,00%			
10	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2,5 mm, PM-100	m	263,00	272,20	\$ 71.588,600		49,00	49,00	18,63%		13.337,80	13.337,80
11	S.C. Tubería de acero corrugado D= 2,20 m, e=2,5 mm, PM-100	m	46,00	562,20	\$ 25.861,200				0,00%			
12	Hormigón para cunetas (F'c=180 KG/CM)	m ³	4.746,82	167,21	\$ 793.712,772				0,00%			
13	Muro de H.S. f'c=180kg./cm2 tipo B(Cabezales)	m ³	763,00	167,20	\$ 127.573,600				0,00%			
14	Hormigón simple en obras de arte F'c=240 KG/CM2	m ³	78,47	162,46	\$ 12.742,236				0,00%			
15	Hierro estructural fy=4200 kg/cm ²	kg	8.288,90	1,94	\$ 16.082,466				0,00%			
16	Muro de gaviones - calibre N° 12	m ³	400,00	70,12	\$ 28.042,000				0,00%			
17	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m ³	83.263,76	3,00	\$ 249.791,280		6.828,20	6.828,20	8,20%		20.484,60	20.484,60
18	Material de subbase clase 3	m ³	21.010,98	12,44	\$ 261.372,591		1.125,00	1.125,00	5,35%		13.995,00	13.995,00
19	Material de base granular de agregados	m ³	13.031,28	15,78	\$ 205.633,598				0,00%			
20	Transporte material de desalaje	m ³	8.746,43	1,02	\$ 8.921,359				0,00%			
21	Transporte de material pétreo de mejoramiento	m ³ -km	3.309.493,83	0,25	\$ 827.373,458		225.194,04	225.194,04	6,80%		56.298,51	56.298,51
22	Transporte de material pétreo de subbase clase 3	m ³ -km	781.104,32	0,25	\$ 195.272,080		37.102,50	37.102,50	4,75%		9.275,63	9.275,63
23	Transporte de material pétreo de base granular de agregados	m ³ -km	484.450,99	0,25	\$ 121.112,748				0,00%			
24	Impregnación con emulsión asfáltica	Lt	171.247,08	0,76	\$ 130.147,781				0,00%			
25	C. rodadura hormigón asf. Mezclado en planta, e=2"	m ²	122.319,34	9,74	\$ 1.191.390,372				0,00%			
26	Bordillo de H.S. (f'c=210 kg/cm ² - 0,14x0,40)	m	2.000,00	14,64	\$ 29.282,000				0,00%			
27	Aceras de H.S. f'c=180kg/cm ² E=7cm escotillado	m ²	3.000,00	19,32	\$ 57.962,000				0,00%			
28	Marcas en pavimento	m	43.626,97	0,40	\$ 17.452,788				0,00%			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO. FISCALIZACIÓN

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 01

OBRA : ASFALTADO DE LA VÍA CURABAY - FRANCISCO DE PRELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

FECHA DE CONTRATO : 7 de Noviembre de 2022

CONTRATISTA : CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

PLAZO : 540 Días a partir de la orden de inicio

AMPLIACIONES : 0 Días

SUSPENSIÓN : 0 Días

TOTAL : 540 Días

PARCIAL

\$4,650,521.23

\$135,466.45

0.00

2.91%

1.58%

ACUMULADO

\$135,466.45

0.00

2.91%

1.58%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	CANTIDADES			IMPORTE			
						T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
29	Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccionales y bidireccionales)	U	3,895.00	7.32	\$ 28,511,400			-	0.00%			-
30	Pancarta informativa (letero)-con estructura	U	1.00	1,179.51	\$ 1,179,510			-	0.00%			-
31	Señales ecologicas (2.40x1.20)M	U	2.00	354.87	\$ 709,740			-	0.00%			-
32	Señales informativas (2.40x1.20)M	U	4.00	354.87	\$ 1,419,480			-	0.00%			-
33	Señales reglamentarias (0.75 x 0.75)M	U	10.00	111.50	\$ 1,115,000			-	0.00%			-
34	Señales preventivas (0.75 x 0.75) M	U	200.00	111.50	\$ 22,300,000			-	0.00%			-
35	Señales informativas y reglamentarias (0.60mx0.80m) móviles	U	4.00	78.18	\$ 312,720		4.00	4.00	100.00%		312.72	312.72
36	Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.60m) móviles	U	4.00	163.34	\$ 653,360		4.00	4.00	100.00%		653.36	653.36
37	Contenedores metálicos de 55 galones	U	4.00	17.57	\$ 70,280		4.00	4.00	100.00%		70.28	70.28
38	Kit antiderrames	U	4.00	157.50	\$ 630,000		4.00	4.00	100.00%		630.00	630.00
39	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m	1,000.00	0.32	\$ 320,000		90.00	90.00	9.00%		28.80	28.80
40	S/C Cono de seguridad con protección UV, 71cm Indy, cinta reflectiva	U	20.00	22.48	\$ 449,600		20.00	20.00	100.00%		449.60	449.60
41	Suministro de paleta de alto y siga	U	4.00	30.32	\$ 121,280		4.00	4.00	100.00%		121.28	121.28
42	Capacitación sobre preservación de recursos naturales (de 2 a 3 horas)	U	1.00	100.00	\$ 100,000		1.00	1.00	100.00%		100.00	100.00
43	Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas)	U	1.00	100.00	\$ 100,000		1.00	1.00	100.00%		100.00	100.00
44	Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 horas)	U	1.00	100.00	\$ 100,000		1.00	1.00	100.00%		100.00	100.00
DESCUENTOS:					\$ 4,650,521.23				TOTAL	\$ 0.00	\$ 135,466.45	\$ 135,466.45
Anticipo									0%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Mora 0 días									\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
VALOR A PAGARSE									\$ 0.00	\$ 135,466.45	\$ 135,466.45	\$ 135,466.45

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS DÓLARES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS



ODILO VINCICIO GUEVARA MARIN



JESSICA MARIELA JARAMILLO ARMILLOS



ERYKA MIREYA SILVA MANZANO

CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATISTA

KEYSEN S.A.S.

FISCALIZADOR EXTERNO

ING. ERYKA SILVA

ADMINISTRADOR GADPPP



MAZONAS BUILDING S.A.

Puyo - Pastaza - Ecuador

REAJUSTE

PROVISIONAL

"ASFALTADO DE LA VIACURARAY -FRANCISCO DE ORELLANA-JATUN PACCHA, HASTA EL KILOMETRO
12 VIA 10 DE AGOSTO -EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA



REAJUSTE (PROVISIONAL) PLANILLA 1

PROYECTO: ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
UBICACIÓN: PARROQUIA 10 DE AGOSTO-CANTON PASTAZA-PROVINCIA DE PASTAZA
CONTRATISTA: CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
ANEXO: REAJUSTE (PROVISIONAL) PLANILLA 1
FECHA: 02/03/2023
POR: \$ 1,973.63

NOTA:

FORMULA POLINOMICA DE REAJUSTE

Pr=Po(0.143 B1/Bo + 0.072 C1/Co + 0.034 COM1/COMo + 0.372 E1/Eo + 0.128 F1/Fo + 0.002 H1/Ho + 0.057 M1/Mo + 0.147 P1/Po + 0.023 T1/To + 0.022 X1/Xo)

CUADRILLA TIPO

Table with columns: DESCRIPCION, COEFICIENTE, JORNAL T.D, TOTAL, PLANILLA #1 (Nov-22, Feb-23) JORNAL T.D, TOTAL

Table with columns: DESCRIPCION, SIMBOLO, COEFICIENTE, PRECIO O, PRECIO (I), RELACION, TERMINO, OBSERVACIONES

Summary table with rows: VALOR DE PLANILLA: \$ 135,466.45, VALOR A REAJUSTE (Po) \$ 135,466.45, VALOR REAJUSTADO (Pr=Po*I) \$ 137,440.08, VALOR DE REAJUSTE PRECIOS (Pr-Po) \$ 1,973.63

REAJUSTE: 1.015
OBSERVACIONES: Sub-indices Nov-22, Sub-indices Feb-23

A FAVOR DEL CONTRATISTA
SON: MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES DÓLARES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Handwritten notes: 137440.08, 0.98, 1422.39, Calcular con todos los decimales

JESSICA MARIELA JARAMILLO ARMIJOS
KEYSZEN S.A.S. FISCALIZADOR EXTERNO

ING. ALVARO SOSA DIRECCION DE FISCALIZACION



MAZONAS BUILDING S.A.

Puyo - Pastaza - Ecuador

ANEXOS
GRÀFICOS
VOL DE OBRA

"ASFALTADO DE LA VIACURARAY -FRANCISCO DE ORELLANA-JATUN PACCHA, HASTA EL KILOMETEO
12 VIA 10 DE AGOSTO -EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"





**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO**



PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
CONTRATISTA:	CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.		
PLANILLA N°:	1	N° RUBRO:	1
PERIODO:	25-Ene-23 - 28-Feb-23	UNIDAD:	Ha

Desbroce, desbosque y limpieza



TRAMO	ABSCISADO		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m2)	CANTIDAD EJECUTADA (Ha)	OBSERVACIONES
	DESDE	HASTA					
1	0+000.00	1+600.00	1,600.00	20.00	32,000.00	3.20	
TOTAL						3.20	

PLANILLADO ANTERIORMENTE =	Ha
TOTAL CONTRATADO =	29.18 Ha
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	3.20 Ha
CANTIDAD PLANILLADA =	3.20 Ha
EXCEDENTES =	- Ha



Firmado electrónicamente por:
ODILO VENICIO GUEVARA MARIN



Firmado electrónicamente por:
JESSICA MARIELA JARAMILLO ARMIJOS

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
CONTRATISTA

KEYSZEN S.A.S
FISCALIZADOR EXTERNO



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO**



PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
CONTRATISTA:	CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.		
PLANILLA N°:	1	N° RUBRO:	2
PERIODO:	25-Ene-23	-	28-Feb-23
		UNIDAD:	km

Replanteo y nivelación a nivel de asfalto



TRAMO	ABSCISADO		LONGITUD (m)	LONGITUD (Km)	CANTIDAD EJECUTADA (Km)	OBSERVACIONES
	DESDE	HASTA				
1	0+000.00	1+600.00	1,600.00	1.60	1.60	
TOTAL					1.60	

PLANILLADO ANTERIORMENTE =	km
TOTAL CONTRATADO =	14.59 km
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA	1.60 km
CANTIDAD PLANILLADA =	1.60 km
EXCEDENTES =	- km



Firmado electrónicamente por:
ODILO VINICIO GUEVARA MARIN



Firmado electrónicamente por:
JESSICA MARTELA JARAMILLO ARMIJOS

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
CONTRATISTA

KEYSZEN S.A.S
FISCALIZADOR EXTERNO



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO**



PROYECTO: ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

CONTRATISTA: CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

PLANILLA N°: 1 **N° RUBRO:** 3

PERIODO: 25-Ene-23 - 28-Feb-23 **UNIDAD:** m

Remocion de alcantarillas

DESCRIPCIÓN	ELEMENTO	LONGITUD	OBSERVACIONES
		L (m)	
Abs. 0+120.00	Tubería de acero corrugado D= 0,80 m	12.00	Diametro= 0,80 m
Abs. 0+440.00	Tubería de acero corrugado D= 1,20 m	14.00	Diametro= 1,20 m
Abs. 0+620.00	Tubería de acero corrugado D= 1,20 m	12.00	Diametro= 1,20 m
Abs. 0+780.00	Tubería de acero corrugado D= 1,20 m	12.00	Diametro= 1,20 m
Abs. 1+480.00	Tubería de acero corrugado D=0,80 m	12.00	Diametro= 0,80 m
TOTAL		62.00	

PLANILLADO ANTERIORMENTE =	m³
TOTAL CONTRATADO =	243.00 m³
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	62.00 m³
CANTIDAD PLANILLADA =	62.00 m³
EXCEDENTES =	- m³



Firmado electrónicamente por:
**ODILO VINICIO
GUEVARA MARIN**



Firmado electrónicamente por:
**JESSICA MARIELA
JARAMILLO ARMIJOS**

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
CONTRATISTA

KEYSZEN S.A.S
FISCALIZADOR EXTERNO




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 PROVINCIAL DE PASTAZA
 ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
CONTRATISTA:	CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.		
PLANILLA N°:	1	N° RUBRO:	4
PERIODO:	25-Ene-23	28-Feb-23	UNIDAD: m ²

Excavacion sin claificar (mov. De tierra)

SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO
 EXCAVACIÓN DE CAJERAS Y TALUDES



TRAMO	ABSCISADO		CANTIDAD EJECUTADA (m3)	VOLUMEN EXCAVADO (m3)	OBSERVACIONES
	DESDE	HASTA			
1	0+000.00	1+600.00	3,119.20	3,119.20	Ver anexo justificativo Rubro 4
TOTAL				3119,20	

PLANILLADO ANTERIORMENTE =	- m ³
TOTAL CONTRATADO =	68,863.64 m ³
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	3,119.20 m ³
CANTIDAD PLANILLADA =	3,119.20 m ³
EXCEDENTES =	- m ³



Firmado electrónicamente por:
 ODILO VINICIO
 GUEVARA MARIN

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
 CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
 JESSICA MARIELA
 JARAMILLO ARMIJOS

KEYSZEN S.A.S
 FISCALIZADOR EXTERNO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 PROVINCIAL DE PASTAZA
 ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
CONTRATISTA:	CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.		
PLANILLA No.	1	Nº RUBRO	4
PERIODO:	25-Ene-23	-	28-Feb-23
		UNIDAD:	m³



Excavación sin clasificar(mov.de tierra)

Abs 0+000 a la 1+600

ABSCISAS	LONGITUD (M)	CAJERAS (M2)	ÁREA CORTE(M2)	AREA CAJERAS. (M2)	ÁREA PROMEDIO (M2)	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO (M3)
0+000.00		0	2.57	2.57			
	20.00				2.04	40.80	40.80
0+020.00		1.43	0.07	1.5			
	20.00				2.13	42.60	83.40
0+040.00		1.59	1.16	2.75			
	20.00				2.06	41.20	124.60
0+060.00		1.34	0.02	1.36			
	20.00				1.50	30.00	154.60
0+080.00		1.59	0.04	1.63			
	20.00				1.70	34.00	188.60
0+100.00		1.61	0.15	1.76			
	20.00				2.06	41.20	229.80
0+120.00		1.67	0.69	2.36			
	20.00				2.18	43.60	273.40
0+140.00		1.39	0.61	2			
	20.00				1.49	29.80	303.20
0+160.00		0.97	0	0.97			
	20.00				1.12	22.40	325.60
0+180.00		1.25	0.01	1.26			
	20.00				1.27	25.40	351.00
0+200.00		1.28	0	1.28			
	20.00				1.20	24.00	375.00
0+220.00		1.12	0	1.12			
	20.00				1.25	25.00	400.00
0+240.00		1.34	0.03	1.37			
	20.00				1.15	23.00	423.00
0+260.00		0.93	0	0.93			
	20.00				1.06	21.20	444.20
0+280.00		1.05	0.14	1.19			
	20.00				1.38	27.60	471.80
0+300.00		1.51	0.05	1.56			
	20.00				1.61	32.20	504.00
0+320.00		1.45	0.21	1.66			
	20.00				1.87	37.40	541.40
0+340.00		1.53	0.55	2.08			
	20.00				2.36	47.20	588.60
0+360.00		1.67	0.97	2.64			
	20.00				2.01	40.20	628.80
0+380.00		1.37	0.01	1.38			
	20.00				1.17	23.40	652.20
0+400.00		0.95	0	0.95			
	20.00				0.66	13.20	665.40
0+420.00		0.37	0	0.37			

ABSCISAS	LONGITUD (M)	CAJERAS (M2)	ÁREA CORTE(M2)	AREA CAJERAS. (M2)	ÁREA PROMEDIO (M2)	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO (M3)
	20.00				0.19	3.80	669.20
0+440.00		0	0	0			
	20.00				0.00	0.00	669.20
0+460.00		0	0	0			
	20.00				0.00	0.00	669.20
0+480.00		0	0	0			
	20.00				0.40	8.00	677.20
0+500.00		0.72	0.07	0.79			
	20.00				1.00	20.00	697.20
0+520.00		1.15	0.05	1.2			
	20.00				1.21	24.20	721.40
0+540.00		1.17	0.05	1.22			
	20.00				1.12	22.40	743.80
0+560.00		1.01	0	1.01			
	20.00				0.86	17.20	761.00
0+580.00		0.48	0.23	0.71			
	20.00				0.36	7.20	768.20
0+600.00		0	0	0			
	20.00				0.00	0.00	768.20
0+620.00		0	0	0			
	20.00				0.00	0.00	768.20
0+640.00		0	0	0			
	20.00				1.35	27.00	795.20
0+660.00		1.41	1.28	2.69			
	20.00				3.47	69.40	864.60
0+680.00		1.74	2.5	4.24			
	20.00				4.58	91.60	956.20
0+700.00		1.74	3.17	4.91			
	20.00				3.65	73.00	1,029.20
0+720.00		1.52	0.86	2.38			
	20.00				1.50	30.00	1,059.20
0+740.00		0.54	0.07	0.61			
	20.00				0.31	6.20	1,065.40
0+760.00		0	0	0			
	20.00				0.00	0.00	1,065.40
0+780.00		0	0	0			
	20.00				0.14	2.80	1,068.20
0+800.00		0.26	0.01	0.27			
	20.00				0.73	14.60	1,082.80
0+820.00		1.17	0.02	1.19			
	20.00				1.38	27.60	1,110.40
0+840.00		1.53	0.04	1.57			
	20.00				2.05	41.00	1,151.40
0+860.00		1.74	0.78	2.52			
	20.00				2.29	45.80	1,197.20
0+880.00		1.63	0.42	2.05			
	20.00				2.26	45.20	1,242.40
0+900.00		1.73	0.74	2.47			
	20.00				2.53	50.60	1,293.00
0+920.00		1.71	0.87	2.58			
	20.00				2.26	45.20	1,338.20
0+940.00		1.7	0.24	1.94			
	20.00				2.55	51.00	1,389.20
0+960.00		1.74	1.41	3.15			
	20.00				3.26	65.20	1,454.40
0+980.00		1.74	1.62	3.36			
	20.00				3.28	65.60	1,520.00
1+000.00		1.73	1.47	3.2			
	20.00				2.79	55.80	1,575.80

ABSCISAS	LONGITUD (M)	CAJERAS (M2)	ÁREA CORTE(M2)	AREA CAJERAS. (M2)	ÁREA PROMEDIO (M2)	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO (M3)
1+020.00		1.72	0.66	2.38			
	20.00				1.72	34.40	1,610.20
1+040.00		1.04	0.02	1.06			
	20.00				0.53	10.60	1,620.80
1+060.00		0	0	0			
	20.00				0.01	0.20	1,621.00
1+080.00		0	0.01	0.01			
	20.00				0.01	0.20	1,621.20
1+100.00		0	0	0			
	20.00				0.00	0.00	1,621.20
1+120.00		0	0	0			
	20.00				0.00	0.00	1,621.20
1+140.00		0	0	0			
	20.00				0.00	0.00	1,621.20
1+160.00		0	0	0			
	20.00				4.02	80.40	1,701.60
1+180.00		0.72	7.32	8.04			
	20.00				14.15	283.00	1,984.60
1+200.00		1.66	18.59	20.25			
	20.00				17.63	352.60	2,337.20
1+220.00		1.67	13.34	15.01			
	20.00				13.22	264.40	2,601.60
1+240.00		1.42	10	11.42			
	20.00				7.13	142.60	2,744.20
1+260.00		1.54	1.3	2.84			
	20.00				2.59	51.80	2,796.00
1+280.00		1.42	0.92	2.34			
	20.00				1.36	27.20	2,823.20
1+300.00		0.37	0	0.37			
	20.00				0.19	3.80	2,827.00
1+320.00		0	0	0			
	20.00				0.00	0.00	2,827.00
1+340.00		0	0	0			
	20.00				0.00	0.00	2,827.00
1+360.00		0	0	0			
	20.00				0.06	1.20	2,828.20
1+380.00		0.07	0.04	0.11			
	20.00				0.23	4.60	2,832.80
1+400.00		0.35	0	0.35			
	20.00				0.92	18.40	2,851.20
1+420.00		1.26	0.22	1.48			
	20.00				1.98	39.60	2,890.80
1+440.00		1.28	1.19	2.47			
	20.00				1.92	38.40	2,929.20
1+460.00		1	0.37	1.37			
	20.00				0.69	13.80	2,943.00
1+480.00		0	0	0			
	20.00				0.03	0.60	2,943.60
1+500.00		0	0.06	0.06			
	20.00				0.16	3.20	2,946.80
1+520.00		0.26	0	0.26			
	20.00				1.18	23.60	2,970.40
1+540.00		1.3	0.79	2.09			
	20.00				2.50	50.00	3,020.40
1+560.00		1.7	1.2	2.9			
	20.00				2.36	47.20	3,067.60
1+580.00		1.58	0.23	1.81			
	20.00				2.58	51.60	3,119.20
1+600.00		1.74	1.6	3.34			

ABSCISAS	LONGITUD (M)	CAJERAS (M2)	ÁREA CORTE(M2)	AREA CAJERAS. (M2)	ÁREA PROMEDIO (M2)	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO (M3)
							3,119.20
SUB TOTAL EJECUTADO (M3)							3,119.20
TOTAL EJECUTADO EN PLANILLA (M3)							3,119.20
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ODILO VINICIO GUEVARA MARIN		 <small>Firmado electrónicamente por:</small> JESSICA MARIELA JARAMILLO ARMIJOS					
CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. CONTRATISTA				KEYSZEN S.A.S FISCALIZADOR EXTERNO			



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA



CÁLCULO DE VOLUMEN DE TIERRA

PROYECTO: ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
 UBICACIÓN: PARROQUIA 10 DE AGOSTO-CANTON PASTAZA-PROVINCIA DE PASTAZA
 CONTRATISTA: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
 FECHA: 02/03/2023

Station	Cut Area (Sq.m.)	Cut Volume (Cu.m.)	Reusable Volume (Cu.m.)	Fill Area (Sq.m.)	Fill Volume (Cu.m.)	Cum. Cut Vol. (Cu.m.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.m.)	Cum. Fill Vol. (Cu.m.)	Cum. Net Vol. (Cu.m.)
ESTACIÓN	ÁREA DE CORTE	VOLUMEN DE CORTE	VOLUMEN REUSABLE	ÁREA DE RELLENO	VOLUMEN DE RELLENO	VOLUMEN ACUMULADO DE CORTE	VOLUMEN ACUMULADO REUSABLE	VOLUMEN ACUMULADO DE RELLENO	VOLUMEN ACUMULADO NETO
	m2	m3	m3	m2	m3	m3	m3	m3	m3
0	2.57	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0.07	26.39	26.39	0.64	6.36	26.39	26.39	6.36	20.04
40	1.16	12.33	12.33	0.19	8.29	38.72	38.72	14.64	24.08
60	0.02	11.77	11.77	0.73	9.26	50.49	50.49	23.9	26.59
80	0.04	0.59	0.59	0.23	9.63	51.08	51.08	33.53	17.54
100	0.15	1.94	1.94	0.17	4.01	53.02	53.02	37.54	15.48
120	0.69	8.4	8.4	0.07	2.38	61.42	61.42	39.92	21.5
140	0.61	12.99	12.99	0.53	5.98	74.41	74.41	45.9	28.51
160	0	6.17	6.17	1.39	19.2	80.58	80.58	65.1	15.49
180	0.01	0.18	0.18	0.94	23.27	80.76	80.76	88.37	-7.61
200	0	0.13	0.13	1.14	20.82	80.89	80.89	109.19	-28.3
220	0	0	0	1.05	21.97	80.9	80.9	131.16	-50.26
240	0.03	0.27	0.27	0.71	17.66	81.17	81.17	148.82	-67.65
260	0	0.27	0.27	2.2	29.14	81.43	81.43	177.96	-96.52
280	0.14	1.43	1.43	1.78	39.86	82.87	82.87	217.81	-134.95
300	0.05	1.94	1.94	0.63	24.16	84.81	84.81	241.97	-157.16
320	0.21	2.62	2.62	0.92	15.52	87.43	87.43	257.49	-170.05
340	0.55	7.61	7.61	0.65	15.7	95.04	95.04	273.19	-178.15
360	0.97	15.24	15.24	0.09	7.44	110.28	110.28	280.63	-170.35
380	0.01	9.88	9.88	0.54	6.36	120.16	120.16	286.99	-166.83
400	0	0.14	0.14	2.41	29.57	120.3	120.3	316.56	-196.26
420	0	0	0	4.73	71.32	120.3	120.3	387.87	-267.57
440	0	0	0	8.23	129.53	120.3	120.3	517.41	-397.1
460	0	0.08	0.08	6.73	149.59	120.38	120.38	666.99	-546.61
480	0	0.11	0.11	5.92	126.49	120.5	120.5	793.48	-672.98
500	0.07	0.72	0.72	2.43	83.48	121.22	121.22	876.96	-755.74
520	0.05	1.21	1.21	1.02	34.59	122.43	122.43	911.55	-789.12
540	0.05	1.06	1.06	1.27	22.96	123.49	123.49	934.51	-811.02
560	0	0.59	0.59	1.75	30.24	124.08	124.08	964.75	-840.66
580	0.23	2.4	2.4	3.28	50.23	126.48	126.48	1015	-888.52
600	0	2.35	2.35	10.57	138.48	128.83	128.83	1153.48	-1024.66
620	0	0	0	9.75	203.27	128.83	128.83	1356.75	-1227.93
640	0	0	0	4.86	146.17	128.83	128.83	1502.92	-1374.1
660	1.28	13	13	0.14	49.94	141.82	141.82	1552.86	-1411.04
680	2.5	37.9	37.9	0	1.35	179.72	179.72	1554.21	-1374.49
700	3.17	56.76	56.76	0	0	236.47	236.47	1554.21	-1317.73
720	0.86	40.32	40.32	0.36	3.55	276.79	276.79	1557.76	-1280.97
740	0.07	9.24	9.24	3.24	36	286.03	286.03	1593.76	-1307.72
760	0	0.66	0.66	7.89	111.28	286.7	286.7	1705.04	-1418.34
780	0	0	0	10.12	180.06	286.7	286.7	1885.1	-1598.4
800	0.01	0.13	0.13	4.79	149.09	286.83	286.83	2034.19	-1747.36
820	0.02	0.35	0.35	1.26	60.51	287.18	287.18	2094.7	-1807.52
840	0.04	0.61	0.61	0.61	18.7	287.78	287.78	2113.4	-1825.61
860	0.78	8.21	8.21	0.3	9.07	295.99	295.99	2122.47	-1826.48
880	0.42	12.03	12.03	0.36	6.54	308.02	308.02	2129.01	-1820.99
900	0.74	11.57	11.57	0.02	3.74	319.59	319.59	2132.75	-1813.16
920	0.87	16.06	16.06	0.05	0.71	335.64	335.64	2133.45	-1797.81
940	0.24	11.15	11.15	0.16	2.16	346.79	346.79	2135.62	-1788.83
960	1.41	16.5	16.5	0	1.65	363.20	363.20	2137.26	-1773.08
980	1.62	30.27	30.27	0.13	1.28	393.56	393.56	2138.54	-1744.98
1000	1.47	30.9	30.9	0.11	2.37	424.46	424.46	2140.91	-1716.45
1020	0.66	21.3	21.3	0.15	2.57	445.76	445.76	2143.48	-1697.72
1040	0.02	6.76	6.76	1.99	21.42	452.52	452.52	2164.9	-1712.38
1060	0	0.16	0.16	5.86	78.62	452.68	452.68	2243.52	-1790.84
1080	0.01	0.13	0.13	8.45	143.19	452.81	452.81	2386.7	-1933.9
1100	0	0.13	0.13	15.24	236.88	452.94	452.94	2623.58	-2170.64
1120	0	0	0	17.62	328.59	452.94	452.94	2952.17	-2499.23
1140	0	0	0	12.68	302.96	452.94	452.94	3255.12	-2802.19
1160	0	0	0	7.09	197.68	452.94	452.94	3452.8	-2999.86
1180	7.32	73.24	73.24	1.84	89.31	526.18	526.18	3542.11	-3015.93
1200	18.59	259.17	259.17	0	18.4	785.35	785.35	3560.51	-2775.16

1220	13.34	319.32	319.32	0.06	0.56	1104.68	1104.68	3561.07	-2456.39
1240	10	233.26	233.26	0.47	5.2	1337.94	1337.94	3566.27	-2228.34
1260	1.3	114.09	114.09	0.64	10.7	1452.03	1452.03	3576.97	-2124.94
1280	0.92	23.12	23.12	1.81	24.11	1475.15	1475.15	3601.08	-2125.93
1300	0	9.61	9.61	3.64	54.21	1484.76	1484.76	3655.29	-2170.53
1320	0	0	0	9.49	131.18	1484.76	1484.76	3786.48	-2301.72
1340	0	0	0	17.72	272.12	1484.76	1484.76	4058.6	-2573.84
1360	0	0	0	12.23	299.52	1484.76	1484.76	4358.12	-2873.36
1380	0.04	0.42	0.42	8.03	202.6	1485.18	1485.18	4560.72	-3075.54
1400	0	0.44	0.44	4.89	129.22	1485.62	1485.62	4689.94	-3204.32
1420	0.22	2.21	2.21	0.72	55.67	1487.83	1487.83	4745.61	-3257.78
1440	1.19	14.52	14.52	1.4	20.31	1502.35	1502.35	4765.92	-3263.58
1460	0.37	15.75	15.75	2.06	33.73	1518.1	1518.1	4799.65	-3281.55
1480	0	3.46	3.46	9.44	114.5	1521.56	1521.56	4914.16	-3392.59
1500	0.06	0.58	0.58	7.91	173.57	1522.15	1522.15	5087.72	-3565.57
1520	0	0.57	0.57	4.21	121.28	1522.72	1522.72	5209	-3686.28
1540	0.79	7.93	7.93	0.96	51.72	1530.65	1530.65	5260.72	-3730.07
1560	1.2	19.94	19.94	0.05	10.14	1550.6	1550.6	5270.86	-3720.27
1580	0.23	14.33	14.33	0.17	2.23	1564.93	1564.93	5273.09	-3708.16
1600	1.6	18.36	18.36	0	1.68	1583.29	1583.29	5274.77	-3691.49



Firmado electrónicamente por:
RODILLO VINICIO
AGUIRRE GUEVARA MARIN

AMAZONAS BUILDING / AMAZONBUILD S.A.
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
JESSICA MARIELA
JARAMILLO ARMIJOS

KEYSZEN S.A.S.
FISCALIZADOR EXTERNO



PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
CONTRATISTA:	CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.		
PLANILLA No.	1	Nº RUBRO	7
PERIODO:	25-Ene-23	28-Feb-23	UNIDAD: m ²

Excavacion y relleno de estructuras menores




ALCANTARILLA DE ACERO CORRUGADO ABCISCA					D+160
MEJORAMIENTO SOBRE ALCANTARILLA			MEJORAMIENTO DEBAJO DE TUBERIA		ANCHO DE VIA (m)
LADO MAYOR(m)	LADO MENOR(m)	ALTO(m)	LARGO(m)	alto (m)	
9.00	4.50	7.00	4.50	1.50	9.00
TUBERIA					
DIAMETRO (m)	1.20	AREA DE TUB (m2)	1.13	VOL. TUB (m3)	-10.18

COORDENADAS				
PUNTOS	x	y	TRAMOS	DISTANCIA
a	1.00	9.00	a-b	9.00
b	10.00	9.00	b-c	8.50
c	7.75	0.80	c-d	1.50
d	7.75	-0.70	d-e	4.50
e	3.25	-0.70	e-f	1.50
f	3.25	0.80	f-g	8.50
g	1.00	9.00		

Area (m2)	Ancho de Via (m)	Volumen relleno (m3)	Vol. Tub. (m3)	Vol. Total (m3)
66.20	9.00	595.80	-10.18	585.62

GRAFICO:

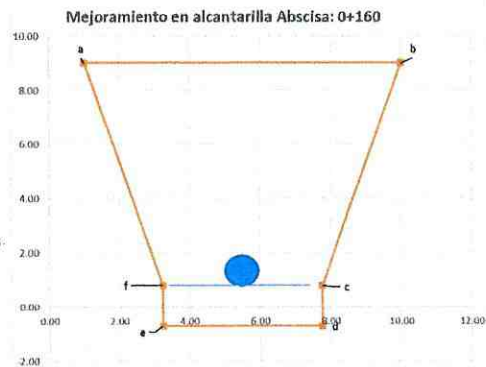


ALCANTARILLA DE ACERO CORRUGADO ABCISCA					0+420
MEJORAMIENTO SOBRE ALCANTARILLA			MEJORAMIENTO DEBAJO DE TUBERIA		ANCHO DE VIA (m)
LADO MAYOR(m) a	LADO MENOR(m) b	ALTO(m)	LARGO(m)	alto (m)	
12.00	6.20	8.43	6.20	1.50	9.00
TUBERIA					
DIAMETRO (m)	1.20	AREA DE TUB (m2)	1.13	VOL TUB (m3)	-10.18

COORDENADAS				
PUNTOS	x	y	TRAMOS	DISTANCIA
a	1.00	9.00	a-b	12.00
b	13.00	9.00	b-c	10.06
c	10.10	-0.63	c-d	1.50
d	10.10	-2.13	d-e	6.20
e	3.90	-2.13	e-f	1.50
f	3.90	-0.63	f-g	10.06
g	1.00	9.00		

Area (m2)	Ancho de Via (m)	Volumen relleno (m3)	Vol. Tub. (m3)	Vol. Total (m3)
101.75	9.00	915.73	-10.18	905.55

GRAFICO:

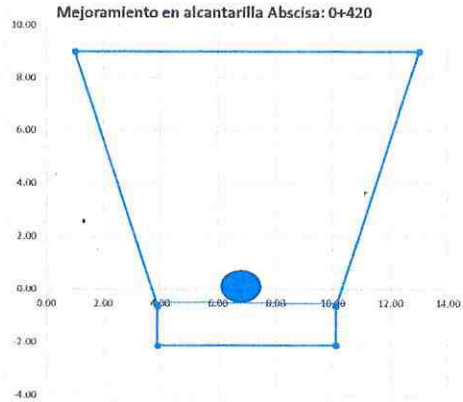


ALCANTARILLA DE ACERO CORRUGADO ABCISCA					0+590
MEJORAMIENTO SOBRE ALCANTARILLA			MEJORAMIENTO DEBAJO DE TUBERIA		ANCHO DE VIA (m)
LADO MAYOR(m) a	LADO MENOR(m) b	ALTO(m)	LARGO(m)	alto (m)	
7.80	4.50	8.20	4.50	2.00	9.00
TUBERIA					
DIAMETRO (m)	1.20	AREA DE TUB (m2)	1.13	VOL TUB (m3)	-10.18

COORDENADAS				
PUNTOS	x	y	TRAMOS	DISTANCIA
a	1.00	9.00	a-b	7.80
b	8.80	9.00	b-c	9.54
c	7.15	-0.40	c-d	2.00
d	7.15	-2.40	d-e	4.50
e	2.65	-2.40	e-f	2.00
f	2.65	-0.40	f-g	9.54
g	1.00	9.00		

Area (m2)	Ancho de Via (m)	Volumen relleno (m3)	Vol. Tub. (m3)	Vol. Total (m3)
71.51	9.00	643.59	-10.18	633.41



GRAFICO:



MEJORAMIENTO DEBAJO DE ARMICO-FUERA DE CABEZAL

Alcantarilla	ABCISCA	LONG. TUB	Long. Vía	Tub. Restante	espesor de mejoramiento	Vol mejoramiento
1	0+160	16		8	2.00	16
2	0+420	15.5		8	1.50	15
3	0+590	16		8	2.00	16
Total:						47 m3

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN
Excavacion y relleno Abs.160	m³	585.62
Excavacion y relleno Abs.420	m³	805.55
Excavacion y relleno Abs.590	m³	633.41
Excavacion y mejoramiento debajo de tubería-fuera del cabezal	m³	47.00
TOTAL		2171.59

TOTAL EJECUTADO (M3)		2,171.59
TOTAL EJECUTADO EN PLANILLA (M3)		2,171.59
 Firmado electrónicamente por: ODILO VINICIO GUEVARA MARIN	 Firmado electrónicamente por: JESSICA MARIELA JARAMILLO ARMIJOS	
CÍA. AMAZON CONTRATISTA	AMAZONBUILD S.A. FISCALIZADOR EXTERNO	KEYSZEN S.A.S FISCALIZADOR EXTERNO



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO**



PROYECTO: ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

CONTRATISTA: CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

PLANILLA N°: 1	N° RUBRO: 10
PERIODO: 25-Ene-23 - 28-Feb-23	UNIDAD: m

S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2.5 mm, PM-100



ALCANT.	ABSCISA	CANTIDAD EJECUTADA (m)	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA (m)	OBSERVACIONES
1	0+160.00	16.00	m	16.00	Tubería de acero corrugado
2	0+420.00	17.00	m	17.00	Tubería de acero corrugado
3	0+590.00	16.00	m	16.00	Tubería de acero corrugado
TOTAL				49,00	

PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	m
TOTAL CONTRATADO =	263.00	m
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	49.00	m
CANTIDAD PLANILLADA	49.00	m
EXCEDENTES =	-	m



Firmado electrónicamente por:
**ODILO VINICIO
GUEVARA MARIN**

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
**JESSICA MARIELA
JARAMILLO ARMIJOS**

KEYSZEN S.A.S
FISCALIZADOR EXTERNO




**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO**



PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
CONTRATISTA:	CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.,		
PLANILLA N°:	1	N° RUBRO:	17
PERIODO:	25-Ene-23	28-Feb-23	UNIDAD: m³

Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)

**SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO
MEJORAMIENTO DE CAJERAS Y TERRAPLEN**



TRAMO	ABSCISADO		CANTIDAD EJECUTADA (m3)	OBSERVACIONES
	DESDE	HASTA		
1	0+000.00	1+600.00	6,828.20	Ver anexo justificativo Rubro 17
TOTAL			6,828.20	

PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	m³
TOTAL CONTRATADO =	68,863.54	m³
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	6,828.20	m³
CANTIDAD PLANILLADA =	6,828.20	m³
EXCEDENTES =	-	m³



Firmado electrónicamente por:
**ODILO VINICIO
GUEVARA MARIN**

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
**JESSICA MARIELA
JARAMILLO ARMIJOS**

KEYSZEN S.A.S
FISCALIZADOR EXTERNO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
CONTRATISTA:	CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.		
PLANILLA No.	1	Nº RUBRO	17
PERIODO:	25-Ene-23	28-Feb-23	UNIDAD: m³

Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)

Abs 0+000-1+600							
ABSCISAS	LONGITUD (M)	CAJERAS (M2)	AREA RELLENO(M2)	AREA T. (M2)	AREA PROMEDIO	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO (M3)
0+000.00		0	0	0			
	20.00				1.04	20.80	20.80
0+020.00		1.43	0.64	2.07			
	20.00				1.93	38.60	59.40
0+040.00		1.59	0.19	1.78			
	20.00				1.93	38.60	98.00
0+060.00		1.34	0.73	2.07			
	20.00				1.95	39.00	137.00
0+080.00		1.59	0.23	1.82			
	20.00				1.80	36.00	173.00
0+100.00		1.61	0.17	1.78			
	20.00				1.76	35.20	208.20
0+120.00		1.67	0.07	1.74			
	20.00				1.83	36.60	244.80
0+140.00		1.39	0.53	1.92			
	20.00				2.14	42.80	287.60
0+160.00		0.97	1.39	2.36			
	20.00				2.28	45.60	333.20
0+180.00		1.25	0.94	2.19			
	20.00				2.31	46.20	379.40
0+200.00		1.28	1.14	2.42			
	20.00				2.30	46.00	425.40
0+220.00		1.12	1.05	2.17			
	20.00				2.11	42.20	467.60
0+240.00		1.34	0.71	2.05			
	20.00				2.59	51.80	519.40
0+260.00		0.93	2.2	3.13			
	20.00				2.98	59.60	579.00
0+280.00		1.05	1.78	2.83			
	20.00				2.49	49.80	628.80
0+300.00		1.51	0.63	2.14			
	20.00				2.26	45.20	674.00
0+320.00		1.45	0.92	2.37			
	20.00				2.28	45.60	719.60
0+340.00		1.53	0.65	2.18			
	20.00				1.97	39.40	759.00
0+360.00		1.67	0.09	1.76			
	20.00				1.84	36.80	795.80
0+380.00		1.37	0.54	1.91			
	20.00				2.64	52.80	848.60
0+400.00		0.95	2.41	3.36			
	20.00				4.23	84.60	933.20
0+420.00		0.37	4.73	5.1			
	20.00				6.67	133.40	1,066.60
0+440.00		0	8.23	8.23			
	20.00				7.48	149.60	1,216.20
0+460.00		0	6.73	6.73			
	20.00				6.33	126.60	1,342.80
0+480.00		0	5.92	5.92			
	20.00				4.54	90.80	1,433.60
0+500.00		0.72	2.43	3.15			
	20.00				2.66	53.20	1,486.80
0+520.00		1.15	1.02	2.17			
	20.00				2.31	46.20	1,533.00
0+540.00		1.17	1.27	2.44			
	20.00				2.60	52.00	1,585.00

0+560.00		1.01	1.75	2.76			
	20.00				3.26	65.20	1,650.20
0+580.00		0.48	3.28	3.76			
	20.00				7.17	143.40	1,793.60
0+600.00		0	10.57	10.57			
	20.00				10.16	203.20	1,996.80
0+620.00		0	9.75	9.75			
	20.00				7.31	146.20	2,143.00
0+640.00		0	4.86	4.86			
	20.00				3.21	64.20	2,207.20
0+660.00		1.41	0.14	1.55			
	20.00				1.65	33.00	2,240.20
0+680.00		1.74	0	1.74			
	20.00				1.74	34.80	2,275.00
0+700.00		1.74	0	1.74			
	20.00				1.81	36.20	2,311.20
0+720.00		1.52	0.36	1.88			
	20.00				2.83	56.60	2,367.80
0+740.00		0.54	3.24	3.78			
	20.00				5.84	116.80	2,484.60
0+760.00		0	7.89	7.89			
	20.00				9.01	180.20	2,664.80
0+780.00		0	10.12	10.12			
	20.00				7.59	151.80	2,816.60
0+800.00		0.26	4.79	5.05			
	20.00				3.74	74.80	2,891.40
0+820.00		1.17	1.26	2.43			
	20.00				2.29	45.80	2,937.20
0+840.00		1.53	0.61	2.14			
	20.00				2.09	41.80	2,979.00
0+860.00		1.74	0.3	2.04			
	20.00				2.02	40.40	3,019.40
0+880.00		1.63	0.36	1.99			
	20.00				1.87	37.40	3,056.80
0+900.00		1.73	0.02	1.75			
	20.00				1.76	35.20	3,092.00
0+920.00		1.71	0.05	1.76			
	20.00				1.81	36.20	3,128.20
0+940.00		1.7	0.16	1.86			
	20.00				1.80	36.00	3,164.20
0+960.00		1.74	0	1.74			
	20.00				1.81	36.20	3,200.40
0+980.00		1.74	0.13	1.87			
	20.00				1.86	37.20	3,237.60
1+000.00		1.73	0.11	1.84			
	20.00				1.86	37.20	3,274.80
1+020.00		1.72	0.15	1.87			
	20.00				2.46	49.20	3,324.00
1+040.00		1.04	2	3.04			
	20.00				4.45	89.00	3,413.00
1+060.00		0	5.86	5.86			
	20.00				7.16	143.20	3,556.20
1+080.00		0	8.45	8.45			
	20.00				11.85	237.00	3,793.20
1+100.00		0	15.24	15.24			
	20.00				16.43	328.60	4,121.80
1+120.00		0	17.62	17.62			
	20.00				15.15	303.00	4,424.80
1+140.00		0	12.68	12.68			
	20.00				9.89	197.80	4,622.60
1+160.00		0	7.09	7.09			
	20.00				4.83	96.60	4,719.20
1+180.00		0.72	1.84	2.56			
	20.00				2.11	42.20	4,761.40
1+200.00		1.66	0	1.66			
	20.00				1.70	34.00	4,795.40
1+220.00		1.67	0.06	1.73			
	20.00				1.81	36.20	4,831.60
1+240.00		1.42	0.47	1.89			
	20.00				2.04	40.80	4,872.40
1+260.00		1.54	0.64	2.18			
	20.00				2.71	54.20	4,926.60
1+280.00		1.42	1.81	3.23			

	20.00				3.62	72.40	4,999.00
1+300.00		0.37	3.64	4.01			
	20.00				6.75	135.00	5,134.00
1+320.00		0	9.49	9.49			
	20.00				13.61	272.20	5,406.20
1+340.00		0	17.72	17.72			
	20.00				14.98	299.60	5,705.80
1+360.00		0	12.23	12.23			
	20.00				10.17	203.40	5,909.20
1+380.00		0.07	8.03	8.1			
	20.00				6.67	133.40	6,042.60
1+400.00		0.35	4.89	5.24			
	20.00				3.61	72.20	6,114.80
1+420.00		1.26	0.72	1.98			
	20.00				2.33	46.60	6,161.40
1+440.00		1.28	1.4	2.68			
	20.00				2.84	56.80	6,218.20
1+460.00		1	2	3			
	20.00				6.22	124.40	6,342.60
1+480.00		0	9.44	9.44			
	20.00				8.94	178.80	6,521.40
1+500.00		0	8.44	8.44			
	20.00				6.46	129.20	6,650.60
1+520.00		0.26	4.22	4.48			
	20.00				3.37	67.40	6,718.00
1+540.00		1.3	0.96	2.26			
	20.00				2.01	40.20	6,758.20
1+560.00		1.7	0.05	1.75			
	20.00				1.75	35.00	6,793.20
1+580.00		1.58	0.17	1.75			
	20.00				1.75	35.00	6,828.20
1+600.00		1.74	0	1.74			
SUB TOTAL EJECUTADO (M3)							6,828.20
TOTAL EJECUTADO EN PLANILLA (M3)							6,828.20



Firmado electrónicamente por:
RODOLFO VINICIO
GUEVARA MARIN

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
JESSICA MARTELA
JARAMILLO ARMUTOS

KEYSZEN S.A.S
FISCALIZADOR EXTERNO



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO**



PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
CONTRATISTA:	CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.		
PLANILLA N°:	1	N° RUBRO:	18
PERIODO:	25-Ene-23	28-Feb-23	UNIDAD: m ²

Material de subbase clase 3



TRAMO	ABSCISADO			DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA		CANTIDAD EJECUTADA (m ³)	OBSERVACIONES
	DESDE	HASTA	LONGITUD (m)	ANCHO(m)	ESPESOR (m)		
1	0+000.00	1+000.00	1000.00	7.50	0.15	1,125.00	
TOTAL						1,125.00	

PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	m ³
TOTAL CONTRATADO =	21,010.98	m ³
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	1,125.00	m ³
CANTIDAD PLANILLADA =	1,125.00	m ³
EXCEDENTES =	-	m ³



Firmado electrónicamente por:
ODILO VINICIO
GUEVARA MARIN



Firmado electrónicamente por:
JESSICA MARIELA
JARAMILLO ARMIJOS

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
CONTRATISTA

KEYSZEN S.A.S
FISCALIZADOR EXTERNO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 PROVINCIAL DE PASTAZA
 ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



PROYECTO: ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

CONTRATISTA: CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

PLANILLA N°: 1 **N° RUBRO:** 21

PERIODO: 25-Ene-23 - 28-Feb-23 **UNIDAD:** m³ - km

Transporte de material pétreo de mejoramiento

TRAMO	ABSCISADO		CANTIDAD EJECUTADA (m3)	DISTANCIA MINA - INICIO PROYECTO (Km)	CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO (Km)	DISTANCIA TOTAL (Km)	TOTAL (Km-m3)	OBSERVACIONES
	DESDE	HASTA						
1	0+000.00	1+600.00	6,828.20	31.33	1.65	32.98	225,194.04	Cantidades detalladas en Anexo 17
SUB TOTAL							225,194.04	

PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	m³ - km
TOTAL CONTRATADO =	3,309,493.83	m³ - km
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	225,194.04	m³ - km
CANTIDAD PLANILLADA	225,194.04	m³ - km
EXCEDENTES =	-	m³ - km



Firmado electrónicamente por:
 ODILIO VINICIO GUEVARA MARIN

CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
 CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
 JESSICA MARIELA JARAMILLO ARMIJOS

KEYSZEN S.A.S
 FISCALIZADOR EXTERNO



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO**



PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
CONTRATISTA:	CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.		
PLANILLA N°:	1	N° RUBRO:	22
PERIODO:	25-Ene-23 - 28-Feb-23	UNIDAD:	m³ - km

Transporte de material pétreo de subbase clase 3

TRAMO	ABSCISADO		CANTIDAD EJECUTADA (m³)	DISTANCIA MNA - INICIO PROYECTO (Km)	CENTRO DE GRAVEDAD PROYECTO (Km)	DISTANCIA TOTAL (Km)	TOTAL (Km-m³)	OBSERVACIONES
	DESDE	HASTA						
1	0+000.00	1+000.00	1,125.00	31.33	1.65	32.98	37,102.50	Cantidades detalladas en Anexo 18
SUB TOTAL							37,102.50	

PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	m³ - km
TOTAL CONTRATADO =	781,104.32	m³ - km
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	37,102.50	m³ - km
CANTIDAD PLANILLADA	37,102.50	m³ - km
EXCEDENTES =	-	m³ - km



Firmado electrónicamente por:
ODILO VINICIO GUEVARA MARIN



Firmado electrónicamente por:
JESSICA MARIELA JARAMILLO ARMIJOS

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
CONTRATISTA

KEYSZEN S.A.S
FISCALIZADOR EXTERNO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA



ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO

PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
CONTRATISTA:	CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.		
PLANILLA N°:	1	N° RUBRO:	35
PERIODO:	25-Ene-23 - 28-Feb-23	UNIDAD:	U

Señales informativas y reglamentarias (0,60mx0,80m) móviles



DESCRIPCIÓN DEL IMPLEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Señales informativas y reglamentarias (0,60mx0,80m) móviles	u	4,00	
TOTAL		4,00	

PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	u
TOTAL CONTRATADO =	4,00	u
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	4,00	u
CANTIDAD PLANILLADA	4,00	u
EXCEDENTES =	-	u



Firmado electrónicamente por:
ODILO VINICIO
GUEVARA MARIN

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
JESSICA MARIELA
JARAMILLO ARMIJOS

KEYSZEN S.A.S
FISCALIZADOR EXTERNO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA

ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
CONTRATISTA:	CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.		
PLANILLA N°:	1	N° RUBRO:	36
PERIODO:	25-Ene-23 - 28-Feb-23	UNIDAD:	u

Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.60m) móviles



DESCRIPCIÓN DEL IMPLEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.60m) móviles	u	4.00	
TOTAL		4.00	

PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	u
TOTAL CONTRATADO =	4.00	u
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	4.00	u
CANTIDAD PLANILLADA	4.00	u
EXCEDENTES =	-	u



Firmado electrónicamente por:
RODILLO VINICIO
GUEVARA MARIN

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
JESSICA MARIELA
JARAMILLO ARMIJOS

KEYSZEN S.A.S
FISCALIZADOR EXTERNO



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO**



PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
CONTRATISTA:	CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.		
PLANILLA N°:	1	N° RUBRO:	37
PERIODO:	25-Ene-23	- 28-Feb-23	UNIDAD: u

Contenedores metálicos de 55 galones



DESCRIPCIÓN DEL IMPLEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Contenedores metálicos de 55 galones	u	4.00	
TOTAL		4.00	

PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	u
TOTAL CONTRATADO =	4.00	u
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	4.00	u
CANTIDAD PLANILLADA	4.00	u
EXCEDENTES =	-	u



Firmado electrónicamente por:
**ODILO VINICIO
GUEVARA MARIN**



Firmado electrónicamente por:
**JESSICA MARIELA
JARAMILLO ARMIJOS**

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
CONTRATISTA

KEYSZEN S.A.S
FISCALIZADOR EXTERNO



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA**



PROYECTO:	ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA VERACRUZ		
CONTRATISTA:	CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.		
PLANILLA N°:	1	N° RUBRO:	38
PERIODO:	25-Ene-23 -	28-Feb-23	UNIDAD: u

Kit antiderrames



DESCRIPCIÓN DEL IMPLEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Kit antiderrames	u	4.00	
TOTAL		4.00	

PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	u
TOTAL CONTRATADO =	4.00	u
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	4.00	u
CANTIDAD PLANILLADA	4.00	u
EXCEDENTES =	-	u



Firmado electrónicamente por:
**ODILO VINICIO
GUEVARA MARIN**

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
**JESSICA MARIELA
JARAMILLO ARMIJOS**

KEYSZEN S.A.S
FISCALIZADOR EXTERNO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA

ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
CONTRATISTA:	CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.		
PLANILLA N°:	1	N° RUBRO:	39
PERIODO:	25-Ene-23 - 28-Feb-23	UNIDAD:	m

Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)



DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBSERVACIONES
Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	90.00	
TOTAL	90.00	

PLANILLADO ANTERIORMENTE =	- m
TOTAL CONTRATADO =	100.00 m
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	90.00 m
CANTIDAD PLANILLADA	90.00 m
EXCEDENTES =	- m



Firmado electrónicamente por:
ODILO VINICIO
GUEVARA MARIN



Firmado electrónicamente por:
JESSICA MARIELA
GUARAMILLO ARMIJOS

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
CONTRATISTA

KEYSZEN S.A.S
FISCALIZADOR EXTERNO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA

ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
CONTRATISTA:	CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.		
PLANILLA N°:	1	N° RUBRO:	40
PERIODO:	25-Ene-23	29-Feb-23	UNIDAD: u

S/C Cono de seguridad con protección UV, 71cm Incl. cinta reflectiva



DESCRIPCIÓN DEL IMPLEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
S/C Cono de seguridad con protección UV, 71cm Incl. cinta reflectiva	u	20.00	
TOTAL		20.00	

PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	u
TOTAL CONTRATADO =	20.00	u
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	20.00	u
CANTIDAD PLANILLADA	20.00	u
EXCEDENTES =	-	u



Firmado electrónicamente por:
ODILO VINICIO
GUEVARA MARIN



Firmado electrónicamente por:
JESSICA MARIELA
JARAMILLO ARMIJOS

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
CONTRATISTA

KEYSZEN S.A.S
FISCALIZADOR EXTERNO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA

ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



AMAZONAS BUILDING S.A.

PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
CONTRATISTA:	CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.		
PLANILLA N°:	1	N° RUBRO:	41
PERIODO:	25-Ene-23 -	28-Feb-23	UNIDAD: u

Suministro de paleta de alto y siga



DESCRIPCIÓN DEL IMPLEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Suministro de paleta de alto y siga	u	4.00	
TOTAL		4.00	

PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	u
TOTAL CONTRATADO =	4.00	u
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	4.00	u
CANTIDAD PLANILLADA	4.00	u
EXCEDENTES =	-	u



Firmado electrónicamente por:
ODILO VINICIO
GUEVARA MARIN

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
JESSICA MARIELA
JARAMILLO ARMIJOS

KEYSZEN S.A.S
FISCALIZADOR EXTERNO



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA**

ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



AMAZONAS BUILDING S.A.

PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
CONTRATISTA:	CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.		
PLANILLA N°:	1	N° RUBRO:	42
PERIODO:	25-Ene-23 - 28-Feb-23	UNIDAD:	u

Capacitación sobre preservación de recursos naturales (de 2 a 3 horas)



DESCRIPCIÓN DEL IMPLEMENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
Capacitación sobre preservación de recursos naturales (de 2 a 3 horas)	1.00	
TOTAL	1.00	

PLANILLADO ANTERIORMENTE =	- u
TOTAL CONTRATADO =	1.00 u
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	1.00 u
CANTIDAD PLANILLADA	1.00 u
EXCEDENTES =	- u



Firmado electrónicamente por:
**ODILO VINICIO
GUEVARA MARIN**



Firmado electrónicamente por:
**JESSICA MARIELA
JARAMILLO ARMIJOS**

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
CONTRATISTA

KEYSZEN S.A.S
FISCALIZADOR EXTERNO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA

ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
CONTRATISTA:	CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.		
PLANILLA N°:	1	N° RUBRO:	43
PERIODO:	25-Ene-23 - 28-Feb-23	UNIDAD:	u

Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas)



DESCRIPCIÓN DEL IMPLEMENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas)	1.00	
TOTAL	1.00	

PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	u
TOTAL CONTRATADO =	1.00	u
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	1.00	u
CANTIDAD PLANILLADA	1.00	u
EXCEDENTES =	-	u



Firmado electrónicamente por:
ODILO VINICIO
GUEVARA MARIN

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
JESSICA MARIELA
JARAMILLO ARMIJOS

KEYSZEN S.A.S
FISCALIZADOR EXTERNO



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA**

ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
CONTRATISTA:	CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.		
PLANILLA N°:	1	N° RUBRO:	44
PERIODO:	25-Ene-23 - 28-Feb-23	UNIDAD:	u

Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 horas)



DESCRIPCIÓN DEL IMPLEMENTO	UNIDAD	CANIDAD	OBSERVACIONES
Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 horas)	u	1,00	
TOTAL		1.00	

PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	u
TOTAL CONTRATADO =	1,00	u
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	1,00	u
CANTIDAD PLANILLADA	1,00	u
EXCEDENTES =		u



Firmado electrónicamente por:
**RODILLO VINICIO
GUEVARA MARIN**

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
CONTRATISTA




Firmado electrónicamente por:
**JESSICA MARIELA
JARAMILLO ARMIJOS**

KEYSZEN S.A.S
FISCALIZADOR EXTERNO

174000.000

9844600.000

VELOCIDAD DE DISEÑO = 60 km/h



Administración
2019-2023

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

ASFALTADO DE LA VIA G. JIRARAY - FRANCISCO
DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM
2 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN
PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

CLASE:	EXCAVACION	HOJA:	1 DE 2
DESDE:	0+000	ESCALA H:	1:1000
HASTA:	1+000	ESCALA V:	1:100
ESTUDIO:	DEFINITIVO	DIBUJO:	KM

CONTENIDO: PLANTA Y PERFIL DE LA VIA

FISCALIZADOR EXTERNO:



JESSICA MARIELA
JARAMILLO ARMIJOS

ODILO VINICIO
SUEVARA MARIN

MARIN
IAS BUILDING S.A

ING. JESSICA JARAMILLO
GERENTE GENERAL KEYSZEN S.A.S

+ 994.26 + 994.21 +

Administración
2019-2023

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

ASFALTADO DE LA VIA G. JIRARAY - FRANCISCO
DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM
12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN
PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

CLASE:	EXCAVACION	HOJA:	2 DE 2
DESDE:	1+000	ESCALA H:	1:1000
HASTA:	2+000	ESCALA V:	1:100
ESTUDIO:	DEFINITIVO	DIBUJO:	KM

CONTENIDO: PLANTA Y PERFIL DE VIA

FISCALIZADOR EXTERNO:
















ODILO VINICIO
GUEVARA MARIN



JESSICA MARIELA
JARAMILLO ARMIJOS

MARIN
NAS BUILDING S.A

ING. JESSICA JARAMILLO
GERENTE GENERAL KEYSZEN S.A.S

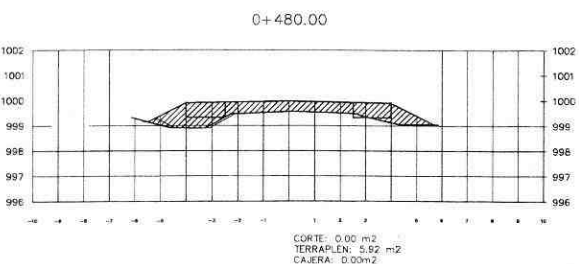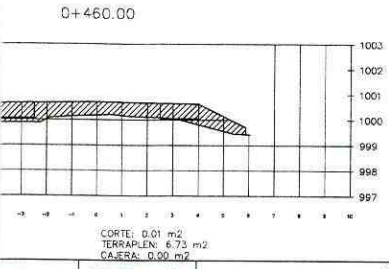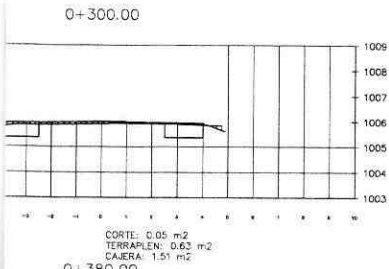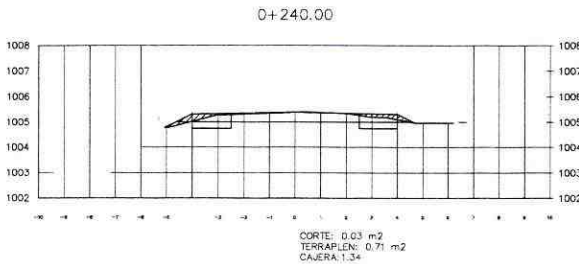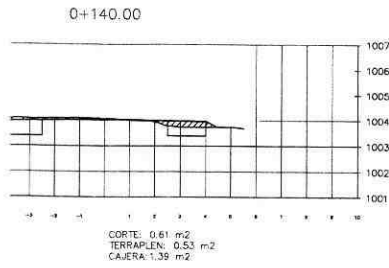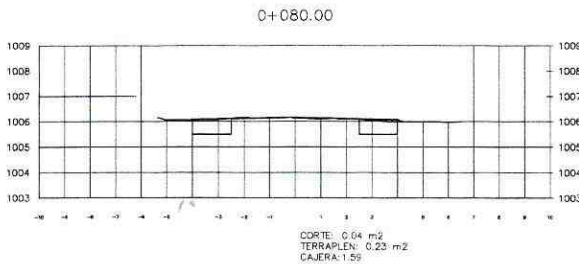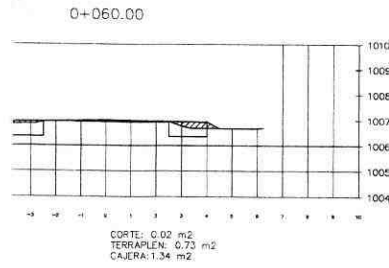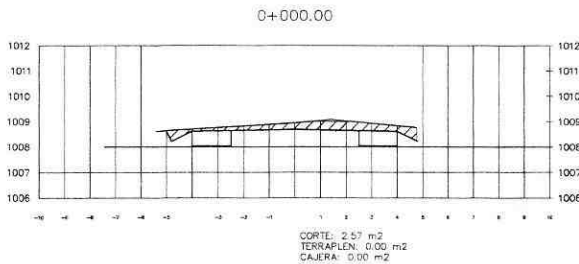



**Administración
2019-2023**

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA**

ASFALTADO DE LA VÍA CUNARAY - FRACCION DE BELLAMA - JATUNPACHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TIEMPO - BANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CLASE: EXCAVACION	HOJA: 1 DE 4
DESDE: 0+000	ESCALA H: 1:1000	
HASTA: 0+520	ESCALA V: 1:100	
CONTENIDO: SECCIONES TRANSVERSALES DE CORTE Y RELLENO	ESTUDIO: DEFINITIVO	DIBUJO: KM

ARTISTA:














DDOLO GUEVARA MARIN
GENERAL AMAZONAS BUILDING S.A












FISCALIZADOR EXTERNO:



INC. JESSICA JARAMILLO
GERENTE GENERAL KEYSZEN S.A.S

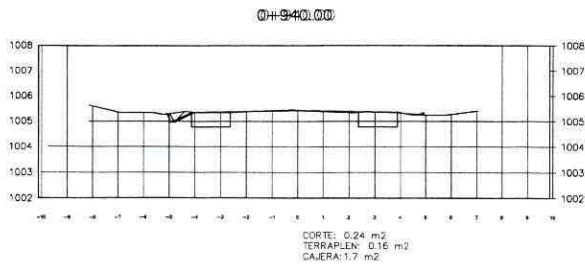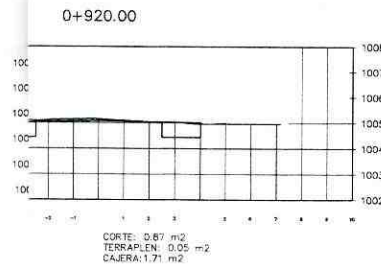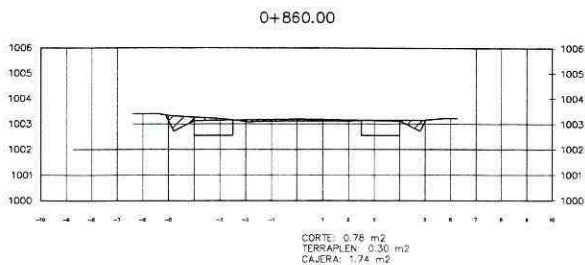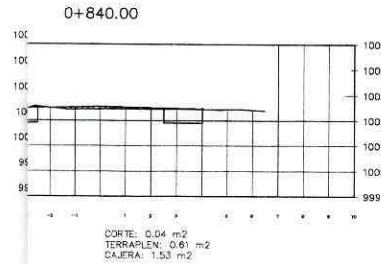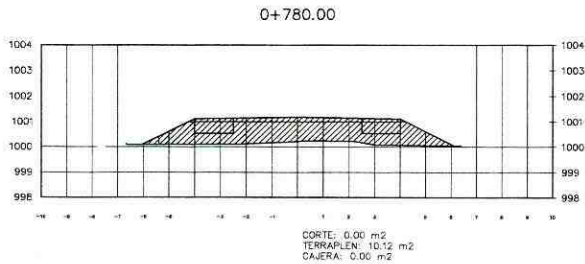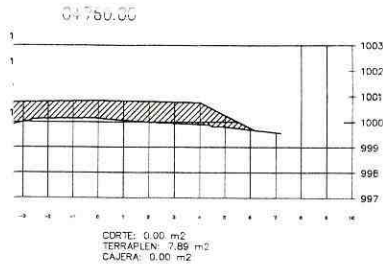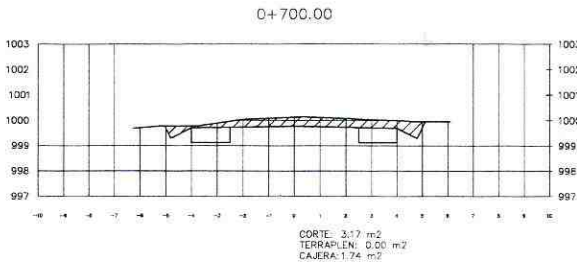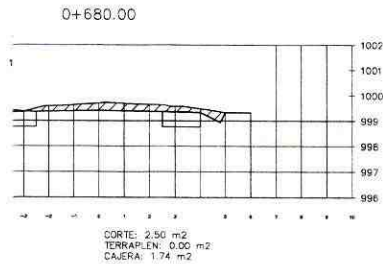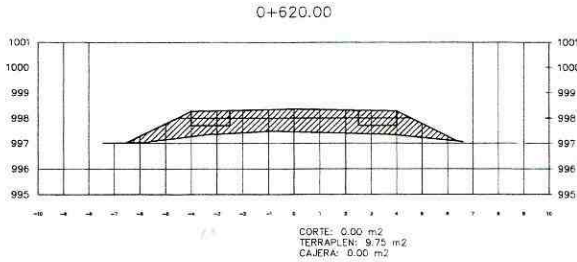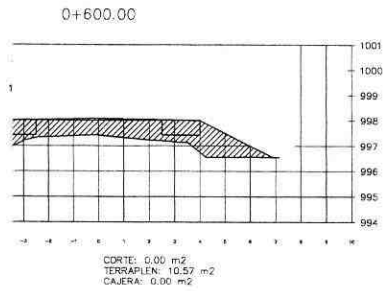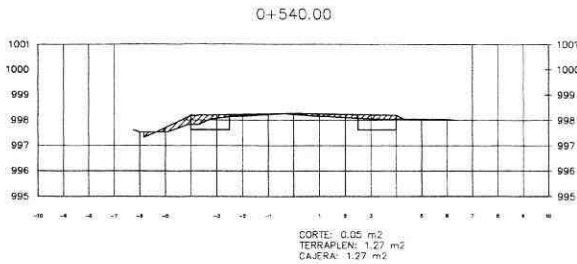

 Administración 2019-2023	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA	
	ASFALTADO DE LA VÍA GUERRAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 DE VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CLASE: EXCAVACION DESDE: 0+540 HASTA: 0+980
CONTENIDO: SECCIONES TRANSVERSALES DE CORTE Y RELLENO	ESTUDIO: DEFINITIVO	DIBUJO: KM
ATISTA:	FISCALIZADOR EXTERNO:	
 ODILIO GUEVARA MARÍN GENERAL AMAZONAS BUILDING S.A.	 ING. JESSICA JARAMILLO GERENTE GENERAL KEYSZEN S.A.S.	

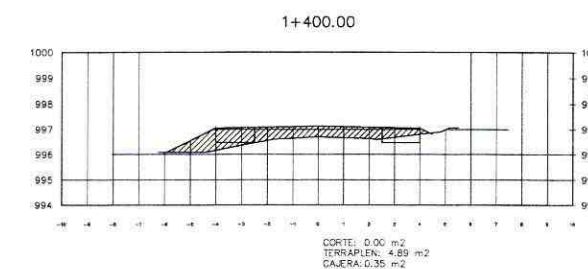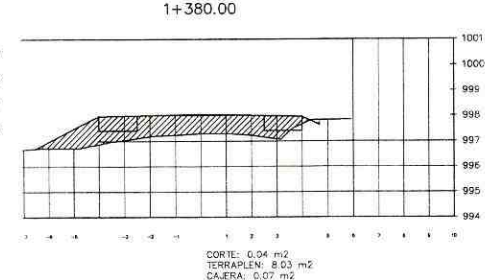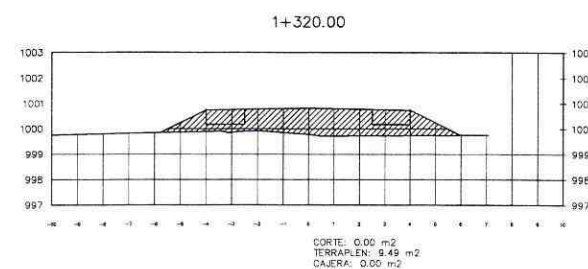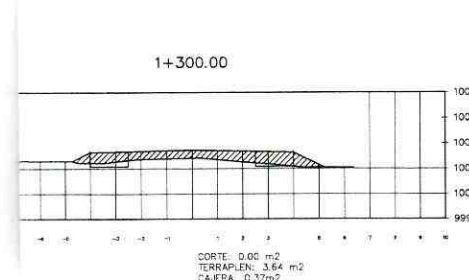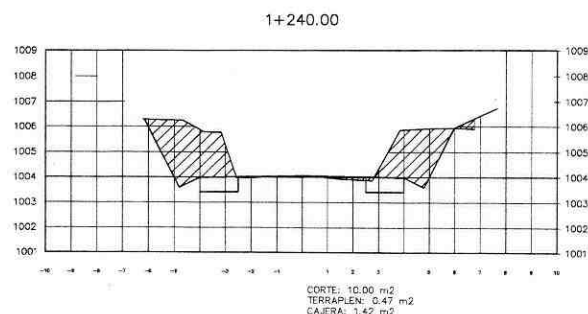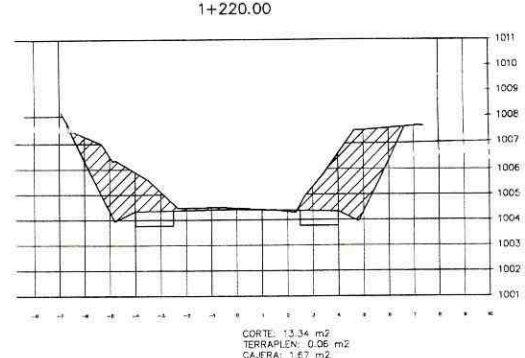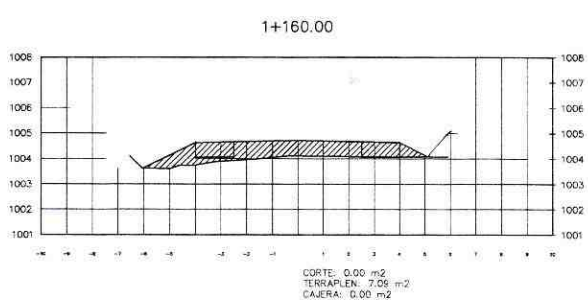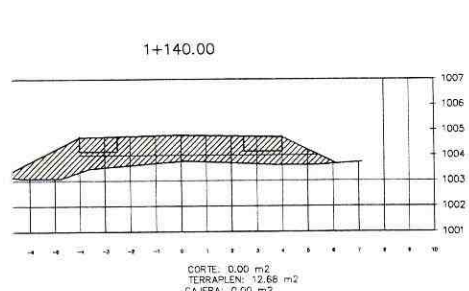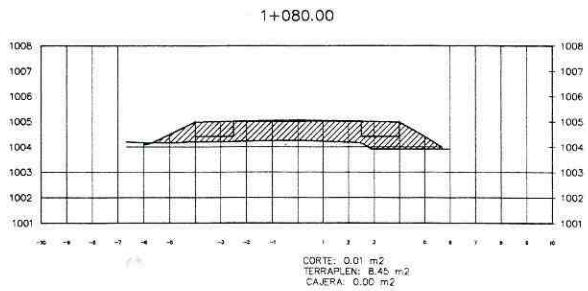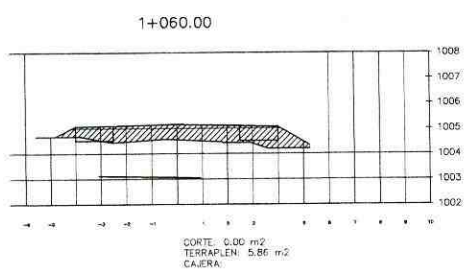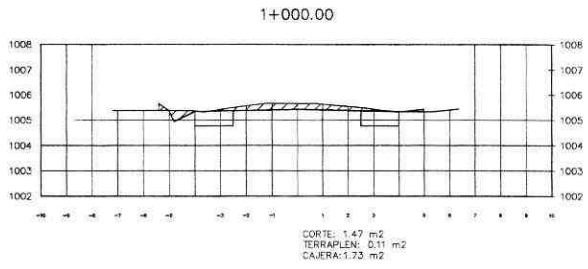

Administración 2019-2023 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

ASFOALTADO DE LA VÍA CUBARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACHA, HASTA EL KM 12 DE LA VÍA 9 DE ABRIL - EL TRIUNFO - CAJÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

CLASE: EXCAVACION HOJA: 3 DE 3
DESDE: 1+000 ESCALA H: 1:100
HASTA: 1+440 ESCALA V: 1:100
CONTENIDO: SECCIONES TRANSVERSALES DE CORTE Y RELLENO ESTUDIO: DEFINITIVO DIBUJO: KM




TRATISTA:

FISCALIZADOR EXTERNO:



R. ODILLO QUEVARA MARIN GENERAL AMAZONAS BUILDING S.A

ING. JESSICA JARAMILLO GERENTE GENERAL KEYSZEN S.A.S

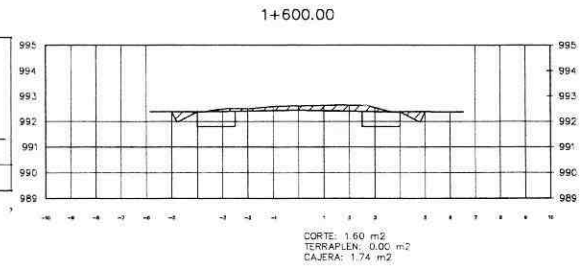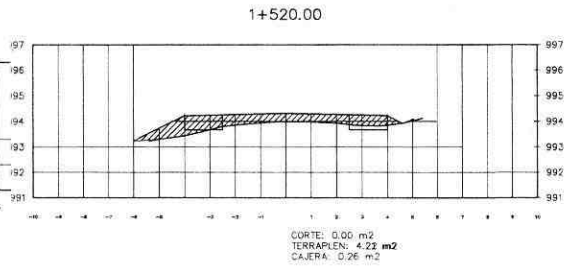

Administración 2019-2023 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

ASFALTADO DE LA VÍA GENERAL - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUMAYUGA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CLASE: EXCAVACION	HOJA: 4 DE 4
	DESDE: 1+460	ESCALA H: 1:1000
	HASTA: 1+600	ESCALA V: 1:100
CONTENIDO: SECCIONES TRANSVERSALES DE CORTE Y RELLENO	ESTUDIO: DEFINITIVO	DIBUJO: KM

ARTISTA:

FISCALIZADOR EXTERNO:



ODILO QUEVARA MARIN
GENERAL AMAZONAS BUILDING S.A



ING. JESSICA JARAMILLO
GERENTE GENERAL KEYSZEN S.A.S



MAZONAS BUILDING S.A.

Puyo - Pastaza - Ecuador

LIBRO

DE OBRA

"ASFALTADO DE LA VIACURARAY -FRANCISCO DE ORELLANA-JATUN PACCHA, HASTA EL KILOMETEO
12 VIA 10 DE AGOSTO -EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"





N:

PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 25 Mes 01 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS:

Reconocimiento del lugar del Proyecto
 Socialización con habitantes del sector.
 Traslado de Maquinarias y equipo.

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

Selección y verificación de Puntos de Inicio de Obra.

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Nublado TARDE: Soleado NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMATICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización

REVISIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

Se establece una metodo logico de trabajo
 Con promisos de trabajo total establecidos en los parametros del contrato

AUTORIZACIONES: (trabajos especificos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

SERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
LUBRICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA
CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
CONTRATO : MONED. USD 4 650 521.23 **FECHA:** 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022
FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S
FECHA DE REPORTE N : Día 26 Mes 01 Año 2023

Espacio para el contratista
TRABAJOS REALIZADOS:
 Excavación desde 0+000 hasta 0+200 margen izquierdo
 Desbroce margen izquierdo 0+000 + 0+800
 Replanteo y nivelación 0+000 hasta 0+1000

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: nublado TARDE: lluvioso NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	7	Ingeniero ambiental	1
MOLOQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización
ACCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

LUBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 27 Mes 01 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS:
 Desbroce lado derecho Ab: i: 0+000 Ab: f: 0+800
 Excavación cajón: 0+000 Ab: f: 0+200 lado derecho.

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvioso TARDE: Lluvioso NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
PISTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)


 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)


 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



N:

PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

LUBICACION : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 28 Mes 01 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS:

Descarga - Tendida - Regar - Compactado Materiales de mejoramiento.
 Descarga - Extendido - Regar - Compactarlo - material sub base
 Abj: 0+000 - Abj: 0+048

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

TIPO DEL TIEMPO: MAÑANA: llovioso TARDE: neblado NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	-
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



N.º

PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 29 Mes 01 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: Descargar - Extender - Regar - Compactar el material de mejoramiento.

Descargar, extender, regar y compactar material de subbase.

Ab. i: 0+048 Ab. f: 0+096

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

PERIODO DEL TIEMPO: MAÑANA: *rubrado* TARDE: *rubrado* NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

[Signature]
CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

[Signature]
CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



N.º

PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 30 Mes 01 Año 2023

Espacio para el contratista

TRabajos REALIZADOS:

- Descarga, - Extender - Regar - Compactar material de mejoramiento.
 - Descarga, - Extender - Regar y Compactar material de sub base.
 Abi: 0+096 Abf: 0+160

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

CONDICIÓN DEL TIEMPO:		MAÑANA: Lluvioso	TARDE: nublado	NOCHE:
EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO		
MAQUINA	Nº	CARGO	Nº	
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1	
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2	
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1	
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1	
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1	
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1	
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2	
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6	
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5	
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1	
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1	
UNICARGADORA	1	INSPECTORES	1	
PARATOS DE TOPOGRAFÍA	1	ALBAÑILES	1	
		SOLDADORES	1	
		JORNALEROS	4	

para la fiscalización

ACCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

IZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

ACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



Nº: 00000000000000000000

PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

MONTANTO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

REALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 31 Mes 01 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJO REALIZADO:

Desbroce y limpieza - Excavación - Encausamiento - movimiento de tierra -
 remoción de alcantarillas - colocación de almezo.
 Descargar, extender, regar y compactar material de mejoramiento
 Abf. 0 + 170

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MANANA: lluvioso TARDE: lluvioso NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
MOLQUETA	1	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
MAQUINA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
COMPAÑADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	6
ASFALTO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	5
ASFALTO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	1
ASFALTO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
ALMOCADERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
DESCARGADORA	1	INSPECTORES	1
INSTRUMENTOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	4
		JORNALEROS	

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

MODIFICACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



N.º

PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 05 Mes 02 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: Desbroce y limpieza. Excavación de cajas lado der y izq.
 Ab i: 0+600 - Ab f: 0+720

Descargar, extendido - Regar - compactar Material de mejoramiento y se base
 Ab i: 0+336 Ab f: 0+389

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvia fuerte TARDE: Lluvioso NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS		SUPERINTENDENTE	
MOTONIVELADORA		RESIDENTE	
CAMION CISTERNA		Ingeniero ambiental	
COLQUETA		Técnico en seguridad	
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO		ING. AYUDANTE	
PLANTA DE ASFALTO		TOPÓGRAFO	
TERMINADORA DE ASFALTO		CADENERO	
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR		OPERADORES	
RODILLO VIBRATORIO LISO		CHOFERES	
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO		MECÁNICO	
CONCRETERA 1 SACO		AYUDANTE DE MECÁNICO	
MINICARGADORA		INSPECTORES	
PARATOS DE TOPOGRAFIA		ALBAÑILES	
		SOLDADORES	
		JORNALEROS	

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)


 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)


 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



N.º

PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCODEORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
 OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCODEORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
 UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA
 CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
 MONTO DEL CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022
 FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S
 FECHA DE REPORTE N : Día 06 Mes 02 Año 2023

espacio para el contratista
 TRABAJOS REALIZADOS: Desbroce, limpieza, excavación, encausamiento, movimiento de tierra - remover alcantarilla. Armado y colocación de armicos pescarior - Extender - Pegar - Compactar de material de mejoramiento y sub base
 Abi: 0+384 - Abf: 0+432
 -Capacitación al personal sobre manejo de desechos peligrosos
 NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvia fuerte TARDE: Lluvioso NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	7	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
MOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PANTA DE ASFALTO	1	TOPOGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMATICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

espacio para la fiscalización
 INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

MONTO DEL CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 07 Mes 02 Año 2023

espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: Desbroce y limpieza, excavación de cajas lado derecho e izquierdo
 Abi: 0+720 Abj: 0+800

Desatque - Extendido - Regado - Compactado de material de mejoramiento y sub base
 Abi: 0+432 - Abj: 0+481

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvioso TARDE: Lluvioso NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
ROLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMATICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)


 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)


 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



N.º

PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-
ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-
ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 08 Mes 02 Año 2023

espacio para el contratista

TRABAJO REALIZADOS: Desbroce y limpieza -Extracción de cajas lado izquierdo
 Abi: 0+800 Abf: 0+910
 Descarga - Extendida - Recardo - Compactado de material de mejora-
 miento y Sub base Abi: 0+481 - Abf: 0+528

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Nublado TARDE: Lluvioso NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
MOLOQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PALANCA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
MODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
MODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
MODILLO VIBRATORIO NEUMATICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	-
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)


 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)


 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



N.º

PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARA Y FRANCISCO ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARA Y FRANCISCO ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 09 Mes 02 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: Desbroce y Limpieza - Excavación de cajeros - lado derecho e izquierdo Abi = 0+910 - Abf: 1+000.
 Replanteo y nivelación Abi: 1+000 - Abf: 2+000
 Descargas - Extendido - Regado - Compactado de material de mejoramiento y subbase. Abi: 0+528 - Abf: 0+576

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvioso TARDE: Lluvioso NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
COLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	1	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	2	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)


 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)


 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



N.º

PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

REALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 10 Mes 02 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: Desbroce y limpieza - Excavación - Encausamiento - Movimiento de tierra - Remoción de Alcantarillas - Armado y Colocación de armicos.
Descargar - Extendido - Pegado - Compactado de material de mejoramiento y sub base Abi = 0+576 - Abf = 0+624

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvioso TARDE: Lluvioso NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	Nº	CARGO	Nº
CAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
OTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
PLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
MINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
ODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
ODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
ODILLO VIBRATORIO NEUMATICO	1	MECÁNICO	1
ONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
INICARGADORA	1	INSPECTORES	1
ARATOS DE TOPOGRAFIA	4	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



N.º

PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
 OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
 UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA
 CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
 MONTO DEL CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022
 FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S
 FECHA DE REPORTE N : Día 11 Mes 02 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: Desbroce y Limpieza -Excavación de cajeras lado derecho e izquierdo Abj: 1+100 Abf: 1+100
 Descarga- Extendido- Regado - Compactado de material de mejoramiento y Subbase Abi- 0+624 - Abf: 0+672
 NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvia fuerte TARDE: Lluvioso NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
CAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
COLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMATICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

ASISTENCIA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



N.º

PROYECTO :	ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
OBJETO DEL CONTRATO :	ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
UBICACIÓN :	PROVINCIA PASTAZA		
CONTRATISTA :	CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.		
MONTANTO DEL CONTRATO :	Monto USD 4 650 521.23	FECHA:	07 DE NOVIEMBRE DEL 2022
FISCALIZADOR :	KEYSZEN S.A.S		
FECHA DE REPORTE N.º :	Día 12	Mes 13	Año 2023

espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: Desbroce y Limpieza - Excavación de cajas lado derecho e izquierdo Abi: 1+100 - Abf: 1+220

Descarga-Extendido - Pegado- Compactado de material de mejoramiento y Subbase Abi: 0+672 Abf: 0+720

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

TIPO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvioso TARDE: Lluvioso NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
COLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	-
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)


CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)


CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



N.º

PROYECTO : ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 13 Mes 02 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS:

- Relleno de cajas ABC 1+220 HASTA 1+300
 - Desbroce y limpieza
 - Excavación y Relleno - Descarga - Extendido - Pegado - Compactado de material de mejoramiento sub base Abj: 0+720 - Abj: 0+768.

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

CONDICIÓN DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvioso TARDE: Lluvioso NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
ROLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos especificos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



N.º

PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 14 Mes 02 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: Desbroce y limpieza - Excavación - Encauzamiento - Movimiento de tierra - Remoción de alcantarilla - Armado y Colocación de curvo.
- Descarga - Extendido - Regado - Compactado de material de mejoramiento Abi: 0+768 - Abf: 0+816

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO:		MAÑANA: Lluvioso	TARDE: Nublado	NOCHE:
EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO		
MAQUINA	No	CARGO	No	
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1	
GRADONIVELADORA	7	RESIDENTE	2	
CAMION CISTERNA	7	Ingeniero ambiental	1	
ROLQUETA	5	Técnico en seguridad	1	
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	4	ING. AYUDANTE	1	
PLANTA DE ASFALTO	4	TOPÓGRAFO	1	
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2	
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6	
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5	
RODILLO VIBRATORIO NEUMATICO	1	MECÁNICO	1	
CONCRETERA 1 SACO	1	AYUDANTE DE MECÁNICO	1	
MINICARGADORA	2	INSPECTORES	1	
PARATOS DE TOPOGRAFIA	7	ALBAÑILES	-	
	1	SOLDADORES	1	
		JORNALEROS	4	

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)


CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)


CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



N.º

PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

LUGAR DE EJECUCIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

VALOR DEL CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 15 Mes 02 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: Desbroce y Limpieza - Excavación de cajeas lado derecho izquierdo Abj: 1+300 - Abf: 1+400

- Descarga - Extendido - Regado - Compactado de material de mejoramiento Abj: 0+816 - Abf: 0+864

- Capacitación al personal sobre seguridad y Salud ocupacional.

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Fuerte lluvia TARDE: Lluvioso NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
COMPACTADORA	7	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	7	Ingeniero ambiental	1
PLACAS	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	-
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)


 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)


 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



N:

PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARA Y FRANCISCO ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARA Y FRANCISCO ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 16 Mes 02 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: Desbroce y limpieza - Excavación de cajas - lado izquierdo y derecho
 Abi: 1+460 Abf: 1+500
 Descargar - Extender - Regado - Compactado de material de mejora -
 miento Abi: 0+864 - Abf: 0+912.

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado TARDE: Nublado NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
ROLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	-
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)


 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)


 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



N:

PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOEORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
 OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOEORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
 UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA
 CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
 MONTO DEL CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022
 FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S
 FECHA DE REPORTE N : Día 17 Mes 02 Año 2023

espacio para el contratista
 TRABAJOS REALIZADOS: Desbroce y limpieza - Excavación de cajas lado izquierdo y derecho Abi: 17500 - Abf: 17600
 - Descarga - Extendido - Pegado - Compactado de material de mejoramiento Abi: 07912 - Abf: 07960

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

TIPO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvioso TARDE: Soleado - NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
CAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
OTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
AMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
OLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
LANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
MINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
ODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
ODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFÉRES	5
ODILLO VIBRATORIO NEUMATICO	1	MECÁNICO	1
ONCRETERA 1 SACO	1	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
INICARGADORA	2	INSPECTORES	1
ARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	-
	1	SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

SERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)


 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)


 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



N.º

PROYECTO : ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

REALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 18 Mes 02 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: Desbroce y Umpieza - Excavación de cajeras lado derecho e izquierdo y Abi: 1+600 - Abf: 1+720
 - Descargar - Extendido - Pegado - Compactado de material de mejoramiento Abi: 0+960 - Abf: 1+008

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Nublado TARDE: Soleado NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
POLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	-
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)


 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)


 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



N.º

PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOEORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
 OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOEORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
 UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA
 CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
 MONTO DEL CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022
 FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S
 FECHA DE REPORTE N : Día 19 Mes 02 Año 2023

espacio para el contratista
 TRABAJOS REALIZADOS: Desbroce y limpieza - Excavación de cajeras - lado derecho e izquierdo Abi: 1+720 - Abf: 1+800
 - Descarga - Extendido - Regado - Compactado de material de mejoramiento Abi: 1+008 - Abf: 1+056
 NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Hablado TARDE: Lluvioso NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
ROLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMATICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	2	INSPECTORES	1
PARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	-
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

espacio para la fiscalización
 INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)
 AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)
 OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)
 VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)


 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)


 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



N.

PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 20 Mes 02 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: Desbroce y limpieza - Excavación de cajas, lado derecho e izquierdo Abi: 1+800 Abf 1+900.
- Descarga - Extendido - Regado de material de mejoramiento Abi: 1+056 - Abf: 1+100

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvioso TARDE: Nublado NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
CAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
OTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
OLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
LANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
RRMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
ODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
ODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
ODILLO VIBRATORIO NEUMATICO	1	MECÁNICO	1
ONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
PARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

SERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)


CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)


CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



N:

PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCODEORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCODEORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Dia 21 Mes 02 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJO REALIZADOS: *Desbroce y limpieza - Excavación de caja lado derecha e izquierdo Abi: 1+900 - Abf: 2+000 Descarga - Extendido - Regado - Compactado de material de mejoramiento. Terraplen lado izquierdo Abi: 1+100 - Abf: 1+152*

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: *Lluvioso* TARDE: *Lluvioso* NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
FOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
COLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PALANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMATICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	-
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

[Signature]
 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

[Signature]
 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



N.º

PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCODEORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCODEORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 22 Mes 02 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: Descarga - Extendido - Pegado - Compactado de material de mejoramiento Abi: 1+152 - Abp: 1+200

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvioso TARDE: Habiado NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
TRACTOR	3	SUPERINTENDENTE	1
EXCAVADORA	3	RESIDENTE	2
CAMIÓN CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
CARGADORA	1	Técnico en seguridad	1
MOTONIVELADORA	1	ING. AYUDANTE	1
RODILLOS	3	TOPÓGRAFO	1
MANQUERO	1	CADENERO	2
ASCABA MECÁNICA	1	OPERADORES	6
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CHOFERES	5
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	MECÁNICO	1
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS	1	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
RECUPERADORA DE PAVIMENTO	1	INSPECTORES	1
PLANTA TRITURADORA	1	ALBAÑILES	0
PLANTA DE ASFALTO	1	SOLDADORES	1
TERMINADORA DE CONCRETO	1	JORNALEROS	4
COLQUETA	5		
CONCRETO MIXER	1		
CONCRETERA	2		

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



N.º

PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 23 Mes 02 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: Descarga - Extendido - Pegado - Compactado de material de mejoramiento Abq: 1+200 - Abf: 1+248

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

CONDICIÓN DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvioso TARDE: Nublado NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
ROLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
MODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
MODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
MODILLO VIBRATORIO NEUMATICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	-
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)


 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)


 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



N.º

PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 24 Mes 02 Año 2023

espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: Descargar, Extendido, Regado - Compactado de material de mejoramiento - Abi: 1+248 - Abf: 1+300

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvia fuerte TARDE: Lluvia fuerte NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
PALQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMATICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
PARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)



CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



N.º

PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARA Y FRANCISCO ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARA Y FRANCISCO ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 25 Mes 02 Año 2023

espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: Descarga - Extendido - Regado - Compactado de material de mejoramiento Ab. i: 1+300 hasta Ab. f: 1+344

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO:		MAÑANA: Soleado	TARDE: Nublado	NOCHE:
EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO		
MAQUINA	No	CARGO	No	
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1	
FOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2	
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1	
ROLQUETA	5	Técnico en seguridad	1	
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1	
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1	
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2	
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	4	OPERADORES	6	
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5	
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1	
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1	
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1	
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1	
		SOLDADORES	1	
		JORNALEROS	4	

espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



N.º

PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 26 Mes 02 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: Descarga - Extendido - Pegado - Compactado de material de mejoramiento Abi: 1+344 - Abf: 1+392

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

PERIODO DEL TIEMPO:	MAÑANA: Soleado	TARDE: Nublado	NOCHE:
EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
BOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMATICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



N.º

PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOEORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOEORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Dia 27 Mes 02 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: Descarga - Extendido - Regado - Compactado de material de mejoramiento Abi: 4+392 - Abj: 1+470

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvioso TARDE: Nublado NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
ROLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMATICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
PARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



N.º

PROYECTO : ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 28 Mes 02 Año 2023

espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Descarga - Extendido - Regado - Compactado de material de mejoramiento Abi: 24470 - Abp: 1+600.

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvia fuerte TARDE: Lluvioso. NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	2
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
ROLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)


CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)


CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



MAZONAS BUILDING S.A.

Puyo - Pastaza - Ecuador

ANEXOS

FOTOGRAFICOS

"ASFALTADO DE LA VIACURARAY -FRANCISCO DE ORELLANA-JATUN PACCHA, HASTA EL KILOMETEO
12 VIA 10 DE AGOSTO -EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"



Desbroce, desbosque y limpieza



Replanteo y nivelación a nivel de asfalto



Excavación sin clasificar



Excavación y relleno de estructuras menores



S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e= 2,5 mm, PM-100



Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)



Material sub base class 3



SEÑALÉTICA







Señalética existente en los distintos frentes del proyecto.

CONTENEDORES METALICOS



Contenedores metálicos según la Norma INEN 2841

KIT ANTIDERRAMES



Material adsorbente (salchicha y aserrín)

CINTA DE PELIGRO






Zonificación de áreas intervenidas con cinta de peligro.

SUMINISTRO DE PALETA DE ALTO Y PARE



Paletas para controlar el tráfico.

CONOS DE SEGURIDAD

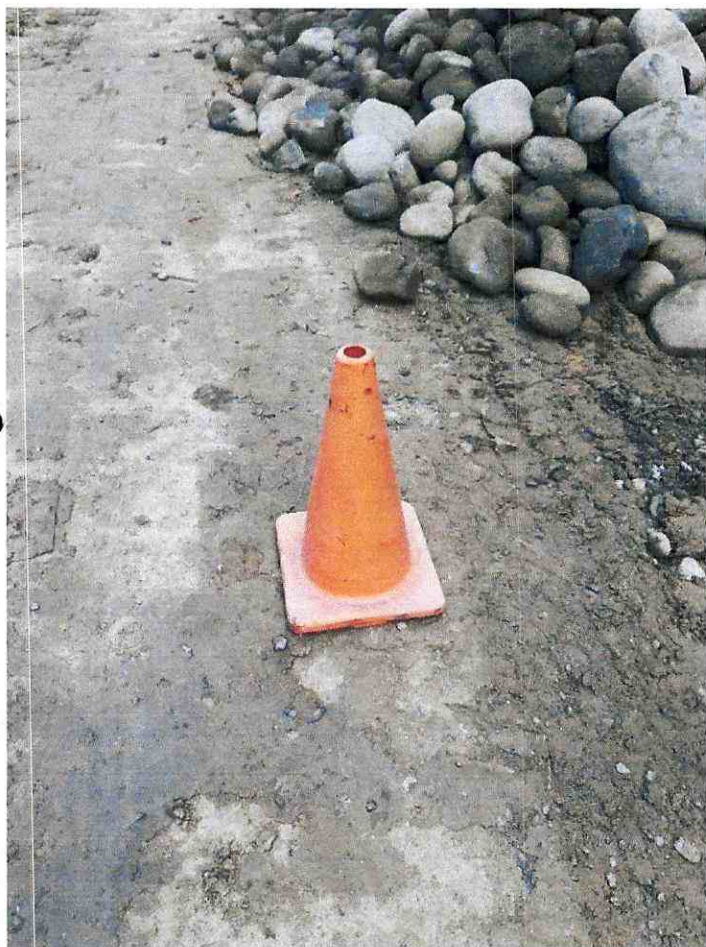

Conos de seguridad existentes en obra.

CAPACITACIONES EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE



Capacitación en prevención de recursos naturales.



Capacitación en manejo de desechos peligrosos.



Capacitación en seguridad y salud ocupacional.



MAZONAS BUILDING S.A.

Puyo - Pastaza - Ecuador

PLANILLA

PAGO IESS

"ASFALTADO DE LA VIACURARAY -FRANCISCO DE ORELLANA-JATUN PACCHA, HASTA EL KILOMETEO
12 VIA 10 DE AGOSTO -EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

marzo 06 del 2023 09:05

GUEVARA MARIN ODILO VINICIO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2023-02-14))

(BANCO GUAYAQUIL S.A.)

No. Comprobante: 0000000166624247

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2023-02-07
No. RUC / REGISTRO:	1691710080001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2023-02-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. - AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.			
Periodo de Pago:	2023 - 01			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2023 - 1	06	1720483609	ACERO UMAQUINGA JUAN ISAAC	521.45	30	NNA	107.42	0.00
2023 - 1	06	1312506288	AMAGUAY CEDEÑO JOSE ALFREDO	691.69	30	NNA	142.49	0.00
2023 - 1	06	1600354383	BRAVO CHANGO NUBIA TATHIANA	458.36	30	NNA	94.42	0.00
2023 - 1	06	0503530610	CHASIPANTA CHASIPANTA JOSE AUGUSTO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 1	06	0503774580	CHASIPANTA CHASIPANTA JOSE PEDRO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 1	06	1600459331	GOMEZ BARROSO DAVID ALEJANDRO	451.92	26	NNA	93.10	0.00
2023 - 1	06	0604954677	GUACHO AUQUILLA JUAN CARLOS	90.00	6	NNA	18.54	0.00
2023 - 1	06	0603907080	GUAMAN CASTILLO GEREMIAS JOSE	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 1	06	1600257404	HERAS PINEDA VERONICA ANDREA	465.87	30	NNA	95.97	0.00
2023 - 1	06	0922862834	IBARRA RIVERA JHESLY SARAY	494.67	30	NNA	101.90	0.00
2023 - 1	06	1600342222	JACOME RODRIGUEZ EDWIN HUGO	691.69	30	NNA	142.49	0.00
2023 - 1	06	1600267494	JACOME RODRIGUEZ JENNY BEATRIZ	494.67	30	NNA	101.90	0.00
2023 - 1	06	1600671760	MARIN JACOME JENNYFER BRITHNEY	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 1	06	1600496770	MARIN JACOME KENYA MERYJOSEPH	450.04	30	NNA	92.71	0.00
2023 - 1	06	1600296717	MARIN MONTERO KLEVER JINSOP	680.00	30	NNA	140.08	0.00
2023 - 1	06	1600695876	MARIN PEREZ JOSE ALEXANDER	450.04	30	NNA	92.71	0.00
2023 - 1	06	1600695868	MARIN PEREZ KRISLEY ARIANNA	458.72	30	NNA	94.50	0.00
2023 - 1	06	0601716327	MIRANDA AMBI EDGAR JUVENAL	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 1	06	1600439804	MONTERO ESPINOSA KATTY JESSENIA	450.04	30	NNA	92.71	0.00
2023 - 1	06	1004325641	SOTAMINGA BELTRAN PATRICIO BOLIVAR	451.92	26	NNA	93.10	0.00
2023 - 1	06	0604593434	TAMAY GUAMAN LUIS GERARDO	521.45	30	NNA	107.42	0.00
2023 - 1	06	1600177461	TAPUY TAPUY CESAR LUIS	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 1	06	0500865159	UGSHA VEGA JOSE GREGORIO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
				10972.53			2260.36	0.00

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

Valor	2370.09
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	2370.09
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	2370.09

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.





COMPROBANTE DE TRANSACCION

COMPROBANTE DE PAGO IESS - 0000000166624247 .

Cedula/RUC : 1691710030001 AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
Codigo/Rubro : PLANI - PAGO DE PLANILLAS
Periodo : 2023-01 Secuencia: 202302140030471
Valor : 2,370.09
Comisión : 0.57
Efectivo : 2,370.66
T.Pagado : 2,370.66 100.00%

JN4 D9V51 2023-02-14 12:32:25

Si realiza el pago a partir de las 17H00, se registrará 202302140030471 190000427660403 I en la recaudación del sgte. día hábil.

Consulte su Comp.Venta o Retencion en WWW.BANCOGUAYAQUIL.COM con el No. 54689

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información

REV 10.10 - 000.1100048



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

marzo 15 del 2023 13:16

GUEVARA MARIN ODILO VINICIO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(DEPOSITADO)

(BANCO GUAYAQUIL S.A.)

No. Comprobante: 000000167593605

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2023-03-06
No. RUC / REGISTRO:	1691710080001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2023-03-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. - AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.			
Periodo de Pago:	2023 - 02			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2023 - 2	06	1720483609	ACERO UMAQUINGA JUAN ISAAC	633.75	30	NNA	130.55	0.00
2023 - 2	06	1312506288	AMAGUAY CEDEÑO JOSE ALFREDO	691.69	30	NNA	142.49	0.00
2023 - 2	06	1600354383	BRAVO CHANGO NUBIA TATHIANA	510.35	30	NNA	105.13	0.00
2023 - 2	06	0503530610	CHASIPANTA CHASIPANTA JOSE AUGUSTO	724.58	30	NNA	149.26	0.00
2023 - 2	06	0503774580	CHASIPANTA CHASIPANTA JOSE PEDRO	560.00	30	NNA	115.36	0.00
2023 - 2	06	1600459331	GOMEZ BARROSO DAVID ALEJANDRO	191.20	11	NNA	39.39	0.00
2023 - 2	06	0603907080	GUAMAN CASTILLO GEREMIAS JOSE	590.79	30	NNA	121.70	0.00
2023 - 2	06	1600257404	HERAS PINEDA VERONICA ANDREA	232.94	15	NNA	47.99	0.00
2023 - 2	06	0922862834	IBARRA RIVERA JHESLY SARAY	634.40	30	NNA	130.69	0.00
2023 - 2	06	1600342222	JACOME RODRIGUEZ EDWIN HUGO	691.69	30	NNA	142.49	0.00
2023 - 2	06	1600267494	JACOME RODRIGUEZ JENNY BEATRIZ	924.09	30	NNA	190.36	0.00
2023 - 2	06	1600671760	MARIN JACOME JENNYFER BRITHNEY	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 2	06	1600496770	MARIN JACOME KENYA MERYJOSEPH	450.04	30	NNA	92.71	0.00
2023 - 2	06	1600296717	MARIN MONTERO KLEVER JINSOP	982.19	30	NNA	202.33	0.00
2023 - 2	06	1600695876	MARIN PEREZ JOSE ALEXANDER	450.04	30	NNA	92.71	0.00
2023 - 2	06	1600695868	MARIN PEREZ KRISLEY ARIANNA	458.72	30	NNA	94.50	0.00
2023 - 2	06	0601716327	MIRANDA AMBI EDGAR JUVENAL	560.00	30	NNA	115.36	0.00
2023 - 2	06	1600439804	MONTERO ESPINOSA KATTY JESSENIA	450.04	30	NNA	92.71	0.00
2023 - 2	06	1004325641	SOTAMINGA BELTRAN PATRICIO BOLIVAR	1195.71	30	NNA	246.32	0.00
2023 - 2	06	0604593434	TAMAY GUAMAN LUIS GERARDO	330.25	19	NNA	68.03	0.00
2023 - 2	06	1600177461	TAPUY TAPUY CESAR LUIS	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 2	06	0500865159	UGSHA VEGA JOSE GREGORIO	560.00	30	NNA	115.36	0.00
				12722.47			2620.84	0.00

hora (+)	
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	2748.07
Notas de Crédito (-)	0.00
	2748.07

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.





COMPROBANTE DE TRANSACCION

COMPROBANTE DE PAGO IESS - 0000000167593605

Cedula/RUC : 1691710080001 AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
Codigo/Rubro : PLANI - PAGO DE PLANILLAS
Periodo : 2023-02 Secuencia: 202303150013231
Valor : 2,748.07
Comisión : 0.57
Efectivo : 2,748.64
T. Pagado : 2,748.64 100.00%

MPK D9V41 2023-03-15 10:32:33

Si realiza el pago a partir de las 17H00, se registrará 202303150013231 190000430012531 I
en la recaudación del sgte. día hábil.
Consulte su Comp.Venta o Retención en WWW.BANCOGUAYAQUIL.COM con el No. 54689

ANTE GUAYAS SINGELER S.L. Date: 2023-03-15 10:32:33 - Canal: Internet - 2023-03-15 10:32:33

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información

REV. 10.19 - COD. 1100045

CONDICIONES DE LA PÓLIZA Nº 1142519

RAMO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
MONEDA: DÓLARES
LUGAR Y FECHA: AMBATO, Noviembre 1 de 2022



VIGENCIA DE LA POLIZA DESDE: 07/11/2022 HASTA: 06/05/2023
VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE: LAS 00:01 H HASTA: LAS 24:00 H (Local)

ASEGURADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL TLF: 0 032883830 Cel: 0999123457
DIRECCIÓN: FRANCISCO DE ORELLANA SN GENERAL VILLAMIL

ANZAS

COBERTURAS CONTRATADAS	Sumas Aseguradas hasta: USD	Deducible: Aplica el mayor de los tres		
		% Suma Asegurada	% Valor de siniestro	Mínimo USD
del Cumplimiento de Contrato	232.536,06			

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

El(La) asegurado(a) y/o el(la) solicitante declara libre y voluntariamente, que el seguro solicitado a Aseguradora del Sur C.A., ampara bienes, garantías y contratos de procedencia lícita, los mismos que no están ligados con actividades de Narcotráfico, Lavado de Activos o Financiamiento del Terrorismo. Igualmente, declara que los fondos con los cuales se pagará la prima correspondiente a este contrato de seguros tienen origen lícito y no guardan ninguna relación con las actividades mencionadas anteriormente.

AUTORIZACIÓN

Siendo conocedor de las disposiciones legales para la Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, autorizo expresamente en forma libre, voluntaria e irrevocable a Aseguradora del Sur C.A. a realizar el análisis y las verificaciones que considere necesarias para corroborar la licitud de fondos y bienes comprendidos en el contrato de seguro; así como autorizo expresa, voluntaria e irrevocablemente a todas las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado a facilitar a Aseguradora del Sur C.A. toda la información que ésta les requiera, inclusive autorizo anticipadamente el levantamiento del registro vehicular en caso de ser necesario, incluido la revisión de los buró de crédito sobre mi información de riesgos crediticios.

://fms.aseguradoradelsur.com/asegsur/v1/fms/uploads/bcdc194c-76f0-4390-b851-44b0fbc0f318.pdf

Direcciones:

Matriz Quito: Av. De Los Naranjos y De Las Azucenas (02) 2997-500 / Fax: (02)2467-983. Sucursal Ambato: Av. Rodrigo Pachano 13-109 y Juan Montalvo. Sector Ficoa (03)2828-211 / (03)2828-213 / (03) 2829-299. Sucursal Francisco Orellana (Coca): Calle Quito entre Guayaquil y Jorge Rodríguez (06)2883-276 / (06)2881-511. Sucursal Cuenca: Federico Proaño 365 y Honorato de Loyola, a dos cuadras de Pizza Hut. (07)2819-721 / (07)2819-964. Sucursal Ibarra: Victoria Cast. Chiriboga 657 y Galo Plaza Lasso, atrás del C.C. La Plaza (06) 2630-920 / (06)2630-868. Sucursal Loja: Av. Av. Orillas Zamora y Segundo Puertas Moreno (07)2560-991 / (07)2587-677. Sucursal Machala: Av. 25 de Junio Km 2 1/2, vía a Pasi Urbanización Ciudad del Sol Mz. L1 (07)279-7087 / (07)279-7089 / 099 844 5197. Sucursal Manta: Calle M1 entre las calles y 24, diagonal al Hotel Oro Verde Manta, edificio 'Manta Business Center', planta baja. (05)2625 -751 / (05)2626-50: (05)2626-052. Sucursal Portoviejo: Av. Manabí y Granda Centeno, frente a la pista del aeropuerto (05)2563-494 / (05)2563-33 / (05)2563-508. Sucursal Riobamba: Uruguay 21-50 y Av. Daniel León Borja (03)2942-830 / (03)2941-063. Sucursal Sa Dominga: Av. Los Naranjos S/N y Av. Quito, 3er piso (frente al SRI), (02)2775-231 / (02)2762-2006. Sucursal Guayaquil: 'Urde Circunvalación Sur #304 y Todos los Santos. (04)501-3050.
Línea de atención al cliente: teléfono: (02) 2997500 / (09)9555-3333.
Página web de la compañía: www.aseguradoradelsur.com
Dirección de correo electrónico de contacto: asesgur@aseguradoradelsur.com

ORIGINAL



09 NOV 2022

Ing. Pedro Eduardo Medina Castillo
C.C. 1803299591
SECRETARIO GENERAL DEL CADPPA

POLIZA DE SEGURO DE FIANZAS PUBLICO

ASEGURADORA DEL SUR C.A. en adelante "La Aseguradora" en virtud de la solicitud de seguro presentada por el interesado, que en adelante se denomina "El Afianzado o Contratista", y que forma parte integrante de ese contrato, se obliga a indemnizar al Asegurado, por las razones previstas en este contrato, de acuerdo a las condiciones generales, aprobadas por la Superintendencia de Bancos y seguros con Resolución N°. SBS-INS-2002-293 de Septiembre 3 del 2002 y especiales, teniendo prelación las últimas sobre las primeras.

Emitido en: AMBATO

Emisión: 01/11/2022

Agente: 16917279

RAMO		PÓLIZA NÚMERO	SUMA ASEGURADA
FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		1142619	232.536,06
VIGENCIA DEL DOCUMENTO		TIPO DE DOCUMENTO	
DESDE LAS 00:01 DE	HASTA LAS 24:00 DE	PLAZO	POLIZA
07/11/2022	06/05/2023	180	0

EL AFIANZADO O CONTRATISTA: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S A

1691710080001

DIRECCIÓN: LUIS MOLINA SN ,Dpto. , Piso0,

TELÉFONOS: 0 032861348 0999813185



ASEGURADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

1660000170001

DIRECCIÓN: FRANCISCO DE ORELLANA SN GENERAL VILLAMIL

TELÉFONOS: 0 032883830 0999123457

OBJETO DEL CONTRATO:

ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, SEGÚN PROCESO No. LICO-GADPPz-006-2022

PRIMA	IMPUESTOS Y OTROS	TOTAL CONTADO
4.357,66	728,22	5.085,88

ESTE FORMULARIO ES UN AVISO DE COBRO

Mediante esta póliza de seguro incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, según la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, Aseguradora del Sur C.A. se obliga a favor del Beneficiario de esta póliza por los perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación afianzada hasta el monto estipulado como suma asegurada que le ocasiona el afianzado, en caso de terminación del contrato. Esta póliza podrá ser renovada mediante petición escrita del Afianzado o Asegurado. Transcurrido el plazo/vigencia, la presente póliza quedará automáticamente caduca, cesando de hecho toda responsabilidad de la compañía aún en el caso de que no fuera devuelto el original de la misma.

En testimonio de lo acordado se firma este contrato en: AMBATO a 1 DE NOVIEMBRE DE 2022

EL ASEGURADO




Firmado electrónicamente por:
**JORGE RODRIGO
LOPEZ PAREDES**

EL CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
**ODILO VINICIO
GUEVARA MARIN**

LA ASEGURADORA



Digitally signed by
**RODRIGO CEVALLOS
GUEVARA**
Date: 2022.11.01
17:17:54 -05:00
Reason: Firma
Electrónica
Location: Aseguradora
Versión:

ORIGINAL

MATRIZ QUITO

TELS:(02)2997500

FAX:(02)2997553

2997588

CUENCA

TELS:(07)2819721

IBARRA

TELS:(06)640820

LOJA

TELS:(07)587677

FAX:(07)560995

PORTOVIEJO

TELS:(05)632647

FAX:(05)632669

MANTA

TELS:(06)825241223333

FAX:(06)823483

AMBATO

TELS:(03)829299/828211

FAX:(03)828534

RIOBAMBA

TELS:(03)941063

FAX:(03)965040

MACHALA

TELS:

(07)2985563

FAX:

(07)2985561



Mag. Pedro Eduardo Merino Castilla
C.C. 1803290591
SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO

09 NOV 2022



AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING
RUC. 1691710080001

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

En la ciudad de Puyo, el 01 día del mes de diciembre del 2022, comparecen a la suscripción del presente Contrato, por una parte, en calidad de INGENIERO CIVIL el Ing. JONATHAN RODOLFO TORRES TAMAYO C.I. 160029485-2 y, por otra, parte el señor Odilo Vinicio Guevara Marín en calidad de representante legal de la Compañía AMAZONAS BUILDING S.A con Ruc 1691710080001, quienes en forma libre y voluntaria convienen en celebrar el presente contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, contenido en las siguientes cláusulas

Cláusula Primera. - ANTECEDENTES

El día 7 de noviembre del 2022, La Compañía Amazonas Building suscribe un contrato con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA para la ejecución de la Obra denominada ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Cláusula Segunda. - OBJETO DEL CONTRATO

La compañía contrata al Ing. Jonathan Rodolfo Torres Tamayo, el mismo que prestará sus servicios de manera autónoma e independiente a la compañía, encargándose del área civil en el proyecto de ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA". tareas que se encuentran dentro de su campo de conocimiento y experiencia" teniendo la capacidad de celebrar el contrato, en virtud de que está familiarizado con la materia indicada en el mismo, en los términos y condiciones.

Cláusula Tercera. — PLAZO

El plazo del presente contrato es por el tiempo que dure la ejecución de la obra, (aproximadamente 18 meses) a partir de la suscripción del presente contrato, pudiendo prorrogarse, si las partes así lo convienen, solo podrá extinguirse una vez que las labores materia del mismo hayan concluido para la COMPAÑIA Es obligación del Ing. Jonathan Rodolfo Torres Tamayo realizar el trabajo contratado, los alcances y aclaraciones que la Compañía solicite, previo al pago.

Cláusula Cuarta. - OBLIGACIONES DEL CONTRATADO

EL CONTRATADO está obligado y sin perjuicio de lo previsto por las leyes y reglamentos vigentes en el Ecuador a: Encargándose de supervisar que se aplique todas las normas técnicas del proyecto de ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

- Desarrollar con total transparencia, prolijidad y honestidad las tareas allá encomendadas.
- Mantener la confidencialidad de la información y los datos proporcionados por la Compañía.



AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING
RUC. 1691710080001

- Será responsable del manejo, uso y mantenimiento de los equipos y mobiliario a él entregados,

La compañía se reserva el derecho a intervenir, evaluar y analizar el trabajo realizado por el Ing. Jonathan Rodolfo Torres Tamayo.

Además, un informe mensual de los trabajos civiles realizados en el proyecto **ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**.

Cláusula Quinta: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO

Las partes acuerdan determinar que la COMPAÑÍA cancelara sus honorarios profesionales al TECNICO por la gestión que él asume en el presente Contrato, al finalizar la obra. previa presentación de la factura correspondiente,

Cláusula Sexta – DEDUCCIONES

La compañía deducirá de los honorarios " PROFESIONALES ", las cantidades que correspondan por concepto de impuesto a la Renta (10 %) e Impuesto al Valor Agregado (100%).

Cláusula Séptima. – RESPONSABILIDAD

EL RESIDENTE DE OBRA 1 se obliga a ejecutar el trabajo con profesionalismo, diligencia, prolijidad y cuidados necesarios. Para evitar algún daño, pérdida o deterioro en los bienes de la COMPAÑÍA, por cualquier causa que fuere, "El Técnico se obliga a informar de manera inmediata, para determinar responsabilidades y sanciones a los causantes.

Clausula Octava: RELACIÓN CIVIL ENTRE LAS PARTES

El presente Contrato es de naturaleza civil, sujeto al derecho común y singularmente a las reglas del Mandato. Por tanto, entre la COMPAÑÍA y "EL RESIDENTE DE OBRA" no existe relación laboral o de dependencia alguna, ni, consecuentemente sometimiento al Código del Trabajo y Leyes del Seguro Social Obligatorio. No hay subordinación jurídica ni de ninguna otra especie que pudiera significar relación laboral entre las partes o sus dependientes, puesto que " EL RESIDENTE DE OBRA " prestará sus servicios a la Compañía de manera libre, independiente y autónoma.

Clausula Novena: MODIFICACIONES

Este contrato podrá ser modificado de común acuerdo y por escrito entre las partes contratantes.

Clausula Décima: DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato podrá darse por terminado en los siguientes casos:

- a) De común acuerdo entre las partes,
- b) Por terminación de su plazo de duración.
- c) Por cualquier causa legalmente establecida.

Clausula Décima Primera: DEL PACTO DE CONFIDENCIALIDAD



AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING
RUC. 1691710080001

Toda la información que sea conocida por EL RESIDENTE DE OBRA consecuencia de este Contrato, sin importar su naturaleza y que fuere entregada, comunicada, divulgada o conocida como consecuencia de la ejecución de sus obligaciones bajo este instrumento, es propiedad de la COMPAÑÍA AMAZONAS BUILDING y se encuentra limitada su divulgación a terceros salvo las excepciones previstas en la ley.

Clausula Décima Segunda: DEL DOMICILIO DE LAS PARTES

Para los efectos legales respectivos, las partes señalan domicilios para citaciones y notificaciones en esta ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, los siguientes.

- a) COMPAÑÍA AMAZONAS BUILDING S.A Avenida Tarqui calle los Laureles
- b) Ing. Jonathan Rodolfo Torres Tamayo, Ciudad Puyo.

Clausula Décima Tercera: DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Los Contratantes quedan sometidos a los jueces competentes de esta ciudad de Puyo y al trámite previsto por la LEY

Clausula Décima Cuarta: DE LA ACEPTACIÓN

Los contratantes aceptan el presente contrato en su integridad, para constancia de lo cual lo firman por triplicado, todo en el día y fecha antes anotados.




Firmado electrónicamente por:
ODILO VINICIO
GUEVARA MARIN

Sr. Odilo Guevara Marín
GERENTE CIA AMAZONAS BUILDING



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN RODOLFO
TORRES TAMAYO

Ing. Jonathan Torres
RESIDENTE CIVIL



AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING
RUC. 1691710080001

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

En la ciudad de Puyo, el 01 día del mes de diciembre del 2022, comparecen a la suscripción del presente Contrato, por una parte, en calidad de INGENIERO CIVIL el Ing. MARCO VINICIO TAMAYO MEJIA C.I. 16000877-9 y, por otra, parte el señor Odilo Vinicio Guevara Marín en calidad de representante legal de la Compañía AMAZONAS BUILDING S.A con Ruc 1691710080001, quienes en forma libre y voluntaria convienen en celebrar el presente contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, contenido en las siguientes cláusulas

Cláusula Primera. – ANTECEDENTES

El día 7 de noviembre del 2022, La Compañía Amazonas Building suscribe un contrato con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA para la ejecución de la Obra denominada ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Cláusula Segunda. - OBJETO DEL CONTRATO

La compañía contrata al Ing. Marco Vinicio Tamayo Mejía, el mismo que prestará sus servicios de manera autónoma e independiente a la compañía, encargándose del área civil en el proyecto de ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA". tareas que se encuentran dentro de su campo de conocimiento y experiencia" teniendo la capacidad de celebrar el contrato, en virtud de que está familiarizado con la materia indicada en el mismo, en los términos y condiciones.

Cláusula Tercera. — PLAZO

El plazo del presente contrato es por el tiempo que dure la ejecución de la obra, (aproximadamente 18 meses) a partir de la suscripción del presente contrato, pudiendo prorrogarse, si las partes así lo convienen, sólo podrá extinguirse una vez que las labores materia del mismo hayan concluido para la COMPAÑIA Es obligación del Ing. Marco Vinicio Tamayo Mejía, realizar el trabajo contratado, los alcances y aclaraciones que la Compañía solicite, previo al pago.

Cláusula Cuarta. - OBLIGACIONES DEL CONTRATADO

EL CONTRATADO está obligado y sin perjuicio de lo previsto por las leyes y reglamentos vigentes en el Ecuador a: Encargándose de supervisar que se aplique todas las normas técnicas del proyecto de ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

- Desarrollar con total transparencia, prolijidad y honestidad las tareas allá encomendadas.
- Mantener la confidencialidad de la información y los datos proporcionados por la Compañía.



AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING
RUC. 1691710080001

- Será responsable del manejo, uso y mantenimiento de los equipos y mobiliario a él entregados,

La compañía se reserva el derecho a intervenir, evaluar y analizar el trabajo realizado por el Ing. Marco Vinicio Tamayo Mejía.

Además, un informe mensual de los trabajos civiles realizados en el proyecto **ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**.

Cláusula Quinta: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO

Las partes acuerdan determinar que la COMPAÑÍA cancelara sus honorarios profesionales al TECNICO por la gestión que él asume en el presente Contrato, al finalizar la obra. previa presentación de la factura correspondiente,

Cláusula Sexta – DEDUCCIONES

La compañía deducirá de los honorarios " PROFESIONALES ", las cantidades que correspondan por concepto de impuesto a la Renta (10 %) e Impuesto al Valor Agregado (100%).

Cláusula Séptima. – RESPONSABILIDAD

EL SUPERINTENDENTE DE OBRA se obliga a ejecutar el trabajo con profesionalismo, diligencia, prolijidad y cuidados necesarios. Para evitar algún daño, pérdida o deterioro en los bienes de la COMPAÑÍA, por cualquier causa que fuere, El Superintendente se obliga a informar de manera inmediata, para determinar responsabilidades y sanciones a los causantes.

Clausula Octava: RELACIÓN CIVIL ENTRE LAS PARTES

El presente Contrato es de naturaleza civil, sujeto al derecho común y singularmente a las reglas del Mandato. Por tanto, entre la COMPAÑÍA y 'EL SUPERINTENDENTE DE OBRA' no existe relación laboral o de dependencia alguna, ni, consecuentemente sometimiento al Código del Trabajo y Leyes del Seguro Social Obligatorio. No hay subordinación jurídica ni de ninguna otra especie que pudiera significar relación laboral entre las partes o sus dependientes, puesto que " EL SUPERINTENDENTE DE OBRA" prestará sus servicios a la Compañía de manera libre, independiente y autónoma.

Clausula Novena: MODIFICACIONES

Este contrato podrá ser modificado de común acuerdo y por escrito entre las partes contratantes.

Clausula Décima: DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato podrá darse por terminado en los siguientes casos:

- a) De común acuerdo entre las partes,
- b) Por terminación de su plazo de duración.
- c) Por cualquier causa legalmente establecida.



AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING
RUC. 1691710080001

Clausula Décima Primera: DEL PACTO DE CONFIDENCIALIDAD

Toda la información que sea conocida por EL SUPERINTENDENTE DE OBRA consecuencia de este Contrato, sin importar su naturaleza y que fuere entregada, comunicada, divulgada o conocida como consecuencia de la ejecución de sus obligaciones bajo este instrumento, es propiedad de la COMPAÑÍA AMAZONAS BUILDING y se encuentra limitada su divulgación a terceros salvo las excepciones previstas en la ley.

Clausula Décima Segunda: DEL DOMICILIO DE LAS PARTES

Para los efectos legales respectivos, las partes señalan domicilios para citaciones y notificaciones en esta ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, los siguientes.

- a) COMPAÑÍA AMAZONAS BUILDING S.A Avenida Tarqui calle los Laureles
- b) Ing. Marco Vinicio Tamayo Mejía, Ciudad Puyo.

Clausula Décima Tercera: DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Los Contratantes quedan sometidos a los jueces competentes de esta ciudad de Puyo y al trámite previsto por la LEY

Clausula Décima Cuarta: DE LA ACEPTACIÓN

Los contratantes aceptan el presente contrato en su integridad, para constancia de lo cual lo firman por triplicado, todo en el día y fecha antes anotados.



Firmado digitalmente por:
ODILO VINICIO
GUEVARA MARIN

Sr. Odilo Guevara Marín
GERENTE CIA AMAZONAS BUILDING



Firmado digitalmente por:
MARCO VINICIO
TAMAYO MEJIA

Ing. Marco Tamayo
SUPERINTENDENTE



AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING
RUC. 1691710080001

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

En la ciudad de Puyo, el 01 día del mes de diciembre del 2022, comparecen a la suscripción del presente Contrato, por una parte, en calidad de TOPOGRAFO la Ing. Daniela Analía Gómez Zambrano Cl. 070407321-2 y, por otra, parte el señor Odilo Vinicio Guevara Marín en calidad de representante legal de la Compañía AMAZONAS BUILDING S.A con Ruc 1691710080001, quienes en forma libre y voluntaria convienen en celebrar el presente contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, contenido en las siguientes cláusulas

Cláusula Primera. – ANTECEDENTES

El día 7 de **noviembre** del 2022, La Compañía Amazonas Building suscribe un contrato con el **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA** para la ejecución de la Obra denominada **ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**".

Cláusula Segunda. - OBJETO DEL CONTRATO

La compañía contrata al Ing. Daniela Analía Gómez Zambrano, el mismo que prestará sus servicios de manera autónoma e independiente a la compañía, encargándose de la TOPOGRAFIA en el proyecto de **ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**". tareas que se encuentran dentro de su campo de conocimiento y experiencia" teniendo la capacidad de celebrar el contrato, en virtud de que está familiarizado con la materia indicada en el mismo, en los términos y condiciones.

Cláusula Tercera. — PLAZO

El plazo del presente contrato es por el tiempo que dure la ejecución de la obra, (*aproximadamente 18 meses*) a partir de la suscripción del presente contrato, pudiendo prorrogarse, si las partes así lo convienen, solo podrá extinguirse una vez que las labores materia del mismo hayan concluido para la COMPAÑIA Es obligación de la Ing. Daniela Analía Gómez Zambrano realizar el trabajo contratado, los alcances y aclaraciones que la Compañía solicite, previo al pago.

Cláusula Cuarta. - OBLIGACIONES DEL CONTRATADO

EL CONTRATADO está obligado y sin perjuicio de lo previsto por las leyes y reglamentos vigentes en el Ecuador a: Encargándose de supervisar que se aplique todas las normas técnicas del proyecto de **ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**".

- Desarrollar con total transparencia, prolijidad y honestidad las tareas allá encomendadas.
- Mantener la confidencialidad de la información y los datos proporcionados por la Compañía.



AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING

RUC. 1691710080001

- Será responsable del manejo, uso y mantenimiento de los equipos y mobiliario a él entregados,

La compañía se reserva el derecho a intervenir, evaluar y analizar el trabajo realizado por la Ing. Daniela Analía Gómez Zambrano.

Además, un informe mensual de los trabajos topográficos realizadas en el proyecto ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Cláusula Quinta: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO

Las partes acuerdan determinar que la COMPAÑÍA cancelara sus honorarios profesionales al TECNICO por la gestión que él asume en el presente Contrato, al finalizar la obra, previa presentación de la factura correspondiente,

Cláusula Sexta – DEDUCCIONES

La compañía deducirá de los honorarios " TOPOGRAFO ", las cantidades que correspondan por concepto de impuesto a la Renta (10 %) e Impuesto al Valor Agregado (100%).

Cláusula Séptima. – RESPONSABILIDAD

LA TOPOGRAFA se obliga a ejecutar el trabajo con profesionalismo, diligencia, prolijidad y cuidados necesarios. Para evitar algún daño, pérdida o deterioro en los bienes de la COMPAÑÍA, por cualquier causa que fuere," EL TECNICO "se obliga a informar de manera inmediata, para determinar responsabilidades y sanciones a los causantes.

Clausula Octava: RELACIÓN CIVIL ENTRE LAS PARTES

El presente Contrato es de naturaleza civil, sujeto al derecho común y singularmente a las reglas del Mandato. Por tanto, entre la COMPAÑÍA Y' LA TOPÓGRAFA "no existe relación laboral o de dependencia alguna, ni, consecuentemente sometimiento al Código del Trabajo y Leyes del Seguro Social Obligatorio. No hay subordinación jurídica ni de ninguna otra especie que pudiera significar relación laboral entre las partes o sus dependientes, puesto que" LA TOPÓGRAFA "prestará sus servicios a la Compañía de manera libre, independiente y autónoma.

Clausula Novena: MODIFICACIONES

Este contrato podrá ser modificado de común acuerdo y por escrito entre las partes contratantes.

Clausula Décima: DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato podrá darse por terminado en los siguientes casos:

- a) De común acuerdo entre las partes,
- b) Por terminación de su plazo de duración.
- c) Por cualquier causa legalmente establecida.

Clausula Décima Primera: DEL PACTO DE CONFIDENCIALIDAD



AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING
RUC. 1691710080001

Toda la información que sea conocida por LA TOPÓGRAFA "consecuencia de este Contrato, sin importar su naturaleza y que fuere entregada, comunicada, divulgada o conocida como consecuencia de la ejecución de sus obligaciones bajo este instrumento, es propiedad de la COMPAÑÍA AMAZONAS BUILDING y se encuentra limitada su divulgación a terceros salvo las excepciones previstas en la ley.

Clausula Décima Segunda: DEL DOMICILIO DE LAS PARTES

Para los efectos legales respectivos, las partes señalan domicilios para citaciones y notificaciones en esta ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, los siguientes.

- a) COMPAÑÍA AMAZONAS BUILDING S.A Avenida Tarqui calle los laureles
- b) Ing. Daniela Analía Gómez Zambrano Barrio la Merced.

Clausula Décima Tercera: DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Los Contratantes quedan sometidos a los jueces competentes de esta ciudad de Puyo y al trámite previsto por la LEY

Clausula Décima Cuarta: DE LA ACEPTACIÓN

Los contratantes aceptan el presente contrato en su integridad, para constancia de lo cual lo firman por triplicado, todo en el día y fecha antes anotados.



ODILO GUEVARA MARÍN
GERENTE CIA AMAZONAS BUILDING



DANIELA ANALÍA GÓMEZ ZAMBRANO
TOPÓGRAFO

Sr. Odilo Guevara Marín
GERENTE CIA AMAZONAS BUILDING

Ing. Daniela Gómez
TOPÓGRAFO



AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING
RUC. 1691710080001

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

En la ciudad de Puyo, el 01 día del mes de diciembre del 2022, comparecen a la suscripción del presente Contrato, por una parte, en calidad de INGENIERO CIVIL el Ing. LUIS OCTAVIO TIBANTA GUAMAN C.I. 160015313-2 y, por otra, parte el señor Odilo Vinicio Guevara Marín en calidad de representante legal de la Compañía AMAZONAS BUILDING S.A con Ruc 1691710080001, quienes en forma libre y voluntaria convienen en celebrar el presente contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, contenido en las siguientes cláusulas

Cláusula Primera. – ANTECEDENTES

El día 7 de noviembre del 2022, La Compañía Amazonas Building suscribe un contrato con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA para la ejecución de la Obra denominada ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Cláusula Segunda. - OBJETO DEL CONTRATO

La compañía contrata al Ing. Luis Octavio Tibanta Guamán, el mismo que prestará sus servicios de manera autónoma e independiente a la compañía, encargándose del área civil en el proyecto de ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA". tareas que se encuentran dentro de su campo de conocimiento y experiencia" teniendo la capacidad de celebrar el contrato, en virtud de que está familiarizado con la materia indicada en el mismo, en los términos y condiciones.

Cláusula Tercera. – PLAZO

El plazo del presente contrato es por el tiempo que dure la ejecución de la obra, (aproximadamente 18 meses) a partir de la suscripción del presente contrato, pudiendo prorrogarse, si las partes así lo convienen, solo podrá extinguirse una vez que las labores materia del mismo hayan concluido para la COMPAÑIA Es obligación del Ing. Luis Octavio Tibanta Guamán realizar el trabajo contratado, los alcances y aclaraciones que la Compañía solicite, previo al pago.

Cláusula Cuarta. - OBLIGACIONES DEL CONTRATADO

EL CONTRATADO está obligado y sin perjuicio de lo previsto por las leyes y reglamentos vigentes en el Ecuador a: Encargándose de supervisar que se aplique todas las normas técnicas del proyecto de ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

- Desarrollar con total transparencia, prolijidad y honestidad las tareas allá encomendadas.
- Mantener la confidencialidad de la información y los datos proporcionados por la Compañía.



AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING
RUC. 1691710080001

- Será responsable del manejo, uso y mantenimiento de los equipos y mobiliario a él entregados,

La compañía se reserva el derecho a intervenir, evaluar y analizar el trabajo realizado por el Ing. Luis Octavio Tibanta Guamán.

Además, un informe mensual de los trabajos civiles realizados en el proyecto ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Cláusula Quinta: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO

Las partes acuerdan determinar que la COMPAÑÍA cancelara sus honorarios profesionales al TECNICO por la gestión que él asume en el presente Contrato, al finalizar la obra. previa presentación de la factura correspondiente,

Cláusula Sexta – DEDUCCIONES

La compañía deducirá de los honorarios " PROFESIONALES ", las cantidades que correspondan por concepto de impuesto a la Renta (10 %) e Impuesto al Valor Agregado (100%).

Cláusula Séptima. – RESPONSABILIDAD

EL RESIDENTE DE OBRA 2 se obliga a ejecutar el trabajo con profesionalismo, diligencia, prolijidad y cuidados necesarios. Para evitar algún daño, pérdida o deterioro en los bienes de la COMPAÑÍA, por cualquier causa que fuere, "El Técnico se obliga a informar de manera inmediata, para determinar responsabilidades y sanciones a los causantes.

Clausula Octava: RELACIÓN CIVIL ENTRE LAS PARTES

El presente Contrato es de naturaleza civil, sujeto al derecho común y singularmente a las reglas del Mandato. Por tanto, entre la COMPAÑÍA y "EL RESIDENTE DE OBRA" no existe relación laboral o de dependencia alguna, ni, consecuentemente sometimiento al Código del Trabajo y Leyes del Seguro Social Obligatorio. No hay subordinación jurídica ni de ninguna otra especie que pudiera significar relación laboral entre las partes o sus dependientes, puesto que" EL RESIDENTE DE OBRA 2" prestará sus servicios a la Compañía de manera libre, independiente y autónoma.


Clausula Novena: MODIFICACIONES

Este contrato podrá ser modificado de común acuerdo y por escrito entre las partes contratantes.

Clausula Décima: DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato podrá darse por terminado en los siguientes casos:

- a) De común acuerdo entre las partes,
- b) Por terminación de su plazo de duración.
- c) Por cualquier causa legalmente establecida.



AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING
RUC. 1691710080001

Clausula Décima Primera: DEL PACTO DE CONFIDENCIALIDAD

Toda la información que sea conocida por EL RESIDENTE DE OBRA consecuencia de este Contrato, sin importar su naturaleza y que fuere entregada, comunicada, divulgada o conocida como consecuencia de la ejecución de sus obligaciones bajo este instrumento, es propiedad de la COMPAÑÍA AMAZONAS BUILDING y se encuentra limitada su divulgación a terceros salvo las excepciones previstas en la ley.

Clausula Décima Segunda: DEL DOMICILIO DE LAS PARTES

Para los efectos legales respectivos, las partes señalan domicilios para citaciones y notificaciones en esta ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, los siguientes.

- a) COMPAÑÍA AMAZONAS BUILDING S.A Avenida Tarqui calle los Laureles
- b) Ing. Luis Octavio Tibanta Guamán, Ciudad Puyo.

Clausula Décima Tercera: DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Los Contratantes quedan sometidos a los jueces competentes de esta ciudad de Puyo y al trámite previsto por la LEY

Clausula Décima Cuarta: DE LA ACEPTACIÓN

Los contratantes aceptan el presente contrato en su integridad, para constancia de lo cual lo firman por triplicado, todo en el día y fecha antes anotados.



ODILO VINICIO
GUEVARA MARIN



LUIS OCTAVIO
TIBANTA
GUAMAN

Sr. Odilo Guevara Marín
GERENTE CIA AMAZONAS BUILDING

Ing. Luis Tibanta
RESIDENTE CIVIL



MAZONAS BUILDING S.A.

Puyo - Pastaza - Ecuador

DOCUMENTACIÓN

CRUZADA

"ASFALTADO DE LA VIACURARAY -FRANCISCO DE ORELLANA-JATUN PACCHA, HASTA EL KILOMETEO
12 VIA 10 DE AGOSTO -EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"



Puyo, 07 de marzo 2023

Señor
Odilo Vinicio Guevara Marín
Gerente General
AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
Presente. –

De mi consideración:

Mediante Contrato **LICO-GADPPz-006-2022** suscrito el 07 de noviembre del 2022, dentro del Proceso de **LCC-GADPPz-004-2022**, para la **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, entre la Compañía **AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.** y el **Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza**, con un **Anticipo del 0%**, por un monto de **USD \$ 4'650.521,23 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 23/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) SIN INCLUIR IVA**, y un **Plazo de 540 Días** contados a partir de la suscripción del **Acta de Inicio de Obra**.

En referencia al **Oficio 111 CABA/GADPPz**, suscrito por el Señor Odilo Vinicio Guevara Marín, de fecha 02 de marzo del 2023 y entregado de manera física el 03 de marzo del 2023.

Adjunto la corrección de la Planilla de Avance No. 01:

- 1.- Dentro de la sabana principal indicar: Fecha de Contrato 07 de noviembre del 2022
- 2.- Dentro del Cronograma de Avance se estipulan periodos de 30 días calendario. Corregir fecha de periodo de Planilla de Avance No. 01: Del 25 de enero al 23 de febrero del 2023.
- 3.- Quitar **marca amarilla** en Fecha de Planilla.
- 4.- Liquidar **Planilla de Avance No. 01** al 23 de febrero del 2023, la presentada tiene fecha 28 de febrero del 2023.
- 5.- Corregir **anexos** los periodos de acuerdo a lo ejecutado en libro de obra y Cronograma de Avance de Obra del 25 de enero al 23 de febrero del 2023.
- 6.- Corrección Anexos periodo del 25 de enero al 23 de febrero del 2023
- 7.- Anexo Rubro No. 04, especificar cuadro de volúmenes y secciones transversales.
- 8.- Anexar Excel para revisión de cálculos.
- 9.- Anexo 17, se repite igual al Anexo 3
- 10.- Anexo 18, descripción del rubro corregir.
- 11.- Anexar Pólizas
- 12.- Anexar Planilla de Personal Técnico IESS

13.- Favor hacer entrega de correos con la Planilla y los anexos al mail keyszen.sas@gmail.com

Por la atención al presente le anticipo mis sinceros agradecimientos.

Sin otro particular por el momento, me despido.

Atentamente,



Través de el electrónicamente por:
**JESSICA MARIELA
JARAMILLO ARMIJOS**

Ing. Jessica Jaramillo
C.C. 0704239128
Gerente General
KEYSZEN S.A.S.
RUC 0791840462001

KEYSZEN **SAS**
INGENIERIA & CONSTRUCCION
Machala - El Oro - Ecuador

Puyo, 13 de marzo 2023

Ingeniera
Eryka Mireya Silva Manzano
Administrador de Contrato
Contrato LCC-GADPPz-004-2022
GAD Provincial de Pastaza
Presente. –

De mi consideración:

En referencia al **Oficio 112 CABA/GADPPz**, suscrito por el Señor Odilo Vinicio Guevara Marín, de fecha 08 de marzo del 2023.

Dentro del Contrato **LICO-GADPPz-006-2022** suscrito el 07 de noviembre del 2022, dentro del Proceso de **LCC-GADPPz-004-2022**, para la **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, entre la Compañía **AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.** y el **Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza**, con un **Anticipo del 0%**, por un monto de **USD \$ 4'650.521,23 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 23/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) SIN INCLUIR IVA**, y un **Plazo de 540 Días** contados a partir de la suscripción del **Acta de Inicio de Obra**.

Extiende la Planilla de avance No. 01, del Periodo: 25 de enero al 28 de febrero del 2023.

Por la atención al presente le anticipo mis sinceros agradecimientos.

Sin otro particular por el momento, me despido.

Atentamente,



JESSICA MARIELA
JARAMILLO ARMIJOS

Ing. Jessica Jaramillo
C.C. 0704239128
Gerente General
KEYSZEN S.A.S.
RUC 0791840462001



CC. **AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.**

Puyo, 27 de marzo 2023

Ingeniera
Eryka Mireya Silva Manzano
Administrador de Contrato
Contrato LCC-GADPPz-004-2022
GAD Provincial de Pastaza
Presente. –

De mi consideración:

Dentro del Contrato **LCC-GADPPz-004-2022** suscrito el 25 de enero del 2023, dentro del Proceso de **LCC-GADPPz-004-2022**, para la **FISCALIZACIÓN EXTERNA DEL ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, entre la Compañía **AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.** y el **Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza**, con un **Anticipo del 50%**, por un monto de **USD \$ 186.020,85 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL VEINTE CON 85/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) SIN INCLUIR IVA**, y un **Plazo de 540 Días** contados a partir de la suscripción del **Acta de Inicio de Obra**.

Se extiende la Planilla de Avance de Fiscalización No. 01, del Periodo: 25 de enero al 28 de febrero del 2023.

Por la atención al presente le anticipo mis sinceros agradecimientos.

Sin otro particular por el momento, me despido.

Atentamente,



JESSICA MARIELA
JARAMILLO ARMIJOS

Ing. Jessica Jaramillo
C.C. 0704239128
Gerente General
KEYSZEN S.A.S.
RUC 0791840462001

KEYSZEN 
INGENIERIA & CONSTRUCCION
Machala - El Oro - Ecuador

CC. ARCHIVO

Puyo, 30 de marzo 2023

Señor
Odilo Vinicio Guevara Marín
Gerente General
AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
Presente. –

De mi consideración:

Mediante Contrato **LICO-GADPPz-006-2022** suscrito el 07 de noviembre del 2022, dentro del Proceso de **LCC-GADPPz-004-2022**, para la **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, entre la Compañía **AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.** y el **Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza**, con un **Anticipo del 0%**, por un monto de **USD \$ 4'650.521,23 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 23/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) SIN INCLUIR IVA**, y un **Plazo de 540 Días** contados a partir de la suscripción del **Acta de Inicio de Obra**.

En referencia al **Oficio No. GADPPz-ES-2023-003**, suscrito por la Ing. Eryka Mireya Silva Manzano, de fecha 24 de marzo del 2023 al correo electrónico **keyszen.sas@gmail.com**.

En el cual se adjunta el **Memorando Nro. GADPPZ-DGA-2023-14154-M**, suscrito por Mgs. David Alejandro Yedra Machado, Director de Gestión Ambiental.

A su vez esta fiscalización solicita que se dé cumplimiento lo mencionado en respectivo documento para continuar los tramites de aprobación permitentes de la Planilla de Avance No. 01:

- 1.- Coordenadas UTM WGS84 17S en forma de polígono de todo el trayecto vial: Tramo km 12 Vía 10 de Agosto – El Triunfo hasta JATUNPACCHA desde la abscisa 0+000 hasta la abscisa 2+040 y desde la abscisa 2+500 hasta 3+445, intervenidos sin permiso ambiental. (Formato Excel y Formato Cad)
- 2.- Informe técnico especificando la longitud y ancho de la vía, mismo que debe coincidir con las coordenadas adjuntadas.
- 3.- Anexo Fotográfico de estado actual de la vía tramo intervenido.
- 4.- Estudios viales del proyecto.

Por la atención al presente le anticipo mis sinceros agradecimientos.

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03
Oficina 072 785 269
keyszen.sas@gmail.com
www.keyszen.com
Machala – El oro - Ecuador

Sin otro particular por el momento, me despido.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
JESSICA MARTELA
JARAMILLO ARMIJOS

Ing. Jessica Jaramillo
C.C. 0704239128
Gerente General
KEYSZEN S.A.S.
RUC 0791840462001

CC. Administrador del Contrato

KEYSZEN SAS
INGENIERIA & CONSTRUCCION

Recibido

Rodrigo Gaspar

30/03/2023
11 h00.

Puyo, 30 de marzo 2023

Señor
Odilo Vinicio Guevara Marín
Gerente General
AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
Presente. –

De mi consideración:

Mediante Contrato **LICO-GADPPz-006-2022** suscrito el 07 de noviembre del 2022, dentro del Proceso de **LCC-GADPPz-004-2022**, para la **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, entre la Compañía **AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.** y el **Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza**, con un Anticipo del 0%, por un monto de **USD \$ 4'650.521,23 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 23/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) SIN INCLUIR IVA**, y un Plazo de **540 Días** contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Obra.

En referencia al **Oficio No. GADPPz-ES-2023-003**, suscrito por la Ing. Eryka Mireya Silva Manzano, de fecha 24 de marzo del 2023 al correo electrónico **keyszen.sas@gmail.com**.

En el cual se adjunta el **Memorando Nro. GADPPZ-DGA-2023-14154-M**, suscrito por Mgs. David Alejandro Yedra Machado, Director de Gestión Ambiental.

A su vez esta fiscalización solicita que se dé cumplimiento lo mencionado en respectivo documento para continuar los tramites de aprobación permitientes de la Planilla de Avance No. 01:

- 1.- **Coordenadas UTM WGS84 17S** en forma de polígono de todo el trayecto vial: Tramo km 12 Vía 10 de Agosto – El Triunfo hasta JATUNPACCHA desde la abscisa 0+000 hasta la abscisa 2+040 y desde la abscisa 2+500 hasta 3+445, intervenidos sin permiso ambiental. (Formato Excel y Formato Cad)
- 2.- **Informe técnico** especificando la longitud y ancho de la vía, mismo que debe coincidir con las coordenadas adjuntadas.
- 3.- **Anexo Fotográfico** de estado actual de la vía tramo intervenido.
- 4.- **Estudios viales** del proyecto.

Por la atención al presente le anticipo mis sinceros agradecimientos.

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03
Oficina 072 785 269
keyszen.sas@gmail.com
www.keyszen.com
Machala – El oro - Ecuador

Sin otro particular por el momento, me despido.

Atentamente,



JESSICA MARIELA
JARAMILLO ARMIJOS

Ing. Jessica Jaramillo
C.C. 0704239128
Gerente General
KEYSZEN S.A.S.
RUC 0791840462001



CC. Administrador del Contrato

Jaramillo
30/03/2023
14h 36

Puyo, 31 de marzo 2023

Ingeniera
Eryka Mireya Silva Manzano
Administrador de Contrato
Contrato LCC-GADPPz-004-2022
GAD Provincial de Pastaza
Presente. –

De mi consideración:

Mediante Contrato LICO-GADPPz-006-2022 suscrito el 07 de noviembre del 2022, dentro del Proceso de LCC-GADPPz-004-2022, para el ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, entre la Compañía AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, con un Anticipo del 0%, por un monto de USD \$ 4'650.521,23 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 23/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) SIN INCLUIR IVA, y un Plazo de 540 Días contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Obra.

En respuesta a Memorando Nro. GADPPZ-DGA-2023-14154-M, enviado por Unidad de Gestión Ambiental GAD Provincial de Pastaza.

Adjunto información pertinente para trámite de permiso ambiental del área observada:

- Informe de coordenadas y estado actual de la vía por parte del administrador.
- Archivo Formato Excel con coordenadas en forma de polígono.
- CD (Información Solicitada)

Por la atención al presente le anticipo mis sinceros agradecimientos.

Sin otro particular por el momento, me despido.

Atentamente,



firmado digitalmente por
JESSICA MARIELA
JARAMILLO ARMIÑOS

Ing. Jessica Jaramillo
C.C. 0704239128
Gerente General
KEYSZEN S.A.S.
RUC 0791840462001

KEYSZEN S.A.S
INGENIERIA & CONSTRUCCION
Machala - El Oro - Ecuador

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03
Oficina 072 785 269
keyszen.sas@gmail.com
www.keyszen.com
Machala – El oro - Ecuador

Recibido
31/03/2023



Puyo, 30 de marzo del 2023

No.- ERGC-AMAZON-002-2023

Asunto: Respuesta Oficio KEYSOFICIO -018-2023 del 30 de marzo de 2023.

Sra. Ingeniera

Jessica Jaramillo

GERENTE GENERAL KEYSZEN.S.A.S.

FISCALIZACION EXTERNA DEL CONTRATO "PROYECTO DE ASFALTO DE LA VÍA CURARAY – FCO. DE ORELLANA – 10 DE AGOSTO, JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO "CODIGO: LICO-GADPPz-006-2022

Presente. –

De mí consideración:

Reciba un cordial y atento saludo.

De acuerdo a lo solicitado según Oficio KEYSOFICIO -018-2023 del 30 de marzo de 2023, se realiza la entrega de lo solicitado para los fines pertinentes.

1.- Coordenadas UTM WGS84 17S en forma de polígono de todo el trayecto vial: Tramo km 12 Vía 10 de Agosto – El Triunfo hasta JATUNPACCHA desde la abscisa 0+000 hasta la abscisa 2+040 y desde la abscisa 2+500 hasta 3+445, intervenidos sin permiso ambiental. (Formato Excel y Formato Cad).

Tabla 1.- Descripción y ubicación de zonas sin regularización

ZONA 1				
ITEM	ABSCISA	ZONA	COORDENADA X	COORDENADA Y
1	0+000	18M	178304,00m E	9839271,00m S
2	0+500	18M	178324,00m E	9839765,00m S
3	1+000	18M	178390,00m E	9840273,00m S
4	1+500	18M	178520,00m E	9840720,00m S
5	2+000	18M	178343,00m E	9841210,00m S
ZONA 2				
ITEM	ABSCISA	ZONA	COORDENADA X	COORDENADA Y
1	2+500	18M	178178,00m E	9841664,00m S
2	3+000	18M	178126,00m E	9842125,00m S
3	3+445	18M	177960,00m E	9842483,00m S




2.- Informe técnico especificando la longitud y ancho de la vía, mismo que debe coincidir con las coordenadas adjuntadas.

De acuerdo a lo solicitado, a continuación, se muestra la ubicación de las abscisas con sus respectivas coordenadas con el ancho de vía de 8 metros tal como lo determina el contrato de "CODIGO: LICO-GADPPz-006-2022.

Imagen 1.- Ubicación grafica de coordenadas NO regularizada.



Imagen. - Ubicación grafica de coordenadas área regularizada mediante ficha ambiental

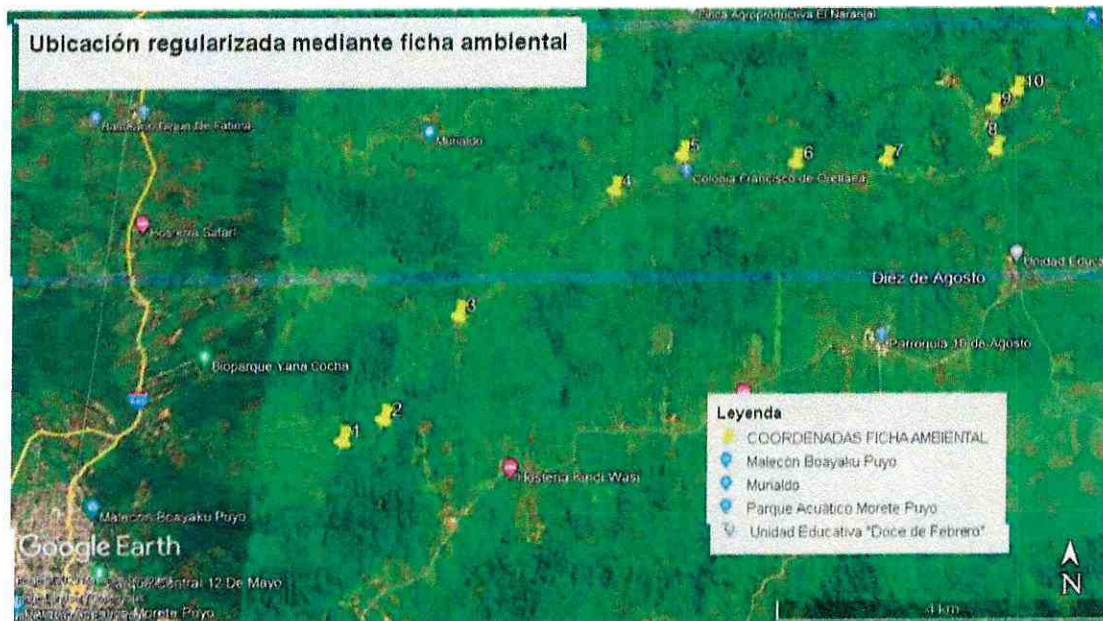



3.- Anexo Fotográfico de estado actual de la vía tramo intervenido.



FOTO 1.- Abscisa 0+000



FOTO 2.- Abscisa 0+500





sábado, 25 de marzo de 2023 14:59:41.435
18M 178390 9840273
Altitud: 1005.5m
Velocidad: 1.5km/h

FOTO 3.- Abscisa 1+000



sábado, 25 de marzo de 2023 14:57:18.673
18M 178520 9840720
Altitud: 1009.8m
Velocidad: 0.3km/h

FOTO 4.- Abscisa 1+500





MAZONAS BUILDING S.A.

Puyo - Pastaza - Ecuador



sábado, 25 de marzo de 2023 11:52:37.987
18M 178343 9841210
Altitud: 1003.7m
Velocidad: 0.0km/h

FOTO 5.- Abscisa 2+000



sábado, 25 de marzo de 2023 12:07:13.502
18M 178178 9841664
Altitud: 1024.8m
Velocidad: 0.0km/h

FOTO 6.- Abscisa 2+500





MAZONAS BUILDING S.A.

Puyo - Pastaza - Ecuador



FOTO 7.- Abscisa 3+000



FOTO 8.- Abscisa 3+445



AMAZONAS BUILDING S.A.

Puyo - Pastaza - Ecuador

4.- Estudios viales del proyecto.

Se adjunta un cd magnético con los estudios de del tramo km 12 Vía 10 de agosto – El Triunfo, abscisa 0+000 hasta JATUNPACCHA, Abscisa 3+308

Dando fe y cumplimiento a lo actuado, me suscribo con altos sentimientos de consideración y estima.

Atentamente;



TIPO: 001
ODILO VINICIO
GUEVARA MARIN

Sr. Odilo Guevara

GERENTE AMAZONAS BUILDING S.A.

Oficio, 111 CABA/GADPPz
Puyo, a 2 de marzo del 2023

Ingeniera

Jessica Mariela Jaramillo Armijos
FIZCALIZADOR EXTERNO KEYSZEN S.A.S
Presente. -

De mi consideración:

Con respecto al contrato "ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VIA 10 DE AGOSTO- EL TRIUNFO, PARROQUIA 10 DE AGOSTO, PROVINCIA DE PASTAZA", del particular debo manifestar lo siguiente:

- Adjunto se servirá encontrar la planilla de avance número 01, con los respectivos anexos y sustentos de justificación para que proceda con su revisión y autorización correspondiente, conforme lo señalado en CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO. - La forma de pago se realizará por planilla de avance mensual.

Particular que comunico a ustedes para los fines legales correspondientes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
ODILO VINICIO
GUEVARA MARIN

Sr. Odilo Guevara
CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
GERENTE
CC. Ing. Eryka Silva Administradora del contrato.

Rebido
03-03-2023
Ricardo Caspio



AMAZONAS BUILDING S.A.

Puyo - Pastaza - Ecuador

Oficio, 001-AB-2023

Puyo, 25 de febrero de 2023

KEYSZEN S.A.S.

FISCALIZADOR EXTERNO

Proyecto: "ASFALTADO DE LA VIACURARAY -FRANCISCO DE ORELLANA-JATUN PACCHA, HASTA EL KILOMETEO 12 VIA 10 DE AGOSTO -EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA" código del proceso LICO-GADPPz- 006-2022.

Presente,

Reciba un cordial y atento saludos, mediante la presente el Sr. Odilo Guevara representante legal de AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. hace la entrega del Informe Ambiental de Cumplimiento correspondiente a la planilla N.1 periodo 25 de enero de 2023 al 25 de febrero de 2023 del proyecto: **"ASFALTADO DE LA VIACURARAY -FRANCISCO DE ORELLANA-JATUN PACCHA, HASTA EL KILOMETEO 12 VIA 10 DE AGOSTO -EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"** código del proceso LICO-GADPPz- 006-2022 del particular debo manifestar lo siguiente:

El informe fue realizado con base a las observaciones emitidas por el técnico ambiental de fiscalización, considerando los lineamientos indicados, siendo esta la primera versión a entregar para su respectiva revisión y aprobación.

Se encuentra adjunto el siguiente documento:

- Informe Ambiental de Cumplimiento (digital)

De antemano anticipo mis agradecimientos por la atención prestada.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
ODILO VINICIO
GUEVARA MARIN

Sr. Odilo Guevara

GERENTE DE AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.


Recibido
26-02-2023
Ricardo Campio



Oficio, 112 CABA/GADPPz
Puyo, a 8 de marzo del 2023

KEYSZEN S.A.S
FIZCALIZADOR EXTERNO

Presente. -

De mi consideración:

Con respecto al contrato **"ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VIA 10 DE AGOSTO- EL TRIUNFO, PARROQUIA 10 DE AGOSTO, PROVINCIA DE PASTAZA"**, del particular debo manifestar lo siguiente:

- Adjunto se servirá encontrar la planilla de avance número 01, con los respectivos anexos y sustentos de justificación para que proceda con su revisión y autorización correspondiente, conforme lo señalado en CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO. - La forma de pago se realizará por planilla de avance mensual, una vez realizadas las correcciones solicitadas en comunicación KEYSOFICIO-013-2023 de fecha 7 de marzo/2023

Particular que comunico a ustedes para los fines legales correspondientes.

Atentamente,



Prescrito electrónicamente por:
ODILO VINICIO
GUEVARA MARIN

Sr. Odilo Guevara
CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
GERENTE
CC. Ing. Eryka Silva Administradora del contrato.

Recibido
8-03-2023
Ricardo Cejudo



OFICIO N° GADPPz-ES-2023-001

Puyo, 25 de enero de 2023

Señor

Odilo Guevara

REPRESENTANTE LEGAL DE AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S. A. ✓

CONTRATISTA

Presente. -

De mi consideración:

Una vez revisado toda la documentación con respecto al contrato cuyo objeto es: **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, se remite el acta de inicio de obra de los trabajos a ejecutarse para dicho mantenimiento, en donde se da como fecha de inicio de la obra el 25 de enero de 2023.

Particular que comunico, para los fines pertinentes.

Atentamente.



Firmado electrónicamente por:
**ERYKA MIREYA SILVA
MANZANO**

Ing. Eryka Silva M.

ADMINISTRADORA DE CONTRATO



ACTA DE INICIO DE OBRA
PROCESO: CODIGO-LICO-GADPPz-006-2022

En la ciudad de Puyo, a los veinticinco de enero del 2023, se procede a la entrega en sitio donde se ejecutarán los trabajos concernientes al Contrato suscrito con fecha 07 de noviembre del 2022, cuyo objeto de contratación es: **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza con su representante legal el Ing. Jaime Guevara, Prefecto de Pastaza; por otro lado, en calidad de contratista AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S. A., representado legalmente por el Sr. Odilo Guevara Marín; KEYSZEN.S.A.S. en calidad de Fiscalizador Externo y la Ing. Eryka Silva M. en calidad de Administradora de Contrato; con la finalidad de suscribir la presente Acta de inicio de obra, la misma que consta de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES. -

Con fecha 07 de noviembre del 2022 se suscribió el contrato cuyo objeto de contratación es: **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**. Los trabajos se ejecutarán en varias comunidades de la provincia de Pastaza, con sujeción a diseños, especificaciones y más documentos contractuales, por un monto de U.S.D. \$4'650.521,23 en un plazo de 540 días:

Mediante Memorando Nro. GADPPZ-PROCURADURIA-2023-4383-M con fecha 06 de enero del 2023 se recibe la NOTIFICACIÓN DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO mediante Resolución N° 713- GADPPz-2022, de fecha 01 de diciembre, Resuelve mediante el Art. 2.- DESIGNAR a la Ing. Eryka Silva M. como Administradora de Contrato.

Con fecha 25 de enero de 2023, y según las Normas de control interno de Contraloría (NCI) Art. 408-17, literal g, la Administradora de Contrato procede a la autorización de inicio de obra para dicha contratación cuyo objeto es: **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, signado con el código LICO-GADPPz-006-2022.

CLÁUSULA SEGUNDA: REVISIÓN DE DOCUMENTOS, INSPECCIÓN DE CAMPO Y ENTREGA DE SITIO EN OBRA. -

Los documentos revisados son: El Contrato, los Pliegos (condiciones particulares y Condiciones generales); las especificaciones técnicas, la oferta presentada por el contratista, presupuesto, cronograma valorado de trabajos, garantías, resolución de adjudicación y la notificación de inicio de obra.



La obra materia del contrato consta de lo siguiente:

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

No.	Rubro / Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio global
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	29.18	444.42	12,968.18
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	14.59	1,383.97	20,192.12
3	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	M	243.00	26.76	6,502.68
4	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	MP	68,863.54	1.02	70,240.81
5	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	613.80	1.29	791.80
6	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	MP	8,576.91	5.02	43,056.09
7	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	MP	7,720.00	5.08	39,217.60
8	LIMPIEZA DE DERRUMBES	MP	8,746.43	0.82	7,172.07
9	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 0.80 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	126.00	166.33	20,957.58
10	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1.20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	263.00	272.20	71,588.60
11	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 2.20 M ,E=3.0 MM ,MP-100	ML	46.00	562.20	25,861.20
12	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	MP	4,746.82	167.21	793,715.77
13	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	MP	763.00	167.20	127,573.60
14	HORMIGON SIMPLE EN OBRAS DE ARTE F'C=240 KG/CM2	M3	78.47	162.46	12,748.24
15	HIERRO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2	KG	8,288.90	1.94	16,080.47
16	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	400.00	70.12	28,048.00
17	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	MP	83,263.76	3.00	249,791.28
18	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	MP	21,010.98	12.44	261,376.59
19	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	MP	13,031.28	15.78	205,633.60
20	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	MP	8,746.43	1.02	8,921.36
21	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	MP-KM	3,309,493.83	0.25	827,373.46
22	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	MP-KM	781,104.32	0.25	195,276.08
23	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	MP-KM	484,450.99	0.25	121,112.75
24	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	LT	171,247.08	0.76	130,147.78
25	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	122,319.34	9.74	1,191,390.37
26	BORDILLO DE H.S.(F'C=210 KG/CM2 - 0.14X0.40)	M	2,000.00	14.64	29,280.00
27	ACERAS DE H.S. F'C=180KG/CM2 E=7CM-ESCABILADO	MP	3,000.00	19.32	57,960.00
28	MARCAS EN PAVIMENTO	M	43,626.97	0.40	17,450.79
29	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	3,895.00	7.32	28,511.40
30	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1.00	1,179.51	1,179.51
31	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	2.00	354.87	709.74
32	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	4.00	354.87	1,419.48
33	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X0.75)M2	U	10.00	111.50	1,115.00
34	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X0.75)M2	U	200.00	111.50	22,300.00
35	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	4.00	78.18	312.72
36	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	4.00	163.34	653.36
37	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	4.00	17.57	70.28
38	KIT ANTIDERRAMES	U	4.00	157.50	630.00
39	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	1,000.00	0.32	320.00
40	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	20.00	22.48	449.60
41	SUMINISTRO DE PALETA DE ALTO Y SIGA	U	4.00	30.32	121.28
42	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	100.00	100.00
43	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	100.00	100.00
44	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	100.00	100.00
				TOTAL:	4,650,521.23

SON : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO DOLARES, 23/100 CENTAVOS
PLAZO TOTAL: 540 DIAS

En la inspección realizada al sitio donde se ejecutarán los trabajos, el Administrador, Fiscalizador y Contratista determinan la necesidad de recorrer y entregar los sitios donde se ejecutarán los trabajos de dicho mantenimiento.

Se deja constancia que las condiciones climáticas imperantes son apropiadas para realizar los trabajos y que las vías de acceso están libres de interrupción por lo que, se acuerda **iniciar los trabajos a partir del 25 de enero de 2023.**

CLÁUSULA TERCERA: PLAZO

En conformidad con lo previsto en la Cláusula Octava del contrato, el plazo previsto para ejecutar la totalidad de los trabajos es de quinientos cuarenta días (540 días), contados a partir de la fecha de suscripción de contrato, de donde la notificación por escrito de administrador de Contrato y Fiscalización llega con fecha **25 de enero de 2023**, por tanto, se inicia a partir de la misma dando como resultado los siguientes plazos contractuales:

- **Firma del contrato:** 06 de enero del 2023
- **Fecha Notificación de Administrador de Contrato:** 06 de diciembre 2022.
- **Fecha Notificación de inicio de obra:** 25 de enero de 2023
- **Fecha de inicio plazo contractual:** 25 de enero de 2023
- **Fecha de terminación de plazo contractual:** 18 de julio de 2024

Por tanto, la fecha de terminación del plazo contractual es el 03 de julio de 2024 en conformidad con el cronograma valorado de trabajos previsto en el proceso de contratación de las obras (ajustado a la fecha de inicio de obra).

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES

El contratista ejecutará las obras contratadas en los plazos y en las cantidades establecidas en el contrato, observará y cumplirá todas las leyes y reglamentos en cuanto a uso de maquinaria y personal vigentes en el país. De igual forma a disponer del personal técnico de acuerdo a lo especificado en su propuesta.

La fiscalización y administración cumplirá con todas las funciones y actividades necesarias para que la ejecución de la obra, observando los documentos precontractuales, el contrato vigente, las especificaciones técnicas, técnicas constructivas adecuadas, leyes y reglamentos vigentes en el país para este tipo de actividades.

CLÁUSULA QUINTA: DISPOSICIONES DE FISCALIZACIÓN.

Las inquietudes de tipo general que tenga el contratista, serán absueltas durante el proceso constructivo por parte de Fiscalización, caso contrario si hubiera controversias entre el Contratista y el Fiscalizador podrá intervenir el Administrador de Contrato.

Para constancia de lo actuado y por lo antes expuesto, en unidad de acto se suscribe la presente Acta de inicio de obra.



Firmado electrónicamente por:
**JESSICA MARIELA
JARAMILLO ARMIJOS**

Ing. Jessica Mariela Jaramillo Armijos
Representante Legal
KEYSZEN,S.A.S
FISCALIZADOR EXTERNO



Firmado electrónicamente por:
**ODILO VINICIO
GUEVARA MARIN**

Sr. Odilo Guevara
Representante Legal
AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S. A.
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
**ERYKA MIREYA SILVA
MANZANO**

Ing. Eryka Silva M.
ADMINISTRADORA DE CONTRATO GADPPz



MAZONAS BUILDING S.A.

Puyo - Pastaza - Ecuador

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

"ASFALTADO DE LA VIACURARAY -FRANCISCO DE ORELLANA-JATUN PACCHA, HASTA EL KILOMETRO
12 VIA 10 DE AGOSTO -EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"



RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	PE																	
						1 SEN																	
						1 MES		15 MES			16 MES			17 MES			18 MES						
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73						
1	Desbroce, desbosque y limpieza	Ha	29.18	444.42	12968.17560																		
2	Replanteo y nivelación a nivel de asfalto	km	14.59	1383.97	20192.12230													12 968.17560					
3	Remoción de alcantarillas	m	243.00	26.76	6502.68000	13.44856												20 192.12230					
4	Excavación sin clasific. (mov. de tierra)	m³	68863.54	1.02	70240.81080													6 502.68000					
5	Excavación de cunetas de coronación	m³	613.60	1.29	791.80200	82.72072		4 682.72072										70 240.81080					
6	Excavación para cunetas y encauzamiento	m³	8576.91	5.09	43056.08820					395.90100			395.90100					791.80200					
7	Excavación y relleno de estructuras menores	m³	7720.00	5.08	39217.60000	70.40588		2 870.40588					2 870.40588					43 056.08820					
8	Limpieza de derrumbes	m³	8746.43	0.82	7172.07260	14.50667		2 614.50667					2 614.50667					39 217.80000					
9	S.C. Tubería de acero corrugado D= 0.80 m, e=2.5 mm, MP	m	126.00	166.33	20957.58000	45.25454		448.25454					448.25454					7 172.07260					
10	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1.20 m, e=2.5 mm, MP	m	263.00	272.20	71588.60000	09.84875		1 309.84875					1 309.84875					20 957.58000					
11	S.C. Tubería de acero corrugado D= 2.20 m, e=3.0 mm, MP	m	46.00	562.20	25861.20000	74.28750		4 474.28750					4 474.28750					71 588.60000					
12	Hormigón para cunetas (F'c=180 KG/CM2)	m³	4746.62	167.21	793715.77220													25 861.20000					
13	Muro de H.S. f'c=180kg/cm2 tipo B(Cabezales)	m³	763.00	167.20	127573.60000	42.98102		65 142.98102					65 142.98102					793 715.77219					
14	Hormigón simple en obras de arte F'c=240 KG/CM2	m³	78.47	162.46	12748.23620													127 573.60000					
15	Hierro estructural fy=4200 kg/cm²	kg	8286.89	1.94	16080.46600													12 748.23620					
16	Muro de pavones - calibre N° 12	m³	400.00	70.12	28048.00000													16 080.46600					
17	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m³	83263.76	3.00	249791.28000													28 048.00000					
18	Material de subbase clase 3	m³	21010.98	12.44	261376.59120	93.60471		14 693.60471					14 693.60471					249 791.28000					
19	Material de base granular de agregados	m³	13031.28	15.78	205633.59840	25.19508		17 425.10608					17 425.10608					261 376.59120					
20	Transporte material de desalojo	m³	8746.43	1.02	8921.35860	88.11417		14 688.11417					14 688.11417					205 633.59840					
21	Transporte material pétreo de mejoramiento	m³.km	3309493.83	0.25	827373.45750	94.75724		594.75724					594.75724					8 921.35860					
22	Transporte de material sub base clase 3	m³.km	781104.32	0.25	195276.08000	69.02691		48 669.02691					48 669.02691					827 373.45750					
23	Transporte de material base granular de agregados	m³.km	484450.99	0.25	121112.74750	18.40533		13 018.40533					13 018.40533					195 276.08000					
24	Impregnación con emulsión asfáltica	Lt	171247.08	0.76	130147.78080	50.81054		8 650.81054					8 650.81054					121 112.74750					
25	C. rodadura hormigón asf. Mezclado en planta, e=2"	m²	122319.34	9.74	1191390.37160	68.47260		16 268.47260					16 268.47260					130 147.78080					
26	Bordillo de H.S. (f'c=210 kg/cm² - 0.14x0.40)	m	2000.00	14.64	29280.00000	23.79645		148 923.79645					148 923.79645					1 191 390.37160					
27	Aceras de H.S. f'c=180kg/cm² E=7cm escobillado	m²	3000.00	19.32	57960.00000													14540.00000					
28	Marcas en pavimento	m	43626.97	0.40	17450.78800													28980.00000					
29	Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccionales y bidirec)	u	3895.00	7.32	28511.40000													17450.78800					
30	Pancarta informativa de la obra (letrero)-con estructura	u	1.00	1179.51	1179.51000													28511.40000					
31	Señales ecológicas (2.44x1.22)M2	u	2.00	354.87	709.74000													1 179.51000					
32	Señales informativas (2.44x1.22)M2	u	4.00	354.87	1419.48000													709.740000					
33	Señales reglamentarias (0.75 x 0.75)M2	u	10.00	111.50	1115.00000													1419.480000					
34	Señales preventivas (0.75 x 0.75)M2	u	200.00	111.50	22300.00000													1115.000000					
35	Señales informativas y reglamentarias (0.60m x 0.80m) móviles	u	4.00	78.18	312.72000													22300.000000					
36	Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.60m) móviles	u	4.00	163.34	653.36000													312.720000					
37	Contenedores metálicos de 55 galones	u	4.00	17.57	70.28000													653.360000					
38	Kit antiderrames	u	4.00	157.50	630.00000													70.280000					
39	Cinta peligro colores intensos (mat. poliéster)	m	1000.00	0.32	320.00000													630.000000					
40	S/C Cono de seguridad con protección UV, 71cm Inch. cinta	u	20.00	22.48	449.60000	17.77778		17.77778					17.77778					320.000000					
41	Suministro de paleta de alto y baja	u	4.00	30.32	121.28000													449.600000					
42	Capacitación sobre preservación de recursos naturales (de 2 a 3 hor	u	1.00	100.00	100.00000													121.280000					
43	Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 hor	u	1.00	100.00	100.00000													100.000000					
44	Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 hor	u	1.00	100.00	100.00000													100.000000					

INVERSION MENSUAL	4 650 521.2295	300.000																
AVANCE MENSUAL (%)		0.0142544																
INVERSION ACUMULADA AL 100% (línea e=1p)		300.000																
AVANCE ACUMULADO (%)		0.0120358																
INVERSION ACUMULADA AL 80% (línea e=0.5p)		240.000																
AVANCE ACUMULADO (%)		0.0056286																
PLAZO TOTAL 540 DIAS		4																
PUYO, 25 DE ENERO DE 2023																		



CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
 CONTRATISTA



MAZONAS BUILDING S.A.

Puyo - Pastaza - Ecuador

CONFORMIDAD

AMBIENTAL

"ASFALTADO DE LA VIACURARAY -FRANCISCO DE ORELLANA-JATUN PACCHA, HASTA EL KILOMETRO
12 VIA 10 DE AGOSTO -EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"



Puyo, 05 de marzo del 2023

Ing. Adam Mariño
DIRECTOR DE FISCALIZACION SUBROGANTE DEL GADPPz
Presente. -



De mis consideraciones. -

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez desearle éxitos en las funciones a usted encomendadas, de la misma manera pongo en conocimiento que se adjunta el informe Ambiental de Cumplimiento del Proyecto **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA** perteneciente a la Planilla de Avance No. 01 para que se proceda con el trámite pertinente.

Verificando en territorio lo presentado en el informe Ambiental de cumplimiento remitido por el contratista, fiscalización externa emite la **CONFORMIDAD AMBIENTAL**, correspondiente al periodo **ENERO 25 DEL 2023 A FEBRERO 25 DEL 2023**

25 de Enero al 28 de Febrero 2023

Por la atención prestada anticipo mis más sinceros agradecimientos

Atentamente,



Firmado digitalmente por
JESSICA MARIELA
JARAMILLO ARMIÑOS

Ing. Jessica Jaramillo
C.C. 0704239128
GERENTE GENERAL
KEYSZEN S.A.S.
RUC 0791840462001

KEYSZEN SAS
INGENIERIA & CONSTRUCCION
Machala - El Oro - Ecuador

*Hecho el oficio del tecnico
al fiscalizador externo*



Archivos Adjuntos :

- 01 Oficio de Entrega Informe Ambiental Administrador de Contrato (1 hoja)
- 02 Oficio de Entrega Informe Ambiental Director de Fiscalizacion(2 hojas)
- 03 Informe Ambiental de Cumplimiento Planilla de Avance N° 01 (55 hojas)

CC. Ing. David Yadra - Director de Gestión Ambiental del GADPPz

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03
Oficina 072 785 269
keyszen.sas@gmail.com
www.keyszen.com
Machala - El oro - Ecuador

**INFORME AMBIENTAL DE FISCALIZACION DEL PROYECTO: "ASFALTADO
DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL
KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA,
PROVINCIA DE PASTAZA"**

PERIODO: ENERO 25 DEL 2023 A FEBRERO 25 DEL 2023

25 de Enero al 28 de Febrero 2023.

1. NOMBRE DEL PROYECTO

ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

2. FICHA DEL PROYECTO

ETAPA DEL PROYECTO	Operación y mantenimiento		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA	Provincia: Pastaza	Cantón: Pastaza	Parroquia: 10 de agosto
	CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA		
TIPO DE ZONA	Rural		
CÓDIGO DEL PROYECTO	LICO-GADPPz-006-2022		
PERIODO DEL INFORME	25 de enero de 2023 al 25 de febrero de 2023 <i>25 de enero de 28 de febrero</i>		
COORDENADAS UTM			
	Este (X)		Norte (Y)
	169467		9837116
	169975		9837403
	170901		9838807
	173028		9840607
	173979		9841143
	175562		9841028
	176810		9841069
	178330		9841233
	178384		9841892
	178743		9842171
DATOS DEL OPERADOR DEL PROYECTO			
Representante legal	Ing. Jaime Guevara		
Domicilio	Francisco de Orellana y 27 de febrero, Puyo, Pastaza		
Página web	gadppz@pastaza.gob.ec	Cel:	(593) 032 994-220
DATOS DEL RESPONSABLE TÉCNICO FISCALIZACIÓN EXTERNA			
Elaborado por:	Ing. Jessica Gorozabel		
Dirección	Machala		
Correo electrónico	jessica.gorozabel@gmail.com	Cel:	0995057489
Aprobado por:	Ing. Jessica Jaramillo		
Dirección:	Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03		
Correo Electrónico	keyszen.sas@gmail.com	Cel:	072 785 269
Representante legal	Gerente de KEYSZEN S.A.S.		
PERIODO	25 de enero de 2023 al 25 de febrero de 2023		
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	4 % APROXIMADO		

INFORME AMBIENTAL DE FISCALIZACION DEL PROYECTO: "ASFALTADO DE LA VÍA
CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10
DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

PERIODO: ENERO 25 DEL 2023 A FEBRERO 25 DEL 2023



FISCALIZADOR:

KEYSZEN S.A.S.

CONTRATISTA:

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

PERIODO:

ENERO 25 DEL 2023 A FEBRERO 25 DEL 2023

1. OBJETIVO GENERAL

- El Objetivo principal, es el cumplimiento de Plan de manejo Ambiental establecido en materia ambiental, por parte de la contratista AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A., que permitan evitar, mitigar y corregir las potenciales afectaciones que se pudieran presentar durante la ejecución del proyecto.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Procurar la menor afectación e impactos ambientales negativos hacia el recurso humano y recursos naturales como suelo, agua, calidad de aire, flora y fauna.
- Maximizar el bienestar de la población, en función de los beneficios sociales y de seguridad que conllevan la ejecución del proyecto.
- Detectar oportunamente errores y/u omisiones en el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y dar soluciones a las diferentes situaciones que se presenten dentro de la ejecución del proyecto **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA** ✓

2. ACTIVIDADES

Las actividades de quien suscribe este informe se han desarrollado durante el periodo enero 25 del 2023 a febrero 25 del 2023. X

En cumplimiento a la ejecución del proyecto **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA** sea compatible con las normas ambientales; se ha establecido el siguiente alcance:

- Identificación y sistematización de los potenciales riesgos ambientales que se producirán durante la ejecución de las actividades de constructivas del proyecto en mención.

3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE PROYECTO

- Desbroce, desbosque y limpieza
- Replanteo y nivelación a nivel de asfalto
- ~~Remoción de alcantarillas~~
- Excavación sin clasificar (mov. de tierra)
- Excavación de cunetas de coronación

- Excavación para cunetas y encauzamiento
- Excavación y relleno de estructuras menores
- Limpieza de derrumbes
- S.C. Tubería de acero corrugado D= 0,80 m, e=2.5 mm, MP-100
- S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2.5 mm, MP-100
- S.C. Tubería de acero corrugado D= 2.20 m. e=3.0 mm, MP-100
- Hormigón para cunetas (F'C=180 KG/CM2)
- Muro de H.S. f'c=180kg./cm² tipo B (Cabezas)
- Hormigón simple en obras de arte F'C=240 KG/CM2
- Hierro estructural fy=4200 kg/cm²
- Muro de gaviones - calibre N.º 12
- Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)
- Material de subbase clase 3
- Material de base granular de agregados
- Transporte material de desalojo
- Transporte material pétreo de mejoramiento
- Transporte de material sub base clase 3
- Transporte de material base granular de agregados
- Imprimación con emulsión asfáltica
- C. rodadura hormigón asf. Mezclado en planta, e=2"
- Bordillo de H.S. (f'c=210 kg/cm² - 0,14x0,40)
- Aceras de H.S. f'c=180kg/cm² E=7cm escobillado
- Marcas en pavimento
- Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccionales y bidireccionales)
- Pancarta informativa de la obra (letrero)-con estructura
- Señales ecológicas (2.44x1.22) M2
- Señales informativas (2.44x1.22) M2
- Señales reglamentarias (0.75 x 0.75) M2
- Señales preventivas (0.75 x 0.75) M2
- Señales informativas y reglamentarias (0.60m x 0.80m) móviles
- Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.60m) móviles
- Contenedores metálicos de 55 galones
- Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)
- S/C Cono de seguridad con protección UV, 71cm Incl. cinta reflectiva
- Suministro de paleta de alto y siga
- Capacitación sobre preservación de recursos naturales (de 2 a 3 horas)
- Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas)
- Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 horas)

4. MAQUINARIA/EQUIPO EMPLEADO

Excavadora sobre oruga

- Motoniveladora
- Camión cisterna
- Volquetes
- Distribuidor de asfalto
- Planta de asfalto
- Terminador de asfalto
- Rodillo tanden doble tambor
- Rodillo vibratorio liso
- Rodillo vibratorio neumáticos
- Concretera
- Mini cargadora
- Aparatos de topografía

5. CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

ITEM	MEDIDA	Medio de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> ● Implementar señalética ● Señalética de prohibición ● Señalética de condición obligatoria ● Señalética condición Segura ● Señalética preventiva ● Señalética Ambiental ● Señalética informativa 	ANEXO 9 Señalética	X			En el frente de trabajo existe señalética.
2	<ul style="list-style-type: none"> ● Humedecer la vía en los días soleados para evitar material particulado, optimizando el recurso agua. 	ANEXO 10 Tanquero de agua	X			Dentro de proyecto existe un tanquero el cual sirve para rociar agua y mitigar el material particulado.
3	<ul style="list-style-type: none"> ● Zonificar las áreas de trabajo con cinta de peligro. 	ANEXO 11 Zonificación de áreas con cinta	X			Los diferentes frentes de trabajo han sido zonificados por cinta de peligro, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los peatones y tránsito vehicular.
4	<ul style="list-style-type: none"> ● Cubrir con una lona las volquetas que trasladen material pétreo hacia el lugar de la obra. 	ANEXO 12 Volquetas cubiertas con lona	X			Las volquetas que operan en el proyecto son cubiertas de lonas para evitar la dispersión del material transportado.

5	<ul style="list-style-type: none"> Las vías por donde circula el equipo caminero deben estar despejadas y sin obstáculos. 	<p>ANEXO 13</p> <ul style="list-style-type: none"> Vías despejadas 	X	Las vías se encuentran libres de obstáculos.
6	<ul style="list-style-type: none"> Realizar mantenimiento regular de la maquinaria y equipo utilizado 	<p>ANEXO 5</p> <ul style="list-style-type: none"> Registro del mantenimiento vehicular 	X	La maquinaria, herramientas y equipos se encuentran operando en buen estado, debido a que se les da el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo.
7	<ul style="list-style-type: none"> El transporte del equipo se realizará utilizando las vías de accesos existentes, considerado no causar molestias a los habitantes del estado de la vía y el posible deterioro de la misma. 	<p>ANEXO 13</p> <ul style="list-style-type: none"> Vías despejadas 	X	Los vehículos livianos y pesados que operan en el proyecto utilizan las vías de acceso, precautelado el correcto uso de las mismas con el objetivo de evitar daños.
8	<ul style="list-style-type: none"> Implementar un kit anti derrame y equipo de respuesta rápida para combatir posibles contaminados. 	<p>ANEXO 14</p> <ul style="list-style-type: none"> Kits antiderrames 	X	Dentro del proyecto existe un kit antiderrame, con el objetivo de mitigar cualquier derrame.
9	<ul style="list-style-type: none"> Se Deberá instalar de forma permanente un extintory botiquín de primeros auxilios en los vehículos y maquinaria. 	<p>ANEXO 6 y 7</p> <ul style="list-style-type: none"> Botiquín Extintor 	X	Los vehículos y maquinarias pesadas cuentan con un botiquín que dispone insumos básicos y un extintor operativo.

10	<ul style="list-style-type: none"> Dotar al personal que labora en el Proyecto de EPP 	<ul style="list-style-type: none"> ANEXO 8 <ul style="list-style-type: none"> Entrega y uso de EPPs 	X			El contratista habilitado a sus trabajadores del EPP adecuado, según la actividad laboral asignada.
11	<ul style="list-style-type: none"> Implementar un área para el almacenamiento temporal de combustibles el cual deberá cumplir las siguientes características <ul style="list-style-type: none"> Deberá estar ubicado alejado de cuerpos hídricos y aislados. Los sitios de almacenamiento de combustible serán ubicados en áreas no inundables. La estructura será realizada con vigas de madera y cubierta de dura techo o también pueden ser hojadas si las dimensiones del área se realizarán en base a la cantidad de tanques de almacenamiento a utilizar. El tanque de almacenamiento deberá estar protegido contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones que contaminen el ambiente y contarán con manijas y llaves de distribución. El tanque de almacenamiento debe estar rodeado de un cubeto o estructura de contención impermeables técnicamente diseñados para el efecto con volumen = o mayor a 110% del tanque. En el área deberá implementarse un extintor para evitar cualquier riesgo de incendio Tener un acceso adecuado para la carga de combustible y en caso de ser necesario para la entrada del carro de los bomberos El área deberá estar señalizada en base a la normativa NTE INEN 2266. 	<ul style="list-style-type: none"> ANEXO 15 <ul style="list-style-type: none"> Área para el almacenamiento de combustible 	X			En el campamento se encuentra un área destinada para el almacenamiento de combustible, la misma cuenta con piso pavimentado, bajo cubierta, kit antiderrame, señalética y extintor.

12	<ul style="list-style-type: none"> • Ubicar el material de desalojo en los sitios descritos en el ítem 7 del presente documento. • Los cuáiles han sido ubicados de acuerdo a los siguientes criterios técnicos • Deberán encontrarse dentro del área de influencia del Proyecto. • El terreno deberá estar desprovisto de vegetación • Alejado de cueros hídricos • Las áreas destinadas a las escombreras deberán ser estables y seguras a corto y largo plazo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Registro fotografía de las escombreras del proyecto • Actas de acuerdo de desalojo de escombreras (en caso de ser predios privados) • Deberán contar con una capacidad mínima de 1500m³ • El transporte del material debe realizarse en una volqueta con cubierta (lona), con el fin de evitar derrames en la carretera. 		X	Se lo realizara cuando las actividades lo ameriten
----	---	--	--	---	--

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

ITEM	MEDIDA	Medio de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> Implementar un área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos en el cual deberá tener las siguientes características: Estar bajo cubierta Iluminación natural En un espacio abierto cerrado El acceso a estos locales deberá ser registrado Y el personal que ingiere estará provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial Contar con señalización apropiada en lugares y formas visibles en base a la Norma nte ine 2266. Contar con el material y equipamiento para atender contingencias. Contar con sistemas de extinción contra incendios Contar con bases o pisos impermeabilizados o similares según el caso. 	<p>ANEXO 16</p> <ul style="list-style-type: none"> Área para almacenamiento de desechos peligrosos 	X			<p>En el campamento se encuentra un área destinada para el almacenamiento temporal de los desechos peligrosos, la misma cuenta con piso pavimentado, bajo cubierta, kit antiderrame, señalética y extintor.</p> <p>Cabe mencionar que durante este periodo no se han realizado actividades productivas que generen desechos peligrosos.</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> Dotar de fundas plásticas a los conductores de volquetes y máquinas pesadas para los desechos. 	<p>ANEXO 17</p> <ul style="list-style-type: none"> Dotación de fundas 	X			<p>Constantemente se dotaa los transportistas de fundas plásticas para el correcto almacenamiento de los desechos comunes.</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> Implementación de contenedores de colores debidamente etiquetadas para la clasificación en lavia, se deberá cumplir con las siguientes características: Encontrarse bajo techo Contenedores de 55 galones (4) El rotulado estará en un lugar visible con caracteres legibles según lo 	<p>ANEXO 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Contenedores metálicos 	X			<p>En el frente de trabajo existen contenedores metálicos móviles, coloreados según el residuo y/o desecho a clasificar.</p>

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03

Oficina 072 785 269

keyszen.sas@gmail.com

www.keyszen.com

Machala – El oro - Ecuador

	<ul style="list-style-type: none"> establecido en la NTE INEN 878. El nombre o denominación de los residuos con su logo respectivo y la distancia de observaciones según lo establecido en la NTE INEN ISO 3864-1 				
--	--	--	--	--	--

PLAN DE CAPACITACIÓN:

ITEM	MEDIDA	Medio de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> Capacitaciones al personal de trabajo sobre: Medidas propuestas en el MA Manejo de los procedimientos de seguridad Trabajos en altura Protecciones del ambiente Primeros auxilios y procedimiento en caso de emergencia Manejo de desechos peligrosos y no peligrosos Técnicas para prevenir conflictos con la comunidad 	<p>ANEXO 18</p> <ul style="list-style-type: none"> Capacitaciones 	X			<p>Todo el personal que opera en el proyecto ha sido capacitado en los temas de seguridad, salud y ambiente, de igual forma ha sido socializado el PMA.</p>

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS:

ITEM	MEDIDA	Medio de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> Realizar una reunión previa con los involucrados directos del Proyecto para darles a conocer las ventajas de implementación del Proyecto obra o actividad. 	ANEXO 19 <ul style="list-style-type: none"> Socialización con la comunidad 	X			El proyecto y las actividades a realizarse han sido socializadas con la comunidad.
2	<ul style="list-style-type: none"> Implementación un buzón donde se recopile las quejas y sugerencias de la población. 	ANEXO 20 <ul style="list-style-type: none"> Buzón de quejas 	X			El personal que se encuentra diariamente en el proyecto cuenta con hojas de registro, en las cuales las personas
3	<ul style="list-style-type: none"> Participar activamente en reuniones y procesos comunales que se realiza que se realicen en el área de influencia 	ANEXO 18 <ul style="list-style-type: none"> Capacitaciones 	X			El personal ha participado en simulacro de emergencia, dictado por el cuerpo de bomberos.

PLAN DE CONTINGENCIAS:

ITEM	MEDIDA	Medio de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar un plan de contingencia accesible a todo el personal en el cual se aborde la gestión de contingencia en caso de incendios, derrame, fuga o explotación 	ANEXO 21 <ul style="list-style-type: none"> Plan de contingencia 	X			El proyecto cuenta con un plan de contingencia, el mismo que ha sido socializado a los trabajadores.
2	<ul style="list-style-type: none"> Crear un comité de seguridad que actúe en caso de emergencia. 	<ul style="list-style-type: none"> Actas firmadas por los miembros del comité 			X	Se lo realizará en el mes de febrero.

3	<ul style="list-style-type: none"> Se realizará simulacros, de evaluación, incendio, derrames o fugas para agilitar los tiempos de reacción del personal y su actuación. 	<ul style="list-style-type: none"> Registro fotográfico 	X		Se lo realizara en él es de febrero.
4	<p>Actuar de la siguiente manera en caso de</p> <ul style="list-style-type: none"> En caso de incendio <p>Si alguien detecta un fuego incipiente y sabe usar un extintor actúa inmediatamente</p> <ul style="list-style-type: none"> Se recomienda el uso de extintores de industriales ubicados estrictamente Tipos de extintores El tipo A se usará durante la combustión de sólidos comunes El tipo B se usará para líquidos y gases inflamables El tipo C sé para equipos eléctrico energizado Y tipode para metales combustibles Salve su vida y la de los demás abandonando el lugar de incendio Una vez a salvo avisar a la brigada hágalosin pensar que otro ya lo han hecho Solicite Auxilio Si se encuentra Atrapado por el humo trate de salir arrastrándose o permanezcalo más cerca del suelo el humo tiende a subir y existe aire no contaminado a nivel del suelo Si el humo es muy denso curarse con un pañuelo ropa mojada la boca y nariz manténgase cerca del suelo Cuándo se inflaman la ropa de una persona, impida que corra, el viento aviva el fuego. Cobijelo con una manta húmeda haga que se proteja la cara y cuello. En caso de explosión Evacuen la zona de riesgo y proceda de acuerdo a lo establecido en el programa de contingencia Acordeón del área y restringe el acceso a personal ajeno Utilice el extintor adecuado? No intenté extinguir el fuego hasta que la fuga haya sido detenida de otra manera existe grave riesgo de rescisión y explosión En caso de sismo o fenómeno natural Antes un sismo -Conozca las zonas de seguridad 	<ul style="list-style-type: none"> Informe técnico del hecho 	X		Durante este periodo no ha existido ningún incidente y/o accidente de manera natural o antrópica, en caso de suceder se tomará en cuenta lo establecido en esta medida.

	<ul style="list-style-type: none"> - Contar con un mapa de peligro potencialmente zonas seguras - Recibir entrenamiento en primeros auxilios y evacuación - Manténgase plenamente informado de cómo interrumpir de forma segura sus labores habituales o el proceso de construcción - Observe la ubicación de su área de trabajo Buscar sitios de protección contra materiales que pudieran desprenderse. - Haga una evacuación de vulnerabilidad de su entorno de trabajo para determinar los peligros potenciales - En caso de derrame o fuga - Localice el derrame o fuga - Antes de comenzar con el control o contención del derrame, debe colocarse los elementos de protección personal necesario: ropa adecuada impermeable y resistente a los productos químicos guantes protectores lentes de seguridad protección respiratoria. - Contenga con barreras, diques o materiales absorbentes - Colocar fluidos y desechables en recipientes de fundas para recolección de materiales contaminados - Entregar el material contaminado a un gestor calificado 					
--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO:

ITEM	MEDIDA	Medio de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar el nivel de cumplimiento al presente PMA a través de un informe interno de cumplimiento de las medidas del plan de aprobación por la Autoridad Ambiental. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de monitoreo 	X			Se presenta el informe correspondiente a este periodo.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Monitorear el manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos dentro del área de influencia del proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de monitoreo al manejo de desechos peligrosos y no peligrosos 			X	La acción No Aplica, debido a que durante este periodo no se han realizado actividades que generen desechos peligrosos.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar el mantenimiento de los extintores 	<ul style="list-style-type: none"> • ANEXO 7 • Extintores 	X			Los extintores se encuentran recargados, en buen estado y ubicados en lugares visibles y de fácil acceso.

PLAN DE REHABILITACION:

ITEM	MEDIDA	Medio de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> • Revegetación reforestación de áreas degradadas en el proyecto con plantas nativas de la zona. 	<ul style="list-style-type: none"> • Registro fotográfico • Informe de revegetación 			X	La acción no aplica, debido a que el proyecto se encuentra en etapa de construcción.

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03

Oficina 072 785 269

keyszen.sas@gmail.com

www.keyszen.com

Machala – El oro - Ecuador

PLAN DE ENTREGA Y ABANDONO:

ITEM	MEDIDA	Medio de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> Desmantelamiento de la infraestructura temporal existente en el área del proyecto (campamento, área de almacenamiento de combustibles y desechos peligrosos) 	<ul style="list-style-type: none"> Registro fotográfico Informe de monitoreo 			X	La acción no aplica, debido a que el proyectose encuentra en etapa de construcción.
2	<ul style="list-style-type: none"> Limpieza general del área del proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> Registro fotográfico 			X	La acción no aplica, debido a que el proyecto se encuentra en etapa de construcción.

Durante el periodo enero 25 del 2023 a febrero 25 del 2023. En la ejecución del proyecto **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**

LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LAS MEDIDAS AMBIENTALES SE HAN CUMPLIDO

6. CONCLUSIONES

Podemos concluir en el presente informe mensual la administración del Proyecto **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, tiene como objetivo continuar con el cumplimiento de las medidas ambientales y así mitigar el impacto que esta obra pueda ocasionar en los moradores del sector.

En ese contexto, se recomienda continuar con la implementación del Plan de Manejo Ambiental, así como también el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad del personal.

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:
JESSICA GISSELLA
GOROZABEL ROSILLO

Jessica Gorozabel Rosillo
INGENIERO AMBIENTAL

Aprobado por:



Firmado electrónicamente por:
JESSICA MARIELA
JARAMILLO ARMIJOS

Jessica Jaramillo Armijos
KEYSZEN S.A.S.
FISCALIZADOR EXTERNO

ANEXOS

ANEXO 1. Permiso Ambiental

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03
Oficina 072 785 269
keyszen.sas@gmail.com
www.keyszen.com
Machala – El oro – Ecuador



Via Puyo-Napo Km2 1/2
Diagonal Hostelería los Chomtos
Puyo - Ecuador
Teléfonos: (593 3) 2883809 / 2883085
www.ambiente.gob.ec

Oficio No. MAE-DPP-2010-0457

Puyo, 09 de diciembre de 2010.

Señor Ingeniero
Jaime Patricio Guevara Blaschke
Prefecto
GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA
Presente.

En respuesta al oficio N° 266-GPPZ-2010, de lugar y fecha, Puyo 04 de Noviembre de 2010, suscrito por el Ing. Rodrigo Villagomez, Técnico Ambiental del Gobierno Provincial de Pastaza, en el cual remite a la Dirección Provincial de Pastaza del Ministerio del Ambiente, para análisis y pronunciamiento de la Ficha Ambiental del proyecto: "ASFALTADO DE LA VIA CURARAY -FRANCISCO DE ORELLANA-INTERSECCION CON LA VIA 10 DE AGOSTO -EL TRIUNFO", al respecto comunico que luego de revisada la documentación y sobre el Informe Técnico N° 171 UCA.DPP de 08 de diciembre de 2010 realizado por el Ing. Franklin Guamán, Responsable de la Unidad Calidad Ambiental, se aprueba la Ficha Ambiental en mención, el cumplimiento a cabalidad del Plan de Manejo Ambiental de la ficha lo realizará el Ministerio del Ambiente, mediante el proyecto a través de inspecciones, sin previo aviso.

Al ejecutarse modificaciones en la operación normal del proyecto, se deberá notificar en forma oficial e inmediata de los detalles de modificación y/o cambios a esta Dirección Provincial.

Atentamente,


José María García Paican

DIRECTOR PROVINCIAL DE PASTAZA (E)



C.C.:
Señor
Franklin Patricio Guamán Boasmediano
Servidor Público 1
MINISTERIO DEL AMBIENTE
Señor
Angel Gualberto Vargas Cevallos
Servidor Público de apoyo 3
MINISTERIO DEL AMBIENTE

Oficio de aprobación del permiso ambiental del
proyecto.

ANEXO 2. Certificado de Intersección



Via Puyo-Napo Km2 1/4
Diagonal Hostena los Chombas
Puyo - Ecuador
Teléfonos: (593 3) 2683809 / 2683065
www.ambiente.gob.ec

Oficio No. MAE-DPP-2010-0457

Puyo, 09 de diciembre de 2010

Señor Ingeniero
Jaime Patricio Guevara Blaschke
Prefecto
GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA
Presente.

En respuesta al oficio N° 266-GPPZ-2010, de lugar y fecha, Puyo 04 de Noviembre de 2010, suscrito por el Ing. Rodrigo Villagomez, Técnico Ambiental del Gobierno Provincial de Pastaza, en el cual remite a la Dirección Provincial de Pastaza del Ministerio del Ambiente, para análisis y pronunciamiento de la Ficha Ambiental del proyecto: "ASFALTADO DE LA VIA CURARAY -FRANCISCO DE ORELLANA-INTERSECCION CON LA VIA 10 DE AGOSTO -EL TRIUNFO", al respecto comunico que luego de revisada la documentación y sobre el Informe Técnico N° 171 UCA.DPP de 08 de diciembre de 2010 realizado por el Ing. Franklin Guamán, Responsable de la Unidad Calidad Ambiental, se aprueba la Ficha Ambiental en mención, el cumplimiento a cabalidad del Plan de Manejo Ambiental de la Ficha lo realizará el Ministerio del Ambiente hacia el proyecto a través de inspecciones, sin previo aviso.

Al ejecutarse modificaciones en la operación normal del proyecto, se deberá notificar en forma oficial e inmediata de los detalles de modificación y/o cambios a esta Dirección Provincial.

Atentamente,


Rosa María García Paican

DIRECTOR PROVINCIAL DE PASTAZA (E)



C.C.:
Señor
Franklin Patricio Guamán Bosmediano
Servidor Público 1
MINISTERIO DEL AMBIENTE
Señor
Ángel Gualberto Vargas Cevallos.
Servidor público de apoyo 3
MINISTERIO DEL AMBIENTE

ANEXO 3. Contenedores metálicos



Fotografía 1,2 y 3. Contenedores metálicos, coloreados y etiquetados.

ANEXO 4. Entrega de desechos comunes al recolector municipal




Fotografía 4. Entrega de los desechos comunes al recolector municipal.



ANEXO 5. Certificación de mantenimiento vehicular

AMAZONAS BUILDING S.A.								
CONTROL DE MANTENIMIENTOS MAQUINARIA								
Fecha	25/10/22		Lugar de Mantenimiento	TALLER DE COMPAÑIA AMAZONAS BUILDING S.A.		RESPONSABLE		
VEHICULOS								
MINICARGADORA KOMATSU SK 815-5			EXCAVADORA ORUGA DOOSAN DX225LCA 2		ACEITE	TIPO DE ACEITE	Ed	
PLANTA ASFALTICA ADM SPL 110			EXCAVADORA ORUGA DOOSAN DX225LCA 3			15W40		
GENERADOR CUMMIS (PLANTA DE ASFALTO)			EXCAVADORA ORUGA DOOSAN DX225LCA 4			CANTIDAD	TECNICO	
GENERADOR KOLER (PLANTA DE ASFALTO)			GALLINETA					
BOMBA HORMIGON SCHWING AMERICA INC. SP 750-1			Rodillo AMMAN			6%	TECNICO	
RODILLO TANDEM BOMAG BW 8AS			Rodillo AMMAN 2					
RODILLO TANDEM INGERSOLL S0100D			Rodillo Caterpillar					
RODILLO NEUMATICO BASIC HUBOTA MODELO 700								
FINISHER LEE BOY 8500 T								
MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670B								
PLANTA DOSIFICADORA HORMIGON PAD001B2								
CAMBIO DE ACEITE MOTOR								
FECHA CAMBIO	25/10/22	CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO	170043	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO	
CAMBIO FILTRO DE ACEITE								
FECHA CAMBIO	25/10/22	CANTIDAD	1	KILOMETRAJE HOROMETRO	"	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO	
CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE								
FECHA CAMBIO	25/10/22	CANTIDAD	1	KILOMETRAJE HOROMETRO	"	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO	
CAMBIO FILTRO DE AIRE								
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		NUMERACION	PROXIMO CAMBIO	
CAMBIO ACEITE HIDRAULICO								
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		NUMERACION	PROXIMO CAMBIO	
CAMBIO DE ACEITE DE GIRO								
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		NUMERACION	PROXIMO CAMBIO	
CAMBIO DE ACEITE DEPURADORES								
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		NUMERACION	PROXIMO CAMBIO	
CAMBIO DE ACEITE CATALINA								
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		NUMERACION	PROXIMO CAMBIO	
CAMBIO DE ACEITE RUEDAS GUIAS								
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		NUMERACION	PROXIMO CAMBIO	
CAMBIO DE URAS - RETENEDORES - RUEDAS								
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		NUMERACION	PROXIMO CAMBIO	
OTROS MANTENIMIENTOS								
DETALLAR OBSERVACIONES: Limpieza de separador de agua								

Registro de maquinaria pesada (excavadora).

AMAZONAS BUILDING S.A.								
CONTROL DE MANTENIMIENTOS MAQUINARIA								
Fecha:	09/11/22	Lugar de Mantenimiento TALLER DE COMPAÑIA AMAZONAS BUILDING S.A			①	RESPONSABLE		
VEHICULOS				ACEITE	TIPO DE ACEITE	TECNICO		
MINICARGADORA KOMATSU SK R15-5		EXCAVADORA ORUGA DOOSAN DX225LCA 2	X		15W40	6.42		
GENERADOR CUMMIS (PLANTA DE ASFALTO)		EXCAVADORA ORUGA DOOSAN DX225LCA 4						
GENERADOR KOLER (PLANTA DE ASFALTO)		GALLINETA						
BOMBA HORMIGON SCHWING AMERICA INC. SP 750.1		Rodillo AMMAN						
RODILLO TANDEM BOMAG BW 9AS		Rodillo AMMAN 2						
RODILLO TANDEM INGERSOLL SD1000		Rodillo Caterpillar						
RODILLO NEUMATICO BASIC KUBOTA MODELO 700								
FINISHER LEE BOY 8500 T								
MOTONIVELADORA JHON DEFRE 8708								
PLANTA DOSIFICADORA HORMIGON PADD0162								
CAMBIO DE ACEITE MOTOR								
FECHA CAMBIO	09/11/22	CANTIDAD	6.42	KILOMETRAJE HOROMETRO	19640	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO	
CAMBIO FILTRO DE ACEITE								
FECHA CAMBIO	09/11/22	CANTIDAD	1	KILOMETRAJE HOROMETRO	"	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO	
CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE								
FECHA CAMBIO	09/11/22	CANTIDAD	1	KILOMETRAJE HOROMETRO	"	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO	
CAMBIO FILTRO DE AIRE								
FECHA CAMBIO	09/11/22	CANTIDAD	1	KILOMETRAJE HOROMETRO	19640	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO	
CAMBIO ACEITE HIDRAULICO								
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		NUMERACION	PROXIMO CAMBIO	
CAMBIO DE ACEITE DE GIRO								
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		NUMERACION	PROXIMO CAMBIO	
CAMBIO DE ACEITE DEPURADORES								
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		NUMERACION	PROXIMO CAMBIO	
CAMBIO DE ACEITE CATALINA								
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		NUMERACION	PROXIMO CAMBIO	
CAMBIO DE ACEITE RUEDAS GUIAS								
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		NUMERACION	PROXIMO CAMBIO	
CAMBIO DE UÑAS - RETENEDORES - RUEDAS								
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		NUMERACION	PROXIMO CAMBIO	
OTROS MANTENIMIENTOS								
DETALLAR OBSERVACIONES:								

Registro de mantenimiento para maquinaria pesada (excavadora oruga).

AMAZONAS BUILDING S.A.							
CONTROL DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS							
Fecha:	08/11/22	Lugar de Mantenimiento:	TALLER DE COMPANIA AMAZONAS BUILDING S.A.				
VEHICULOS		PLACA	TB35817		RESPONSABLE		
HINO DUTRO 300		TOYOTA FORTUNER		TIPO DE ACEITE			
HINO 1 M 500		VITARA ROJO		15W40			
HINO 15700		MIXER HYUNDAI HD270		CANTIDAD			
TRAILER FREIGHTLINER		TANQUERO MERCEDES		16 1/4			
Volqueta Chevrolet Azul		FORD AZUL					
GREAT WALL 5 BLANCA	X						
GREAT WALL 7 PLOMA							
JAC ROJO							
CAMBIO DE ACEITE MOTOR							
FECHA CAMBIO	08/11/22	CANTIDAD	16 1/4	KILOMETRAJE HOROMETRO	48376	PROXIMO CAMBIO	53376
						NUMERACION	Gulf
CAMBIO FILTRO DE ACEITE							
FECHA CAMBIO	08/11/22	CANTIDAD	1	KILOMETRAJE HOROMETRO	48376	PROXIMO CAMBIO	53376
						NUMERACION	Indes Finer PH820
CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE							
FECHA CAMBIO	08/11/22	CANTIDAD	1	KILOMETRAJE HOROMETRO	48376	PROXIMO CAMBIO	53376
						NUMERACION	9.800.70-1501 Kodomo 374 # 10
CAMBIO FILTRO DE AIRE							
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		PROXIMO CAMBIO	
						NUMERACION	
CAMBIO ACEITE DE CORONAS							
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		PROXIMO CAMBIO	
						NUMERACION	
CAMBIO DE ACEITE DE CAJA							
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		PROXIMO CAMBIO	
						NUMERACION	
CAMBIO DE GRASAS DE LAS RUEDAS							
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		PROXIMO CAMBIO	
						NUMERACION	
CAMBIO DE DE RUEDAS							
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		PROXIMO CAMBIO	
						NUMERACION	
OTROS MANTENIMIENTOS							
DETALLAR OBSERVACIONES: + Cambio de pastillas de freno							
+ Anillo Camisa estro							
+ Anillo Antena de radio.							

Registro de mantenimiento para vehículo pesado.

ANEXO 6. Botiquín




Fotografía 5 y 6. Botiquín con insumos básicos en vehículo y maquinaria pesada.

ANEXO 7. Extintor



Fotografía 7 y 8 . Extintores en vehículos pesados.

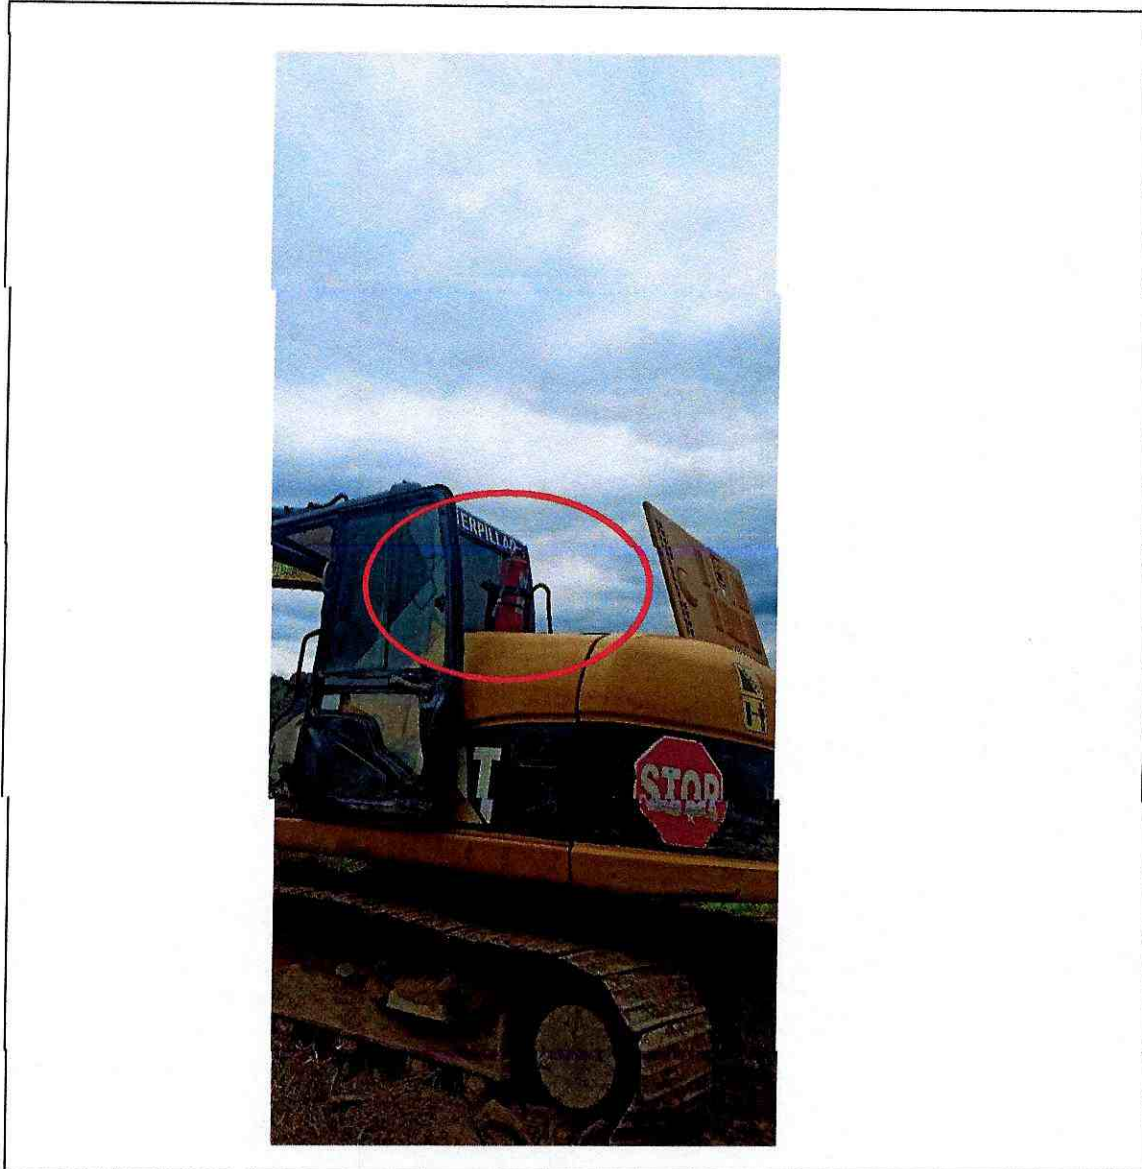


Fotografía 9. Extintor en maquinaria pesada.

ANEXO 8. Entrega y uso de EPPs

REGISTRO DE ENTREGA DE UNIFORMES		Nº
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Edgar Jacome	
CATEGORÍA OCUPACIONAL:		CÉDULA: 160051882-6
SE LE HACE LA ENTREGA DE LO SIGUIENTE:		
<ul style="list-style-type: none"> • CAMISA DE TRABAJO COLOR AZUL CON FRANJAS PLOMAS • PANTALON DE TRABAJO COLOR AZUL CON FRANJAS PLOMAS • CALZADO TIPO BOTAS COLOR CAFÉ CON PUNTA DE ACERO 		
OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR		
<p>Art. 1.- Obligaciones generales del empleador. -</p> <p>4. <i>Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección individual adecuados.</i></p>		
PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR Y TRABAJADORES		
<p>Art.4.- Prohibiciones del empleador. - La empresa deberá considerar las siguientes prohibiciones:</p> <p>c) <i>Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y equipo de protección personal.</i></p>		
INCUMPLIMIENTOS		
<p>Art. 133.-Incumplimientos</p> <p>b) Faltas graves.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>No cuidar o dar mal uso a los elementos de protección personal.</i> 		
SANCIONES		
<p>Art. 134.-Sanciones</p> <p>c) Sanción pecuniaria administrativa o multa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>No excederá el monto del diez por ciento de la remuneración, y se impondrá por reincidencia en faltas leves en el cumplimiento de sus deberes. En caso de reincidencia, trabajador/a será destituido con sujeción a la ley.</i> 		

COMPROMISO: Me comprometo a cuidar, mantener en buen estado y usar adecuadamente el equipo de protección personal. Cualquier imprevisto será notificado, teniendo presente que el inadecuado uso del EEP conlleva a sanciones por parte de la empresa.


 FIRMA DEL TRABAJADOR

		REGISTRO DE ENTREGA DE UNIFORMES		Nº	
NOMBRE DEL TRABAJADOR:		Pedro Chacipanta			
CATEGORÍA OCUACIONAL:				CÉDULA: 090377458-0	
SE LE HACE LA ENTREGA DE LO SIGUIENTE:					
<ul style="list-style-type: none"> • CAMISA DE TRABAJO COLOR AZUL CON FRANJAS PLOMAS • PANTALON DE TRABAJO COLOR AZUL CON FRANJAS PLOMAS • CALZADO TIPO BOTAS COLOR CAFÉ CON PUNTA DE ACERO 					
OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR					
<p>Art. 1.- Obligaciones generales del empleador. -</p> <p>4. <i>Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección individual adecuados.</i></p>					
PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR Y TRABAJADORES					
<p>Art.4.- Prohibiciones del empleador. - La empresa deberá considerar las siguientes prohibiciones:</p> <p>c) <i>Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y equipo de protección personal.</i></p>					
INCUMPLIMIENTOS					
<p>Art. 133.-Incumplimientos</p> <p>b) Faltas graves.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>No cuidar o dar mal uso a los elementos de protección personal.</i> 					
SANCIONES					
<p>Art. 134.-Sanciones</p> <p>c) Sanción pecuniaria administrativa o multa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>No excederá el monto del diez por ciento de la remuneración, y se impondrá por reincidencia en faltas leves en el cumplimiento de sus deberes. En caso de reincidencia, trabajador/a será destituido con sujeción a la ley.</i> 					

COMPROMISO:

Me comprometo a cuidar, mantener en buen estado y usar adecuadamente el equipo de protección personal. Cualquier imprevisto será notificado, teniendo presente que el inadecuado uso del EEP conlleva a sanciones por parte de la empresa.




FIRMA DEL TRABAJADOR

REGISTRO DE ENTREGA DE UNIFORMES		Nº
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Edgar Miranda	
CATEGORÍA OCUPACIONAL:		CÉDULA: 0601916327
<p align="center">SE LE HACE LA ENTREGA DE LO SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAMISA DE TRABAJO COLOR AZUL CON FRANJAS PLOMAS • PANTALON DE TRABAJO COLOR AZUL CON FRANJAS PLOMAS • CALZADO TIPO BOTAS COLOR CAFÉ CON PUNTA DE ACERO 		
<p>OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR</p> <p>Art. 1.- Obligaciones generales del empleador. –</p> <p>4. <i>Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección individual adecuados.</i></p>		
<p>PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR Y TRABAJADORES</p> <p>Art.4.- Prohibiciones del empleador. - La empresa deberá considerar las siguientes prohibiciones:</p> <p>c) <i>Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y equipo de protección personal.</i></p>		
<p>INCUMPLIMIENTOS</p> <p>Art. 133.-Incumplimientos</p> <p>b) Faltas graves.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>No cuidar o dar mal uso a los elementos de protección personal.</i> 		
<p>SANCIONES</p> <p>Art. 134.-Sanciones</p> <p>c) Sanción pecuniaria administrativa o multa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>No excederá el monto del diez por ciento de la remuneración, y se impondrá por reincidencia en faltas leves en el cumplimiento de sus deberes. En caso de reincidencia, trabajador/a será destituido con sujeción a la ley.</i> 		

COMPROMISO: Me comprometo a cuidar, mantener en buen estado y usar adecuadamente el equipo de protección personal. Cualquier imprevisto será notificado, teniendo presente que el inadecuado uso del EEP conlleva a sanciones por parte de la empresa.


 FIRMA DEL TRABAJADOR

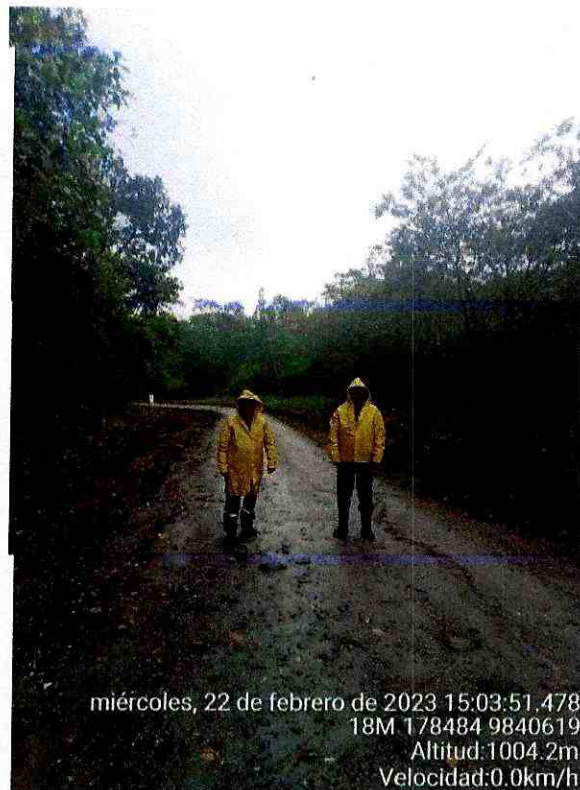

miércoles, 22 de febrero de 2023 15:03:51.478
18M 178484 9840619
Altitud:1004.2m
Velocidad:0.0km/h



Fotografía 10, 11 y 12 . Uso y entrega del equipo de protección personal.

ANEXO 10. Señalética



Fotografía 13 y 14. Señalética existente en los frentes de trabajo.



Fotografía 15 . Aspersión de agua en la vía intervenida

ANEXO 11. Zonificación de áreas



Fotografía 16 y 17. Delimitación de frentes de trabajo con cinta de peligro.

ANEXO 12. Volquetas cubiertas con lona



Fotografía 18. Volqueta cubierta con lona.

ANEXO 13. Vías despejadas



Fotografía 19 y 20. Vías despejadas en los distintos frentes del proyecto.



Fotografía 21. Kit antiderrame existente en el proyecto.

ANEXO 15. Área para almacenamiento de combustible



Fotografía 22. Bodega de almacenamiento ubicada en el campamento de la compañía contratista.



Fotografías 23. Área de desechos peligrosos, con piso impermeable, bajo cubierta y señalética.

ANEXO 17. Dotación de fundas plásticas



*Fotografía 24. Dotación de fundas plásticas a los Sres.
Transportistas.*

ANEXO 18. Capacitaciones



Fotografía 25 y 26. Capacitación en los temas de seguridad, salud y ambiente.

ANEXO 19. Socialización con la comunidad



Fotografía 27. Socialización con la comunidad de Jatun Paccha.

ANEXO 20. Buzón de sugerencias



Fotografía 28. Buzón de quejas ubicado en el frente de la obra.



AMAZONAS BUILDING S.A.
Puyo - Pastaza - Ecuador

PLAN DE CONTINGENCIA

**ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE
ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO
12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN
PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**

PREPARADO PARA:

GADP DE PASTAZA



ELABORADO POR:

ING. LESLIE CASTILLO POZO

2022



Contenido

1. GENERALIDADES	1
1. OBJETIVOS	3
2. ENTIDADES DE APOYO ANTE UNA CONTINGENCIA	3
2.1. Cuerpo de bomberos	4
Tabla 1. Cuerpo de bomberos	4
2.2. Salud	4
TABLA 2. CENTROS DE SALUD	4
2.3. Policía	4
Tabla 3. Unidad de policía comunitaria	4
2.4. CRUZ ROJA	4
Tabla 4. Cruz roja ecuatoriana	4
3. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	4
3.1. Recursos humanos	5
3.2. Recursos físicos y logísticos	5
3.3. Recursos físicos y logísticos	5
3.4. Recursos económicos	5
4. CAPACITACIÓN	5
4.1. Divulgación	5
4.2. Capacitación	6
4.3. Entrenamiento	6
FIGURA 1. Organigrama para la atención de emergencia	6
5. PLANES DE RESPUESTA A CONTINGENCIAS	7
FIGURA 1. Organigrama para la atención de emergencia	7
6. Firma de responsabilidad	10



PLAN DE CONTINGENCIA

ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

1. GENERALIDADES

El Plan de Contingencias se presenta para hacer frente oportunamente a las contingencias ambientales, estas están referidas a la ocurrencia de efectos adversos sobre el ambiente debido a situaciones de origen natural o producto de actividades humanas, situaciones no previsibles que están en directa correlación con el potencial de riesgo y vulnerabilidad del área y del proceso productivo.

Las **actividades**, no ofrecen mayores riesgos de contingencia para el medio ambiente, sin embargo, puede considerarse como contingencias, los riesgos por derrame de hidrocarburos, incendios y sismos.

Es política del proyecto; **"ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**, que trabajadores, así como todo usuario deberá tener en cuenta la seguridad física y de salud, en caso de emergencia dentro de las actividades relacionadas con materiales áridos y pétreos y en apoyo a las poblaciones cercanas.

2. OBJETIVOS

- Establecer las medidas de prevención, atención y control requeridas para atender eventos o siniestros, con fin de manejar eventualidades naturales y accidentes laborales que pudieran ocurrir en el área de influencia del proyecto.
- Asignar funciones y responsabilidades dentro del personal vinculado al área, que permitan generar acciones operativas prácticas, eficaces, ágiles frente a la probable ocurrencia de un evento o siniestro.

Proporcionar la información necesaria al personal que labora en el **ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**, para que puedan responder de forma inmediata y correcta a las situaciones de emergencia.

3. ENTIDADES DE APOYO ANTE UNA CONTINGENCIA

Ante la posible ocurrencia de contingencia que por su magnitud e implicaciones no pueden ser atendidas totalmente por el **ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**, es necesario el apoyo y participación de entidades públicas con objetivos e infraestructura diseñados para la atención de emergencias, continuación, se relacionan las entidades de apoyo para la atención de contingencias en el área de influencia del **ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**.



a. Cuerpo de bomberos

En la parroquia Madre Tierra donde se encuentran ubicada y operando del ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA*, al estar ubicada entre dos cantones, se puede contar con dos estaciones de bomberos los cuales prestan apoyo en una situación de emergencia

Tabla 1. Cuerpo de bomberos

ESTACION	DIRECCION	TELÉFONO
Estación de bomberos Shell	La Misericordia	032790122
Cuerpo de bomberos Puyo	Av. Alberto Zambrano, Km 1/2, vía Macas	032930173

b. Salud

El sistema de salud de Ecuador esta compuesto por dos sectores, público y privado. El sector público comprende al Ministerio de Salud Pública (MSP), y el instituciones de seguridad social Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)

TABLA 2. Centros de salud

ESTACION	DIRECCION	TELÉFONO
Subcentro de salud	Cabeceza parroquial	032884067
IESS	Calle Tomas Ibarra y Crespo	032885010

c. Policía

Las **Unidades de Policía Comunitaria (UPC)** juegan un papel fundamental en el nuevo modelo de gestión de la Policía Nacional, donde el acercamiento a la ciudadanía es la base para los programas de prevención de delitos, así como el centro de integración de los barrios y comunidades en torno a la seguridad

Tabla 3. Unidad de policía comunitaria

ESTACION	DIRECCION	TELÉFONO
UPC	Cabeceza parroquial, Av. Principal	032011117

d. CRUZ ROJA

La Cruz Roja, nacida del deseo de prestar auxilio sin discriminación, a todas las heridas en el campo de batalla, se fundamenta en su capacidad internacional y nacional de prevenir y aliviar el sufrimiento humano dondequiera que se encuentre. Su propósito es proteger la vida y la salud y hacer respetar a la vida humana. Promueve la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre los pueblos.

Tabla 4. Cruz roja ecuatoriana

ESTACION	DIRECCION	TELÉFONO
CRUZ ROJA	Calle 9 de octubre, esquina con parroquia 22 de mayo	032881388

4. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS





MAZONAS BUILDING S.A.

Puyo - Pastaza - Ecuador

Los recursos humanos, logísticos, físicos y económicos necesarios para atender las contingencias se enuncian a continuación:

a. Recursos humanos

Los recursos humanos están representados por el personal capacitado y entrenado que conforma los comités y grupos mencionados anteriormente; adicionalmente se encuentra el personal perteneciente a las unidades de apoyo.

b. Recursos físicos y logísticos

Dentro de estos recursos encontramos todos los elementos, equipos y maquinaria necesarios para afrontar una contingencia

c. Recursos físicos y logísticos

Dentro de estos recursos encontramos todos los elementos, equipos y maquinaria necesarios para afrontar una contingencia.

- Unidades móviles
- Celulares
- Equipos contra incendios
- Equipo de primeros auxilios
- Equipos para control de movimientos de remoción en masa

d. Recursos económicos

Se deberá disponer de un rubro económico que de visibilidad al Plan Contingencia y que cubra en gran medida los gastos correspondientes a la atención de emergencias.

5. CAPACITACION

Con el fin de asegurar un óptimo desarrollo del Plan de Contingencias se implementarán planes de capacitación, divulgación y entrenamiento para todo el personal que labore en la obra. Las actividades de capacitación, divulgación y entrenamiento irán dirigidas al personal directivo, profesional, técnico y obrero del ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

ii. Divulgación

El objetivo de la divulgación del Plan de Contingencias es de informar y dar herramientas al personal que labora en el ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA para realizar las acciones que deben seguir en el momento de afrontar una emergencia; adicionalmente se pretende comunicar las responsabilidades y la forma organizacional del Plan de Contingencias.

Para conseguir este objetivo se realizarán las siguientes actividades:

- **Charlas y conferencias:** se realizarán charlas y conferencias donde se traten los siguientes temas: definición, objetivos, estructura y alcance del plan de contingencias, causa magnitud y consecuencia de los riesgos, identificación de áreas más vulnerables (zonas de riesgo), seguridad industrial y salud ocupacional, medidas preventivas, primeros auxilios, comportamiento de las personas durante la emergencia, técnicas de orientación y movilización, manejo de información y medios de comunicación y equipos utilizados para la emergencia e instrucciones de manejo.
- **Folleto y cartillas:** se elaborarán folletos y cartillas didácticas, de forma sencilla donde se explique el manejo de equipos, información y medios de comunicación durante una



MAZONAS BUILDING S.A.

Puyo - Pastaza - Ecuador

emergencias, pasos a seguir durante una emergencia y sitios seguros. Este material se entregará a todo el personal.

b. Capacitación

Se iniciará un periodo de capacitación, en el cual participarán entidades especializadas en atención de emergencia y desastres como la Cruz Roja, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, entre otras.


c. Entrenamiento

Con el propósito de que el personal que labora en el ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, tenga un mejor desenvolvimiento ante una situación de emergencia, se programarán cursos, talleres y simulacros, consiguiendo una mejor preparación de dicho personal.

Los talleres y cursos están enfatizados en temas como: manejo de contingencias, uso de equipos, sistema de evacuación, atención de heridos, sistema de comunicación de emergencias y prestación de primeros auxilios.

Los simulacros se planificarán con anterioridad a su ejecución, estos serán evaluados con el fin de corregir las falencias presentadas al atender una emergencia.

FIGURA 1. Organigrama para la atención de emergencias.

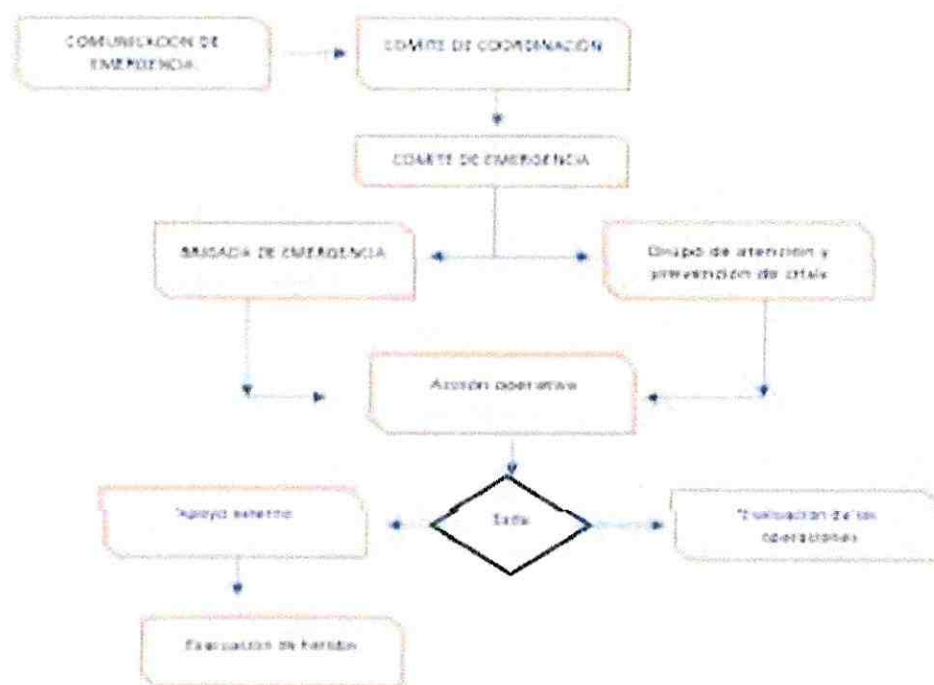



6. PLANES DE RESPUESTA A CONTINGENCIAS

En el presente numeral se describen los planes de atención de emergencias, que contienen los procedimientos y acciones particulares para atender a cada uno de los riesgos en el momento de su desarrollo.

• Procedimiento

- Ubicar el lugar del accidente
- Movilizar los recursos necesarios para atender los heridos.
- Identificar el personal herido.
- Retirar al personal herido a un lugar seguro para brindarles los primeros auxilios.
- Evaluar la condición del accidentado y su traslado a un centro de salud.
- Trasladar el (los) herido(s) al centro de salud más cercano a la obra.
- Evaluar las causas del accidente y describir las lesiones.

CONTINGENCIA: ACCIDENTE DE TRABAJOS

AREA CRITICA

- Frentes de trabajo.
- Campamentos.


MEDIDAS PREVENTIVAS

- Se debe cumplir cuidadosamente las normas de seguridad industrial.
- Usar elementos de protección personal.
- Realizar adecuadamente el trabajo designado a cada personal.
- Implementar medidas de seguridad en el ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.
- Colocación de advertencia y barreras en los sitios de mayor probabilidad de ocurrencia de accidentes.
- Utilizar rutas de viaje y medios seguros de acceso.
- Señalización clara que comunique al personal y a la comunidad al tipo de riesgo al que se exponen.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE LA CONTINGENCIA

- Comunicar inmediatamente la contingencia al Comité Coordinador del plan, quien a su vez informará al Comité de Emergencias.
- El comité de emergencia atenderá de inmediato el evento, desplazando recursos como personal capacitado, vehículos para transportar heridos al lugar del accidente.
- Luego, según sea la gravedad del evento, se pedirá apoyo a las entidades externas, como hospitales, bomberos y otros del municipio de Soacha.
- Simultáneamente se evacuará todo el personal del lugar del accidente.
- Una vez controlada la emergencia se hará una evaluación de los hechos que originaron el accidente y la magnitud de su gravedad.

FIGURA 1: Organigrama para la atención de emergencia



RESPONSABLE:

CONTINGENCIA: ACCIDENTE DE TRABAJOS

AREA CRITICA

- Manipulación de hidrocarburos, aceites, combustibles, grasas, aceites usados.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- El tanque donde se almacena los hidrocarburos, aceites, combustibles, grasas, aceites usados, deberá ser de materiales apropiados y no presentar escapes.
- Se colocará una señal cerca del depósito donde se indique que es prohibido fumar.
- El depósito deberá contar con el siguiente equipo: extintores portátiles.
- Durante el recibo y suministro de hidrocarburos, aceites, combustibles, grasas, aceites usados, se pueden presentar accidentes que ocasionen derrames, por lo que los encargados de esta labor deben ser personas capacitadas en el manejo de hidrocarburos.
- El aprovisionamiento de combustible a la maquinaria o equipo pesado se realizará en el mismo frente de trabajo, tomando todas las medidas preventivas del caso.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE LA CONTINGENCIA

- El comité de emergencias evaluará el evento determinando su magnitud.
- Se realizará un control inmediato de la fuente, en caso de presentarse el derrame durante el recibo o suministro, o por falla del tanque de almacenamiento.
- Se deberá aislar la zona del derrame y evitar que se acerque personal, pues se debe evitar la posibilidad de ocurrencia de un incendio.
- De manera inmediata se procederá a remover en su totalidad el hidrocarburo derramado.
- En caso de presentarse el derrame de hidrocarburos, aceites, combustibles, grasas, aceites usados, por el volcamiento de un vehículo, se dará aviso al comité coordinador, quien dependiendo de la magnitud del daño instruirá al comité de emergencias para activar el plan de acción que consiste en la interceptación del derrame mediante zanjas construidas en el camino de migración del combustible.
- Controlado el evento se realizará una evaluación de los efectos sobre el suelo, para posteriormente restaurar el área afectada.

RESPONSABLE: Departamento ambiental, seguridad y salud ocupacional.

AMAZONAS BUILDING S.A.

Puyo - Pastaza - Ecuador

AREA CRITICA

Area de influencia del ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

PROCEDIMIENTO EN CASO DE LA CONTINGENCIA

- El personal debe mantener la calma y controlar el pánico.
- Detener todas las actividades que estén siendo realizadas en ese momento.
- El personal deberá evacuar las áreas de trabajo inmediatamente y desplazarse a espacios abiertos para evitar ser atrapados.
- Se verificará si falta personal.
- Verificará el estado de las comunicaciones, de la infraestructura y del personal.
- Se convocará la Brigada de Emergencias para que rescate y de primeros auxilios a los heridos; la brigada activará el procedimiento ante emergencia descrito en el numeral.
- Una vez evacuados los heridos se evaluarán los daños producidos por el sismo.
- Seguidamente se procederá a adecuar la zona afectada eliminando riesgo de derrumbes, escombros, etc.
- Recuperar la estabilidad del lugar.

RESPONSABLE: Departamento ambiental, seguridad y salud ocupacional.

CONTINGENCIA: INUNDACIONES

AREA CRITICA

Area de influencia del ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

PROCEDIMIENTO EN CASO DE LA CONTINGENCIA

- Si mientras se conduce se produjera en el trayecto una inundación el conductor deberá disminuir la velocidad y ubicar, en las cercanías y a la brevedad posible, un lugar donde pueda estacionar la unidad de transporte en sitio apartado de zona de ocurrencia.
- Permanecer dentro de la cabina atento a la intensidad de la inundación y a la dirección de su desplazamiento las cuales podrían comprometer a la unidad de transporte.
 - Mantener la calma, evaluar la situación y de ser factible reubicar la posición de la unidad de transporte a otra más segura. Si la situación es crítica y se torna peligrosa para su integridad personal descender del vehículo y buscar ponerse a salvo en otra zona.
 - De ser el caso, comunicar el evento a las autoridades locales.

RESPONSABLE: Departamento ambiental, seguridad y salud ocupacional.

7. Firma de responsabilidad

ELABORADO POR:

Ing. Leslie Castillo
TÉCNICO AMBIENTAL DE LA COMPAÑÍA
AMAZONAS BUILDING.



LESLIE
VERÓNICA
CASTILLO SOTO

APROBADO POR:

Sr. Odilio Guevara
GERENTE DE LA COMPAÑÍA AMAZONAS
BUILDING.



ODILIO VINICIO
GUEVARA MARÍN



MAZONAS BUILDING S.A.

Puyo - Pastaza - Ecuador

FACTURAS

"ASFALTADO DE LA VIACURARAY -FRANCISCO DE ORELLANA-JATUN PACCHA, HASTA EL KILOMETEO
12 VIA 10 DE AGOSTO -EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600294852001

FACTURA

No. 001-101-00000080

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

080220230116002948520012001101000000800000000113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/02/2023 19:52:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



080220230116002948520012001101000000800000000113

TORRES TAMAYO JONATHAN RODOLFO

TORRES TAMAYO JONATHAN RODOLFO INGENIERO CIVIL

Dirección Matriz: MARCO AURELIO SUBIA

Dirección Sucursal: MARCO AURELIO SUBIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 08/02/2023 Placa / Matricula: Guía

Dirección: BARRIO MIRAFLORES LUIS MOLINA Y FIDEL RODRIGUEZ

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
57	57	1.00	RESIDENTE DE OBRA PARA EL PROYECTO ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACHA HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO CANTON PASTAZA PROVINCIA PASTAZA. CORRESPONDIENTE PARA EL MES DE ENERO DEL 2023.		2732.14	0.00	0.00	0.00	2732.14

Información Adicional	
eMail:	jinmarinm@hotmail
Sistema:	FenixPRO
Vendedor:	ZULLY PERALVO
Telefono:	032808377
Correo:	jtorresft2019@gmail.com
Forma Pago:	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD-3060.00
Plazo:	15 DIAS

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3060.00

SUBTOTAL 12%	2732.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2732.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	327.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3060.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600282295001

FACTURA

No. 001-100-000000004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0902202301160028229500120011000000000049067236313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/02/2023 23:58:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0902202301160028229500120011000000000049067236313

GASPATA CALO EDGAR RAUL

Dirección Matriz: Barrio: MARISCAL Calle: AV. ALBERTO ZAMBRANO
Número: S/N Intersección: AMAZONAS

Dirección Sucursal: Barrio: MARISCAL Calle: AV. ALBERTO ZAMBRANO
Número: S/N Intersección: AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 09/02/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Puyo, Via Tarquí

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003		29.00	SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ENERO DEL 2023		60.00	0.00	0.00	0.00	1740.00

Información Adicional

Email: Amazo_Building2009@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1948.80

SUBTOTAL 12%	1740.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1740.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	208.80
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1948.80

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



TECHNOLOGY INNOVATION IN
INVESTMENT PROJECTS

GASPATA CALO EDGAR RAUL

Dirección Barrio: MARISCAL Calle: AV. ALBERTO ZAMBRANO
Matriz: Número: S/N Intersección: AMAZONAS

Dirección Barrio: MARISCAL Calle: AV. ALBERTO ZAMBRANO
Sucursal: Número: S/N Intersección: AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1600282295001

FACTURA

No. 001-100-000000005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1403202301160028229500120011000000000053043287817

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 14/03/2023 10:44:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1403202301160028229500120011000000000053043287817

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación 1691710080001

Fecha 14/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004		25.00	SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023		60.00	0.00	0.00	0.00	1500.00

Información Adicional

Telefono: 0999813185

Email: Amazo_Building2009@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1680.00

SUBTOTAL 12%	1500.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1500.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	180.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1680.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600232332001

FACTURA

No. 001-100-00000002

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

140220230116002323320012001100000000022845483117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2023 10:51:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



140220230116002323320012001100000000022845483117

LASCANO COELLO WASHINGTON EDUARDO

Dirección Matriz: Barrio: LA MERCED Calle: SADOG VALLADARES Intersección: MEDARDO ANGEL SILVA

Dirección Sucursal: Barrio: LA MERCED Calle: SADOG VALLADARES Intersección: MEDARDO ANGEL SILVA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 14/02/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: AV. TARQUI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		660.00	0.00	0.00	0.00	660.00

Información Adicional

Teléfono: 0999813185

Email: jinmarinm@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	739.20

SUBTOTAL 12%	660.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	660.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	79.20
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	739.20

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1000100899001

FACTURA

No. 001-014-000001431

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2502202301100010089900120010140000014310000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2023 11:08:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2502202301100010089900120010140000014310000000016

VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL

E/S AZOR

Dirección Matriz: LAS PALMAS AV ALBERTO ZAMBRANO S/N VIA PUYO

Dirección Sucursal: LAS PALMAS AV ALBERTO ZAMBRANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710000001

Fecha: 25/02/2023 Placa / Matricula: ZZZ9999 Guía

Dirección: BARRIO MIRAFLORES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	3	1000.00	DIESEL PREMIUM		1.56	1.53	3.09	0.00	1562.50

Información Adicional	
Factura:	001-014-000001431
E_MAIL:	jinmarinm@hotmail.com
Dirección_Cliente:	BARRIO MIRAFLORES
Telefono_Cliente:	0
Código_Cliente:	66

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1750.00

SUBTOTAL 12%	1562.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1562.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	187.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1750.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	3461.87
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1711.87

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1000100899001

FACTURA

No. 001-014-000001431

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2502202301100010089900120010140000014310000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2023 11:08:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2502202301100010089900120010140000014310000000016

VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL

E/S AZOR

Dirección Matriz: LAS PALMAS AV ALBERTO ZAMBRANO S/N VIA PUYO

Dirección Sucursal: LAS PALMAS, AV ALBERTO ZAMBRANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 25/02/2023

Placa / Matrícula: ZZZ9999

Guía

Dirección: BARRIO MIRAFLORES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	3	1000.00	DIESEL PREMIUM		1.56	1.53	3.09	0.00	1562.50

Información Adicional

Num_Factura: 001-014-000001431
E_MAIL: jinmarinm@hotmail.com
Direccion_Cliente: BARRIO MIRAFLORES
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 66

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1750.00

SUBTOTAL 12%	1562.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1562.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	187.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1750.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	3461.87
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1711.87

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1702962331001

FACTURA

No. 001-003-000001491

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2502202301170296233100120010030000014910000149112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/02/2023 12:59:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2502202301170296233100120010030000014910000149112

ROMO PROANO ANGEL ENRIQUE

TODO FIERRO

Dirección Matriz: LIBERTAD ARAJUNO S/N Y CURARAY

Dirección Sucursal: LIBERTAD ARAJUNO S/N Y CURARAY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1,

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING

Identificación: 1691710080001

Fecha: 25/02/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: AV TARQUI Y LOS LAURE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MOTOR7		1.00	MOTOR 7.5 HP 220 BIFASICO		669.64	0.00	0.00	0.00	669.64
VR		1.00	VARILLAS		10.71	0.00	0.00	0.00	10.71
KINOX		1.00	ELECTRODO AWS E 308L 17 3 32 1 5KG		40.18	0.00	0.00	0.00	40.18
RODEL12 MM		2.00	RODELA PLANA DE 1 2 12MM		0.54	0.00	0.00	0.00	1.07
PLT		50.00	PLATINA		2.77	0.00	0.00	0.00	138.39
PERN30		2.00	PERNO DE 30MM DE ESPESOR		7.14	0.00	0.00	0.00	14.29
VAROSC3/4		0.33	VARILLA ROSCADA DE 3 4		6.76	0.00	0.00	0.00	2.23
TUERC3/4		2.00	TUERCA DE 3 4		0.67	0.00	0.00	0.00	1.34
MACHUEL O		1.00	MACHUELO VARIAS MEDIDAS		7.59	0.00	0.00	0.00	7.59
RES		1.00	RESORTES		2.68	0.00	0.00	0.00	2.68
VAR16		1.00	VARILLA DE 5 8		8.04	0.00	0.00	0.00	8.04
TUERC30 MM		2.00	TUERCA DE 30MM		2.68	0.00	0.00	0.00	5.36
EJPERF		10.00	EJE PERFORADO		2.68	0.00	0.00	0.00	26.79

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RODELAS		1.00	RODELAS PLANCHA		13.39	0.00	0.00	0.00	13.39
CHUMP21 ONTN		2.00	CHUMACERA 210 NTN		57.14	0.00	0.00	0.00	114.29
CHUMP21 OISB		1.00	CHUMACERA 210 ISB		28.57	0.00	0.00	0.00	28.57

Información Adicional	
Email:	jinmarinm@hotmail.com
Dirección:	AV TARQUI Y LOS LAURE
cliente:	00000088
AGENTE DE RETENCION:	No RESOLUCION : 0001

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1214.70

SUBTOTAL 12%	1084.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1084.55
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	130.15
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1214.70
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	1214.70
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1000100899001

FACTURA

No. 001-014-000001427

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202301100010089900120010140000014270000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/02/2023 11:18:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202301100010089900120010140000014270000000011

VILLARRUEL BURBANO JOSÉ RAUL

E/S AZOR

Dirección Matriz: LAS PALMAS AV ALBERTO ZAMBRANO S/N VIA PUYO

Dirección Sucursal: LAS PALMAS, AV ALBERTO ZAMBRANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 24/02/2023

Placa / Matricula: ZZZ9999

Guía

Dirección: BARRIO MIRAFLORES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	3	500.00	DIESEL PREMIUM		1.56	1.53	3.09	0.00	781.25

Información Adicional

Num_Factura: 001-014-000001427
_MAIL: jinmarinm@hotmail.com
Direccion_Cliente: BARRIO MIRAFLORES
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 66

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	875.00

SUBTOTAL 12%	781.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	781.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	93.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	875.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	1730.93
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	855.93

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1000100899001

FACTURA

No. 001-014-000001428

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202301100010089900120010140000014280000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/02/2023 11:18:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202301100010089900120010140000014280000000015

VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL

E/S AZOR

Dirección Matriz: LAS PALMAS AV ALBERTO ZAMBRANO S/N VIA PUYO

Dirección Sucursal: LAS PALMAS, AV ALBERTO ZAMBRANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 24/02/2023 Placa / Matrícula: ZZZ9999 Guía

Dirección: BARRIO MIRAFLORES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	3	1000.00	DIESEL PREMIUM		1.56	1.53	3.09	0.00	1562.50

Información Adicional

Num_Factura: 001-014-000001428
_MAIL: jinmarinm@hotmail.com
Direccion_Cliente: BARRIO MIRAFLORES
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 66

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1750.00

SUBTOTAL 12%	1562.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1562.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	187.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1750.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	3461.87
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1711.87

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1701952069001

FACTURA

No. 001-014-000000679

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202301170195206900120010140000006790000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/02/2023 11:10:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202301170195206900120010140000006790000000018

FUENTES FLORES MARIA DEL CARMEN

E/S AZOR SHELL

Dirección Matriz: AV PADRE LUIS JACOME

Dirección Sucursal: AV. BARRIO LAS PALMAS, AV. ALBERTO ZAMBRANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 24/02/2023 Placa / Matrícula: ABC9999 Guía

Dirección: BARRIO MIRAFLORES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	3	500.04	DIESEL PREMIUM		1.56	1.53	3.09	0.00	781.31

Información Adicional

Num_Factura: 001-014-000000679
_MAIL: shellazor.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente: BARRIO MIRAFLORES
Telefono_Cliente: 000
Codigo_Cliente: 45848

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	875.07

SUBTOTAL 12%	781.31
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	781.31
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	93.76
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	875.07
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	1731.06
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	856.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600438509001

FACTURA

No. 001-002-000000087

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2302202301160043850900120010020000000871234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2023 12:55:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302202301160043850900120010020000000871234567811

CAJAMARCA ESCOBAR SANTIAGO ALEJANDRO

CAJAMARCA ESCOBAR SANTIAGO ALEJANDRO

Dirección Matriz: AV. LUIS A. MARTINEZ 220 Y GARCIA MORENO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 23/02/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: AVENIDA TARQUI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0017		200.00	M3 triturado 3/8		12.00	0.00	0.00	0.00	2400.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: AVENIDA TARQUI

TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 0999813185

EMAIL DEL ADQUIRENTE: jinmarinm@hotmail.com

OBSERVACION: P/R TRITURADO

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2688.00

SUBTOTAL 12%	2400.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2400.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	288.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	2688.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1691701723001

FACTURA

No. 001-001-000001760

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2202202301169170172300120010010000017607477040617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/02/2023 14:51:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2202202301169170172300120010010000017607477040617

WILISELZU CIA LTDA

WILISELZU CIA LTDA

Dirección Matriz: CHIMBORAZO Y MANABI

Dirección Sucursal: CHIMBORAZO Y MANABI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 001

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING

Identificación: 1691710080001

Fecha: 22/02/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0003		333.00	RIPIO TRITURADO 3/4"		15.00	0.00	0.00	0.00	4995.00
0004		768.00	CHISPA		13.00	0.00	0.00	0.00	9984.00
0006		179.00	ARENA NEGRA		7.00	0.00	0.00	0.00	1253.00

SUBTOTAL 12%	16232.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16232.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1947.84
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18179.84

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18179.84

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600132607001

FACTURA

No. 001-002-000000332

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0902202301160013260700120010020000003322302091515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/02/2023 14:19:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0902202301160013260700120010020000003322302091515

GUACHO CALDERON ROSA ELVIRA

REPUESTOS VILLAFUERTE

Dirección Matriz: AV. ALBERTO ZAMBRANO Y AV. LA TARQUI

Dirección Sucursal: AV ALBERTO ZAMBRANO Y AV. TARQUI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDIND

Identificación: 1691710080001

Fecha: 09/02/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: PUYO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
839	839	3.00	RELAY 12V		7.14	0.00	0.00	0.00	21.43
RLY-008	RLY-008	2.00	RELAY 24V 4P 20 30AMP UNIVERSAL MITSUBISHI HINO UND		6.25	0.00	0.00	0.00	12.50
SOQ5	SOQ5	3.00	SOQUET RELAY 5T CERAMICA		2.23	0.00	0.00	0.00	6.70
48328	48328	1.00	FOCO H7 12V 55W NARVA		7.14	0.00	0.00	0.00	7.14
SK 111	SK 111	1.00	SOQUET AIRE MONTAJE PARA REPUESTO CITROEN AUDI		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
P6X15	P6X15	5.00	PERNO 6X15 MM NG		0.43	0.00	0.00	0.00	2.14
CB6	CB6	1.00	CABLE BATERIA 6 N/R		4.29	0.00	0.00	0.00	4.29
BOR 360	BOR 360	2.00	BORNES BATERIA GRANDE PAR POSIT NEGAT UNI		2.23	0.00	0.00	0.00	4.46
TERM1/4	TERM1/4	20.00	TERMINAL 1/4		0.22	0.00	0.00	0.00	4.46
48892	48892	1.00	FOCO H4 24V 75/70 P43T NARVA		8.93	0.00	0.00	0.00	8.93
FLA-036	FLA-036	1.00	FLASER 24V CHEVROLET NQR NPR 4HF1 4HG1 3P		35.71	0.00	0.00	0.00	35.71
JHN 219-180117	JHN 219-180117	2.00	LUNA POS.RJ.HINO RANGER-180117		1.79	0.00	0.00	0.00	3.57

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
GA716	GA716	2.00	REG ALT 12V -CHEVROLET AVEO EMOTION.FAMILY.ACTIVO.CHE		31.25	0.00	0.00	0.00	62.50
6X30PO	6X30PO	3.00	PERNO ORIGINAL AM 6X30 S/TUERCA		0.45	0.00	0.00	0.00	1.34
CB1/0	CB1/0	2.00	CABLE BATERIA 1/0 NG/RJ		17.86	0.00	0.00	0.00	35.71
1022	1022	2.00	TERMINAL DE COBRE		1.79	0.00	0.00	0.00	3.57

Información Adicional	
RIMPE:	Contribuyente Régimen RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	242.68

SUBTOTAL 12%	216.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	216.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	26.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	242.68
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1690015133001

FACTURA

No. 001-901-000000249

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1602202301169001513300120019010000002490000007217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/02/2023 12:06:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602202301169001513300120019010000002490000007217

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN VOLQUETES RIO PASTAZA

COOPERATIVA DE VOLQUETAS RIO PASTAZA

Dirección Matriz: AV. ALBERTO ZAMBRANO

Dirección Sucursal: AV. ALBERTO ZAMBRANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1,

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 16/02/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
160		2.00	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO ALLISHUNGO		90.00	0.00	0.00	0.00	180.00
160		4.00	TRANSPORTE DE MATERIAL STOCK		20.00	0.00	0.00	0.00	80.00
160		12.00	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO JATUNPACHA		51.30	0.00	0.00	0.00	615.60
160		11.00	TRANSPORTE DE MATERIAL JATUNPACHA		48.96	0.00	0.00	0.00	538.56
160		7.00	TRANSPORTE DE MATERIAL JATUNPACHA		56.44	0.00	0.00	0.00	395.08

Información Adicional	
Dirección:	PUYO VIA TARQUI
Teléfono:	0993328972
Email:	jinmarinm@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1809.24

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1809.24
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1809.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1809.24
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO : (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1000100899001

FACTURA

No. 001-014-000001406

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1602202301100010089900120010140000014060000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/02/2023 09:58:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602202301100010089900120010140000014060000000010

VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL

E/S AZOR

Dirección Matriz: LAS PALMAS AV ALBERTO ZAMBRANO S/N VIA PUYO

Dirección Sucursal: LAS PALMAS, AV ALBERTO ZAMBRANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 16/02/2023 Placa / Matrícula: ABE4997 Guía

Dirección: BARRIO MIRAFLORES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	1	152.01	EXTRA		2.14	0.42	2.56	0.00	325.73
0121	3	2222.94	DIASEL PREMIUM		1.56	1.53	3.09	0.00	3473.34

Información Adicional

Num_Factura: 001-014-000001406
E_MAIL: jinmarinm@hotmail.com
Direccion_Cliente: BARRIO MIRAFLORES
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 66
Comentarios: CONSUMO DEL 30/01 AL 15/02

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4254.96

SUBTOTAL 12%	3799.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3799.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	455.89
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4254.96

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	8131.43
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3876.48

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1701952069001

FACTURA

No. 001-014-000000676

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1502202301170195206900120010140000006760000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/02/2023 10:50:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1502202301170195206900120010140000006760000000012

FUENTES FLORES MARIA DEL CARMEN

E/S AZOR SHELL

Dirección AV PADRE LUIS JACOME
Matriz:

Dirección AV. BARRIO LAS PALMAS, AV. ALBERTO ZAMBRANO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 15/02/2023

Placa / Matricula: ABC9999

Guía

Dirección: BARRIO MIRAFLORES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	3	1000.00	DIESEL PREMIUM		1.56	1.53	3.09	0.00	1562.50

Información Adicional

Mum_Factura: 001-014-000000676
_MAIL: shellazor.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente: BARRIO MIRAFLORES
Telefono_Cliente: 000
Codigo_Cliente: 45848

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1750.00

SUBTOTAL 12%	1562.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1562.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	187.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1750.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	3461.87
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1711.87

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600500001001

FACTURA

No. 001-100-000000011

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1502202301160050000100120011000000000113854243814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/02/2023 09:07:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1502202301160050000100120011000000000113854243814

CASTILLO POZO LESLIE VERONICA

Dirección Matriz: EL DORADO

Dirección Sucursal: MORONA SANTIAGO Y POMONA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 15/02/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1,00	HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		216,56	0,00	0,00	0,00	216,56

Información Adicional

Correo electrónico: Jinmarinms@hotmail.com

Teléfono: 0962106301

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	242,55

SUBTOTAL 12%	216,56
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	216,56
TOTAL DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	25,99
TOTAL DEVOLUCION IVA	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	242,55

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600573032001

FACTURA

No. 001-100-000000003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402202301160057303200120011000000000032222260011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2023 13:56:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402202301160057303200120011000000000032222260011

MUÑOZ VELASTEGUI CARLOS VICENTE

Dirección Matriz: Calle: 9 DE OCTUBRE Número: SN Intersección: 24 DE MAYO

Dirección Sucursal: Calle: 9 DE OCTUBRE Número: SN Intersección: 24 DE MAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 14/02/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Via a la tarquí

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0001		1.00	CONTROL Y MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA PESADA		875.00	0.00	0.00	0.00	875.00

Información Adicional

Email: jinmarinm@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	980.00

SUBTOTAL 12%	875.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	875.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	105.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	980.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0401467592001

FACTURA

No. 001-100-000000003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1302202301040146759200120011000000000038170866512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/02/2023 10:32:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1302202301040146759200120011000000000038170866512

NAULA GUANO WASHINGTON VINICIO

Dirección Matriz: Barrio: LA MONTANA Calle: VIA PUYO BAÑOS Número: S/N

Dirección Sucursal: Barrio: LA MONTANA Calle: VIA PUYO BAÑOS Número: S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 13/02/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	POR SERVICIOS PERSONALES PRESTADOS		182.00	0.00	0.00	0.00	182.00

Información Adicional

mail: Amazo_Building2009@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	203.84

SUBTOTAL 12%	182.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	182.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	21.84
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	203.84

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0401467592001

FACTURA

No. 001-100-00000002

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

130220230104014675920012001100000000029738583112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/02/2023 10:28:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



130220230104014675920012001100000000029738583112

NAULA GUANO WASHINGTON VINICIO

Dirección Matriz: Barrio: LA MONTANA Calle: VIA PUYO BAÑOS Número: S/N

Dirección Sucursal: Barrio: LA MONTANA Calle: VIA PUYO BAÑOS Número: S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 13/02/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: AV TARQUI Y LOS LAURELES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	POR SERVICIOS PERSONALES PRESTADOS		729.00	0.00	0.00	0.00	729.00

Información Adicional

Teléfono: 0993328972
Email: jinmarinn@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	816.48

SUBTOTAL 12%	729.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	729.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	87.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	816.48
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1000100899001

FACTURA

No. 001-014-000001395

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1102202301100010089900120010140000013950000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/02/2023 07:57:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1102202301100010089900120010140000013950000000011

VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL

E/S AZOR

Dirección Matriz: LAS PALMAS AV ALBERTO ZAMBRANO S/N VIA PUYO

Dirección Sucursal: LAS PALMAS AV ALBERTO ZAMBRANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 11/02/2023 Placa / Matricula: ABE4997 Guía

Dirección: BARRIO MIRAFLORES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	3	1000.00	DIESEL PREMIUM		1.56	1.53	3.09	0.00	1562.50

Información Adicional

m_Factura: 001-014-000001395
E_MAIL: jinmarinm@hotmail.com
Direccion_Cliente: BARRIO MIRAFLORES
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 66

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1750.00

SUBTOTAL 12%	1562.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1562.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	187.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1750.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	3461.87
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1711.87

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600210064001

FACTURA

No. 001-002-000000155

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1102202301160021006400120010020000001552302111217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/02/2023 12:14:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1102202301160021006400120010020000001552302111217

BARBA CHAVEZ MAURICIO ROLANDO

MARROBA REPUESTOS

Dirección Matriz: AV. ALBERTO ZAMBRANO Y MANUEL SANTOS

Dirección Sucursal: AV. ALBERTO ZAMBRANO Y MANUEL SANTOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING

Identificación: 1691710080001

Fecha: 11/02/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: BARRIO EL DORADO VIA A LA TARQUI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
73756	73756	1.00	481409V-1 ISUZU DBR 370 M83 POS 12 HOJAS DUTRO POST		49.57	0.00	0.00	0.00	49.57

Información Adicional	
RIMPE:	Contribuyente Régimen RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	55.52

SUBTOTAL 12%	49.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	49.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.95
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	55.52

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1691713381001

FACTURA

Nº. 001-010-000000024

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1102202301169171338100120010100000000241234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/02/2023 08:26:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1102202301169171338100120010100000000241234567815

TRANSPORTE PESADO FREIRE CORTEZ S.A

TRANSPORTE PESADO FREIRE CORTEZ S.A

Dirección VIA PUYO - TENA LAS AMERICAS
Matriz:

Dirección VIA PUYO - TENA LAS AMERICAS
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A

Identificación: 1691710080001

Fecha: 11/02/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1001	1001	1.00	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO		186.00	0.00	0.00	0.00	186.00

Información Adicional

Mail: jinmarina@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	186.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	186.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	186.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	186.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1000100899001

FACTURA

No. 001-014-000001390

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1002202301100010089900120010140000013900000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/02/2023 08:47:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1002202301100010089900120010140000013900000000018

VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL

E/S AZOR

Dirección LAS PALMAS AV ALBERTO ZAMBRANO S/N VIA PUYO
Matríz:

Dirección LAS PALMAS AV ALBERTO ZAMBRANO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 10/02/2023

Placa / Matrícula: ZZZ9999

Guía

Dirección: BARRIO MIRAFLORES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	3	1000.00	DIESEL PREMIUM		1.56	1.53	3.09	0.00	1562.50

Información Adicional

Num_Factura: 001-014-000001390
E_MAIL: jinmarinm@hotmail.com
Dirección_Cliente: BARRIO MIRAFLORES
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 66

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1750.00

SUBTOTAL 12%	1562.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1562.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	187.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1750.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	3461.87
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1711.87

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1000100899001

FACTURA

No. 001-014-000001386

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0902202301100010089900120010140000013860000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/02/2023 14:07:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0902202301100010089900120010140000013860000000013

VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL

E/S AZOR

Dirección Matriz: LAS PALMAS AV ALBERTO ZAMBRANO S/N VIA PUYO

Dirección Sucursal: LAS PALMAS, AV ALBERTO ZAMBRANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 09/02/2023 Placa / Matrícula: ZZZ9999 Guía

Dirección: BARRIO MIRAFLORES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	3	1000.00	DIESEL PREMIUM		1.56	1.53	3.09	0.00	1562.50

Información Adicional

Num_Factura: 001-014-000001386
E_MAIL: jinmarinm@hotmail.com
Direccion_Cliente: BARRIO MIRAFLORES
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 66

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1750.00

SUBTOTAL 12%	1562.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1562.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	187.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1750.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	3461.87
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1711.87

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600266819001

FACTURA

No. 004-002-000001189

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0702202301160026681900120040020000011892302071214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2023 12:25:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0702202301160026681900120040020000011892302071214

SAGBAY LITUMA KEHENDY KARINA

TECNOFUEGO

Dirección Matriz: AV. ALBERTO ZAMBRANO Y VIA A TARQUI

Dirección Sucursal: AV. ALBERTO ZAMBRANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING S.A

Identificación: 1691710080001

Fecha: 07/02/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: BARRIO MIRAFLORES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
410	410	49.00	GUANTE DE OPERADOR		1.79	0.00	0.00	0.00	87.50
061	061	2.00	BOTAS PVC S/P DE ACERO		10.71	0.00	0.00	0.00	21.43
192	192	1.00	CINTA PELIGRO DE 200 METROS LINEALES X 12 CM DE ANCHO		13.39	0.00	0.00	0.00	13.39
100	100	24.00	GUANTES DE PUPO		0.89	0.00	0.00	0.00	21.43
091	091	1.00	GUANTE DE CUERO BICOLOR CAFE CON BLANCO		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
363	363	2.00	GUANTE DE NITRILLO		2.23	0.00	0.00	0.00	4.46
042	042	6.00	GAFAS TRANSPARENTES		4.46	0.00	0.00	0.00	26.79
099	099	12.00	CHALECO REFLECTIVO TELA NARANJA		3.12	0.00	0.00	0.00	37.50
461	461	5.00	GAFAS DE SOLDADOR		2.00	0.00	0.00	0.00	10.00
480	480	12.00	TAPONES AUDITIVOS		2.23	0.00	0.00	0.00	26.79
114	114	1.00	EXTINTOR P.Q.S DE 10 LIBRAS NUEVO		21.43	0.00	0.00	0.00	21.43
0062	0062	1.00	EXTINTOR DE 5 LIBRAS P.Q.S. NUEVO		13.39	0.00	0.00	0.00	13.39
587	587	1.00	EXTINTOR DE 150 LIBRAS		267.86	0.00	0.00	0.00	267.86

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
139	139	1.00	CONOS GRANDES 70CM		16.07	0.00	0.00	0.00	16.07
137	137	2.00	CONOS MEDIANOS 18" 27CM		8.93	0.00	0.00	0.00	17.86
230	230	1.00	PONCHO PVC		13.39	0.00	0.00	0.00	13.39
005	005	2.00	CEPILLOS DE ACERO- 3PC WIRE BRUSH SET -		2.23	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional	
RIMPE:	Contribuyente Régimen RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	678.20

SUBTOTAL 12%	605.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	605.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	72.66
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	678.20
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1000100899001

FACTURA

No. 001-014-000001383

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0402202301100010089900120010140000013830000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2023 08:37:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0402202301100010089900120010140000013830000000014

VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL

E/S AZOR

Dirección Matriz: LAS PALMAS AV ALBERTO ZAMBRANO S/N VIA PUYO

Dirección Sucursal: LAS PALMAS AV ALBERTO ZAMBRANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 04/02/2023 Placa / Matrícula: ABE4997 Guía

Dirección: BARRIO MIRAFLORES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	3	1000.00	DIESEL PREMIUM		1.56	1.53	3.09	0.00	1562.50

Información Adicional

Núm_Factura: 001-014-000001383
E_MAIL: jinmarinm@hotmail.com
Dirección_Cliente: BARRIO MIRAFLORES
Teléfono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 66

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1750.00

SUBTOTAL 12%	1562.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1562.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	187.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1750.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	3461.87
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1711.87

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1803258902001

FACTURA

No. 001-003-000001292

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202301180325890200120010030000012922013886110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/02/2023 14:08:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101202301180325890200120010030000012922013886110

TORRES MORALES MARIA GABRIELA

FERRETERIA LA FLORIDA

Dirección Matriz: PASTAZA / PASTAZA / PUYO / VIA A TARQUI S/N Y JORGE ICAZA

Dirección Sucursal: PASTAZA / PASTAZA / PUYO / VIA A TARQUI S/N Y JORGE ICAZA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 31/01/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: PASTAZA / PASTAZA / PUYO / AV. TARQUI S/N Y LOS LAURELES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B221	B221	1.00	CABLE CABLEC 8-7 HILOS GENERAL CABLE		149.60	0.00	0.00	0.00	149.60
APRE2	APRE2	100.00	CABLE FLEXIBLE 10		1.00	0.00	0.00	0.00	99.75
FER01575	FER01575	12.00	HOJA DE ZINC ACESCO DE 6		14.20	0.00	0.00	0.00	170.36
LABRO	LABRO	5.00	PERFIL G 80X1.8 MM		22.07	0.00	0.00	0.00	110.33
FCR3070	C688	105.00	AUTOPERFORANTE 12X2		0.06	0.00	0.00	0.00	6.56
BPP2530	BPP2530	1.00	COPA 5/16		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
D01006	D01006	5.00	QQ CEMENTO CHIMBORAZO		6.92	0.00	0.00	0.00	34.60
BT1170	C589	1.00	CANDADO 40 MM GRAFENO		2.68	0.00	0.00	0.00	2.68
4FRIN01	C594	20.00	CLAVO ACERO UNIDAD		0.04	0.00	0.00	0.00	0.89
820132950 864	820132950 864	4.00	VALVULA ESFERICA 3/4 (PASO)		7.59	0.00	0.00	0.00	30.36
EMS3072	EMS3072	3.50	LB. SOGA/CABO 7/16		2.46	0.00	0.00	0.00	8.59
638060414 941	638060414 941	10.00	TAYPE NEGRO 3/4 3M 20 YD		1.34	0.00	0.00	0.00	13.39
JS0022647 221CE	JS0022647 221CE	1.00	CAL AGRICOLA		3.57	0.00	0.00	0.00	3.57

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B220	V21044	2.00	VALVULA GAS INDUSTRIAL		5.36	0.00	0.00	0.00	10.71
BAJNT4	BAJNT4	1.00	CEPILLO ACERO		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional	
ORDEN DE COMPRA:	NO REGISTRADO
EMAIL.:	jinmarinm@hotmail.com
DIRECCION:	PASTAZA / PASTAZA / PUYO / AV. TARQUI S/N Y LOS LAURELES
TELEFONO:	0993328972
USUARIO:	GABY DAMARIS KAISAR CHUINDA
Agente de Retención:	No.Resolución:1

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	720.35

SUBTOTAL 12%	643.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	643.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	77.18
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	720.35

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1000100899001

FACTURA

No. 001-014-000001351

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202301100010089900120010140000013510000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/01/2023 16:57:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101202301100010089900120010140000013510000000010

VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL

E/S AZOR

Dirección Matriz: LAS PALMAS AV ALBERTO ZAMBRANO S/N VIA PUYO

Dirección Sucursal: LAS PALMAS, AV ALBERTO ZAMBRANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 31/01/2023 Placa / Matricula: ZZZ9999 Guía

Dirección: BARRIO MIRAFLORES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	3	1000.00	DIESEL PREMIUM		1.56	1.53	3.09	0.00	1562.50

Información Adicional	
n_Factura:	001-014-000001351
E_MAIL:	jinmarinm@hotmail.com
Dirección_Cliente:	BARRIO MIRAFLORES
Telefono_Cliente:	0
Código_Cliente:	66

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1750.00

SUBTOTAL 12%	1562.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1562.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	187.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1750.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	3461.87
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1711.87

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400310361001

FACTURA

No. 001-001-000033532

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2701202301140031036100120010010000335327477040618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2023 17:01:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701202301140031036100120010010000335327477040618

RIVERA OTACOMA BLANCA MARLENE

FERRETERIA TOAPANTA RIVERA

Dirección 27 DE FEBRERO Y TENIENTE HUGO ORTIZ
Matríz:

Dirección 27 DE FEBRERO Y TENIENTE HUGO ORTIZ
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1.

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S A

Identificación: 1691710080001

Fecha: 27/01/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PUNACE009		1.00	PUNTA/CINCEL DE ACERO 3/4*13"		4.75	0.00	0.00	0.00	4.75
7314150119028		1.00	FLEXOMETRO BAHCO 3 MTG-3-16-E		3.75	0.00	0.00	0.00	3.75
7702956200796		1.00	COMBO BELLOTA 4LB C/M		10.98	0.00	0.00	0.00	10.98
7705509021626		1.00	DISCO DIAMANTADO CONTINUO ABRACOL 4.1/2"		8.92	0.00	0.00	0.00	8.92
7705509829821		1.00	DISCO DIAMANTADO CONTINUO ABRACOL 7"		13.39	0.00	0.00	0.00	13.39
C6105		1.00	PERMATEX 11OZ		4.78	0.00	0.00	0.00	4.78
7702956208563		2.00	LLANA BELLOTA 5864 MANGO NEGRO		9.15	0.00	0.00	0.00	18.30
799592000375		4.00	LIJA D/AGUA FANDELI 220		0.49	0.00	0.00	0.00	1.96
799592000511		4.00	LIJA D/AGUA FANDELI 080		0.49	0.00	0.00	0.00	1.96
PUNACE009		1.00	PUNTA/CINCEL DE ACERO 3/4*13"		4.75	0.00	0.00	0.00	4.75
747752280839		3.00	ESPATULA STANLEY 3		2.50	0.00	0.00	0.00	7.50
7612894541717		2.00	EMPASTE EXTERIOR 20 KG		22.32	0.00	0.00	0.00	44.64
TAG001007		2.00	TEFLON AMARILLO GRANDE 3/4		1.38	0.00	0.00	0.00	2.76

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
590756013 8028		1.00	LIJA D/METAL #80		0.85	0.00	0.00	0.00	0.85
CCC00059 0		1.00	LIJA D/METAL #36		0.75	0.00	0.00	0.00	0.75
PEN00003 2		2.00	PINTURA SPRAY ABRO NEGRA (BR)		2.50	0.00	0.00	0.00	5.00
2658		1.00	DISCO HAROMAX P/CIERRA CIRCULAR 7"		6.47	0.00	0.00	0.00	6.47
770295620 4008		3.00	PALA BELLOTA CUADRADA		12.23	0.00	0.00	0.00	36.69
786115930 0136		5.00	CHOVA 20CM*10		2.68	0.00	0.00	0.00	13.40
AHG00044 6		1.00	ALAMBRE HG 18		52.13	0.00	0.00	0.00	52.13
FE000211		1.00	FLEXOMETRO 5MT EC		1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
AHG14		1.00	ALAMBRE HG 14		128.57	0.00	0.00	0.00	128.57
770295620 3735		3.00	PALA BELLOTA PUNTONA		12.23	0.00	0.00	0.00	36.69
CP000001		1.00	JUNTA DE PELIGRO 500MT. AMARILLA		31.25	0.00	0.00	0.00	31.25
MAC00065 4		1.00	MACHETE AGUILA 24"		7.01	0.00	0.00	0.00	7.01
841574083 286		1.00	LLAVE PRESMA TIC TEMPO SG00 5765 306 EDESA		61.60	0.00	0.00	0.00	61.60

SUBTOTAL 12% 511.65

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 511.65

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 61.40

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 573.05

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	573.05

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1000100899001

FACTURA

No. 001-014-000001346

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202301100010089900120010140000013460000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2023 09:57:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202301100010089900120010140000013460000000019

VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL

E/S AZOR

Dirección Matriz: LAS PALMAS AV ALBERTO ZAMBRANO S/N VIA PUYO

Dirección Sucursal: LAS PALMAS, AV ALBERTO ZAMBRANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 30/01/2023

Placa / Matricula: ZZZ9999

Guía

Dirección: BARRIO MIRAFLORES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	3	1000.00	DIESEL PREMIUM		1.56	1.53	3.09	0.00	1562.50

Información Adicional

n_Factura: 001-014-000001346
E_MAIL: jinmarim@hotmail.com
Direccion_Cliente: BARRIO MIRAFLORES
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 66

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1750.00

SUBTOTAL 12%	1562.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1562.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	187.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1750.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	3461.87
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1711.87

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0202410700001

FACTURA

No. 001-013-000254002

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2501202301020241070000120010130002540021234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/01/2023 08:12:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501202301020241070000120010130002540021234567811

ESPIN TACO GABRIEL SHONEY

ESTACION DE SERVICIO MERCEDITAS

Dirección Matriz: AV LUIS A MARTINEZ VIA A BANOS

Dirección Sucursal: AV LUIS A MARTINEZ VIA A BANOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1.

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 25/01/2023

Placa / Matrícula: ADE4997

Guía

Dirección: N/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		2.86	DIESEL PREMIUM		1.56	2.24	3.80	0.00	4.46

Información Adicional

Conductor: JOSUE SEBASTIAN PERGUEZA NARVAEZ

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12.16
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	7.16

R.U.C.: 1691710080001

FACTURA

No. 001-101-000000093

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2106202301169171008000120011010000000930000009318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106202301169171008000120011010000000930000009318

AMAZONBUILD SA 2023

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S A

Dirección Matriz:

BARRIO EL DORADO, AV TARQUI SN Y LOS LAURELES

Telf.:

E-mail: jinmarinm@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención RESOLUCION No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

RUC / CI: 1660000170001

Fecha Emisión: 21/06/2023

Dirección: FRANCISCO DE ORELLANA 739 Y 27 DE FEBRERO

Codigo	Descripción - Serie	Cant.	Unidad	P.Unitario	Desc.	Valor Total
SVF-0001	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nº 01	1.00		135,466.45	0.00	135,466.45
SVF-0001	REAJUSTE (PROVISIONAL) PLANILLA Nº 01	1.00		1,973.63	0.00	1,973.63

INFORMACION ADICIONAL:

Forma de pago: CREDITO 0 dias

Vendedor: 00002 JENNY PUNINA

Observaciones: PLANILLA DE AVANCE OBRA 1:"ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA"

SUBTOTAL: 137,440.08

TOTAL DESCUENTO: 0.00

SUBTOTAL 12%: 137,440.08

SUBTOTAL 0%: 0.00

SUB TOTAL No Objeto IVA: 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 137,440.08

IVA 12%: 16,492.81

VALOR TOTAL: 153,932.89

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
20 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	153932.89	0	DIAS
