

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 1422

Fecha: 01/09/2023

Asiento N° 4103

Compromiso N° 416

3BCE BDE CREDITO Cta Cte No 76210011

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **CONSORCIO ASFALTO CANELOS** / **USD 14,738.16** /

LA SUMA DE: **CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO Dolares 16/100 Ctv**

PUYO, 01 de Septiembre del 2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO ASFALTO CANELOS.- PAGO DEL SALDO DE LA PLANILLA DE RUBROS NUEVOS DEL PROYECTO "ASFALTADO DE LA VIA LATASAS - CHALLUAYAKU PARROQUIA CANELOS, CANTON PASTAZA. REFERENCIA ASIEN TO DE DIARIO N 1897 DE FECHA 21/04/2023.

Usuario: ALE

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor
CTA 8189641	CONSORCIO ASFALTO CANELOS	14,738.16
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		14,738.16

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	14,738.16	
1.1.1.03.01.009	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / BDE CREDITO		14,738.16 ✓
SUMAN o PASAN USD		14,738.16	14,738.16

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D511.519.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			14,738.16
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	14,738.16 ✓


LCDO. ANDRE GRANDA.
Prefecto Provincial


LCDA. MARILU ORDOÑEZ.
Directora Financiera E.


LCDO. MARCELO CUEVA.
Jefe De Contabilidad E.


ING. GABRIEL SOS
Tesorero



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 7-9-2023

Hora: 12:47:39

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: SOSA ESPINEL GABRIEL ALEJANDRO 76210011

368

Num. Ref. BCE.:19033175

Institución Pública: GAD. PROV. PASTAZA/BDE CREDITO							# Cta.: 76210011	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO DEL PACIFICO	8189641	14,738.16	368	1691728888001	CONSORCIO ASFALTO CANELOS	1	04-09-2023 17:47:10	ACREDITADA
BANCO DEL PACIFICO	8189641	70,460.53	368	1691728888001	CONSORCIO ASFALTO CANELOS	1	04-09-2023 17:47:10	ACREDITADA
BANCO DEL PACIFICO	8189641	82,414.41	368	1691728888001	CONSORCIO ASFALTO CANELOS	1	04-09-2023 17:47:10	ACREDITADA
Total:	167,613.10	Reg.:3						

Atrás



GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno del Añimo

Orden de Pago Nro. GADPPZ-GADPPZ-2023-0260-GOP

Puyo, 01 de septiembre de 2023

PARA: Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
Directora Financiera (E)

ASUNTO: Orden de pago de Consorcio Asfalto Canelos

De conformidad al Memorando No. GADPPZ-FINANCIERO-2023-0273-SOLOP, de 01 de septiembre 2023, considerando que la Dirección Financiera ha realizado el control previo del trámite de PLANILLA DE LIQUIDACIÓN Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO; PLANILLA DE RUBROS NUEVOS DEL PROYECTO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 04 Y PLANILLA DE LIQUIDACIÓN Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL DEL PROYECTO "ASFALTADO DE LA VIA LATASAS - CHALLUAYAKU PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA; autorizo proceda con el pago en observancia de las disposiciones legales, a favor de CONSORCIO ASFALTO CANELOS, por el valor de 167.613.1 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. André Mauricio Granda Garrido
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

Referencias:

- GADPPZ-FINANCIERO-2023-0273-SOLOP

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes - Directora Financiera (E)



Firmado electrónicamente por:
**ANDRÉ MAURICIO
GRANDA GARRIDO**



GOBIERNO DE
PASTAZA

El Gobierno del Azuero

PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA

29 JUN 2023

Pao Rea

Número: 5614 Hora: 16h51

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5614-M

Puyo, 29 de junio de 2023


PARA: Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
Directora Financiera (E)

ASUNTO: ENTREGA DE EXPEDIENTES ORIGINALES REVISADOS

En respuesta al Documento No. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2263-M, manifiesto que la ingeniera Eryka Silva Manzano – Subdirectora de Fiscalización ha procedido a revisar los expedientes originales de las planillas que se detallan a continuación; por lo que, se solicita se continúe con trámite administrativo correspondiente.

FECHA	NUMERO DE COMPROBANTE	DETALLE DE LA OBRA
11/05/2023	1294	VIA Y CON S.A.S.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DEL PROYECTO AFIRMADO DE TRAMO DE VÍA EN LA COMUNIDAD SAN CARLOS, PARROQUIA 10 DE AGOSTO, PROVINCIA DE PASTAZA.
09/06/2023	1552	ROMERO ALDAZ JOHNNY GABRIEL.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, PLANILLA DE LIQUIDACION DE EXCEDENTES DE OBRA, PLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO, REAJUSTES PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DE EXCEDENTES DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO MUTIPLACA UBICADA EN LA ABS 2+250 DE LA VIA MIRAFLORES - LA INDEPENDENCIA, COMUNIDAD LA INDEPENDENCIA, PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
22/05/2023	1387	REYES VILLACRES KATHERINE LILIANA.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DEL PROYECTO AFIRMADO HACIA LA CAPTACION DE AGUA DE LA COMUNIDAD EL ROSAL PARROQUIA FATIMA, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

Abono \$ 3059,43
Comprobante # 1143 (19/07/23).



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5614-M

Puyo, 29 de junio de 2023

06/04/2023	922	CONSORCIO MICH.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCION DE VARIAS VIAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BAÑEÑOS.
25/04/2023	1041	CONSTRUCTORES AMAZONICOS CA S.A.S.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N2 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N2 DEL PROYECTO "AFIRMADO DE LA VIA UBICADA DESDE LA COMUNIDAD SAMASUNCHI HASTA LA COLONIA JESUS DEL GRAN PODER (LONGITUD=0.950 KM), PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA".
21/04/2023	1028	CONSORCIO ASFALTO CANELOS.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE RUBROS NUEVOS DEL PROYECTO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 04 DEL PROYECTO "ASFALTADO DE LA VIA LATASAS - CHALLUAYAKU PARROQUIA CANELOS, CANTON PASTAZA

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
DIRECTOR DE FISCALIZACION

Referencias:

- GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5606-M

Copia:

Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - Secretaria Ejecutiva 2 /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - Secretaria Ejecutiva 2

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL



Pastaza

Fecha:

29 JUN 2023

Ejecutar el control previo y efectuar
La contabilización, conforme leyes y
Reglamentos vigentes

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL



Pastaza

Fecha:

29 JUN 2023

Ejecutar el control previo al PAGO
Conforme leyes y reglamentos
Vigentes.



Firmado electrónicamente por:
JAIR FERNANDO
LEDESMA BASTIDAS



Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA

Dirección: Francisco de Orellana y 27 de Febrero

Telefono: 032885380 / Fax: 032886179

E-mail: financiero@pastaza.gob.ec

Web: www.pastaza.gob.ec

Contribuyente Especial: 590

RUC: 1660000170001

COMPROBANTE DE RETENCION

Nº 001-010-000020773

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202307166000017000120010100000207731438925211

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

25/04/2023 10:36:06

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2104202307166000017000120010100000207731438925211

Razon Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ASFALTO CANELOS

RUC/Ci: 1691728888001

Fecha Emisión: 21 de Abril del 2023

Guía de Remisión:

Número de Documento	Cód. SRI	Descrip. Reten.	% Reten.	Base Retención	Valor Retenido
001-101-000000007	346	1.75% IMPUESTO A LA RENTA	1.75	18,114.60	317.01
001-101-000000007	731	100% SRI RESOLUCION 074 075	100.00	2,173.75	2,173.75
				Total	2,490.76

Información Adicional:

Dirección:

Teléfono:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE DIARIO N° 1028

Fecha: 21/04/2023

Asiento N° 1897

Compromiso N° 416

Retención N° 001-010-000020773

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO ASFALTO CANELOS.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE RUBROS NUEVOS DEL PROYECTO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 04 DEL PROYECTO "ASFALTADO DE LA VIA LATASAS - CHALLUAYAKU PARROQUIA CANELOS, CANTON PASTAZA


Usuario: ALE


DOCUMENTOS			
Fecha	Documento	No / Autorización	Valor
19/04/2023	FACTURA	0011010000000771968196212	20,288.35

APLICACION CONTABLE			
Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IVA	2,173.75	
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	18,114.60	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS		17,797.59
2.1.3.75.01.112	IMPUESTO A LA RENTA 1.75%		317.01
2.1.3.81.14.001	CXP IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI		2,173.75
SUMAN o PASAN USD		20,288.35	20,288.35

APLICACION PRESUPUESTARIA			
Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D511.519.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS		18,114.60	
TOTAL GASTOS USD	0.00	18,114.60	0.00

Abono 1. 3059.43 Comp # 1143 (19/07/23).
Saldo. /14738.16 Comp # 1422. (01/09/23).
17.797.59


LCDA. MARILU ORDOÑEZ
Contadora General


ING. ALEXANDRA POZO
Contador 1

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Compromiso No: 416

Transacción No: 3682

Fecha: 19/04/2023

Proveedor: CONSORCIO ASFALTO CANELOS ✓

Identificación: Ruc 1691728888001

Programa: 05 FUNCION SERVICIO CONECTIVIDAD VIALIDAD Y ENERGIA

SubPrograma: 01 MOVILIDAD CONECTIVIDAD Y ENERGIA

Proyecto: D511 FINANCIAMIENTO BEDE STCEA

Actividad: 519 FINANCIAMIENTO BDE VIAS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO	4215-M	05/01/2023	0.00	FISCALIZACION

DETALLE:

CONSORCIO ASFALTO CANELOS.- ASFALTO DE LA VIA CANELOS - LATASAS - CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA. ✓

RIGO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
05.01.D511.519.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	483,933.95	3,863,046.06
Total =>	483,933.95	3,863,046.06



FRANCISCO RIGOBERTO
GREFA RIVADENEYRA

Subdirector Financiero

CONSORCIO ASFALTO CANELOS

R.U.C.: 1691728888001

FACTURA No. 001 - 101 - 0000007

NUMERO DE AUTORIZACION

1904202301169172888800120011010000000071968196212

Fecha y Hora de AUTORIZACION

2023-04-19 08:26:22

AMBIENTE Produccion OFFLINE

CLAVE DE ACCESO

1904202301169172888800120011010000000071968196212

Direccion Matriz: AV LUIS A MARTINEZ 508 JUAN MONTALVO

Direccion Sucursal: AV. LUIS A. MARTINEZ 508 Y JUAN MONTALVO

Contribuyente Especial Nro NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social/Nombres y Apellidos: GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

Identificacion: 1660000170001

Fecha Emision: 19 de abril del 2023

Guia Remision:

Codigo Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Des cuenta	Precio Total
10	1.00	PLANILLA DE RUBROS NUEVOS (CON TODOS LOS ANEXOS)	18,114.60	0.00	18,114.60
	0.00	PROYECTO ASFALTO DE LA VIA LATASA-CHALLUAYAKU, PARROQU	0.00	0.00	0.00
	0.00	CANELOS, CANTON PASATZA	0.00	0.00	0.00

Informacion Adicional

SUBTOTAL	12%	18,114.60
SUBTOTAL 0%		0.00
Subtotal No O. Iva		0.00
Subtotal Exento IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPU		18,114.60
TOTAL Descuento		0.00
ICE		
I.V.A. 12%		2,173.75
IRBPNR		0.00
PROPINA		0.00
VALOR TOTAL		20,288.35

correo financiero@pastaza.gob.ec;nic_loza@yahoo.es;nlanda79@hotmail
direccion FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO
telefono 032885380

FORMA PAGO

TRANFORMPAG FORMAPAGO	VALOR	PLAZO	UNIDTIEMP
OTROS CON UTILIZACION DE SISTEMA	20,288.35	0.00	dias

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA

Pastaza

31 MAR 2023

Fecha:

Recibido:

Pao Rea

Número:

4863

Hora:

13 h 06

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4863-M

Puyo, 29 de marzo de 2023

PARA: Sr. Téc. Jose Mauricio Marin Montero
Director Financiero (E)**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO PLANILLA DE RUBROS NUEVOS ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS a LATASAS - CHALLUAYAKU,

En referencia a los documentos: OFICIO: F.A.C.025-2023, de fecha 28 de febrero de 2023, suscrito por el ingeniero William Fuentes – Representante Legal F.B. FRATRES CONS. Y SERV. CIA. LTDA. – FISCALIZADOR EXTERNO; y, Memorando Nro.

GADPPZ-OBRA-PUBLICAS-2023-9984-M, de fecha 20 de marzo de 2023; suscritos por el ingeniero Fabián Salazar – Subdirector de Obras Públicas (Administrador de Contrato), me permito informar lo siguiente:

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado 408-17 Administrador del contrato, que indica: *“El administrador del contrato velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sí para lograr el éxito del proyecto.- Es función del administrador del contrato establecer un sistema que evalúe el logro de los objetivos, mediante el cual pueda obtenerse información sobre su estado. Esto con el fin de tomar oportunamente acciones correctivas o para informar a las autoridades de la entidad sobre el desarrollo del proyecto”*

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado 408-18 Jefe de Fiscalización, indica: *“El Jefe de Fiscalización establecerá un sistema para asegurar la correcta ejecución de la obra, mediante el control de la calidad, el avance físico y el avance financiero de la obra. Dichos controles conllevan una evaluación mensual, de los aspectos mencionados y la comunicación de resultados a los mandos superiores, incluyendo los problemas surgidos, especialmente cuando afectan las condiciones pactadas en relación al plazo, presupuesto y calidad de la obra.- El Jefe de Fiscalización, se asegurará de que la obra se ejecute de conformidad con las bases establecidas en los estudios de preinversión, es decir, de acuerdo con el diseño definitivo, las especificaciones y demás normas técnicas aplicables, para lograr obtener del proyecto los beneficios esperados”*.

Con estos antecedentes, adjunto al presente la Planilla de Rubros Nuevos (con todos los anexos) del proyecto: **“ASFALTADO DE LA VÍA LATASAS – CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**; documentos que han sido revisados y aprobados por el Administrador de Contrato y Fiscalizador Externo; por lo que, en base a los informes anexos, se determina como viable y procedente realizar el pago de \$ 18.114,60 USD (DIECIOCHO MIL CIENTO CATORCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 60/100), a favor del Consorcio Asfalto Canelos, representado legalmente por el ingeniero Jonathan Narváez Machado - Contratista, de acuerdo al siguiente detalle:



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4863-M

Puyo, 29 de marzo de 2023

PLANILLA DE RUBROS NUEVOS	\$ 18.114,60 USD
VALOR TOTAL	\$ 18.114,60 USD

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Álvaro Renato Sosa Castro
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

Referencias:

- GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-9984-M

Anexos:

- check_list_tramites_de_pago-signed0310736001679348975.pdf
- ofic_n_39_a_ingreso_planilla_rubros_nuevos-signed-signed.pdf
- me_y_orden_de_trabajo_incre_y_ord_trab_asfaltado_canelos_chaullayaku-signed-signed-signed.pdf
- certificacion644-signed0671884001679348976.pdf
- certificación_poa_n°_706_oopp_20220501089001679348976.pdf
- 1_oficio_25_planilla_rubros_nuevos_obra-signed.pdf
- informe_administrador_de_contrato_rubros_nuevos_obra-signed.pdf
- anexo_de_calculo-signed-signed.pdf
- planilla_rubros_nuevos_obra-signed-signed.pdf
- oficio_n_46_reingreso_gaviones-signed.pdf
- memo_03_2023-signed.pdf
- informe_planilla_costo+%-signed.pdf
- certificado_iess0425413001679349012.pdf
- libro_de_obra_rn.pdf
- anexo_fotografico-signed-signed0393169001679349011.pdf
- informe_administrador_orden_de_trabajo0778279001679349013.pdf
- memorando_nro._gadppz-obras-publica-2023-9984-m.pdf

Copia:

Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaria Ejecutiva 2** / Sr. Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña - **Director de Obras Publicas** /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - Secretaria Ejecutiva 2

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL
Pastaza
Fecha: 31 MAR 2023
Ejecutar el control previo y efectuar la contabilización, conforme leyes y Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL
Pastaza
Fecha: 31 MAR 2023
Ejecutar el control previo al pago conforme leyes y reglamentos vigentes.

1.75% = 317.01 //

Benef = 17.797.59 //



Firmado electrónicamente por:
ÁLVARO RENATO SOSA CASTRO



Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-9984-M

Puyo, 20 de marzo de 2023

PARA: Sr. Ing. Álvaro Renato Sosa Castro
Director de Fiscalización

ASUNTO: PLANILLA DE RUBROS NUEVOS ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS a LATASAS - CHALLUAYAKU,

Por medio de la presente, en mi calidad de Administrador de Contrato del "ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS - LATASAS - CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", una vez revisada y aprobada la PLANILLA DE RUBROS NUEVOS, se solicita el trámite de pago por un valor de \$ 18.114,60 USD (DIECIOCHO MIL CIENTO CATORCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 60/100), conforme al siguiente detalle:

PLANILLA DE RUBROS NUEVOS

\$ 18.114,60 USD

VALOR A PAGAR

\$ 18.114,60 USD

Para ello se adjunta la información en físico y digital.

Particular que se comunica para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Fabian Dario Salazar Laguna
SUBDIRECTOR DE OOPP

Anexos:

- check_list_tramites_de_pago-signed0310736001679348975.pdf
- informe_administrador_de_contrato_rubros_nuevos_obra-signed.pdf
- l_oficio_25_planilla_rubros_nuevos_obra-signed.pdf
- certificaciOn_poa_n°_706_oopp_20220501089001679348976.pdf
- certificacion644-signed0671884001679348976.pdf
- me_y_orden_de_trabajo_incre_y_ord_trab_asfaltado_canelos_chaullayaku-signed-signed-signed-signed.pdf
- ofic_n_39_a_ingreso_planilla_rubros_nuevos-signed-signed.pdf
- oficio_n_46_reingreso_gaviones-signed.pdf
- planilla_rubros_nuevos_obra-signed-signed.pdf
- anexo_de_calculo-signed-signed.pdf
- anexo_fotografico-signed-signed0393169001679349011.pdf
- libro_de_obra_rn.pdf
- certificado_ies0425413001679349012.pdf
- informe_planilla_costo+%-signed.pdf
- memo_03_2023-signed.pdf
- informe_administrador_orden_de_trabajo0778279001679349013.pdf

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
Pastaza
20 MAR 2023
Fecha: RM
Recibido: _____
Número: _____ Hora: 16:57

Memorando Nro. GADPPZ-OBRA-PUBLICA-2023-9984-M

Puyo, 20 de marzo de 2023



FABIAN DARIO
SALAZAR LAGUA



INFORME DE PLANILLA DE RUBROS NUEVOS- ADMINISTRADOR DE CONTRATO

PROYECTO "ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS - LATASAS - CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

PROCESO: COTO-GADPPz-006-2022

Puyo, 20 de marzo de 2023

1. ANTECEDENTES.

- Con fecha 07 de Julio de 2022 se firma el contrato entre el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA y el CONSORCIO ASFALTO CANELOS.; cuyo objeto es el "ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS - LATASAS - CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"
- Mediante RESOLUCIÓN N° 388-GADPPz-2022 de fecha 27 de Junio de 2022; designa a mi persona como Administrador del Contrato para ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS - LATASAS - CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"
- Con fecha 10 de Junio de 2022 se firma el contrato entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza y F.B. FRATRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA. Con su gerente el Ing. Fuentes Barrionuevo William Rodrigo en calidad de Fiscalizador Externo; cuyo objeto es la "FISCALIZACIÓN EXTERNA ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS - LATASAS - CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".
- Mediante NOTIFICACIÓN DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 92-2022 de fecha 15 de Junio de 2022; designa a mi persona como Administrador del Contrato para "FISCALIZACION EXTERNA ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS - LATASAS - CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"
- Mediante comprobante de pago N° 1401 de fecha 18 de Julio de 2022, se entrega el anticipo de obra por un valor de \$363.228,96 USD al CONSORCIO ASFALTO CANELOS.
- Mediante comprobante de pago N° 1427 de fecha 21 de Julio de 2022, se entrega el anticipo de fiscalización por un valor de \$19.842,24 USD a F.B. FRATRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.
- De acuerdo a lo determinado en la Cláusula Octava del Contrato: **PLAZO.- 8.1** El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de trescientos sesenta días (180 días), contados desde la fecha de **orden de inicio de la Obra.**
- Mediante OFICIO-CDC-GADPPz-004-2022-OF-2022-001 se notifico a Fiscalizacion externa y con OFICIO-COTO-GADPPz-006-2022-OF-2022-001 se

ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS- LATASAS - CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

Web: www.pastaza.gob.ec | Teléfonos: 03 2885 380 / 032 994 220 | Dirección: Francisco de Orellana 739 y 27 de febrero



notifico al Contratista del inicio de Obra, adjuntando a los oficios antes mencionados la respectiva Acta de inicio de Obra.

- De acuerdo a lo determinado en la Cláusula Sexta del Contrato de Obra:

CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO. –

6.1 Se otorgara anticipo del 40% y con una forma de pago por planilla del 60% contra presentación de planillas mensuales por avance de obra debidamente aprobada y legalizada por la fiscalización y administración de contrato.

6.2 Entregada la planilla por el contratista, en el plazo máximo de cinco (5) días después de finalizado el mes, la fiscalización, en el plazo de quince días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por el contratante.

6.3 Discrepancias: si existieran discrepancias entre las planillas presentadas por el contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, esta notificará al contratista. Si no se receptare respuesta, dentro de los quince días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el contratista ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el presente contrato.

6.4 en los primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el contratista, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo mensual anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la tabla de cantidades y precios para cada rubro señalado en el formulario único de la oferta.

Nota: (en caso de haberse estipulado reajuste de precio: en cada plantilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indica en este contrato. El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC que sean aplicables)

Planilla de liquidación: Junto con la solicitud de entrega-recepción provisional de la obra, el Contratista presentará una planilla del estado de cuenta final, salvo el rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva.

Trámite de la planilla: Para el trámite de la planilla se observarán las siguientes reglas:

- 1) La planilla será preparada por capítulos y siguiendo el orden establecido en la "Tabla de Cantidades y Precios", con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.
- 2) Dentro de los cinco (5) días de cada mes, el Contratista preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.



3) Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.

4) Con la planilla, el Contratista presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

5) Los documentos mencionados en el numeral anterior, se elaborarán según el modelo preparado por el Contratante, y será requisito indispensable para tramitar el pago de la planilla correspondiente.

6) La fiscalización, en el término de cinco (5) días, aprobará u objetará la planilla.

7) Si la fiscalización, en el plazo señalado, no aprueba o no expresa las razones fundamentadas para su objeción, transcurrido dicho plazo, se entenderá que la planilla ha sido aprobada.

8) Con la aprobación expresa o tácita continuará el trámite de pago.

Requisito previo al pago de la planilla: Previamente al pago de la planilla el Contratista presentará el certificado de no adeudar al IESS los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviere empleando en la obra y una copia de las planillas de pago al IESS., sin este requisito el Contratante no realizará pago alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 465, de 30 denoviembre de 2001, excepto en el caso de que sus trabajadores empleados estén bajo otro régimen legal de contratación.

De los pagos que deba hacer el Contratante retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato.

Pagos indebidos: El Contratante se reserva el derecho de reclamar al Contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose el Contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear el Contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido en el Banco Central del Ecuador.

2. ALCANCE DEL INFORME.

- Emitir el informe de Aprobación de parte de la Administración de Contrato del proyecto cuyo objeto es **ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS - LATASAS - CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**, respecto a la planilla de rubros nuevos con la finalidad de continuar con los trámites respectivos de pago.
- Aprobar el informe de Fiscalización Externa respecto a la Planilla de rubros nuevos.

3. OBJETIVO.

- Elaborar el informe de Administrador del Contrato verificando el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el contrato para el pago correspondiente a la Planilla de rubros nuevos.



4. DESARROLLO DEL INFORME

4.1 GENERALIDADES:

Objeto del Contrato: **ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS - LATASAS - CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**

Monto Contractual: **\$ 908.072,39 USD**

Contratista: **CONSORCIO ASFALTO CANELOS**

Administrador de Contrato: **Ing. Fabian Salazar**

Plazo Contractual: **180 días**

Fecha firma de contrato: **07 de Julio de 2022**

Fecha de inicio: **04 de Agosto de 2022**

Anticipo: **40% del monto contractual**

Período del Informe: **01 de enero al 10 de enero de 2023**

4.2 AVANCE ECONÓMICO

Valor del Anticipo de Obra: **\$ 363.228,96 USD**

Forma de pago: **Según lo estipulado en el contrato.**

Número de Planilla de Obra: **Rubros nuevos**

Valor de Planilla de rubros nuevos: **\$ 18.114,60 USD**

Porcentaje de Avance de obra: **1,99%**

RESUMEN PLANILLAS DE OBRA

PLANILLAS	RUBROS NUEVOS	
	MONTO	%
ANTERIORES		
ACTUAL	\$18.114,60	1,99
ACUMULADAS	\$18.114,60	1,99

PLANILLAS	EJECUTADO		PLANILLA AL 100%		INCREMENTOS	
	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
ANTERIORES	\$636.085,23	70,05	\$592.868,27	65,29	\$43.216,96	4,76
ACTUAL	\$160.292,14	17,65	\$148.579,23	16,36	\$11.712,91	1,29
ACUMULADAS	\$796.377,37	87,70	\$741.447,50	81,65	\$54.929,87	6,05

4.3 PRODUCTOS ESPERADOS DE FISCALIZACIÓN EXTERNA.

- Informe de aprobación de Planilla de rubros nuevos.
SI PRESENTA
- Informe Mensual de Actividades realizadas dentro del período
SI PRESENTA

4.4 PERSONAL TÉCNICO CONTRATISTA.

- 1 Superintendente de Obra

ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS- LATASAS - CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA



- 1 Residente de Obra
- 1 Técnico Ambiental
- 1 Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional
- 1 Topógrafo

4.5 EQUIPO Y MAQUINARIA.

- 1 Excavadora sobre orugas
- 1 Volquetes

4.6 PRINCIPALES RUBROS EJECUTADOS EN EL PERÍODO.

1. Muro de gaviones calibre N° 12 ✓

4.7 LIQUIDACIÓN DE MULTAS.

No presenta multas en este período.

4.8 OBSERVACIONES.

La Planilla de rubros nuevos no presenta observaciones.

5. CONCLUSIONES.

- Revisada y analizada toda la documentación y el informe de Fiscalización correspondiente al período 01 de enero al 10 de enero del 2023 y al cumplir con todos los productos estipulados en el contrato se procede a Aprobar el informe de fiscalización de la Planilla de rubros nuevos.
- Aprobación expresa de la Planilla de rubros nuevos por \$ 18.114,60. ✓

6. RECOMENDACIONES.


- Se recomienda continuar con el respectivo trámite de pago.

Atentamente,



firmado electrónicamente por:
FABIAN DARIO
SALAZAR LAGUA

Ing. Fabian Salazar
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

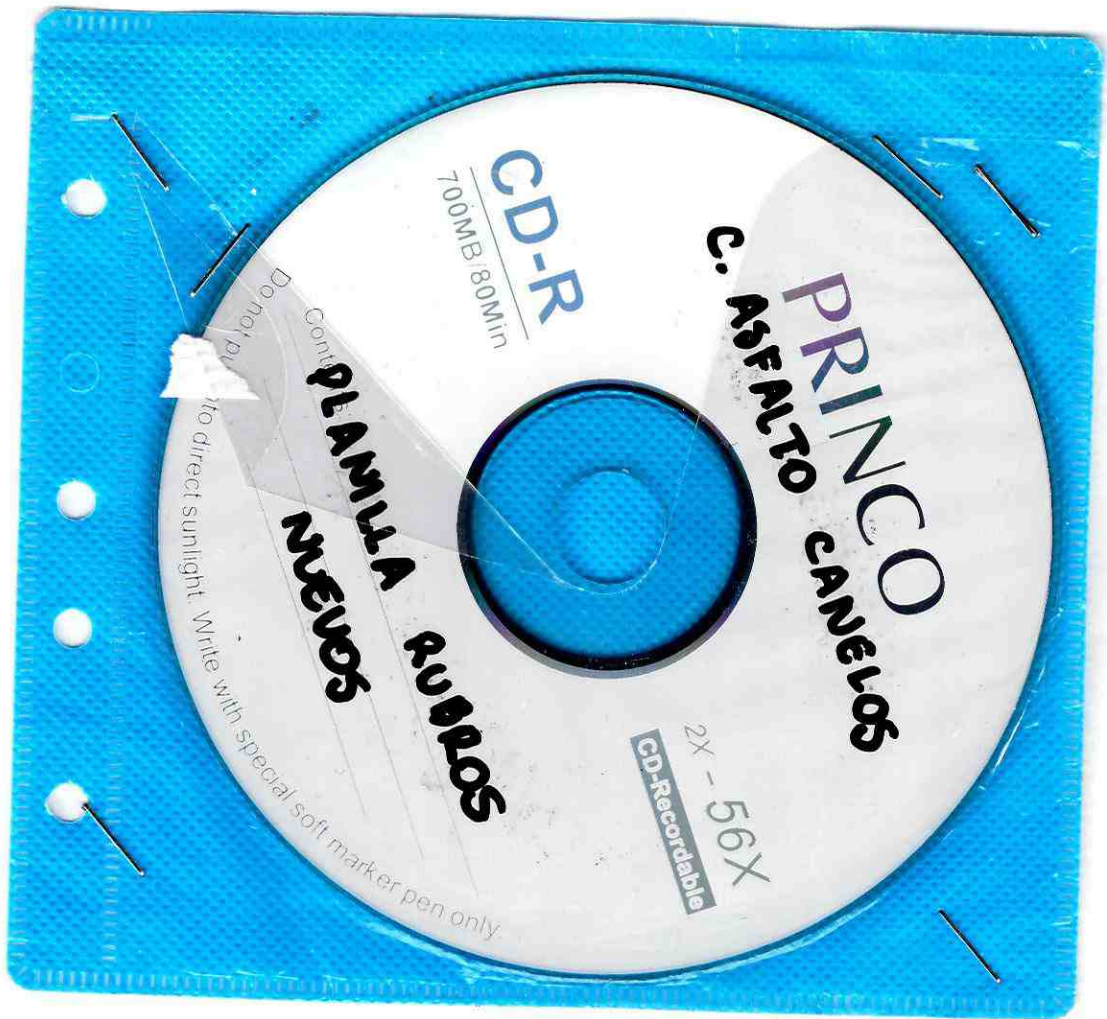

CD-R
700MB/80Min

C. ASFALTO
PRINCO
CANEROS

PLANILLA
RUBROS
NUEVOS

2X-56X
CD-Recordable

Do not print on this disc. Do not use a soft marker pen on this disc. Do not expose to direct sunlight. Write with special soft marker pen only.

OFICIO: F.A.C. 025-2023
Puyo, 28 de febrero del 2023

**ING.
FABIAN SALAZAR
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
GAD PROVINCIAL DE PASTAZA
PRESENTE.**

Ref.

CONTRATO: CDC-83-06-2022 "FISCALIZACIÓN ASFALTO DE LA VÍA CANELOS – LATASAS – CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

De mis consideraciones:

Por medio del presente me dirijo a Ud. para expresarle un cordial y atento saludo, y a la vez desearle éxitos en sus funciones encomendadas.

El motivo de la presente es para presentar la *Planilla de Rubros Nuevos de Obra*, del proyecto denominado: "**ASFALTO DE LA VÍA CANELOS – LATASAS – CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**", para su respectiva revisión y aprobación para el trámite correspondiente.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente;



Firmado electrónicamente por:
**WILLIAM RODRIGO
FUENTES BARRIONUEVO**

Ing. William Fuentes B.
Representante Legal
F.B. FRATRES CONS. Y SERV. CIA. LTDA.
FISCALIZADOR EXTERNO



MEMORÁNDUM N° FISCA-AC-03-2023

FECHA: Puyo, 28 de febrero de 2023
DE: FISCALIZADOR EXTERNO
PARA: ADMINISTRADOR DE CONTRATO
ASUNTO: Solicitud de Trámite de Pago Planilla de Rubros Nuevos

Solicito proceder con el trámite para cancelar a favor del CONSORCIO ASFALTO CANELOS, representado legalmente por el Ing. Jonathan Narváez Machado, contratista de la obra: "ASFALTO DE LA VÍA CANELOS – LATASAS – CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", el valor de **\$ 18.114,60 USD**, conforme al siguiente detalle:

PLANILLA DE AVANCE DE RUBROS NUEVOS	\$	18.114,60 USD
TOTAL	\$	18.114,60 USD

Particular que remito para los fines pertinentes.

Atentamente;



firmado electrónicamente por:
WILLIAM RODRIGO
FUENTES BARRIONUEVO

Ing. William Fuentes B.
Representante Legal
F.B. FRATRES CONS. Y SERV. CIA. LTDA.
FISCALIZADOR EXTERNO



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA**

**CONSTRUCCIÓN DE “ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS –
LATASAS – CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS,
CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”.**

INFORME DE FISCALIZACIÓN No. 01 (R.N.)

PLANILLA DE RUBROS NUEVOS (COSTO+%)

PROYECTO: **ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS – LATASAS –
CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN
PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**

CONTRATISTA: **CONSORCIO ASFALTO CANELOS. REPRESENTANTE
LEGAL ING. NARVÁEZ MACHADO JONATHAN
ISRAEL**

MONTO DEL CONTRATO: **USD. 908.072,39 (NOVECIENTOS OCHO MIL
SETENTA Y DOS CON 39/100 DÓLARES
AMERICANOS)**

PERIODO DEL INFORME: **01 DE ENERO AL 10 DE ENERO DEL 2023**

FECHA DE ELABORACIÓN: **28 DE FEBRERO DEL 2023**

ÍNDICE

INFORME DE FISCALIZACIÓN No. _	1
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN:	3
2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN:	3
3. PERIODO DEL INFORME	3
4. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE PERÍODO	3
5. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO	4
6. PLANILLAS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS	4
7. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA	4
8. TIEMPO UTILIZADO DESDE LA FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO:	6
9. ACCIONES EFECTUADAS POR LA FISCALIZACIÓN	7
10. CONCLUSIONES	10
11. RECOMENDACIONES	10
12. ANEXOS	10
13. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME:	10

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN:

OBJETO DEL CONTRATO	ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS – LATASAS – CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
CÓDIGO DEL PROCESO	COTO – GADPPz – 006 - 2022
MONTO DEL CONTRATO	USD. 908.072,39
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 DE JULIO DE 2022
NUEVO PLAZO CONTRACTUAL	210 DÍAS
MONTO DEL ANTICIPO	USD. 363.228,96
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	23 DE JULIO DE 2022
FECHA DE INICIO DE TRABAJO	04 DE AGOSTO DE 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	01 DE MARZO DE 2023
SUSPENSIÓN DE TRABAJO	0 DÍAS
AMPLIACIÓN DE PLAZO	30 DÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO ASFALTO CANELOS
GEORREFERENCIACIÓN DEL PROYECTO	P1. Long. (187.685,6380E) Lat. (9° 806.739,47N) P2. Long. (186.955,1790E) Lat. (9° 805.662,59N)

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN:

OBJETO DEL CONTRATO	FISCALIZACIÓN ASFALTO DE LA VÍA CANELOS – LATASAS – CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS.
CÓDIGO DEL PROCESO	CDC – GADPPz – 004 – 2022
MONTO DEL CONTRATO	USD 49.605,60
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 DE JUNIO DE 2022
NUEVO PLAZO CONTRACTUAL	210 DÍAS
MONTO DEL ANTICIPO	USD 19.842,24
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	28 DE JULIO DE 2022
FECHA DE INICIO DE TRABAJO	04 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	01 DE MARZO DE 2023
SUSPENSIÓN DE TRABAJO	0 DÍAS
AMPLIACIÓN DE PLAZO	30 DÍAS
CONTRATISTA	F.B. FRATRES CONST. Y SERV. CIA LTDA.

3. PERIODO DEL INFORME

El período del informe es desde el *01 de enero al 10 de enero* del 2023.

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE PERÍODO

El seguimiento por parte de Fiscalización de los trabajos de obra, ejecutados por el contratista durante el mes de *enero* del 2023, corresponden a:

1. Muro de Gaviones Calibre N°12.

TABLA DE CANTIDADES

RUBRO	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES		
		UNIDAD	CONTRATADO	ESTE PERÍODO
01	Muro de Gaviones Calibre N°12.	m ³	228,00	228,00

5. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

El monto del proyecto CONTRACTUAL alcanza la suma de USD \$ **908.072,39** (Novecientos ocho mil setenta y dos con 39/100 DÓLARES), para la construcción de ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS – LATASAS – CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

El monto ejecutado de RUBROS NUEVOS es por un valor de \$ **18.114,60**, equivalente al **1.99 %**, del avance parcial para la construcción de ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS – LATASAS – CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

DETALLE	DESCRIPCIÓN
Valor del Anticipo de Obra	\$363,228.96
Forma de pago	Se otorga anticipo del 40% y con una forma de pago por planilla del 60% contra presentación de planillas mensuales por avance de obra debidamente aprobada y legalizada por la fiscalización y administración de contrato.
Numero de Planilla de Obra	Planilla de Rubros Nuevos # 01
Planilla al 100%	18.114,60
Porcentaje de Avance Parcial	1.99%
Numero de Planilla de Fisca	Planilla de Fiscalización Rubros Nuevos # 01
Valor de Planilla de Fisca 100%	989,55

6. PLANILLAS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS.

PLANILLAS	VALORES					PORCENTAJES			
	MONTO PROGRAMADO		MONTO PLANILLADO			AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL	
	MES	ACUM.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.
PLANILLA 1	96,931.55	96,931.55		96,931.55		10.67%	10.67%	10.67%	10.67%
EXCEDENTES	N/A	N/A							
R. NUEVOS	N/A	N/A							

PLANILLA 2	75,672.65	172,604.20	96,931.55	75,672.65	172,604.20	8.33%	19.00%	8.33%	19.00%
EXCEDENTES	N/A	N/A							
R. NUEVOS	N/A	N/A							
PLANILLA 3	201,633.26	374,237.46	172,604.20	201,633.26	374,237.46	22.21%	41.21%	22.21%	41.21%
EXCEDENTES	N/A	N/A							
R. NUEVOS	N/A	N/A							
PLANILLA 4	165,880.65	540,118.11	374,237.46	165,880.03	540,117.49	18.27%	59.48%	18.27%	59.48%
EXCEDENTES 01	43,216.96	583,335.07		43,216.96	583,334.45	4.76%	64.24%	4.76%	64.24%
R. NUEVOS	N/A	N/A							
PLANILLA 5	48,205.77	631,540.84	583,334.45	52,750.78	636,085.23	5.31%	69.55%	5.81%	70.05%
EXCEDENTES	N/A	N/A							
R. NUEVOS	N/A	N/A							
PLANILLA 6	150,270.89	781,811.73	636,085.23	160,292.14	796,377.37	16.55%	86.10%	17.65%	87.70%
EXCEDENTES	N/A	N/A							
R. NUEVOS	18,114.60	799,926.33	796,377.37	18,114.60	814,491.97	1.99%	88.09%	1.99%	89.69%
TOTAL	799,926.33			814,491.97		88.09%		89.69%	
VALOR SIN EXCED. R. NUEVOS	738,594.77			753,160.41		81.34%		82.94%	

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	No.	PERÍODO	VALOR
PLANILLA 1	10.67%	1	Agosto (04 - 31)	96,931.55
PLANILLA 2	8.33%	2	Septiembre (01 - 30)	75,672.65
PLANILLA 3	22.21%	3	Octubre (01 - 31)	201,633.26
PLANILLA 4	18.27%	4	Noviembre (01 - 30)	165,880.03
EXCEDENTES	4.76%	1	Octubre (01 - 21)	43,216.96
PLANILLA 5	5.81%	5	Diciembre (01 - 31)	52,750.78
PLANILLA 6	17.65%	6	Enero (01 - 31)	160,292.14
R. NUEVOS	1.99%	1	Enero (01 - 10)	18,114.60
TOTAL	89.69%			814,491.97
Valor sin Excedentes, R. Nuevos	82.94%			753,160.41

7. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

ACUMULADO PROGRAMADO	799,926.33
ACUMULADO EJECUTADO	753,160.41
CONTRATADO SIN EXCEDENTES	908,072.39
EXCEDENTES (Ordenes de cambio)	43,216.96
RUBROS NUEVOS (Órdenes de trabajo)	\$18,114.60
TOTAL, EJECUTADO	814,491.97

ACUMULADO PROGRAMADO	88.09%
ACUMULADO EJECUTADO	89.69%

8. TIEMPO UTILIZADO DESDE LA FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO:

El plazo total establecido para la ejecución del Proyecto inicialmente fue de **180 días**, se aprobó una ampliación de plazo de **30 días**.

Plazo total para la ejecución del proyecto es de **210 días**.

Los días utilizados para el periodo actual es de **160 días**, desde la fecha que se inició los trabajos (04 de agosto de 2022) hasta el 10 de enero de 2023, correspondiente a la *Planilla de Rubros Nuevos*, que corresponde al **76.19%** del plazo total del proyecto.

	PLAZO	PORCENTAJE
PLAZO TOTAL	210	100.00 %
DÍAS UTILIZADOS	160	76.19 %

Se presenta a continuación el resumen de las inversiones programadas:

DESCRIPCIÓN	PERÍODO	MONTO PROGRAMADO	% DE OBRA PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO	% DE OBRA EJECUTADO
PLANILLA 1	Agosto (04 - 31)	96,931.55	10.67%	96,931.55	10.67%
PLANILLA 2	Septiembre (01 - 30)	75,672.65	8.33%	75,672.65	8.33%
PLANILLA 3	Octubre (01 - 31)	201,633.26	22.21%	201,633.26	22.21%
EXCEDENTES	Octubre (01 - 11)	43,216.96	4.76%	43,216.96	4.76%
PLANILLA 4	Noviembre (01 - 30)	165,880.65	18.27%	165,880.03	18.27%
PLANILLA 5	Diciembre (01 - 31)	48,205.77	5.31%	52,750.78	5.81%
PLANILLA 6	Enero (01 - 31)	150,270.89	16.55%	160,292.14	17.65%
RUBROS NUEVOS	Enero (01 - 10)	18,114.60	1.99%	18,114.60	1.99%
	TOTAL	799,926.33	88.09%	814,491.97	89.69%
	Valor sin Excedentes. R. Nuevos	738,594.77	81.34%	753,160.41	82.94%

- **RESUMEN PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA:**

Detalle	Ejecutado	Planilla al 100%	Excedentes	Porcentaje de Avance	ANTICIPO DEVENGADO	Valor Liquido
Planilla Avance 01	\$96,931.55	\$96,931.55	\$0.00	10.67%	\$38,772.62	\$58,158.93
Planilla Avance 02	\$75,672.65	\$75,672.65	\$0.00	8.33%	\$30,269.06	\$45,403.59
Planilla Avance 03	\$201,633.26	\$201,633.26	\$0.00	22.21%	\$80,653.30	\$120,979.96
Planilla Avance 04	\$209,096.99	\$165,880.03	\$43,216.96	23.03%	\$66,352.01	\$142,744.98
Planilla Avance 05	\$52,750.78	\$52,750.78	\$0.00	5.81%	\$21,100.31	\$31,650.47
Planilla Avance 06	\$160,292.14	\$148,579.23	\$11,712.91	17.65%	\$59,431.69	\$100,860.45
Rubros Nuevos	\$18,114.60	\$18,114.60	\$0.00	1.99%	\$0.00	\$0.00
TOTAL, ACUMULADO	\$814,491.97	\$759,562.10	\$54,929.87	89.69%	\$296,579.00	\$499,798.37

- **RESUMEN PLANILLAS DE FISCALIZACIÓN:**

Detalle	Ejecutado	Planilla al 100%	Excedentes	Porcentaje de Avance	ANTICIPO DEVENGADO	Valor Liquido
Planilla Fisca 01	\$5,295.11	\$5,295.11	\$0.00	10.67%	\$2,118.04	\$3,177.07
Planilla Fisca 02	\$4,133.80	\$4,133.80	\$0.00	8.33%	\$1,653.52	\$2,480.28
Planilla Fisca 03	\$11,014.69	\$11,014.69	\$0.00	22.21%	\$4,405.88	\$6,608.81
Planilla Fisca 04	\$11,422.42	\$9,061.59	\$2,360.83	23.03%	\$3,624.64	\$7,797.78
Planilla Fisca 05	\$2,881.64	\$2,881.64	\$0.00	5.81%	\$1,152.66	\$1,728.98
Planilla Fisca 06	\$8,756.34	\$8,116.49	\$639.85	17.65%	\$3,502.54	\$5,253.80
Rubros Nuevos	\$989.55	\$989.55	\$0.00	1.99%	\$0.00	\$0.00
TOTAL, ACUMULADO	\$44,493.55	\$41,492.87	\$3,000.68	89.69%	\$16,457.28	\$27,046.72

9. ACCIONES EFECTUADAS POR LA FISCALIZACIÓN

Las actividades y acciones efectuadas por el equipo de Fiscalización del Proyecto están determinadas por el contrato de Consultoría y por los términos de referencia. Son actividades que se realizan en forma permanente y rutinaria y están enfocadas básicamente a:

Control de la calidad de los materiales y de la ejecución de los rubros que se incorporan al proyecto;

Estado y número de maquinaria disponible en la ejecución de los trabajos; número y desempeño del personal del contratista;

Solución de los problemas que afecten a la obra y trámite de los aspectos administrativos vinculados al proyecto.

- **VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL DE FISCALIZACIÓN:**

PERSONAL OFERTADO	PERSONAL PRESENTE EN OBRA	CHECK LIST
Director de Fiscalización	Ing. Klever Freire	Ok
Residente – Ing. Civil (Vial)	Ing. Omar Silva	Ok
Ingeniero Ambiental	Ing. Darwin Piedra	Ok

- **VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA:**

EQUIPO Y MAQUINARIA OFERTADO	EQUIPO Y MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA	CHECK LIST
Equipo de Topografía	01	Ok
Camioneta	01	Ok
Computadora Portátil	01	Ok

- **VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL DE CONTRATISTA:**

PERSONAL OFERTADO	PERSONAL PRESENTE EN OBRA	CHECK LIST
Superintendente de Obra	Ing. Manolo Torres	Ok
Residente de Obra	Ing. Marco Lozano	Ok
Técnico Ambiental	Ing. Paola Quinga	Ok
Técnico Seguridad y Salud Ocupacional	Ing. Marcelo Chimborazo	Ok
Topógrafo	Ing. Israel Alulema	Ok

- **VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA:**

EQUIPO Y MAQUINARIA OFERTADO	EQUIPO Y MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA	CHECK LIST
Excavadora sobre Orugas	1	Ok
Motoniveladora	-	-
Camión Cisterna	-	-
Volquetes	1	Ok
Distribuidor de Asfalto	-	-
Planta de Asfalto	-	-
Terminadora de Asfalto	-	-
Escoba Mecánica	-	-
Rodillo Vibratorio Liso	-	-

Rodillo Vibratorio Neumático	-	-
Concreteira 1 Saco	-	-
Aparatos de Topografía	1	Ok

- **INCIDENCIAS PRODUCIDAS EN LA OBRA**

No se ha producido en este período ninguna incidencia grave.

- **CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES:**

Uno de los principales objetivos de la Fiscalización es el control de la calidad de los materiales que intervienen en los diferentes rubros, así como el cumplimiento de las especificaciones para la ejecución de los rubros.

Se ha solicitado al CONTRATISTA en campo cumplir a cabalidad con cada una de las especificaciones técnicas establecidas para cada uno de los rubros ejecutados, verificando el control de CALIDAD de los materiales.

- **VERIFICACIONES REALIZADAS.**

No se realizo ensayos para la ejecución de gaviones.

OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

Oficio Nro.	Fecha	Asunto
OFICIOS RECIBIDOS		
Oficio N.011-AC-2022	21/09/2022	Solicitud de Creación Rubros Nuevos (Contratista).
INFORME Y ORDEN DE TRABAJO (RUBROS NUEVOS)	16/11/2022	Orden de Trabajo emitida por el Administrador de Contrato.
OFICIOS ENVIADOS		
Oficio F.A.C. 022-2022	09/11/2022	Solicitud de Recursos Rubros Nuevos (Para Contratista).
Oficio F.A.C. 024-2022	09/11/2022	Solicitud de Recursos Rubros Nuevos (Para Fiscalización).

10. CONCLUSIONES.

- Hasta la presente fecha de elaboración del informe el desarrollo de la obra se lleva de manera adecuada con la respectiva utilización de los materiales según los APUS y las especificaciones técnicas.
- Se ha realizado revisiones constantes de impacto ambiental con el fin de cumplir con las normativas establecidas dentro del proyecto en ejecución.
- Una vez Revisada toda la documentación y a su vez cumplir con los requerimientos estipulados en el Contrato de Obra se procede a Aprobar la **Planilla de Rubros Nuevos** por el valor de **\$ 18.114,60.**

11. RECOMENDACIONES

- Mantener el libro de obra en sitio, así como el número pertinente de trabajadores en los diferentes frentes de trabajo para mantener el avance de obra conforme al cronograma establecido.
- Cumplir con la presencia del personal técnico mínimo ofertado.
- Realizar una programación tomando como base la metodología presentada para poder cumplir el monto del cronograma estipulado.

12. ANEXOS

- REPROGRAMACIÓN DE OBRA # 3
- ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Planillas de respaldo: contractual.

Ensayos realizados (Anexo en planilla de Contratista)

13. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME:

NOMBRE:	ING. WILLIAM FUENTES REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCIÓN:	Ceslao Marín y Manabí
CIUDAD:	PUYO
TELÉFONO- FAX:	032884-451
CELULAR:	0995663479
CORREO ELECTRÓNICO:	william.fuentes@hotmail.com

Elaborador Por:



firmado electrónicamente por:
**WILLIAM RODRIGO
FUENTES BARRIONUEVO**

**Ing. William Fuentes B.
REPRESENTANTE LEGAL
F.B. FRATRES CONST. Y SERV. CIA LTDA.
FISCALIZADOR EXTERNO**

ANEXO FOTOGRÁFICO

Rubro 01. Muro de Gaviones Calibre N°12.





**“ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS - LATASAS - CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS,
CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**

OFICIOS



Oficio N° 46 - AC-2023
Canelos, 20 de febrero del 2023

Señor
F.B. FRATRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA LTDA
FISCALIZADOR EXTERNO
Presente. –

Ref: "ASFALTADO DE LA VIA CANELOS- LATASAS- CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS,
CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA"

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo, una vez realizadas las correcciones solicitadas, adjunto al presente sírvase encontrar LA PLANILLA DE RUBROS NUEVOS-Ejecución de Muro de Gaviones para el proyecto en referencia.

Se adjunta:

- Planilla de avance de Obra
- Anexo de cálculos
- Anexo fotográfico
- Libro de Obra
- Documentación IESS

Por la atención al presente, desde ya anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,



CONSORCIO ASFALTO CANELOS

CONTRATISTA

Oficio N° 39A - AC-2022
Canelos, 10 de febrero del 2023

Señor
F.B. FRATRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA LTDA
FISCALIZADOR EXTERNO
Presente. –

Ref: "ASFALTADO DE LA VIA CANELOS- LATASAS- CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS,
CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA"

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo, adjunto al presente sírvase encontrar la PLANILLA de RUBROS
NUEVOS – Ejecución de Muros de Gaviones.

Se adjunta:

- Planilla de avance de Obra
- Anexo de cálculos
- Anexo fotográfico
- Libro de Obra
- Documentación IESS

Por la atención al presente, desde ya anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN ISRAEL
MARVAEZ MACHADO

CONSORCIO ASFALTO CANELOS

CONTRATISTA

CERTIFICACIÓN POA N° 706 – OOPP – 2022.

Puyo, 10 de noviembre de 2022

En referencia a lo que determina el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en el Art. 233 y Art. 234, de la Sección Cuarta, Formulación del Presupuesto, en el párrafo primero, Programación del Presupuesto en donde indica:

Art. 233.- Plazo. - "Todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos de conformidad con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los principios de la participación definidos en la Constitución y la ley."

Art. 234.- Contenido. - "Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento."

Los programas deberán formularse en función de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. A fin de hacer posible su evaluación técnica, las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán presentar programas alternativos con objetivos de corto, mediano y largo plazo. Al respecto me permito certificar que luego de la revisión del POA 2022. Aprobado, constan las siguientes actividades:

MEGAPROGRAMA: MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA

PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN VIAL RURAL PROVINCIAL

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VÍAS ASFALTADAS

DESCRIPCIÓN	PARTIDA	RUBRO SIN IVA
ORDEN DE TRABAJO DE OBRA PARA "ASFALTADO DE LA VÍA – LATASAS – CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".	75.01.05	\$ 18.114,60 USD

Con la finalidad de cumplir los siguientes objetivos:

✓ **OBJETIVO GENERAL:**

- ✓ MEJORAR LA MOVILIDAD DE LA PROVINCIA DE PASTAZA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.

✓ **OBJETIVO ESPECÍFICO:**

- ✓ INCREMENTAR LA RED VIAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS.

La Dirección Financiera de conformidad con su competencia verificará la disponibilidad y la partida presupuestaria.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
JORGE ROBERTO
ARBOLEDA
BASANTES

Lcdo. Arboleda Basantes Jorge R.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 644

Transacción No: 984

Fecha: 15/11/2022

Responsable: RAMOS CAMPAÑA DANIEL ANIBAL

Identificación: Cédula 1600324378

Programa: 05 FUNCION SERVICIO CONECTIVIDAD VIALIDAD Y ENERGIA

SubPrograma: 01 MOVILIDAD CONECTIVIDAD Y ENERGIA

Proyecto: D511 FINANCIAMIENTO BEDE STCEA

Actividad: 519 FINANCIAMIENTO BDE VIAS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO	8231-M	10/11/2022	0.00	OBRAS PUBLICAS

DETALLE:

ORDEN DE TRABAJO DEL PROCESO COTO-GADPPz-006-2022. "ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS - LATASAS CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

RIGO

Partida Presupuestaria	Valor
05.01.D511.519.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	18,144.60
Total =>	18,144.60



Firmado electrónicamente por:
FRANCISCO RIGOBERTO
GREPA RIVADENEYRA

Subdirector Financiero





15/11/2022 15:44

Página 1/1



INCREMENTOS DE VOLÚMENES Y ORDEN DE TRABAJO	01	FECHA:	16 DE NOVIEMBRE DE 2022																				
NOMBRE DEL PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VÍA - LATASAS - CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA																						
CONTRATISTA:	CONSORCIOASFALTO CANELOS																						
ADMINISTRADOR DE CONTRATO:	ING. FABIAN SALAZAR																						
OBJETIVO:	Se dispone ejecutar los siguientes trabajos:																						
MONTO AUTORIZADO		PARCIAL		ACUMULADOS																			
	Rubros Nuevos (2%)	\$ 18.114,60	1.99 %	\$	(...)%																		
	Incremento de Volumen (5%)	\$	%	\$	(...)%																		
	Contrato complementario (8%)	\$	(...)%	\$	(...)%																		
JUSTIFICACIÓN	Inexistencia en el Contrato Principal	<p>En base a la Socavación producida por las fuertes lluvias en las Abscisa 3+060, es de primordial importancia la ejecución del siguiente rubro, para garantizar la estabilidad y seguridad de todos los vehículos que circulen por la vía:</p> <p style="text-align: center;">TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Rubro, Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio unitario</th> <th>Precio total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MURO DE GAVIONES - CALIBRE N°12</td> <td>M3</td> <td>223,06</td> <td>79,45</td> <td>18.114,60</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL:</td> <td></td> <td>18.114,60</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">SON : DIECIOCHO MIL CIENTO CATORCE DÓLARES. 60/100 CENTAVOS</p> <p>Por lo que pongo a su conocimiento que, por estos trabajos es conveniente la creación de una orden de trabajo para el pago de rubros nuevos por un monto de \$ 18.114,60 dólares americanos, que corresponden al 1.99 % del valor del contrato, por lo que se considera como PROCEDENTE el tramite respectivo.</p>				Nº	Rubro, Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total	1	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N°12	M3	223,06	79,45	18.114,60	TOTAL:					18.114,60
	Nº	Rubro, Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total																	
1	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N°12	M3	223,06	79,45	18.114,60																		
TOTAL:					18.114,60																		
Inconsistencia Presupuesto del Rubro																							
MODALIDAD DE CONTRATOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGÚN LA LOSNCP	CONTRATO COMPLEMENTARIO		CUMPLE		NO CUMPLE																		
	Prevista en el Art. 85 y 86, en el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivada, presentadas con su ejecución, las sumas de los contratos referidos no podrán exceder del 8% del valor del contrato principal.																						
	DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA		CUMPLE		NO CUMPLE																		
	Prevista en el Art. 88, que da la posibilidad de pagar cantidades diferentes a las previstas en el contrato, sin necesidad de suscribir un contrato complementario, siempre y cuando se mantengan los planos y especificaciones del contrato y hasta el 5% del contrato principal.																						
	COSTO MÁS PORCENTAJE		CUMPLE	X	NO CUMPLE																		
Para la ejecución de rubros nuevos a través de la modalidad de costo más porcentaje, y con el límite de hasta el 2% del valor del contrato principal, en las situaciones previstas en el artículo 89 de la LOSNCP, se observará el siguiente procedimiento.																							
INSUMOS PREVISTOS	Se anexa presupuesto: \$ 18.114,60 USD (Rubros nuevos)																						
	Análisis de precios:																						
	Oficio N.023- AC-2022																						
COSTOS INDIRECTOS	Los que constan en el contrato principal.																						
FORMA DE PAGO	Global																						
RECOMENDACIONES	Se anexa informes y justificativos técnicos.																						
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (Art. 90 LOSNCP)	CERTIFICADO COMPROMISO N°	644	PARTIDA PRESUPUESTARIA N°	05.01.D511.519.750105.000.000																			
	FECHA:	15-11-2022																					
<p>NOTA: De conformidad con el artículo 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los fiscalizadores y Administradores de los contratos, certifican con su firma que, verificaron y garantizan por ser de su única responsabilidad, el cumplimiento de veracidad y legalidad de las motivaciones, valores, de los documentos justificativos y comprobatorios, y de las modificaciones contractuales autorizadas, garantizando que las mismas, no afectan la calidad, cantidad, la ejecución del contrato y mejoran la programación de la obra.</p>																							



 Firmado electrónicamente por: WILLIAM RODRIGO FUENTES BARRIONUEVO		 Firmado electrónicamente por: FABIAN DARIO SALAZAR LAGUA	
Ing. William Fuentes Representante legal FB FRATES CONS Y SERV CIA LTDA FISCALIZADOR EXTERNO APROBADO		Ing. Fabian Salazar ADMINISTRADOR DE CONTRATO ELABORADO	
 Firmado electrónicamente por: JONATHAN ISRAEL NARVAEZ MACHADO			
Ing. Jonathan Narváez Procurador Común CONSORCIO ASFALTO CANELOS CONTRATISTA ACEPTADO			
 Firmado electrónicamente por: DANIEL ANIBAL RAMOS CAMPAÑA			
PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA Ó DELEGADO AUTORIZADO			



“ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS - LATASAS - CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS,
CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”

PLANILLA DE RUBROS NUEVOS





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA



DPTO. FISCALIZACIÓN

PLANILLA DE RUBROS NUEVOS

OBRA : ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS - LATASAS - CHALLUAYAKU, PAREQUJA CANELOS, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

FECHA DE CONTRATO : Jueves 7 de julio de 2022

CONTRATISTA : CONSORCIO ASFALTO CANELOS

PLAZO : 180 Días a partir de la orden de inicio

AMPLIACIONES : 30 Días

SUSPENSIÓN : 0 Días

TOTAL : 210 Días

FECHA DE PLANILLA : 10 de enero de 2023

INICIO DEL PLAZO : 4 de agosto de 2022

TERMINACIÓN DEL PLAZO : 1 de marzo de 2023

PERÍODO : 01-ene-23

A : 10-ene-23

V. CONTRATO : 908,072.39

V. PLANILLAS : 18,114.60

V. EXCEDENTES : 0.00

% DE AVANCE : 1.99%

PARCIAL ACUMULADO

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	CANTIDADES			IMPORTE		
						T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
1	Muro de Gaviones - Calibre N°12	m ³	228.00	\$ 79.45	\$ 18,114.60	-	228.00	228.00	\$ 0.00	18,114.60	18,114.60
DESCUENTOS:											
Anticipo									\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL									\$ 0.00	\$ 18,114.60	\$ 18,114.60
LIQUIDO									\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

SON: DIECIOCHO MIL CIENTO CATORCE DÓLARES, 60/100 CENTAVOS

Multa por Mora

Contratista:



WILLIAM RODRIGO FUENTES BARRIONUEVO

F.B. FRATRES CONST. Y SERV. CIA. LTDA
FISCALIZADOR



JOSUEAN SANCHEZ NAVAREZ MACHADO

CONSORCIO ASFALTO CANELOS
CONTRATISTA



**“ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS - LATASAS - CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS,
CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**

ANEXO DE CÁLCULO







**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO**

PROYECTO:	"ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS - LATASAS - CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ASFALTO CANELOS		
PLANILLA:	RUBROS NUEVOS	Nº RUBRO:	1
PERIODO:	01-ene-23 - 10-ene-23	UNIDAD:	M3

MURO DE GAVIONES - CALIBRE Nº 12

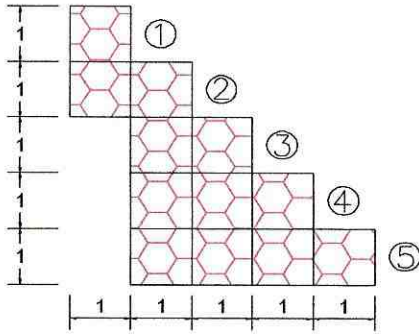

MURO DE GAVIONES ABCISIA 3+060

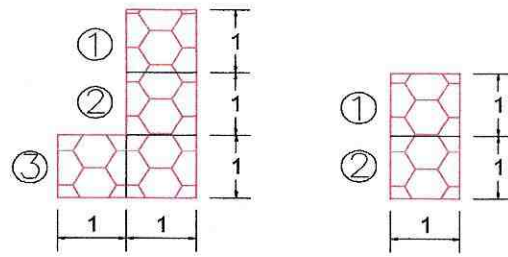

MURO DE GAVIONES ABCISIA 4+400

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
ABSCISA 3+060	FILA 1	20	1	1	20
	FILA 2	15	2	1	30
	FILA 3	12	2	1	24
	FILA 4	10	3	1	30
	FILA 5	10	4	1	40
SUB TOTAL					144
ABSCISA 4+400	FILA 1	14	1	1	14
	FILA 2	18	1	1	18
	FILA 3	11	2	1	22
SUB TOTAL					54
ABSCISA 4+400	FILA 1	16	1	1	16
	FILA 2	14	1	1	14
SUB TOTAL					30
TOTAL					228

TOTAL CONTRACTUAL	228.00	m3
TOTAL EJECUTADO	228.00	m3
CANTIDAD CONTRATADA	228.00	m3
PORCENTAJE EJECUTADO	100%	



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN ISRAEL
NARVAEZ MACHADO

ING. JONATHAN NARVÁEZ
CONSORCIO ASFALTO CANELOS



Firmado electrónicamente por:
WILLIAM RODRIGO
FUENTES BARRIONUEVO

F.B. FRATRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA LTDA.
FISCALIZADOR



**“ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS - LATASAS - CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS,
CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**

ANEXO FOTOGRAFICO





ANEXO FOTOGRÁFICO

PLANILLA RUBROS NUEVOS

Rubro 1: Muro de Gaviones - Calibre N° 12



Firmado electrónicamente por:
**JONATHAN ISRAEL
NARVAEZ MACHADO**

**CONSORCIO ASFALTO CANELOS
CONTRATISTA**



Firmado electrónicamente por:
**WILLIAM RODRIGO
FUENTES BARRIONUEVO**

**F. B. FRATRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA
FISCALIZADOR**



**“ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS - LATASAS - CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS,
CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**

LIBRO DE OBRA



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS - LATASAS - CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"				
UBICACIÓN:	PARROQUIA CANELOS				
CONTRATISTA:	CONSORCIO ASFALTO CANELOS				
FISCALIZADOR:	F.B. FRATRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA			HOJA N.-	151
FECHA DE REPORTE:	Día	01	Mes	Enero	Año
ESTADO DEL TIEMPO	MAÑANA			TARDE	
D= DESPEJADO	N=NUBLADO		LLD=LLUVIA DEBIL	LLF=LLUVIA FUERTE	
PERSONAL			EQUIPO		
SUPERINTENDENTE DE OBRA			APARATOS DE TOPOGRAFÍA		
RESIDENTE DE OBRA			HERRAMIENTA MANUAL		
INGENIERO AMBIENTAL			CONCRETERA 1 SACO		
INGENIERO EN SEGURIDAD			EXCAVADORA SOBRE ORUGAS		
TOPÓGRAFO			VOLQUETES		
CADENEROS			MOTONIVELADORA		
MAESTRO MAYOR			RODILLO VIBRATORIO LISO		
ALBAÑILES			TANQUERO - CAMIÓN CISTERNA		
OPERADOR			MIXER - HORMIGONERA		
AYUDANTE DE MAQUINARIA			TERMINADORA DE ASFALTO		
CHOFER			DISTRIBUIDOR DE ASFALTO		
PEÓN			RODILLO NEUMATICO		
OTROS			ESCOBA MECÁNICA		
			OTROS		

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Día de descanso

ESPACIO PARA FISCALIZACION:

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:



CONSORCIO ASFALTO CANELOS
CONTRATISTA



F.B. FRATRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA
FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS - LATASAS - CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"				
UBICACIÓN:	PARROQUIA CANELOS				
CONTRATISTA:	CONSORCIO ASFALTO CANELOS				
FISCALIZADOR:	F.B. FRATRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA			HOJA N.-	152
FECHA DE REPORTE:	Día	02	Mes	Enero	Año 2023
ESTADO DEL TIEMPO	MAÑANA	N		TARDE	D
D= DESPEJADO	N=NUBLADO		LLD=LLUVIA DEBIL		LLF=LLUVIA FUERTE
PERSONAL			EQUIPO		
SUPERINTENDENTE DE OBRA	1		APARATOS DE TOPOGRAFÍA	1	
RESIDENTE DE OBRA	1		HERRAMIENTA MANUAL	1	
INGENIERO AMBIENTAL			CONCRETERA 1 SACO		
INGENIERO EN SEGURIDAD	1		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS		
TOPÓGRAFO	1		VOLQUETES	8	
CADENEROS	2		MOTONIVELADORA	1	
MAESTRO MAYOR	1		RODILLO VIBRATORIO LISO	1	
ALBAÑILES	8		TANQUERO - CAMIÓN CISTERNA	1	
OPERADOR	2		MIXER - HORMIGONERA		
AYUDANTE DE MAQUINARIA	2		TERMINADORA DE ASFALTO		
CHOFER	9		DISTRIBUIDOR DE ASFALTO		
PEÓN	2		RODILLO NEUMATICO		
OTROS			ESCOBA MECÁNICA		
			OTROS	1	

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Replanteo y nivelación
- Transporte de material subbase 3
- Tendido y compactación de material subbase 3
- Preparación del terreno compactación
- construcción de gaviones

ESPACIO PARA FISCALIZACION:
AUTORIZACIONES:
OBSERVACIONES:


 CONSORCIO ASFALTO CANELOS
 CONTRATISTA



 F.B. FRATRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA
 FISCALIZACIÓN


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS - LATASAS - CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"				
UBICACIÓN:	PARROQUIA CANELOS				
CONTRATISTA:	CONSORCIO ASFALTO CANELOS				
FISCALIZADOR:	F.B. FRATRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA			HOJA N.-	153
FECHA DE REPORTE:	Día	03	Mes	Enero	Año 2023
ESTADO DEL TIEMPO	MAÑANA	N		TARDE	D
D= DESPEJADO	N=NUBLADO		LLD=LLUVIA DEBIL	LLF=LLUVIA FUERTE	
PERSONAL			EQUIPO		
SUPERINTENDENTE DE OBRA	1		APARATOS DE TOPOGRAFÍA	1	
RESIDENTE DE OBRA	1		HERRAMIENTA MANUAL	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1		CONCRETERA 1 SACO		
INGENIERO EN SEGURIDAD	1		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS		
TOPÓGRAFO	1		VOLQUETES	8	
CADENEROS	2		MOTONIVELADORA	1	
MAESTRO MAYOR	1		RODILLO VIBRATORIO LISO	1	
ALBAÑILES	8		TANQUERO - CAMIÓN CISTERNA	1	
OPERADOR	2		MIXER - HORMIGONERA		
AYUDANTE DE MAQUINARIA	2		TERMINADORA DE ASFALTO		
CHOFER	9		DISTRIBUIDOR DE ASFALTO		
PEÓN			RODILLO NEUMATICO		
OTROS			ESCOBA MECÁNICA		
			OTROS		

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Replanteo y nivelación
- Transporte de material subbase 3
- Tendido y compactación de material subbase 3
- Preparación y compactación del terreno
- construcción de muros de gavion

ESPACIO PARA FISCALIZACION:
AUTORIZACIONES:
OBSERVACIONES:


 CONSORCIO ASFALTO CANELOS
CONTRATISTA


 F.B. FRATRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA
FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS - LATASAS - CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"				
UBICACIÓN:	PARROQUIA CANELOS				
CONTRATISTA:	CONSORCIO ASFALTO CANELOS				
FISCALIZADOR:	F.B. FRATRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA			HOJA N.-	154
FECHA DE REPORTE:	Día	04	Mes	Enero	Año
ESTADO DEL TIEMPO	MAÑANA	LLD		TARDE	LLF
D= DESPEJADO	N=NUBLADO		LLD=LLUVIA DEBIL	LLF=LLUVIA FUERTE	
PERSONAL			EQUIPO		
SUPERINTENDENTE DE OBRA	1		APARATOS DE TOPOGRAFÍA	1	
RESIDENTE DE OBRA	1		HERRAMIENTA MANUAL	1	
INGENIERO AMBIENTAL			CONCRETERA 1 SACO		
INGENIERO EN SEGURIDAD	1		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS		
TOPÓGRAFO	1		VOLQUETES	8	
CADENEROS	2		MOTONIVELADORA	1	
MAESTRO MAYOR	1		RODILLO VIBRATORIO LISO	1	
ALBAÑILES	8		TANQUERO - CAMIÓN CISTERNA	1	
OPERADOR	2		MIXER - HORMIGONERA		
AYUDANTE DE MAQUINARIA	2		TERMINADORA DE ASFALTO		
CHOFER	9		DISTRIBUIDOR DE ASFALTO		
PEÓN	2		RODILLO NEUMATICO		
OTROS			ESCOBA MECÁNICA		
			OTROS		

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Replanteo y nivelación
- Transporte de material subbase 3
- Tendido y compactación de material subbase 3
- Preparación y compactación del terreno
- Construcción de muros de gavión

ESPACIO PARA FISCALIZACION:
AUTORIZACIONES:
OBSERVACIONES:


 CONSORCIO ASFALTO CANELOS
 CONTRATISTA



 F.B. FRATRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA
 FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS - LATASAS - CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"				
UBICACIÓN:	PARROQUIA CANELOS				
CONTRATISTA:	CONSORCIO ASFALTO CANELOS				
FISCALIZADOR:	F.B. FRATRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA			HOJA N.-	155
FECHA DE REPORTE:	Día	05	Mes	Enero	Año 2023
ESTADO DEL TIEMPO	MAÑANA	LLD		TARDE	LLD
D= DESPEJADO	N=NUBLADO		LLD=LLUVIA DEBIL	LLF=LLUVIA FUERTE	
PERSONAL			EQUIPO		
SUPERINTENDENTE DE OBRA	1		APARATOS DE TOPOGRAFÍA	1	
RESIDENTE DE OBRA	1		HERRAMIENTA MANUAL	1	
INGENIERO AMBIENTAL	1		CONCRETERA 1 SACO		
INGENIERO EN SEGURIDAD			EXCAVADORA SOBRE ORUGAS		
TOPÓGRAFO	1		VOLQUETES	8	
CADENEROS	2		MOTONIVELADORA	1	
MAESTRO MAYOR	1		RODILLO VIBRATORIO LISO	1	
ALBAÑILES	8		TANQUERO - CAMIÓN CISTERNA	1	
OPERADOR	2		MIXER - HORMIGONERA		
AYUDANTE DE MAQUINARIA	2		TERMINADORA DE ASFALTO		
CHOFER	9		DISTRIBUIDOR DE ASFALTO		
PEÓN	2		RODILLO NEUMATICO		
OTROS			ESCOBA MECÁNICA		
			OTROS		

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Transporte de material subbase 3
- Tendido y compactación de material subbase 3
- Preparación y compactación
- construcción de muros de gavión

ESPACIO PARA FISCALIZACION:

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:



CONSORCIO ASFALTO CANELOS
CONTRATISTA



F.B. FRATRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA
FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS - LATASAS - CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"				
UBICACIÓN:	PARROQUIA CANELOS				
CONTRATISTA:	CONSORCIO ASFALTO CANELOS				
FISCALIZADOR:	F.B. FRATRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA			HOJA N.-	156
FECHA DE REPORTE:	Día	06	Mes	Enero	Año 2023
ESTADO DEL TIEMPO	MAÑANA	LLD		TARDE	N
D= DESPEJADO	N=NUBLADO		LLD=LLUVIA DEBIL	LLF=LLUVIA FUERTE	
PERSONAL			EQUIPO		
SUPERINTENDENTE DE OBRA	1		APARATOS DE TOPOGRAFÍA		
RESIDENTE DE OBRA	1		HERRAMIENTA MANUAL	3	
INGENIERO AMBIENTAL			CONCRETERA 1 SACO		
INGENIERO EN SEGURIDAD	1		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS		
TOPÓGRAFO			VOLQUETES	8	
CADENEROS			MOTONIVELADORA	1	
MAESTRO MAYOR	1		RODILLO VIBRATORIO LISO	1	
ALBAÑILES	8		TANQUERO - CAMIÓN CISTERNA	1	
OPERADOR	2		MIXER - HORMIGONERA		
AYUDANTE DE MAQUINARIA	2		TERMINADORA DE ASFALTO		
CHOFER	9		DISTRIBUIDOR DE ASFALTO		
PEÓN	2		RODILLO NEUMATICO		
OTROS			ESCOBA MECÁNICA		
			OTROS		

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Transporte de material subbase 3
- Tendido y compactación de material subbase 3
- Construcción de muros de gavión

ESPACIO PARA FISCALIZACION:
AUTORIZACIONES:
OBSERVACIONES:


 CONSORCIO ASFALTO CANELOS
CONTRATISTA


 F.B. FRATRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA
FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS - LATASAS - CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"				
UBICACIÓN:	PARROQUIA CANELOS				
CONTRATISTA:	CONSORCIO ASFALTO CANELOS				
FISCALIZADOR:	F.B. FRATRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA			HOJA N.-	157
FECHA DE REPORTE:	Día	07	Mes	Enero	Año
ESTADO DEL TIEMPO	MAÑANA	D		TARDE	D
D= DESPEJADO	N=NUBLADO		LLD=LLUVIA DEBIL	LLF=LLUVIA FUERTE	
PERSONAL			EQUIPO		
SUPERINTENDENTE DE OBRA		1		APARATOS DE TOPOGRAFÍA	
RESIDENTE DE OBRA		1		HERRAMIENTA MANUAL	5
INGENIERO AMBIENTAL				CONCRETERA 1 SACO	
INGENIERO EN SEGURIDAD				EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	
TOPÓGRAFO				VOLQUETES	8
CADENEROS				MOTONIVELADORA	
MAESTRO MAYOR		1		RODILLO VIBRATORIO LISO	
ALBAÑILES		8		TANQUERO - CAMIÓN CISTERNA	
OPERADOR				MIXER - HORMIGONERA	
AYUDANTE DE MAQUINARIA				TERMINADORA DE ASFALTO	
CHOFER		8		DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	
PEÓN		2		RODILLO NEUMATICO	
OTROS				ESCOBA MECÁNICA	
				OTROS	

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Transporte de material subbase 3

- Construcción de muros de gavión

ESPACIO PARA FISCALIZACION:

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:



CONSORCIO ASFALTO CANELOS
CONTRATISTA



F.B. FRATRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA
FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS - LATASAS - CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"				
UBICACIÓN:	PARROQUIA CANELOS				
CONTRATISTA:	CONSORCIO ASFALTO CANELOS				
FISCALIZADOR:	F.B. FRATRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA			HOJA N.-	158
FECHA DE REPORTE:	Día	08	Mes	Enero	Año
ESTADO DEL TIEMPO	MAÑANA	D		TARDE	D
D= DESPEJADO	N=NUBLADO		LLD=LLUVIA DEBIL	LLF=LLUVIA FUERTE	
PERSONAL			EQUIPO		
SUPERINTENDENTE DE OBRA	1		APARATOS DE TOPOGRAFÍA		
RESIDENTE DE OBRA	1		HERRAMIENTA MANUAL		
INGENIERO AMBIENTAL			CONCRETERA 1 SACO		
INGENIERO EN SEGURIDAD			EXCAVADORA SOBRE ORUGAS		
TOPÓGRAFO			VOLQUETES		
CADENEROS			MOTONIVELADORA		
MAESTRO MAYOR	1		RODILLO VIBRATORIO LISO		
ALBAÑILES	4		TANQUERO - CAMIÓN CISTERNA		
OPERADOR			MIXER - HORMIGONERA		
AYUDANTE DE MAQUINARIA			TERMINADORA DE ASFALTO		
CHOFER	8		DISTRIBUIDOR DE ASFALTO		
PEÓN	2		RODILLO NEUMATICO		
OTROS			ESCOBA MECÁNICA		
			OTROS		

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Transporte de material subbase 3

- Construcción de muros de gavion

ESPACIO PARA FISCALIZACION:

Se concluye la semana de actividades sin novedades.

AUTORIZACIONES:
OBSERVACIONES:


CONSORCIO ASFALTO CANELOS
CONTRATISTA



F.B. FRATRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA
FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS - LATASAS - CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"				
UBICACIÓN:	PARROQUIA CANELOS				
CONTRATISTA:	CONSORCIO ASFALTO CANELOS				
FISCALIZADOR:	F.B. FRATRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA			HOJA N.-	159
FECHA DE REPORTE:	Día	09	Mes	Enero	Año 2023
ESTADO DEL TIEMPO	MAÑANA	0		TARDE	0
D= DESPEJADO	N=NUBLADO		LLD=LLUVIA DEBIL	LLF=LLUVIA FUERTE	
PERSONAL			EQUIPO		
SUPERINTENDENTE DE OBRA		1	APARATOS DE TOPOGRAFÍA		
RESIDENTE DE OBRA		1	HERRAMIENTA MANUAL		9
INGENIERO AMBIENTAL		1	CONCRETERA 1 SACO		
INGENIERO EN SEGURIDAD		1	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS		
TOPÓGRAFO			VOLQUETES		8
CADENEROS			MOTONIVELADORA		1
MAESTRO MAYOR		1	RODILLO VIBRATORIO LISO		1
ALBAÑILES		8	TANQUERO - CAMIÓN CISTERNA		1
OPERADOR		2	MIXER - HORMIGONERA		
AYUDANTE DE MAQUINARIA		2	TERMINADORA DE ASFALTO		
CHOFER		9	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO		
PEÓN		2	RODILLO NEUMATICO		
OTROS			ESCOBA MECÁNICA		
			OTROS		1



ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Transporte de material base granular
- Tendido y compactación de material subbase 3
- Colocación del letrero informativo de la obra
- construcción de muros de gavión

ESPACIO PARA FISCALIZACION:

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

 CONSORCIO ASFALTO CANELOS CONTRATISTA	 F.B. FRATRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA FISCALIZACIÓN
--	--

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS - LATASAS - CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"				
UBICACIÓN:	PARROQUIA CANELOS				
CONTRATISTA:	CONSORCIO ASFALTO CANELOS				
FISCALIZADOR:	F.B. FRATRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA			HOJA N.-	160
FECHA DE REPORTE:	Día	10	Mes	Enero	Año 2023
ESTADO DEL TIEMPO	MAÑANA	0		TARDE	0
D= DESPEJADO	N=NUBLADO		LLD=LLUVIA DEBIL	LLF=LLUVIA FUERTE	
PERSONAL			EQUIPO		
SUPERINTENDENTE DE OBRA	1		APARATOS DE TOPOGRAFÍA		
RESIDENTE DE OBRA	1		HERRAMIENTA MANUAL	8	
INGENIERO AMBIENTAL			CONCRETERA 1 SACO		
INGENIERO EN SEGURIDAD	1		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS		
TOPÓGRAFO			VOLQUETES	8	
CADENEROS			MOTONIVELADORA	1	
MAESTRO MAYOR	1		RODILLO VIBRATORIO LISO	1	
ALBAÑILES	8		TANQUERO - CAMIÓN CISTERNA	1	
OPERADOR	2		MIXER - HORMIGONERA		
AYUDANTE DE MAQUINARIA	2		TERMINADORA DE ASFALTO		
CHOFER	9		DISTRIBUIDOR DE ASFALTO		
PEÓN	2		RODILLO NEUMATICO		
OTROS			ESCOBA MECÁNICA		
			OTROS		

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Transporte de material base granular
- Tendido y compactación de material subbase 3
- Construcción de muros de gavión

ESPACIO PARA FISCALIZACION:
AUTORIZACIONES:
OBSERVACIONES:


 CONSORCIO ASFALTO CANELOS
 CONTRATISTA



 F.B. FRATRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA
 FISCALIZACIÓN



**“ASFALTADO DE LA VÍA CANELOS - LATASAS - CHALLUAYAKU, PARROQUIA CANELOS,
CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**

DOCUMENTOS IESS





CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) NARVAEZ MACHADO JONATHAN ISRAEL, representante legal de la empresa CONSORCIO ASFALTO CANELOS con RUC Nro. 1691728888001 y dirección BARRIO ESPERANZA. LA ESPERANZA AV. LUIS A. MARTINEZ 508 JUAN MONTALVO . SN. SN. A 50 METROS ESCUELA., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Firmado electrónicamente por:


**KARLA DENISSE
BERMUDEZ ROLDAN**

Abg. Karla Denisse Bermúdez Roldán

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 14 de febrero de 2023

Validez del Certificado 30 días



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Consulta Rol Empleados

Fecha : 08/02/2023

Denominación de la Empresa

Nombre del Empleador: CONSORCIO ASFALTO CANELOS

Ruc: 169172888001

Nombre Sucursal: 0001 CONSORCIO ASFALTO CANELOS

Nombre	Cédula	Actividad	Actividad Sectorial	Relación de Trabajo	Forma Pago	% Aportación	% Cesantía Aportación	Sueldo	Sueldo Extra	Días mod	Valor días Mod	Total Afiliado
ESCOBAR ALVAREZ DARLIN VLADIMIR	0401474911	PEON	1406452000023	05-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	461.70	0.00	0	0.00	461.70
LOZA LESCANO HECTOR RODRIGO	1600359290	PEON	1406452000023	05-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	461.70	0.00	0	0.00	461.70
LOZA LESCANO WILLIAM N/C	1600175358	PROFESIONALES CON TITULO DE TERCER NIVEL	19100000000043	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	2000.00	0.00	0	0.00	2000.00
NATVAEZ MACIAGO JONATHAN ISRAEL	1600796550	GERENTE - AFINES	1918200000101	05-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	2000.00	0.00	0	0.00	2000.00
ORTEGA MACIAGE IVAN AMADEO	1204418113	PEON	1406452000023	05-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	P	20.6	0.0	461.70	0.00	0	0.00	461.70
Total Rol												
								5385.10	0.00		0.00	5385.10

BANCO INTERNACIONAL

RECAUDACIONES IESS EN VENTANILLA
Sucursal.....: EL PUYO 0320
Fecha.....: 14/02/2023 13:39:19
Nombre.....: CONSORCIO ASFALTO CANELO
Identificación.: R1691728888001
N° Comprobante...: 0000000166642994
T Comprobante...: PAGO DE PLANILLAS
Período.....: 202301
Tipo Pago.....: Débito a Cuenta
Valor Total.....: 1,163.19
Comisión.....: 0.57
Secuencia.....: 00009909
Cajero.....: BINVELIN - 325

Cliente / Copia Banco

Serficiador de servicios planilla

Form. 999-1390





febrero 08 del 2023 13:13

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO ASFALTO CANELOS

NARVAEZ MACHADO JONATHAN ISRAEL

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000166642994

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,

Emitido en: 2023-02-08

No. RUC / REGISTRO: 1691728888001 - 0001

Fecha de Vigencia de Pago: 2023-02-15

Nombre / Razón Social /
Organización:

CONSORCIO ASFALTO CANELOS - CONSORCIO ASFALTO CANELOS

Periodo de Pago:

2023 - 01

Forma de pago:

Fondos propios

Observación:

Valor	1163.19
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	1163.19
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	1163.19

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmege

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido)

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones
