

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

## COMPROBANTE DE PAGO N° 549

Fecha: 04/04/2023

Asiento N° 1417

Compromiso N° 411

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210014

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **CONSORCIO ESTADIO TARQUI**

**USD 130,880.28**

LA SUMA DE: **CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Dolares 28/100 CtvS**

PUYO, 04 de Abril del 2023

### DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO ESTADIO TARQUI.- PAGO DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 2 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N2 DEL PROCESO COTO-GADPPz-017-2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FÚTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA" REF. ASIEN TO DE DIARIO N 1287 DE FECHA 16/03/2023.

Usuario: ALE

### DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor
CTA 3001570156	CONSORCIO ESTADIO TARQUI	130,880.28
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		130,880.28

### APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	130,880.28	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		130,880.28
SUMAN o PASAN USD		130,880.28	130,880.28

### APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
02.01.1801.805.750199.000.000 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			130,880.28
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	130,880.28

ING. JAIME GUEVARA B.  
Prefecto Provincial

ING. JOSE MARIN  
Director Financiero E

LCDA. MARILU ORDOÑEZ  
Contadora General

ING. JORGE LO  
Tesorer

04/04/2023 10:15

Página 1/1

TRB-192  
20/04/2023

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA****COMPROBANTE DE DIARIO N° 673**

Fecha: 16/03/2023

Asiento N° 1287

Compromiso N° 411

Retención N° 001-010-000020679

## DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO ESTADIO TARQUI.- CONTABILIZACION DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 2 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N2 DEL PROCESO COTO-GADPPz-017-2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FÚTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

Usuario: ALE

DOCUMENTOS			
Fecha	Documento	No Autorización	Valor
16/03/2023	FACTURA	00110000000002 22998254610	303,962.59

APLICACION CONTABLE			
Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IVA	32,567.42	
1.5.1.51.99.001	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	271,395.17	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS		266,645.75
2.1.3.75.01.112	IMPUESTO A LA RENTA 1.75%		4,749.42
2.1.3.81.14.001	CXP IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI		32,567.42
SUMAN o PASAN USD		303,962.59	303,962.59

APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
02.01.1801.805.750199.000.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		271,395.17	
TOTAL GASTOS USD		0.00	271,395.17	0.00



LCDA. MARILU ORDOÑEZ  
Contadora General



ING. ALEXANDRA POZO  
Contador 1

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA****COMPROBANTE DE DIARIO N° 674**

Fecha: 16/03/2023

Asiento N° 1288

Compromiso N° 411

## DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO ESTADIO TARQUI.- CONTABILIZACION DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 2 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N2 DEL PROCESO COTO-GADPPz-017-2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FÚTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA" COBRO DEL ANTICIPO.

Usuario: ALE

## APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS AI	135,765.47	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	135,765.47	
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES		135,765.47
1.2.4.97.08.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTER. DE GAD'S Y EMPR. F		135,765.47
SUMAN o PASAN USD		271,530.94	271,530.94

## APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
02.01.1801.805.750199.000.000 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			135,765.47
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	135,765.47
01.01.A100.114.380108.000.000 DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS		135,765.47	135,765.47
TOTAL INGRESOS USD		135,765.47	135,765.47

LCDA. MARILU ORDOÑEZ  
Contadora General

ING. ALEXANDRA POZO  
Contador 1

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

## Compromiso No: 411

Transacción No: 2621

Fecha: 16/03/2023

Proveedor: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

Identificación: Ruc 1691728994001

Programa: 02 FUNCION SERVICIOS GESTION DEL TERRITORIO  
SubPrograma: 01 POLITICO INSTITUCIONAL  
Proyecto: 1801 COOPERACION INSTITUCIONAL  
Actividad: 805 COOPERACION INSTITUCIONAL

### DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO	4479-M	08/02/2023	0.00	DIRECCION DE FISCALI

#### DETALLE:

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 02 PROYECTO CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL  
REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI

MARCELO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
02.01.1801.805.750199.000.000 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	556,132.89	594,383.36
Total =>	556,132.89	594,383.36



JORGE MARCELO CUEVA  
ROMERO

Jefe De Presupuesto



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 24-4-2023

Hora: 10:28:34

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: LOPEZ PAREDES JORGE RODRIGO 1210014

Num. Ref. BCE.:18688621

Institución Pública: GAD PROV PASTAZA						# Cta.: 1210014		
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced. Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANECUADOR B.P.	3001570156	130,880.28	192	1691728994001	CONSORCIO ESTADIO TARQUI	1	21-04-2023 17:54:09	ACREDITADA
BANCO DEL PACIFICO	7708165	65,228.56	192	1600485336	REYES VILLACRES KATHERINE LILI	1	21-04-2023 17:37:53	ACREDITADA
<b>Total:</b>	<b>196,108.84</b>	<b>Reg.:2</b>						

[Atrás](#)



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
**PROVINCIAL DE PASTAZA**

Dirección: Francisco de Orellana y 27 de Febrero

Teléfono: 032885380 / Fax: 032886179

E-mail: financiero@pastaza.gob.ec

Web: www.pastaza.gob.ec

Contribuyente Especial: 590

RUC: 1660000170001

COMPROBANTE DE RETENCION

Nº 001-010-000020679

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202307166000017000120010100000206791438919211

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

05/04/2023 8:40:24

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1603202307166000017000120010100000206791438919211

Razon Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

RUC/CI: 1691728994001

Fecha Emisión: 16 de Marzo del 2023

Guía de Remisión:

Número de Documento	Cód. SRI	Descrip. Reten.	% Reten.	Base Retención	Valor Retenido
001-100-000000002	346	1.75% IMPUESTO A LA RENTA	1.75	271,395.17	4,749.42
001-100-000000002	731	100% SRI RESOLUCION 074 075	100.00	32,567.42	32,567.42
				Total	37,316.84

Información Adicional:

Dirección:

Teléfono:

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1691728994001

FACTURA

No. 001-100-000000002

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202301169172899400120011000000000022998254610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/03/2023 11:40:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202301169172899400120011000000000022998254610

CONSORCIO ESTADIO TARQUI

Dirección Matriz: Barrio: MIRAFLORES Calle: RAFAEL VEGA Intersección: EZEQUIEL CAMPAÑA

Dirección Sucursal: Barrio: MIRAFLORES Calle: RAFAEL VEGA Intersección: EZEQUIEL CAMPAÑA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Identificación 1660000170001

Fecha 16/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°2	CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA. REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N2 -\$135.77	271530.94	0.00	0.00	135.77	271395.17

Información Adicional	
Email:	financiero@pastaza.gob.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	303962.59

SUBTOTAL 12%	271395.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	271395.17
TOTAL DESCUENTO	135.77
ICE	0.00
IVA 12%	32567.42
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	303962.59
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
SECRETARÍAPastaza  
Fecha:

28 FEB 2023

Recibido:

Pao Rea

Número:

4629

Hora:

16h17

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4629-M

Puyo, 28 de febrero de 2023

**PARA:** Sr. Téc. Jose Mauricio Marin Montero  
**Director Financiero (E)****ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO PLANILLA DE AVANCE N° 2 DEL PROCESO COTO-GADPPz-017-2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FÚTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

En referencia a los documentos: OFICIO SN-GADPPz-2023, de fecha 03 de febrero de 2023, suscrito por el ingeniero Cristian Parra – Procurador Común del Consorcio Estadio Taqui; Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACIÓN-2023-4588-M, de fecha 24 de febrero de 2023, suscrito por el ingeniero Robert Quintana – Fiscalizador 1; y, Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-9641-M, de fecha 24 de febrero de 2023, suscrito por el ingeniero Daniel Ramos – Director de Obras Públicas (Administrador de Contrato), hago hincapié lo siguiente:

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado 408-17 Administrador del contrato, que indica: *"El administrador del contrato velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sí para lograr el éxito del proyecto.- Es función del administrador del contrato establecer un sistema que evalúe el logro de los objetivos, mediante el cual pueda obtenerse información sobre su estado. Esto con el fin de tomar oportunamente acciones correctivas o para informar a las autoridades de la entidad sobre el desarrollo del proyecto"*

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado 408-18 Jefe de Fiscalización, indica: *"El Jefe de Fiscalización establecerá un sistema para asegurar la correcta ejecución de la obra, mediante el control de la calidad, el avance físico y el avance financiero de la obra. Dichos controles conllevan una evaluación mensual, de los aspectos mencionados y la comunicación de resultados a los mandos superiores, incluyendo los problemas surgidos, especialmente cuando afectan las condiciones pactadas en relación al plazo, presupuesto y calidad de la obra.- El Jefe de Fiscalización, se asegurará de que la obra se ejecute de conformidad con las bases establecidas en los estudios de preinversión, es decir, de acuerdo con el diseño definitivo, las especificaciones y demás normas técnicas aplicables, para lograr obtener del proyecto los beneficios esperados"*.

Con estos antecedentes, adjunto al presente la Planilla de Avance N° 02 (con todos los anexos), del proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FÚTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**, documentación que ha sido revisada y aprobada por el Administrador de Contrato y Fiscalizador; por lo que, en base a los informes anexos, se determina como viable y procedente realizar el pago de \$ 135.629,70 USD (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 70/100), a favor del Consorcio Estadio Taqui, representado legalmente por el



**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4629-M**

**Puyo, 28 de febrero de 2023**

ingeniero Cristian Parra Ushca, de acuerdo al siguiente detalle:

PLANILLA DE AVANCE N° 02	\$ 271.530,94 USD
ANTICIPO DEVENGADO (-)	\$ 135.765,47 USD
REAJUSTE PLANILLA AVANCE N° 02	\$ - 135,77 USD
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 135.629,70 USD</b>

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Ing. Adán Mariño Montesdeoca  
**DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, SUBROGANTE**

Referencias:

- GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-9641-M

Anexos:

- img20230215\_17093947.pdf
- informe\_no\_003-dga-fa-jga-jr-2023.docx-signed.pdf
- ficha-pma.pdf
- 6.\_planilla\_2.rar
- 5.\_libro\_de\_obra\_enero.rar
- 4.\_conformidad\_ambiental\_2.rar
- 3.\_facturas.rar
- 2.\_anexos.rar
- 1.\_reprogramación\_1.rar
- oficios\_-contratista.pdf
- informe\_no\_003\_gadppz-dga-jga-s\_c\_m-jr-2023-signed0576077001674828247.pdf
- recibido\_obs.pdf
- coto-017-2022\_inf\_de\_adm\_contr\_plan\_n°\_2.pdf
- coto-017-2022\_check\_list\_adm\_contr\_plan\_n°\_2.pdf

Copia:

Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaria Ejecutiva 2** / Sr. Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña - **Director de Obras Publicas /**

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - Secretaria Ejecutiva 2

175% = 4.749.42,11 ✓  
Ant = 135.765.47 ✓  
Benef = 130.880.28,11 ✓

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL  
Pastaza  
Fecha: 28 FEB 2023

Ejecutar el control previo y efectuar  
La contabilización, conforme leyes y  
Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL  
Pastaza  
Fecha: 28 FEB 2023

Ejecutar el control previo al pago  
Conforme leyes y reglamentos  
Vigentes.



Firmado electrónicamente por:  
ADÁN MARIÑO  
MONTEDEOCA



GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA



DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

24 FEB 2023

Memorando Nro. GADPPZ-OBRA-PUBLICA-2023-9641-M

De: JONARA M.  
Hora: 15 h 04

Puyo, 24 de febrero de 2023

**PARA:** Sr. Ing. Adán Mariño Montesdeoca  
**Director de Fiscalización (E), Subrogante**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE AVANCE N° 2 DEL PROCESO COTO-GADPPz-017-2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FÚTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

De mi consideración:

Señor Director, reciba un atento y cordial saludos, en referencia al OFICIO SN-GADPPZ-2023, de fecha 03 de febrero de 2023, suscrito por el Consorcio Estadio Tarqui, con su procurador común el Ing. Parra Ushca Cristian Fernando, CONTRATISTA, en el cual señala "...*me permito realizar el ingreso de la planilla de AVANCE N2, para su respectivo tramite de revisión y aprobación*", y en referencia al Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACIÓN-2023-4588-M, de fecha 24 de febrero de 2023, suscrito por el Ing. Quintana Muñoz Robert Fernando, FISCALIZADOR DE OBRA; de conformidad a lo establecido en el contrato celebrado entre el GADPPz y el Consorcio Estadio Tarqui, con su procurador común el Ing. Parra Ushca Cristian Fernando, CONTRATISTA, del proceso COTO-GADPPz-017-2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FÚTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA". CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO "...6.01 La contratante entregara al contratista en un plazo máximo de treinta días el 50% referente al anticipo del valor total del contrato.

Se realizará el de pago de la siguiente forma: Se otorgará un anticipo de 50% del valor del contrato y con una forma de pago por planilla de 50%. El 50 por ciento restante se lo hará mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el Administrador del Contrato.", razón por la cual por su intermedio me permito remitir el informe de Administrador de Contrato Aprobando la Planilla de Avance N° 1, el valor a pagar en este periodo es el siguiente:

● Monto Total Planilla de Avance N° 2:	\$ 271.530,94
● Descuento Anticipo 50%:	\$ - 135.765,47
● Reajuste Provisional Planilla de Avance N° 2:	\$ - 135,77
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 135.629,70</b>
*Valor que no incluye IVA*	
El porcentaje de avance acumulado del proyecto:	% <b>49.48</b>

Particular que remito para los fines pertinentes.

Atentamente,



**Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-9641-M**

**Puyo, 24 de febrero de 2023**

***Documento firmado electrónicamente***

Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

Referencias:

- GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4588-M

Anexos:

- img20230215\_17093947.pdf
- ficha-pma.pdf
- informe\_no\_\_003-dga-fa-jga-jr-2023.docx-signed.pdf
- recibido\_obs.pdf
- informe\_no\_\_003\_gadppz-dga-jga-s\_c\_m-jr-2023-signed0576077001674828247.pdf
- oficios\_contratista.pdf
- 1\_reprogramación\_1.rar
- 2\_anexos.rar
- 3\_facturas.rar
- 4\_conformidad\_ambiental\_2.rar
- 5\_libro\_de\_obra\_enero.rar
- 6\_planilla\_2.rar
- coto-017-2022\_inf\_de\_adm\_contr\_plan\_n°\_2.pdf
- coto-017-2022\_check\_list\_adm\_contr\_plan\_n°\_2.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sr. Lcdo. Jorge Roberto Arboleda Basantes - Asistente Administrativo 2



Firmado electrónicamente por:  
**DANIEL ANIBAL RAMOS  
CAMPANA**



## Informe Técnico No. 091-GADPPz-OOPP-2022

Puyo, 24 de febrero de 2023

**ASUNTO:** PLANILLA DE AVANCE N° 2 DEL PROCESO COTO-GADPPz-017-2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FÚTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

En base a la **NOTIFICACIÓN DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO N° 187-2022**, de fecha 30 de noviembre de 2022, se me designa como Administrador de Contrato del proyecto **COTO-GADPPz-017-2022**, para el "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FÚTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", con un presupuesto referencial de **\$556.132,89** (Quinientos Cincuenta Y Seis Mil Ciento Treinta Y Dos Con 89/100) Dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. En un plazo de **Ciento Veinte (120) días**.

Mediante el Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACIÓN-2023-4588, de fecha 24 de febrero de 2023, suscrito por el Ing. Quintana Muñoz Robert Fernando, Fiscalizador del GADPPz, entrega la documentación habilitante de la Planilla de Avance N° 2.

Nº	REFERENCIA	DETALLE
1.-	Contrato No.	COTO-GADPPz-017-2022
2.-	Fecha de suscripción	29 DE NOVIEMBRE DE 2022
3.-	Monto del Contrato Principal	\$ 556.132,89 USD Sin IVA
4.-	Objeto del Contrato	CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FÚTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.
5.-	Porcentaje del anticipo	50 %
6.-	Monto del Anticipo	\$ 278.066,45 USD
7.-	Plazo Contractual	CIENTO VEINTE (120) DÍAS

Los valores y cantidades ejecutados del contrato que constan en la Planilla de Avance N° 2 son los siguientes:

- Periodo de la Planilla de Avance N° 2: 01 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023
- Plazo contractual: 120 Días calendario
- Monto Total Planilla de Avance N° 2: \$ 271.530,94
- Descuento Anticipo 50%: \$ - 135.765,47
- Reajuste Provisional Planilla de Avance N° 2: \$ - 135,77
- Porcentaje de avance parcial del proyecto: % 48.82



- Porcentaje de avance acumulado del proyecto: % 49.48

De acuerdo a la Planilla de Avance N° 2, aprobada bajo responsabilidad de la FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO, y a su vez se encuentra aprobada por el Administrador de Contrato, el valor a pagar en este periodo es el siguiente:

• Monto Total Planilla de Avance N° 2:	\$ 271.530,94
• Descuento Anticipo 50%:	\$ - 135.765,47
• Reajuste Provisional Planilla de Avance N° 2:	\$ - 135,77
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 135.629,70</b>

\*Valor que no incluye IVA\*

El porcentaje de avance acumulado del proyecto: % 49.48

Es todo cuanto puedo informar para los fines pertinentes.

Atentamente,



DANIEL ANÍBAL RAMOS  
CAMPANA

Ing. Ramos Campaña Daniel Aníbal.  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.**

**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4588-M**

Puyo, 24 de febrero de 2023

**PARA:** Sr. Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña  
**Director de Obras Publicas****ASUNTO:** TRÁMITE DE PLANILLA DE AVANCE N° 2 DEL PROYECTO:  
CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL  
REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI,  
CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA

Por medio del presente me permito informarle que en mi calidad de Fiscalizador, de acuerdo a los Art. 408-19 de las NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS, he procedido a **APROBAR LA PLANILLA DE AVANCE N° 02**, del Contrato "CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA", para lo cual en cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas en el CONTRATO-CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO, agradeceré proceder con el trámite respectivo para cancelar a favor del **CONSORCIO ESTADIO TARQUI**, donde es Procurador Común el Ing. Cristian Parra, el valor de **\$ 135.629,70 USD** (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 70/100), conforme al siguiente detalle:

VALOR LÍQUIDO DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 02:	\$ 135.765,47 USD
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE AVANCE N° 02:	<u>\$ - 135,77 USD</u>
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 135.629,70 USD</b>

Se adjunta toda la información relevante en físico y original, firmas y recibidos, Conformidad Ambiental recibida el 16 de febrero de 2023.

Atentamente

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***Ing. Robert Fernando Quintana Muñoz  
**FISCALIZADOR 1**Referencias:  
- GADPPZ-DGA-2023-13864-M



**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4588-M**

**Puyo, 24 de febrero de 2023**

Anexos:

- img20230215\_17093947.pdf
- oficios\_-contratista.pdf
- informe\_no\_\_003\_gadppz-dga-jga-s\_c\_m-jr-2023-signed0576077001674828247.pdf
- recibido\_obs.pdf
- informe\_no.\_003-dga-fa-jga-jr-2023.docx-signed.pdf
- ficha-pma.pdf
- 1.\_reprogramación\_1.rar
- 2.\_anexos.rar
- 3.\_facturas.rar
- 4.\_conformidad\_ambiental\_2.rar
- 5.\_libro\_de\_obra\_enero.rar
- 6.\_planilla\_2.rar



Firmado electrónicamente por:  
**ROBERT FERNANDO  
QUINTANA MUÑOZ**

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE  
CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA  
PROVINCIA DE PASTAZA**

**ING. ROBERT QUINTANA  
FISCALIZADOR**

**INFORME DE FISCALIZACIÓN N° 02**

<b>PROYECTO :</b>	CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA	
<b>CONTRATISTA :</b>	CONSORCIO ESTADIO TARQUI	
<b>MONTO DEL CONTRATO :</b>	556,132.89 \$	
<b>PERIÓDO DEL INFORME :</b>	1 de enero de 2023	31 de enero de 2023
<b>FECHA DE ELABORACIÓN :</b>	23 de febrero de 2023	

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN:

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA
CÓDIGO DEL PROCESO	COTO-GADPPz-017-2022
MONTO DEL CONTRATO	556,132.89 \$
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 de noviembre de 2022
PLAZO CONTRACTUAL	120 DÍAS
MONTO DEL ANTICIPO	278,066.45 \$
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	16 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO DE TRABAJO	21 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	20 de abril de 2023
SUSPENSIÓN DE TRABAJO	
AMPLIACIÓN DE PLAZO	0 DÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO ESTADIO TARQUI
GEOREFERENCIACIÓN DEL PROYECTO	

## 2. PERIODO DEL INFORME

Se ha realizado por parte de la fiscalización y la administración del contrato un permanente seguimiento de las actividades ejecutadas y la prevención de los trabajos con recomendaciones que posteriormente se refleja en la terminación del proyecto.

En la ejecución de cada rubro, se verifico que el contratista utilice el equipo ofertado y necesario para su realización, con las mejores prácticas constructivas, mantuvo en obra el personal capacitado y en número suficiente.

## 3. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE PERÍODO

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO		
			CANT.	EJECUT.	%
	OBRAS PRELIMINARES				
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	m2	9,500.00	0.00	124.80%
2	DESBROCE Y LIMPIEZA	m2	2,300.00	0.00	151.34%
	MOVIMIENTOS DE TIERRA PLATAFORMA				
3	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	m3	1,335.00	0.00	0.00%
4	RELLENO COMPACTADO A MAQUINA	m3	2,125.00	11578.73	544.88%
5	TRANSPORTE DE LASTRE	M3/KM	32,000.00	223469.49	698.34%
6	MINADA, CARGADA Y REGADA DE MATERIAL PETREO SU	m3	2,125.00	0.00	0.00%
7	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE (EG	m2	9,800.00	0.00	0.00%
8	DESALOJO DE MATERIAL CONTAMINADO	m3	1,450.00	1637.16	112.91%
	CANCHA CINTÉTICA				
9	EXCAVACION EN CONGLOMERADO DE ZANJAS	m3	850.00	0.00	0.00%
10	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO, TRITURADO, AREN	m3.km	18,052.00	0.00	0.00%
11	PROVISIÓN DE MATERIAL TRITURADO DE 2" A 3/4"	m3	750.00	0.00	0.00%
12	PROVISIÓN DE ARENA DE RIO.	m3	285.60	0.00	0.00%
13	TENDIDO DE MATERIAL PETREO, TRITURADO, ARENA A l	m3	1,035.00	0.00	0.00%
14	MALLA GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	7,140.00	733.76	10.28%
15	TUBERÍA DE 160 MM PARA DRENAJES, INCLUYE ACCESO	m	850.00	0.00	0.00%

16	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CESPED SINTÉTICO NOR	m2	7,140.00	3360.00	47.06%
17	CANAL RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE HOR	m	225.00	0.00	0.00%
18	CAJA DE REVISIÓN H.S. F'C=210 KG/CM2. INCLUYE TAPA	u	4.00	0.00	0.00%
19	POZO DE REVISION DE H=1,00 A 2,00M, (TAPA, CERCO Y P	u	1.00	0.00	0.00%
20	POZO DE REVISION DE H=2,01 A 3,00M, (TAPA, CERCO Y P	u	1.00	0.00	0.00%
21	ARCOS METÁLICOS DE FUTBOL, INCLUYE RED	u	2.00	0.00	0.00%
22	HORMIGÓN SIMPLE DE 180 KG/CM2 EN CAMINERÍAS PER	m3	300.00	0.00	0.00%
	ZONA TÉCNICA				
23	EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJAS	m3	6.00	22.40	373.33%
24	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 (PERFILES Y PLACAS)	kg	500.00	0.00	0.00%
25	CUBIERTA ESTIL PANEL .40MM	m2	25.00	0.00	0.00%
26	CANAL RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIAS	m	20.00	0.00	0.00%
27	HORMIGÓN SIMPLE DE 210 KG/CM2, INCLUYE ENCOFRAI	m3	5.00	0.00	0.00%
28	REPLANTILLO H.S. 180 KG/CM2	M3	1.00	0.00	0.00%
29	MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3	3.00	14.00	466.67%
30	ACERO DE REFUERZO FY=4200 CON ALAMBRE GALV. 18	kg	750.00	0.00	0.00%
	GRADERIO BAÑOS				
31	EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJAS	m3	33.00	0.00	0.00%
32	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 (PERFILES Y PLACAS)	kg	4,900.00	0.00	0.00%
33	CUBIERTA ESTIL PANEL .40MM	m2	217.00	0.00	0.00%
34	CANAL RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIAS	m	17.00	0.00	0.00%
35	HORMIGÓN SIMPLE DE 210 KG/CM2 EN PLINTOS , INCLUY	m3	32.00	0.00	0.00%
36	HORMIGÓN SIMPLE DE 210 KG/CM2 EN CADENAS , INCLY	m3	41.00	0.00	0.00%
37	HORMIGÓN SIMPLE DE 210 KG/CM2 EN COLUMNAS , INCL	m3	37.00	0.00	0.00%
38	HORMIGÓN SIMPLE DE 210 KG/CM2 EN GRADAS , INCLUY	m3	115.00	0.00	0.00%
39	REPLANTILLO H.S. 180 KG/CM2	m3	10.00	0.00	0.00%
40	MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3	30.00	0.00	0.00%
41	ACERO DE REFUERZO FY=4200 CON ALAMBRE GALV. 18	kg	6,200.00	0.00	0.00%
42	ENLUCIDO CON MORTERO 1:3 + IMPERMEABILIZANTE	m2	350.00	0.00	0.00%
43	MAMPOSTERIA DE BLOQUE ALIVIANADO E=10 CM	m2	150.00	0.00	0.00%
44	MAMPOSTERIA DE BLOQUE ALIVIANADO E=15 CM	m2	250.00	0.00	0.00%
45	ESTUCADO DE PARED, CON EMPASTE INTERIOR	m2	175.00	0.00	0.00%
46	ESTUCADO DE PARED, CON EMPASTE EXTERIOR	m2	225.00	0.00	0.00%
47	PINTURA ESMALTE INTERIOR	m2	175.00	0.00	0.00%
48	PINTURA ESMALTE EXTERIOR	m2	225.00	0.00	0.00%
49	PUERTA DE MADERA TAMBORADA 1.20X2.10	u	4.00	0.00	0.00%
50	PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO	u	10.00	0.00	0.00%
51	INODORO CON FLUXOMETRO CRCONS	u	4.00	0.00	0.00%
52	LAVAMANOS CON GRIFERIA Y ACCESORIOS	u	4.00	0.00	0.00%
53	URINARIO CON ACCESORIOS	u	4.00	0.00	0.00%
54	DUCHA SENCILLA CROMADA COMPLETA - INCL. MEZCLA	u	4.00	0.00	0.00%
55	CERAMICA DE PISO DE 30 x 30 cm. ANTIDESLIZANTE	m2	120.00	0.00	0.00%
56	CERAMICA PARA PARED	m2	125.00	0.00	0.00%
57	TUBERÍA DE AGUA FRIA PVC DE 1/2"	m	180.00	0.00	0.00%
58	PUNTO DE AGUA FRIA PVC DE 1/2"	u	15.00	0.00	0.00%
59	Acometida de agua potable, incluye medidor y valvula de contro	u	1.00	0.00	0.00%
60	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 200 mm FACOTEL	m	45.00	0.00	0.00%
61	BAJANTE AGUA LLUVIA PVC 110MM	m	45.00	0.00	0.00%
62	BAJANTE AGUA LLUVIA PVC 160MM	m	150.00	0.00	0.00%
63	DESAGUE PVC 110MM	pt	8.00	0.00	0.00%
64	DESAGUE PVC 50 mm	pto	10.00	0.00	0.00%
65	DESAGUE PVC 75MM	pto	4.00	0.00	0.00%
66	ACOMETIDA ELECTRICA (TW#10)	m	100.00	0.00	0.00%
67	PUNTO DE ILUMINACIÓN CON CABLE THHN FLEX #12 Y	u	20.00	0.00	0.00%
	CERRAMIENTO PERIMETRAL				

68	EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJAS	m3	120.00	1795.80	1496.50%
69	HORMIGÓN SIMPLE DE 210 KG/CM2 EN PLINTOS , INCLUY	m3	20.00	29.66	148.30%
70	HORMIGÓN SIMPLE DE 210 KG/CM2 EN CADENAS , INCLY	m3	25.00	11.18	44.72%
71	HORMIGÓN SIMPLE DE 210 KG/CM2 EN COLUMNAS , INCI	m3	19.50	15.30	78.46%
72	REPLANTILLO H.S. 180 KG/CM2	m3	9.00	16.09	178.78%
73	MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3	25.00	51.38	205.52%
74	ACERO DE REFUERZO FY=4200 CON ALAMBRE GALV. 18	kg	3,000.00	6225.47	207.52%
75	ENLUCIDO CON MORTERO 1:3 + IMPERMEABILIZANTE	m2	250.00	0.00	0.00%
76	ESTUCADO DE PARED, CON EMPASTE INTERIOR	m2	500.00	0.00	0.00%
77	PINTURA ESMALTE EXTERIOR	m2	500.00	0.00	0.00%
78	MAMPOSTERIA DE BLOQUE ALIVIANADO E=10 CM	m2	250.00	0.00	0.00%
79	CERRAMIENTO DE MALLA TRIPLE GALVANIZADA H=1.60	m	200.00	0.00	0.00%

#### 4. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

El monto contractual del proyecto, alcanza la suma de US \$556,132.89 (SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES DÓLARES, 47/100 CENTAVOS) para la obra: CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA.

VALOR TOTAL DEL PROYECTO	556,132.89 \$	100.00%
VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO	278,066.45 \$	50.00%

#### 5. PLANILLAS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS

PLANILLAS	VALORES MONTO PROGRAMADO		MONTO PLANILLADO			% AVANCE PROGRAMADO		% AVANCE REAL	
	MES	ACUMUL.	ANTER.	ACTUAL	ACUMUL.	MES	ACUMUL.	MES	ACUMUL.
PLAN. 1	1,304.00 \$	1,304.00 \$		3,629.81 \$	3,629.81 \$	0.23%	0.23%	0.65%	0.65%
PLAN. 2	99,930.84 \$	99,930.84 \$		271,530.94 \$	275,160.75 \$	17.97%	18.20%	48.82%	49.48%
TOTAL	101,234.84 \$	101,234.84 \$	0.00 \$	275,160.75 \$	275,160.75 \$	18.20%	18.20%	49.48%	49.48%

DESCRIPCIÓN	Nº	PERIÓDO		VALOR	PORCEN.
PLANILLA	1	21-dic-22	31-dic-22	3,629.81 \$	0.65%
PLANILLA	2	01-ene-23	31-ene-23	271,530.94 \$	48.82%
<b>TOTAL</b>				<b>275,160.75 \$</b>	<b>49.48%</b>

#### 6. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

AVANCE PROGRAMADO	18.20%
AVANCE EJECUTADO	49.48%
AVANCE CONTRATADO CONTRACTUAL	100.00%
AVANCE INCREMENTO	0.00%
AVANCE RUBROS NUEVOS	0.00%

#### 7. TIEMPO UTILIZADO DESDE LA FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO

El plazo contractual es de 120 días, desde la fecha de orden de inicio de los trabajos emitida por el Administrador del Contrato; el tiempo utilizado para la ejecución de los trabajos en este primer periodo comprendido entre el 01 de enero de 2023 y el 31 de enero de 2023, es de 31 días.

PLAZO TOTAL	120 DÍAS	100%
DÍAS UTILIZADOS	41 DÍAS	34%

Se presenta a continuación el resumen de las inversiones programadas.

## 8. ACCIONES EFECTUADAS POR LA FISCALIZACIÓN

Se ha realizado la revisión de todos los trabajos, rubro por rubro, en cantidades y calidad de trabajo, se ha constatado diferencia en cantidades de obra que no fueron considerados dentro del estudio.

## 9. VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL TÉCNICO Y EQUIPO

PERSONAL OFERTADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CHECK LIST
RESIDENTE DE OBRA	100%	OK
TÉCNICO AMBIENTAL	50%	OK
TOPÓGRAFO	100%	OK

VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA		
EQUIPO Y MAQUINARIA OFERTADO	EQUIPO Y MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA	CHECK LIST
Excavadora sobre orugas	1	OK
Volquetes	2	OK
Rodillo Vibratorio Liso	1	OK
Compactador (sapo)	1	OK
Concretera 1 Saco	2	OK
Aparatos de Topografía	1	OK
Soldadora Eléctrica o moto suelda	1	OK

## INCIDENCIAS PRODUCIDAS EN LA OBRA

Dentro del estudio no se consideraron algunos volúmenes los cuales son necesarios para cumplir con el objeto contractua, como son el transporte de material de relastre. No se cuantificaron los volúmenes reales dentro del proyecto, por esta razón es que existe excedentes de volúmenes en los rubros.

## CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES

En cada uno de los rubros contratados se constata la ejecución de las actividades de los que constan en la planilla de este informe, verificando que se a cumpliendo con el objeto del contrato cumpliendo las especificaciones técnicas.

El contratista presenta un único cronograma valorado de trabajos en un solo período, en el cual consta su inversión, mismo que sirve para la verificación de su cabal cumplimiento, el que será detallado en el informe mensual de administración de contrato.

## VERIFICACIONES REALIZADAS

Durante la ejecución de los trabajos el contratista está utilizando métodos tradicionales de construcción con el personal y maquinaria adecuados y suficientes que exigen las obras en ejecución, mismos que se ha verificado los rubros ejecutados por el contratista en el lugar del proyecto, procurando que cumpla con las normas técnicas y precautelando los recursos asignados al proyecto.

## 10. CONCLUSIONES

El equipo de fiscalización contribuirá al proceso constructivo de la obra, verificando en todo momento el debido cumplimiento de las especificaciones técnicas y el apego estricto en su forma y dimensiones a los diseños, planos, detalles constructivos y más documentos entregados en los pliegos contractuales de la obra contratada, en procura de garantizar la correcta ejecución de la obra en condiciones de seguridad y funcionalidad de la misma.

## 11. RECOMENDACIONES

Se recomienda practicar con todas las normas constructivas, normas ambientales y de seguridad industrial en todos los proyectos, por parte del contratista y del contratante. Efectuar a tiempo la entrega de documentos generados en obra, cumplir con todas las cláusulas contractuales y pliegos del contrato para evitar retrasos en la ejecución de las obras..

## 12. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME

NOMBRE : ROBERT FERNANDO QUINTANA MUÑOZ

DIRECCIÓN : CDLA. PASTAZA

CIUDAD : PUYO - PASTAZA

TELÉFONO CELULAR : 0999770873

CORREO ELECTRÓNICO : [robertquintanam@hotmail.com](mailto:robertquintanam@hotmail.com)



firmado electrónicamente por:  
ROBERT FERNANDO  
QUINTANA MUÑOZ

Ing. Robert Quintana  
**FISCALIZADOR**

MEMORANDO N° 022 - FISCALIZACIÓN - 2023

FECHA : 23 de febrero de 2023  
DE : FISCALIZADOR  
PARA : DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN  
ASUNTO : Solicitud Trámite de Pago

Solicito proceder con el trámite para cancelar a favor del CONSORCIO ESTADIO TARQUI, contratista de la obra: CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA, el valor de \$135,629.70 conforme al siguiente detalle:

PLANILLA DE AVANCE N° 2  
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N°2

\$ 135,765.47  
-\$ 135.77

Total

---

\$ 135,629.70



Firmado electrónicamente por:  
ROBERT FERNANDO  
QUINTANA MUÑOZ

Ing. Robert Quintana  
FISCALIZADOR

Puyo, 03 de Febrero del 2023

Ing.  
Álvaro Sosa  
**DIRECTOR DE FISCALIZACION**  
Presente. -

Expresándole un saludo cordial, en referencia al **CONTRATO COTO-GADPPz-017-2022**, denominado: **CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FÚTBOL PROFESIONAL, REGLAMENTARIO DE CESPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, me permito realizar el ingreso de la planilla de AVANCE N2, para su respectivo tramite de revisión y aprobación.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

ATENTAMENTE.



CRISTIAN FERNANDO  
PARRA USHCA

Ing. Cristian Parra.  
PROCURADOR COMUN DEL CONSORCIO ESTADIO TARQUI  
1691728994001

Anexos:

- OFICIO SN-GADPPz-2023
- Anexos Planilla
- Planilla less
- Libro de Obra

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN DE FISCALIZACION



03 ENE 2023

Fecha:

Recibido:

FM

Número:

Hora:

18:18

RECIBIDO:  
Robert Quintana  
08-02-2023

ING. ROBERT QUINTANA  
FAVOR CONTINUAR CON  
EL TRAMITE PERTINENTE

07-07-2023

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

## DPTO. FISCALIZACIÓN

### PLANILLA DE AVANCE No. 2

OBRA : CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA  
 FECHA DE CONTRATO : martes, 29 de noviembre de 2022  
 CONTRATISTA : CONSORCIO ESTADIO TARQUI  
 PLAZO : 120 Días a partir de la orden de inicio  
 AMPLIACIONES :  
 SUSPENSION :  
 TOTAL : 120 Días

V. CONTRATO : 556.132,89  
 V. PLANILLAS : 271.530,94  
 V. EXCEDENTES : 120.204,70  
 % DE AVANCE : 48,82%

ACUMULADO  
 PARCIAL  
 556.132,89  
 271.530,94  
 120.204,70  
 48,82%

FECHA DE PLANILLA : 23 de febrero de 2023  
 NOTIFICACION INICIO DEL PLAZO : 21 de diciembre de 2022  
 FECHA CONTABILIZACION DE PLAZO : 22 de diciembre de 2022  
 TERMINACION DEL PLAZO : 20 de abril de 2023  
 PERIODO : 01-ene-23 A 31-ene-23

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	CANTIDADES		% TOTAL	IMPORTEANTE	
						T. ANTERIOR	ESTE PERIODO		T. ANTERIOR	ESTE PERIODO
<b>OBRAS PRELIMINARES</b>										
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	m2	9.500,00	\$ 0.13	\$ 1.235,00	11.856,06	11.856,06	124,80%	1.541,29	
2	DESROCE Y LIMPIEZA	m2	2.300,00	\$ 0.60	\$ 1.380,00	3.480,87	3.480,87	151,34%	2.088,52	
<b>MOVIMIENTOS DE TIERRA PLATAFORMA</b>										
3	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	m3	1.335,00	\$ 3.47	\$ 4.632,45	-	-	0,00%	-	-
4	RELLENO COMPACTADO A MAQUINA	m3	2.125,00	\$ 2.90	\$ 6.162,50	11.578,73	11.578,73	544,89%	33.578,32	33.578,32
5	TRANSPORTE DE LASTRE	M3/KM	32.000,00	\$ 0.40	\$ 12.800,00	223.469,49	223.469,49	938,34%	89.387,80	89.387,80
6	MINADA, CARGADA Y RETADA DE MATERIAL PETREO SUR BASE.	m3	2.125,00	\$ 2.77	\$ 5.886,25	-	-	0,00%	-	-
7	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE (EQUIPO PESADO)	m2	9.800,00	\$ 0.82	\$ 8.036,00	-	-	0,00%	-	-
8	DESALJO DE MATERIAL CONTAMINADO	m3	1.450,00	\$ 2.40	\$ 3.480,00	1.637,16	1.637,16	112,91%	3.923,18	3.923,18
<b>CANCHA SINTETICA</b>										
9	EXCAVACION EN CONGLOMERADO DE ZANJAS	m3	850,00	\$ 3.47	\$ 2.949,50	-	-	0,00%	-	-
10	TRANSPORTE DE MATERIAL, PETREO, TRITURADO, ARENA	m3 km	18.052,00	\$ 0.40	\$ 7.220,80	-	-	0,00%	-	-
11	PROVISION DE MATERIAL, TRITURADO DE 2" A 3/4"	m3	750,00	\$ 12.25	\$ 9.187,50	-	-	0,00%	-	-
12	PROVISION DE ARENA DE RIO.	m3	285,60	\$ 13.45	\$ 3.841,32	-	-	0,00%	-	-
13	TENDIDO DE MATERIAL, PETREO, TRITURADO, ARENA A MAQUINA	m3	1.035,00	\$ 6.12	\$ 6.334,20	-	-	0,00%	-	-
14	MAILLA GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	7.140,00	\$ 3.56	\$ 25.418,40	-	-	0,00%	-	-
15	TUBERIA DE 160 MM PARA DRENAJES, INCLUYE ACCESORIOS	m	850,00	\$ 12.74	\$ 10.829,00	-	-	0,00%	-	-
16	PROVISION E INSTALACION DE CRESPE SINTETICO NORMAS FIFA DE AL	m	7.140,00	\$ 32.03	\$ 228.694,20	3.360,00	3.360,00	47,05%	107.620,80	107.620,80
17	CANAL RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE HORMIGON 210, ACE	m	225,00	\$ 89.99	\$ 20.247,75	-	-	0,00%	-	-
18	CAJA DE REVISION H.S. F=C=210 KG/CM2, INCLUYE TAPA Y CERCO METAL	u	4,00	\$ 115,00	\$ 460,00	-	-	0,00%	-	-
19	POZO DE REVISION DE H=1.00 A 2.00M. (TAPA, CERCO Y PELDAÑOS)	u	1,00	\$ 501,18	\$ 501,18	-	-	0,00%	-	-
20	POZO DE REVISION DE H=2.01 A 3.00M. (TAPA, CERCO Y PELDAÑOS)	u	1,00	\$ 632,05	\$ 632,05	-	-	0,00%	-	-
21	ARCOS METALICOS DE FUTBOL, INCLUYE RED	u	2,00	\$ 505,01	\$ 1.010,02	-	-	0,00%	-	-
22	HORMIGON SIMPLE DE 180 KG/CM2 EN CAMINERIAS PERIMETRALES DE	m3	300,00	\$ 72.98	\$ 21.894,00	-	-	0,00%	-	-
<b>ZONA TECNICA</b>										
23	EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJAS	m3	6,00	\$ 3.34	\$ 20,04	22,40	22,40	373,33%	74,82	74,82
24	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 (PERFILES Y PLACAS)	kg	500,00	\$ 4.49	\$ 2.245,00	-	-	0,00%	-	-
25	CUBIERTA ESTIL PANEL .40MM	m2	25,00	\$ 17,20	\$ 430,00	-	-	0,00%	-	-
26	CANAL RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIAS	m	20,00	\$ 10,81	\$ 216,20	-	-	0,00%	-	-
27	HORMIGON SIMPLE DE 210 KG/CM2, INCLUYE ENCOFRADO.	m3	5,00	\$ 210,72	\$ 1.053,60	-	-	0,00%	-	-
28	REPLANTILLO H.S. 180 KG/CM2	M3	1,00	\$ 132,10	\$ 132,10	-	-	0,00%	-	-
29	MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3	3,00	\$ 15,19	\$ 45,57	-	-	0,00%	-	-
30	ACERO DE REFUERZO FY=4200 CON ALAMBRE GALV. 18	kg	750,00	\$ 2,00	\$ 1.500,00	-	-	0,00%	-	-
<b>GRADERO BAÑOS</b>										
31	EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJAS	m3	33,00	\$ 3,34	\$ 110,22	-	-	0,00%	-	-
32	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 (PERFILES Y PLACAS)	kg	4.300,00	\$ 4,49	\$ 22.001,00	-	-	0,00%	-	-
33	CUBIERTA ESTIL PANEL .40MM	m2	217,00	\$ 17,20	\$ 3.732,40	-	-	0,00%	-	-
34	CANAL RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIAS	m	17,00	\$ 10,81	\$ 183,77	-	-	0,00%	-	-
35	HORMIGON SIMPLE DE 210 KG/CM2 EN PLINTOS, INCLUYE ENCOFRADOS	m3	32,00	\$ 222,01	\$ 7.104,32	-	-	0,00%	-	-
36	HORMIGON SIMPLE DE 210 KG/CM2 EN CADENAS, INCLUYE ENCOFRADO	m3	41,00	\$ 9.367,27	\$ 3.867,27	-	-	0,00%	-	-
37	HORMIGON SIMPLE DE 210 KG/CM2 EN COLUMNAS, INCLUYE ENCOFRADO	m3	37,00	\$ 236,68	\$ 8.757,16	-	-	0,00%	-	-
38	HORMIGON SIMPLE DE 210 KG/CM2 EN GRADAS, INCLUYE ENCOFRADOS	m3	115,00	\$ 279,38	\$ 32.118,70	-	-	0,00%	-	-
39	REPLANTILLO H.S. 180 KG/CM2	m3	10,00	\$ 132,10	\$ 1.321,00	-	-	0,00%	-	-
40	MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3	30,00	\$ 15,19	\$ 455,70	-	-	0,00%	-	-
41	ACERO DE REFUERZO FY=4200 CON ALAMBRE GALV. 18	kg	6.200,00	\$ 2,00	\$ 12.400,00	-	-	0,00%	-	-
42	ENLUCIDO CON MORTERO 1:3 + IMPERMEABILIZANTE	m2	350,00	\$ 11,04	\$ 3.864,00	-	-	0,00%	-	-
43	MAMPONERIA DE BLOQUE ALIVANADO E=10 CM	m2	150,00	\$ 7,87	\$ 1.180,50	-	-	0,00%	-	-
44	MAMPONERIA DE BLOQUE ALIVANADO E=15 CM	m2	250,00	\$ 12,68	\$ 3.170,00	-	-	0,00%	-	-
45	ESTUCADO DE PARED, CON EMPASTE INTERIOR	m2	175,00	\$ 3,90	\$ 682,50	-	-	0,00%	-	-
46	ESTUCADO DE PARED, CON EMPASTE EXTERIOR	m2	225,00	\$ 6,10	\$ 1.372,50	-	-	0,00%	-	-
47	PINTURA ESMALTE INTERIOR	m2	175,00	\$ 3,60	\$ 630,00	-	-	0,00%	-	-

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO. \_\_\_\_\_ FISCALIZACIÓN

## PLANILLA DE AVANCE No. 2

OBRA : CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA  
 FECHA DE CONTRATO : martes, 29 de noviembre de 2022  
 CONTRATISTA : CONSORCIO ESTADIO TARQUI  
 PLAZO : 120 Días a partir de la orden de inicio  
 AMPLIACIONES :  
 SUSPENSION :  
 TOTAL : 120 Días

FECHA DE PLANILLA : 23 de febrero de 2023  
 NOTIFICACION INICIO DEL PLAZO : 21 de diciembre de 2022  
 FECHA CONTABILIZACION DE PLAZO : 22 de diciembre de 2022  
 TERMINACION DEL PLAZO : 20 de abril de 2023  
 PERIODO : 01-ene-23 A 31-ene-23

PARCIAL :  
 ACUMULADO :  
 V. CONTRATO : 556,132.89  
 V. PLANILLAS : 271,630.94  
 V. EXCEDENTES : 120,204.70  
 % DE AVANCE : 48.82%  
 49.48%

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	CANTIDADES		% TOTAL	IMPORTANTE		
						T. ANTERIOR	ESTE PERIODO		T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
48	PINTURA ESMALTE EXTERIOR	m <sup>2</sup>	225.00	\$ 3.86	\$ 868.50	-	-	0.00%	-	-	
49	PUERTA DE MADERA TAMBORADA 1.20X2.10	u	4.00	\$ 150.00	\$ 600.00	-	-	0.00%	-	-	
50	PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO	u	10.00	\$ 160.00	\$ 1,600.00	-	-	0.00%	-	-	
51	INODORO CON FLOXOMETRO GRCONS	u	4.00	\$ 305.65	\$ 1,222.64	-	-	0.00%	-	-	
52	LAVAMANOS CON GRIFERIA Y ACCESORIOS	u	4.00	\$ 79.14	\$ 316.56	-	-	0.00%	-	-	
53	URINARIO CON ACCESORIOS	u	4.00	\$ 105.97	\$ 423.88	-	-	0.00%	-	-	
54	DUCHA SENGUILLA CROMADA COMPLETA - INCL. MEZCLADORA Y GRIFER	u	4.00	\$ 93.46	\$ 373.84	-	-	0.00%	-	-	
55	CERAMICA DE PISO DE 30 x 30 cm. ANTIDESLIZANTE	m <sup>2</sup>	120.00	\$ 17.83	\$ 2,139.60	-	-	0.00%	-	-	
56	CERAMICA PARA PARED	m <sup>2</sup>	125.00	\$ 23.05	\$ 2,881.25	-	-	0.00%	-	-	
57	TUBERIA DE AGUA FRIA PVC DE 1/2"	m	180.00	\$ 2.57	\$ 462.60	-	-	0.00%	-	-	
58	PUNTO DE AGUA FRIA PVC DE 1/2"	u	15.00	\$ 12.44	\$ 186.60	-	-	0.00%	-	-	
59	Acometida de agua potable, incluye medidor y valvula de control.	u	1.00	\$ 64.18	\$ 64.18	-	-	0.00%	-	-	
60	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 200 mm FACOTEL	m	45.00	\$ 26.64	\$ 1,198.80	-	-	0.00%	-	-	
61	BAJANTE AGUA LLOVIA PVC 110MM	m	45.00	\$ 8.09	\$ 364.05	-	-	0.00%	-	-	
62	BAJANTE AGUA LLOVIA PVC 160MM	m	150.00	\$ 15.84	\$ 2,376.00	-	-	0.00%	-	-	
63	DESAGUE PVC 110MM	pl	8.00	\$ 22.36	\$ 258.88	-	-	0.00%	-	-	
64	DESAGUE PVC 50 mm	pl	10.00	\$ 20.32	\$ 203.20	-	-	0.00%	-	-	
65	DESAGUE PVC 75MM	pl	4.00	\$ 18.72	\$ 74.88	-	-	0.00%	-	-	
66	ACOMETIDA ELECTRICA (TW#10)	m	100.00	\$ 13.81	\$ 1,381.00	-	-	0.00%	-	-	
67	PUNTO DE ILUMINACION CON CABLE THIN FLEX #12 Y TUBERIA EMT 1/2"	u	20.00	\$ 52.63	\$ 1,052.60	-	-	0.00%	-	-	
68	CERRAMIENTO PERIMETRAL	m <sup>3</sup>	120.00	\$ 3.34	\$ 400.80	-	1795.80	1496.50%	5.997.97	5.997.97	
69	EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJAS	m <sup>3</sup>	20.00	\$ 222.01	\$ 4,440.20	-	29.66	148.30%	6.584.82	6.584.82	
70	HORMIGON SIMPLE DE 210 KG/CM2 EN PLINTAS - INCLUYE ENCOFRADO	m <sup>3</sup>	25.00	\$ 228.47	\$ 5,711.75	-	11.18	44.72%	2.554.29	2.554.29	
71	HORMIGON SIMPLE DE 210 KG/CM2 EN CADENAS - INCLUYE ENCOFRADO	m <sup>3</sup>	19.50	\$ 236.68	\$ 4,615.26	-	15.30	78.46%	3.621.20	3.621.20	
72	REPLANTILLO H.S. 180 KG/CM2	m <sup>3</sup>	9.00	\$ 132.10	\$ 1,188.90	-	16.09	178.78%	2.125.49	2.125.49	
73	MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m <sup>3</sup>	25.00	\$ 15.19	\$ 379.75	-	51.38	205.52%	780.46	780.46	
74	ACERO DE REFUERZO FV=1200 CON ALAMBRE GALV. 18	kg	3.000.00	\$ 2.00	\$ 6,000.00	-	6225.47	207.52%	12.450.94	12.450.94	
75	ENLUCIDO CON MORTERO 1:3 + IMPERMEABILIZANTE	m <sup>2</sup>	250.00	\$ 11.04	\$ 2,760.00	-	-	0.00%	-	-	
76	ESTUCADO DE PARED CON EMPASTE INTERIOR	m <sup>2</sup>	500.00	\$ 3.90	\$ 1,950.00	-	-	0.00%	-	-	
77	PINTURA ESMALTE EXTERIOR	m <sup>2</sup>	500.00	\$ 3.86	\$ 1,930.00	-	-	0.00%	-	-	
78	MANPOSTERIA DE BLOQUE ALVIANADO E=10 CM	m <sup>2</sup>	250.00	\$ 7.87	\$ 1,967.50	-	-	0.00%	-	-	
79	CERRAMIENTO DE MALLA TRIPLE GALVANIZADA H=1.60 M	m	200.00	\$ 49.00	\$ 9,800.00	-	-	0.00%	-	-	
<b>TOTAL</b>						\$ 556,132.89			\$ 3,629.81	\$ 271,630.94	\$ 275,160.75
DESCUENTOS:									\$ 1,814.91	\$ 135,765.47	\$ 137,580.38
Anticipo 50%											
LÍQUIDO										\$ 0.00	\$ 135,765.47

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO DÓLARES, 47/100 CENTAVOS

Multa por Mora



ROBERT FERNANDO  
QUINTANA MUÑOZ

Ing. Robert Quintana  
FISCALIZADOR



ADÁN WARING  
MONTEDROCA

Ing. Adán Waring

DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN (S)



CRISTIAN FERNANDO  
PARRA USHCA

Consortio Estadio Tarqui

CONTRATISTA

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**  
**REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE No. 2**

OBRA: CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA

Fecha de elaboración:	23 de febrero de 2023	Fecha de contrato:	29-nov-22
Contratista:	Consortio Estadio Tarqui /	Monto del contrato:	\$ 556,132.89
Fecha de índices sub-cero:	sep-22	Valor de planilla o anticipo:	\$ 271,530.94
Fecha de índices sub-uno:	dic-22	Anticipo descontado:	\$ 135,765.47
		Po:	\$ 135,765.47

CUADRILLA TIPO

Categoría	Cosficiente	Salarios Reales Diarios		Cx B1	Cx B0
	C	B1	Bo		
		209	207		
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3	0.001	34.410	34.410	0.034	0.034
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	0.067	34.350	34.350	2.301	2.301
CHOFERES PROFESIONALES CH C1	0.028	44.970	44.970	1.259	1.259
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	0.018	34.410	34.410	0.619	0.619
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	0.346	31.000	31.000	10.726	10.726
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	0.540	30.620	30.620	16.535	16.535
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>			<b>31.474</b>	<b>31.474</b>

	Coeficiente	Indices		Factor
		C	Io	
		209	206	
Mano de obra	0.248	31.474	31.474	0.248
Productos geosintéticos	0.319	128.100	128.100	0.319
Cemento Portland Tipo I	0.061	182.280	185.910	0.060
Equipo y maquinaria de Construc. vial	0.119	184.950	184.590	0.119
Acero en barras	0.039	301.350	301.350	0.039
Tubos y accesorios de PVC Para desague	0.083	165.110	164.560	0.083
Repuestos para maquinaria de construcción	0.060	172.440	169.690	0.061
Perfiles estructurales de acero	0.046	312.150	321.940	0.045
Combustibles (Mezcla 5% gasolina extra ; 95% diesel)	0.018	244.320	244.320	0.018
IPC AMBATO	0.007	109.390	108.940	0.007
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>			<b>0.999</b>

Valor a reajustarse en esta planilla	(Po)	\$ 135,765.47
Factor de reajuste -1	(-1)	-0.001
Valor de reajuste	(Pr)	-\$ 135.77
Valor de reajuste provicional		
Diferencia de reajuste	(Vr)	<u>-\$ 135.77</u>

Descuentos:

Nota: se coloca como Componente no Principal a IPC ambato

LÍQUIDO A PAGARSE

**-\$ 135.77**



Firmado electrónicamente por:  
**ROBERT FERNANDO**  
**QUINTANA MUÑOZ**

Ing. Robert Quintana  
 FISCALIZADOR



Firmado electrónicamente por:  
**ADAN MARINO**  
**MONTESEDECA**

Ing. Adán Mariño  
 DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN (S)

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  
DE PASTAZA**



**ANEXO 1-2**

CONTRATO: CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACIÓN: PARROQUIA TARQUI

CONTRATISTA : CONSORCIO ESTADIO TARQUI

**MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES**


PLANILLA DE AVANCE 2

RUBRO:4      RELLENO COMPACTADO A MAQUINA      UNIDAD:      m3

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			RESULTADO	SUB TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES	
		VOLUMEN	a	h					
PLATAFORMA ESTADIO	1.00	10,149.56			10,149.56	10,149.56	m3	VER ANEXO EN PERFILES	
PLATAFORMA PARQUEADERO	1.00	474.84			474.84	474.84	m3		
MEJORAMIENTO PARA GAVIONES Y RELLENO EN ZANGA DE EXCAVACION	1.00	954.33			954.33	954.33	m3		
<b>TOTAL :</b>							<b>11,578.73</b>	<b>m3</b>	

TOTAL ESTA PLANILLA	11,578.73	m3
CANTIDAD CONTRATADA	2,125.00	m3
PORCENTAJE EJECUTADO	544.88	%

**Anexo Gráfico**

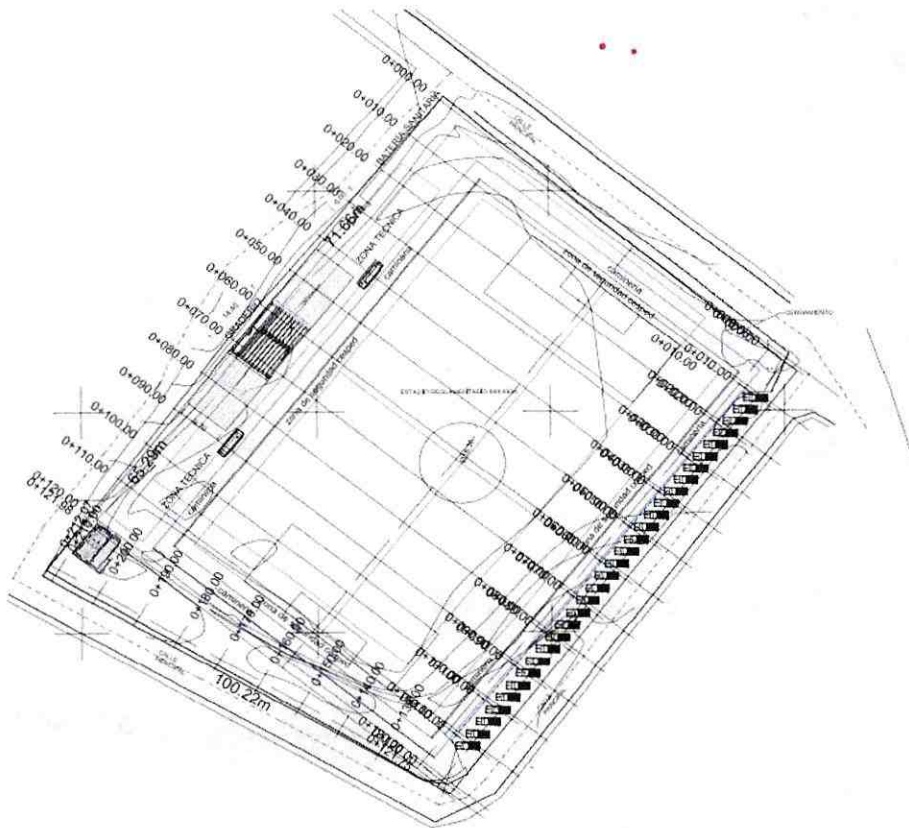

ING. CRISTIAN FERNANDO  
PARRA USHCA

ING. CRISTIAN PARRA  
PROCURADOR COMUN CONSORCIO ESTADIO TARQUI  
CONTRATISTA



ING. ROBERT FERNANDO  
QUINTANA MUÑOZ

ING. ROBERT QUINTANA  
FISCALIZADOR

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  
DE PASTAZA**



**ANEXO 2-2**

CONTRATO: CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACIÓN: PARROQUIA TARQUI

CONTRATISTA : CONSORCIO ESTADIO TARQUI

**MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES**

PLANILLA DE AVANCE 2

RUBRO:4 RELLENO COMPACTADO A MAQUINA UNIDAD: m3

**Anexo Fotográfico**



ING. CRISTIAN FERNANDO  
PARRA USHCA

ING. CRISTIAN PARRA

PROCURADOR COMUN CONSORCIO ESTADIO TARQUI  
CONTRATISTA



ING. ROBERT FERNANDO  
QUINTANA MUNOZ

ING. ROBERT QUINTANA  
FISCALIZADOR

COORDENADA INICIAL DE CURVA MASA		10,000.00				AREAS						VOLUMENES					
SECCIONES DE TN LEVANTADAS EN CAMPO	ELEVACIONES		ESPORES		DESPALME		C	I	MJ	Factor de abundamiento en corte	SEMI-DISTANCIA	DESPALME		C	I	MJ	
	TN	SUBRAS ANTE	C	T	DC	DT						DC	DT				
0+000.000	932.129	932.100	0.03	0.00	0.00	0.00	1.15	0.10	3.90								
0+010.000	933.020	931.963	1.06	0.00	0.00	0.00	6.67	0.00	3.90	1.00	5.00	0.00	0.00	39.10	0.48	39.00	
0+020.000	932.869	931.825	1.04	0.00	0.00	0.00	6.86	0.00	3.90	1.00	5.00	0.00	0.00	67.68	0.00	39.00	
0+030.000	932.740	931.688	1.05	0.00	0.00	0.00	5.96	0.00	3.90	1.00	5.00	0.00	0.00	64.13	0.02	39.00	
0+040.000	932.675	931.550	1.12	0.00	0.00	0.00	6.52	0.01	3.90	1.00	5.00	0.00	0.00	62.42	0.05	39.00	
0+050.000	932.102	931.412	0.69	0.00	0.00	0.00	4.26	0.03	3.90	1.00	5.00	0.00	0.00	53.91	0.16	39.00	
0+060.000	931.782	931.275	0.51	0.00	0.00	0.00	2.90	0.01	3.90	1.00	5.00	0.00	0.00	35.82	0.19	39.00	
0+070.000	931.547	931.137	0.41	0.00	0.00	0.00	2.39	0.06	3.90	1.00	5.00	0.00	0.00	26.45	0.37	39.00	
0+080.000	931.696	931.000	0.70	0.00	0.00	0.00	3.77	0.12	3.90	1.00	5.00	0.00	0.00	30.76	0.89	39.00	
0+090.000	931.778	931.096	0.68	0.00	0.00	0.00	4.11	0.00	3.90	1.00	5.00	0.00	0.00	39.36	0.59	39.00	
0+100.000	931.853	931.192	0.66	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	3.90	1.00	5.00	0.00	0.00	39.93	0.03	39.00	
0+110.000	931.943	931.287	0.66	0.00	0.00	0.00	3.99	0.00	3.90	1.00	5.00	0.00	0.00	39.35	0.03	39.00	
0+120.000	932.011	931.383	0.63	0.00	0.00	0.00	4.08	0.00	3.90	1.00	5.00	0.00	0.00	40.35	0.01	39.00	
0+121.755	932.018	931.400	0.62	0.00	0.00	0.00	4.02	0.00	3.90	1.00	0.88	0.00	0.00	7.10	0.00	6.84	
												<b>SUB TOTAL 2</b>		<b>546.36</b>			<b>474.84</b>

**CORTE Y RELLENO EN PARQUEADERO**



CRISTIAN FERNANDO  
PARRA USCA



ROBERT FERNANDO  
QUINTANA MUÑOZ

COORDENADA INICIAL DE CURVA MASA		10,000.00				AREAS				VOLUMENES			
SECCIONES DE TN LEVANTADAS EN CAMPO	ELEVACIONES		ESPESORES		DESPALME		C	I	Factor de abundamiento o en corte	SEMI- DISTANCIA	DESPALME		MJ
	TN	SUBRASANTE	C	T	DC	DT					DC	DT	
<b>MATERIAL DE MEJORAMIENTO PLATAFORMA ESTADIO</b>													
0+000.000	933.284	934.080	0.00	0.80	0.00	0.00	0.93	61.92					
0+010.000	932.911	934.080	0.00	1.17	0.00	0.00	0.78	95.67	1.00	5.00	0.00	0.00	787.95
0+020.000	933.062	934.080	0.00	1.02	0.00	0.00	0.95	85.04	1.00	5.00	0.00	0.00	903.55
0+030.000	933.214	934.080	0.00	0.87	0.00	0.00	0.81	75.15	1.00	5.00	0.00	0.00	800.96
0+040.000	933.342	934.080	0.00	0.74	0.00	0.00	0.35	67.73	1.00	5.00	0.00	0.00	714.44
0+050.000	933.362	934.080	0.00	0.72	0.00	0.00	0.17	68.62	1.00	5.00	0.00	0.00	681.78
0+060.000	933.372	934.080	0.00	0.71	0.00	0.00	0.05	73.24	1.00	5.00	0.00	0.00	709.30
0+070.000	933.348	934.080	0.00	0.73	0.00	0.00	0.21	79.83	1.00	5.00	0.00	0.00	765.37
0+080.000	933.322	934.080	0.00	0.76	0.00	0.00	0.21	83.66	1.00	5.00	0.00	0.00	817.45
0+090.000	933.282	934.080	0.00	0.80	0.00	0.00	0.12	82.23	1.00	5.00	0.00	0.00	829.41
0+100.000	933.230	934.080	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	81.93	1.00	5.00	0.00	0.00	820.76
0+110.000	933.067	934.080	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	98.14	1.00	5.00	0.00	0.00	900.31
0+120.000	932.605	934.080	0.00	1.48	0.00	0.00	0.01	131.52	1.00	5.00	0.00	0.00	1148.27
0+121.990	932.555	934.080	0.00	1.53	0.00	0.00	0.01	139.84	1.00	0.99	0.00	0.00	269.99
<b>TOTAL</b>												<b>10149.56</b>	



CRISTIAN FERNANDO  
PARRA USHCA


ROBERT FERNANDO  
QUINTANA MUNOZ

COORDENADA INICIAL DE CURVA MASA		10,000.00		AREAS						VOLUMENES						
SECCIONES DE TN LEVANTADAS EN CAMPO	ELEVACIONES		ESESORES		DESPALME		C	I	MJ	Factor de abundamiento en corte	SEMI-DISTANCIA A	DESPALME		C	I	MJ
	TN	SUBRASANTE	C	T	DC	DT						DC	DT			
<b>CORTE Y MEJORAMIENTO PARA GAVIONES</b>																
0+000.000	932.446	930.600	1.85	0.00	0.00	0.00	5.77	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	62.73	0.00	45.00
0+010.000	932.694	930.600	2.09	0.00	0.00	0.00	6.77	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	70.03	0.00	45.00
0+020.000	932.782	930.600	2.18	0.00	0.00	0.00	7.24	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	69.43	0.00	45.00
0+030.000	932.680	930.600	2.08	0.00	0.00	0.00	6.65	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	67.11	0.00	45.00
0+040.000	932.717	930.600	2.12	0.00	0.00	0.00	6.77	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	62.15	0.00	45.00
0+050.000	932.432	930.600	1.83	0.00	0.00	0.00	5.66	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	47.23	0.00	45.00
0+060.000	931.860	930.600	1.26	0.00	0.00	0.00	3.79	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	32.61	0.38	45.00
0+070.000	931.522	930.600	0.92	0.00	0.00	0.00	2.74	0.08	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	24.44	1.32	45.00
0+080.000	931.318	930.600	0.72	0.00	0.00	0.00	2.15	0.19	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	22.67	1.23	45.00
0+090.000	931.112	930.600	0.51	0.00	0.00	0.00	2.38	0.06	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	26.63	0.46	45.00
0+100.000	931.580	930.600	0.98	0.00	0.00	0.00	2.94	0.03	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	33.07	0.17	45.00
0+110.000	931.823	930.600	1.22	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	40.56	0.00	45.00
0+120.000	932.069	930.600	1.47	0.00	0.00	0.00	4.44	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	46.99	0.00	45.00
0+130.000	932.222	930.600	1.62	0.00	0.00	0.00	4.95	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	52.15	0.00	45.00
0+140.000	932.370	930.600	1.77	0.00	0.00	0.00	5.48	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	55.60	0.00	45.00
0+150.000	932.417	930.600	1.82	0.00	0.00	0.00	5.64	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	57.16	0.00	45.00
0+160.000	932.457	930.600	1.86	0.00	0.00	0.00	5.79	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	57.35	0.00	45.00
0+170.000	932.428	930.600	1.83	0.00	0.00	0.00	5.68	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	58.46	0.00	45.00
0+180.000	932.518	930.600	1.92	0.00	0.00	0.00	6.01	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	62.23	0.00	45.00
0+190.000	932.630	930.600	2.03	0.00	0.00	0.00	6.43	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	65.16	0.00	45.00
0+200.000	932.664	930.600	2.06	0.00	0.00	0.00	6.60	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	64.12	0.00	45.00
0+210.000	932.559	930.600	1.96	0.00	0.00	0.00	6.23	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	12.91	0.00	9.33
0+212.074	932.569	930.600	1.97	0.00	0.00	0.00	6.22	0.00	4.50	1.00	1.04	0.00	0.00	<b>SUB TOTAL 1</b>	<b>1090.80</b>	<b>954.33</b>



CRISTIAN FERNANDO  
PARRA USHECA

ROBERT FERNANDO  
QUINTANA MUNOZ

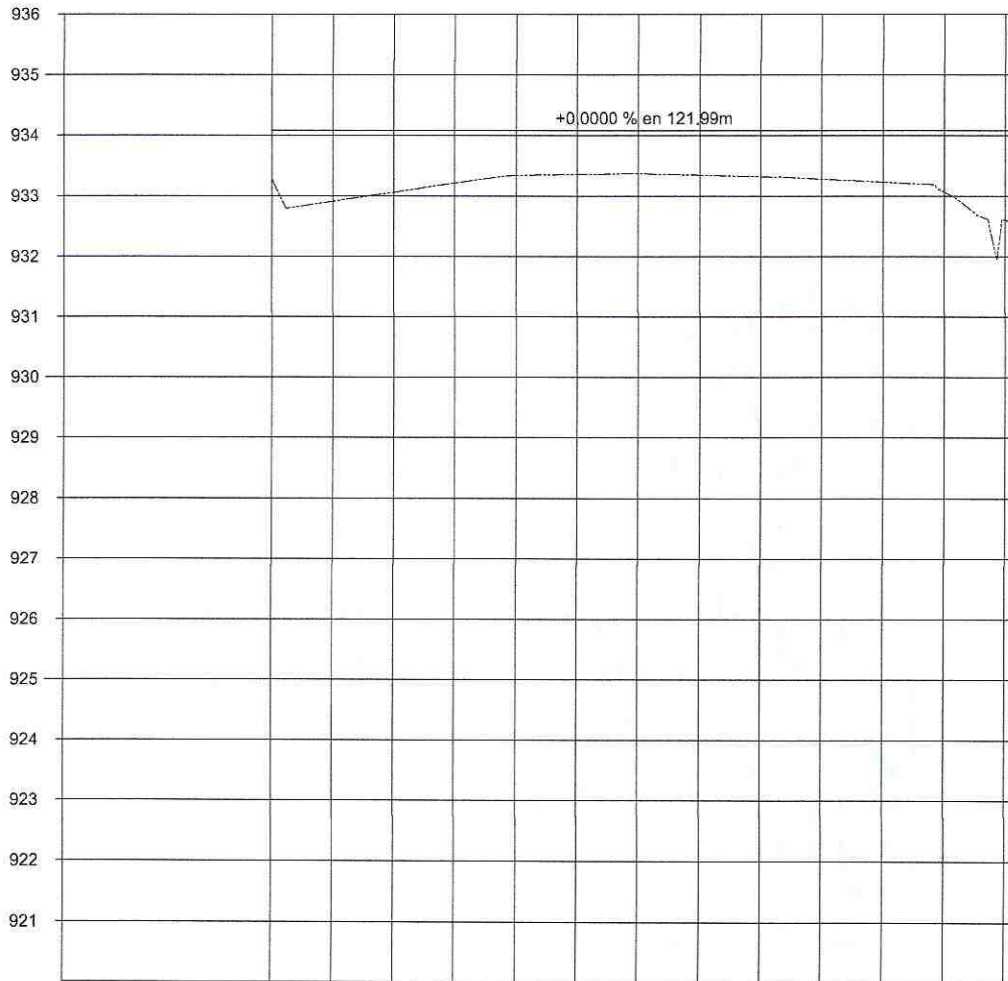

ELEVACION		ESPESOR	VOLUMEN		ORDENADAS DE LA CURVA MASA	FACTOR DE COMPACTACION	FACTOR DE ABUNDAMIENTO	TIPO DE MATERIAL
TERRENO	SUBRASANTE		CORTE	TERRAPLEN				
933.28	934.08	0.80	0.00	0.00	10.000			
932.91	934.08	1.17	8.53	787.95	9.221			
933.06	934.08	1.02	8.64	903.55	8.326			
933.21	934.08	0.87	8.80	800.96	7.534			
933.34	934.08	0.74	5.84	714.44	6.825			
933.36	934.08	0.72	2.60	681.78	6.146			
933.37	934.08	0.71	1.07	709.30	5.437			
933.35	934.08	0.73	1.29	765.37	4.673			
933.32	934.08	0.76	2.10	817.45	3.858			
933.28	934.08	0.80	1.67	829.41	3.030			
933.23	934.08	0.85	0.62	820.76	2.210			
933.07	934.08	1.01	0.00	900.31	1.310			
932.89	934.08	1.19	0.03	1,149.27	162			
932.89	934.08	1.19	0.01	269.99	168			

PERFIL LONGITUDINAL ESTADIO






ESCALA HORIZONTAL 1 : 1000






ESCALA VERTICAL 1 : 100





TOTAL VOLUMEN CORTE = 41.20m3

TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = 10,149.56m3












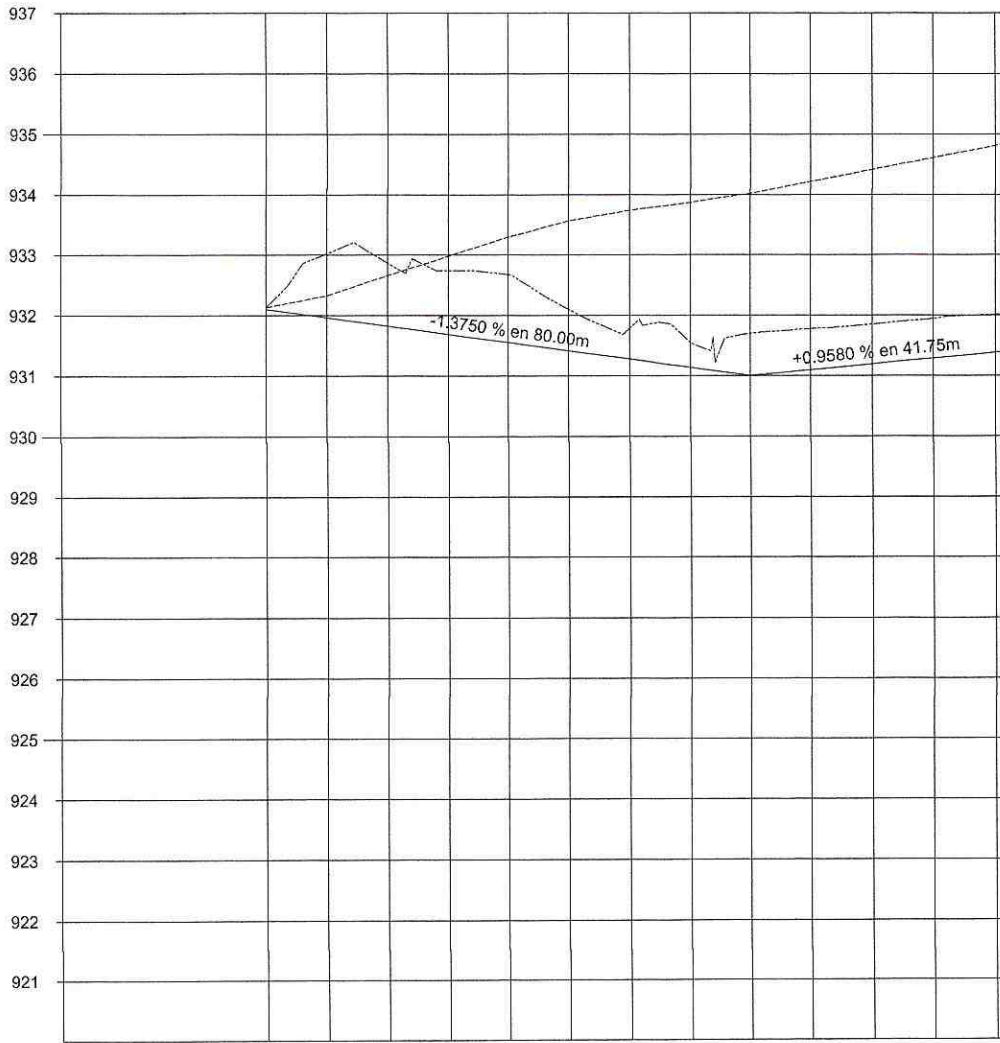

		TIPO DE MATERIAL		
		FACTOR DE ABUNDAMIENTO		
		FACTOR DE COMPACTACION		
		ORDENADAS DE LA CURVA MASA		
ELEVACION	VOLUMEN	ESPESOR		ORDENADAS DE LA CURVA MASA
		TERRAPLEN	CORTE	
TERRENO		TERRAPLEN	CORTE	
932.13	0.00	0.03	0.00	10,000
933.02	39.10	1.06	0.48	10,039
932.87	67.68	1.04	0.00	10,106
932.74	64.13	1.05	0.02	10,170
932.67	62.42	1.12	0.05	10,233
932.10	53.91	0.69	0.16	10,287
931.78	35.82	0.51	0.19	10,322
931.55	26.45	0.41	0.37	10,348
931.70	30.76	0.70	0.89	10,378
931.78	39.36	0.66	0.59	10,417
931.85	39.93	0.66	0.03	10,457
931.94	39.35	0.66	0.03	10,496
932.02	49.35	0.63	0.01	10,526
8+120.99				

### PERFIL LONGITUDINAL PARQUEADERO


ESCALA HORIZONTAL 1 : 1000

ESCALA VERTICAL 1 : 100

TOTAL VOLUMEN CORTE = 546.36m<sup>3</sup>

TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -2.82m<sup>3</sup>



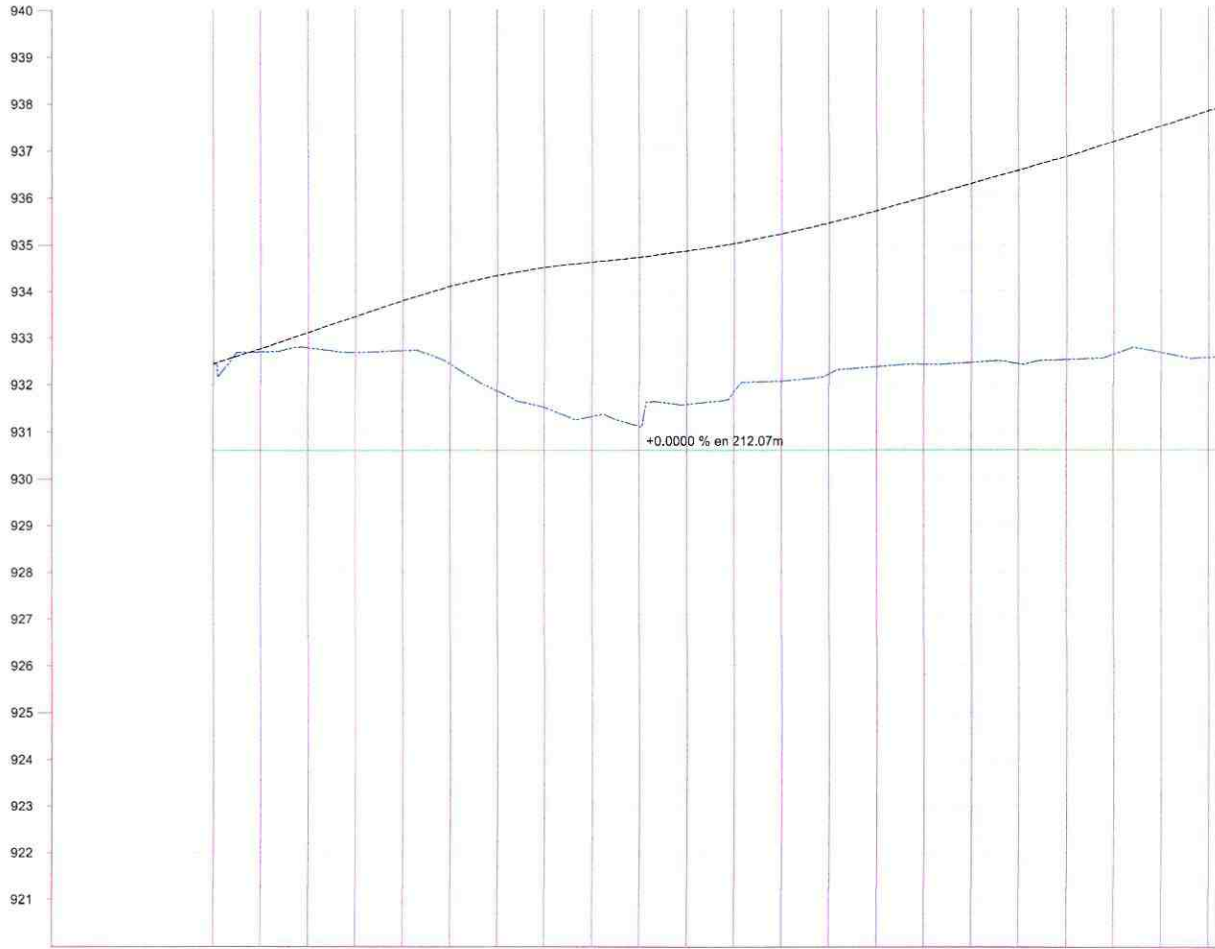

ELEVACION		ESPOSOR	VOLUMEN		ORDENADAS DE LA CURVA MASA	FACTOR DE COMPACTACION	FACTOR DE ABUNDAMIENTO	TIPO DE MATERIAL
TERRAPLEN	TERRENO		TERRAPLEN	CORTE				
932.45	930.60	1.85	0.00	0.00	10.000			
932.69	930.60	2.09	62.73	0.00	10.083			
932.78	930.60	2.18	70.03	0.00	10.133			
932.68	930.60	2.08	69.43	0.00	10.202			
932.72	930.60	2.12	67.11	0.00	10.269			
932.43	930.60	1.83	62.15	0.00	10.331			
931.86	930.60	1.26	47.23	0.00	10.379			
931.52	930.60	0.92	32.61	0.38	10.411			
931.32	930.60	0.72	24.44	1.32	10.434			
931.11	930.60	0.51	22.67	1.23	10.455			
931.58	930.60	0.98	26.63	0.46	10.482			
931.82	930.60	1.22	33.07	0.17	10.515			
932.07	930.60	1.47	40.56	0.00	10.555			
932.22	930.60	1.62	46.99	0.00	10.602			
932.37	930.60	1.77	52.15	0.00	10.654			
932.42	930.60	1.82	55.60	0.00	10.710			
932.46	930.60	1.86	57.16	0.00	10.767			
932.43	930.60	1.83	57.35	0.00	10.824			
932.52	930.60	1.92	58.46	0.00	10.883			
932.63	930.60	2.03	62.23	0.00	10.945			
932.86	930.60	2.06	65.16	0.00	11.010			
932.56	930.60	1.96	62.12	0.00	11.067			
932.57	930.60	1.97	62.97	0.00	11.127			
932.00	930.60				11.187			

ESCALA HORIZONTAL 1 : 1000  
 ESCALA VERTICAL 1 : 100  
 TOTAL VOLUMEN CORTE = 1,090.80m3  
 TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -3.58m3





**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  
DE PASTAZA**



**ANEXO 1**

CONTRATO: CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACIÓN: PARROQUIA TARQUI

CONTRATISTA : CONSORCIO ESTADIO TARQUI

**MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES**


PLANILLA DE AVANCE 2

RUBRO:5 | TRANSPORTE DE LASTRE | UNIDAD: | m3/km

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			RESULTADO	SUB TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
		l	Recorrido	h				
	1.00	11,578.73	19.30		223,469.49	223,469.49	m3/km	TRANSPORTE DE MATERIAL
TOTAL :						<b>223,469.49</b>	<b>m3/km</b>	

TOTAL ESTA PLANILLA	223,469.49	m3/km
CANTIDAD CONTRATADA	32,000.00	m3/km
PORCENTAJE EJECUTADO	698.34	%

**Anexo Gráfico**

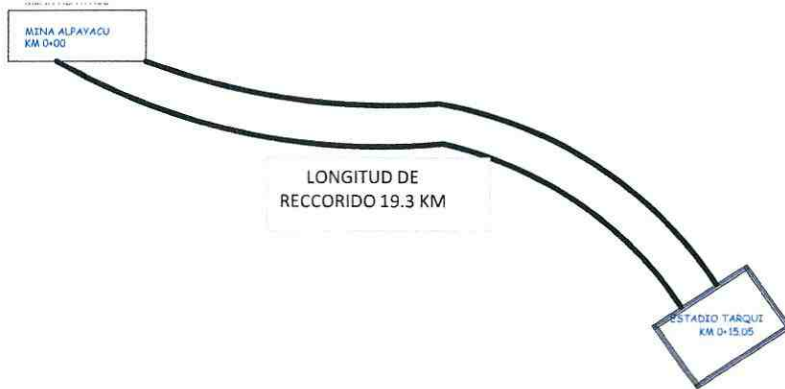

**Anexo Fotográfico**



Firmado digitalmente por  
**CRISTIAN FERNANDO  
PARRA USHCA**

ING. CRISTIAN PARRA

PROCURADOR COMUN CONSORCIO ESTADIO TARQUI  
CONTRATISTA



Firmado digitalmente por  
**ROBERT FERNANDO  
QUINTANA MUÑOZ**

ING. ROBERT QUINTANA

FISCALIZADOR

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  
DE PASTAZA**



**ANEXO 1**

CONTRATO: CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACIÓN: PARROQUIA TARQUI

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

**MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES**


PLANILLA DE AVANCE 2

RUBRO:8 DESALOJO DE MATERIAL CONTAMINADO UNIDAD: m3

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			RESULTADO	SUB TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
		VOLUMEN	a	h				
DESALOJO DE MATERIAL PARA GAVIONES Y CERRAMIENTO	1.00	1,090.80			1,090.80	1,090.80	m3	VER ANEXO 68 EN RUBRO DE EXCAVACION EN ZANGAS
DESALOJO DE MATERIAL CONTAMINADO EN PARQUEADERO	1.00	546.36			546.36	546.36	m3	
<b>TOTAL :</b>						<b>1,637.16</b>	<b>m3</b>	

TOTAL ESTA PLANILLA	1,637.16	m3
CANTIDAD CONTRATADA	1,450.00	m3
PORCENTAJE EJECUTADO	112.91	%

**Anexo Gráfico**

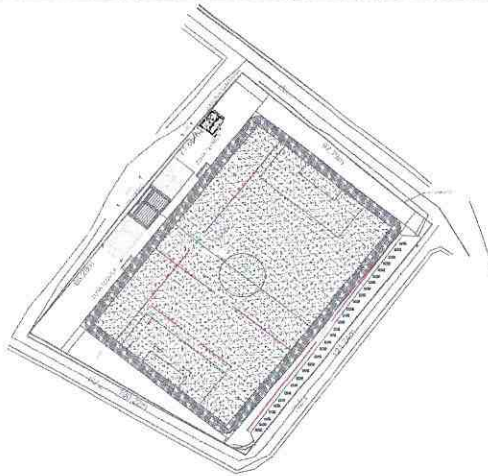

**Anexo Fotográfico**



Atestado electrónicamente por:  
**CRISTIAN FERNANDO  
PARRA USHCA**

ING. CRISTIAN PARRA

PROCURADOR COMUN CONSORCIO ESTADIO TARQUI  
CONTRATISTA



Atestado electrónicamente por:  
**ROBERT FERNANDO  
QUINTANA MUÑOZ**

ING. ROBERT QUINTANA

FISCALIZADOR

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  
DE PASTAZA**



**ANEXO 1**

CONTRATO: CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACIÓN: PARROQUIA TARQUI

CONTRATISTA : CONSORCIO ESTADIO TARQUI

**MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES**


PLANILLA DE AVANCE 2

RUBRO:14 MALLA GEOTEXTIL NO TEJIDO UNIDAD: m2

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			RESULTADO	SUB TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
		l	a	h				
COLOCACION DE MALLA PARA DREN LADO IZQUIERDO ESTADIO	1.00	53.60	4.00		214.40	214.40	m2	
COLOCACION DE MALLA PARA DREN LADO IZQUIERDO ESTADIO	1.00	6.38	8.00		51.04	51.04	m2	
COLOCACION DE MALLA PARA DREN LADO POSTERIOR ESTADIO	1.00	43.58	4.00		174.32	174.32	m2	
COLOCACION DE MALLA PARA DREN LADO DERECHO	1.00	73.50	4.00		294.00	294.00	m2	
<b>TOTAL :</b>						<b>733.76</b>	<b>m2</b>	

TOTAL ESTA PLANILLA	733.76	m2
CANTIDAD CONTRATADA	7,140.00	m2
PORCENTAJE EJECUTADO	10.28	%

**Anexo Gráfico**

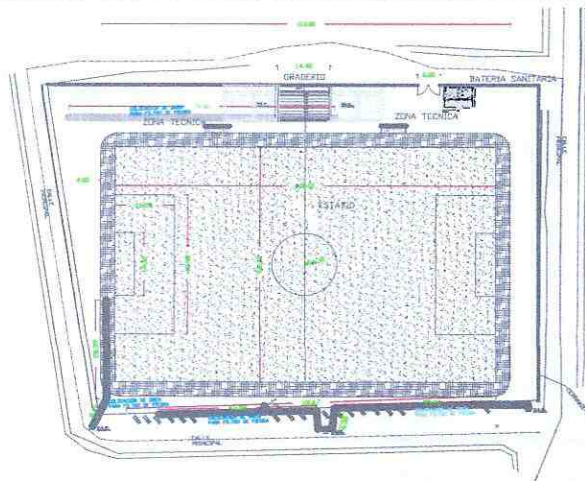

**Anexo Fotográfico**



Procurador común del Consorcio Estadio Tarqui  
**CRISTIAN FERNANDO  
PARRA USHCA**

ING. CRISTIAN PARRA

PROCURADOR COMUN CONSORCIO ESTADIO TARQUI  
CONTRATISTA



Procurador común del Consorcio Estadio Tarqui  
**ROBERT FERNANDO  
QUINTANA MUÑOZ**

ING. ROBERT QUINTANA

FISCALIZADOR

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  
DE PASTAZA**



**ANEXO 1**

CONTRATO: CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACIÓN: PARROQUIA TARQUI

CONTRATISTA : CONSORCIO ESTADIO TARQUI

**MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES**


PLANILLA DE AVANCE 2

RUBRO:16	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CESPED SINTÉTICO NORMAS FIFA DE ALTA CALIDAD, ARENA DE CILICE, PARTÍCULAS DE CAUCHO.	UNIDAD:	m2
----------	---	---------	----

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			RESULTADO	SUB TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
		l	a	h				
COLOCACION DE CESPED	1,00	105,00	32,00		3,360,00	3,360,00	m2	
TOTAL :						3,360,00	m2	

TOTAL ESTA PLANILLA	3,360,00	m2
CANTIDAD CONTRATADA	7,140,00	m2
PORCENTAJE EJECUTADO	47,06	%

**Anexo Gráfico**

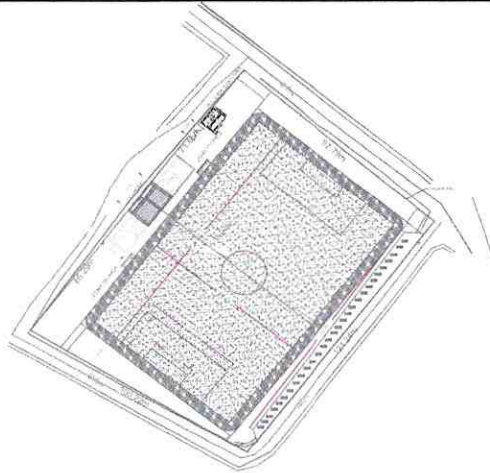

**Anexo Fotográfico**



ING. CRISTIAN FERNANDO  
PARRA USHCA

ING. CRISTIAN PARRA

PROCURADOR COMUN CONSORCIO ESTADIO TARQUI  
CONTRATISTA



ING. ROBERT FERNANDO  
QUINTANA MUÑOZ

ING. ROBERT QUINTANA

FISCALIZADOR

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  
DE PASTAZA**



**ANEXO 1**

CONTRATO: CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACIÓN: PARROQUIA TARQUI

CONTRATISTA : CONSORCIO ESTADIO TARQUI

**MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES**


PLANILLA DE AVANCE 2

RUBRO:23 EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJAS UNIDAD: m3

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			RESULTADO	SUB TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
		L	a	h				
EXCAVACION ZONA TECNICA 1	1.00	7.00	2.00	0.80	11.20	11.20	m3	
EXCAVACION ZONA TECNICA 2	1.00	7.00	2.00	0.80	11.20	11.20	m3	
TOTAL :						22.40	m3	

TOTAL ESTA PLANILLA	22.40	m3
CANTIDAD CONTRATADA	6.00	m3
PORCENTAJE EJECUTADO	373.33	%

**Anexo Gráfico**

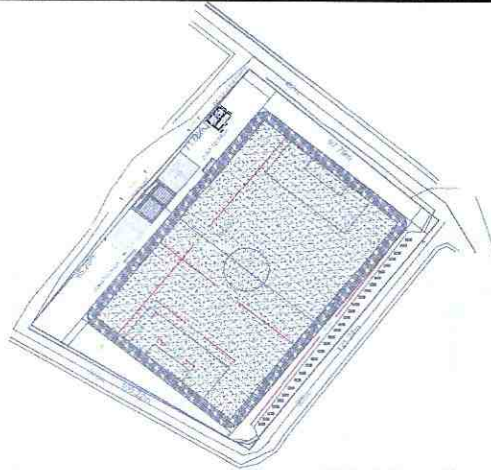

**Anexo Fotográfico**



Firmado electrónicamente por:  
**CRISTIAN FERNANDO  
PARRA USHCA**

ING. CRISTIAN PARRA  
PROCURADOR COMUN CONSORCIO ESTADIO TARQUI  
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:  
**ROBERT FERNANDO  
QUINTANA MUÑOZ**

ING. ROBERT QUINTANA  
FISCALIZADOR

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  
DE PASTAZA**



**ANEXO 1**

CONTRATO: CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACIÓN: PARROQUIA TARQUI

CONTRATISTA : CONSORCIO ESTADIO TARQUI

**MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES**

PLANILLA DE AVANCE 2


RUBRO:29 MATERIAL DE MEJORAMIENTO UNIDAD: m3

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			RESULTADO	SUB TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
		L	a	h				
MEJORAMIENTO ZONA TECNICA 1	1.00	7.00	2.00	0.50	7.00	7.00	m3	
MEJORAMIENTO ZONA TECNICA 2	1.00	7.00	2.00	0.50	7.00	7.00	m3	

TOTAL : 14.00 m3

TOTAL ESTA PLANILLA	14.00	m3
CANTIDAD CONTRATADA	3.00	m3
PORCENTAJE EJECUTADO	466.67	%

**Anexo Gráfico**

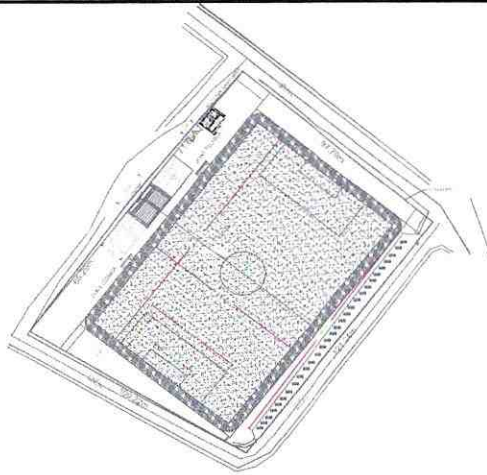

**Anexo Fotográfico**



Firma del Contratista:  
**CRISTIAN FERNANDO  
PARRA USHCA**

ING. CRISTIAN PARRA

PROCURADOR COMUN CONSORCIO ESTADIO TARQUI  
CONTRATISTA



Firma del Fiscalizador:  
**ROBERT FERNANDO  
QUINTANA MUÑOZ**

ING. ROBERT QUINTANA  
FISCALIZADOR

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  
DE PASTAZA**



**ANEXO 1-2**

CONTRATO: CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACIÓN: PARROQUIA TARQUI

CONTRATISTA : CONSORCIO ESTADIO TARQUI


**MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES**

PLANILLA DE AVANCE 2

RUBRO:68	EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJAS	UNIDAD:	m3						
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			RESULTADO	SUB TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES	
		VOLUMEN	l	a	h				
CERRAMIENTO FRONTAL	27.00		1.30	1.30	1.15	1.94	52.47	m3	EXCAVACION EN PLINTO
CERRAMIENTO FRONTAL	1.00		90.57	1.30	0.75	88.31	88.31	m3	EXCAVACION PARA CADENA
CERRAMIENTO POSTERIOR	31.00		1.20	1.20	0.40	0.58	17.86	m3	EXCAVACION PARA PLINTOS Y GAVIONES
VER EN MEMORIA DE CALCULO EN CORTE EN GAVIONES	1.00	1,090.80				1,090.80	1,090.80	m3	EXCAVACION PARA, GAVIONES Y GRADERIO
VER EN MEMORIA DE CALCULO EN CORTE EN PARQUEADERO	1.00	546.36				546.36	546.36	m3	EXCAVACION PLATAFORMA PARQUEADERO
<b>TOTAL :</b>							<b>1,795.80</b>	<b>m3</b>	

TOTAL ESTA PLANILLA	1,795.80	m3
CANTIDAD CONTRATADA	120.000	m3
PORCENTAJE EJECUTADO	1,496.50	%

**Anexo Gráfico**

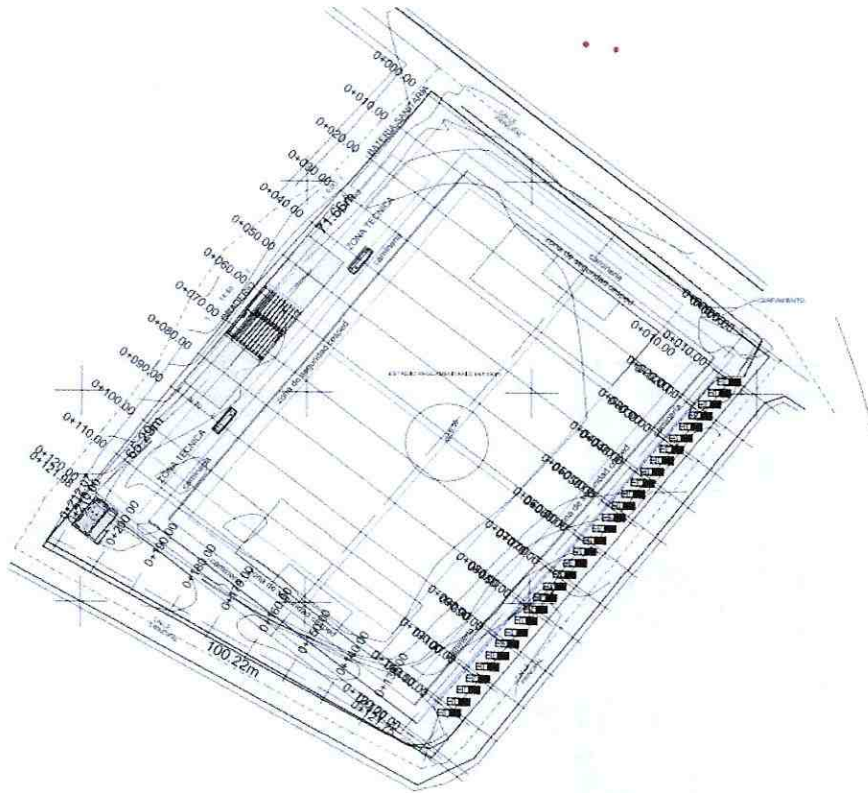

ING. CRISTIAN FERNANDO PARRA USHCA

ING. CRISTIAN PARRA

PROCURADOR COMUN CONSORCIO ESTADIO TARQUI  
CONTRATISTA



ING. ROBERT FERNANDO QUINTANA MUÑOZ

ING. ROBERT QUINTANA  
FISCALIZADOR

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  
DE PASTAZA**



**ANEXO 2-2**

CONTRATO: CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACIÓN: PARROQUIA TARQUI

CONTRATISTA : CONSORCIO ESTADIO TARQUI

**MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES**

PLANILLA DE AVANCE 2

RUBRO:68	EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJAS	UNIDAD:	m3
----------	--------------------------------	---------	----

**Anexo Gráfico**



CRISTIAN FERNANDO  
PARRA USHCA

ING. CRISTIAN PARRA

PROCURADOR COMUN CONSORCIO ESTADIO TARQUI  
CONTRATISTA



ROBERT FERNANDO  
QUINTANA MUÑOZ

ING. ROBERT QUINTANA  
FISCALIZADOR

COORDENADA INICIAL DE CURVA MASA		10,000.00		AREAS				VOLUMENES						
SECCIONES DE TN LEVANTADAS EN CAMPO	ELEVACIONES		ESPESORES		DESPALME		C	I	MJ	Factor de abundamiento en corte	SEMI-DISTANCIA A	DESPALME		C
	TN	SUBRAS ANTE	C	T	DC	DT						DC	DT	
<b>CORTE PARA GAVIONES</b>														
0+000.000	932.446	930.600	1.85	0.00	0.00	0.00	5.77	0.00	4.50					
0+010.000	932.694	930.600	2.09	0.00	0.00	0.00	6.77	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	62.73
0+020.000	932.782	930.600	2.18	0.00	0.00	0.00	7.24	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	70.03
0+030.000	932.680	930.600	2.08	0.00	0.00	0.00	6.65	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	69.43
0+040.000	932.717	930.600	2.12	0.00	0.00	0.00	6.77	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	67.11
0+050.000	932.432	930.600	1.83	0.00	0.00	0.00	5.66	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	62.15
0+060.000	931.860	930.600	1.26	0.00	0.00	0.00	3.79	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	47.23
0+070.000	931.522	930.600	0.92	0.00	0.00	0.00	2.74	0.08	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	32.61
0+080.000	931.318	930.600	0.72	0.00	0.00	0.00	2.15	0.19	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	24.44
0+090.000	931.112	930.600	0.51	0.00	0.00	0.00	2.38	0.06	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	22.67
0+100.000	931.580	930.600	0.98	0.00	0.00	0.00	2.94	0.03	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	26.63
0+110.000	931.823	930.600	1.22	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	33.07
0+120.000	932.069	930.600	1.47	0.00	0.00	0.00	4.44	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	40.56
0+130.000	932.222	930.600	1.62	0.00	0.00	0.00	4.95	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	46.99
0+140.000	932.370	930.600	1.77	0.00	0.00	0.00	5.48	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	52.15
0+150.000	932.417	930.600	1.82	0.00	0.00	0.00	5.64	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	55.60
0+160.000	932.457	930.600	1.86	0.00	0.00	0.00	5.79	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	57.16
0+170.000	932.428	930.600	1.83	0.00	0.00	0.00	5.68	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	57.35
0+180.000	932.518	930.600	1.92	0.00	0.00	0.00	6.01	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	58.46
0+190.000	932.630	930.600	2.03	0.00	0.00	0.00	6.43	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	62.23
0+200.000	932.664	930.600	2.06	0.00	0.00	0.00	6.60	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	65.16
0+210.000	932.559	930.600	1.96	0.00	0.00	0.00	6.23	0.00	4.50	1.00	5.00	0.00	0.00	64.12
0+212.074	932.569	930.600	1.97	0.00	0.00	0.00	6.22	0.00	4.50	1.00	1.04	0.00	0.00	12.91
												<b>SUB TOTAL 1</b>	<b>1090.80</b>	



CRISTIAN FERNANDO  
QUINTANA USICO  
PARA USUCA



ROBERT FERNANDO  
QUINTANA MUNOZ

COORDENADA INICIAL DE CURVA MASA		10,000.00		AREAS						VOLUMENES					
SECCIONES DE TN LEVANTADAS EN CAMPO	ELEVACIONES		ESPEORES		DESPALME		C	I	MJ	Factor de abundami ento en corte	SEMI- DISTAN CIA	DESPALME		C	
	TN	SUBRAS ANTE	C	T	DC	DT						DC	DT		
0+000.000	932.129	932.100	0.03	0.00	0.00	0.00	1.15	0.10	3.90						
0+010.000	933.020	931.963	1.06	0.00	0.00	0.00	6.67	0.00	3.90	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	39.10
0+020.000	932.869	931.825	1.04	0.00	0.00	0.00	6.86	0.00	3.90	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	67.68
0+030.000	932.740	931.688	1.05	0.00	0.00	0.00	5.96	0.00	3.90	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	64.13
0+040.000	932.675	931.550	1.12	0.00	0.00	0.00	6.52	0.01	3.90	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	62.42
0+050.000	932.102	931.412	0.69	0.00	0.00	0.00	4.26	0.03	3.90	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	53.91
0+060.000	931.782	931.275	0.51	0.00	0.00	0.00	2.90	0.01	3.90	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	35.82
0+070.000	931.547	931.137	0.41	0.00	0.00	0.00	2.39	0.06	3.90	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	26.45
0+080.000	931.696	931.000	0.70	0.00	0.00	0.00	3.77	0.12	3.90	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	30.76
0+090.000	931.778	931.096	0.68	0.00	0.00	0.00	4.11	0.00	3.90	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	39.36
0+100.000	931.853	931.192	0.66	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	3.90	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	39.93
0+110.000	931.943	931.287	0.66	0.00	0.00	0.00	3.99	0.00	3.90	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	39.35
0+120.000	932.011	931.383	0.63	0.00	0.00	0.00	4.08	0.00	3.90	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	40.35
0+121.755	932.018	931.400	0.62	0.00	0.00	0.00	4.02	0.00	3.90	1.00	0.88	0.00	0.00	0.00	7.10
<b>SUB TOTAL 2</b>												<b>546.36</b>			


**CORTE EN PARQUEADERO**



ROBERT FERNANDO  
QUINTANA MUÑOZ



CRISTIAN FERNANDO  
PARRA USHCA

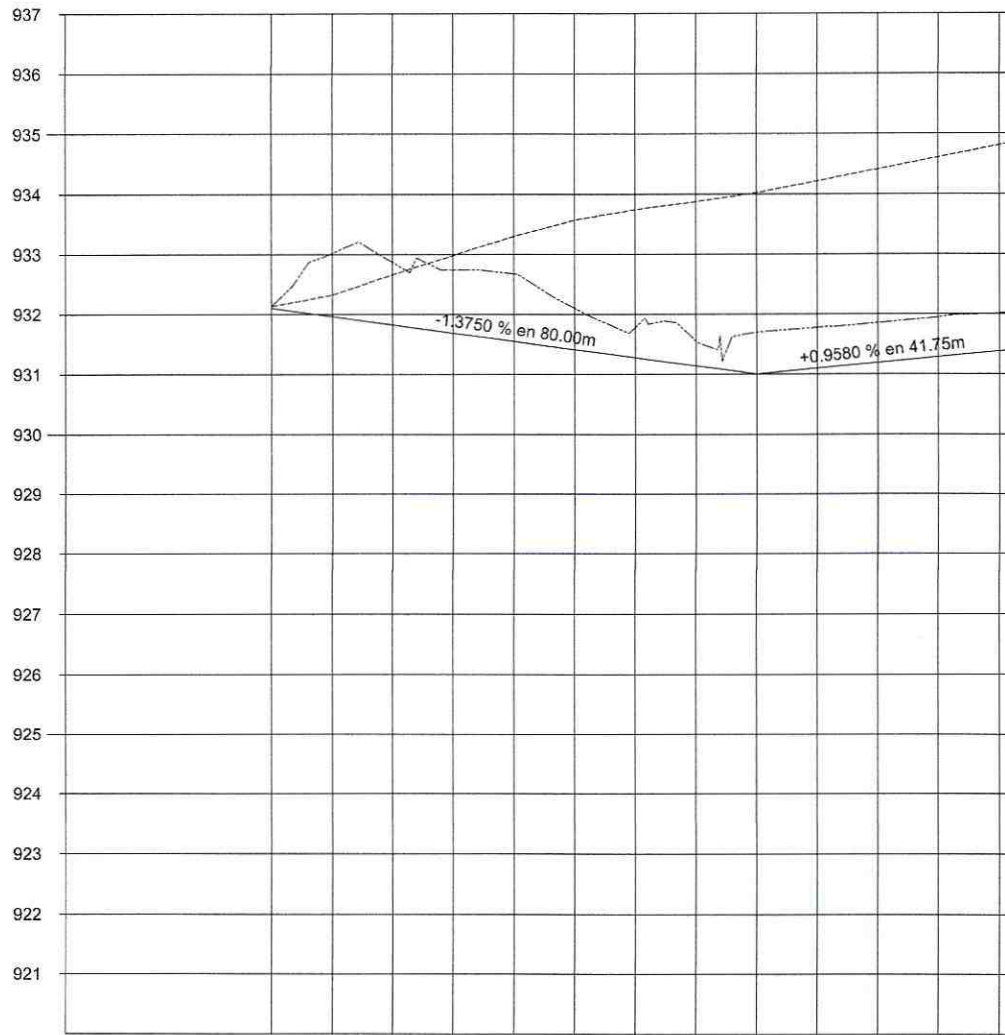

TIPO DE MATERIAL			
FACTOR DE ABUNDAMIENTO			
FACTOR DE COMPACTACION			
ORDENADAS DE LA CURVA MASA			
VOLUMEN	TERRAPLEN	0.00	0.00
	CORTE	39.10	0.48
ESPESOR	TERRAPLEN	0.03	1.06
	CORTE	1.04	1.05
ELEVACION	SUBRASANTE	932.10	931.96
	TERRENO	932.13	931.82
		932.74	931.69
		932.67	931.55
		932.10	931.41
		931.78	931.28
		931.55	931.14
		931.70	931.00
		931.78	931.10
		931.85	931.19
		931.94	931.29
		932.01	931.38
		10.536	0.01
		40.35	0.00

PERFIL LONGITUDINAL PARQUEADERO


ESCALA HORIZONTAL 1 : 1000

ESCALA VERTICAL 1 : 100

TOTAL VOLUMEN CORTE = 546.36m3

TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -2.82m3



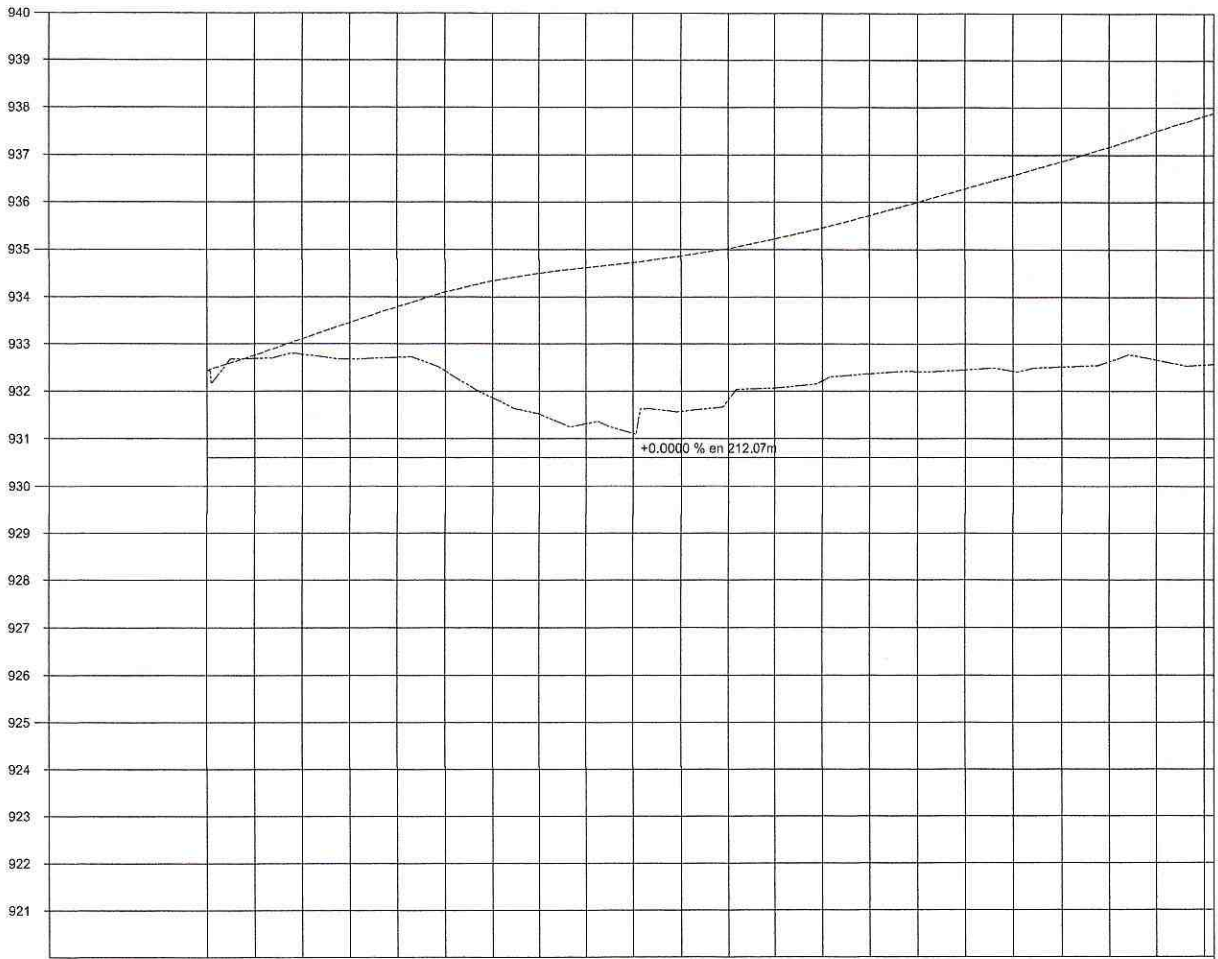

ESTACION	ELEVACION		ESPESOR		VOLUMEN		ORDENADAS DE LA CURVA MASA	FACTOR DE COMPACTACION	FACTOR DE ABUNDAMIENTO	TIPO DE MATERIAL
	TERRAPLEN	SUBRASANTE	CORTE	TERRAPLEN	CORTE	TERRAPLEN				
0+000.00	932.45	930.60	1.85		0.00	0.00	10.000			
0+010.00	932.69	930.60	2.09		62.73	0.00	10.063			
0+020.00	932.78	930.60	2.18		70.03	0.00	10.133			
0+030.00	932.68	930.60	2.08		69.43	0.00	10.202			
0+040.00	932.72	930.60	2.12		67.11	0.00	10.289			
0+050.00	932.43	930.60	1.83		62.15	0.00	10.331			
0+060.00	931.86	930.60	1.26		47.23	0.00	10.379			
0+070.00	931.52	930.60	0.92		32.61	0.38	10.411			
0+080.00	931.32	930.60	0.72		24.44	1.32	10.434			
0+090.00	931.11	930.60	0.51		22.67	1.23	10.455			
0+100.00	931.58	930.60	0.98		26.63	0.46	10.482			
0+110.00	931.62	930.60	1.22		33.07	0.17	10.515			
0+120.00	932.07	930.60	1.47		40.56	0.00	10.555			
0+130.00	932.22	930.60	1.62		46.99	0.00	10.602			
0+140.00	932.37	930.60	1.77		52.15	0.00	10.654			
0+150.00	932.42	930.60	1.82		55.60	0.00	10.710			
0+160.00	932.46	930.60	1.86		57.16	0.00	10.767			
0+170.00	932.43	930.60	1.83		57.35	0.00	10.824			
0+180.00	932.52	930.60	1.92		58.46	0.00	10.883			
0+190.00	932.63	930.60	2.03		62.23	0.00	10.945			
0+200.00	932.66	930.60	2.06		65.16	0.00	11.010			
0+210.00	932.55	930.60	1.95		64.12	0.00	11.074			
TOTAL					1,090.80	3.58				

PERFIL LONGITUDINAL GAVIONES

ESCALA HORIZONTAL 1 : 1000  
 ESCALA VERTICAL 1 : 100  
 TOTAL VOLUMEN CORTE = 1,090.80m<sup>3</sup>  
 TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -3.58m<sup>3</sup>



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  
DE PASTAZA**



**ANEXO 1**

CONTRATO: CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACIÓN: PARROQUIA TARQUI

CONTRATISTA : CONSORCIO ESTADIO TARQUI

**MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES**


PLANILLA DE AVANCE 2

RUBRO:69 | HORMIGÓN SIMPLE DE 210 KG/CM2 EN PLINTOS, INCLUYE ENCOFRADOS | UNIDAD: | m3

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			RESULTADO	SUB TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
		l	a	h				
CERRAMIENTO FRONTAL	31.00	1.20	1.20	0.20	0.29	8.93	m3	
CERRAMIENTO LATERAL IZQUIERDO	41.00	1.20	1.20	0.20	0.29	11.81	m3	
CERRAMIENTO POSTERIOR	31.00	1.20	1.20	0.20	0.29	8.93	m3	
<b>TOTAL :</b>						<b>29.66</b>	<b>m3</b>	

TOTAL ESTA PLANILLA	29.66	m3
CANTIDAD CONTRATADA	20.00	m3
PORCENTAJE EJECUTADO	148.32	%

**Anexo Gráfico**

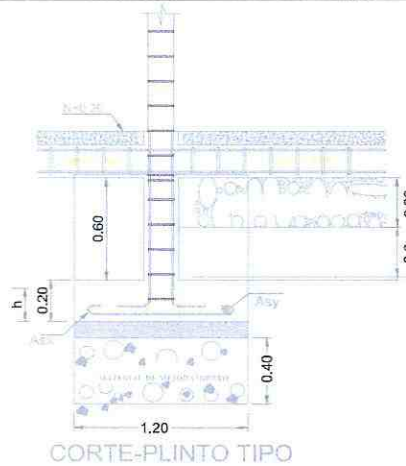

**Anexo Fotográfico**



CRISTIAN FERNANDO  
PARRA USHCA

ING. CRISTIAN PARRA

PROCURADOR COMUN CONSORCIO ESTADIO TARQUI  
CONTRATISTA



ROBERT FERNANDO  
QUINTANA MUÑOZ

ING. ROBERT QUINTANA  
FISCALIZADOR

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  
DE PASTAZA**



**ANEXO 1**

CONTRATO: CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACIÓN: PARROQUIA TARQUI

CONTRATISTA : CONSORCIO ESTADIO TARQUI

**MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES**


PLANILLA DE AVANCE 2

RUBRO:70	HORMIGÓN SIMPLE DE 210 KG/CM2 EN CADENAS, INCLUYE ENCOFRADOS	UNIDAD:	m3
----------	--	---------	----

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			RESULTADO	SUB TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
		l	a	h				
CERRAMIENTO FRONTAL	27.00	2.79	0.20	0.20	0.11	3.01	m3	
CERRAMIENTO FRONTAL	1.00	1.30	0.20	0.20	0.05	0.05	m3	
CERRAMIENTO LATERAL IZQUIERDO	41.00	2.80	0.20	0.20	0.11	4.59	m3	
CERRAMIENTO LATERAL IZQUIERDO	1.00	1.80	0.20	0.20	0.07	0.07	m3	
CERRAMIENTO POSTERIOR	30.00	2.80	0.20	0.20	0.11	3.36	m3	
CERRAMIENTO POSTERIOR	1.00	2.30	0.20	0.20	0.09	0.09	m3	
<b>TOTAL :</b>						<b>11.18</b>	<b>m3</b>	

TOTAL ESTA PLANILLA	11.18	m3
CANTIDAD CONTRATADA	25.00	m3
PORCENTAJE EJECUTADO	44.72	%

**Anexo Gráfico**

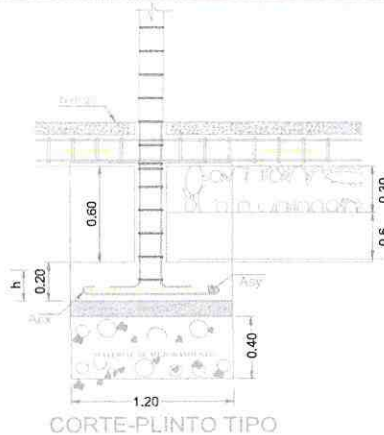

**Anexo Fotográfico**



Firmado electrónicamente por:  
**CRISTIAN FERNANDO  
PARRA USHCA**

ING. CRISTIAN PARRA

PROCURADOR COMUN CONSORCIO ESTADIO TARQUI  
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:  
**ROBERT FERNANDO  
QUINTANA MUÑOZ**

ING. ROBERT QUINTANA  
FISCALIZADOR

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  
DE PASTAZA**



**ANEXO 1**

CONTRATO: CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACIÓN: PARROQUIA TARQUI

CONTRATISTA : CONSORCIO ESTADIO TARQUI

**MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES**


PLANILLA DE AVANCE 2

RUBRO:71	HORMIGÓN SIMPLE DE 210 KG/CM2 EN COLUMNAS, INCLUYE ENCOFRADOS	UNIDAD:	m3
----------	---	---------	----


DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			RESULTADO	SUB TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
		l	a	h				
CERRAMIENTO FRONTAL	26,00	2,60	0,20	0,20	0,10	2,70	m3	
CERRAMIENTO FRONTAL	5,00	4,30	0,20	0,20	0,17	0,86	m3	COLUMNAS INGRESO PUERTAY ESQUINERA
CERRAMIENTO LATERAL IZQUIERDO	27,00	4,30	0,20	0,20	0,17	4,64	m3	
	14,00	4,00	0,20	0,20	0,16	2,24	m3	
CERRAMIENTO POSTERIOR	18,00	4,00	0,20	0,20	0,16	2,88	m3	
	13,00	3,80	0,20	0,20	0,15	1,98	m3	
<b>TOTAL :</b>						<b>15,30</b>	<b>m3</b>	

TOTAL ESTA PLANILLA	15,30	m3
CANTIDAD CONTRATADA	19,50	m3
PORCENTAJE EJECUTADO	78,48	%

**Anexo Gráfico**

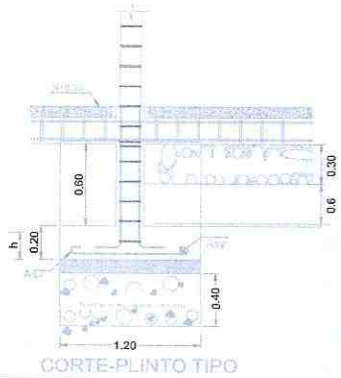

**Anexo Fotográfico**

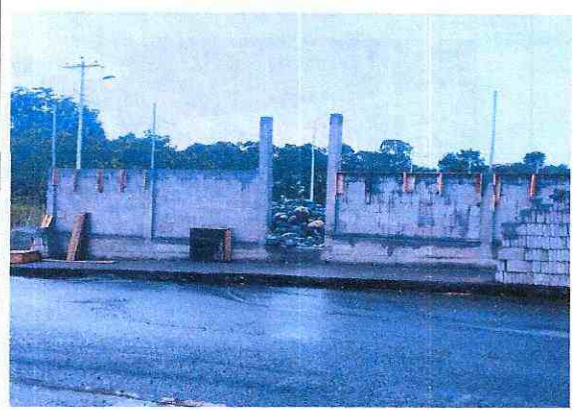

CRISTIAN FERNANDO  
PARRA USHCA

ING. CRISTIAN PARRA

PROCURADOR COMUN CONSORCIO ESTADIO TARQUI  
CONTRATISTA



ROBERT FERNANDO  
QUINTANA MUÑOZ

ING. ROBERT QUINTANA

FISCALIZADOR

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  
DE PASTAZA**



**ANEXO 1**

CONTRATO: CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACIÓN: PARROQUIA TARQUI

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

**MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES**


PLANILLA DE AVANCE 2

RUBRO:72	REPLANTILLO H.S. 180 KG/CM2	UNIDAD:	m3
----------	-----------------------------	---------	----

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			RESULTADO	SUB TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
		l	a	h				
CERRAMIENTO FRONTAL	31.00	1.25	1.25	0.10	0.16	4.84	m3	HORMIGON REPLANTILLO
CERRAMIENTO LATERAL IZQUIERDO	41.00	1.25	1.25	0.10	0.16	6.41	m3	HORMIGON REPLANTILLO
CERRAMIENTO POSTERIOR	31.00	1.25	1.25	0.10	0.16	4.84	m3	HORMIGON REPLANTILLO
<b>TOTAL</b>					<b>16.09</b>	<b>48.09</b>	<b>m3</b>	

TOTAL ESTA PLANILLA	16.09	m3
CANTIDAD CONTRATADA	9.00	m3
PORCENTAJE EJECUTADO	178.82	%

**Anexo Gráfico**

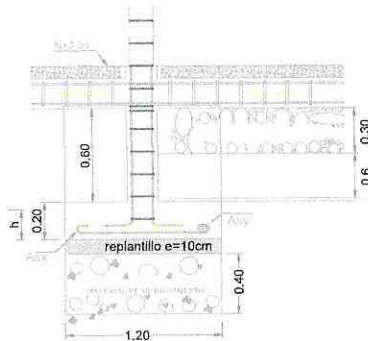

**Anexo Fotográfico**



Firmado digitalmente por  
**CRISTIAN FERNANDO  
FARRA USHCA**

ING. CRISTIAN FARRA  
PROCURADOR COMUN CONSORCIO ESTADIO TARQUI  
CONTRATISTA



Firmado digitalmente por  
**ROBERT FERNANDO  
QUINTANA MUÑOZ**

ING. ROBERT QUINTANA  
FISCALIZADOR

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  
DE PASTAZA**



**ANEXO 1**

CONTRATO: CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACIÓN: PARROQUIA TARQUI

CONTRATISTA : CONSORCIO ESTADIO TARQUI

**MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES**


PLANILLA DE AVANCE 2

RUBRO:73	MATERIAL DE MEJORAMIENTO	UNIDAD:	m3
----------	--------------------------	---------	----

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			RESULTADO	SUB TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
		l	a	h				
CERRAMIENTO FRONTAL	31.00	1.30	1.30	0.40	0.68	20.96	m3	MEJORAMIENTO PARA PLINTOS
CERRAMIENTO LATERAL IZQUIERDO	14.00	1.30	1.30	0.40	0.68	9.46	m3	
CERRAMIENTO POSTERIOR	31.00	1.30	1.30	0.40	0.68	20.96	m3	
<b>TOTAL :</b>						<b>51.38</b>	<b>m3</b>	

TOTAL ESTA PLANILLA	51.38	m3
CANTIDAD CONTRATADA	25.00	m3
PORCENTAJE EJECUTADO	205.50	%

**Anexo Gráfico**

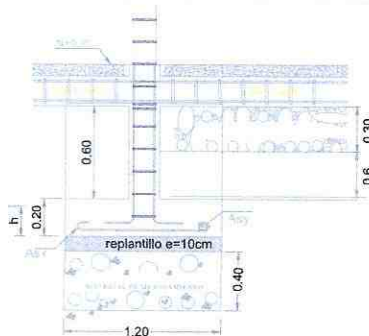

**Anexo Fotográfico**



firmado digitalmente por  
**CRISTIAN FERNANDO  
PARRA USHCA**

ING. CRISTIAN PARRA

PROCURADOR COMUN CONSORCIO ESTADIO TARQUI  
CONTRATISTA



firmado digitalmente por  
**ROBERT FERNANDO  
QUINTANA MUÑOZ**

ING. ROBERT QUINTANA  
FISCALIZADOR

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  
DE PASTAZA**



**ANEXO 1**

CONTRATO: CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACIÓN: PARROQUIA TARQUI

CONTRATISTA : CONSORCIO ESTADIO TARQUI

**MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES**


PLANILLA DE AVANCE 2

RUBRO:74	ACERO DE REFUERZO FY=4200 CON ALAMBRE GALV. 18	UNIDAD:	kg
----------	--	---------	----

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES		RESULTADO	SUB TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
		CANTIDAD	a				
ACERO DE REFUERZO	1,00	6,225.47			6,225.47	kg	
TOTAL :					6,225.47	kg	

TOTAL ESTA PLANILLA	6,225.47	kg
CANTIDAD CONTRATADA	3,000.00	kg
PORCENTAJE EJECUTADO	207.52	%

**Anexo Gráfico**

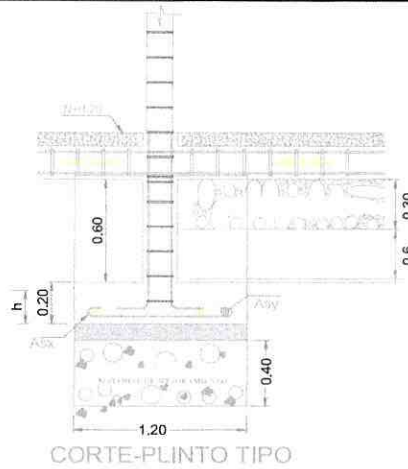

**Anexo Fotográfico**



Firmado electrónicamente por:  
**CRISTIAN FERNANDO  
PARRA USHCA**

ING. CRISTIAN PARRA

PROCURADOR COMUN CONSORCIO ESTADIO TARQUI  
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:  
**ROBERT FERNANDO  
QUINTANA MUÑOZ**

ING. ROBERT QUINTANA

FISCALIZADOR



## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

CONTRATO: CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACIÓN: PARROQUIA TARQUI

CONTRATISTA : CONSORCIO ESTADIO TARQUI

### ANEXO 2

#### RUBRO ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2

Mc	D (mm)	TIPO	N °.	DIMENSIONES			LONGITUD		PESO (Kg)	OBS.	
				a	b	c	g	Parcial			Total
<b>PLINTO CERRAMIENTO FRONTAL</b>											
100	12	C	434.00	1.10	0.15*2			1.40	607.60	540.76	
<b>PLINTO CERRAMIENTO LATERAL IZQUIERDO</b>											
100	12	C	574.00	1.10	0.15*2			1.40	803.60	715.20	
<b>PLINTO CERRAMIENTO POSTERIOR</b>											
100	12	C	434.00	1.10	0.15*2			1.40	607.60	540.76	
<b>COLUMNA FRONTAL</b>											
200	12	L	104.00	2.75	0.25			3.00	312.00	277.68	
200	12	L	20.00	4.30	0.25			4.55	91.00	80.99	
101	10	O	609.00	0.15*2	0.15*2		0.05*2	0.70	426.30	263.03	
<b>COLUMNA LATERAL IZQUIERDA</b>											
200	12	L	56.00	4.00	0.25			4.25	238.00	211.82	
200	12	L	108.00	4.30	0.25			4.55	491.40	437.35	
101	10	O	840.00	0.15*2	0.15*2		0.05*2	0.70	588.00	362.80	
									<b>SUB TOTAL 1</b>	<b>3430.39</b>	<b>Kg</b>



ING. CRISTIAN PARRA  
CONTRATISTA



ING. ROBERT QUINTANA  
FISCALIZADOR

PROCURADOR COMUN CONSORCIO ESTADIO TARQUI  
CONTRATISTA



# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

CONTRATO: CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACION: PARROQUIA TARQUI

CONTRATISTA : CONSORCIO ESTADIO TARQUI

## ANEXO 2

### RUBRO ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2

Mc	D (mm)	TIPO	N °.	DIMENSIONES			LONGITUD		PESO (Kg)	OBS.	
				a	b	c	g	Parcial			Total
COLUMNA POSTERIOR											
200	12	L	52.00	4.00	0.25			4.25	221.00	196.69	
200	12	L	72.00	3.80	0.25			4.05	291.60	259.52	
101	10	O	516.00	0.15*2	0.15*2		0.05*2	0.70	361.20	222.86	
CADENA FRONTAL											
200	12	C	4.00	96.60	0.15*2			96.90	387.60	344.96	
201	10	O	495.00	0.15*2	0.15*2		0.05*2	0.70	346.50	213.79	
CADENA LATERAL IZQUIERDA											
200	12	C	4.00	128.00	0.15*2			128.30	513.20	456.75	
201	10	O	738.00	0.15*2	0.15*2		0.05*2	0.70	516.60	318.74	
CADENA POSTERIOR											
200	12	C	434.00	96.70	0.15*2			1.40	607.60	540.76	
201	10	O	558.00	0.15*2	0.15*2		0.05*2	0.70	390.60	241.00	
									SUB TOTAL 2	2795.08	Kg
									TOTAL	6225.47	Kg



ING. CRISTIAN FERNANDO PARRA USHCA  
CONTRATISTA



ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZADOR

PROCURADOR COMUN CONSORCIO ESTADIO TARQUI



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**



**LIBRO DE OBRA**

Hoja No. 11

Construye: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Contrato: COTO-GADPPz-017-2022

FECHA: 02 / 01 / 2023

Descripción de trabajos:

► TRANSPORTE DE MAQUINARIA AL SITIO DEL PROYECTO

Equipo utilizado

Herramienta menor, Volqueta, Retroexcavadora.

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra

Residente de Obra, Ingeniero Ambiental, operador, Chofer  
Maestro Peón.

Estado del tiempo

Soleado

X

Nublado

Lluvia

Observaciones:

  
**FISCALIZADOR**  
ING. ROBERT QUINTANA

  
**CONTRATISTA**  
ING. CRISTIAN PARRA  
PROCURADOR COMUN DEL CONSORCIO ESTADIO TARQUI



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**



LIBRO DE OBRA

Hoja No. 12

Construye: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA

Contrato: COTO-GADPPz-017-2022

FECHA: 03 / 01 / 2023

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Descripción de trabajos:

- ▶ TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO
- ▶ EXCAUACIÓN EN CONGLOMERADO
- ▶ DESALOJO MATERIAL CONTAMINADO
- ▶ DESARROLLO DE CUBIERTO EN ZONA TÉCNICA

Equipo utilizado

Herramienta menor, Volquetas Retroexcavadora

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra

Residente de Obra, Operador, Chofer, Maestro Peón

Estado del tiempo

Soleado

x

Nublado

Lluvia

Observaciones:

FISCALIZADOR  
ING. ROBERT QUINTANA

CONTRATISTA  
ING. CRISTIAN PARRA  
PROCURADOR COMUN DEL CONSORCIO ESTADIO TARQUI



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**



**LIBRO DE OBRA**

Hoja No. 13

Construye: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Contrato: COTO-GADPPz-017-2022

FECHA: 04/01/2023

Descripción de trabajos:

- ▶ TRANSPORTE DE MATERIAL PÉREDO DE MEJORAMIENTO
- ▶ EXCAUCIÓN EN CONCRETO
- ▶ DESARROLLO MATERIAL CONTINUADO

Equipo utilizado

Volquetas, Herramienta Menor, Retroexcavadora

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra

Residente de Obra, Ingeniero Ambiental, Operador, chofer, Maestro Peon

Estado del tiempo

Soleado

x

Nublado

Lluvia

Observaciones:

**FISCALIZADOR**  
ING. ROBERT QUINTANA

**CONTRATISTA**  
ING. CRISTIAN PARRA



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**



<b>LIBRO DE OBRA</b>	Hoja No. 14
	Construye: CONSORCIO ESTADIO TARQUI
	Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA
	Contrato: COTO-GADPPz-017-2022

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

FECHA: 05 / 01 / 2023

Descripción de trabajos:

- ▶ TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO
- ▶ EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO
- ▶ DESALOJO MATERIAL CONTAMINADO
- ▶ DESARROLLO DE CUBIERTA EN GRABEROL

Equipo utilizado  
Herramienta Menor, Volquetas, Retroexcavadora.

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra  
Residente de Obra, Ingeniero Ambiental, Operador, Chofer, Manejo de Peón

Estado del tiempo		Observaciones:
Soleado	x	
Nublado		
Lluvia		

FISCALIZADOR  
ING. ROBERT QUINTANA

CONTRATISTA  
ING. CRISTIAN PARRA  
PROCURADOR COMUN DEL CONSORCIO ESTADIO TARQUI



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**



**LIBRO DE OBRA**

Hoja No. 15

Construye: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Contrato: COTO-GADPPz-017-2022

FECHA: 06 / 01 / 2023

Descripción de trabajos:

- ▷ TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO
- ▷ EXCAVACIÓN EN CONCRETO
- ▷ DESALOJO MATERIAL CONTAMINADO
- ▷ DESARMADO DE CUBIERTA

Equipo utilizado

Herramienta Menor, Volquetas, Retroexcavadora

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra

Residentes de Obra, Operador, Chofer, Marcelo Pañ.

Estado del tiempo

Soleado

x

Nublado

Lluvia

Observaciones:

FISCALIZADOR  
ING. ROBERT QUINTANA

CONTRATISTA  
ING. CRISTIAN PARRA  
PROCURADOR COMÚN DEL CONSORCIO ESTADIO TARQUI



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**



**LIBRO DE OBRA**

Hoja No. 16

Construye: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Contrato: COTO-GADPPz-017-2022

FECHA: 07/01/2023

Descripción de trabajos:

- ▷ TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO
- ▷ EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR
- ▷ DESALOJO MATERIAL CONTAMINADO
- ▷ DESARMAO DE CUBIERTA

Equipo utilizado

Herramienta menor, Volquetas, Retroexcavadora.

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra

Residente de Obra, Operador, Chofer, Maestro peón

Estado del tiempo

Soleado

x

Nublado

Lluvia

Observaciones:

  
FISCALIZADOR  
ING. ROBERT QUINTANA

  
CONTRATISTA  
ING. CRISTIAN PARRA  
PROCURADOR COMUN DEL CONSORCIO ESTADIO TARQUI



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**



**LIBRO DE OBRA**

Hoja No. 17

Construye: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA

Contrato: COTO-GADPPz-017-2022

FECHA: 09/01/2023

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Descripción de trabajos:

- ▷ TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO
- ▷ EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR
- ▷ DESALOJO DE MATERIAL CONTAMINADO
- ▷ DESARMAO DE COBIERTA

Equipo utilizado

Herramienta Menor, Volquetas, Retroexcavadora.

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra

Residente de Obra, Ingeniero Ambiental, Operador, Chofer, Maestro Peón

Estado del tiempo

Soleado

x

Nublado

Lluvia

x

Observaciones:

  
FISCALIZADOR  
ING. ROBERT QUINTANA

  
CONTRATISTA  
ING. CRISTIAN PARRA  
PROCURADOR COMUN DEL CONSORCIO ESTADIO TARQUI



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**



LIBRO DE OBRA

Hoja No. 18

Construye: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Contrato: COTO-GADPPz-017-2022

FECHA: 10 / 01 / 2023

Descripción de trabajos:

- ▶ TRANSPORTE DE MATERIAL DE REORDAMIENTO
- ▶ DESALOJO DE MATERIAL CONTAMINADO

Equipo utilizado

Herramienta Menor, Volquetas, Retroexcavadora.

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra

Residente de Obra, Operador, Chofer, Maestro Peón

Estado del tiempo

Soleado

x

Nublado

Lluvia

x

Observaciones:

FISCALIZADOR  
ING. ROBERT QUINTANA

CONTRATISTA  
ING. CRISTIAN PARRA  
PROCURADOR COMUN DEL CONSORCIO ESTADIO TARQUI



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**



**LIBRO DE OBRA**

Hoja No. 13

Construye: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA

Contrato: COTO-GADPPz-017-2022

FECHA: 11/01/2023

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Descripción de trabajos:

- ▶ TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO
- ▶ CONFIGURACIÓN DE ESTRIBOS PARA COLUMNAS
- ▶

Equipo utilizado

Herramienta menor, Volquetas, Retroexcavadora.

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra

Residentes de Obra, Ingeniero Ambiental, Operador, Chofer, Maestro Peón.

Estado del tiempo

Soleado

Nublado

Lluvia

Observaciones:

FISCALIZADOR  
ING. ROBERT QUINTANA

CONTRATISTA  
ING. CRISTIAN PARRA  
PROCURADOR COMUN DEL CONSORCIO ESTADIO TARQUI



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**



<b>LIBRO DE OBRA</b>	Hoja No. 10
	Constuye: CONSORCIO ESTADIO TARQUI
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".	Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA
	Contrato: COTO-GADPPz-017-2022
	FECHA: 12/01/2023

Descripción de trabajos:

- ▶ TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO
- ▶ CONFIGURACIÓN DE ESTRIBOS PARA COLUMNAS
- ▶ TENIDO DE MATERIAL PIEDRO
- ▶ CORTE DE VARILLAS PARA PLINTOS

Equipo utilizado  
Herramienta menor, Volquetas, Retroexcavadora.

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra  
Residente de Obra, Ingéniero Ambiental, Operador, Chofer, Maestro menor.

Estado del tiempo	Observaciones:
Soleado	
Nublado	
Lluvia	

  
**FISCALIZADOR**  
 ING. ROBERT QUINTANA

  
**CONTRATISTA**  
 ING. CRISTIAN PARRA  
 PROCURADOR COMUN DEL CONSORCIO ESTADIO TARQUI



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**



**LIBRO DE OBRA**

Hoja No. 21

Construye: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Contrato: COTO-GADPPz-017-2022

FECHA: 13 / 01 / 2023

Descripción de trabajos:

- ▶ TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO
- ▶ CONFIGURACIÓN DE ESTALDOS PARA COLUMNA.
- ▶ CONTE DE VARILLAS PARA PLINTOS

Equipo utilizado

Herramienta Manera, Volquetas, Retroexcavadora.

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra

Residente de Obra, Operador, Chofer, Maestro Peón

Estado del tiempo

Soleado

Nublado

Lluvia

Observaciones:

  
FISCALIZADOR  
ING. ROBERT QUINTANA

  
CONTRATISTA  
ING. CRISTIAN PARRA  
PROCURADOR COMUN DEL CONSORCIO ESTADIO TARQUI



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**



**LIBRO DE OBRA**

Hoja No. 22

Construye: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Contrato: COTO-GADPPz-017-2022

FECHA: 14/01/2023

Descripción de trabajos:

- ▷ TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO
- ▷ CONFIGURACIÓN DE ESTRIBOS PARA COLUMNAS
- ▷ ARMADO DE PLINTOS

Equipo utilizado

Herramienta menor, Volquetas, Retroexcavadora.

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra

Residente de Obra, Operador, Chofer, Maestro Peón

Estado del tiempo

Soleado

Nublado

Lluvia

Observaciones:

FISCALIZADOR  
ING. ROBERT QUINTANA

CONTRATISTA  
ING. CRISTIAN PARRA  
PROCURADOR COMUN DEL CONSORCIO ESTADIO TARQUI



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**



**LIBRO DE OBRA**

Hoja No. 23

Construye: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Contrato: COTO-GADPPz-017-2022

FECHA: 16/01/2023

Descripción de trabajos:

- ▶ TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTRICO DE MEJORAMIENTO
- ▶ ARMADO DE ESTADOS PARA COLUMNAS

Equipo utilizado

Herramienta menor, Volquetas, Retroexcavadora.

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra

Residentes de Obra, Operador, Chofer, Maestro Peci

Estado del tiempo

Soleado

x

Nublado

Lluvia

x

Observaciones:

FISCALIZADOR  
ING. ROBERT QUINTANA

CONTRATISTA  
ING. CRISTIAN PARRA  
PROCURADOR COMUN DEL CONSORCIO ESTADIO TARQUI



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**



**LIBRO DE OBRA**

Hoja No. 24

Construye: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Contrato: COTO-GADPPz-017-2022

FECHA: 17/01/2023

Descripción de trabajos:

- ▶ TRANSPORTE DE MATERIAL PÉREO DE MEJORAMIENTO
- ▶ ARMAO DE HIERRO EN COLUMNAS
- ▶ EXCAVACIÓN EN SUELO NATURAL PARA PLINTOS
- ▶ MEJORAMIENTO DE SUELO PARA PLINTOS

Equipo utilizado

Herramienta Menor, Volquetas, Retroexcavadora

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra

Residentes de Obra, Operador, Chofer, Maestro Peón.

Estado del tiempo

Soleado

x

Nublado

Lluvia

Observaciones:

FISCALIZADOR  
ING. ROBERT QUINTANA

CONTRATISTA  
ING. CRISTIAN PARRA  
PROCURADOR COMUN DEL CONSORCIO ESTADIO TARQUI



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**



<b>LIBRO DE OBRA</b>	Hoja No. 25
	Construye: CONSORCIO ESTADIO TARQUI
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".	Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA
	Contrato: COTO-GADPPz-017-2022
	FECHA: 18/01/2023

Descripción de trabajos:

↳ TRANSPORTE DE MATERIAL PÉREO DE MEJORAMIENTO

↳ EXCAVACIÓN EN SUELO NATURAL PARA PLINTOS

↳ MEJORAMIENTO DE SUELO PARA PLINTOS

Equipo utilizado  
Herramienta menor, Volquetas, Retroexcavadora.

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra  
Residentes de Obra, Operadora, Chofer, Maestro Peón

Estado del tiempo		Observaciones:
Soleado	x	
Nublado		
Lluvia	x	

FISCALIZADOR  
ING. ROBERT QUINTANA

CONTRATISTA  
ING. CRISTIAN PARRA  
PROCURADOR COMUN DEL CONSORCIO ESTADIO TARQUI



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**



**LIBRO DE OBRA**

Hoja No. 26

Construye: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Contrato: COTO-GADPPz-017-2022

FECHA: 13/01/2023

Descripción de trabajos:

- ▷ TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO
- ▷ ENCOFRADO DE MAQUERA PARA REPLANTILLO
- ▷ COLOCACIÓN DE HORMIGON EN REPLANTILLO

Equipo utilizado

Herramienta Menor, Volquetas, Retroexcavadora.

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra

Residentes de Obra, Operador, Chofer, Maestro Peón.

Estado del tiempo

Soleado

x

Nublado

Lluvia

Observaciones:

FISCALIZADOR  
ING. ROBERT QUINTANA

CONTRATISTA  
ING. CRISTIAN PARRA  
PROCURADOR COMUN DEL CONSORCIO ESTADIO TARQUI



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**



**LIBRO DE OBRA**

Hoja No. 27

Construye: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Contrato: COTO-GADPPz-017-2022

FECHA: 20/01/2023

Descripción de trabajos:

- ▶ TRANPORTE DE MATERIAL PIEDRO DE MEJORAMIENTO
- ▶ TENIDO DE MATERIAL PIEDRO DE MEJORAMIENTO EN PLATAFORMA
- ▶ ENCOFRADO DE MADERA PARA PLINTO
- ▶ COLOCACIÓN DE HORMIGON F'c = 210 kg/cm<sup>2</sup> en PLINTO

Equipo utilizado

Herramienta Menor, Volquetas, Retroexcavadora.

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra

Residente de Obra, Operador, Chofer, Maestro Placi

Estado del tiempo

Soleado

Nublado

Lluvia

Observaciones:

FISCALIZADOR  
ING. ROBERT QUINTANA

CONTRATISTA  
ING. CRISTIAN PARRA  
PROCURADOR COMUN DEL CONSORCIO ESTADIO TARQUI



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**



**LIBRO DE OBRA**

Hoja No. 28

Construye: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Contrato: COTO-GADPPz-017-2022

FECHA: 21 / 01 / 2023

Descripción de trabajos:

- ▶ TRANSPORTE DE MATERIAL PIEDRO DE MEJORAMIENTO
- ▶ TENIDO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO
- ▶ ARMADO DE ENCOFRADO PARA COLUMNA
- ▶

Equipo utilizado

Herramienta menor, Volquetas, Retroexcavadora

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra

Residente de Obra, Operador, Chofer, maestro Peón.

Estado del tiempo

Soleado

x

Nublado

Lluvia

Observaciones:

FISCALIZADOR  
ING. ROBERT QUINTANA

CONTRATISTA  
ING. CRISTIAN PARRA  
PROCURADOR COMUN DEL CONSORCIO ESTADIO TARQUI



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**



**LIBRO DE OBRA**

Hoja No. 29

Construye: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Contrato: COTO-GADPPz-017-2022

FECHA: 23/01/2023

Descripción de trabajos:

- ▶ TRANSPORTE DE MATERIAL PÉREO DE MEJORAMIENTO
- ▶ TENIDO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO
- ▶ COLOCACIÓN DE HORMIGÓN EN COLUMNAS
- ▶ ENCOFRADO PARA HORMIGÓN CICLOPEO

Equipo utilizado

Herramienta menor, Volquetas, Retroexcavadora

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra

Residente de Obra, Operador, chofer, Maestro Peón

Estado del tiempo

Soleado

x

Nublado

Lluvia

Observaciones:

FISCALIZADOR  
ING. ROBERT QUINTANA

CONTRATISTA  
ING. CRISTIAN PARRA  
PROCURADOR COMUN DEL CONSORCIO ESTADIO TARQUI



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**



**LIBRO DE OBRA**

Hoja No. 30

Construye: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Contrato: COTO-GADPPz-017-2022

FECHA: 24 / 01 / 2023

Descripción de trabajos:

- ▶ TRANSPORTE DE MATERIAL PETAÑO DE MEJORAMIENTO
- ▶ TENIDO DE MATERIAL PETAÑO
- ▶ ENCOBADO PARA HORNICOH CICLOPEO

Equipo utilizado

Herramienta menor, Volquetas, Retroexcavadora.

Fiscalizador - Supervisor:

Residentes de Obra, Operador, Chofer, Maestro Peon

Personal en obra

Estado del tiempo

Soleado

x

Nublado

x

Lluvia

Observaciones:

FISCALIZADOR  
ING. ROBERT QUINTANA

CONTRATISTA  
ING. CRISTIAN PARRA  
PROCURADOR COMUN DEL CONSORCIO ESTADIO TARQUI



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**



**LIBRO DE OBRA**

Hoja No. 31

Construye: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Contrato: COTO-GADPPz-017-2022

FECHA: 25/01/2023

Descripción de trabajos:

- ▷ TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO DE MEJORAMIENTO
- ▷ TENDIDO DE MATERIAL PÉTREO
- ▷ COLOCACIÓN DE HORMIGÓN CICLOPEO
- ▷ EXCAVACIÓN PARA DRENAJE
- ▷ COLOCACIÓN DE GEOTEXIL EN OREN

Equipo utilizado

Herramienta menor, Volquetas, Retroexcavadora.

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra

Residentes de Obra, Ingeniero Ambiental, Operador, Chofer Maestro Peón.

Estado del tiempo

Soleado

+

Nublado

Lluvia

x

Observaciones:

FISCALIZADOR  
ING. ROBERT QUINTANA

CONTRATISTA  
ING. CRISTIAN PARRA  
PROCURADOR COMUN DEL CONSORCIO ESTADIO TARQUI



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**



**LIBRO DE OBRA**

Hoja No. 32

Construye: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Contrato: COTO-GADPPz-017-2022

FECHA: 26/01/2023

Descripción de trabajos:

- ▷ TRANSPORTE DE MATERIAL PÉREO DE MEJORAMIENTO
- ▷ TENIDO DE MATERIAL PÉREO
- ▷ ENCOFRADO DE MADEA PARA COLUMNAS
- ▷ EXCAVACIÓN PARA DRENAJE
- ▷ COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL PARA DREH

Equipo utilizado

Herramienta menor, Volquetas, Retroexcavadora.

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra

Residentes de Obra, Operador, Chofer, Maestro Peón

Estado del tiempo

Soleado

x

Nublado

x

Lluvia

Observaciones:

FISCALIZADOR  
ING. ROBERT QUINTANA

CONTRATISTA  
ING. CRISTIAN PARRA

PROCURADOR COMUN DEL CONSORCIO ESTADIO TARQUI



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**



**LIBRO DE OBRA**

Hoja No. 33

Construye: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Contrato: COTO-GADPPz-017-2022

FECHA: 27/01/2023

Descripción de trabajos:

- ▷ TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO
- ▷ TENDIDO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO
- ▷ COLOCACIÓN DE HORMIGON EN CAJENA

Equipo utilizado

Herramienta Menor, Volquetas, Retroexcavadora.

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra

Residentes de Obra, Operador, Chofer, Maestro Peón

Estado del tiempo

Soleado

Y

Nublado

X

Lluvia

Observaciones:

  
FISCALIZADOR  
ING. ROBERT QUINTANA

  
CONTRATISTA  
ING. CRISTIAN PARRA



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**



**LIBRO DE OBRA**

Hoja No. 34

Construye: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Contrato: COTO-GADPPz-017-2022

FECHA: 28/01/2023

Descripción de trabajos:

- ▶ TRANSPORTE DE MATERIAL PARA DE MEJORAMIENTO
- ▶ TENIDO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO
- ▶ COLOCACIÓN DE NORMICON EN COLUMNA
- ▶ EXCAVACIÓN EN SUELO NATURAL PARA CERCAAMIENTO LATERAL IZQUIERDO
- ▶ RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO LATERAL
- ▶ EXCAVACIÓN PARA DRENAJE
- ▶ COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL EN AREL

Equipo utilizado

Herramienta menor, Volquetas, Retroexcavadora.

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra

Residentes de Obra, Operador, Chofer, Maestro Peón

Estado del tiempo

Soleado

X

Nublado

Lluvia

X

Observaciones:

FISCALIZADOR  
ING. ROBERT QUINTANA

CONTRATISTA  
ING. CRISTIAN PARRA  
PROCURADOR COMUN DEL CONSORCIO ESTADIO TARQUI



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**



**LIBRO DE OBRA**

Hoja No. 35

Construye: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA

Contrato: COTO-GADPPz-017-2022

FECHA: 30/01/2023

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Descripción de trabajos:

- ▷ TRANSPORTE DE MATERIAL PIEDRA DE MEJORAMIENTO
- ▷ TENIDOS DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO
- ▷ ENCOFRADO DE MADERA PARA REPLANTILLO
- ▷ COLOCACIÓN DE NORMICOR EN REPLANTILLO CERRAMIENTO LATERAL

Equipo utilizado

Herramienta menor, Volquetas, Retroexcavadora

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra

Residente de Obra, Operador, Chofer, Maestro Peón

Estado del tiempo

Soleado

x

Nublado

x

Lluvia

Observaciones:

**FISCALIZADOR**  
ING. ROBERT QUINTANA

**CONTRATISTA**  
ING. CRISTIAN PARRA  
PROCURADOR COMUN DEL CONSORCIO ESTADIO TARQUI



## ACTA DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS DE PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA EL CONTRATO DE LA OBRA

**“CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”.**

**COTO-GADPPz-017-2022**

En la ciudad de Puyo a los **Catorce (14) días del mes de diciembre de 2022**, comparecen el Consorcio Estadio Tarquí, con su Procurador Común el Ing. Parra Uscha Cristian Fernando, CONTRATISTA; el Ing. Quintana Muñoz Robert Fernando, FISCALIZADOR DE OBRA, y el Ing. Ramos Campaña Daniel Aníbal, ADMINISTRADOR DE CONTRATO del GADPPZ; con la finalidad de suscribir el Acta de Cumplimiento de Parámetros del Personal Técnico Mínimo y Equipo Mínimo requerido en la etapa precontractual de la obra antes mencionada; y así dar cumplimiento a lo determinado en la resolución Nro. RE-SERCOP-2019-0000100.

### **PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO POR LA ENTIDAD**

CAN	FUNCIÓN	NIVEL DE ESTUDIO	TITULACIÓN ACADÉMICA	EXPERIENCIA
1	Residente de Obra	Tercer Nivel Con Título	Ingeniero/a Civil con licencia de prevención de riesgos en la construcción registrado en el SENESCYT.	5 Años
1	Técnico Ambiental	Tercer Nivel Con Título	Ingeniero/a Ambiental con licencia de prevención de riesgos en la construcción registrado en el SENESCYT.	3 Años
1	Topógrafo	Tercer Nivel Con Título	Topógrafo-Ingeniero/a Civil registrado en el SENESCYT.	1 Año

### **PERSONAL MÍNIMO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA**

Nº	DESCRIPCIÓN	PLIEGOS		OFERTADO		
		CAN	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS	TIEMPO DE PART.
1	Residente de Obra	1	Ingeniero/a Civil.	León Sanabria Diego Fernando	Profesión: Ingeniero Civil	100 %
2	Técnico Ambiental	1	Ingeniero/a Ambiental.	Fonseca Núñez Johnny Paul	Profesión: Ingeniero Ambiental	50 %
3	Topógrafo	1	Topógrafo-Ingeniero/a Civil	Parra Uscha Cristian Fernando	Profesión: Ingeniero Civil	100%



### EQUIPO E INSTRUMENTOS DISPONIBLES REQUERIDO POR LA ENTIDAD

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS
1	Excavadora Sobre Orugas.	1	Potencia Mínima 140 HP.
2	Volquetes	2	Capacidad Mínima 10 M3.
3	Rodillo Vibratorio Liso	1	Potencia Mínima 125 HP.
4	Compactador (Sapo)	1	Potencia Mínima 5 HP.
5	Concretera 1 Saco	2	Capacidad Mínima 1 Saco
6	Aparatos de Topografía	1	Estación Total
7	Soldadura Eléctrica o Moto suelda	1	Capacidad 110V-220V.

### EQUIPO E INSTRUMENTOS DISPONIBLES PROPUESTO POR EL CONTRATISTA

Nº	DESCRIPCIÓN	CAN	CARACTERÍSTICAS	RELACIÓN DE PROPIEDAD
1	Excavadora Sobre Orugas.	1	Marca: Caterpillar Modelo: 320C Potencia: 186 HP Matricula: 7.1-12-000238 Año de fabricación: 2005	Alquiler de la Sra. Revilla Cruz Lilian Natali.
2	Volquete.	2	Marca: Hino Modelo: FM1JLUD Capacidad: 10 M3 Placa: SBD-0506 Año de fabricación: 2009	Alquiler del Sr. Paredes Chávez José Antonio.
			Marca: Hino Modelo: FM1JLUD Capacidad: 10 M3 Placa: HBA-3011 Año de fabricación: 2009	Alquiler del Sr. Vargas Cadena Ivan Klever.
3	Rodillo Vibratorio Liso	1	Marca: J.C.B Modelo: VM115D Potencia: 125 HP Matricula: 8.2-20374 Año de fabricación: 2008	Alquiler de la Cooperativa De Transporte de Carga En Volquetes Rio Pastaza, con su Representante Legal, Gerente, el Sr. Silva Merino Carlos Edwin.
4	Compactador	1	Nº de factura: 001-001-004303 Fecha de compra: 03-02-2020 Compactadora a Gasolina	Alquiler de la Sra. Torres Tenelema Alexandra.
5	Concretera 1 Saco	2	Nº de factura: 001-001-0002660 Fecha de compra: 24-02-2022 Concretera Capacidad: 1.5 Sacos Motor: Honda 6.5 HP	Alquiler del Sr. Parra Uscha Cristian Fernando.
			Nº de factura: 003-001-000119890 Fecha de compra: 18-11-2011 Concretera Motor 10 HP	Alquiler del Sr. Mosquera Moya Juan Antonio.



6	Aparatos de Topografía	Nº de factura: 001—001-000022981 Fecha de compra: 31-08-2014 Estación Total Sokkia Modelo CX-105	Alquiler del Sr. Segundo Fabián Nuñez Chiriboga.
7	Soldadura Eléctrica O Moto suelda	Nº de factura: 001-001-000077 Fecha de compra: 30-04-2001 Maquina Soldadora MI 300/250 CA/CD INFRA Capacidad: 110V-220V	Alquiler del Sr- Mosquera Moya Juan Antonio.

De la documentación presentada por el contratista se puede verificar que cumple con lo determinado en la sección **4.1.3 Personal técnico mínimo** y **4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico** de los parámetros de contratación determinados para el presente proceso; así como también lo dispuesto en los numerales **4.1.7 Metodología y Cronograma de ejecución**; para constancia se firma dos ejemplares.



Firmado electrónicamente por:  
**DANIEL ANIBAL RAMOS CAMPAÑA**

Ing. Ramos Campaña Daniel Aníbal  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**



Firmado electrónicamente por:  
**ROBERT FERNANDO QUINTANA MUÑOZ**

Ing. Quintana Muñoz Robert Fernando  
**FISCALIZADOR DE OBRA**



Firmado electrónicamente por:  
**CRISTIAN FERNANDO PARRA USHCA**

Ing. Parra Uscha Cristian Fernando  
**PROCURADOR COMÚN  
CONSORCIO ESTADIO TARQUI  
CONTRATISTA**



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO ESTADIO TARQUI

febrero 23 del 2023 08:36

PARRA USHCA CRISTIAN FERNANDO

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2023-02-14))

(REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE)

No. Comprobante: 000000166727648

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2023-02-14
No. RUC / REGISTRO:	1691728994001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2023-02-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSORCIO ESTADIO TARQUI - CONSORCIO ESTADIO TARQUI			
Periodo de Pago:	2023 - 01			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

### AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2023 - 1	35	1600671976	FONSECA NUÑEZ JOHNNY PAUL	420.00	21	NNA	86.52	0.00
2023 - 1	35	1600273112	LEON SANABRIA DIEGO FERNANDO	700.00	30	NNA	144.20	0.00
2023 - 1	35	1600454464	NUÑEZ YUCAILLA ALEX IVAN	246.24	16	NNA	50.73	0.00
2023 - 1	35	1600526402	NUÑEZ YUCAILLA DARIO ORLANDO	385.00	21	NNA	79.31	0.00
2023 - 1	35	1600415317	PARRA USHCA CRISTIAN FERNANDO	521.45	30	NNA	107.42	0.00
2023 - 1	35	1600635740	SANCHEZ USHCA DERLIS DAVID	323.19	21	NNA	66.58	0.00
				<b>2595.88</b>			<b>534.76</b>	<b>0.00</b>



<b>Valor</b>	560.71
<b>Intereses por mora (+)</b>	0.00
<b>Seguro Salud Tiempo Parcial (+)</b>	0.00
<b>Honorarios Abogado (+)</b>	0.00
<b>Gastos Administrativos (+)</b>	0.00
<b>Subtotal (=)</b>	560.71
<b>Notas de Crédito (-)</b>	0.00
<b>Total (=)</b>	<b>560.71</b>

#### Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.


\*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

\*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

\*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a LOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

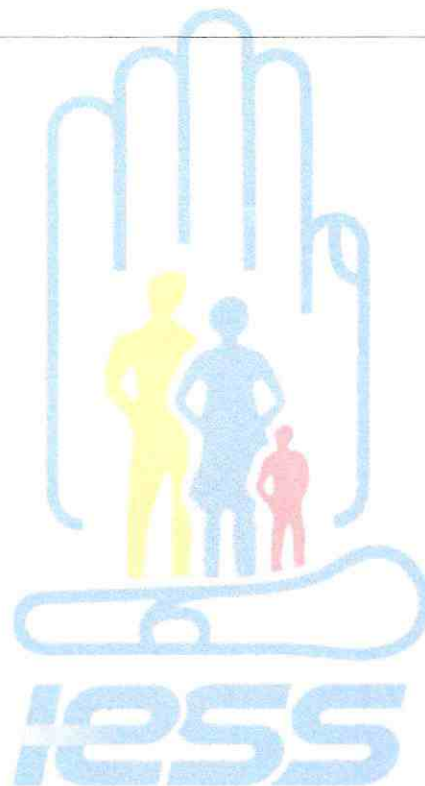

## **CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES**

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) PARRA USHCA CRISTIAN FERNANDO, representante legal de la empresa CONSORCIO ESTADIO TARQUI con RUC Nro. 1691728994001 y dirección BARRIO MIRAFLORES. RAFAEL VEGA . SN. EZEQUIEL CAMPAÑA . CASA DE DOS PISOS., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Firmado electrónicamente por:

**KARLA DENISSE  
BERMUDEZ ROLDAN**

Abg. Karla Denisse Bermúdez Roldán

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 03 de febrero de 2023

Validez del Certificado 30 días

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600286940001

FACTURA

No. 001-100-000000004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

160220230116002869400012001100000000049174098212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/02/2023 16:20:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



160220230116002869400012001100000000049174098212

SARMIENTO PICO CARMEN DEL ROCIO

Dirección Barrio: LAS AMERICAS Calle: VIA AL TENA Número: S/N  
Matriz: Intersección: VIA SANTA MARTHA

Dirección Barrio: LAS AMERICAS Calle: VIA AL TENA Número: S/N  
Sucursal: Intersección: VIA SANTA MARTHA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

Identificación 1691728994001

Fecha 16/02/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: BARRIO MIRAFLORES, CALLE RAFAEL VEGA Y EZEQUIEL CAMPAÑA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		105.32	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA EXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE LA PARROQUIAL DE TARQUI - PROVINCIA PASTAZA		31.24	0.00	0.00	0.00	3290.20

Información Adicional

Telefono: 0984686015

Email: consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3685.02

SUBTOTAL 12%	3290.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3290.20
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	394.82
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3685.02

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

R.U.C: 1600191736001

**FACTURA**

No. 001-002-000000150

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1002202301160019173600120010020000001500000015018

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:**

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISION:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1002202301160019173600120010020000001500000015018

PROAÑO CASTRO FERNANDO RAMIRO  
PROAÑO CASTRO FERNANDO RAMIRO

Direccion Matriz: CALLE CESAR TAMAYO Y JUAN MONTALVO LA LOMA

Direccion establecimiento:

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI**

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

RUC / CI: 1691728994001

Nombre Comercial:

Fecha Emisión: 10/02/2023

Guía de Remisión:

**DIRECCION:** BARRIO MIRAFLORES

**CORREOELECTRONICO:**

consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es

Codigo	Cantidad	Unidad	Descripción	P.Unitario	Descuento	Valor Total
005	1.00		ALQUILER MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO TARQUI	6,431.7900	0.00	6,431.79 *

**INFORMACION ADICIONAL:**

CORREO ELECTRONICO: consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es

CONTROL: 1001E00000150  
CODIGO: 00000008

REFERENCIA:  
DIRECCION:  
FORMA\_PAGO: CONTADO

SUBTOTAL 12%	6,431.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUB TOTAL No Objeto IVA	0.00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	<b>6,431.79</b>
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	771.81
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>7,203.60</b>

Forma de Pago	Valor
	0.00
	0.00

**Condiciones de Venta:**

DEBO Y PAGARE, INCONDICIONALMENTE EN LA CIUDAD DE AMBATO , A LA ORDEN DE PROAÑO CASTRO FERNANDO RAMIRO LA SUMA TOTAL SENALADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO. DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO COMO FECHA DE VENCIMIENTO, SIN PROTESTO. EXIMESE DE LA PRESENTACION PARA EL PAGO, ASI COMO EL DE LOS AVISOS POR FALTA DE ESTE. EN CASO DE MORA PAGARE ADEMAS LA MAXIMA TASA PERMITIDA POR LA LEY Y LOS CORRESPONDIENTES GASTOS POR COBRANZAS

**Recibí Conforme:** .....

**Cédula de Identidad:** .....

**DIGITADOR:** YAJAIRA CUBIÑA

**RUTA:**

**Transportista**





**COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO S.A.**

**Dir. Matriz:** SHELL / MERA / PASTAZA

**Dir. Sucursal:** LA MORAVIA/VIA PUYO BAÑOS

**Obligado A Llevar Contabilidad:** SI

**R.U.C:** 1691713438001

**FACTURA**

**No.** 001-001-000000027

**NÚMERO AUTORIZACIÓN**

1802202301169171343800120010010000000279846951111

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2023-02-18 08:47:17-05:00

**AMBIENTE:**

Producción

**EMISIÓN:**

Normal

**CLAVE DE ACCESO**



1802202301169171343800120010010000000279846951111

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** CONSORCIO ESTADIO TARQUI

**Fecha Emisión:** 18/02/2023

**RUC / CI:** 1691728994001

**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
01	001	5	TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO	-	-	-	\$25.0000	0%	\$0.00	\$125.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$125.00	0	dias	SUBTOTAL 12%	\$ 0.00
				SUBTOTAL 0%	\$ 125.00

Información Adicional	
Dirección	Barrio: MIRAFLORES Calle: RAFAEL VEGA Intersección: EZEQUIEL CAMPAÑA
Email	consorcio_estadio_tarqui@outlook.es
Teléfono	0984686015

SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 125.00
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 125.00

**VALOR A PAGAR** \$ **125.00**

R.U.C.: 1691715783001

**FACTURA**

No. 001-100-000000061

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0402202301169171578300120011000000000611234567812

FECHA DE AUTORIZACIÓN

04/02/2023 20:35:23

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0402202301169171578300120011000000000611234567812

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
INTERNACIONAL BUITRAGO S.A.

Dirección Matriz: VIA A TARQUI

Dirección Establecimiento: VIA TARQUI

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

Identificación: 1691728994001

Fecha Emisión: 04/02/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
TMP		VIAJES DE RELLENO	94.00	27.00	0.00	2538.00
DS		DESALOJO DE MATERIAL	73.00	10.00	0.00	730.00

**Información Adicional**

Dirección: BARRIO: MIRAFLORES CALLE:RAFAEL VEGA  
INTERSECCION:EZEQUIEL CAMPAÑA  
Teléfono: 0984686015  
Email: consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	3268.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3268.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.00
IMPORTE TOTAL	3268.00

Forma Pago	Valor
PAGOS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3268.00

R.U.C.: 1691715783001

FACTURA

No. 001-100-000000048

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2301202301169171578300120011000000000481234567818

FECHA DE AUTORIZACIÓN

23/01/2023 09:24:41

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2301202301169171578300120011000000000481234567818

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
INTERNACIONAL BUITRAGO S.A.

Dirección Matriz: VIA A TARQUI

Dirección Establecimiento: VIA TARQUI

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

Identificación: 1691728994001

Fecha Emisión: 23/01/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
TM		VIAJES DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA EL ESTADIO DE LA PARROQUIA TARQUI, PROVINCIA PASTAZA	105.00	25.00	0.00	2625.00
DS		DESALOJO DE MATERIAL PARA LA COSTRUCCION DEL ESTADIO DE LA TARQUI	48.00	10.00	0.00	480.00

Información Adicional

Dirección: BARRIO: MIRAFLORES CALLE:RAFAEL VEGA  
INTERSECCION:EZEQUIEL CAMPAÑA  
Teléfono: 0984686015  
Email: consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	3105.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3105.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.00
IMPORTE TOTAL	3105.00

Forma Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3105.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1691708973001

FACTURA

No. 001-100-000000015

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0702202301169170897300120011000000000155378262011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2023 14:47:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0702202301169170897300120011000000000155378262011

VOLQUEALPAY S.A.

Dirección Matriz: Calle: AV. 10 DE NOVIEMBRE Número: S/N Intersección: AV. LAS COOPERATIVAS

Dirección Sucursal: Calle: AV. 10 DE NOVIEMBRE Número: S/N Intersección: AV. LAS COOPERATIVAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

Identificación 1691728994001

Fecha 07/02/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		54.00	TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO PARA EL CONSORCIO DEL ESTADIO DE LA TARQUI		27.00	0.00	0.00	0.00	1458.00
003		100.00	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EL CONSORCIO DEL ESTADIO DE TARQUI	placa PAZ0630	10.00	0.00	0.00	0.00	1000.00

Información Adicional

Telefono: 0984686015

Email: consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

2458.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	2458.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2458.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2458.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



PUYO: 0989417048 TENA: 0961706329  
JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

Matriz: PUYO Luis Arias Guerra y Cumanda  
Sucursal: TENA: Via a Puerto Napo  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
AGENTE DE RETENCIÓN  
RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001  
Email: ferre\_promacero1@yahoo.es

RUC/CI: 1802841187001  
LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA  
FACTURA Nro. 001-002-000071558  
NUMERO DE AUTORIZACION:  
2202202301180284118700120010020000715580012719911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:  
2023-02-23T08:12:17-05:00  
CLAVE DE ACCESO:  
2202202301180284118700120010020000715580012719911

Razon Social / Nombres y Apellidos:  
CONSORCIO ESTADIO TARQUI

RUC/CI: 1691728994001  
FECHA EMISION: 22/02/2023

DIRECCION:  
BARRIO MIRAFLORES - RAFAEL VEGA EZEQUIEL CAMPANA  
TELEFONO:

EMAIL: consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es

COD.	CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
221002		GAVION T/TORSION IDEAL GALV. 2X1X1		

10.00			48.21	482.14
-------	--	--	-------	--------

\*\*\*\*\*  
SUBTOTAL: 482.14  
IVA 12 %: 57.86  
VALOR TOTAL: 540.00

FORMA DE PAGO  
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 540

FACTURA: CLIENTE

FACTURA: BODEGA

COPIA



PUYO: 0989417048 TENA: 0961706329  
JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

Matriz: PUYO Luis Arias Guerra y Cumanda  
Sucursal: TENA: Via a Puerto Napo  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
AGENTE DE RETENCIÓN  
RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001  
Email: ferre\_promacero1@yahoo.es

RUC/CI: 1802841187001  
LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA  
FACTURA Nro. 001-002-000071552  
NUMERO DE AUTORIZACION:  
2202202301180284118700120010020000715520012718211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:  
2023-02-23T08:11:25-05:00  
CLAVE DE ACCESO:  
2202202301180284118700120010020000715520012718211

Razon Social / Nombres y Apellidos:  
CONSORCIO ESTADIO TARQUI  
RUC/CI: 1691728994001  
FECHA EMISION: 22/02/2023  
DIRECCION:  
BARRIO MIRAFLORES - RAFAEL VEGA - EZEQUIEL CAMPANA  
TELEFONO:  
EMAIL: consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es

COD.	CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V.TOTAL
1130110		VARILLA NOVACERO 10X12		

40.00 8.12 325.00

\*\*\*\*\*  
SUBTOTAL: 325.00  
IVA 12 % 39.00  
VALOR TOTAL: 364.00

FORMA DE PAGO  
20 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 364

FACTURA: CLIENTE FACTURA: BODEGA

# CORPTA



PUYO: 0989417048 TENA: 0961706329  
JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

Matriz: PUYO Luis Arias Guerra y Cumanda  
Sucursal: TENA: Via a Puerto Napo  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
AGENTE DE RETENCIÓN  
RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001  
Email: ferre\_promacero1@yahoo.es

RUC/CI: 1802841187001

LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA

FACTURA Nro. 001-002-000071516

NUMERO DE AUTORIZACION:

2002202301180284118700120010020000715160012706110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2023-02-22T07:54:58-05:00

CLAVE DE ACCESO:

2002202301180284118700120010020000715160012706110

Razon Social / Nombres y Apellidos:

CONSORCIO ESTADIO TARQUI

RUC/CI: 1691728994001

FECHA EMISION: 20/02/2023

DIRECCION:

BARRIO MIRAFLORES - RAFAEL VEGA -EZEQUIEL CAMPANA

TELEFONO:

EMAIL: consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es

COD.	CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V.TOTAL
221002		GAVION T/TORSION IDEAL GALV. 2X1X1		

20.00			48.21	964.28
-------	--	--	-------	--------

\*\*\*\*\*

SUBTOTAL: 964.29

IVA 12 % 115.71

VALOR TOTAL: 1,080.00

FORMA DE PAGO

20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 1080

FACTURA: CLIENTE

FACTURA: BODEGA

# COPTA



PUYO: 0989417048 TENA: 0961706329  
JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

Matriz: PUYO Luis Arias Guerra y Cumanda  
Sucursal: TENA: Via a Puerto Napo  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
AGENTE DE RETENCIÓN  
RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001  
Email: ferre\_promacero1@yahoo.es

RUC/CI: 1802841187001

LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA

FACTURA Nro. 001-002-000071490

NUMERO DE AUTORIZACION:

1802202301180284118700120010020000714900012699117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2023-02-20T08:08:16-05:00

CLAVE DE ACCESO:

1802202301180284118700120010020000714900012699117

Razon Social / Nombres y Apellidos:

CONSORCIO ESTADIO TARQUI

RUC/CI: 1691728994001

FECHA EMISION: 18/02/2023

DIRECCION:

BARRIO MIRAFLORES - RAFAEL VEGA - EZEQUIEL CAMPANA

TELEFONO:

EMAIL: consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es

COD.	CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V.TOTAL
800112		VARILLA ADELGA 12X12		
200.00			11.83	2,367.85
1130114		VARILLA NOVACERO 14X12		
40.00			15.91	636.78
150118		ALAMBRE NEGRO #18 (KG)		
40.00			1.86	74.40
276301		TIZA INDUSTRIAL		
5.00			0.15	0.75
180116		DISCO CORTE NORTON 7"X1/16		
4.00			1.66	6.64

\*\*\*\*\*  
SUBTOTAL: 3,086.43  
IVA 12 % 370.37  
VALOR TOTAL: 3,456.80  
FORMA DE PAGO

20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 3456.8 /

FACTURA: CLIENTE

FACTURA: BODEGA



PUYO: 0989417048 TENA: 0961706329  
JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

Matriz: PUYO Luis Arias Guerra y Cumanda  
Sucursal: TENA: Vía a Puerto Napo  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
AGENTE DE RETENCIÓN  
RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001  
Email: ferre\_promacero1@yahoo.es

RUC/CI: 1802841187001

LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA

FACTURA Nro. 001-002-000071402

NUMERO DE AUTORIZACION:

1702202301180284118700120010020000714020012677011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2023-02-18T08:00:45-05:00

CLAVE DE ACCESO:

1702202301180284118700120010020000714020012677011

Razon Social / Nombres y Apellidos:

CONSORCIO ESTADIO TARQUI

RUC/CI: 1691728994001

FECHA EMISION: 17/02/2023

DIRECCION:

BARRIO MIRAFLORES - RAFAEL VEGA - EZEQUIEL CAMPANA

TELEFONO:

EMAIL: consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es

\*\*\*\*\*  
COD. CANT. DESCRIPCION V. UNIT V.TOTAL  
\*\*\*\*\*  
150012 ALAMBRE GALVANIZADO IDEAL (2.80#12)(R44KG)

2.00 108.16 216.32

\*\*\*\*\*

SUBTOTAL: 216.32

IVA 12 % 25.96

VALOR TOTAL: 242.28

FORMA DE PAGO

20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 242.28 /

FACTURA: CLIENTE

FACTURA: BODEGA

COPIA



PUYO: 0989417048 TENA: 0961706329  
JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

Matriz: PUYO Luis Arias Guerra y Cumanda

Sucursal: TENA: Via a Puerto Napo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN

RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Email: ferre\_promacero1@yahoo.es

RUC/CI: 1802841187001

LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA

FACTURA Nro. 001-002-000071320

NUMERO DE AUTORIZACION:

1602202301180284118700120010020000713200012653015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2023-02-17T08:20:47-05:00

CLAVE DE ACCESO:

1602202301180284118700120010020000713200012653015

Razon Social / Nombres y Apellidos:

CONSORCIO ESTADIO TARQUI

RUC/CI: 1691728994001

FECHA EMISION: 16/02/2023

DIRECCION:

BARRIO MIRAFLORES - RAFAEL VEGA - EZEQUIEL CAMPAÑA

TELEFONO:

EMAIL: consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es

\*\*\*\*\*  
COD. CANT. DESCRIPCION V. UNIT V.TOTAL  
\*\*\*\*\*

800112		VARILLA ADELCA 12X12		
50.00			11.95	597.50
276301		TIZA INDUSTRIAL		
5.00			0.15	0.75
271409		LIBRA CLAVO 2 1/2"		
55.00			0.86	47.30
272220		GUANTE CUERO OPERADOR		
11.00			1.50	16.50
273132		GAFA TRANSPARENTES PHENIX		
2.00			1.20	2.40

\*\*\*\*\*

SUBTOTAL: 664.45

IVA 12 % 79.73

VALOR TOTAL: 744.18

FORMA DE PAGO

20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 744.18 /

FACTURA: CLIENTE

FACTURA: BODEGA

COPY A



PUYO: 0989417048 TENA: 0961706329  
JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

Matriz: PUYO Luis Arias Guerra y Cumanda  
Sucursal: TENA: Via a Puerto Napo  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
AGENTE DE RETENCIÓN  
RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001  
Email: ferre\_promacero1@yahoo.es

RUC/CI: 1802841187001

LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA

FACTURA Nro. 001-002-000070958

NUMERO DE AUTORIZACION:

0902202301180284118700120010020000709580012546317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2023-02-10T08:20:29-05:00

CLAVE DE ACCESO:

0902202301180284118700120010020000709580012546317

Razon Social / Nombres y Apellidos:

CONSORCIO ESTADIO TARQUI

RUC/CI: 1691728994001

FECHA EMISION: 09/02/2023

DIRECCION:

BARRIO MIRAFLORES - RAFAEL VEGA - EZEQUIEL CAMPANA

TELEFONO:

EMAIL: consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es

COD.	CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
271208		CEMENTO CHIMBORAZO TIPO IP 50 KG		

50.00	7.09	354.91
-------	------	--------

\*\*\*\*\*

SUBTOTAL: 354.91

IVA 12 % 42.59

VALOR TOTAL: 397.50

FORMA DE PAGO

20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 397.5 /

FACTURA: CLIENTE

FACTURA: BODEGA



PUYO: 0989417048 TENA: 0961706329  
JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

Matriz: PUYO Luis Arias Guerra y Cumanda  
Sucursal: TENA: Via a Puerto Napo  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
AGENTE DE RETENCIÓN  
RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001  
Email: ferre\_promacero1@yahoo.es

RUC/CI: 1802841187001

LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA

FACTURA Nro. 001-002-000070758

NUMERO DE AUTORIZACION:

0402202301180284118700120010020000707580012483218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2023-02-07T08:17:36-05:00

CLAVE DE ACCESO:

0402202301180284118700120010020000707580012483218

Razon Social / Nombres y Apellidos:

CONSORCIO ESTADIO TARQUI

RUC/CI: 1691728994001

FECHA EMISION: 04/02/2023

DIRECCION:

BARRIO MIRAFLORES - RAFAEL VEGA - EZEQUIEL CAMPANA

TELEFONO:

EMAIL: consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es

COD.	CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V.TOTAL
271208		CEMENTO CHIMBORAZO TIPO IP 50 KG		

50.00	7.09	354.91
-------	------	--------

\*\*\*\*\*

<b>SUBTOTAL:</b>	354.91
<b>IVA 12 %</b>	42.59
<b>VALOR TOTAL:</b>	397.50

**FORMA DE PAGO**

20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 397.5 /

**FACTURA: CLIENTE**

**FACTURA: BODEGA**



PUYO: 0989417048 TENA: 0961706329  
 JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

Matriz: PUYO Luis Arias Guerra y Cumanda  
 Sucursal: TENA: Via a Puerto Napo  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
 AGENTE DE RETENCIÓN  
 RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001  
 Email: ferre\_promacero1@yahoo.es

RUC/CI: 1802841187001  
 LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA  
 FACTURA Nro. 001-002-000070699  
 NUMERO DE AUTORIZACION:  
 0302202301180284118700120010020000706990012466319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:  
 2023-02-03T08:21:17-05:00  
 CLAVE DE ACCESO:  
 0302202301180284118700120010020000706990012466319

Razon Social / Nombres y Apellidos:  
 CONSORCIO ESTADIO TARQUI

RUC/CI: 1691728994001  
 FECHA EMISION: 03/02/2023

DIRECCION:  
 BARRIO MIRAFLORES - RAFAEL VEGA - EZEQUIEL CAMPANA  
 TELEFONO:

EMAIL: consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es

COD.	CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V.TOTAL
271208		CEMENTO CHIMBORAZO TIPO IP 50 KG		
70.00			7.09	496.87
150118		ALAMBRE NEGRO #18 (KG)		
20.00			1.86	37.20
271408		LIBRA CLAVO 2"		
55.00			0.92	50.60
180116		DISCO CORTE NORTON 7"X1/16		
5.00			1.66	8.30

\*\*\*\*\*  
 SUBTOTAL: 592.97  
 IVA 12 % 71.16  
 VALOR TOTAL: 664.13  
 FORMA DE PAGO

20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 664.13 /  
 FACTURA: CLIENTE FACTURA: BODEGA

COPIA



PUYO: 0989417048 TENA: 0961706329  
JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

Matriz: PUYO Luis Arias Guerra y Cumanda  
Sucursal: TENA: Via a Puerto Napo  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
AGENTE DE RETENCIÓN  
RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001  
Email: ferre\_promacero1@yahoo.es

RUC/CI: 1802841187001  
LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA  
FACTURA Nro. 001-002-000070587  
NUMERO DE AUTORIZACION:  
0102202301180284118700120010020000705870012433511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:  
2023-02-02T07:54:50-05:00  
CLAVE DE ACCESO:  
0102202301180284118700120010020000705870012433511

Razon Social / Nombres y Apellidos:  
CONSORCIO ESTADIO TARQUI

RUC/CI: 1691728994001  
FECHA EMISION: 01/02/2023

DIRECCION:  
BARRIO MIRAFLORES - RAFAEL VEGA -EZEQUIEL CAMPANA  
TELEFONO:

EMAIL: consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es

COD.	CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V.TOTAL
271208		CEMENTO CHIMBORAZO TIPO IP 50 KG		
	50.00		7.09	354.91
281629		TUBO CORRUGADO DURAFORT 250MM		
	1.00		86.75	86.75
279632		MANGUERA AGUA 1/2 121PSI PLASTICMOYA		
	80.00		0.43	34.40
<b>SUBTOTAL:</b>				476.06
<b>IVA 12 %</b>				57.13
<b>VALOR TOTAL:</b>				533.19

FORMA DE PAGO  
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 533.19 /

FACTURA: CLIENTE

FACTURA: BODEGA

COPJA



PUYO: 0989417048 IFNA: 0061706329  
JESSY LORIANA VILLALBA RITE MASABANDA

Matriz: PUYO Luis Arias Guerra y Cumanda  
Sucursal: IFNA: Vía a Puento Napu  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
AGENTE DE REGISTRO:  
RESOLUCIÓN Nro. NAC-DINCRASC20 09000001  
Email: ferre\_promacero1@yahoo.es

RUC/CI: 1802841187001  
LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA

FACTURA Nro. 001 002 000070568

NUMERO DE AUTORIZACION:  
3101202301180284118700120010020000705680012426913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:  
2023-02-01 10:56:24 05:00

CLAVE DE ACCESO:  
3101202301180284118700120010020000705680012426913

Razon Social / Nombres y Apellidos:  
CONSORCIO ESTADIO TARQUI

RUC/CI: 1691728994001  
FECHA EMISION: 31/01/2023

DIRECCION:  
BARRIO MIRAFLORES RAFAEL VELGA ELIZQUIEL CAMPANA  
TELEFONO:

EMAIL: consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es

COD.	CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
280120		CODO PLASTIGAMA 2"X 45"		5.28
4.00			1.32	
280635		TEE PLASTIGAMA 4"X 3"		19.23
3.00			6.41	
280499		REDUCCION PLASTIGAMA 4"X 3"		3.40
1.00			3.40	
280840		TUBO PLASTIGAMA 2"		19.60
4.00			4.90	
27671411		CINTA EMBALAJE TRANSP 100YDS		1.00
1.00			1.00	
290207		TUBO PLASTIGAMA 1.2"		23.25
3.00			7.75	
290205		TUBO ROJO PLASTIGAMA 1.2"		62.65
7.00			8.95	
27671690		METRO CHOVA 20 CM		18.24
8.00			2.28	
273013		METRO MANGUERA P/R LUZ 1.2 P.VERDE		41.00
200.00			0.22	
27673480		SIKA PLASTOCRET HE 161 10KG.		102.68
4.00			25.67	
290603		UNION PLASTIGAMA 1.2		2.28
4.00			0.57	
271208		CEMENTO CHIMBORAZO TIPO IP 50 KG		553.60
80.00			6.92	
279905		LUSTRE N 5		2.90
5.00			0.58	
380070		PLANCHA GALVANIZADA 0.70 (16.36)		21.87
1.00			21.87	

\*\*\*\*\*  
SUBTOTAL: 8,985.73  
IVA 12 %: 1,078.29  
VALOR TOTAL: 10,064.02  
FORMA DE PAGO

20 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 10064.02 /  
FACTURA: CLIENTE FACTURA: BODEGA

COPY A



PUYO: 0989417048 TENA: 0961706329  
JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

Matriz: PUYO Luis Arias Guerra y Cumanda  
Sucursal: TENA: Via a Puerto Napo  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
AGENTE DE RETENCIÓN  
RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20 00000001  
Email: ferre\_promacero1@yahoo.es

RUC/CI: 1802841187001

LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA

FACTURA Nro. 001-002-000070464

NUMERO DE AUTORIZACION:

3001202301180284118700120010020000704640012395015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2023-01-31T08:04:18-05:00

CLAVE DE ACCESO:

3001202301180284118700120010020000704640012395015

Razon Social / Nombres y Apellidos:

CONSORCIO ESTADIO TARQUI

RUC/CI: 1691728994001

FECHA EMISION: 30/01/2023

DIRECCION:

BARRIO MIRAFLORES - RAFAEL VEGA - EZEQUIEL CAMPANA

TELEFONO:

EMAIL: consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es

COD.	CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
271208		CEMENTO CHIMBORAZO TIPO IP 50 KG		

50.00 7.09 354.91

279636 MANGUERA P/NIVEL

15.00 0.50 7.50

27673090 PIOLA PLASTICA # 2 / 6

2.00 1.86 3.72

\*\*\*\*\*

SUBTOTAL: 366.13

IVA 12 % 43.94

VALOR TOTAL: 410.07

FORMA DE PAGO

20 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 410.07 /

FACTURA: CLIENTE

FACTURA: BODEGA

COPIA



PUYO: 0989417048 TENA: 0961706329  
JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

Matriz: PUYO Luis Arias Guerra y Cumanda  
Sucursal: TENA: Via a Puerto Napu  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
AGENTE DE RETENCIÓN  
RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001  
Email: ferre\_promacero1@yahoo.es

RUC/CI: 1802841187001

LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA

FACTURA Nro. 001-002-000070389

NUMERO DE AUTORIZACION:

2701202301180284118700120010020000703890012374213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2023-01-28T11:38:53-05:00

CLAVE DE ACCESO:

2701202301180284118700120010020000703890012374213

Razon Social / Nombres y Apellidos:

CONSORCIO ESTADIO TARQUI

RUC/CI: 1691728994001

FECHA EMISION: 27/01/2023

DIRECCION:

BARRIO MIRAFLORES - RAFAEL VEGA - EZEQUIEL CAMPANA

TELEFONO:

EMAIL: consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es

COD.	CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
271208		CEMENTO CHIMBORAZO TIPO IP 50 KG		
40.00			6.96	278.57
271409		LIBRA CLAVO 2 1/2"		
55.00			0.86	47.30

\*\*\*\*\*  
SUBTOTAL: 325.87  
IVA 12 % 39.10  
VALOR TOTAL: 364.97

FORMA DE PAGO

20- OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 364.97 /

FACTURA: CLIENTE

FACTURA: BODEGA



PUYO: 0989417048 TENA: 0961706329  
JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

Matriz: PUYO Luis Arias Guerra y Cumanda  
Sucursal: TENA: Via a Puerto Napo  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
AGENTE DE RETENCIÓN  
RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001  
Email: ferre\_promacero1@yahoo.es

RUC/CI: 1802841187001

LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA

FACTURA Nro. 001-002-000070272

NUMERO DE AUTORIZACION:

2601202301180284118700120010020000702720012342711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2023-01-27T08:28:28-05:00

CLAVE DE ACCESO:

2601202301180284118700120010020000702720012342711

Razon Social / Nombres y Apellidos:

CONSORCIO ESTADIO TARQUI

RUC/CI: 1691728994001

FECHA EMISION: 26/01/2023

DIRECCION:

BARRIO MIRAFLORES - RAFAEL VEGA -EZEQUIEL CAMPANA

TELEFONO:

EMAIL: consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es

\*\*\*\*\*  
COD. CANT. DESCRIPCION V. UNIT V.TOTAL  
\*\*\*\*\*

281629 TUBO CORRUGADO DURAFORT 250MM

1.00 86.75 86.75

27673089 PIOLA PLASTICA #4

3.00 2.70 8.10

\*\*\*\*\*

SUBTOTAL: 94.85

IVA 12 % 11.38


VALOR TOTAL: 106.23

FORMA DE PAGO

20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 106.23 /

FACTURA: CLIENTE

FACTURA: BODEGA



PUYO: 0989417048 TENA: 0961706329  
JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

Matriz: PUYO Luis Arias Guerra y Cumanda  
Sucursal: TENA: Vía a Puerto Napo  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
AGENTE DE RETENCIÓN  
RESOLUCIÓN Nro. NAC.DNCRASC.20-00000001  
Email: ferre\_promacero1@yahoo.es

RUC/Ci: 1802841187001

LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA

FACTURA Nro. 001-002-000070264

NUMERO DE AUTORIZACION:

2501202301180284118700120010020000702640012338617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2023-01-26T09:07:19-05:00

CLAVE DE ACCESO:

2501202301180284118700120010020000702640012338617

Razon Social / Nombres y Apellidos:

CONSORCIO ESTADIO TARQUI

RUC/Ci: 1691728994001

FECHA EMISION: 25/01/2023

DIRECCION:

BARRIO MIRAFLORES - RAFAEL VEGA - EZEQUIEL CAMPANA

TELEFONO:

EMAIL: consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es

\*\*\*\*\*  
COD. CANT. DESCRIPCION V. UNIT V.TOTAL  
\*\*\*\*\*

755002		TUBO GALV POSTE 2"X2		
20.00			21.32	426.42
271208		CEMENTO CHIMBORAZO TIPO IP 50 KG		
50.00			6.96	348.21
271449		CAJA CLAVOS ACERO 2 1/2" (8X65MM) (64UND)		
3.00			3.80	11.40
1130108		VARILLA NOVACERO 08X12		
9.00			5.33	47.97
190350		SUELDA ESAB (OK) 6011 X1/8 KG		
2.50			3.41	8.52

\*\*\*\*\*

SUBTOTAL: 842.54

IVA 12 % 101.10

VALOR TOTAL: 943.64

FORMA DE PAGO

20- OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 943.64 /

FACTURA: CLIENTE

FACTURA: BODEGA

COPIA



PUYO: 0989417048 TENA: 0961706329  
JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

Matriz: PUYO Luis Arias Guerra y Cumanda  
Sucursal: TENA: Via a Puerto Napo  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
AGENTE DE RETENCIÓN  
RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC.20 00000001  
Email: ferre\_promacero1@yahoo.es

RUC/CI: 1802841187001

LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA

FACTURA Nro. 001-002-000070239

NUMERO DE AUTORIZACION:

2501202301180284118700120010020000702390012331217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2023-01-26T08:19:02-05:00

CLAVE DE ACCESO:

2501202301180284118700120010020000702390012331217

Razon Social / Nombres y Apellidos:

CONSORCIO ESTADIO TARQUI

RUC/CI: 1691728994001

FECHA EMISION: 25/01/2023

DIRECCION:

BARRIO MIRAFLORES - RAFAEL VEGA -EZEQUIEL CAMPANA

TELEFONO:

EMAIL: consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es

\*\*\*\*\*  
COD. CANT. DESCRIPCION V. UNIT V.TOTAL  
\*\*\*\*\*  
221002 GAVION T/TORSION IDEAL GALV. 2X1X1

160.00 47.32 7,571.42

\*\*\*\*\*

SUBTOTAL: 7,571.43

IVA 12 % 908.57

VALOR TOTAL: 8,480.00

FORMA DE PAGO

20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 8480 /

FACTURA: CLIENTE

FACTURA: BODEGA



PUYO: 0989417048 TENA: 0961706329  
JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

Matriz: PUYO Luis Arias Guerra y Cumanda  
Sucursal: TENA: Via a Puerto Napo  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
AGENTE DE RETENCIÓN  
RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001  
Email: ferre\_promacero1@yahoo.es

RUC/CI: 1802841187001

LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA

FACTURA Nro. 001-002-000070237

NUMERO DE AUTORIZACION:

2501202301180284118700120010020000702370012330619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2023-01-26T08:17:34-05:00

CLAVE DE ACCESO:

2501202301180284118700120010020000702370012330619

Razon Social / Nombres y Apellidos:

CONSORCIO ESTADIO TARQUI

RUC/CI: 1691728994001

FECHA EMISION: 25/01/2023

DIRECCION:

BARRIO MIRAFLORES - RAFAEL VEGA - EZEQUIEL CAMPANA

TELEFONO:

EMAIL: consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es

COD.	CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1808101		DISCO DIAMANTE PHENIX 7"X7/8" SEGMENTADO		

2.00	5.94	11.88
------	------	-------

\*\*\*\*\*

<b>SUBTOTAL:</b>	11.88
<b>IVA 12 %</b>	1.43
<b>VALOR TOTAL:</b>	13.31

FORMA DE PAGO

20- OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 13.31 /

FACTURA: CLIENTE

FACTURA: BODEGA



PUYO: 0989417048 TENA: 0961706329  
JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

Matriz: PUYO Luis Arias Guerra y Comanda  
Sucursal: TENA: Via a Puerto Napo  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
AGENTE DE RETENCIÓN  
RESOLUCIÓN No. NAC-DNCRASC.20 00000001  
Email: ferre\_promacero1@yahoo.es

RUC/CI: 1802841187001  
LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA  
FACTURA Nro. 001 002-000070234  
NUMERO DE AUTORIZACION:  
2501202301180284118700120010020000702340012330019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:  
2023-01-26T08:10:21-05:00  
CLAVE DE ACCESO:  
2501202301180284118700120010020000702340012330019

Razon Social / Nombres y Apellidos:  
CONSORCIO ESTADIO TARQUI  
RUC/CI: 1691728994001  
FECHA EMISION: 25/01/2023  
DIRECCION:  
BARRIO MIRAFLORES RAFAEL VEGA EZEQUIEL CAMPANA  
TELEFONO:  
EMAIL: consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es

COD.	CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V.TOTAL
1130110		VARILLA NOVACERO 10X12		
	150.00		8.31	1,246.50
1130112		VARILLA NOVACERO 12X12		
	290.00		11.98	3,474.20
815109		VIGA COLUMNA 15X15X9(V6)		
	73.00		24.02	1,753.46
150118		ALAMBRE NEGRO #18 (KG)		
	200.00		1.86	372.00
180116		DISCO CORTE NORTON 7"X1/16		
	10.00		1.66	16.60
276301		TIZA INDUSTRIAL		
	5.00		0.22	1.11
271409		LIBRA CLAVO 2 1/2"		
	55.00		0.86	47.30

\*\*\*\*\*  
SUBTOTAL: 6,911.18  
IVA 12 % 829.34  
VALOR TOTAL: 7,740.52  
FORMA DE PAGO  
20 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 7740.52 /  
FACTURA: CLIENTE FACTURA: BODEGA

COPIA



PUYO: 098941/048 TENA: 0961/06329  
JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

Matriz: PUYO Luis Arias Guerra y Cumanda  
Sucursal: TENA: Via a Puerto Napo  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
AGENTE DE RETENCIÓN  
RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20 00000001  
Email: ferre\_promacero1@yahoo.es

RUC/CI: 1802841187001

LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA

FACTURA Nro. 001-002-000070230

NUMERO DE AUTORIZACION:

2501202301180284118700120010020000702300012328918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2023-01-26T08:09:26-05:00

CLAVE DE ACCESO:

2501202301180284118700120010020000702300012328918

Razon Social / Nombres y Apellidos:

CONSORCIO ESTADIO TARQUI

RUC/CI: 1691728994001

FECHA EMISION: 25/01/2023

DIRECCION:

BARRIO MIRAFLORES RAFAEL VEGA FZEQUIEL CAMPANA

TELEFONO:

EMAIL: consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es

COD.	CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
281620		TUBO CORRUGADO 160MMX6M RIVAL		

240.00	35.71	8,571.42
--------	-------	----------

\*\*\*\*\*

SUBTOTAL: 8,571.43

IVA 12 % 1,028.57

VALOR TOTAL: 9,600.00

FORMA DE PAGO

20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 9600

FACTURA: CLIENTE

FACTURA: BODEGA

COPIA



PUYO: 0989417048 TENA: 0961706329  
JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

Matriz: PUYO Luis Arias Guerra y Cumanda  
Sucursal: TENA: Via a Puerto Napo  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
AGENTE DE RETENCIÓN  
RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001  
Email: ferre\_promacero1@yahoo.es

RUC/CI: 1802841187001

LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA

FACTURA Nro. 001-002-000070183

NUMERO DE AUTORIZACION:

2401202301180284118700120010020000701830012314411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2023-01-25T08:43:59-05:00

CLAVE DE ACCESO:

2401202301180284118700120010020000701830012314411

Razon Social / Nombres y Apellidos:

CONSORCIO ESTADIO TARQUI

RUC/CI: 1691728994001

FECHA EMISION: 24/01/2023

DIRECCION:

BARRIO MIRAFLORES - RAFAEL VEGA - EZEQUIEL CAMPANA

TELEFONO:

EMAIL: consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es

\*\*\*\*\*  
COD. CANT. DESCRIPCION V. UNIT V.TOTAL  
\*\*\*\*\*

180116		DISCO CORTE NORTON 7"X1/16		
3.00			1.66	4.98
271208		CEMENTO CHIMBORAZO TIPO IP 50 KG		
40.00			6.96	278.57

\*\*\*\*\*

SUBTOTAL: 283.55

IVA 12 % 34.03

VALOR TOTAL: 317.58

FORMA DE PAGO

20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 317.58 /

FACTURA: CLIENTE

FACTURA: BODEGA



PUYO: 0989417048 TENA: 0961706329  
JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

Matriz: PUYO Luis Arias Guerra y Cumanda  
Sucursal: TENA: Vía a Puerto Napo  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
AGENTE DE RETENCIÓN  
RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001  
Email: ferre\_promacero1@yahoo.es

RUC/CI: 1802841187001  
LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA  
FACTURA Nro. 001-002-000070152  
NUMERO DE AUTORIZACION:  
2401202301180284118700120010020000701520012303518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:  
2023-01-25T08:11:29-05:00  
CLAVE DE ACCESO:  
2401202301180284118700120010020000701520012303518

Razon Social / Nombres y Apellidos:  
CONSORCIO ESTADIO TARQUI

RUC/CI: 1691728994001  
FECHA EMISION: 24/01/2023

DIRECCION:  
BARRIO MIRAFLORES - RAFAEL VEGA - EZEQUIEL CAMPANA  
TELEFONO:

EMAIL: consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es

COD.	CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V.TOTAL
27671464		CONO REFLECTIVO 70"		
1.00			17.00	17.00
27671640		CHALECO REFLECTIVO NARANJA CENT		
3.00			2.80	8.40
372408		CASCO AZUL HALLY		
3.00			2.67	8.01

\*\*\*\*\*  
SUBTOTAL: 33.41  
IVA 12 % -4.01  
VALOR TOTAL: 37.42  
FORMA DE PAGO  
20- OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 37.42 /  
FACTURA: CLIENTE FACTURA: BODEGA

COPIA



PUYO: 0989417048 TENA: 0961706329  
JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

Matriz: PUYO Luis Arias Guerra y Cumanda  
Sucursal: TENA: Vía a Puerto Napo  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
AGENTE DE RETENCIÓN  
RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001  
Email: ferre\_promacero1@yahoo.es

RUC/CI: 1802841187001

LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA

FACTURA Nro. 001-002-000070102

NUMERO DE AUTORIZACION:

2301202301180284118700120010020000701020012291210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2023-01-24T09:22:52-05:00

CLAVE DE ACCESO:

2301202301180284118700120010020000701020012291210

Razon Social / Nombres y Apellidos:

CONSORCIO ESTADIO TARQUI

RUC/CI: 1691728994001

FECHA EMISION: 23/01/2023

DIRECCION:

BARRIO MIRAFLORES - RAFAEL VEGA -EZEQUIEL CAMPAÑA

TELEFONO:

EMAIL: consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es

COD.	CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V.TOTAL
271208		CEMENTO CHIMBORAZO TIPO IP 50 KG		

50.00			6.96	348.21
-------	--	--	------	--------

\*\*\*\*\*

SUBTOTAL: 348.21

IVA 12 % -41.79

VALOR TOTAL: 390.00

FORMA DE PAGO

20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 390 /

FACTURA: CLIENTE

FACTURA: BODEGA

COPIA



PUYO: 0989417048 TENA: 0961706329  
JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

Matriz: PUYO Luis Arias Guerra y Cumanda  
Sucursal: TENA: Via a Puerto Napo  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
AGENTE DE RETENCIÓN  
RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001  
Email: ferre\_promacero1@yahoo.es

RUC/CI: 1802841187001  
LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA  
FACTURA Nro. 001-002-000069918  
NUMERO DE AUTORIZACION:  
1901202301180284118700120010020000699180012238510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:  
2023-01-20T08:35:20-05:00  
CLAVE DE ACCESO:  
1901202301180284118700120010020000699180012238510

Razon Social / Nombres y Apellidos:  
CONSORCIO ESTADIO TARQUI

RUC/CI: 1691728994001  
FECHA EMISION: 19/01/2023

DIRECCION:  
BARRIO MIRAFLORES - RAFAEL VEGA - EZEQUIEL CAMPANA  
TELEFONO:

EMAIL: consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es

COD.	CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
27671640		CHALECO REFLECTIVO NARANJA CENT		
5.00			2.80	14.00
372407		CASCO AMARILLO HALLY		
2.00			2.67	5.34
27671464		CONO REFLECTIVO 70"		
2.00			17.00	34.00

\*\*\*\*\*  
SUBTOTAL: 53.34  
IVA 12 % 6.40  
VALOR TOTAL: 59.74  
FORMA DE PAGO  
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 59.74 /

FACTURA: CLIENTE

FACTURA: BODEGA



PUYO: 0989417048 TENA: 0961706329  
JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

Matriz: PUYO Luis Arias Guerra y Cumanda  
Sucursal: TENA: Via a Puerto Napo  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
AGENTE DE RETENCIÓN  
RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20 00000001  
Email: ferre\_promacero1@yahoo.es

RUC/CI: 1802841187001

LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA

FACTURA Nro. 001-002-000069860

NUMERO DE AUTORIZACION:

1801202301180284118700120010020000698600012222712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2023-01-19T07:57:14-05:00

CLAVE DE ACCESO:

1801202301180284118700120010020000698600012222712

Razon Social / Nombres y Apellidos:

CONSORCIO ESTADIO TARQUI

RUC/CI: 1691728994001

FECHA EMISION: 18/01/2023

DIRECCION:

BARRIO MIRAFLORES - RAFAEL VEGA -EZEQUIEL CAMPANA

TELEFONO:

EMAIL: consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es

COD.	CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
271208		CEMENTO CHIMBORAZO TIPO IP 50 KG		
60.00			6.96	417.85
371620		PLASTICO NEGRO 2.00 MTS		
10.00			2.00	20.00

\*\*\*\*\*  
SUBTOTAL: 437.86  
IVA 12 % 52.54  
VALOR TOTAL: 490.40

FORMA DE PAGO

20 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO -190-1 /

FACTURA: CLIENTE

FACTURA: BODEGA



GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Pastaza

Fecha:

17 FEB 2023

Recibido:

JOMARA M.

Número:

Hora: Ocho

Memorando Nro. GADPPZ-DGA-2023-13864-M

Puyo, 16 de febrero de 2023

**PARA:** Sr. Ing. Adán Mariño Montesdeoca  
**Director de Fiscalización, Subrogante**

**ASUNTO:** CONFORMIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA, PERDIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

De mi consideración:

Estimado Director Subrogante, en atención al memorando GADPPZ-JGA-GA-2023-6214-M, suscrito por el Ing. Jorge Antonio Vargas Escobar JEFE DE GESTIÓN AMBIENTAL (E), adjunto al presente el Informe Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, realizadas del 01 al 31 de enero del 2023, del Proyecto "CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA", conforme OFICIO 002-GADPPz-2023, de fecha 31 de enero del 2023, mediante el cual, el Ing. Cristian Parra (Contratista), para su revisión y pronunciamiento. Me permito dar a conocer lo siguiente:

- Con fecha 27 de enero del 2023, conforme la planificación de seguimiento control y monitoreo ambiental que ejecuta la Dirección de Gestión Ambiental del GADPPz, a los proyectos de obra civil que ejecuta la Prefectura de Pastaza, se realizó la inspección in situ en el proyecto evidenciando el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en el Plan de Manejo Ambiental conforme el avance de los trabajos realizados, para su respectivo pronunciamiento.
- Mediante oficio Nro. GADPPz-JGA-GA-2023-0231-O, de fecha 03 de febrero del 2023, se emite observaciones al Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA".
- Mediante Oficio 003-GADPPz-2023, de fecha 07 de enero del 2023, y recibido por parte de la dirección de Gestión Ambiental del GADPPz, con fecha 7 febrero del 2023, donde el Ing. Cristian Parra en calidad de contratista ingresa el Informe Ambiental de Cumplimiento correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2023, corregido para su revisión.
- Mediante Oficio 004-GADPPz-2023, de fecha 15 de febrero del 2023, donde el Ing. Cristian Parra en calidad de contratista ingresa a la dirección de Gestión Ambiental del GADPPz un alcance al Oficio 003-GADPPz-2023, subsanando el error de tipeo en relación al mes de presentación del oficio en mención.

Con lo antes expuesto, y previo inspección in situ, sírvase encontrar el **INFORME No. 003-DGA-FA-JGA-JR-2023**, donde se determina el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA), por lo que se concede la **CONFORMIDAD AMBIENTAL**, bajo la revisión y criterio técnico del Ing. Jefferson Leonardo Rodriguez Rodriguez, correspondiente al periodo evaluado del 01 al 31 de enero del 2023, con la finalidad de seguir los trámites pertinentes.

Favor sup. Robert, adjuntar a la planilla correspondiente. 17/02/2023

*[Handwritten signature]*

RECIBIDO:  
17-02-2023



Memorando Nro. GADPPZ-DGA-2023-13864-M

Puyo, 16 de febrero de 2023

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. David Alejandro Yedra Machado  
**DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL**

Referencias:

- GADPPZ-JGA-GA-2023-6214-M

Anexos:

- ficha-pma.pdf
- informe\_no.\_003-dga-fa-jga-jr-2023.docx-signed.pdf
- recibido\_obs.pdf
- informe\_no\_\_003\_gadppz-dga-jga-s\_c\_m-jr-2023-signed0576077001674828247.pdf
- oficios\_contratista.pdf
- img20230215\_17093947.pdf

Copia:

Sr. Ing. Jorge Antonio Vargas Escobar - Jefe de Gestión Ambiental (E) / Sra. Lcda. Mayra Elizabeth Yucailla Valencia - Asistente Administrativo I /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Lcda. Mayra Elizabeth Yucailla Valencia - Asistente Administrativo I



Firmado electrónicamente por  
DAVID ALEJANDRO  
YEDRA MACHADO



Fecha

18 FEB 2023

RECIBIDO:

CRIS G.

Número:

6214-M

Hora:

15:01

Memorando Nro. GADPPZ-JGA-GA-2023-6214-M

Puyo, 16 de febrero de 2023

**PARA:** Sr. Mgs. David Alejandro Yedra Machado  
Director de Gestión Ambiental

**ASUNTO:** CONFORMIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA, PERDIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

De mi consideración:

Estimado Director, en atención al memorando GADPPZ-JGA-GA-2023-6207-M, suscrito por el Ing. Jefferson Leonardo Rodríguez Rodríguez ANALISTA DE CALIDAD AMBIENTAL 1, en referencia al OFICIO 002-GADPPz-2023, de fecha 31 de enero del 2023, mediante el cual, el Ing. Cristian Parra (Contratista), ingresa el Informe Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, realizadas del 01 al 31 de enero del 2023, del Proyecto "CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA"; para su revisión y pronunciamiento. Me permito dar a conocer lo siguiente:

- Con fecha 27 de enero del 2023, conforme la planificación de seguimiento control y monitoreo ambiental que ejecuta la Dirección de Gestión Ambiental del GADPPz, a los proyectos de obra civil que ejecuta la Prefectura de Pastaza, se realizó la inspección in situ en el proyecto evidenciando el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en el Plan de Manejo Ambiental conforme el avance de los trabajos realizados, para su respectivo pronunciamiento.
- Mediante oficio Nro. GADPPz-JGA-GA-2023-0231-O, de fecha 03 de febrero del 2023, se emite observaciones al Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA".
- Mediante Oficio 003-GADPPz-2023, de fecha 07 de enero del 2023, y recibido por parte de la dirección de Gestión Ambiental del GADPPz, con fecha 7 febrero del 2023, donde el Ing. Cristian Parra en calidad de contratista ingresa el Informe Ambiental de Cumplimiento correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2023, corregido para su revisión.
- Mediante Oficio 004-GADPPz-2023, de fecha 15 de febrero del 2023, donde el Ing. Cristian Parra en calidad de contratista ingresa a la dirección de Gestión Ambiental del GADPPz un alcance al Oficio 003-GADPPz-2023, subsanando el error de tipeo en relación al mes de presentación del oficio en mención.

Con lo antes expuesto, y previo inspección in situ, sírvase encontrar el INFORME No. 003-DGA-FA-JGA-JR-2023, donde se determina el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA), por lo que se concede la **CONFORMIDAD AMBIENTAL**, bajo la revisión y criterio técnico del Ing. Jefferson Leonardo Rodríguez Rodríguez, correspondiente al periodo evaluado del 01 al 31 de enero del 2023.

Además, se solicita poner en conocimiento de la Dirección de Fiscalización, conforme el respectivo



Memorando Nro. GADPPZ-JGA-GA-2023-6214-M

Puyo, 16 de febrero de 2023

proceso.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Jorge Antonio Vargas Escobar  
**JEFE DE GESTIÓN AMBIENTAL (E)**

Referencias:

- GADPPZ-JGA-GA-2023-6207-M

Anexos:

- img20230215\_17093947.pdf
- oficios\_-contratista.pdf
- informe\_no\_\_003\_gadppz-dga-jga-s\_c\_m-jr-2023-signed0576077001674828247.pdf
- recibido\_obs.pdf
- informe\_no\_\_003-dga-fa-jga-jr-2023.docx-signed.pdf
- ficha-pma.pdf

Copia:

Sra. Leda. Mayra Elizabeth Yucaila Valencia - Asistente Administrativo 1 / Sr. Ing. Jefferson Leonardo Rodríguez Rodríguez - Analista de Calidad Ambiental 1 /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Leda. Mayra Elizabeth Yucaila Valencia - Asistente Administrativo 1



JORGE ANTONIO  
VARGAS ESCOBAR

**Memorando Nro. GADPPZ-JGA-GA-2023-6207-M****Puyo, 16 de febrero de 2023****PARA:** Sr. Ing. Jorge Antonio Vargas Escobar  
**Jefe de Gestión Ambiental (E)****ASUNTO:** CONFORMIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA, PERDIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

En respuesta al Documento No. GADPPZ-DGA-2023-0927-E

Estimado ingeniero en el marco de la Jefatura de Gestión Ambiental, se encuentra establecido el proyecto de Regularización, Seguimiento y Control Ambiental de las actividades a desarrollarse por el GADPPz; y en referencia al OFICIO 002-GADPPz-2023, de fecha 31 de enero del 2023, mediante el cual, el Ing. Cristian Parra (Contratista), ingresa el Informe Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, realizadas del 01 al 31 de enero del 2023, del Proyecto "CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA"; para su revisión y pronunciamiento.

Con fecha 27 de enero del 2023, conforme la planificación de seguimiento control y monitoreo ambiental que ejecuta la Dirección de Gestión Ambiental del GADPPz, a los proyectos de obra civil que ejecuta la Prefectura de Pastaza, se realizó la inspección in situ en el proyecto evidenciando el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en el Plan de Manejo Ambiental conforme el avance de los trabajos realizados, para su respectivo pronunciamiento.

Mediante oficio Nro. GADPPZ-JGA-GA-2023-0231-O, de fecha 03 de febrero del 2023, se emite observaciones al Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA".

Mediante Oficio 003-GADPPz-2023, de fecha 07 de enero del 2023, y recibido por parte de la dirección de Gestión Ambiental del GADPPz, con fecha 7 febrero del 2023, donde el Ing. Cristian Parra en calidad de contratista ingresa el Informe Ambiental de Cumplimiento correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2023, corregido para su revisión.

Mediante Oficio 004-GADPPz-2023, de fecha 15 de febrero del 2023, donde el Ing. Cristian Parra en calidad de contratista ingresa a la dirección de Gestión Ambiental del GADPPz un alcance al Oficio 003-GADPPz-2023, subsanando el error de tipeo en relación al mes de presentación del oficio en mención.

Conforme la designación emitida mediante Memorando Nro. GADPPZ-DGA-2022-13095-M, se elabora la Conformidad Ambiental de la COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-017-2022 del proyecto.

En este contexto, previo inspección in situ, sírvase encontrar el INFORME No. 003-DGA-FA-JGA-JR-2023, donde se determina el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental

*Recibido  
11:41  
16-02-2023*



**Memorando Nro. GADPPZ-JGA-GA-2023-6207-M**

**Puyo, 16 de febrero de 2023**

(PMA), por lo que se concede la **CONFORMIDAD AMBIENTAL**, correspondiente al periodo evaluado del 01 al 31 de enero del 2023.

Se remite a la fecha en razón que el contratista presenta las observaciones subsanadas para lo cual se aprueba el periodo del 01 al 31 de enero del 2023, conforme el INFORME No. 003-DGA-FA-JGA-JR-2023.

Ademas, se solicita poner en conocimiento de la Dirección de Fiscalización, conforme el respectivo proceso.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Jefferson Leonardo Rodriguez Rodriguez  
**ANALISTA DE CALIDAD AMBIENTAL 1**

Referencias:

- GADPPZ-DGA-2023-0927-E

Anexos:

- img20230215\_17093947.pdf
- oficios\_-contratista.pdf
- recibido\_obs.pdf
- informe\_no\_003\_gadppz-dga-jga-s\_c\_m-jr-2023-signed0576077001674828247.pdf
- informe\_no\_003-dga-fa-jga-jr-2023.docx-signed.pdf
- ficha-pma.pdf



JEFFERSON LEONARDO  
RODRIGUEZ RODRIGUEZ



## INFORME No. 003-DGA-FA-JGA-JR-2023

**Para:** Sr. Ing. David Yedra **Director de Gestión Ambiental**

**Asunto:** Informe de Fiscalización Ambiental

**Equipo Técnico DGA-GADPPz** Ing. Jefferson Rodríguez

**Dirección de Coordinación.** Gestión Ambiental

**Proceso** COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-017-2022

**Fecha de elaboración.** 16-02-2023

**Periodo de evaluación** del 01 al 31 de enero del 2023

### 1. ANTECEDENTES:

En referencia al contrato COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-017-2022, suscrito en la ciudad de Puyo, a los 29 días del mes de noviembre del año dos mil veinte y dos, comparecen a la suscripción del presente Contrato, por una parte, en calidad de Contratante, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, GADPPz, legalmente representado por el Ingeniero Jaime Guevara Blaschke, Prefecto Provincial; y, por otra parte, el Consorcio Estadio Tarqui procurador común Ing. Cristian Parra Ushca, en calidad de contratista Intervinientes que acuerdan la suscripción del presente Contrato, para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA", donde establece en una de sus obligaciones el cumplimiento por Impactos Medio Ambientales.

Memorando Nro. GADPPZ-DGA-2022-13095-M, de fecha 01 de diciembre de 2022, se me designa como el responsable de realizar el seguimiento, control y monitoreo ambiental del Proyecto "CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA".

Mediante Oficio Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICAS-2022-0374-O, de fecha 21 de diciembre de 2022, se procede a la entrega en sitio donde se ejecutarán los trabajos concernientes al Contrato suscrito con fecha 29 días del mes de noviembre del 2022, cuyo objeto de contratación es: "CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA", por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza con su representante legal Ing. Jaime Patricio Guevara Blaschke, Prefecto de Pastaza; por otro lado, el Consorcio Estadio Tarqui procurador común Ing. Cristian Parra Ushca, Contratista para este propósito se reúnen el Ing. Daniel Ramos, en calidad



de Administrador de Contrato, Ing. Robert Quintana, en calidad de Fiscalizador, los mismos en representación del GADPPz y el contratista ejecutor, con la finalidad de suscribir la presente Acta de inicio de obra.

Mediante Oficio Nro. GADPPZ-JGA-GA-2022-0188-O, de fecha 23 de diciembre de 2022, se le notifica al representante legal del Consorcio Estadio Tarqui procurador común el Ing. Cristian Parra Ushca, las obligaciones ambientales y la documentación ambiental a cumplir en la ejecución del proyecto (Aprobación de la ficha ambiental mediante Oficio Nro. MAE-DPAP-2012-1168 y Plan de Manejo Ambiental (PMA). Por lo que es de carácter obligatorio el cumplimiento a las medidas establecidas para la construcción del proyecto.

Mediante OFICIO 002-GADPPz-2023, de fecha 31 de enero de 2023, el Ing. Cristian Parra contratista del proyecto, ingresa a la Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza el Informe Ambiental de Cumplimiento correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2023, del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA", para la revisión y evaluación respectivo.

Con fecha 27 de enero del 2023, conforme la planificación de seguimiento control y monitoreo ambiental que ejecuta la Dirección de Gestión Ambiental del GADPPz, a los proyectos de obra civil que ejecuta la Prefectura de Pastaza, se realizó la inspección in situ en el proyecto evidenciando el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en el Plan de Manejo Ambiental conforme el avance de los trabajos realizados, para su respectivo pronunciamiento.

Mediante oficio Nro. GADPPz-JGA-GA-2023-0231-O, de fecha 03 de febrero del 2023, se emite "(...) observaciones al informe ambiental de cumplimiento del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA", para su revisión y pronunciamiento.

Mediante Oficio 003-GADPPz-2023, de fecha 07 de enero del 2023, y recibido por parte de la dirección de Gestión Ambiental del GADPPz, con fecha 7 febrero del 2023, donde el Ing. Cristian Parra en calidad de contratista ingresa el Informe Ambiental de Cumplimiento correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2023, corregido para su revisión.

Mediante Oficio 004-GADPPz-2023, de fecha 15 de febrero del 2023, donde el Ing. Cristian Parra en calidad de contratista ingresa a la dirección de Gestión Ambiental del GADPPz un alcance al Oficio 003-GADPPz-2023, subsanando el error de tipeo en relación al mes de presentación del oficio en mención.

## 2. OBJETIVOS.

### 2.1. General.

- Evaluar en territorio el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y condicionantes establecidas en los contratos, procesos contractuales y permiso Ambiental del proyecto "CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA".

### 2.2. Específicos.

- Establecer, verificar y documentar el Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.
- Identificar hallazgos, mediante el cual se verifique el grado de cumplimiento de lo establecido en los parámetros a evaluar, (Observaciones, Conformidades y No Conformidades).
- Elaborar el informe de Conformidad o No Conformidad Ambiental para su respectiva planilla.

## 3. MARCO LEGAL APLICABLE.

➤ **CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL No. 449 DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2008.**

**Art. 10.-** Reconocida la naturaleza o Pacha Mama como sujeto de derechos

**Art. 14.-** Reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

**Art. 395.-** Reconoce principios ambientales.

**Art. 397.-** Establece que, en caso de daños ambientales, el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas.

➤ **CÓDIGO ORGÁNICO AMBIENTAL, REGISTRO OFICIAL NO. 983, DEL 12 DE ABRIL DE 2017**

**TÍTULO I**

**OBJETO, ÁMBITO Y FINES**

**Art. 1.-** Este Código tiene por objeto garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado

**TÍTULO II**

**DE LOS DERECHOS, DEBERES Y PRINCIPIOS AMBIENTALES**

**Art. 6.-** Derechos de la naturaleza. Son derechos de la naturaleza los reconocidos en la Constitución

**TÍTULO III**



## **REGIMEN DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL**

**Art. 10.- De la responsabilidad ambiental.** El Estado, las personas naturales y jurídicas, así como las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de responder por los daños o impactos ambientales que hayan causado.

## **CAPITULO II**

### **DE LOS MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL**

**Art. 201.- De los mecanismos.** El control y seguimiento ambiental puede efectuarse por medio de los siguientes mecanismos:

1. Monitoreos;
2. Muéstreos;
3. Inspecciones;
4. Informes ambientales de cumplimiento;
5. Auditorías Ambientales;
6. Vigilancia ciudadana o comunitaria; y,
7. Otros que establezca la Autoridad Ambiental Competente

En las normas secundarias que emita la Autoridad Ambiental Nacional se establecerá el mecanismo de control que aplique según el impacto generado conforme lo previsto en este Código.

## **CAPÍTULO III**

### **DE LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL**

**Art. 173.- De las obligaciones del operador.** El operador de un proyecto, obra y actividad, pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que sea posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad

## **CAPÍTULO IV**

### **DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL**

**Art. 181.- De los planes de manejo ambiental.** El plan de manejo ambiental será el instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador

**Art. 186.- Del cierre de operaciones.** Los operadores que por cualquier motivo requieran el cierre de las operaciones o abandono del área, deberán ejecutar el plan de cierre y abandono conforme lo aprobado en el plan de manejo ambiental respectivo.

## **➤ REGLAMENTO AL CÓDIGO ORGANICO**

### **CAPITULO III MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL.**

**Art. 488.- Informes ambientales de cumplimiento.** - Los informes ambientales de cumplimiento deberán ser presentados por los operadores de proyectos, obras o actividades regularizados mediante registro ambiental, con el fin de evaluar la observancia y cumplimiento de la normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas de la autorización administrativa ambiental, de acuerdo a los lineamientos que para el efecto emita la Autoridad Ambiental Nacional.

**Art. 489.- Periodicidad de informes ambientales de cumplimiento.** - Los proyectos, obras o actividades regularizadas mediante registro ambiental deberán presentar a la Autoridad Ambiental Competente un informe ambiental de cumplimiento una vez transcurrido un (1) año desde el otorgamiento de dicha autorización administrativa y posteriormente cada dos (2) años.

**Art. 505.- Plan de acción.** - Cuando se detecten, a través de los mecanismos de control y seguimiento, incumplimientos al plan de manejo ambiental o a la normativa ambiental aplicable, el operador deberá presentar un plan de acción, en el término máximo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de notificación, por parte de la Autoridad Ambiental Competente, que permita corregir los incumplimientos identificados. El plan de acción deberá ser aprobado por la Autoridad Ambiental Competente, misma que realizará el control y seguimiento, de acuerdo al cronograma respectivo y los demás mecanismos de control establecidos en la ley y este Reglamento. La Autoridad Ambiental Competente tendrá un término máximo de (30) días para aprobar, observar o rechazar el plan de acción presentado

➤ **CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN.**

**Art. 41.-** Literal e)

**Art. 42.-** Literal b) y d)

➤ **TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE (TULSMA)**

Mediante Acuerdo Ministerial No. 061 publicado en la Edición Especial No. 316, el lunes 4 de mayo del 2015, se realiza la reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.

**CAPÍTULO VI**

**GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS, Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES**

**Art. 54.-** Prohibiciones

**Art. 61.-** De las prohibiciones.



**PARÁGRAFO II  
DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE**

**Art. 62.-** De la separación en la fuente.

**PARÁGRAFO III**

**DEL ALMACENAMIENTO TEMPORAL**

**Art. 63.-** Del almacenamiento temporal urbano

**Art. 81.-** Obligatoriedad

**CAPÍTULO X**

**CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL**

**MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL**

**INFORMES AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO**

**Art. 262.-** De los Informes Ambientales de cumplimiento

**Art. 263.-** De la periodicidad y revisión.

➤ **ACUERDO MINISTERIAL 109, DEL 02 DE OCTUBRE DE 2018**

**Art. 25** Incorpórese un artículo posterior al art. 262, con el siguiente contenido

**"Art. (...) Revisión de los informes ambientales de cumplimiento.** - una vez analizada la documentación e información remitida por el operador, la Autoridad Ambiental Competente deberá aprobar, observar o rechazar el informe ambiental de cumplimiento en un término de 60 días.

**Art. 26.-** Sustitúyase el contenido del artículo 263 por el siguiente:

**"De la periodicidad y revisión.** - los proyectos obras y actividades regularizadas mediante registro ambiental deberán presentar a la autoridad ambiental competente un informe ambiental de cumplimiento una vez transcurrido un (1) año desde el otorgamiento de dicha autorización administrativa y posteriormente cada dos (2) años.

**Art. 33.-** Inclúyase el siguiente articulado posterior al artículo 283:

**"Art. (...). -Suspensión de la presentación de las Obligaciones Derivadas del permiso Ambiental.** - El operador podrá solicitar la suspensión de la presentación de las obligaciones derivadas de la autorización administrativa ambiental que se le haya otorgado, cuando:

- a) Una vez otorgada la autorización administrativa ambiental los operadores no inicien sus actividades; y,
- b) Cuando exista paralización de la totalidad del proyecto, obra o actividad en su fase de construcción u operación, siempre que se encuentre en



cumplimiento de la normativa vigente y de las obligaciones derivadas de la autorización administrativa ambiental.

➤ **ACUERDO MINISTERIAL 026, REGISTRO OFICIAL No. 334, DEL 12 DE MAYO DE 2008**

**Art. 1.-** Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos determinado en el Anexo A.

➤ **ACUERDO MINISTERIAL 142, REGISTRO OFICIAL No. 856, DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2012**

**Art 1.-** Serán consideradas sustancias químicas peligrosas, las establecidas en el Anexo A del presente acuerdo.

**Art 2.-** Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en el Anexo B del presente acuerdo.

**Art 3.-** Serán considerados desechos especiales los establecidos en los Anexo C del presente acuerdo.

➤ **REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO DEL IESS**

Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2393 y publicado en el Registro Oficial # 565 del 17 de noviembre de 1986.

Las disposiciones de este Reglamento, se aplican a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del ambiente laboral.

➤ **NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN ISO 3864-1:2013, SÍMBOLOS GRÁFICOS. COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE SEGURIDAD.**

Principios de Diseño para Señales de Seguridad e Indicaciones de Seguridad.

➤ **NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN ISO 2841:2014, ESTANDARIZACIÓN DE COLORES PARA RECIPIENTES DE DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.**

Establece los colores para los recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos con el fin de fomentar la separación en la fuente de generación y la recolección selectiva.

➤ **NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN ISO 2266:2013, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS. REQUISITOS**



Esta norma establece los requisitos que se deben cumplir para el transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos.

#### 4. ANÁLISIS Y DESARROLLO

##### 4.1. Metodología.

El Monitoreo Ambiental (o Fiscalización Ambiental) es un proceso sistemático y de permanente control y vigilancia sobre las actividades que pueden conllevar a la generación de impactos potenciales. Busca monitorear el cumplimiento de los estándares ambientales, a través de los planes y programas en ejecución que están presentes en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.

El fundamento del monitoreo es, por tanto, la búsqueda o selección de acciones establecidas para dar solución a los problemas y conflictos ambientales, siendo un instrumento importante para el seguimiento de medidas y/u obras implementadas para evitar, reducir o mitigar los impactos y acciones que se pueden presentar. Se lo ejecuta mediante la observación, registro continuo, mediciones y análisis de laboratorio (de ser necesario), que permiten evaluar y determinar la incidencia sobre el ambiente.

El monitoreo entonces consistirá en:

- Verificar o supervisar el cumplimiento y no cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto y en la legislación ambiental vigente, por parte del contratista y demás compañías de servicios que intervengan en el proyecto.
- Observar el desarrollo de las diferentes actividades.
- Plantear soluciones a problemas detectados en los frentes de trabajo con respecto a la parte ambiental.

##### 4.2. Descripción del proyecto.

**UBICACIÓN:** Provincia Pastaza - Cantón Pastaza - Parroquia Tarqui

#### **ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO**

COORDENADA UTM DATUM WGS 84 ZONA 17S		
Nro.	X	Y
1	833515	9831211
2	833644	9831277
3	833683	9831219
4	833606	9831327
5	833658	9831286



Se procedió a realizar la inspección in situ al proyecto “CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA”.

#### 4.3. Resultados.

En base a la inspección de control, monitoreo y seguimiento, se evidencio el uso equipos de protección personal, señalética preventiva e informativa, como también la delimitación del área de trabajo mediante la colocación de cinta de peligro.

Las medidas que se aplicaron son de cumplimiento obligatorio por parte del contratista y la fiscalización controlara su efectiva implementación, las actividades generaron un impacto de nivel bajo conforme avanza el proyecto en el periodo evaluado, por lo que los factores ambientales no presentan afectaciones. Además, el proyecto **CUMPLE** con las actividades planteadas en el Plan de Manejo Ambiental.

#### 5. CONCLUSIONES

- El proyecto cuenta con la implementación de señalética informativa y de seguridad en el área de trabajo, en este periodo se evidencio el transporte de material pétreo de relleno, desalojo y la construcción del cerramiento, donde, se evidencio el cumplimiento a las medidas ambientales establecidas en el Plan de Manejo Ambiental.
- Dentro de la programación de seguimiento control y monitoreo ambiental del proyecto, se realizó la inspección en el área de influencia directa, donde se desarrollan las actividades del contrato COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-017-2022, del proyecto “CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA”, donde **NO** se evidencian afectaciones a los factores ambientales en el periodo evaluado.
- Luego de la revisión y análisis del documento referente al informe ambiental correspondiente al periodo 01 al 31 de enero del 2023, del proyecto en cuestión, en el que se determina el Cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, por lo tanto, se **CONCEDE LA CONFORMIDAD AMBIENTAL** para el periodo evaluado del 01 al 31 de enero del 2023.

Elaborado por:



Firmado digitalmente por:  
JEFFERSON LEONARDO  
RODRIGUEZ RODRIGUEZ

**Ing. Jefferson Rodríguez**  
Analista de Calidad Ambiental 1

*Nota: Declaro bajo juramento, la veracidad de la información  
consignada y que los documentos presentados como anexos  
son originales y /o copia fiel del original*

## ANEXOS



FUENTE: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL-DGA



FUENTE: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL-DGA



FUENTE: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL-DGA



Estadio césped Tarqui  
Tarqui  
24.01.2023 11:34  
17M 833659 9831265  
Altitud: 944m

FUENTE: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL-DGA




Estadio césped Tarqui  
Tarqui  
24.01.2023 11:31  
17M 833606 9831327  
Altitud: 952m

FUENTE: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL-DGA



Estadio -césped-Tarqui  
Tarqui  
24.01.2023 11:31  
17M 833606 9831327  
Altitud: 953m

FUENTE: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL-DGA

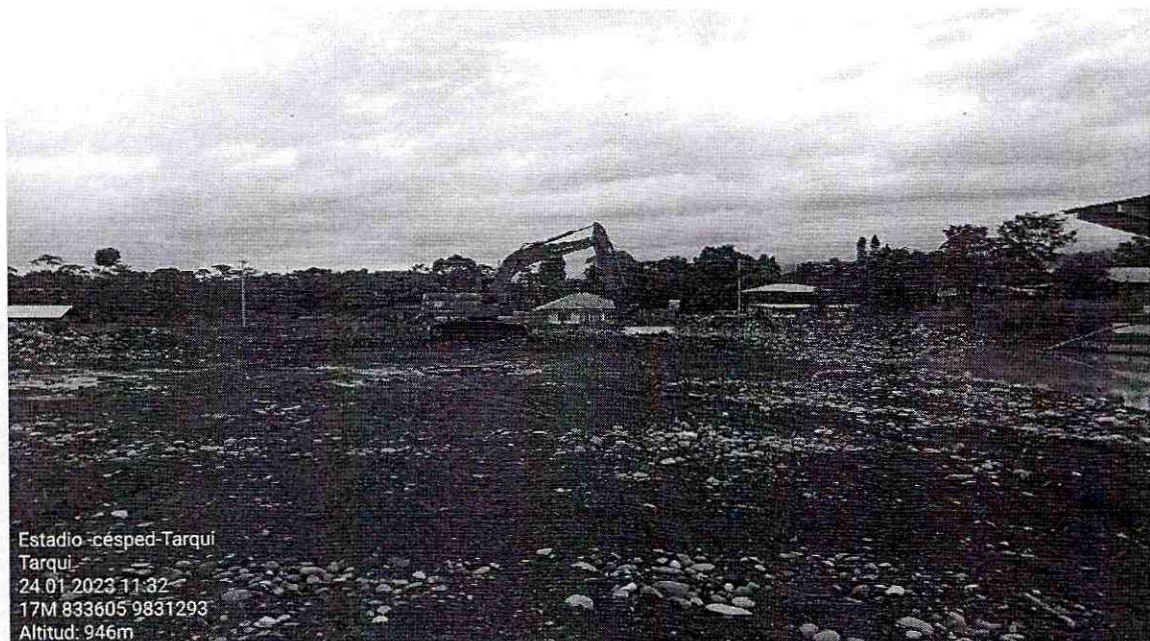


Estadio -césped-Tarqui  
Tarqui  
24.01.2023 11:32  
17M 833605 9831293  
Altitud: 946m


FUENTE: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL-DGA




FUENTE: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL-DGA

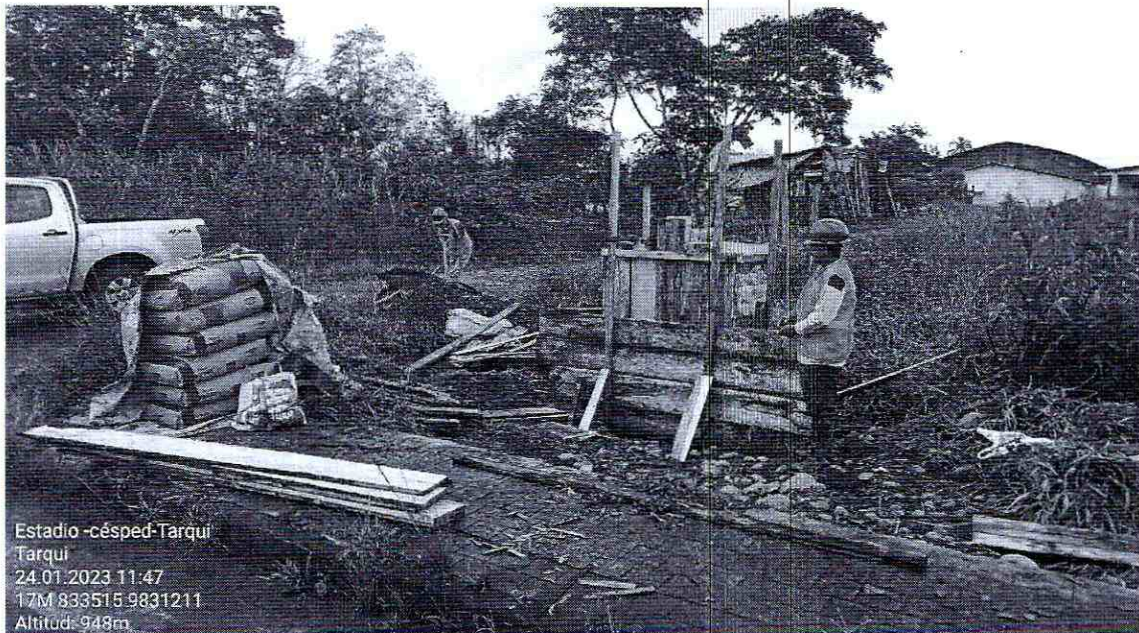

FUENTE: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL-DGA

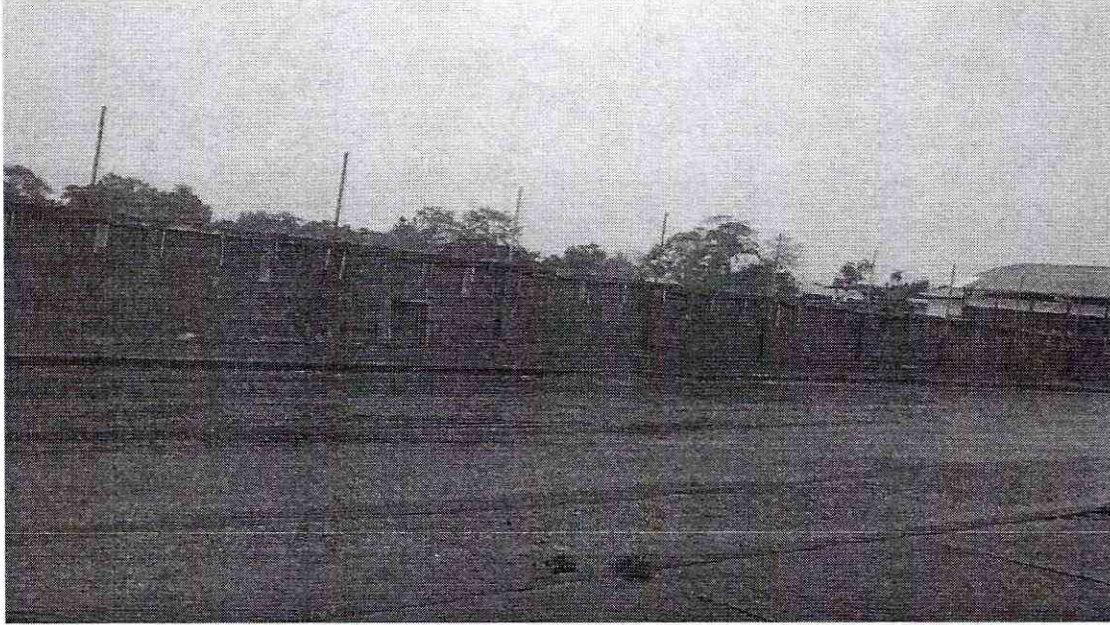

FUENTE: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL-DGA

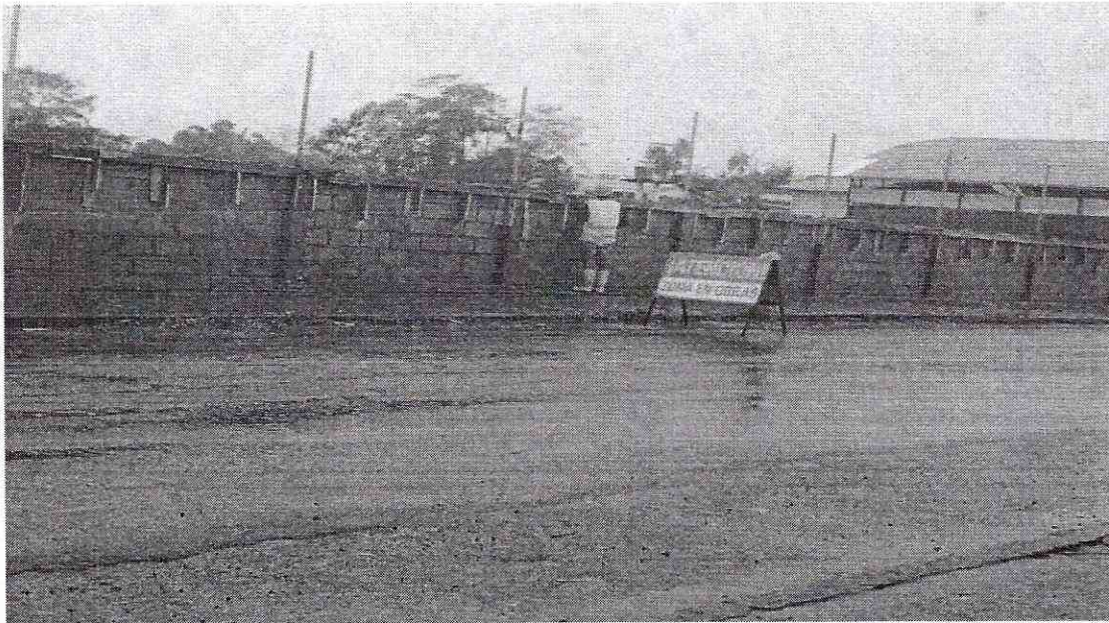

FUENTE: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL-DGA



**DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**  
**INFORME No. 003 GADPPz-DGA-JGA-S.C.M-JR-2023**

<b>Proyecto:</b>	“CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA”
<b>Responsable SCM GADPPz:</b>	Ing. Jefferson Rodriguez <b>Analista de Calidad Ambiental</b>
<b>Contratista:</b>	Ing. Cristian Parra Ushca - CONSORCIO ESTADIO TARQUI
<b>Sector :</b>	Parroquia Tarqui
<b>Codigo del contrato :</b>	COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-017-2022
<b>Fecha :</b>	27/01/2023

---

**1. ANTECEDENTE:**

En la ciudad de Puyo, a los 29 días del mes de noviembre del año dos mil veinte y dos, comparecen a la suscripción del presente Contrato, por una parte, en calidad de Contratante, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, legalmente representado por el Ing. Jaime Patricio Guevara Blaschke, Prefecto Provincial; y, por otra parte, en calidad de Contratista, el Consorcio Estadio Tarqui procurador común Ing. Cristian Parra Ushca.

Mediante Memorando Nro. GADPPZ-DGA-2022-13095-M, de fecha 01 de diciembre de 2022, se me designa como responsable de realizar el Seguimiento, Control y Monitoreo Ambiental conforme al proceso de COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-017-2022, para la CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA" COTO 017".

Mediante Oficio Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICAS-2022-0374-O, de fecha 21 de diciembre de 2022, se notifica la suscripción del acta de inicio de obra del proceso COTO-GADPPZ-017-2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Mediante Oficio Nro. GADPPZ-JGA-GA-2022-0188-O, de fecha 23 de diciembre de 2022, se notifica las OBLIGACIONES AMBIENTALES POR CUMPLIR PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

**2. MARCO LEGAL APLICABLE.**

➤ **CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL No. 449 DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2008.**

**Art. 10.-** Reconocida la naturaleza o Pacha Mama como sujeto de derechos

**Art. 14.-** Reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

**Art. 395.-** Reconoce principios ambientales.

**Art. 397.-** Establece que, en caso de daños ambientales, el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas.



➤ **CÓDIGO ORGÁNICO AMBIENTAL, REGISTRO OFICIAL NO. 983, DEL 12 DE ABRIL DE 2017**

**TÍTULO I**

**OBJETO, ÁMBITO Y FINES**

**Art. 1.-** Este Código tiene por objeto garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado

**TÍTULO II**

**DE LOS DERECHOS, DEBERES Y PRINCIPIOS AMBIENTALES**

**Art. 6.-** Derechos de la naturaleza. Son derechos de la naturaleza los reconocidos en la Constitución

**TÍTULO III**

**REGIMEN DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL**

**Art. 10.- De la responsabilidad ambiental.** El Estado, las personas naturales y jurídicas, así como las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de responder por los daños o impactos ambientales que hayan causado.

**CAPITULO II**

**DE LOS MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL**

**Art. 201.- De los mecanismos.** El control y seguimiento ambiental puede efectuarse por medio de los siguientes mecanismos:

1. Monitoreos;
2. Muéstreos;
3. Inspecciones;
4. Informes ambientales de cumplimiento;
5. Auditorías Ambientales;
6. Vigilancia ciudadana o comunitaria; y,
7. Otros que establezca la Autoridad Ambiental Competente

En las normas secundarias que emita la Autoridad Ambiental Nacional se establecerá el mecanismo de control que aplique según el impacto generado conforme lo previsto en este Código.

**CAPÍTULO III**

**DE LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL**

**Art. 173.- De las obligaciones del operador.** El operador de un proyecto, obra y actividad, pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que sea posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad

**CAPÍTULO IV**

**DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL**

**Art. 181.- De los planes de manejo ambiental.** El plan de manejo ambiental será el instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador

**Art. 186.- Del cierre de operaciones.** Los operadores que por cualquier motivo requieran el cierre de las operaciones o abandono del área, deberán ejecutar el plan de cierre y abandono conforme lo aprobado en el plan de manejo ambiental respectivo.

➤ **REGLAMENTO AL CÓDIGO ORGANICO**

**CAPITULO III MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL.**

**Art. 488.- Informes ambientales de cumplimiento.** - Los informes ambientales de cumplimiento deberán ser presentados por los operadores de proyectos, obras o actividades regularizados mediante registro ambiental, con el fin de evaluar la observancia y cumplimiento de la normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas de la autorización administrativa ambiental, de acuerdo a los lineamientos que para el efecto emita la Autoridad Ambiental Nacional.

**Art. 489.- Periodicidad de informes ambientales de cumplimiento.** - Los proyectos, obras o actividades regularizadas mediante registro ambiental deberán presentar a la Autoridad Ambiental



Competente un informe ambiental de cumplimiento una vez transcurrido un (1) año desde el otorgamiento de dicha autorización administrativa y posteriormente cada dos (2) años.

**Art. 505.- Plan de acción.** - Cuando se detecten, a través de los mecanismos de control y seguimiento, incumplimientos al plan de manejo ambiental o a la normativa ambiental aplicable, el operador deberá presentar un plan de acción, en el término máximo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de notificación, por parte de la Autoridad Ambiental Competente, que permita corregir los incumplimientos identificados. El plan de acción deberá ser aprobado por la Autoridad Ambiental Competente, misma que realizará el control y seguimiento, de acuerdo al cronograma respectivo y los demás mecanismos de control establecidos en la ley y este Reglamento. La Autoridad Ambiental Competente tendrá un término máximo de (30) días para aprobar, observar o rechazar el plan de acción presentado

➤ **CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN.**

Art. 41.- Literal e)

Art. 42.- Literal b) y d)

➤ **TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE (TULSMA)**

Mediante Acuerdo Ministerial No. 061 publicado en la Edición Especial No. 316, el lunes 4 de mayo del 2015, se realiza la reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.

**CAPÍTULO VI**

**GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES**

Art. 54.- Prohibiciones

Art. 61.- De las prohibiciones.

**PARÁGRAFO II**

**DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE**

Art. 62.- De la separación en la fuente.

**PARÁGRAFO III**

**DEL ALMACENAMIENTO TEMPORAL**

Art. 63.- Del almacenamiento temporal urbano

Art. 81.- Obligatoriedad

**CAPÍTULO X**

**CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL**

**MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL**

**INFORMES AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO**

Art. 262.- De los Informes Ambientales de cumplimiento

Art. 263.- De la periodicidad y revisión.

➤ **ACUERDO MINISTERIAL 109, DEL 02 DE OCTUBRE DE 2018**

**Art. 25 Incorpórese un artículo posterior al art. 262, con el siguiente contenido**

**"Art. (...) Revisión de los informes ambientales de cumplimiento.** - una vez analizada la documentación e información remitida por el operador, la Autoridad Ambiental Competente deberá aprobar, observar o rechazar el informe ambiental de cumplimiento en un término de 60 días.

**Art. 26.- Sustitúyase el contenido del artículo 263 por el siguiente:**

**"De la periodicidad y revisión.** - los proyectos obras y actividades regularizadas mediante registro ambiental deberán presentar a la autoridad ambiental competente un informe ambiental de cumplimiento una vez transcurrido un (1) año desde el otorgamiento de dicha autorización administrativa y posteriormente cada dos (2) años.

**Art. 33.- Inclúyase el siguiente articulado posterior al artículo 283:**

**"Art. (...). -Suspensión de la presentación de las Obligaciones Derivadas del permiso Ambiental.** - El operador podrá solicitar la suspensión de la presentación de las obligaciones derivadas de la autorización administrativa ambiental que se le haya otorgado, cuando:



- a) Una vez otorgada la autorización administrativa ambiental los operadores no inicien sus actividades; y,
- b) Cuando exista paralización de la totalidad del proyecto, obra o actividad en su fase de construcción u operación, siempre que se encuentre en cumplimiento de la normativa vigente y de las obligaciones derivadas de la autorización administrativa ambiental.

➤ **ACUERDO MINISTERIAL 026, REGISTRO OFICIAL No. 334, DEL 12 DE MAYO DE 2008**

**Art. 1.-** Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos determinado en el Anexo A.

➤ **ACUERDO MINISTERIAL 142, REGISTRO OFICIAL No. 856, DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2012**

**Art 1.-** Serán consideradas sustancias químicas peligrosas, las establecidas en el Anexo A del presente acuerdo.

**Art 2.-** Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en el Anexo B del presente acuerdo.

**Art 3.-** Serán considerados desechos especiales los establecidos en los Anexo C del presente acuerdo.

➤ **REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO DEL IESS**

Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2393 y publicado en el Registro Oficial # 565 del 17 de noviembre de 1986.

Las disposiciones de este Reglamento, se aplican a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del ambiente laboral.

➤ **NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN ISO 3864-1:2013, SÍMBOLOS GRÁFICOS. COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE SEGURIDAD.**

Principios de Diseño para Señales de Seguridad e Indicaciones de Seguridad.

➤ **NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN ISO 2841:2014, ESTANDARIZACIÓN DE COLORES PARA RECIPIENTES DE DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.**

Establece los colores para los recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos con el fin de fomentar la separación en la fuente de generación y la recolección selectiva.

➤ **NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN ISO 2266:2013, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS. REQUISITOS**

Esta norma establece los requisitos que se deben cumplir para el transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos.

**3. DESARROLLO:**

Conforme el Seguimiento control y monitoreo ejecutado desde el inicio del proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA" COTO 017".

**4. HALLAZGOS:**

Durante el recorrido al proyecto se evidencio lo siguiente:

- Mejoramiento de suelo, regado de material pétreo
- Encofrado de bordillos
- Fundición de bases del cerramiento
- Delimitación del área de trabajo (cinta de peligro)
- Señalética preventiva tipo barrera
- Contenedores de desechos comunes



- El personal técnico asignado para el proyecto por parte del contratista se encontraba en el lugar al momento de la inspección in situ con el equipo de protección personal (EPP).
- Trabajos que se encuentran en la Coordenada Geográficas UTM WGS 84 Zona 17s

COORDENADA UTM DATUM WGS 84 ZONA 17S		
NRO.	X	Y
1	833515	9831211
2	833659	9831265
3	833606	9831327
4	833657	9831269
5	833673	9831267

#### 5. CONCLUSION:

- El personal técnico asignado para el proyecto por parte del contratista se encontraba en el lugar al momento de la inspección in situ con el equipo de protección personal (EPP).
- El proyecto cuenta con la implementación de señalética informativa y de seguridad en el área de trabajo.
- Se evidencio los trabajos con la colocación de sub base con una longitud aproximada 1,6 km y asfaltado de un margen de 1000 metros aproximadamente.

#### 6. RECOMENDACIONES:

- Informar a la Dirección de Gestión Ambiental, en caso de realizar una variante o modificación en la ejecución o cierre de la obra, siempre que esta pueda generar daños o riesgos ambientales.
- Cumplir con el Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del trabajo y las que se deriven del Reglamento.


Elaborado por:




firmado electrónicamente por:  
JEFFERSON LEONARDO  
RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Ing. Jefferson Rodriguez  
**RESPONSABLE DEL MONITOREO, CONTROL Y  
SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL GADPPz.**

## 7. ANEXOS

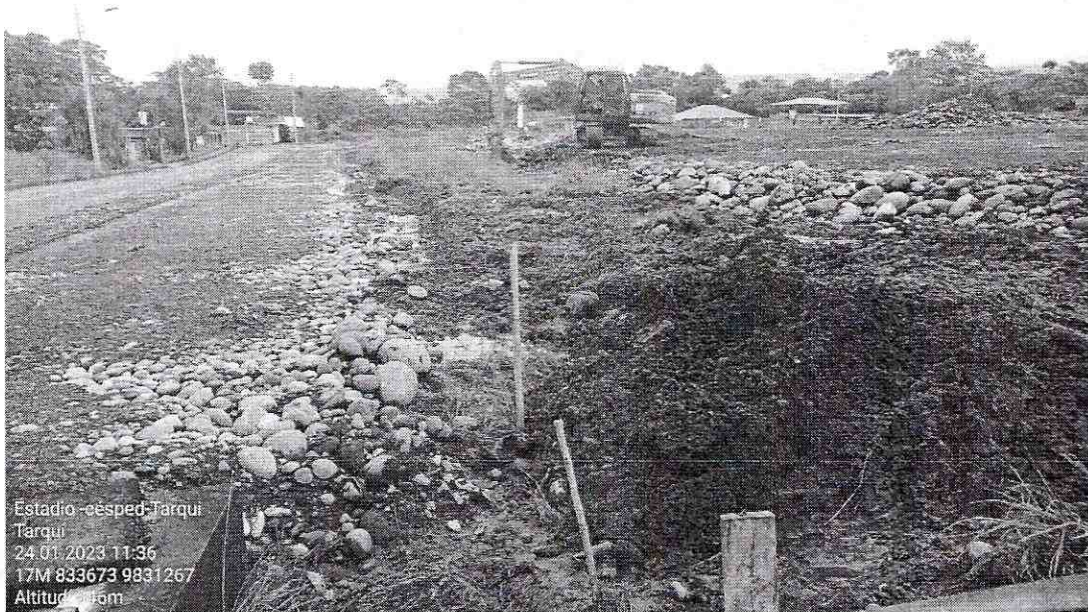

FUENTE: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL-DGA

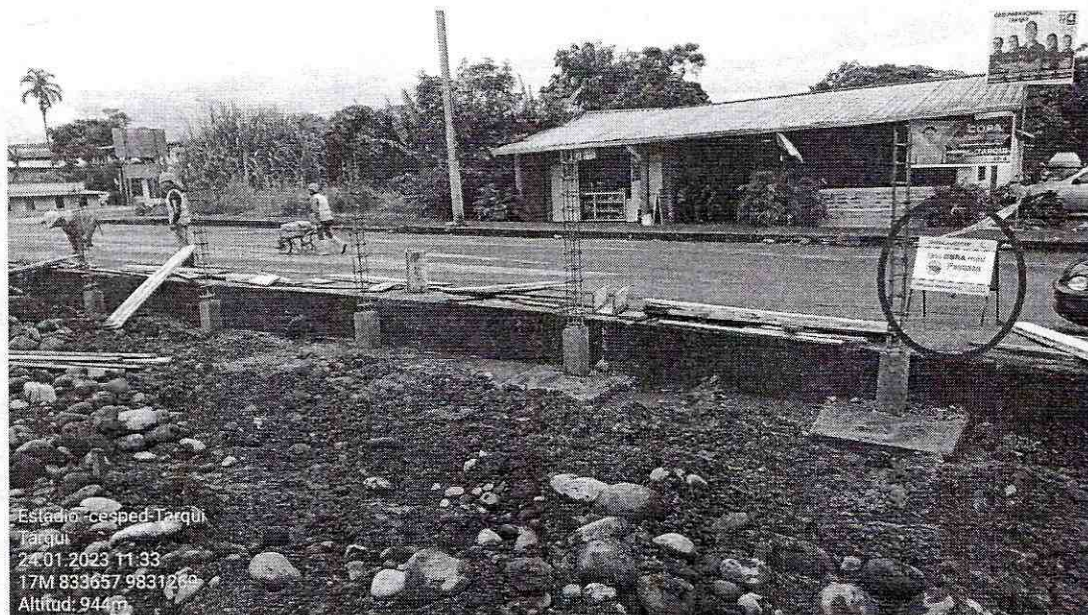

FUENTE: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL-DGA

**FICHA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL REGLAMENTARIO DE CÉSPEDE SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**



RESPONSABLE DE LA ELABORACION DE LA FICHA : Ing. Jefferson Rodriguez  
 CONTRATISTA: Consorcio Estadio Tarqui procurador común Ing. Cristian Parra  
 MODALIDAD: CONTRATACIÓN  
 FECHA: 24-01-2023

**MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**

ITEM	MEDIDA PROPUESTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
<b>PROGRAMA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN</b>						
1	El personal previo el inicio de los trabajos, deberá cumplir con todos los requisitos que establece el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.		✓	NC-		
2	Se capacitará e informará a todo el personal laboral, de todos los trabajos a realizarse, considerando aquellos en los que se demanda un riesgo alto, dando una pauta preventiva sobre el riesgo y evitando accidentes laborales.		✓			
3	Definir el área del emplazamiento del campamento, el que estará ubicado en el área urbana y rural de la provincia (Debido a la ubicación del proyecto)				✓	
4	Se zonificará el área, en la cual se constituirá el estacionamiento de la maquinaria, talleres de reparación, área de mantenimiento de la maquinaria y equipo, a la vez se definirá el área de vivienda, incluyendo el comedor y la cocina.				✓	

5	Las aguas servidas tendrán como destino el sistema de alcantarillado del cantón					
6	Se deberá implementar un tanque móvil, para la recolección de aceites, grasas y combustibles, posterior a su recolección se dará un destino final a los mismos, no se arrojarán a los cuerpos de agua ni se verterán en el suelo.	✓				
7	Se construirá una plataforma de cemento para el cambio de aceites y combustibles, con su respectiva zanja de vaciado, y con su equipo para el traslado al tanque móvil, para posteriormente ser llevado a reciclaje.	✓				
8	El taller, el área de mantenimiento de maquinaria y equipos, el área de vivienda y cocina deberán tener extinguidores contra incendio.	✓				
9	En referencia al punto anterior todo el personal laboral deberá estar capacitado para responder ante una eventualidad y el manejo correcto de los extintores.		✓			
10	Todas las aguas del deslastre de la maquinaria serán tratadas con un sistema biodegradable en una laguna de oxidación, misma que deberá tener paredes impermeabilizadas con material Rugger.	✓				Cuentan con bodegas sanitarias - Bodega
11	El área de habitación, contará con un área destinada a la recreación de los trabajadores, con los servicios higiénicos básicos	✓				Esta medida no aplica el personal al cumplir su jornada se dirige a sus domicilios.
12	El campamento deberá contar con una área destinada para emergencias, curaciones menores, es decir contará con un botiquín básico de primeros auxilios, así como sueros antiofídicos para la mordedura de ofidios, oxígeno y resucitador para probables accidentes.		✓			Se evidencio el Botiquin de primeros Auxilios ubicado en el frente de trabajo
13	Se implementará un área destinada para el Jefe del Proyecto, como para el Técnico que llevará la lista de Control de los Impactos (check-list).		✓			
14	Todo el personal, deberá estar capacitado en el manejo de la maquinaria, y equipo pesado, así como los instrumentos de trabajo para evitar posibles accidentes.		✓			
15	El personal se someterá a un taller de capacitación con el objeto de no cometer impactos que no estén considerados en el proyecto.		✓			

16	Se prohíbe al personal el ingerir bebidas alcohólicas, o consumo de drogas dentro y fuera de las instalaciones del campamento así como en los frentes de trabajo.		✓			
17	El personal que no cumpla con la medida anteriormente descrita, será retirado de los trabajos en el proyecto y se realizará un informe y notificación del incumplimiento del mismo.			✓		
18	Queda terminantemente prohibido el ingreso a comunidades indígenas, de encontrarse una falta de cumplimiento a esta medida por parte del personal, este será sancionado de acuerdo a la gravedad de la falta.			✓		
19	Se establecerá por parte del Jefe del Proyecto, un reglamento que se deberá cumplir dentro del campamento		✓			
20	La plataforma destinada para el mantenimiento y estacionamiento de la maquinaria no se deberá ubicarse junto a esteros o ríos, evitando el peligro de contaminación de las aguas por derrame o infiltración de hidrocarburos		✓			
21	Se proveerá de todo el Equipo de protección Personal a todos los trabajadores del proyecto, y se verificará la utilización del mismo, evitando de esta manera posibles accidentes y promoviendo la seguridad y la salud en los trabajadores, estos deberán constar de lo siguiente: Ropa adecuada, casco, guantes, botas de caucho		✓			
<b>FASE DE CONSTRUCCIÓN</b>						
22	Durante la apertura de trocha, el personal que realice labores de macheo, sobre la actividad desbroce, estará ubicado a distancias considerables de entre 2 y 3 metros de distancia con la finalidad de evitar accidentes o posibles cortaduras.				✓	No se evidencio actividades de desbrose.
23	Se prohíbe la tala de árboles fuera del polígono de construcción.				✓	
24	La maquinaria procederá a retirar la capa vegetal orgánica la cual será colocada un lugar adecuado y protegido de la lluvia al costado de la vía, el que será utilizado para la restauración de áreas afectadas y taludes, reforestación del área y el cultivo de especies alternativas o propias de la zona para el proceso de mejoramiento de los suelos afectados.		✓			Se evidencio el material de desdoblejo en terreno privado

25	En las áreas en las que se trabaje con combustibles y material inflamable se prohibirá el uso y consumo de cigarrillos				✓	No se evidencian áreas de abastecimiento de combustible
26	El cambio de aceites y engrase se recogerá en recipientes apropiados, para posteriormente trasladarlos al sitio de recolección, para su posterior reciclaje				✓	No se evidencian goteos o derrames de aceite
27	Los escombros producto del movimiento de las tierras, será trasladado al sitio de disposición final definido para tal efecto		✓			
28	Los tractores y volquetes quedan terminantemente prohibidos de arrojar el material producto de los movimientos de tierra en cuerpos de agua y esteros, ya que obstruyen su normal circulación y propenden a la eutrofización de las mismas y su degradación.		✓			
29	Se prohíbe botar material del movimiento de tierras en las fuentes hídricas y tributarias, ya que el mismo produce un incremento en la turbidez de este recurso, afectando la dinámica de los ecosistemas acuáticos y sus cadenas tróficas.		✓			
30	Queda prohibido verter o disponer material que contenga o este impregnado con combustibles, aceites o grasas sobre los cauces y cuerpos de agua				✓	
31	Las áreas que presenten aguas subterráneas o pequeños acuíferos perpendiculares a la vía serán considerados e implantados un sistema de drenaje evitando de esta manera probables deslizamientos en masas, en cortes de talud en colinas.				✓	
32	Los volquetes que realizan el transporte de tierra así como de material pético, deberán usar cubiertas, evitando el derrame de estos componentes y el esparcimiento de material y partículas sólidas al ambiente, esto se realizará siempre y de manera obligatoria,		✓			
33	El material producto del movimiento de tierras solo podrá ser dispuesto en un lugar destinado para este fin, mas no en cualquier espacio.		✓			
34	Queda terminantemente prohibido arrojar desechos de cualquier índole en los cuerpos de agua, la medida aplica para todo el personal laboral en el proyecto.		✓			

35	Designar al del personal para que supervise la disposición correcta de los residuos al final del día					✓			
36	La disposición final de los desechos orgánicos, domésticos y escombros será en sitios adecuados y autorizados					✓			
37	Los residuos que pueden ser reciclados serán temporalmente almacenados hasta el momento de su reutilización o entrega a gestores					✓			
38	En el caso de las emisiones gaseosas, se recomienda utilizar maquinaria en buen estado mecánico para evitar la contaminación.					✓			
<b>FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>									
39	Designar al del personal para que supervise la disposición correcta de los residuos al final del día.					✓			
40	La disposición final de los desechos orgánicos, domésticos y escombros será en sitios adecuados y autorizados.					✓			
41	Los residuos que pueden ser reciclados serán temporalmente almacenados hasta el momento de su reutilización o entrega a gestores					✓			
42	En el caso de las emisiones gaseosas, se recomienda utilizar maquinaria en buen estado mecánico para evitar la contaminación.					✓			
<b>TRANSPORTE Y LOGÍSTICA</b>									
43	Antes de uso de los vehículos se deberá realizar una inspección de los mismos, antes de cumplir el turno planificado o después que ha estado en mantenimiento o reparación. Se revisará frenos, llantas, dirección, luces, nivel de agua, gasolina y aceite de motor.					✓			
44	Tener la licencia de conducción vigente y de la categoría adecuada.					✓			
45	Los empleados no podrán manejar los vehículos fuera del área del proyecto salvo en los casos que cuenten con la autorización del supervisor.					✓			
46	Cumplirán de manera estricta los lineamientos de la Dirección de Tránsito, y tomar las precauciones necesarias respecto a los otros conductores y peatones.								✓
47	Antes de poner el vehículo en marcha se asegurará que el área este despejada de materiales, equipos y personas.					✓			

48	En todos los equipos del proyecto sean trabajadores directos o indirectos, deberán contar con extintor de incendios y botiquín de primeros auxilios. Así como equipo de seguridad en carretera gata, llanta de emergencia, tacos, triángulos de seguridad, llave de ruedas y herramientas.	✓			
49	Cuando la visibilidad esté afectada en la noche, se usará las luces altas. Si un vehículo viene en sentido contrario se educará la intensidad de las luces a una distancia aproximada de 130 metros, hasta que el otro vehículo pase.	✓			Esta medida no aplica puesto que los trabajos se ejecutan durante el día
50	Cuando existe polvo y la visibilidad disminuye se detendrá el vehículo	✓			No aplica
51	Los vehículos que no presenten condiciones óptimas para el trabajo como silenciadores, vibraciones excesivas, fallas mecánicas no serán utilizados.	✓			Se verifica la fecha de inspección visual realizada por el tec. ambiental
52	Está prohibido conducir vehículos bajo los efectos del alcohol y/o de las drogas.	✓			
53	Los parabrisas, vidrios, ventanas luces y direccionales delanteros y traseros deberán estar limpios para una buena visibilidad.	✓			
54	Está prohibido fumar o encender fuego cerca de las áreas de aprovisionamiento o cerca del vehículo que está siendo reabastecido de combustible	✓			No aplica puesto que el mantenimiento lo realiza en talleres endocranial, Pabellón
55	Todos los motores deben estar apagados mientras se reabastece de combustible.	✓			

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

Conforme la inspección realizada se constató el cumplimiento a las medidas ambientales y el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales al Plan de manejo ambiental.

Firma de responsabilidad de Control y Monitoreo:  
  
 Ing. Jefferson Rodriguez

Firma de responsable de Obra:  
  
 DARIO NOÑEZ

**TIGERS PREMIUM**

**CD-R80**  
CD-RECORDABLE

**2X-56X**  
80MIN 700MB

Contents:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Do not put into direct sunlight. Write with special soft marker pen only.*

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
Fecha: 15 FEB 2023  
Recibido: CRIS G.  
Número: 0927-E Hora: 16:24

OFICIO 004-GADPPz-2023

Puyo, 15 de Febrero 2023

ING.

David Yedra

**DIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DEL GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

Presente. -

Expresándole un atento y cordial saludo, en alcance al **Oficio 003-GADPPz-2023**, cuyo objeto tiene la **"CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**, en el cual consta la fecha de elaboración 07 de enero del 2023, debo indicar que debido a un error de tipeo no se colocó la fecha adecuada siendo la correcta **07 febrero del 2023**. Por lo cual me permito poner en su conocimiento la respectiva aclaración al oficio en mención.

Por la atención que le tome a la presente le anticipo mis sentimientos de estima y consideración. -




Ing. Cristian Parra

PROCURADOR COMUN CONSORCIO ESTADIO TARQUI

169178994001

CONTRATISTA



Fecha: 07 FEB 2023  
Recibido: CLIS G.  
Número: 0909-E Hora: 14:59

OFICIO 003 GADPPz-2023  
Febrero  
Puyo, 07 de Enero 2023

ING.

David Yedra

**DIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DEL GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

Presente. -

Expresándole un atento y cordial saludo, en referencia al oficio **Nro. GADPPZ-JGA-GA-2023-0231-O** con fecha 03 de Febrero de 2023, sobre las observaciones realizadas al proyecto " **CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**", una vez subsanadas las observaciones me permito adjuntar el informe de cumplimiento ambiental del periodo comprendido del 01 al 31 de Enero 2023, para su respectivo tramite de revisión y aprobación.

Por la atención que le tome a la presente le anticipo mis sentimientos de estima y consideración. -



Ing. Cristian Parra

PROCURADOR COMUN CONSORCIO ESTADIO TARQUI

169178994001

CONTRATISTA

Recibido   
08/02/2023

Ing. Jefferson Rodriguez → Favor trámite pertinente   
08/02/2023



1600671976  
Eduardo Fonseca

**Oficio Nro. GADPPZ-JGA-GA-2023-0231-O**

**Puyo, 03 de febrero de 2023**

**Asunto:** OBSERVACIONES AL INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023.

Ingeniero  
Cristian Fernando Parra Ushca  
**Contratista**  
**CONTRATISTA**  
En su Despacho

En respuesta al Documento No. GADPPZ-DGA-2023-0891-E

Estimado Ingeniero en respuesta al Oficio N°. 002-GADPPz-2023, emitido por su persona en calidad de Contratista, a la Dirección de Gestión Ambiental de forma física y digital el INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO de la Ficha Ambiental aprobada mediante Oficio Nro.MAE-DPAP-2012-1168, por el Ministerio de Ambiente Agua y Transición, Ecológica para el proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", y recibido con fecha 31 de enero del 2023, para su revisión y pronunciamiento.

Al respecto debo informar que luego del análisis y revisión del INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO de la Ficha Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental, correspondiente al periodo 01 al 31 de enero del 2023, cuenta con las siguientes observaciones:

Dentro del cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental (PROGRAMA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS ETAPA DE PRE CONSTRUCCIÓN)

- Numeral 1, la medida propuesta manifiesta "(...) *El personal previo el inicio de los trabajos, deberá cumplir con todos los requisitos que establece el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (...)*", reevaluar como NC- al no disponer del medio de verificación.
- Numeral 19, la medida propuesta manifiesta "(...) *Se establecerá por parte del Jefe del Proyecto, un reglamento que se deberá cumplir dentro del campamento (...)*", el anexo no corresponde a la medida evaluada.

#### FASE DE CONSTRUCCIÓN

- Numeral 25, la medida propuesta manifiesta "(...) *En las áreas en las que se trabaje con combustibles y material inflamable se prohibirá el uso y consumo de cigarrillos (...)*", anexar factura de consumo de combustible.
- Numeral 33, la medida propuesta manifiesta "(...) *El material producto del movimiento de tierras solo podrá ser dispuesto en un lugar destinado para este fin, mas no en cualquier espacio (...)*", el anexo no corresponde a la medida evaluada.

Oficio Nro. GADPPZ-JGA-GA-2023-0231-O

Puyo, 03 de febrero de 2023

### TRASPORTE Y LOGÍSTICA

- Numeral 48, la medida propuesta manifiesta “(...) *En todos los equipos del proyecto sean trabajadores directos o indirectos, deberán contar con extintor de incendios y botiquín de primeros auxilios. Así como equipo de seguridad en carretera gata, llanta de emergencia, tacos, triángulos de seguridad, llave de ruedas y herramientas (...)*”, el anexo no corresponde a la medida evaluada.
- Numeral 54, la medida propuesta manifiesta “(...) *Está prohibido fumar o encender fuego cerca de las áreas de aprovisionamiento o cerca del vehículo que está siendo reabastecido de combustible (...)*”, anexas factura de consumo de combustible.
- El documento presentado de forma física presenta un formato inapropiado ya que debe mejorar la presentación del informe (un solo tipo de letra, espacios entre líneas y párrafos).
- Revaluación de hallazgos al Plan de Manejo Ambiental.
- Adjuntar en forma física y digital el informe ambiental de cumplimiento subsanado

En este contexto me permito solicitar acoger las siguientes observaciones, corregirlas y presentarlas en un nuevo documento para su posterior revisión y pronunciamiento, mismas que deberán ser entregadas en un plazo de 48 horas término.

Atentamente,

#### *Documento firmado electrónicamente*

Ing. Jefferson Leonardo Rodríguez Rodríguez  
**ANALISTA DE CALIDAD AMBIENTAL 1**

#### Referencias:

- GADPPZ-DGA-2023-0891-E

#### Anexos:

- img20230201\_08484205.pdf
- img20230201\_08464656.pdf
- observaciones\_al\_iac\_periodo\_del\_1\_al\_31\_de\_enero\_del\_2023.pdf

#### Copia:

Señor Magíster David Alejandro Yedra Machado - **Director de Gestión Ambiental** - / Señor Ingeniero Jorge Antonio Vargas Escobar - **Jefe de Gestión Ambiental (E)** - /



JEFFERSON LEONARDO  
RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Fecha: 31 ENERO 2023  
recibido: CRD G.

Número: \_\_\_\_\_ Hora: 16:38

OFICIO 002-GADPPz-2023

Puyo, 31 de Enero del 2023

Ing.  
David Yedra

**DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

Presente. –

Expresándole un saludo cordial, en referencia al **CONTRATO COTO-GADPPz-017-2022**, denominado: **CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTETICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA**, me permito adjuntar el informe de cumplimiento correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Enero del 2023.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

**ATENTAMENTE,**



CRISTIAN FERNANDO  
PARRA USHCA

Ing. Cristian Parra.

**PROCURADOR COMUN CONSORCIO ESTADIO TARQUI**  
1691728994001

OFICIO 002-GADPPz-2022

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**



**INFORME:**

**SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL PROYECTO:**  
"CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO  
DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA,  
PROVINCIA DE PASTAZA".

**CODIGO:**  
MAE-DPAP-2012-1168

**PLAZO:**  
120 DIAS

**CONTRATISTA:**  
ING. CRISTIAN FERNANDO PARRA USHCA

**FISCALIZADOR:**  
ING. ROBERT QUINTANA

**ADMINISTRADOR:**  
ING. DANIEL RAMOS CAMPAÑA.

**FISCALIZADOR AMBIENTAL:**  
ING. JEFFERSON RODRIGUEZ

**PERIODO**  
1 de Enero al 31 de Enero del 2023

## INTRODUCCION

A través de la implementación del presente documento se provee la posibilidad de reducir los impactos ambientales negativos generados por las actividades de cada uno de los trabajadores de manera individual, sin la necesidad de sustituir o realizar cambios profundos en los procesos. Aunque el impacto generado pudiera percibirse como poco significativo o bajo impacto, la suma de cientos de malas actuaciones individuales puede generar resultados globales adversos, por lo cual se pueden llevar a cabo pequeñas acciones encaminadas a su prevención o su reducción de impactos ambientales.

### 1. ANTECEDENTES

El Gobierno Provincial de Pastaza como operador del proyecto, busca mejorar la calidad de vida de la población a través de proyectos infraestructura deportiva que en este caso es “CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”. y de este modo aporta con el desarrollo del sector Deportivo que posee esta localidad.

De esta manera el GADPPz realiza la Contratación Pública por Menor Cuantía de Obras COTO-GADPPZ-017-2022, para la ejecución del proyecto de “CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”. Por tanto, se inicia a partir de la misma dando como resultado los siguientes plazos contractuales:

- Firma del contrato de obra: 29 de noviembre de 2022.
- Fecha Notificación Administrador de Contrato: 30 de noviembre de 2022.
- Fecha de Notificación de Inicio de obra: 21 de diciembre de 2022.
- Fecha de contabilización de plazo: 22 de diciembre de 2022.

2.-FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Tabla 1. Ficha técnica del proyecto

DATOS GENERALES			
NOMBRE DEL PROYECTO		"CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".	
CÓDIGO:		MAE-DPAP-2012-1168	
ZONA:		Rural	
ETAPA:	Construcción		
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
	Pastaza	Pastaza	Tarqui
COORDENADAS			
Punto 1		-1.525171, -78002403	
Punto 2		-1.524781, -78.00291	
Punto 3		-1.524427, -78.001845	
Punto 4		-1.524057, -78.002349	
PLAZO DE EJECUCIÓN		120 días	
PERIODO		1 de Enero al 31 de Enero del 2023	
ESTADO ACTUAL		Construcción	
PORCENTAJE DE AVANCE		30 %	

Tabla 2. Datos de la entidad ejecutora

DATOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA	
NOMBRE RAZÓN SOCIAL	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Jaime Guevara

### **3.-OBJETIVOS**

#### **3.1.-Objetivo Principal**

- Definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para mitigar los impactos negativos causados por la “CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”.
- 3.2.-Objetivos Específicos
- Describir el proyecto y sus actividades en la etapa de construcción y adecuación.
- Determinar las condiciones ambientales del área de influencia directa del proyecto.
- Cumplimiento de las medidas o acciones para prevenir, mitigar, controlar y corregir los impactos ambientales identificados.

### **4.- MARCO LEGAL**

#### **CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la Conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.

**Art. 395** reconoce los siguientes principios ambientales:

El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.

Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.

El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.

#### **CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 983 DE 12 ABRIL DE 2017.**

Art. 162.- Obligatoriedad. Todo proyecto, obra o actividad, así como toda ampliación o modificación de los mismos, que pueda causar riesgo o impacto ambiental, deberá cumplir con las disposiciones y principios

que rigen al Sistema Único de Manejo Ambiental, en concordancia con lo establecido en el presente Código.

#### Capítulo II de la Regularización Ambiental

Art. 172.- Objeto. La regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales. Para dichos efectos, el impacto ambiental se clasificará como no significativo, bajo, mediano o alto. El Sistema Único de Información Ambiental determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental a otorgarse.

Art. 173.- De las obligaciones del operador. El operador de un proyecto, obra y actividad, pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que sea posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad. Cuando se produzca algún tipo de afectación al ambiente, el operador establecerá todos los mecanismos necesarios para su restauración.

#### **CAPITULO IV. DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL**

Art. 177.- De la información de los proyectos, obras o actividades que puedan afectar al ambiente. La autorización administrativa emitida por la Autoridad Ambiental Competente deberá incorporarse inmediatamente al Sistema Único de Información Ambiental. Las autorizaciones emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional son de acceso público, de conformidad con la ley.

Art. 181.- De los planes de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental será el instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende varios subplanes, en función de las características del proyecto, obra o actividad. La finalidad del plan de manejo será establecer en detalle y orden cronológico, las acciones cuya ejecución se requiera para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar, según corresponda. Además, contendrá los programas, presupuestos, personas responsables de la ejecución, medios de verificación, cronograma y otros que determine la normativa secundaria.

#### **CAPÍTULO II. DE LOS MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL**

Art. 201.- De los mecanismos. El control y seguimiento ambiental puede efectuarse por medio de los siguientes mecanismos:

- Monitoreos;
- Muestreos;
- Inspecciones;
- Informes ambientales de cumplimiento;
- Auditorías Ambientales;
- Vigilancia ciudadana o comunitaria; y,
- Otros que establezca la Autoridad Ambiental Competente.

## **PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA REGULARIZACION AMBIENTAL**

Art. 488.- Informes ambientales de cumplimiento. - Los informes ambientales de cumplimiento deberán ser presentados por los operadores de proyectos, obras o actividades regularizados mediante registro ambiental, con el fin de evaluar la observancia y cumplimiento de la normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas de la autorización administrativa ambiental, de acuerdo a los lineamientos que para el efecto emita la Autoridad Ambiental Nacional. Los informes ambientales de cumplimiento podrán incluir la actualización del plan de manejo ambiental, de así requerirlo.

### **5.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

El presente proyecto tiene la finalidad de beneficiar a los pobladores de la parroquia Tarqui y el desarrollo deportivo de dicho sector. Este beneficio se verá reflejado en especial a los usuarios del Transporte de pasajeros, usuarios de vehículos particulares, empresarios, consumidores finales de productos y la población en general al generarse nuevas alternativas deportivas.

El presente proyecto consiste en la “CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”, el porcentaje de obra al momento de la presentación del informe es del 30 %.

Actividades realizadas en este periodo:

#### **MOVIMIENTOS DE TIERRA PLATAFORMA**

- Excavación en suelo natural
- Desalojo de material
- Relleno compactado a máquina (Plataforma)
- Desalojo de suelo natural

#### **CERRAMIENTO PERIMETRAL**

- Excavación a máquina de zanjas
- Desalojo de material
- Replanteo de hormigón simple de 180 kg.cm<sup>2</sup>- incluye encofrado
- Acero de refuerzo para plintos, columnas y cadenas en el cerramiento- incluye encofrado
- Hormigón simple en plintos – incluye encofrado
- Hormigón simple en columnas – incluye encofrado
- Hormigón ciclópeo – incluye encofrado
- Hormigón en cadenas – incluye encofrado
- Mampostería de bloque alivianado

- Colocación de tubo galvanizado en columnas de hormigón
- Construcción de caja de revisión de hormigón simple.

## 6.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN

**Conformidad (C):** Calificación que se da a toda actividad, instalación o práctica que se ha realizado o se encuentra dentro de las restricciones, parámetros o especificaciones expuestas en el Plan de Manejo Ambiental y leyes aplicables.

**No Conformidad (NC):** Calificación que se da a toda actividad, instalación o práctica que no se ha realizado o se encuentra dentro de las restricciones, parámetros o especificaciones expuestas en el Plan de Manejo Ambiental y/o normativa aplicable al parámetro evaluado.

**No conformidad menor (NC-):** Calificación que implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios:

- Fácil corrección o remediación
- Rápida corrección o remediación
- Bajo costo de corrección o remediación
- Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo
- Impactos menores, sean directos y/o indirectos.

**No conformidad mayor (NC+):** Calificación que implica una falta grave frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ puede ser aplicada también cuando no se produzcan repeticiones periódicas de no conformidades menores.

Los criterios de calificación son los siguientes:

- Corrección o remediación de carácter difícil.
- Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y económicos. - El evento es de magnitud moderada a grande
- Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales

**No Aplica (NA):** Calificación que se otorga cuando una medida del Plan de Manejo Ambiental o requisito de la normativa no guarda relación con las características del proyecto o su ejecución no corresponde al periodo de reporte.

**Tabla 3.** evaluación de cumplimiento

Cumple ©	No Cumple (NC)	No Aplica (N/A)
----------	----------------	-----------------

7.- MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL						
N°	ART.	REFERENCIA	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
			C	NC	N/A	
<b>CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR</b>						
1	Art. 14.-	Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la Conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.				Ver anexo N°1. Aprobación de la ficha ambiental del proyecto "MANTENIMIENTO DE LOS ESTADIOS DE LA PROVINCIA DE PASTAZA"
2	Art. 66.-	Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.				Ver anexo N°1. Aprobación de la ficha ambiental del proyecto "MANTENIMIENTO DE LOS ESTADIOS DE LA PROVINCIA DE PASTAZA"
<b>CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE</b>						
1	Art .16 2.-	Obligatoriedad. Todo proyecto, obra o actividad, así como toda ampliación o modificación de los mismos, que pueda causar riesgo o impacto ambiental, deberá cumplir con las disposiciones y principios que rigen al Sistema Único de Manejo Ambiental, en concordancia con lo establecido en el presente Código. Capítulo II de la Regularización Ambiental				Elaboración de Informes Ambientales de cumplimiento según lo establece la categorización establecida por el sistema SUIA (Certificación ambiental).

2	Art.172 .-	Objeto. La regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales. Para dichos efectos, el impacto ambiental se clasificará como no significativo, bajo, mediano o alto. El Sistema Único de Información Ambiental determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental a otorgarse.			Ver anexo N°1. Aprobación de la ficha ambiental del proyecto "MANTENIMIENTO DE LOS ESTADIOS DE LA PROVINCIA DE PASTAZA"
3	Art.173 .-	De las obligaciones del operador. El operador de un proyecto, obra y actividad, pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que sea posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad. Cuando se produzca algún tipo de afectación al ambiente, el operador establecerá todos los mecanismos necesarios para su restauración.			Desarrollo y ejecución de la Ficha ambiental emitida por la entidad reguladora MAEE
4	Art.177	De la información de los proyectos, obras o actividades que puedan afectar al ambiente. La autorización administrativa emitida por la Autoridad Ambiental Competente deberá incorporarse inmediatamente al Sistema Único de Información Ambiental. Las autorizaciones emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional son de acceso público, de conformidad con la ley.			Ver anexo N°1. Aprobación de la ficha ambiental del proyecto "MANTENIMIENTO DE LOS ESTADIOS DE LA PROVINCIA DE PASTAZA"

5	Art.181.-	<p>De los planes de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental será el instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende varios subplanes, en función de las características del proyecto, obra o actividad. La finalidad del plan de manejo será establecer en detalle y orden cronológico, las acciones cuya ejecución se requiera para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar, según corresponda. Además, contendrá los programas, presupuestos, personas responsables de la ejecución, medios de verificación, cronograma y otros que determine la normativa secundaria.</p>		<p>El presente proyecto cuenta con un plan de manejo ambiental acorde a su categorización de la obra. Cuenta con la aprobación de la ficha ambiental del proyecto "MANTENIMIENTO DE LOS ESTADIOS DE LA PROVINCIA DE PASTAZA".</p>
6	Art.201.-	<p>De los mecanismos. El control y seguimiento ambiental puede efectuarse por medio de los siguientes mecanismos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoreos;</li> <li>• Muestreos;</li> <li>• Inspecciones;</li> <li>• Informes ambientales de cumplimiento;</li> <li>• Auditorías Ambientales;</li> <li>• Vigilancia ciudadana o comunitaria; y,</li> <li>• Otros que establezca la Autoridad Ambiental Competente.</li> </ul>		<p>Elaboración de Informes Ambientales de cumplimiento.</p>

8.- MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

ITEM	MEDIDA PROPUESTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
<b>PROGRAMA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS</b>					
<b>ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN</b>					
1	El personal previo el inicio de los trabajos, deberá cumplir con todos los requisitos que establece el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.	Consolidado de aportaciones		NC-	Esta medida no aplica puesto que se anexará el mecanizado del iess en el siguiente periodo.
2	Se capacitará e informará a todo el personal laboral, de todos los trabajos a realizarse, considerando aquellos en los que se demanda un riesgo alto, dando una pauta preventiva sobre el riesgo y evitando accidentes laborales.	Registro fotográfico Registro de capacitaciones	X		Ver anexo 2
3	Definir el área del emplazamiento del campamento, el que estará ubicado en el área urbana y rural de la provincia (Debido a la ubicación del proyecto)	Registro fotográfico	X		Ver anexo 3
4	Se zonificará el área, en la cual se constituirá el estacionamiento de la maquinaria, talleres de reparación, área de mantenimiento de la maquinaria y equipo, a la vez se definirá el área de vivienda, incluyendo el comedor y la cocina.	Registro fotográfico Registro fotográfico	X		Se definió el área de estacionamiento de vehículos y maquinaria, así también como el área de cocina y comedor. Ver anexo 4 y 9
5	Las aguas servidas tendrán como destino el sistema de alcantarillado del cantón	Registro fotográfico	X		Ver anexo 5
6	Se deberá implementar un tanque móvil, para la recolección de aceites, grasas y combustibles, posterior a su recolección se dará un destino final a los mismos, no se arrojarán a los cuerpos de agua ni se verterán en el suelo.	Registro fotográfico			No aplica debido a que no se genera este tipo de desechos en el proyecto.
7	Se construirá una plataforma de cemento para el cambio de aceites y combustibles, con su respectiva zanja de vaciado, y con su equipo para el traslado al tanque móvil, para posteriormente ser llevado a reciclaje.	Registro fotográfico			Esta medida no aplica puesto que el mantenimiento de maquinaria se lo realizara en talleres autorizados. Se adjunta la factura de mantenimiento de la maquinaria. Ver anexo 18.

8	El taller, el área de mantenimiento de maquinaria y equipos, el área de vivienda y cocina deberán tener extinguidores contra incendio.	Registro fotográfico Registro de inspecciones	X			El área de cocina y comedor cuenta con un extinguidor contra incendios Ver anexo 6
9	En referencia al punto anterior todo el personal laboral deberá estar capacitado para responder ante una eventualidad y el manejo correcto de los extintores.	Registro fotográfico Registro de capacitaciones	X			Ver anexo 2
10	Todas las aguas del deslante de la maquinaria serán tratadas con un sistema biodegradable en una laguna de oxidación, misma que deberá tener paredes impermeabilizadas con material Rugger.	Registro fotográfico			X	No aplica debido a que el proyecto no genera desechos peligrosos.
11	El área de habitación, contará con un área destinada a la recreación de los trabajadores, con los servicios higiénicos básicos	Registro fotográfico			X	No aplica debido a que el personal cumple su jornada diaria y se retira hacia sus domicilios.
12	El campamento deberá contar con un área destinada para emergencias, curaciones menores, es decir contará con un botiquín básico de primeros auxilios, así como sueros antiofídicos para la mordedura de ofidios, oxígeno y resucitador para probables accidentes.	Registro fotográfico	X			Ver anexo 6
13	Se implementará un área destinada para el jefe del Proyecto, como para el Técnico que llevará la lista de Control de los Impactos (check-list).	Registro fotográfico	X			Ver Anexo 7
14	Todo el personal, deberá estar capacitado en el manejo de la maquinaria, y equipo pesado, así como los instrumentos de trabajo para evitar posibles accidentes.	Registro fotográfico Actas de asistencia	X			Ver Anexo 2
15	El personal se someterá a un taller de capacitación con el objeto de no cometer impactos que no estén considerados en el proyecto.	Registro fotográfico Actas de asistencia	X			Ver anexo 2
16	Se prohíbe al personal el ingerir bebidas alcohólicas, o consumo de drogas dentro y fuera de las instalaciones del campamento, así como en los frentes de trabajo.	Elaboración de un reglamento para los trabajadores	X			Se procedió a realizar el proceso y registro para la aprobación del reglamento interno de trabajo. se adjunta una captura de la respuesta del ministerio de trabajo. Ver anexo 8
17	El personal que no cumpla con la medida anteriormente descrita, será retirado de los trabajos en el proyecto y se realizara un informe y notificación del incumplimiento del mismo.	Reglamento interno de trabajo			X	Esta medida no aplica debido que no se ha registrado algún inconveniente en cuanto al reglamento por parte del personal.

18	Queda terminantemente prohibido el ingreso a comunidades indígenas, de encontrarse una falta de cumplimiento a esta medida por parte del personal, este será sancionado de acuerdo a la gravedad de la falta.	Reglamento interno de trabajo			X	Esta medida no aplica, puesto que en este periodo no se han registrado incumplimientos en este aspecto por parte del personal.
19	Se establecerá por parte del Jefe del Proyecto, un reglamento que se deberá cumplir dentro del campamento.	Reglamento interno de trabajo	X			El consorcio se encuentra registrado y el reglamento se encuentra en proceso de aprobación Ver anexo 8
20	La plataforma destinada para el mantenimiento y estacionamiento de la maquinaria no se deberá ubicarse junto a esteros o ríos, evitando el peligro de contaminación de las aguas por derrame o infiltración de hidrocarburos.	Registro fotográfico			X	Estacionamiento de la maquinaria pesada Ver anexo 9
21	Se proveerá de todo el Equipo de protección Personal a todos los trabajadores del proyecto, y se verificará la utilización del mismo, evitando de esta manera posibles accidentes y promoviendo la seguridad y la salud en los trabajadores, estos deberán constar de lo siguiente: Ropa adecuada, casco, guantes, botas de caucho	Registro fotográfico Actas de entrega	X			Se doto al personal del equipo de protección personal para la realización de las actividades en los diferentes frentes de trabajo, acompañados de la señalética correspondiente para precautelar su seguridad. Ver anexo 10
<b>FASE DE CONSTRUCCIÓN</b>						
22	Durante la apertura de trocha, el personal que realice labores de macheco, sobre la actividad desbroce, estará ubicado a distancias considerables de entre 2 y 3 metros de distancia con la finalidad de evitar accidentes o posibles cortaduras.	Registro fotográfico				En este periodo no se realizó actividades de desbroce
23	Se prohíbe la tala de árboles fuera del polígono de construcción.	Registro fotográfico			X	Esta medida no se aplica puesto que el proyecto se encuentra en el centro poblado de la parroquia Tarqui y no existe bosque primario o secundario adyacente al área a intervenir.
24	La maquinaria procederá a retirar la capa vegetal orgánica la cual será colocada un lugar adecuado y protegido de la lluvia al costado de la vía, el que será utilizado para la restauración de áreas afectadas y taludes, reforestación del área y el cultivo de especies alternativas o propias de la zona para el proceso de mejoramiento de los suelos afectados.	Registro fotográfico	X			A petición verbal de un morador aledaño al área del proyecto, se procedió a realizar un acta de conformidad para depositar el desalojo en su predio. Se adjunta el acta de conformidad. Ver anexo 11

25	En las áreas en las que se trabaje con combustibles y material inflamable se prohibirá el uso y consumo de cigarrillos.	Registro fotográfico Señalética informativa		X	Esta medida no aplica debido que el proyecto se encuentra cerca de las estaciones de servicio (Cantón Pastaza), se anexa las facturas. Ver anexo 23
26	El cambio de aceites y engrase se recogerá en recipientes apropiados, para posteriormente trasladarlos al sitio de recolección, para su posterior reciclaje	Registro fotográfico		X	Esta medida no aplica puesto que la maquina utilizada en el proyecto se encuentra en óptimas condiciones
27	Los escombros producto del movimiento de las tierras, será trasladado al sitio de disposición final definido para tal efecto.	Registro fotográfico	X		A petición verbal de un morador aledaño al área del proyecto, se procedió a realizar un acta de conformidad para depositar el desalojo en su predio. Se adjunta el acta de conformidad. Ver anexo 11
28	Los tractores y volquetes quedan terminantemente prohibidos de arrojar el material producto de los movimientos de tierra en cuerpos de agua y esteros, ya que obstruyen su normal circulación y propenden a la eutrofización de las mismas y su degradación.	Registro fotográfico	X		A petición verbal de un morador aledaño al área del proyecto, se procedió a realizar un acta de conformidad para depositar el desalojo en su predio. Se adjunta el acta de conformidad. Ver anexo 11
29	Se prohíbe botar material del movimiento de tierras en las fuentes hídricas y tributarias, ya que el mismo produce un incremento en la turbidez de este recurso, afectando la dinámica de los ecosistemas acuáticos y sus cadenas tróficas.	Registro fotográfico	X		A petición verbal de un morador aledaño al área del proyecto, se procedió a realizar un acta de conformidad para depositar el desalojo en su predio. Se adjunta el acta de conformidad. Ver anexo 11
30	Queda prohibido verter o disponer material que contenga o este impregnado con combustibles, aceites o grasas sobre los cauces y cuerpos de agua	Registro fotográfico		X	No aplica debido a que no se han registrado derrames de combustible o grasas en este periodo del proyecto.
31	Las áreas que presenten aguas subterráneas o pequeños acuíferos perpendiculares a la vía serán considerados e implantados un sistema de drenaje evitando de esta manera probables deslizamientos en masas, en cortes	Registro fotográfico		X	Esta medida no aplica debido que no se a realizado el drenaje de acuíferos adyacentes al proyecto.

	de talud en colinas.							
32	Los volquetes que realizan el transporte de tierra, así como de material pétreo, deberán usar cubiertas, evitando el derrame de estos componentes y el esparcimiento de material y partículas sólidas al ambiente, esto se realizará siempre y de manera obligatoria.	Registro fotográfico	X				Ver Anexo 12	
33	El material producto del movimiento de tierras solo podrá ser dispuesto en un lugar destinado para este fin, mas no en cualquier espacio.	Registro fotográfico Acta de conformidad	X				A petición verbal de un morador aledaño al área del proyecto, se procedió a realizar un acta de conformidad para depositar el desalojo en su predio. Se adjunta el acta de conformidad. Ver anexo 11	
34	Queda terminantemente prohibido arrojar desechos de cualquier índole en los cuerpos de agua, la medida aplica para todo el personal laboral en el proyecto.	Registro fotográfico	X				En el proyecto se implementó tachos para los residuos en diferentes frentes para su recolección. Ver anexo 13	
35	Designar al personal para que supervise la disposición correcta de los residuos al final del día	Registro fotográfico	X				El personal disponiendo de los residuos al final del día de trabajo. Ver anexo 14	
36	La disposición final de los desechos orgánicos, domésticos y escombros será en sitios adecuados y autorizados	Registro fotográfico	X				Los residuos serán depositados en el contenedor de basura adyacente al proyecto para su posterior recolección y disposición final de los mismos. Ver Anexo 14	
37	Los residuos que pueden ser reciclados serán temporalmente almacenados hasta el momento de su reutilización o entrega a gestores	Registro fotográfico	X				Ver Anexo 15	
38	En el caso de las emisiones gaseosas, se recomienda utilizar maquinaria en buen estado mecánico para evitar la contaminación.	Inspección visual	X				Ficha de inspección visual de la maquinaria Ver Anexo 16	
<b>FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>								
39	Designar al personal para que supervise la disposición correcta de los residuos al final del día.	Registro fotográfico	X				Los residuos serán depositados en el contenedor de basura adyacente al proyecto para su posterior	


						recolección y disposición final de los mismos. Ver anexo 14
40	La disposición final de los desechos orgánicos, domésticos y escombros será en sitios adecuados y autorizados.	Registro fotográfico	X			Los residuos serán depositados en el contenedor de basura adyacente al proyecto para su posterior recolección y disposición final de los mismos. Ver anexo 14
41	Los residuos que pueden ser reciclados serán temporalmente almacenados hasta el momento de su reutilización o entrega a gestores	Registro fotográfico	X			Almacenamiento temporal de residuos para su reutilización Ver Anexo 15
42	En el caso de las emisiones gaseosas, se recomienda utilizar maquinaria en buen estado mecánico para evitar la contaminación.	Inspección Visual	X			Ficha de inspección visual de la maquinaria Ver Anexo 16
<b>TRANSPORTE Y LOGÍSTICA</b>						
43	Antes de uso de los vehículos se deberá realizar una inspección de los mismos, antes de cumplir el turno planificado o después que ha estado en mantenimiento o reparación. Se revisará frenos, llantas, dirección, luces, nivel de agua, gasolina y aceite de motor.	Inspección visual	X			Revisión visual de vehículos. Ver anexo 17
44	Tener la licencia de conducción vigente y de la categoría adecuada.	Registro fotográfico	X			Se adjunta la copia de la licencia de conducir de los choferes de la maquinaria. Ver Anexo 19
45	Los empleados no podrán manejar los vehículos fuera del área del proyecto salvo en los casos que cuenten con la autorización del supervisor.	Permiso de movilización	X			Se adjunta el permiso de movilización. Ver anexo 20
46	Cumplirán de manera estricta los lineamientos de la Dirección de Tránsito, y tomar las precauciones necesarias respecto a los otros conductores y peatones.	Acta de compromiso			X	Esta medida no aplica debido a que no se han registrado multas por el incumplimiento a las leyes de tránsito.
47	Antes de poner el vehículo en marcha se asegurará que el área este despejada de materiales, equipos y personas.	Registro fotográfico	X			Área despejada para la movilización de la maquinaria o vehículos. Ver Anexo 22

48	En todos los equipos del proyecto sean trabajadores directos o indirectos, deberán contar con extintor de incendios y botiquín de primeros auxilios. Así como equipo de seguridad en carretera gata, llanta de emergencia, tacos, triángulos de seguridad, llave de ruedas y herramientas.	Registro fotográfico	X			Ver Anexo 21
49	Cuando la visibilidad esté afectada en la noche, se usará las luces altas. Si un vehículo viene en sentido contrario se reducirá la intensidad de las luces a una distancia aproximada de 130 metros, hasta que el otro vehículo pase.	Registro fotográfico			X	Esta medida no aplica puesto que los trabajos se realizarán en horas del día de 7:00 am a 5:00 pm con su respectivo descanso de 12:00 a 1:00 pm en una jornada laboral normal.
50	Cuando existe polvo y la visibilidad disminuye se detendrá el vehículo	Registro fotográfico			X	Esta medida no aplica debido a que no existe polvo que dificulte la visibilidad en las áreas del proyecto.
51	Los vehículos que no presenten condiciones óptimas para el trabajo como silenciadores, vibraciones excesivas, fallas mecánicas no serán utilizados.	Inspección Visual	X			Ficha de inspección visual. Ver Anexo 16
52	Está prohibido conducir vehículos bajo los efectos del alcohol y/o de las drogas.	Inspección del personal al ingreso a la obra			X	No se han registrado este tipo de incumplimientos al reglamento interno de trabajo en este periodo.
53	Los parabrisas, vidrios, ventanas luces y direccionales delanteros y traseros deberán estar limpios para una buena visibilidad.	Registro fotográfico	X			Ver Anexo 17
54	Está prohibido fumar o encender fuego cerca de las áreas de aprovisionamiento o cerca del vehículo que está siendo reabastecido de combustible	Registro fotográfico			X	El reabastecimiento de las maquinarias se lo realiza fuera del área intervenida, el proyecto se encuentra cerca de las estaciones de servicio (Cantón Pastaza), se anexa las facturas. Ver anexo 23
55	Todos los motores deben estar apagados mientras se reabastece de combustible.	Registro fotográfico			X	El reabastecimiento de las maquinarias se lo realiza fuera del área intervenida, el proyecto se encuentra cerca de las estaciones de servicio (Cantón Pastaza), se anexa las facturas. Ver anexo 23

9.- ANÁLISIS DEL PORCENTAJE DE LA NORMATIVA AMBIENTAL

N°	PROGRAMA	NÚMERO DE MEDIDAS	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
			C	NC	N/A	
1	CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR	2	2	0	0	
2	CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE	6	6	0	0	
<b>TOTAL</b>		8	8	0	0	
		100%	100%		%	Cumplimiento del 100% de la normativa ambiental.

Figura 1 Porcentaje de cumplimiento de la Normativa ambiental

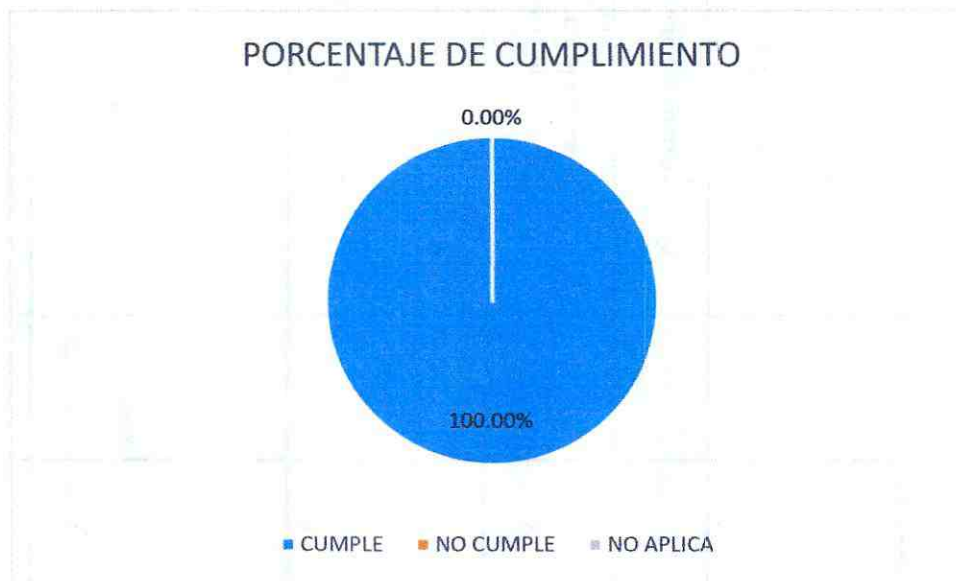


Como se puede observar en la figura N°1, el proyecto cumple con el 100 % de la normativa ambiental.

10.- ANALISIS DEL PORCENTAJE DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PMA

N°	PROGRAMA	NÚMERO DE MEDIDAS	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
			C	NC	N/A	
1	Plan de prevención y Mitigación de impactos	21	12	1	8	
2	Fase de construcción	17	11	0	6	
3	Fase de operación y mantenimiento	4	4	0		
4	Transporte y logística	13	7	0	6	
		55	35	1	19	
<b>TOTAL</b>		100%	63.65%	1.81%	34.54%	Presenta un cumplimiento del 63.65% de las medidas del PMA

Figura 2.- Porcentaje de cumplimiento

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

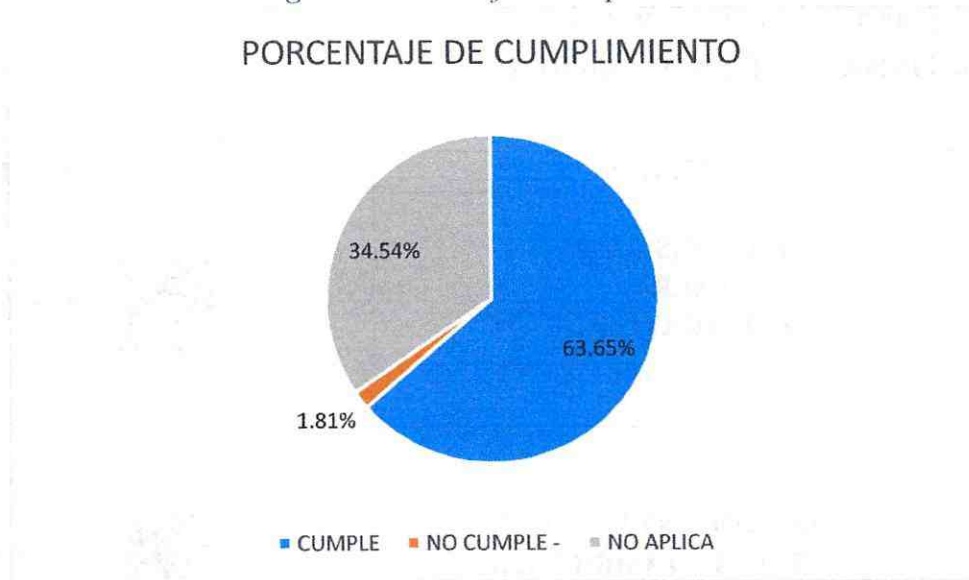

Como se puede observar en la figura N°2, el proyecto actualmente cumple con el 63,65 %de las medidas planteadas dentro del plan de manejo, presenta un incumplimiento de conformidad menor del 1,81 % y el restante 34,54% son medidas que no aplican dentro de las actividades realizadas.

### 11.- CONCLUSIONES

- El proyecto “CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”, presenta un avance del 30 % a la fecha de la culminación de dicho periodo, contemplando las actividades de transporte de material pétreo de relleno y desalojo, en la cual también se incluyen las actividades de construcción del cerramiento perimetral.
- En el proyecto se identificó y cuantifico las medidas en el Plan de Manejo Ambiental de la fase de Construcción, determinando un cumplimiento del PMA del 63,65 %, presenta un incumplimiento de conformidad menor del 1,8 % y presenta un 34,54 % de actividades que no aplican dentro del proyecto.

### 12.- RECOMENDACIONES

- Se recomienda mantener un seguimiento ambiental a las actividades a realizarse durante la operación del proyecto, “CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”. Con la finalidad de continuar realizando una buena gestión Ambiental a nivel local.

### 13.- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRES	FIRMAS
ING. CRISTIAN PARRA CONTRATISTA	 CRISTIAN FERNANDO PARRA USHCA
ING. JOHNNY FONSECA TÉCNICO AMBIENTAL	 JOHNNY PAUL FONSECA NUNEZ

## ANEXO 1.- Aprobación de la ficha ambiental



Oficio Nro. MAE-DPAP-2012-1168

Puyo, 29 de noviembre de 2012

**Asunto:** APROBACIÓN DE LA FICHA AMBIENTAL DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LOS ESTADIOS DE LA PROVINCIA DE PASTAZA".

Señor Ingeniero

Juane Guayana Blaschke

**Prefecto**

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

En su Despacho

De mi consideración:

En atención al Oficio N° 1666-DGA-GADPPz de fecha 06 de Noviembre del 2012, ingresado a esta dependencia el 14 de Noviembre del 2012, el Sr. Ing. David Yedra Director de Gestión Ambiental GADPPz, solicita el análisis, revisión y aprobación de la Ficha y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto "MANTENIMIENTO DE LOS ESTADIOS DE LA PROVINCIA DE PASTAZA". Ya que una vez realizada las rectificaciones pertinentes de acuerdo a las observaciones del Oficio N° MAE-DPAP-2012-1064 se presenta la ficha Ambiental para continuar con el trámite respectivo, para lo cual adjunta el comprobante de depósito Nro.2558 por \$50.00 USD que corresponden a la tasa de Revisión, Calificación de Fichas Ambientales y Planes de Manejo y el comprobante de depósito Nro.2558 por \$80 USD que corresponde a la Tasa de Seguimiento y Monitoreo.

Al respecto le comunico que esta Cartera de Estado, sobre la base del Informe Técnico N° 294-12-CL-UCAP-DPP-MAE, 21 de Noviembre de 2012, remitido mediante Memorando Nro. MAE-UCAP-DPAP-2012-0458 de fecha 29 de noviembre de 2012, **APRUEBA** la Ficha Ambiental del Proyecto "MANTENIMIENTO DE LOS ESTADIOS DE LA PROVINCIA DE PASTAZA".

El Ing. David Yedra, deberá cumplir estrictamente con el Plan de Manejo Ambiental, para lo cual la Dirección Provincial de Pastaza a través de la Unidad de Calidad Ambiental de este Ministerio se encargará del control y seguimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Oficio Nro. MAE-OPAP-2012-1168

Puyo, 29 de noviembre de 2012

*Documento firmado electrónicamente*

Jag. Jorge Luis León Navas  
**DIRECTOR PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE PASTAZA**

Referencias:

- MAE-OPAP-2012-2133

Anexo:

- MAE-OPAP-2012-2133/14/11/12

Copia:

Señoría  
Karen Rocas López-Lora  
Secretaría - Dirección Provincial del Ambiente de Pastaza

Señor Ingeniero  
Carlos Alberto León Lora  
Técnico de la Unidad de Calidad Ambiental - Dirección Provincial del Ambiente de Pastaza

Atte.



Anexo 2.- Capacitaciones al personal



"CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FÚTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CESPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

REGISTRO DE INDUCCION / ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIONES

Forma de impartir conocimiento:  Inducción  capacitación  adiestramiento

Fecha: 11 de enero







Horario:

Nombre del instructor: Johnny Fonseca

Firma: 

TEMAS TRATADOS:

- \* Buenas Practicas ambientales
- \* Socialización del Plan de Manejo Ambiental
- \* Manejo de Extintores

N	Nombre del participante	Cargo/ actividad	Firma	Observaciones
1	Alex Nuñez	Obrero		
2	Deilis Sanchez	Obrero		
3	Dario Nuñez	Obrero		
4	Diego Leon	Residente		
5	Cristian Pina	Topografo		
6	Estefania Parra	Técnica Seguridad		
7				
8				
9				
10				
11				
12				

"CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE  
 FUTBOL PROFESIONAL  
 REGLAMENTARIO DE CÉSPED  
 SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA  
 TARQUI CANTÓN PASTAZA,  
 PROVINCIA DE PASTAZA"

**REGISTRO DE INDUCCION /  
 ADIESTRAMIENTO Y  
 CAPACITACIONES**

Forma de impartir conocimiento:  Inducción  capacitación  adiestramiento

Fecha: 10 de enero del 2023

Horario: 07:00 a 09:00

Nombre del instructor: Estefania Parra

Firma: *[Firma]*

TEMAS TRATADOS:

\* Normas de Seguridad en el Trabajo

\*

N	Nombre del participante	Cargo/ actividad	Firma	Observaciones
1	Alex Nñez	Obrero	<i>[Firma]</i>	
2	Beils Sanchez	Obrero	<i>[Firma]</i>	
3	Dara Nñez	Obrero	<i>[Firma]</i>	
4	Diego Leon	Residente	<i>[Firma]</i>	
5	Cristian Parra	Topografo	<i>[Firma]</i>	
6	Johnny Fonseca	Tecnico Amb	<i>[Firma]</i>	
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Anexo 3.- Área del campamento



Anexo 4.- Área de estacionamiento, cocina y comedor del campamento.

4.1.- Estacionamiento de vehículos



4.2.- Área de cocina



4.3.- Área de comedor para los trabajadores.



4.4.- servicios higiénicos para los trabajadores



4.5.- Área de bodega



Anexo 5.- Aguas servidas conectadas al sistema de alcantarillado de la parroquia Tarqui.





Anexo 6.- Extintor y botiquín al alcance de los trabajadores



Anexo 7.- Área del jefe de proyectos y técnico.



Anexo 8.- Reglamento interno de los trabajadores en proceso de aprobación.



Jhonny Fonseca <jhonnyfonseca3@gmail.com>

**RV: Registro de Usuario - MDT**

Diego Leon Sanabria <consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es>  
Para: "Jhonnyfonseca3@gmail.com" <jhonnyfonseca3@gmail.com>

30 de enero de 2023, 07:52

De: Ministerio del Trabajo <contratos@trabajo.gob.ec>  
Enviado: sábado, 28 de enero de 2023 11:41  
Para: consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es <consorcio\_estadio\_tarqui@outlook.es>  
Asunto: Registro de Usuario - MDT

Sr(a). Representante legal:

De la empresa CONSORCIO ESTADIO TARQUI,

Por medio de la presente nos ponemos en contacto con usted, para informarle que hemos registrado la Empresa CONSORCIO ESTADIO TARQUI en el sistema del Ministerio del Trabajo.

Para acceder a los servicios ofrecidos por el sistema debe confirmar su registro en el siguiente enlace [Confirmación](#)

Si tiene cualquier duda no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del funcionario de su ciudad [http://www.relacioneslaborales.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/FUNCIONARIOS\\_SOPORTE.pdf](http://www.relacioneslaborales.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/FUNCIONARIOS_SOPORTE.pdf)

**MINISTERIO DEL TRABAJO**

QUITO ECUADOR

Av. República del Salvador y Suiza

Anexo 9.- Estacionamiento de la maquinaria



Anexo 10.- Uso del EPP con la debida señalética para precautelar su seguridad.







ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

"CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL  
REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA  
TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

Fecha:

N.-	NOMBRE Y APELLIDO	Cedula	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL								RECIBI CONFORME									
			BOTAS		CASCO		CHALECO		GAFAS											
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO										
1	Alex Muñoz	160045406	✓		✓		✓													
2	Doris Sanchez	160033574-0	✓		✓		✓													
3	Dario Nñez	1600520402	✓		✓		✓													
4	Diego Leon	1000273112	✓		✓		✓													
5	Cristian Parra	1600419317	✓		✓		✓													
6	Johany Fonseca	1600671976	✓		✓		✓													
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				

OBSERVACIONES:

Ing. Cristian Parra

CONTRATISTA

Anexo 11.- Acta de conformidad para el desalojo de material de excavación.

ACTA DE CONFORMIDAD

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Fecha: 20 de enero del 2023

Lugar: Comuna san jacinto, parroquia Tarqui, provincia de Pastaza

Yo Edwin Bujás con CI. 1600289220 propietario de un terreno ubicado en la comuna san jacinto, autorizo al contratista **CONSORCIO TARQUI** la ejecución de las siguientes actividades en dicha propiedad.

Actividades:

- Desalojo de material de excavación


Doy conformidad de los trabajos realizados y necesarios para llevar a cabo la correcta ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Contratista  
  
CONSORCIO TARQUI  
RUC: 1691728994001

PROPIETARIO  
  
CI: 1600289220



Anexo 12.- Lona protectora sobre el material pétreo.

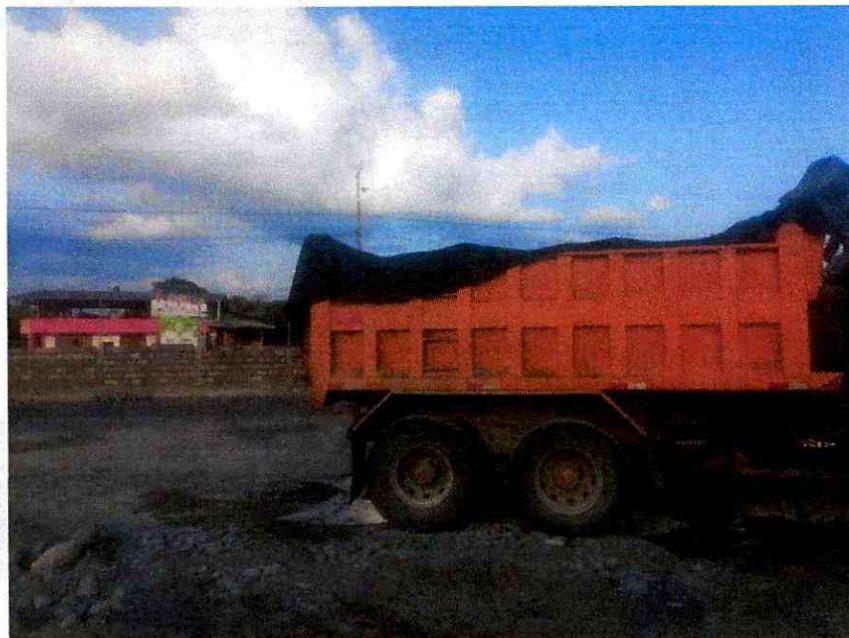

Anexo 13.- Tachos para la recolección de residuos



Anexo 14 .- Depósito de residuos en el contenedor más cercano al proyecto al final del día para su disposición final.



Anexo 15.- Almacenamiento temporal de residuos para su reutilización



## INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PMA

<b>PROYECTO:</b>	"CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"		
<b>CONTRATANTE</b>	CONSEJO PROVINCIAL PASTAZA	<b>PROVINCIA</b>	PASTAZA
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO TARQUI	<b>CANTON</b>	PUYO
<b>CONTRATO</b>	COTO-GADPPZ-017-2022	<b>COD. MAE</b>	MAE-DPAP-2012- 168
<b>RESPONSABLE:</b>	ING. CRISTIAN PARRA	<b>FECHA:</b>	15/01/2023
<b>ASUNTO:</b>	INSPECCIÓN VISUAL DE SILENCIADORES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		

### 1.- ANTECEDENTES

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza como operador del proyecto, busca mejorar la calidad de vida de la población que se encuentra asentada en el área del proyecto y de este modo aportar a la economía del sector generando nuevas fuentes de empleo locales. De esta manera el GAD de Pastaza realiza la adjudicación del proceso de LICITACION DE OBRA COTO-GADPPZ-017-2022 para la "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL REGLAMENTARIO DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

### 2.- OBJETIVO

- Dar cumplimiento a las medidas propuestas en el PMA

### 3.- ALCANCE DEL INFORME

Registrar las actividades ejecutadas en base a las medidas propuestas en el PMA

En lo que respecta la fase de operación y mantenimiento se presenta una actividad en lo que respecta al PMA , En el caso de las emisiones gaseosas, se recomienda utilizar maquinaria en buen estado mecánico para evitar la contaminación.

### 4.- DESCRIPCION FOTOGRAFICA



Los vehiculos y maquinaria cuentan con sus respectivos silenciadores en buen estado




Anexo 17.- Revisión visual de los vehículos

### REVISIÓN VISUAL DE VEHÍCULOS

<b>EMPRESA:</b>	Consortio Tarqui	<b>FECHA:</b>	3/01/2023
<b>TIPO DE VEHÍCULO:</b>	Volqueta		
<b>MARCA:</b>	Hino		
<b>MODELO:</b>	2009		
<b>MATRÍCULA:</b>	HBA-3011	<b>COLOR:</b>	Blanco
<b>CONDUCTOR HABITUAL:</b>	Ivan Vargas		




	Fecha inspección:	Fecha inspección:	Fecha inspección:
	09/01/2023	16/01/2023	23/01/2023
<b>Revisión de niveles de líquidos</b>			
<b>Aceite</b>	<input checked="" type="checkbox"/> max <input type="checkbox"/> med <input type="checkbox"/> min	<input checked="" type="checkbox"/> max <input type="checkbox"/> med <input type="checkbox"/> min	<input checked="" type="checkbox"/> max <input type="checkbox"/> med <input type="checkbox"/> min
<b>Líquido del limpiaparabrisas</b>	<input type="checkbox"/> max <input type="checkbox"/> med <input type="checkbox"/> min	<input checked="" type="checkbox"/> max <input type="checkbox"/> med <input type="checkbox"/> min	<input checked="" type="checkbox"/> max <input type="checkbox"/> med <input type="checkbox"/> min
<b>Refrigerante</b>	<input checked="" type="checkbox"/> max <input type="checkbox"/> med <input type="checkbox"/> min	<input checked="" type="checkbox"/> max <input type="checkbox"/> med <input type="checkbox"/> min	<input checked="" type="checkbox"/> max <input type="checkbox"/> med <input type="checkbox"/> min
<b>Líquido de Freno</b>	<input type="checkbox"/> max <input type="checkbox"/> med <input type="checkbox"/> min	<input checked="" type="checkbox"/> max <input type="checkbox"/> med <input type="checkbox"/> min	<input checked="" type="checkbox"/> max <input type="checkbox"/> med <input type="checkbox"/> min
<b>Líquido de Dirección Asistida</b>	<input type="checkbox"/> max <input type="checkbox"/> med <input type="checkbox"/> min	<input checked="" type="checkbox"/> max <input type="checkbox"/> med <input type="checkbox"/> min	<input checked="" type="checkbox"/> max <input type="checkbox"/> med <input type="checkbox"/> min
<b>Revisión de los Neumáticos</b>			
<b>Presión de los neumáticos</b>	<input type="checkbox"/> correcta <input type="checkbox"/> incorrecta	<input checked="" type="checkbox"/> correcta <input type="checkbox"/> incorrecta	<input checked="" type="checkbox"/> correcta <input type="checkbox"/> incorrecta
<b>Desgaste de la banda de Rodadura de los neumáticos</b> <small>La profundidad mínima legal es de 1,6 mm, se recomienda cambio al llegar a 2,0 mm</small>	<input type="checkbox"/> alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> bajo <input type="checkbox"/> anormal	<input type="checkbox"/> alto <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> bajo <input type="checkbox"/> anormal	<input type="checkbox"/> alto <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> bajo <input type="checkbox"/> anormal
<b>Rueda de repuesto</b> Ubicación: <u>Valde Volqueta</u>	<b>Presión</b>	<input checked="" type="checkbox"/> correcta <input type="checkbox"/> incorrecta	<input checked="" type="checkbox"/> correcta <input type="checkbox"/> incorrecta
	<b>Banda rodadura</b>	<input checked="" type="checkbox"/> correcta <input type="checkbox"/> incorrecta	<input checked="" type="checkbox"/> correcta <input type="checkbox"/> incorrecta
<b>Gato hidráulico y herramientas</b> Ubicación: <u>Cabina</u>	<input checked="" type="checkbox"/> correcto <input type="checkbox"/> incorrecto	<input checked="" type="checkbox"/> correcto <input type="checkbox"/> incorrecto	<input checked="" type="checkbox"/> correcto <input type="checkbox"/> incorrecto
<b>Chaleco Reflectante.</b> Nº: <u>1</u> Ubicación: <u>Cabina</u>	<input checked="" type="checkbox"/> correcto <input type="checkbox"/> incorrecto	<input checked="" type="checkbox"/> correcto <input type="checkbox"/> incorrecto	<input checked="" type="checkbox"/> correcto <input type="checkbox"/> incorrecto
<b>Triángulos de Emergencia.</b> Nº: <u>1</u> Ubicación: <u>Valde Volqueta</u>		<input checked="" type="checkbox"/> correcto <input type="checkbox"/> incorrecto	<input checked="" type="checkbox"/> correcto <input type="checkbox"/> incorrecto

	Fecha inspección:	Fecha inspección:	Fecha inspección:
	09/01/2023	16/01/2023	23/01/2023
<b>Revisión del Alumbrado</b>			
Faros delanteros	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo
Luces de intermitentes	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo
Luces de freno y marcha atrás	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo
Juego de lámparas de repuesto.	<input checked="" type="checkbox"/> correcto <input type="checkbox"/> incorrecto	<input checked="" type="checkbox"/> correcto <input type="checkbox"/> incorrecto	<input checked="" type="checkbox"/> correcto <input type="checkbox"/> incorrecto
Ubicación: <u>Cabina</u>	<input type="checkbox"/> incorrecto	<input type="checkbox"/> incorrecto	<input type="checkbox"/> incorrecto
<b>Estado de los Limpiaparabrisas</b>			
Limpiaparabrisas <i>Limpiar con un paño las escobillas con periodicidad mensual.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo	<input type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo
<b>Aspecto del vehículo</b>			
Aspecto interior (tapicería, cinturones, reposacabezas...) <i>Identificar en su caso incidencias.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo
Aspecto exterior (chapa, pintura...) <i>Identificar en su caso incidencias.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo
<b>Observaciones y cierre:</b>			
Observaciones	Ninguna	Ninguna	Ninguna
Persona que ha realizado la inspección:	Johanny Fonseca	Johanny Fonseca	Johanny Fonseca
Firma			

## REVISIÓN VISUAL DE VEHÍCULOS

**EMPRESA:** Consorcio Tarqui **Fecha:** 31/01/2023  
**TIPO DE VEHÍCULO:** Volquete  
**MARCA:** Hino  
**MODELO:** 2009  
**MATRÍCULA:** SBB-0506 **COLOR:** Amarillo  
**CONDUCTOR HABITUAL:** Jose Paredes

	Fecha inspección:	Fecha inspección:	Fecha inspección:
	<u>09/01/2023</u>	<u>16/01/2023</u>	<u>23/01/2023</u>
<b>Revisión de niveles de líquidos</b>			
<b>Aceite</b>	<input type="checkbox"/> max <input type="checkbox"/> med <input type="checkbox"/> min	<input checked="" type="checkbox"/> max <input type="checkbox"/> med <input type="checkbox"/> min	<input checked="" type="checkbox"/> max <input type="checkbox"/> med <input type="checkbox"/> min
<b>Líquido del limpiaparabrisas</b>	<input type="checkbox"/> max <input type="checkbox"/> med <input type="checkbox"/> min	<input checked="" type="checkbox"/> max <input type="checkbox"/> med <input type="checkbox"/> min	<input checked="" type="checkbox"/> max <input type="checkbox"/> med <input type="checkbox"/> min
<b>Refrigerante</b>	<input checked="" type="checkbox"/> max <input type="checkbox"/> med <input type="checkbox"/> min	<input checked="" type="checkbox"/> max <input type="checkbox"/> med <input type="checkbox"/> min	<input checked="" type="checkbox"/> max <input type="checkbox"/> med <input type="checkbox"/> min
<b>Líquido de Freno</b>	<input type="checkbox"/> max <input type="checkbox"/> med <input type="checkbox"/> min	<input checked="" type="checkbox"/> max <input type="checkbox"/> med <input type="checkbox"/> min	<input checked="" type="checkbox"/> max <input type="checkbox"/> med <input type="checkbox"/> min
<b>Líquido de Dirección Asistida</b>	<input type="checkbox"/> max <input type="checkbox"/> med <input type="checkbox"/> min	<input checked="" type="checkbox"/> max <input type="checkbox"/> med <input type="checkbox"/> min	<input checked="" type="checkbox"/> max <input type="checkbox"/> med <input type="checkbox"/> min
<b>Revisión de los Neumáticos</b>			
<b>Presión de los neumáticos</b>	<input checked="" type="checkbox"/> correcta <input type="checkbox"/> incorrecta	<input checked="" type="checkbox"/> correcta <input type="checkbox"/> incorrecta	<input checked="" type="checkbox"/> correcta <input type="checkbox"/> incorrecta
<b>Desgaste de la banda de Rodadura de los neumáticos</b> <small>La profundidad mínima legal es de 1,6 mm, se recomienda cambio al llegar a 2,0 mm</small>	<input type="checkbox"/> alto <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> bajo <input type="checkbox"/> anormal	<input type="checkbox"/> alto <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> bajo <input type="checkbox"/> anormal	<input type="checkbox"/> alto <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> bajo <input type="checkbox"/> anormal
<b>Rueda de repuesto</b> <b>Ubicación:</b> <u>Valde</u>	<b>Presión</b>	<input checked="" type="checkbox"/> correcta <input type="checkbox"/> incorrecta	<input checked="" type="checkbox"/> correcta <input type="checkbox"/> incorrecta
	<b>Banda rodadura</b>	<input checked="" type="checkbox"/> correcta <input type="checkbox"/> incorrecta	<input checked="" type="checkbox"/> correcta <input type="checkbox"/> incorrecta
<b>Gato hidráulico y herramientas</b> <b>Ubicación:</b> <u>Cabina</u>	<input checked="" type="checkbox"/> correcto <input type="checkbox"/> incorrecto	<input checked="" type="checkbox"/> correcto <input type="checkbox"/> incorrecto	<input checked="" type="checkbox"/> correcto <input type="checkbox"/> incorrecto
<b>Chaleco Reflectante.</b> <b>N°:</b> <u>1</u> <b>Ubicación:</b> <u>Cabina</u>	<input checked="" type="checkbox"/> correcto <input type="checkbox"/> incorrecto	<input checked="" type="checkbox"/> correcto <input type="checkbox"/> incorrecto	<input checked="" type="checkbox"/> correcto <input type="checkbox"/> incorrecto
<b>Triángulos de Emergencia.</b> <b>N°:</b> <u>1</u> <b>Ubicación:</b> <u>Valde</u>		<input type="checkbox"/> correcto <input type="checkbox"/> incorrecto	<input type="checkbox"/> correcto <input type="checkbox"/> incorrecto

	Fecha Inspección:	Fecha Inspección:	Fecha Inspección:
	09/01/2023	16/01/2023	23/01/2023
<b>Revisión del Alumbrado</b>			
Faros delanteros	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo
Luces de intermites	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo
Luces de freno y marcha atrás	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo
Juego de lámparas de repuesto.	<input checked="" type="checkbox"/> correcto <input type="checkbox"/> incorrecto	<input checked="" type="checkbox"/> correcto <input type="checkbox"/> incorrecto	<input checked="" type="checkbox"/> correcto <input type="checkbox"/> incorrecto
Ubicación: <u>Cabina</u>			
<b>Estado de los Limpiaparabrisas</b>			
Limpiaparabrisas <i>Limpiar con un paño las escobillas con periodicidad mensual.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo
<b>Aspecto del vehículo</b>			
Aspecto interior (tapicería, cinturones, reposacabezas...).	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo
<i>Identificar en su caso incidencias.</i>			
Aspecto exterior (chapa, pintura,...)	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo	<input checked="" type="checkbox"/> óptimo <input type="checkbox"/> no óptimo
<i>Identificar en su caso incidencias.</i>			
<b>Observaciones y cierre:</b>			
Observaciones			
Persona que ha realizada la inspección:	Johanny Fonseca	Johanny Fonseca	Johanny Fonseca
Firma			

Anexo 18.-Factura de mantenimiento de la maquinaria

**NO TIENE LOGO**

IBARRA LOPEZ CARLOS WILINTON

Dirección Calle: SN Número: SN Intersección: SN

Dirección Calle: SN Número: SN Intersección: SN

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0603507138001

FACTURA

No. 001-100-000000003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
2601202301060350713800120011000000000039704133411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/01/2023 14:13:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2601202301060350713800120011000000000039

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ESTADIO TARQUI

Identificación: 1691728994001

Fecha: 26/01/2023 Placa / Matrícula: null Gula

Dirección: PUYO, BARRIO MIRAFLORES

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuento	Precio Total
01		1.00	REPARACION DE MOTOR DE VOLQUETA HINO FM500		1224.14	0.00	0.00	1224.14

Información Adicional

Teléfono: 094588015

Email: consorcio\_estadio\_tarqui@bolivia.net

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1371.04

SUBTOTAL 12%	1224.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1224.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	146.90
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IREP/R	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1371.04

AHORRO POR SUBSIDIO  
(Incluye IVA cuando)

Anexo 19.- Licencias de conducir vigentes

**LICENCIA DE CONDUCIR**  
Estado: 1. Ecuador - Categoría: 01. Automóvil - Permisos de conducción: 2. Conducir



REPUBLICA DEL ECUADOR

1. VARGAS CADENA  
 2. IVAN KLEVER  
 3. 01 10 1977 / ECUADOR  
 4a. 02 12 2018 4b. 02 12 2023  
 5. PLAZO, BARRIO MEXICO

6. M 7. NINGUNA

1600355125

9. 005 - SEÑORES

Agencia Nacional de Tránsito

*4. Autorización No.	10	11	12	13
15. NINGUNA *****				
1. Apellido / Surname	A	*****	*****	PARTICULAR
2. Nombre / Name	A1	*****	*****	COMERCIAL
3. Nacimiento / Born	B	26-SEP-96	02-DIC-23	PARTICULAR
4a. Válido desde / Valid from	C1	*****	*****	ESPECIAL
4b. Válido hasta / Valid until	C	*****	*****	COMERCIAL
5. Dirección / Address	D1	*****	*****	BOQUERON
6. Sexo / Sex	D	*****	*****	PASAJEROS
7. Restricción / Restriction	E1	ESPECIAL	*****	ESPECIAL
8. Licencia # / ID Card	E	26-SEP-96	02-DIC-23	PESADO
9. Expedido por / Issued by	F	*****	*****	DESCAPAC.
10. Categoría / Category	G	*****	*****	APAC. VEH.
11. Emisión tra. vez / Iss. Newed				
12. Válido hasta / Valid until				
13. Obs. / Obs				
14. Donante órganos / Organ donor				
15. Escuela / School				

FIRMA AUTORIZADA

28090577

**LICENCIA DE CONDUCIR**





**REPÚBLICA DEL  
ECUADOR**



**L. RANGEL CHAVEZ**  
**Z. JOSE ANTONIO**  
 1.13-03-1965 / ECUADOR  
 Aa 12-09-2019    Bb 01-08-2024  
 X PUNTO: BARRIO EL  
 HORADO, CALLE NARD Y ROMANA  
 C. 58 - 1 829071284

Agencia Nacional de Tránsito




1600211153
6 MCS - RFLUNA

<b>14. Autorización No.</b>				
<b>15. IDENTIFICACION</b>				
<b>1. Apellido / Surname</b>	<b>A</b>	*****	*****	<b>PUEBLOJA</b>
<b>2. Nombre / Name</b>	<b>AI</b>	*****	*****	<b>CHIMBIZO</b>
<b>3. Nacimiento / Birth</b>	<b>M</b>	19-03-65	16-03-65	<b>MANABU</b>
<b>4b. Válido hasta / Valid until</b>	<b>CI</b>	*****	*****	<b>REINSA</b>
<b>5. Dirección / Address</b>	<b>O</b>	*****	*****	<b>CHIMBIZO</b>
<b>6. Sexo / Sex</b>	<b>DI</b>	*****	*****	<b>REINSA</b>
<b>7. Residencia / Residency</b>	<b>D</b>	*****	*****	<b>REINSA</b>
<b>8. Licencia S/ID Card</b>	<b>ES</b>	*****	*****	<b>REINSA</b>
<b>9. Expedido por / Issued by</b>	<b>R</b>	12-2019	10-08-19	<b>REINSA</b>
<b>10. Categoría / Category</b>	<b>F</b>	*****	*****	<b>REINSA</b>
<b>11. Emisión Int. var / Int. Issued</b>	<b>D</b>	*****	*****	<b>REINSA</b>
<b>12. Válido hasta / Valid until</b>				
<b>13. Cita / Cite</b>				
<b>14. Donante Orgánico / Organ donor</b>				
<b>15. Escuela / School</b>				

FORMA AUTORIZADA    0004554152    IGM-10-09-258-05    25826140

Anexo 20.- Permiso de movilización

### Autorización de movilización


Yo Cristian Fernando Parra Ushca representante legal del **CONSORCIO TARQUI** con ruc 1691728994001, autoriza la movilización de las volquetas que fueron arrendadas en la etapa contractual a realizar las diferentes actividades.

- TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO
- TRANSPORTE DE MATERIAL DE DESALOJO

EQUIPOS	PLACA	FECHA DE FABRICACION	CARACTERISTICAS
Volquete	HBA- 3011	2009	CAPACIDAD 10 M3
Volquete	SBD-0506	2009	CAPACIDAD 10 M3
Volquete	PCL - 7951	2015	CAPACIDAD 10 M3

Con el fin de contribuir al desarrollo el proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FÚTBOL PROFESIONAL, REGLAMENTARIO DE CESPED SINTÉTICO PARA LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."**

Atentamente



Señor:

Ing. Cristian Fernando Parra Ushca  
Representante legal del Consorcio Estadio Tarquí

Anexo 21.- Vehículos directos o indirectos que trabajan en el proyecto con lo indispensable en caso de alguna emergencia.



Anexo 22.- Área despejada para la movilización de la maquinaria



Anexo 23.- Facturas de consumo de combustible.

ESTACION DE SERVICIO PUYO  
 PACHECO PACHECO HUGO VICENTE  
 0500511027001  
 AV. ALBERTO ZAMBRANO 7 AMAZONAS  
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

N.º FACTURA: 001-003-001206160  
 Intero: 219259  
 RUC: 0500191736001  
 Placa: TB37405  
 Cliente: PADOVA CASTRO FERNANDO RAMIRO  
 Fecha: 29/01/2023 15:05:44

Descripcion	Cant.	P. Unit.	P. Total
DIESEL PREM	22.858	1.562	35.711

Punto de Carga: 08  
 Manguera: 01

SubTotal: \$ 35.71  
 IVA: \$ 4.29  
 Total: \$ 40.00

\$27.57 Monto equivalente al subsidio  
 \$67.57 Valor Total sin subsidio  
 Transacción: 2479695  
 Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FI  
 NANCIERO  
 C.AVE DE ACCESO SRI  
 31012023019001110270012011005001206160123  
 4367816  
 Vendedor: INENE ELIZABETH HARVAEZ ZAMBRANO

Se factura / registrar email en:  
 www.factind.com  
 Usuario/Clave: 1600191736001

*Ronco Reyes*

**Estación de Servicio "PUYO"**  
 Dirección: Av. Circunvalación y Amazonas  
 Teléfono: 2530-005 RUC: 0500511027001

Puyo, 28 Enero del 2023.

Señor: Fernando Proño (TB37405)

Cant.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Súper SP.		
	Gasolina Extra		
	Diesel 2	408	408
	Lubricantes		
	Líquido de Frenos		
	Filtros, Grasas		
	<b>TOTAL</b>		<b>408</b>

Son: Cuarenta dólares.

Gracias, estamos a su servicio las 24 horas

*[Firma]*  
 FIRMA

ESTACION DE SERVICIO PUYO  
 PACHECO PACHECO HUGO VICENTE  
 0500511027001  
 AV. ALBERTO ZAMBRANO 7 AMAZONAS  
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

N.º FACTURA: 001-003-001206256  
 Intero: 216350  
 RUC: 0500191736001  
 Placa: DA11281  
 Cliente: BARRA PARRA SEGUNDO CARLOS  
 Fecha: 31/01/2023 9:13:56

Descripcion	Cant.	P. Unit.	P. Total
DIESEL PREM	26.175	1.562	40.898

Punto de Carga: 07  
 Manguera: 01

SubTotal: \$ 40.90  
 IVA: \$ 4.91  
 Total: \$ 45.81

\$21.57 Monto equivalente al subsidio  
 \$77.38 Valor Total sin subsidio  
 Transacción: 2411830  
 Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FI  
 NANCIERO  
 C.AVE DE ACCESO SRI  
 3101202301900111027001202011005001206256123  
 4367816  
 Vendedor: WILLIAN RICARDO PRADO MENESES

Se factura / registrar email en:  
 www.factind.com  
 Usuario/Clave: 060194219001

*[Firma]*

**Estación de Servicio "PUYO"**  
 Dirección: Av. Circunvalación y Amazonas  
 Teléfono: 2530-005 RUC: 0500511027001

Puyo, 30 Enero del 2023.

Señor: Carlos Ibarra (DA11281)

Cant.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Súper SP.		
	Gasolina Extra		
	Diesel 2	508	508
	Lubricantes		
	Líquido de Frenos		
	Filtros, Grasas		
	<b>TOTAL</b>		<b>508</b>

Son: Seiscientos dólares

Gracias, estamos a su servicio las 24 horas

*[Firma]*  
 FIRMA

**ESTACION DE SERVICIO PUYO**  
**PACHECO PACHECO HUGO VICENTE**  
 0500511027001  
 AV. ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS  
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Nº. FACTURA: 011-005-001206772  
 Cód. Interno: 236124  
 CI/RUC: 0500511027001  
 Placa: PC 7951  
 Cliente: CRISTIAN PARRA  
 Fecha: 30/01/2023 6:57:01

Descripción	Cant.	P. Unit.	P. Total
DIESEL PREM	23.570	1.562	36.811

Punto de carga: 08  
 Manguera: 01

SubTotal: \$ 44.64  
 IVA: \$ 5.36  
 Total: \$ 50.00

\$34.46 Monto equivalente al subsidio  
 \$54.46 Valor total sin subsidio  
 Transacción: 2400311  
 Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FI  
 NANCIERO  
 CLAVE DE ACCESO SRI  
 001202301950511027001201100500120677223  
 4567815  
 Vendedor: MISELL MONICA BELARNO CHIMBO

Se factura / registrar emit en:  
 www.factmd.com  
 Usuario/Clave: 1600415317101

**Estación de Servicio "PUYO"**  
 Dirección: Av. Circunvalación y Amazonas  
 Teléfono: 2530-005 RUC: 0500511027001

Puyo, 30 Enero del 2023

Señor: Doña Gómez (PCL 7951)

Cant.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Súper SP.		
	Gasolina Extra		
	Diesel 2	508	508
	Lubricantes		
	Líquido de Frenos		
	Filtros, Grasas		
	<b>TOTAL</b>		<b>508</b>

Señor: Cinuenta dólares

Gracias, estamos a su servicio las 24 horas

*[Firma]*  
 FIRMA

**ESTACION DE SERVICIO PUYO**  
**PACHECO PACHECO HUGO VICENTE**  
 0500511027001  
 AV. ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS  
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

FACTURA: 011-005-001203418  
 Cód. Interno: 269020  
 CI/RUC: 0500511027001  
 Placa: DX 5143  
 Cliente: WILLIAN RICARDO PARRANO MENDEZ  
 Fecha: 27/01/2023 16:31:13

Descripción	Cant.	P. Unit.	P. Total
DIESEL PREM	22.855	1.562	35.711

Punto de carga: 07  
 Manguera: 01

SubTotal: \$ 35.71  
 IVA: \$ 4.29  
 Total: \$ 40.00

\$27.57 Monto equivalente al subsidio  
 \$67.57 Valor total sin subsidio  
 Transacción: 2476936  
 Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FI  
 NANCIERO  
 CLAVE DE ACCESO SRI  
 2701202301950511027001201100500120341823  
 4567814  
 Vendedor: WILLIAN RICARDO PARRANO MENDEZ

Se factura / registrar emit en:  
 www.factmd.com  
 Usuario/Clave: 1600286940101

*[Firma]*

**Estación de Servicio "PUYO"**  
 Dirección: Av. Circunvalación y Amazonas  
 Teléfono: 2530-005 RUC: 0500511027001

Puyo, 27 Enero del 2023

Señor: Carmona

Cant.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Súper SP.		
	Gasolina Extra		
	Diesel 2		
	Lubricantes		
	Líquido de Frenos		
	Filtros, Grasas		
	<b>TOTAL</b>		<b>508</b>

Señor: Cinuenta dólares

Gracias, estamos a su servicio las 24 horas

*[Firma]*  
 FIRMA

SHOT ON REDMI 9
