

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 176

Fecha: 27/01/2023

Asiento N° 327

Compromiso N° 119

Retención N° 001-010-000020574

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210014

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **CONSORCIO MICH**

USD 14,994.57

LA SUMA DE: **CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO Dolares 57/100 CtvS**

PUYO, 27 de Enero del 2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO MICH.- PAGO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N3 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N 3 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE VAIRAS VIAS, MURO DE PROTECCION SECTOR AMURISAP Y SECTOR BAÑEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

Usuario: ALE

DOCUMENTOS				
Fecha	Documento	No	Autorización	Valor
26/01/2023	FACTURA	001100000000003	038356100913	28,541.10

DOCUMENTOS BANCARIOS		
No	Beneficiario	Valor
CTA 3001538914	CONSORCIO MICH	14,994.57
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		14,994.57

APLICACION CONTABLE			
Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IVA	3,057.97	
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIK	10,042.61	
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	25,483.13	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	25,037.18	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		14,994.57
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	10,042.61	
1.2.4.97.08.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTER. DE GAD'S Y EMPR. PÚBL. C	10,042.61	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS		25,037.18
2.1.3.75.01.112	IMPUESTO A LA RENTA 1.75%		445.95
2.1.3.81.14.001	CXP IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI		3,057.97
SUMAN o PASAN USD		63,620.89	63,620.89

APLICACION PRESUPUESTARIA			
Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS		25,483.13	25,037.18
TOTAL GASTOS USD	0.00	25,483.13	25,037.18

01.01.A100.114.380108.000.000 DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTEI	10,042.61	10,042.61	
TOTAL INGRESOS USD	10,042.61	10,042.61	

ING. JAIME GUEVARA B.
Prefecto Provincial

ING. JOSE MARIN
Director Financiero E

LCDA. MARILU ORDOÑEZ
Contadora General

ING. JORGE L.
Tesore

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 176

Fecha: 27/01/2023

Asiento N° 327

Compromiso N° 119

Retención N° 001-010-000020574

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210014

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **CONSORCIO MICH**

USD 14,994.57

LA SUMA DE: **CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO Dolares 57/100 Ctvs**

PUYO, 27 de Enero del 2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO MICH.- PAGO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N3 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N 3 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE VAIRAS VIAS, MURO DE PROTECCION SECTOR AMURISAP Y SECTOR BAÑEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

Usuario: ALE

ING. JAIME GUEVARA B.
Prefecto Provincial

TLGO. JOSE MARIN
Director Financiero E


LCDA. MARILU ORDOÑEZ
Contadora General

ING. JORGE LOPEZ
Tesoro

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Compromiso No: 119

Transacción No: 697

Fecha: 27/01/2023

Proveedor: CONSORCIO MICH

Identificación: Ruc 1691728943001

DETALLE:

CONSORCIO MICH.- PLANILLA DE AVANCE No. 3, REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLAN No. 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE VAIRAS VIAS, MURO DE PROTECCION SECTOR AMURISAP Y SECTOR BAÑEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

RIGO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	25,483.13	4,087,172.39
Total =>	25,483.13	4,087,172.39




FRANCISCO RIGOBERTO
GREFA RIVADENEYRA

Subdirector Financiero

27/01/2023 11:08

Página 1/1



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 2-2-2023

Hora: 11:8:19

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: LOPEZ PAREDES JORGE RODRIGO 1210014

Num. Ced o Ruc:1691728943001

Institución Pública: GAD PROV PASTAZA						# Cta.: 1210014		
Fecha de Transferencia : 2023-02-01 00:00:00.0								
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	# Ced.Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado	Observacion
BANECUADOR B.P.	3001538914	14,994.57	1691728943001	CONSORCIO MICH	1	01-02-2023 17:50:48	ACREDITADA	COMPROBANTE DE PAGO 176
Total:		14,994.57	Reg.:1					

[Atrás](#)

44



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
Dirección: Francisco de Orellana y 27 de Febrero

Teléfono: 032885380 / Fax: 032886179

E-mail: financiero@pastaza.gob.ec

Web: www.pastaza.gob.ec

Contribuyente Especial: 590

RUC: 1660000170001

COMPROBANTE DE RETENCION

Nº 001-010-000020574

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2701202307166000017000120010100000205741438928215

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

31/01/2023 10:14:36

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2701202307166000017000120010100000205741438928215

Razon Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO MICH

RUC/CI: 1691728943001

Fecha Emisión: 27 de Enero del 2023

Guía de Remisión:

Número de Documento	Cód. SRI	Descrip. Reten.	% Reten.	Base Retención	Valor Retenido
001-100-000000003	346	1.75% IMPUESTO A LA RENTA	1.75	25,483.13	445.95
001-100-000000003	731	100% SRI RESOLUCION 074 075	100.00	3,057.97	3,057.97
				Total	3,503.92

Información Adicional:

Dirección:

Teléfono:



CONSORCIO MICH

Dirección Calle: GUAYAQUIL Número: S/N
Intersección: WASHINGTON MASON

Dirección Calle: GUAYAQUIL Número: S/N
Intersección: WASHINGTON MASON

OBLIGADO A LLEVAR

SI

R.U.C.: 1691728943001

FACTURA

No. 001-100-00000003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

260120230116917289430012001100000000038356100913

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 26/01/2023 11:25:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2601202301169172894300120011000000000038

Razón Social / Nombres y

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Identificaci 1660000170001

Fecha 26/01/2023 Placa / null Guía

FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
003PA		1.00	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N 3	Construccion de varias vias, muro de proteccion, sector Amurisap y sector Baneños parroquia Tarqui canton Pastaza provincia de Pastaza	25106.53	0.00	0.00	0.00	25106.53
003RE AJ		1.00	REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N 3	Construccion de varias vias, muro de proteccion, sector Amurisap y sector Baneños parroquia Tarqui canton Pastaza provincia de Pastaza	376.60	0.00	0.00	0.00	376.60

Información Adicional	
Telefono:	2885380
Email:	dfinanciera@pastaza.gov.ec
PLANILLA 3:	CONSTRUCCION DE VARIAS VIAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARGUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, PLANILLA 3

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28541.10

SUBTOTAL 12%	25483.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25483.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3057.97
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28541.10

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando





**Informe de
Cumplimiento
Ambiental**

**Consercio Mich
Dic. 2022**



Planilla 3
Consorcio Mich

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA
CONTROL PREVIO**

		TIPO DE PROCESO		FINANCIERO	
CONTRATISTA:	CONSORCIO MICH.	CONTRATO	PLANILLA	CONTRATO	PLANILLA
DOCUMENTO:	PLANILLA DE AVANCE Nº 3 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE PLANILLA Nº 3		X		
CONCEPTO:	PAGO				
FECHA DEL DOCUMENTO:	19 de enero de 2023				
TIPO DE PROCESO	COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-011-2022				
VALOR INCLUIDO IVA:	\$ 17,293.38	APLICA		APLICA	
	CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS	SI	NO	SI	NO
1	Requerimiento				
2	Estudios del proyecto				
3	Informe técnico y económico				
4	Factibilidad Ambiental				
5	Certificación POA				
6	Certificación Presupuestaria				
7	Convenio				
8	Pliegos del Procedimiento				
9	Informe Técnico de Evaluación de Ofertas				
10	Resolución de Adjudicación				
11	Garantía Original de fiel Cumplimiento del contrato				
12	Garantía Original de Buen Uso del Anticipo				
13	Certificado de no Adeudar al GADPPz				
14	Documentos Personales / Representante Legal				
15	Certificación Bancaria				
16	Certificado de cumplimiento Tributario (SRI)				
17	RUC Actualizado				
18	Contrato original y disposición escrita de trabajo (proceso completo)				
19	Planilla de Avance Nº 3	X			
20	Reajuste Definitivo del Anticipo				
21	Reajuste Provisional de la Planilla de Avance Nº 3	X			
22	Orden de Inicio de Trabajos				
23	Planilla de obra de liquidación				
24	Planilla de obra orden de trabajo				
25	Anexos de Obra	X			
26	Cuadro de Diferencia de Cantidades				
27	Conformidad Ambiental	X			
28	Informe de avance de Obra de Administrador de contrato	X			
29	Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales (IESS) Planilla	X			
30	Libro de obra	X			
31	Acta de recepción provisional				
32	Certificado de no ser obra nueva				
33	Multa				
34	Autorización de la máxima Autoridad para prórroga de Plazos				
35	Autorización de la máxima Autoridad para Rubros Nuevos				
36	Certificado que no es obra nueva				
37	Solicitud de recepción de Obra				
38	Solicitud de pago del Administrador del Contrato	X			
39	Solicitud de pago del Director de la Unidad al Financiero				
40	Factura/Nota de Venta				
41	Validación de la factura/Nota de Venta				
OBSERVACIONES:					
Revisado por:	 Firmado electrónicamente por: EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ		 Firmado electrónicamente por: MERCY JOHANNA QUISHPI CUENCA		
	ING. EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ ADMINISTRADOR DE CONTRATO		DEPARTAMENTO FINANCIERO		

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA**24 ENE 2023**

Fecha:

Pao Pa

Recibido:

Número: 4382 Hora: 15h44

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4382-M

Puyo, 24 de enero de 2023

PARA: Sr. Téc. Jose Mauricio Marin Montero
Director Financiero (E)**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO PLANILLA DE AVANCE N° 03 "CONSTRUCCION DE VARIAS VIAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR AMURISAP Y EN EL SECTOR DE LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA".

En referencia a los documentos: Oficio Nro. 022-CM-2023, de fecha 03 de enero de 2023, suscrito por la licenciada María de Lourdes Calle – Procurador Común Consorcio MICH; y, Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACIÓN-2023-4330-M, de fecha 18 de enero de 2023, suscrito por el ingeniero Robert Quintana – Fiscalizador I; y, Memorando Nro.

GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-6089-M, de fecha 19 de enero de 2023, suscrito por el ingeniero Edwin Gustavo Navas – Fiscalizador 1 (Administrador de Contrato), hago hincapié lo siguiente:

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado 408-17 Administrador del contrato, que indica: *"El administrador del contrato velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sí para lograr el éxito del proyecto.- Es función del administrador del contrato establecer un sistema que evalúe el logro de los objetivos, mediante el cual pueda obtenerse información sobre su estado. Esto con el fin de tomar oportunamente acciones correctivas o para informar a las autoridades de la entidad sobre el desarrollo del proyecto"*

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado **408-18** Jefe de Fiscalización, indica: *"El Jefe de Fiscalización establecerá un sistema para asegurar la correcta ejecución de la obra, mediante el control de la calidad, el avance físico y el avance financiero de la obra. Dichos controles conllevan una evaluación mensual, de los aspectos mencionados y la comunicación de resultados a los mandos superiores, incluyendo los problemas surgidos, especialmente cuando afectan las condiciones pactadas en relación al plazo, presupuesto y calidad de la obra.- El Jefe de Fiscalización, se asegurará de que la obra se ejecute de conformidad con las bases establecidas en los estudios de preinversión, es decir, de acuerdo con el diseño definitivo, las especificaciones y demás normas técnicas aplicables, para lograr obtener del proyecto los beneficios esperados"*.

Con estos antecedentes, adjunto al presente la Planilla de Avance N° 03 (con todos los anexos), del proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**, documentación que ha sido revisada y aprobada por el Administrador de Contrato y Fiscalización; por lo que, en base a los informes anexos, se determina como viable y procedente realizar el pago de \$ 15.440,51 USD (QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 52/100), a



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4382-M

Puyo, 24 de enero de 2023

favor del Consorcio MICH – del cual es Procurador Común la licenciada María de Lourdes Calle, de acuerdo al siguiente detalle:

PLANILLA DE AVANCE N° 03	\$ 25.106,53 USD
ANTICIPO DEVENGADO (-)	\$ 10.042,61 USD
REAJUSTE PROV. PLANILLA AVANCE N° 03	\$ 376,60 USD
VALOR TOTAL	\$ 15.440,52 USD

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Álvaro Renato Sosa Castro
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

Referencias:

- GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-6089-M

Anexos:

- doc_2023-01-06_1.pdf
- informe_de_conformidad_ambiental_001-signed-signed.pdf
- doc_2023-01-06_1_20230106140326685.pdf
- reajuste_planilla_3_afirmado_amurisap-signed-signed.pdf
- planilla_3_afirmado_amurisap-signed-signed-signed.pdf
- memo_planilla_3_afirmado_amurisap-signed.pdf
- informe_fisc_planilla_3_afirmado_amurisap-signed.pdf
- check_list-signed0279935001674076766.pdf
- perfiles_calle_r(pasaje).pdf
- kilo.pdf
- gaviones0546531001674076748.pdf
- anexo_planilla_n.3-signed-signed.pdf
- anexo_fotografico_n.3.pdf
- check_list_calles_amurisap-signed0496990001674146781.pdf
- informe_administrador_calles_de_amurisap-signed0765571001674146781.pdf
- memorando_nro._gadppz-estudios-proyectos-2023-6089-m.pdf

Copia:

Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaría Ejecutiva 2** / Sr. Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña - **Director de Obras Publicas /**

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaría Ejecutiva 2**

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL



Pastaza

Fecha:

Ejecutar el control previo y efectuar
La contabilización, conforme leyes y
Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL



Pastaza

Fecha:

24 ENERO 2023

Ejecutar el control previo al pago
Conforme leyes y reglamentos
Vigentes



Firmado electrónicamente por:
**ÁLVARO RENATO SOSA
CASTRO**



Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-6089-M

Puyo, 19 de enero de 2023

PARA: Sr. Ing. Álvaro Renato Sosa Castro
Director de Fiscalización

ASUNTO: PLANILLA DE AVANCE N° 03 "CONSTRUCCION DE VARIAS VIAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR AMURISAP Y EN EL SECTOR DE LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA".

De mi consideración:

De acuerdo a los Art(s). 70. de la LOSNCP; 121. del RLOSNCP; 408 - 16 y 408 - 17 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS (Acuerdo 039-CG), en lo que refiere a la "ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO", en atribuciones exclusivas y únicas a lo que la Ley señala para mi designación como Administrador de Contrato; en relación al "CONSTRUCCIÓN DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", PROCESO COTO-GADPPz-011-2022 , a la presente fecha una vez que el Ing. Fiscalizador ha procedido a remitir la PLANILLA DE AVANCE N° 3 (\$ 15,063.92), REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 3 (\$ 376.60) correspondiente al mes y periodo desde el 01 de diciembre del 2022 al 31 de diciembre del 2022 con un VALOR LIQUIDO A PAGAR TOTAL de \$ 15,440.52 USD Dólares Americanos SIN I.V.A. (quince mil cuatrocientos cuarenta dólares con cincuenta y dos centavos), una vez revisada la información me permito manifestar la conformidad de la documentación adjunta para su debido proceso.

En virtud de lo expuesto y en cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas en el CONTRATO - CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO, solicito por medio de su persona SE PROCEDA CON EL PAGO de PLANILLA DE AVANCE N° 3 y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 3, a favor del **CONSORCIO MICH.**, Contratista responsable de la obra.

Particular que se comunica para los fines pertinentes.

Firma:

Atentamente,

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN



Pastaza
Fecha:

23 ENE 2023

Recibido:

Número: 6089 Hora: 15:00.

175% = 445.95.11
Ant = 10.042.61.11
Benef = 14.994.57.11



Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-6089-M

Puyo, 19 de enero de 2023

Documento firmado electrónicamente

**Ing. Edwin Gustavo Navas Manjarrez
FISCALIZADOR 1**

Referencias:

- GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4330-M

Anexos:

- doc_2023-01-06_1.pdf
- doc_2023-01-06_1_20230106140326685.pdf
- informe_de_conformidad_ambiental_001-signed-signed.pdf
- anexo_fotografico_n.3.pdf
- anexo_planilla_n.3-signed-signed.pdf
- gaviones0546531001674076748.pdf
- kilo.pdf
- perfiles_calle_r(pasaje).pdf
- check_list-signed0279935001674076766.pdf
- informe_fisc_planilla_3_afirmado_amurisap-signed.pdf
- memo_planilla_3_afirmado_amurisap-signed.pdf
- planilla_3_afirmado_amurisap-signed-signed-signed.pdf
- reajuste_planilla_3_afirmado_amurisap-signed-signed.pdf
- check_list_calles_amurisap-signed0496990001674146781.pdf
- informe_administrador_calles_de_amurisap-signed0765571001674146781.pdf



Firmado electrónicamente por:
**EDWIN GUSTAVO
NAVAS MANJARREZ**

**CONSTRUCCION DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCION EN EL
SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA
TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**

INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA

PLANILLA DE AVANCE Nº 3

Período de Ejecución: 01/12/2022 al 31/12/2022

A) ANTECEDENTES:

Con fecha 21 del mes de septiembre del 2022, el GAD Provincial de Pastaza suscribe con CONSORCIO MICH., el contrato para la ejecución de la obra: "CONSTRUCCION DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Mediante Contrato por COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-011-2022, según CLÁUSULA PRIMERA, se designa al Ing. Edwin Gustavo Navas Manjarrez como Administrador del Contrato de Obra: "CONSTRUCCION DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

B) DATOS GENERALES:

Código del proceso de contratación:	COTIZACION DE OBRA-GADPPz-011-2022
Objeto del contrato:	CONSTRUCCION DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
Monto del contrato:	\$ 185,214.73 USD sin incluir IVA
Fecha de suscripción:	21 de septiembre de 2022
Porcentaje de anticipo:	40%
Monto del anticipo:	\$ 74,085.89 USD
Fecha de inicio de plazo:	13 de octubre de 2022
Fecha de terminación contractual:	11 de enero de 2022
Contratista:	CONSORCIO MICH.
Administrador de Contrato:	Ing. Edwin Gustavo Navas Manjarrez

C) PLAZOS Y AVANCE

C.1 PLAZO DEL CONTRATO

Plazo total inicial: 90 días.

C.2 AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA DE LA PLANILLA

Fecha de aprobación:	
Días de ampliación aprobados:	
Motivación:	

C.3 PARALIZACIONES EN EL MES A PLANILLAR

Fecha de suspensión:	
Fecha de reinicio:	

C.4 REPROGRAMACIONES

No.	Fecha	Motivación
1	13 de octubre de 2022	Reprogramado a la fecha de inicio.

C.5 CONTRATO

No.	Fecha de suscripción	Código de contrato	Monto	Motivación
1	21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-011-2022	\$ 185,214.73 USD sin incluir IVA	

D) DESARROLLO DEL PLANILLAJE DE CONTRATO

PLANILLA N°	MONTO PLANILLADO (\$)	ANTICIPO DEVENGADO (\$)	LIQUIDO A PAGAR EN ESTA PLANILLA
PLANILLA DE AVANCE N° 1	56,145.40	22,458.16	33,687.24
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 1	842.18		
PLANILLA DE AVANCE N° 2	102,514.67	41,005.87	61,508.80
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 2	1,537.72		
PLANILLA DE AVANCE N° 3	25,106.53	10,042.61	15,063.92
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 3	376.60		
TOTAL:	186,523.10	73,506.64	110,259.96

MONTO DE AVANCE ECONOMICO TOTAL (\$)	186,523.10
TOTAL ANTICIPO DEVENGADO	73,506.64
% DE AVANCE TOTAL	99.22
MULTA	
VALOR LIQUIDO A PAGAR EN ESTA PLANILLA (incluye reajuste provisional)	15,440.52

Nota: De acuerdo al trámite de la solicitud de pago Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4330-M, de fecha 18 de enero de 2023, se detalla la Planilla de Avance N° 3 y Reajuste Provisional de la Planilla de Avance N° 3.

E) ANÁLISIS DEL PERÍODO DE PLANILLAJE

E.1 ANÁLISIS DE PLANILLAJE

ITEM	PARÁMETRO DE CUMPLIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
A	Avance de obra de acuerdo al cronograma	X		
B	Retardo parcial en el período de la planilla		X	
C	Disposiciones del Administrador	X		
D	Disposiciones del Fiscalizador	X		
E	Cumplimiento de especificaciones técnicas	X		
F	Utilización de maquinaria ofertada	X		

G	Asistencia a las reuniones	X		
H	Asistencia del personal ofertado	X		
I	Obstaculización de trabajos a otros contratistas o al contratante		X	
J	Demora en la presentación de planillas a Fiscalización		X	
K	Normativa de Seguridad Industrial y Seguro Ocupacional	X		
L	Normativa de Manejo Ambiental	X		

E.2 ANÁLISIS DE MULTAS

ÍTEM	DETALLE DEL OBJETO DE SANCIÓN	MONTO BASE PARA CÁLCULO	%	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	No. DE DÍAS	VALOR DE LA MULTA
A							
B							
C							
D							
TOTAL DE MULTAS EN ESTE PERIODO DE PLANILLAJE:							

F) CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN

GARANTÍA BUEN USO DE ANTICIPO – FIEL CUMPLIMIENTO	VIGENTE
SEGURO SOCIAL	SI CUMPLE

En virtud del presente informe y en calidad de Administrador de Obra, **SE APRUEBA Y SE SOLICITA** se proceda con el pago de la Planilla de Avance N° 3 y Reajuste Provisional de la Planilla de Avance N° 3, con el siguiente detalle.

PORCENTAJE DE AVANCE PARCIAL EN ESTE PERIODO (%)	13.56
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO (%)	99.22
VALOR TOTAL PLANILLA DE AVANCE N° 3 (\$)	25,106.53
DEVENGACIÓN DEL ANTICIPO EN ESTE PERIODO (\$) (40%)	-10,042.61
REAJUSTE DEFINITIVO DEL ANTICIPO (\$)	
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 3 (\$)	376.60
VALOR TOTAL PLANILLA DE LIQUIDACIÓN (\$)	
VALOR TOTAL REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN (\$)	
VALOR TOTAL PLANILLA DE AVANCE N° 1 EXCEDENTES (\$)	
VALOR TOTAL REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 1 EXCEDENTES (\$)	
VALOR TOTAL DE LA PLANILLA ORDEN DE TRABAJO (\$)	
VALOR TOTAL REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA ORDEN DE TRABAJO (\$)	
DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTAS PARA ESTA PLANILLA (\$)	
VALOR LIQUIDO A PAGAR (\$)	15,440.52

SON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA DÓLARES, 52/100 CENTAVOS, SIN IVA.

TODAS LAS RETENCIONES TRIBUTARIAS SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL GADPPz.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
EDWIN GUSTAVO
NAVAS MANJARREZ

.....
Ing. Gustavo Navas M.

ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4330-M

Puyo, 18 de enero de 2023

PARA: Sr. Ing. Edwin Gustavo Navas Manjarrez
Fiscalizador 1**ASUNTO:** PLANILLA DE AVANCE N° 03 "CONSTRUCCION DE VARIAS VIAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR AMURISAP Y EN EL SECTOR DE LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA".

Por medio del presente me permito informarle que en mi calidad de Fiscalizador, de acuerdo a los Art. 408-19 de las NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS, he procedido a APROBAR LA PLANILLA DE AVANCE N° 03 del Contrato "CONSTRUCCION DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.", para lo cual en cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas en el CONTRATO-CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO, agradeceré proceder con el trámite respectivo para cancelar a favor del **CONSORCIO MICH**, el valor de \$ 15.440,52 USD (QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 52/100), conforme al siguiente detalle:

VALOR LÍQUIDO DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 03:	\$ 15.063,92 USD
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE AVANCE N° 03:	\$ 376,60 USD
TOTAL:	\$ 15.440,52 USD

Se adjunta toda la información relevante en físico y original, firmas y recibidos, Conformidad Ambiental.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Robert Fernando Quintana Muñoz
FISCALIZADOR 1

Referencias:

- GADPPZ-DGA-2023-13571-M

Anexos:

- doc_2023-01-06_1.pdf
- doc_2023-01-06_1_20230106140326685.pdf
- informe_de_conformidad_ambiental_001-signed-signed.pdf
- anexo_fotografico_n.3.pdf
- anexo_planilla_n.3-signed-signed.pdf
- gaviones0546531001674076748.pdf



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4330-M

Puyo, 18 de enero de 2023

- kilo.pdf
- perfiles_calle_r(pasaje).pdf
- check_list_signed0279935001674076766.pdf
- informe_fisc_planilla_3_afirmado_amunisap-signed.pdf
- memo_planilla_3_afirmado_amunisap-signed.pdf
- planilla_3_afirmado_amunisap-signed-signed.pdf
- reajuste_planilla_3_afirmado_amunisap-signed-signed.pdf



MEMORANDO N° 001 - FISCALIZACIÓN - 2023

FECHA : 5 de enero de 2023 ✓
DE : FISCALIZADOR
PARA : DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN ✓
ASUNTO : Solicitud Trámite de Pago

Solicito proceder con el trámite para cancelar a favor del CONSORCIO MICH., contratista de la obra:
CONSTRUCCION DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL
SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON
PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, el valor de \$15,440.52 conforme al siguiente detalle:

PLANILLA DE AVANCE N° 3	\$ 15,063.92 ✓
REAJUSTE PROVICIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N°3	\$ 376.60 ✓
Total	<hr/> \$ 15,440.52



Firma electrónica por:
ROBERT FERNANDO
QUINTANA MUÑOZ

Ing. Robert Quintana
FISCALIZADOR

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

CONSTRUCCION DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR DE AMURISAP
Y EN EL
SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON

ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZADOR

INFORME DE FISCALIZACIÓN N° 3

PROYECTO :	CONSTRUCCION DE VARIAS VIAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	
CONTRATISTA :	CONSORCIO MICH.	
MONTO DEL CONTRATO :	185,214.73 \$	
PERIÓDO DEL INFORME :	1 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2022
FECHA DE ELABORACIÓN :	5 de enero de 2023	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN:

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
CÓDIGO DEL PROCESO	COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-011-2022
MONTO DEL CONTRATO	185,214.73 \$
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 de septiembre de 2022
PLAZO CONTRACTUAL	90 DÍAS
MONTO DEL ANTICIPO	74,085.89 \$
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	s/n
FECHA DE INICIO DE TRABAJO	13 de octubre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	11 de enero de 2023
SUSPENSIÓN DE TRABAJO	
AMPLIACIÓN DE PLAZO	0 DÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO MICH.
GEOREFERENCIACIÓN DEL PROYECTO	

2. PERIODO DEL INFORME

Se ha realizado por parte de la fiscalización y la administración del contrato un permanente seguimiento de las actividades ejecutadas y la prevención de los trabajos con recomendaciones que posteriormente se refleja en la terminación del proyecto.

En la ejecución de cada rubro, se verifico que el contratista utilice el equipo ofertado y necesario para su realización, con las mejores prácticas constructivas, mantuvo en obra el personal capacitado y en número suficiente.

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE PERÍODO

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO		
			CANT.	EJECUT.	%
	VIAS				
1	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m³	26,760.00	2304.53	91.53%
2	Transporte de material pétreo de mejoramiento	m³-km	289,008.00	38024.81	139.84%
3	S.C. Tubería de cemento MC D=0,60 m	m	150.00	0.00	0.00%
4	Material pétreo kilo (minada, cargada y regada)	m³	625.00	329.85	52.78%
5	Transporte de material pétreo de kilo	m³-km	19,500.00	10291.32	52.78%
	MURO GAVIONES		0.00	0.00	
6	Excavación sin clasificar (mov.de tierra)	m³	210.00	210.20	100.10%
7	Desalojo de material con maquinaria	m³	210.00	210.20	100.10%
8	Relleno tendido y compactado capas 20cm-maquina (Excavado	m³	240.00	240.62	100.26%
9	Muro de gaviones - calibre N 12	m³	83.00	68.00	81.93%
	VIA A LOS BANEÑOS		0.00	0.00	
10	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m³	6,000.00	202.80	88.09%
11	Transporte de material pétreo de mejoramiento	m³-km	129,600.00	3346.20	67.29%
	CONTROL AMBIENTAL		0.00	0.00	
12	Señales informativas y reglamentarias (0.60mx0.80m) móviles	u	2.00	0.00	100.00%
13	Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.60m) móviles	u	2.00	0.00	100.00%
14	Cinta peligro colores intensos (mat.polietileno)	m	250.00	0.00	100.00%
15	Pancarta informativa (letrero)-con estructura	u	1.00	0.00	100.00%

4. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

El monto contractual del proyecto, alcanza la suma de US \$185,214.73 (SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE DÓLARES, 92/100 CENTAVOS) para la obra: CONSTRUCCION DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

VALOR TOTAL DEL PROYECTO	185,214.73 \$	100.00%
VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO	74,085.89 \$	40.00%

5. PLANILLAS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS

PLANILLAS	VALORES MONTO PROGRAMADO		MONTO PLANILLADO			% AVANCE PROGRAMADO		% AVANCE REAL	
	MES	ACUMUL.	ANTER.	ACTUAL	ACUMUL.	MES	ACUMUL.	MES	ACUMUL.
PLAN.1	42,164.12 \$	42,164.12 \$	0.00 \$	56,145.40 \$	56,145.40 \$	22.76%	22.76%	30.31%	30.31%
PLAN. 2	62,269.84 \$	104,433.96 \$	56,145.40 \$	102,514.67 \$	158,660.07 \$	33.62%	56.39%	55.35%	85.66%
PLAN. 3	53,857.59 \$	158,291.55 \$	158,660.07 \$	25,106.53 \$	183,766.60 \$	29.08%	85.46%	13.56%	99.22%
TOTAL	158,291.55 \$	158,291.55 \$	158,660.07 \$	183,766.60 \$	183,766.60 \$	85.46%	85.46%	99.22%	99.22%

DESCRIPCIÓN	Nº	PERIODO		VALOR	PORCEN.
PLANILLA	1	13-oct-22	31-oct-22	56,145.40 \$	30.31%
PLANILLA	2	01-nov-22	30-nov-22	102,514.67 \$	55.35%
PLANILLA	3	01-dic-22	31-dic-22	25,106.53 \$	13.56%
TOTAL				183,766.60 \$	99.22%

6. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

AVANCE PROGRAMADO	85.46%
AVANCE EJECUTADO	99.22%
AVANCE CONTRATADO CONTRACTUAL	85.46%
AVANCE INCREMENTO	0.00%
AVANCE RUBROS NUEVOS	0.00%

7. TIEMPO UTILIZADO DESDE LA FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO

El plazo contractual es de 90 días, desde la fecha de orden de inicio de los trabajos emitida por el Administrador del Contrato; el tiempo utilizado para la ejecución de los trabajos en este tercer periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, es de 30 días.

PLAZO TOTAL	90 DÍAS	100%
DÍAS UTILIZADOS	78 DÍAS	87%

Se presenta a continuación el resumen de las inversiones programadas.

8. ACCIONES EFECTUADAS POR LA FISCALIZACIÓN

De conformidad con las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el fiscalizador contenidas en el proceso de contratación pública por cotización de obras los parámetros de contratación, el personal que integra el equipo de fiscalización, de manera objetiva, permanente y en sitio ha realizado la supervisión constante de los trabajos ejecutados por el contratista relacionados con la ejecución de los 15 rubros constitutivos de la obra, para que estos se ejecuten con una metodología apropiada y con estricto apego a las especificaciones técnicas y realidad del lugar. La participación del personal técnico asignado al proyecto por parte del contratista ha sido la mínima necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. Así como el equipo y maquinaria en la obra ha sido la que corresponde. Esta fiscalización ha realizado la verificación y medición de las cantidades de obra ejecutadas. Finalmente, se han elaborado los anexos numéricos de cálculo para determinación de volúmenes, anexos fotográficos y se ha elaborado la planilla de avance N° 3 para su correspondiente trámite y pago.

9. VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL TÉCNICO Y EQUIPO

PERSONAL OFERTADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CHECK LIST
RESIDENTE DE OBRA	100%	OK
TÉCNICO AMBIENTAL	100%	OK
TOPOGRAFO	100%	OK

VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA		
EQUIPO Y MAQUINARIA OFERTADO	EQUIPO Y MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA	CHECK LIST
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	1	OK
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	OK
VOLQUETE	5	OK
APARATOS DE TOPOGRAFÍA	1	OK

INCIDENCIAS PRODUCIDAS EN LA OBRA

Se ha constatado durante la ejecución de la obra el suelo donde se esta colocando el material petreo para el afirmado, es de mala calidad, por esta razón se está aumentando la altura del relleno, esto ayuda a que se pueda construir ya que el peso de las volquetas hacia que el material se expanda, esto ha implicado una diferencia de cantidades de obra. Se debe indicar también que en la vía a los baneños existe inundaciones por este motivo se va ha elevar la altura.

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES

En cada uno de los 10 rubros ejecutados se constata la ejecución de las actividades antes mencionadas, verificando que se está cumpliendo con el objeto de contrato en un 99.22 % cumpliendo las especificaciones técnicas.

El contratista presenta un cronograma valorado de trabajos en períodos distribuidos mensualmente, en el cual consta su inversión, mismo que sirve para la verificación de su cabal cumplimiento, el que será detallado en el informe mensual de administración de contrato.

VERIFICACIONES REALIZADAS

Durante la ejecución de los trabajos el contratista está utilizando métodos tradicionales de construcción con el personal y maquinaria adecuados y suficientes que exigen las obras en ejecución, mismos que se ha verificado los rubros ejecutados por el contratista en el lugar del proyecto, procurando que cumpla con las normas técnicas y precautelando los recursos asignados al proyecto.

10. CONCLUSIONES

La obra ha transcurrido de acuerdo a lo que se encuentra programado, se debe colocar un armico en la via a los baneños los cuales no fueron considerados en el estudio.

11. RECOMENDACIONES

Se recomienda relizar la correcta revisión de trabajaos a realizar durante la elabaoración de los estudios, puesto que debido a esto no se consideró la cantidad correcta de volúmenes ejecutados.

12. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME

NOMBRE : ROBERT FERNANDO QUINTANA MUÑOZ
DIRECCIÓN : BARRIO NUEVOS HORIZONTES
CIUDAD : PUYO - PASTAZA
TELÉFONO CELULAR : 0999770873
CORREO ELECTRÓNICO : robertquintanam@hotmail.com



Firmado electrónicamente por:
ROBERT FERNANDO
QUINTANA MUÑOZ

Ing. Robert Quintana
FISCALIZADOR

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO. _____ FISCALIZACIÓN

PLANILLA DE AVANCE No. 3

OBRA : CONSTRUCCION DE VARIAS VIAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
FECHA DE CONTRATO : miércoles, 21 de septiembre de 2022
CONTRATISTA : CONSORCIO MICH.
PLAZO : 90 Días a partir de la orden de inicio
AMPLIACIONES :
SUSPENSIÓN :
TOTAL : 90 Días

PARCIAL ACUMULADO
 185,214.73
 183,766.61
 25,106.53
 8,372.00
 13.56%
 99.22%

V. CONTRATO :
V. PLANILLAS :
V. EXCEDENTES :
% DE AVANCE :

5 de enero de 2023
 13 de octubre de 2022
 11 de enero de 2023
 01-dic-22 A 31-dic-22

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	CANTIDADES			% TOTAL	IMPORTE		TOTAL FECHA
						T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA		T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	
VIAS												
1	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m ³	26,760.00	\$ 2.16	\$ 57,801.60	-	2304.53	24,494.40	91.53%	47,930.12	4,977.78	52,907.90
2	Transporte de material pétreo de mejoramiento	m ³ -km	289,008.00	\$ 0.22	\$ 63,581.76	366,132.86	-	404,157.67	139.84%	80,549.23	8,365.46	88,914.69
3	S.C. Tubería de cemento MC D=0.60 m	m	150.00	\$ 48.15	\$ 7,222.50	-	-	-	0.00%	-	-	-
4	Material pétreo kilo (minada, cargada y regada)	m ³	625.00	\$ 2.38	\$ 1,487.50	-	329.85	329.85	52.78%	-	785.04	785.04
5	Transporte de material pétreo de kilo	m ³ -km	19,500.00	\$ 0.23	\$ 4,485.00	-	10291.32	10,291.32	52.78%	-	2,367.00	2,367.00
MURO GAVIONES												
6	Excavación sin clasificar (mov.de tierra)	m ³	210.00	\$ 0.76	\$ 159.60	-	210.20	210.20	100.10%	-	159.75	159.75
7	Desalajo de material con maquinaria	m ³	210.00	\$ 2.63	\$ 552.30	-	210.20	210.20	100.10%	-	552.83	552.83
8	Relleno fendido y compactado capas 20cm-maquina (excavadora) + transp.	m ³	240.00	\$ 9.45	\$ 2,268.00	-	240.62	240.62	100.26%	-	2,273.86	2,273.86
9	Muro de gaviones - calibre N 12	m ³	83.00	\$ 65.45	\$ 5,432.35	-	68.00	68.00	81.93%	-	4,450.60	4,450.60
VIA A LOS BANEÑOS												
10	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m ³	6,000.00	\$ 2.16	\$ 12,960.00	5,082.66	202.80	5,285.46	88.09%	10,978.55	438.05	11,416.60
11	Transporte de material pétreo de mejoramiento	m ³ -km	129,600.00	\$ 0.22	\$ 28,512.00	83,863.90	3346.20	87,210.10	67.29%	18,450.06	736.16	19,186.22
CONTROL AMBIENTAL												
12	Señales informativas y reglamentarias (0.60mx0.80m) móviles	u	2.00	\$ 70.51	\$ 141.02	2.00	-	2.00	100.00%	141.02	-	141.02
13	Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.60m) móviles	u	2.00	\$ 152.05	\$ 304.10	2.00	-	2.00	100.00%	304.10	-	304.10
14	Cinta peligro colores intensos (mat.polietileno)	m	250.00	\$ 0.30	\$ 75.00	250.00	-	250.00	100.00%	75.00	-	75.00
15	Pancarta informativa (detrero)-con estructura	u	1.00	\$ 232.00	\$ 232.00	1.00	-	1.00	100.00%	232.00	-	232.00
					\$ 185,214.73							
DESCUENTOS:												
Anticipo 40%												
						\$ 25,106.53						
						\$ 63,464.03						
						\$ 10,042.61						
						\$ 0.00						
						\$ 15,063.92						
						Líquido						

Multa por Mora

SON: QUINCE MIL SESENTA Y TRES DÓLARES, 92/100 CENTAVOS


 Firmado electrónicamente por:
ROBERT FERNANDO
QUINTANA MUÑOZ


 Firmado electrónicamente por:
ALVARO RENATO
SOSA CASTRO


 Firmado electrónicamente por:
MARIA DE
LOURDES CALLE
VILLA

Ing. Robert Quintana
FISCALIZADOR

Ing. Álvaro Renato Sosa Castro
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

Consortio Mich.
CONTRATISTA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE No. 3

OBRA: CONSTRUCCION DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON

Fecha de elaboración:	5 de enero de 2023	Fecha de contrato:	21-sep-22
Contratista:	Consorcio Mich.	Monto del contrato:	\$ 185,214.73
Fecha de índices sub-cero:	jun-22	Valor de planilla o anticipo:	\$ 25,106.53
Fecha de índices sub-uno:	nov-22	Anticipo descontado:	\$ 10,042.61
		Po:	\$ 15,063.92

CUADRILLA TIPO

Categoría	Coficiente	Salarios Reales Diarios		Cx B1	Cx Bo
	C	B1	Bo		
		208	203		
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 (GRUPO I)	0.284	34.350	34.350	9.755	9.755
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2 (GRUPO I)	0.088	32.700	32.700	2.878	2.878
SIN TITULO D2	0.192	31.000	31.000	5.952	5.952
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3	0.000	34.410	34.410	-	-
CHOFERES PROFESIONALES CH C1	0.239	44.970	44.970	10.748	10.748
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	0.065	34.350	34.350	2.233	2.233
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	0.001	32.700	32.700	0.033	0.033
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	0.024	31.000	31.000	0.744	0.744
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	0.107	30.620	30.620	3.276	3.276
TOTAL	1.000			35.619	35.619

	Coficiente	Indices		Factor
	C	I1	Io	Cx I1/Io
		208	203	
Mano de obra	0.103	35.619	35.619	0.103
Cemento Portland Tipo I Sacos	0.001	182.280	185.910	0.001
Equipo y maquinaria de Construc. vial	0.837	184.950	179.690	0.862
Mallas metálicas (gaviones)	0.012	358.320	358.320	0.012
Materiales pétreos Tungurahua	0.016	214.220	219.440	0.016
Tubos de hormigón simple y accesorios Tungurahua	0.026	295.120	295.120	0.026
IPC AMBATO	0.005	109.180	108.570	0.005
TOTAL	1.000			1.025

Valor a reajustarse en esta planilla	(Po)	\$ 15,063.92
Factor de reajuste -1	(-1)	0.025
Valor de reajuste	(Pr)	\$ 376.60
Valor de reajuste provisional		
Diferencia de reajuste	(Vr)	\$ 376.60

Descuentos:

LÍQUIDO A PAGARSE

\$ 376.60



Firmado electrónicamente por:
ROBERT FERNANDO
QUINTANA MUÑOZ

Ing. Robert Quintana
 FISCALIZADOR



Firmado electrónicamente por:
ALVARO RENATO
SOSA CASTRO

Ing. Álvaro Renato Sosa Castro
 DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

CONSORCIO MICH
RUC 1691728943001
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CALLES, AUTOPISTAS Y OTRAS VÍAS PARA
VEHÍCULOS O PEATONES.

Dir.: Calle Guayaquil y Washington Mazón Telf. Nro.: 0988595730 - 032894117

Oficio Nro. 022-CM -2023 ✓

Puyo, 03 de enero del 2023

Ing.
Álvaro Sosa
DIRECTO DE FISCALIZACIÓN DEL GADPPZ

Presente. -

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA



DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Pastaza

03 ENE 2023

Fecha:

Recibido:

EM

Número:

Hora:

10:34

De mi consideración

Yo, Lcda. María de Lourdes Calle Villa **PROCURADOR COMÚN** del **CONSORCIO MICH** contratista de la Obra "**CONSTRUCCION DE VARIAS VIAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**" expreso un atento saludo y solicito comedidamente se autorice a quien corresponda realizar y/o aprobar la Planilla de Avance N°3 correspondiente al mes de diciembre del año 2022.

Por la favorable atención anticipo mis agradecimientos.

Atentamente



Firmado electrónicamente por:
MARIA DE
LOURDES CALLE
VILLA

Lcda. Lourdes Calle V.
RUC. 1691728943001
PROCURADOR COMUN CONSORCIO MICH

RECIBIDO:
Robert Quintana
04-01-2023

ROBERT QUINTANA
FAVOR CONTINUAR CON
EL TRAMITE PERTINENTE

04-01-2023

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

ANEXO DE VOLUMEN DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA				
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VARIAS VIAS , MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR AMURISAP Y VIA A LOS BANEÑOS , PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA	FECHA	PLANILLA N°
		CONSORCIO MICH	03/01/2023	AVANCE 3
RUBRO	DESCRIPCION			UNIDAD
1	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO (MINADA , CARGADA Y REGADA)			m3

CALLE "R" SECTOR AMURISAP

UBICACIÓN	ABSCISAS	LONGITUD (m)	AREA (m2) PERFILES AUTOCAD	AREA PROMEDIO (m2)	VOLUMEN (m3)
Calle "R" Amurisap	0+150.00		5.537		
		10.00		5.247	52.47
	0+160.00		4.956		
	INTERSECCION	10.00		4.956	49.56
	0+170.00		0.000		
		10.00		6.690	66.90
	0+180.00		6.690		
		10.00		5.350	53.50
	0+190.00		4.010		
		10.00		4.988	49.88
	0+200.00		5.966		
		10.00		5.752	57.52
	0+210.00		5.537		
		10.00		5.403	54.03
	0+220.00		5.269		
		10.00		5.176	51.76
	0+230.00		5.082		
		10.00		5.438	54.38
	0+240.00		5.794		
		10.00		5.682	56.82
	0+250.00		5.570		
		10.00		5.758	57.58
	0+260.00		5.946		
		10.00		5.654	56.54
	0+270.00		5.361		
	INTERSECCION	10.00		5.361	53.61
	0+280.00		0.000		
		10.00		5.772	57.72
	0+290.00		5.772		
		10.00		5.253	52.53
	0+300.00		4.734		
		10.00		4.926	49.26
	0+310.00		5.117		
		10.00		5.033	50.33
	0+320.00		4.949		
		10.00		4.590	45.90
	0+330.00		4.231		
		10.00		4.833	48.33
	0+340.00		5.435		
		10.00		5.578	55.78
	0+350.00		5.721		
		10.00		5.226	52.26
	0+360.00		4.731		
		10.00		4.944	49.44
	0+370.00		5.156		
		10.00		4.802	48.02
	0+380.00		4.872		
	INTERSECCION	10.00		4.872	48.72
	0+390.00		0.000		

	0+390.00		0.000		
	INTERSECCION	10.00		5.007	50.07
	0+400.00		5.007		
		10.00		5.017	50.17
	0+410.00		5.027		
		10.00		4.782	47.82
	0+420.00		4.536		
		10.00		4.586	45.86
	0+430.00		4.636		
		10.00		5.171	51.71
	0+440.00		5.706		
		10.00		5.519	55.19
	0+450.00		5.331		
		10.00		5.450	54.50
	0+460.00		5.569		
		10.00		5.574	55.74
	0+470.00		5.578		
		10.00		5.662	56.62
	0+480.00		5.745		
		10.00		5.864	58.64
	0+490.00		5.983		
	INTERSECCION	10.00		5.983	59.83
	0+500.00		0.000		
	INTERSECCION	10.00		6.151	61.51
	0+510.00		6.151		
				SUBTOTAL "R"	1920.45

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

ANEXO DE VOLUMEN DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA				
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VARIAS VIAS , MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR AMURISAP Y VIA A LOS BANEÑOS , PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA	FECHA	PLANILLA N°
		CONSORCIO MICH	03/01/2023	AVANCE 3
RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD		
1	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO (MINADA , CARGADA Y REGADA)	m3		

SUMATORIA DE VOLUMEN DE CALLES SECTOR AMURISAP

UBICACIÓN	SUBTOTAL	VOLUMEN (m3)	(1.2)FACTOR COMPACTACION (m3)	
			FACTOR (20%)	VOLUMEN COMPACTADO
CALLE "R"	SUBTOTAL "R"	1,920.45	384.09	2,304.53
		TOTAL VOLUMEN PLANILLA AVANCE N.3		2,304.53

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

ANEXO DE VOLUMEN DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA				
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VARIAS VIAS , MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR AMURISAP Y VIA A LOS BANEÑOS , PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA	FECHA	PLANILLA N°
		CONSORCIO MICH	03/01/2023	AVANCE 3
RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD		
2	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	m3-Km		

SECTOR AMURISAP

UBICACIÓN	MINA DE EXTRACCION	VOLUMEN (m3)	DISTANCIA (Km)	RECORRIDO (Km)	TRANSPORTE (m3-km)
CALLES AMURISAP	CHINCHAYACU	2,304.53	16.5	16.5	38024.81
				TOTAL	38024.81

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

ANEXO DE VOLUMEN DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA				
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VARIAS VIAS , MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR AMURISAP Y VIA A LOS BANEÑOS , PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA	FECHA	PLANILLA N°
				CONSORCIO MICH
RUBRO	DESCRIPCION			UNIDAD
4	MATERIAL PETREO KILO (MINADA , CARGADA Y REGADA)			m3

CANCHA SECTOR AMURISAP

UBICACIÓN	ANCHO (m)	LONGITUD (m)	ALTURA(m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
CANCHA AMURISAP	60	30.00	0.15	1800.0	270.00
CANCHA LATERAL	26.25	15.20	0.15	399.0	59.85
TOTAL					329.85

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

ANEXO DE VOLUMEN DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA				
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VARIAS VIAS , MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR AMURISAP Y VIA A LOS BANEÑOS , PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA	FECHA	PLANILLA N°
				CONSORCIO MICH
RUBRO	DESCRIPCION		UNIDAD	
5	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO DE KILO		m3-Km	

SECTOR AMURISAP

UBICACIÓN	MINA DE EXTRACCION	VOLUMEN (m3)	DISTANCIA (Km)	RECORRIDO (Km)	TRANSPORTE (m3-km)
AMURISAP	KILO VIA BAÑOS	329.85	31.2	31.2	10291.32
TOTAL					10291.32

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

ANEXO DE VOLUMEN DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA				
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VARIAS VIAS , MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR AMURISAP Y VIA A LOS BANEÑOS , PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA	FECHA	PLANILLA N°
				CONSORCIO MICH
RUBRO	DESCRIPCION			UNIDAD
6	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (MOVIMIENTO DE TIERRA)			m3

MURO DE PROTECCION - GAVIONES EN ACCESO DE PUENTE RIO SALOME

UBICACIÓN	ANCHO (m)	LONGITUD (m)	ALTURA(m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
GAVION "A" MARGEN DERECHO	3.50	12.00	1.30	42.0	54.60
GAVION "B" MARGEN DERECHO	3.50	10.00	1.00	35.0	35.00
GAVION "C" MARGEN IZQUIERDO	3.50	12.00	1.30	42.0	54.60
GAVION "D" MARGEN IZQUIERDO	4.00	10.00	1.65	40.0	66.00
TOTAL					210.20

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

ANEXO DE VOLUMEN DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA				
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VARIAS VIAS , MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR AMURISAP Y VIA A LOS BANEÑOS , PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA	FECHA	PLANILLA N°
				CONSORCIO MICH
RUBRO	DESCRIPCION			UNIDAD
7	DESALOJO DE MATERIAL CON MAQUINA			m3

MURO DE PROTECCION - GAVIONES EN ACCESO DE PUENTE RIO SALOME

UBICACIÓN	ANCHO (m)	LONGITUD (m)	ALTURA(m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
GAVION "A" MARGEN DERECHO	3.50	12.00	1.30	42.0	54.60
GAVION "B" MARGEN DERECHO	3.50	10.00	1.00	35.0	35.00
GAVION "C" MARGEN IZQUIERDO	3.50	12.00	1.30	42.0	54.60
GAVION "D" MARGEN IZQUIERDO	4.00	10.00	1.65	40.0	66.00
TOTAL					210.20

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

ANEXO DE VOLUMEN DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA				
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VARIAS VIAS , MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR AMURISAP Y VIA A LOS BANEÑOS , PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA	FECHA	PLANILLA N°
				CONSORCIO MICH
RUBRO	DESCRIPCION			UNIDAD
8	RELLENO TENDIDO Y COMPACTADO CAPAS DE 20cm MAQUINA (EXCAVADORA) MAS TRANSPORTE			m3

MURO DE PROTECCION - GAVIONES EN ACCESO DE PUENTE RIO SALOME

UBICACIÓN	ANCHO (m)	LONGITUD (m)	ALTURA(m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
GAVION "A" MARGEN DERECHO	3.50	12.00	1.30	42.0	54.60
RELLE BASUREROS COMUNIDAD	4.50	5.20	1.30	23.4	30.42
GAVION "B" MARGEN DERECHO	3.50	10.00	1.00	35.0	35.00
GAVION "C" MARGEN IZQUIERDO	3.50	12.00	1.30	42.0	54.60
GAVION "D" MARGEN IZQUIERDO	4.00	10.00	1.65	40.0	66.00
				TOTAL	240.62

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

ANEXO DE VOLUMEN DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA				
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VARIAS VIAS , MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR AMURISAP Y VIA A LOS BANEÑOS , PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA	FECHA	PLANILLA N°
				CONSORCIO MICH
RUBRO	DESCRIPCION			UNIDAD
9	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N.12			m3

MURO DE PROTECCION - GAVIONES EN ACCESO DE PUENTE RIO SALOME

UBICACIÓN	LONGITUD (m)	CANTIDAD DE MALLAS (U) 2X1X1m	ALTURA(m)	AREA POR MALLA (m2)	VOLUMEN (m3)
GAVION "A" MARGEN DERECHO	2.00	9.00	1.00	2.0	18.00
GAVION "B" MARGEN DERECHO	2.00	7.00	1.00	2.0	14.00
GAVION "C" MARGEN IZQUIERDO	2.00	9.00	1.30	2.0	18.00
GAVION "D" MARGEN IZQUIERDO	2.00	9.00	1.65	2.0	18.00
				TOTAL	68.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

ANEXO DE VOLUMEN DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA				
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VARIAS VIAS , MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR AMURISAP Y VIA A LOS BANEÑOS , PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA	FECHA	PLANILLA N°
		CONSORCIO MICH	03/01/2023	AVANCE 3
RUBRO	DESCRIPCION			UNIDAD
10	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO (MINADA CARGADA Y REGADA)			m3

AUMENTO DE ALTURA DEL NIVEL DE VIA A LOS BANEÑOS POR INUNDACION

UBICACIÓN	LONGITUD (m)	ALTURA PROMEDIO (m)	ANCHO(m)	AREA POR MALLA (m2)	VOLUMEN (m3)
CALLE "C1" VIA A LOS BANEÑOS	52.00	0.50	7.80	405.6	202.80
				TOTAL	202.80

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

ANEXO DE VOLUMEN DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA				
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE VARIAS VIAS , MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR AMURISAP Y VIA A LOS BANEÑOS , PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA	FECHA	PLANILLA N°
		CONSORCIO MICH	03/01/2023	AVANCE 3
RUBRO	DESCRIPCION			UNIDAD
11	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO			m3-Km

AUMENTO DE ALTURA DEL NIVEL DE VIA A LOS BANEÑOS POR INUNDACION

UBICACIÓN	MINA DE EXTRACCION	VOLUMEN (m3)	DISTANCIA (Km)	RECORRIDO (Km)	TRANSPORTE (m3-km)
CALLE "C1" VIA BANEÑOS	CHINCHAYACU	202.80	16.5	16.5	3346.20
				TOTAL	3346.20



Plasmado electrónicamente por:
**ROBERT FERNANDO
 QUINTANA MUÑOZ**




Plasmado electrónicamente por:
**MARIA DE
 LOURDES CALLE
 VILLA**

ING. ROBERT QUINTANA
 FISCALIZADOR

LCDA. MARIA DE LOURDES CALLE
 PROCURADOR COMUN CONSORCIO "MICH"

MURO DE GAVIONES

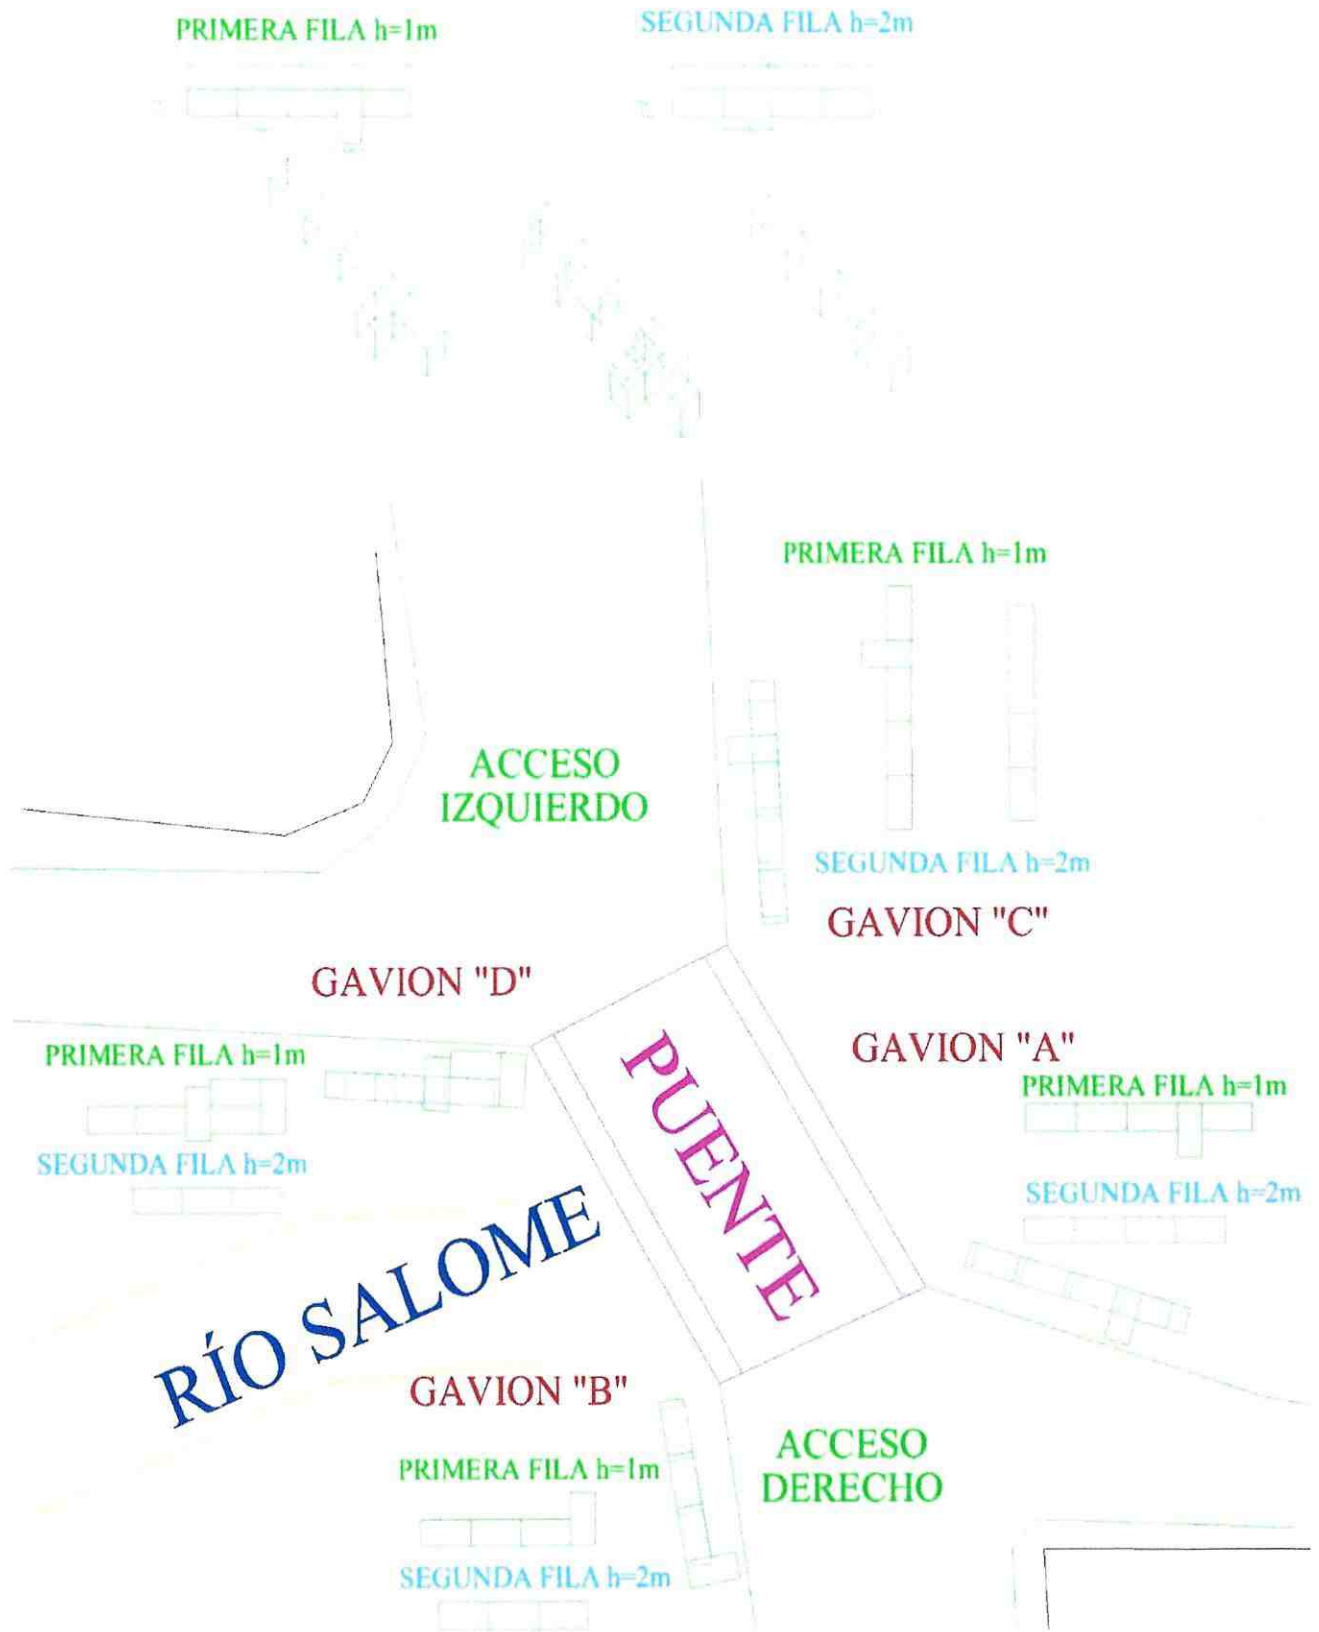

CANCHA DE KILO SECTOR AMURISAP




PASAJE CALLE "R" SECTOR AMURISAP


CALLES
SECTOR
AMURISAP




ABSCISAS CALLE "R" (PASAJE)

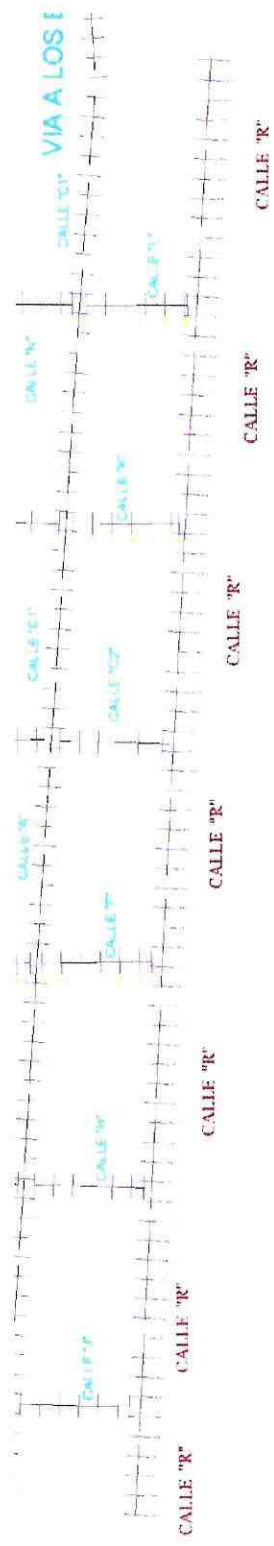


PERFILES CALLE "R" (PASAJE) SECTOR AMURISAP




ESTACION 0+190.00




ESTACION 0+240.00




ESTACION 0+180.00




ESTACION 0+230.00




ESTACION 0+170.00




ESTACION 0+220.00



ESTACION 0+160.00



ESTACION 0+210.00



ESTACION 0+150.00




ESTACION 0+200.00




AREA =5.772m²

ESTACION 0+290.00

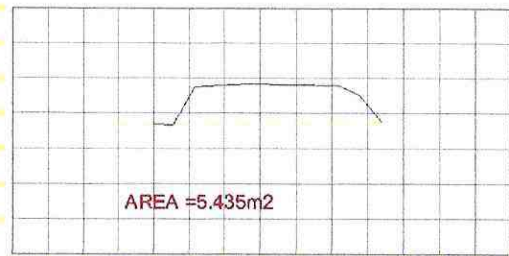

AREA =5.435m²

ESTACION 0+340.00

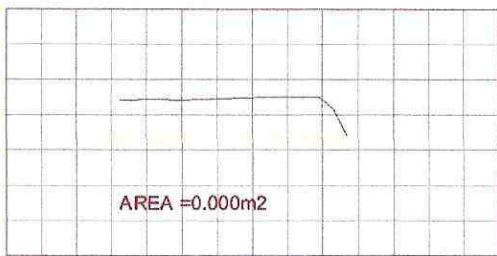

AREA =0.000m²

ESTACION 0+280.00




AREA =4.231m²

ESTACION 0+330.00




AREA =5.361m²

ESTACION 0+270.00

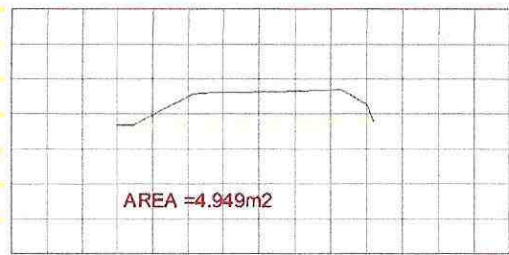


AREA =4.949m²

ESTACION 0+320.00

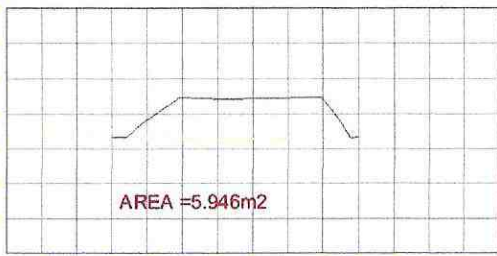


AREA =5.946m²

ESTACION 0+260.00

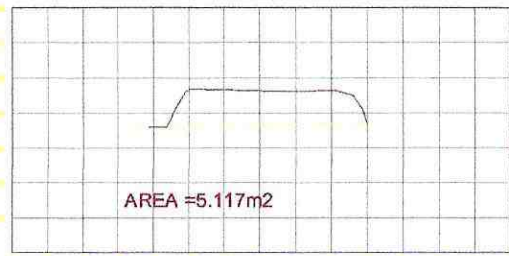


AREA =5.117m²

ESTACION 0+310.00

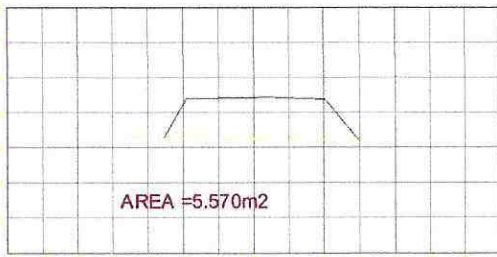


AREA =5.570m²

ESTACION 0+250.00

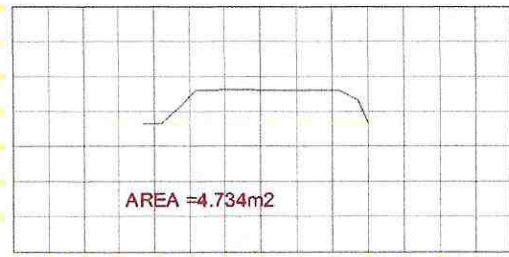


AREA =4.734m²

ESTACION 0+300.00

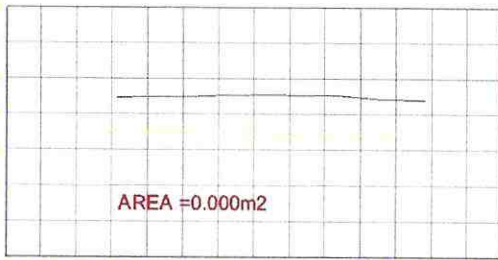


ESTACION 0+390.00

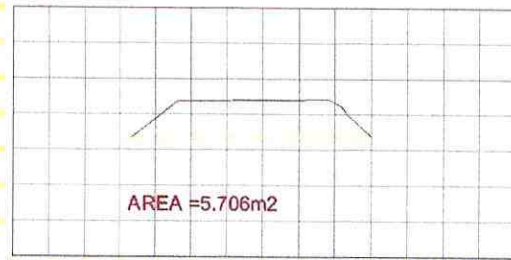


ESTACION 0+440.00




ESTACION 0+380.00

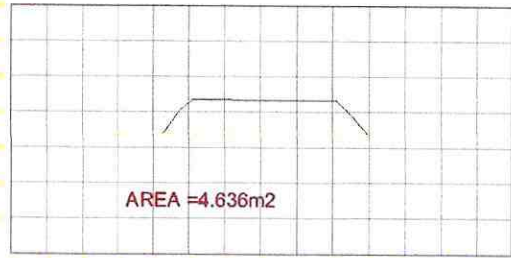


ESTACION 0+430.00

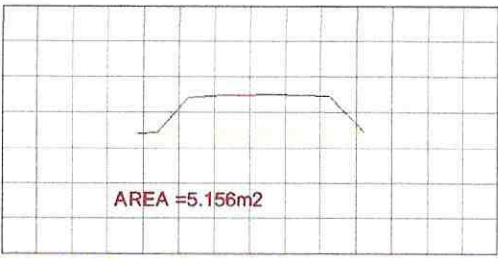


ESTACION 0+370.00

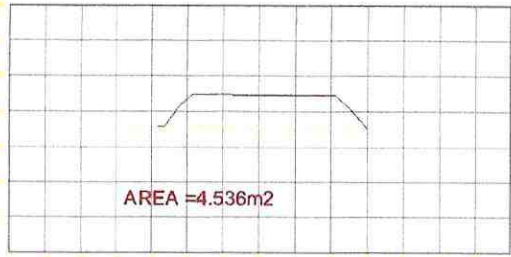


ESTACION 0+420.00

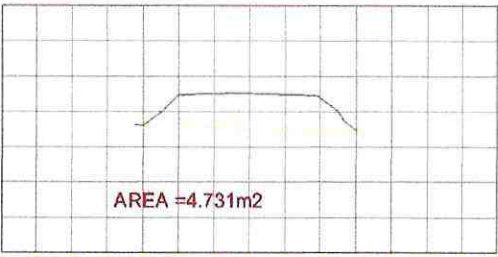


ESTACION 0+360.00

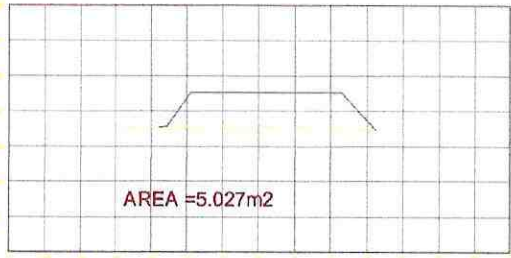


ESTACION 0+410.00

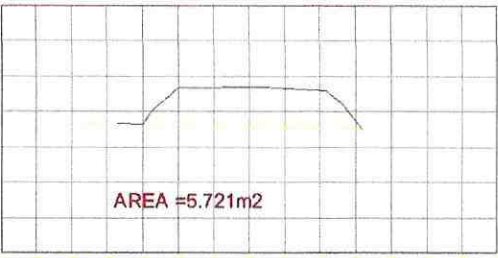

ESTACION 0+350.00

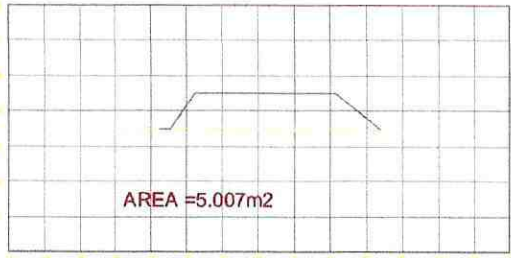


ESTACION 0+400.00

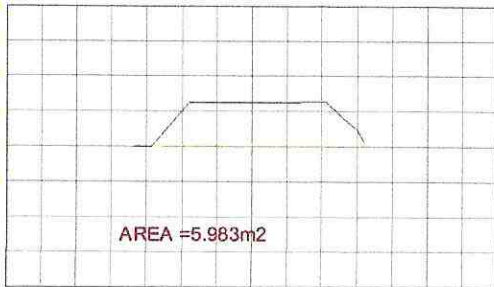


ESTACION 0+490.00




ESTACION 0+480.00

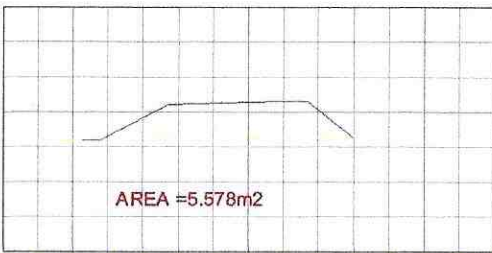


ESTACION 0+470.00

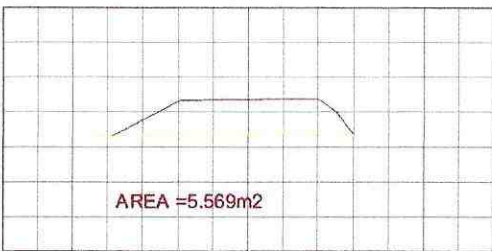


ESTACION 0+460.00

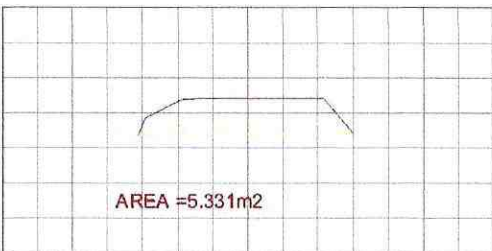

ESTACION 0+450.00

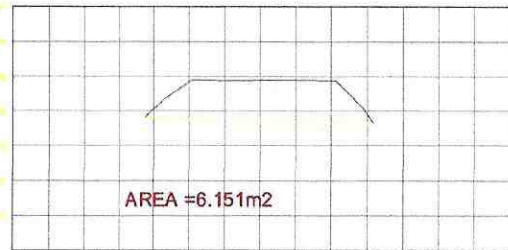

ESTACION 0+510.00

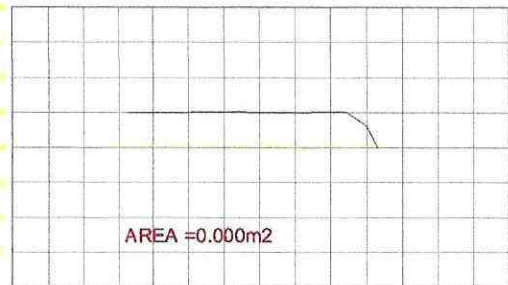

ESTACION 0+500.00

RUBRO N.1.- MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO (MINADA,CARGADA ,REGADA)



RUBRO N.2.- TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO



RUBRO N.4.- MATERIAL PETREO KILO (MINADA,CARGADA ,REGADA)



RUBRO N.5.- TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO DE KILO



RUBRO N.6.- EXCAVACION SIN CLASIFICAR (MOVIMIENTO DE TIERRA)



RUBRO N.7.- DESALOJO DE MATERIAL CON MAQUINA



RUBRO N.8.- RELLENO TENDIDO Y COMPACTADO CAPAS DE 20CM MAQUINA (EXCAVADORA)
MAS TRANSPORTE



RUBRO N.9.- MURO DE GAVIONES CALIBRE N.12



RUBRO N.10.- MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO (MINADA,CARGADA ,REGADA)





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO MICH

enero 09 del 2023 15:31

CALLE VILLA MARIA DE LOURDES

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

No. Comprobante: 0000000165517120

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2023-01-09
No. RUC / REGISTRO:	1691728943001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2023-01-16	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSORCIO MICH - CONSORCIO MICH			
Periodo de Pago:	2022 - 12			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

PERIODOS

PERIODO	TIPO	RT	TP	REG.	SUELDO	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2022 - 12	M	06	A	4	2084.73	429.46	0.00
					2084.73	429.46	0.00

Valor	450.31
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	450.31
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	450.31

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuánto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. LOS APORTES CANCELADOS CON REMISIÓN DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.

RED DE SERVICIOS FACILITO

CACPE PASTAZA

RUC: 0992663235001

COMPROBANTE DE RECAUDACIÓN DE IESS

COMPROBANTE: 000000000321295

REFERENCIA: 0000000165517120

NOMBRE: CONSORCIO MICH

CÉDULA: 16917XXXXX

AGENCIA: CACPE Online

USUARIO: LibelulaSoft

CANAL: WEB

SEC LOC / SW: 832050/321295

VALOR RECAUDADO:	\$	450.31
COMISIÓN:	\$	0.30
TOTAL:	\$	450.61

MENSAJE: TRANSACCION OK

OPERADO POR: RED DE SERVICIOS FACILITO

FACTURA: 001-354-000295979

CÓDIGO AUTORIZACIÓN: 00000026230710

FECHA HORA: 09/01/2023 15:35:14

RECIBÍ CONFORME

CONSULTE SU DOCUMENTO EN
www.facilito.com.ec/documentoselectronicos



Memorando Nro. GADPPZ-DGA-2023-13571-M

Puyo, 18 de enero de 2023

PARA: Sr. Ing. Álvaro Renato Sosa Castro
Director de Fiscalización

ASUNTO: CONFORMIDAD AL INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE VARIAS VIAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR AMURISAP Y EN EL SECTOR DE LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA".

De mi consideración:

Estimado Director, en atención al GADPPZ-JGA-GA-2023-5745-M, suscrito por el Ing. Jorge Antonio Vargas Escobar JEFE DE GESTIÓN AMBIENTAL (E), me permito informar que, conforme al OFICIO 021-CM-2022, del 30 de diciembre de 2022, la Lcda. María de Lourdes Calle Villa PROCURADOR COMUN del CONSORCIO MICH en calidad de CONTRATISTA, presenta el Informe Ambiental N° 3, correspondiente al **Periodo del 01 al 30 de diciembre de 2022**, siendo este el periodo erróneo por lo que con OFICIO 023-CM-2022, del 05 de enero de 2023, la Lcda. María de Lourdes Calle Villa PROCURADOR COMUN del CONSORCIO MICH rectifica el **Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022**, con respecto al proyecto "CONSTRUCCION DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Con lo antes expuesto, sírvase revisar el INFORME-GADPPz-DGA-GA-SC-001-2023, del cumplimiento de las medidas ambientales de la obra correspondientes al proyecto en mención, se determina la **CONFORMIDAD AMBIENTAL**, bajo la revisión y criterio técnico del Ing. Stalin Xavier Cáceres Valverde Responsable del seguimiento, control y monitoreo ambiental del Proyecto "CONSTRUCCION DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", con la finalidad de continuar con los trámites pertinentes.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. David Alejandro Yedra Machado
DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

Referencias:
- GADPPZ-JGA-GA-2023-5745-M

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA



DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Pastaza

18 ENE 2023

Fecha:

Recibido:

JORDAN M

Número:

Hora: 12 hrs



Memorando Nro. GADPPZ-DGA-2023-13571-M

Puyo, 18 de enero de 2023

Anexos:

- informe_de_conformidad_ambiental_001-signed-signed.pdf
- doc_2023-01-06_1_20230106140326685.pdf
- doc_2023-01-06_1.pdf


Copia:

Sr. Ing. Jorge Antonio Vargas Escobar - **Jefe de Gestión Ambiental (E)** / Sra. Lcda. Mayra Elizabeth Yucailla Valencia - **Asistente Administrativo 1** /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Lcda. Mayra Elizabeth Yucailla Valencia - Asistente Administrativo 1



Firmado electrónicamente por:
**DAVID ALEJANDRO
YEDRA MACHADO**



GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha: **17 ENE 2023**
Recibido: Mayra. Y
Número: 5745-M Hora: 11:00

Memorando Nro. GADPPZ-JGA-GA-2023-5745-M

Puyo, 16 de enero de 2023

PARA: Sr. Mgs. David Alejandro Yedra Machado
Director de Gestión Ambiental

ASUNTO: CONFORMIDAD AL INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE VARIAS VIAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR AMURISAP Y EN EL SECTOR DE LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA".

De mi consideración:

Estimado Director, en atención al memorando GADPPZ-JGA-GA-2023-5736-M, suscrito por el Ing. Stalin Xavier Cáceres Valverde ANALISTA DE CALIDAD AMBIENTAL 1, me permito informar que, conforme al OFICIO 021-CM-2022, del 30 de diciembre de 2022, la Lcda. María de Lourdes Calle Villa PROCURADOR COMUN del CONSORCIO MICH en calidad de CONTRATISTA, presenta el Informe Ambiental N° 3, correspondiente al **Periodo del 01 al 30 de diciembre de 2022**, siendo este el periodo erróneo por lo que con OFICIO 023-CM-2022, del 05 de enero de 2023, la Lcda. María de Lourdes Calle Villa PROCURADOR COMUN del CONSORCIO MICH rectifica el **Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022**, con respecto al proyecto **"CONSTRUCCION DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**.

Al respecto, sírvase revisar el INFORME-GADPPz-DGA-GA-SC-001-2023, del cumplimiento de las medidas ambientales de la obra correspondientes al proyecto en mención, se determina la **CONFORMIDAD AMBIENTAL**, bajo la revisión y criterio técnico del Ing. Stalin Xavier Cáceres Valverde Responsable del seguimiento, control y monitoreo ambiental del Proyecto **"CONSTRUCCION DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**.

Para lo cual solicito poner en conocimiento de la Dirección de Fiscalización, con la finalidad de revisión y continuar con los trámites pertinentes.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Memorando Nro. GADPPZ-JGA-GA-2023-5745-M

Puyo, 16 de enero de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Antonio Vargas Escobar
JEFE DE GESTIÓN AMBIENTAL (E)

Referencias:

- GADPPZ-JGA-GA-2023-5736-M

Anexos:

- doc_2023-01-06_1.pdf
- doc_2023-01-06_1_20230106140326685.pdf
- informe_de_conformidad_ambiental_001-signed-signed.pdf

Copia:

Stalin Xavier Cáceres Valverde - **Analista de Calidad Ambiental 1** / Sra. Leda. Mayra Elizabeth Yucailla Valencia - **Asistente Administrativo 1**

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Leda. Mayra Elizabeth Yucailla Valencia - Asistente Administrativo 1



Firmado electrónicamente por:
**JORGE ANTONIO
VARGAS ESCOBAR**



Memorando Nro. GADPPZ-JGA-GA-2023-5736-M

Puyo, 16 de enero de 2023

PARA: Sr. Ing. Jorge Antonio Vargas Escobar
Jefe de Gestión Ambiental (E)

ASUNTO: CONFORMIDAD AL INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE VARIAS VIAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR AMURISAP Y EN EL SECTOR DE LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA".

Ingeniero, en atención al OFICIO 021-CM-2022 del 30 de diciembre de 2022, la Lcda. María de Lourdes Calle Villa PROCURADOR COMUN del CONSORCIO MICH en calidad de CONTRATISTA, presenta el Informe Ambiental N° 3, correspondiente al **Periodo del 01 al 30 de diciembre de 2022** siendo este el periodo erróneo por lo que con OFICIO 023-CM-2022, del 05 de enero de 2023, la Lcda. María de Lourdes Calle Villa PROCURADOR COMUN del CONSORCIO MICH rectifica el **Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022**, con respecto al proyecto "CONSTRUCCION DE VARIAS VIAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

Al respecto, sírvase revisar el INFORME-GADPPZ-DGA-GA-SC-001-2023 de la inspección del cumplimiento de las medidas ambientales de la obra correspondientes al proyecto en mención, se determina la **CONFORMIDAD AMBIENTAL**.

Para lo cual solicito poner en conocimiento de la Dirección de Fiscalización, con la finalidad de seguir los trámites pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Stalin Xavier Cáceres Valverde
ANALISTA DE CALIDAD AMBIENTAL 1

Referencias:

- GADPPZ-DGA-2023-0841-E

Anexos:

- doc_2023-01-06_1_20230106140326685.pdf
- doc_2023-01-06_1.pdf
- informe_de_conformidad_ambiental_001-signed-signed.pdf



Firmado electrónicamente por:
**STALIN XAVIER
CACERES
VALVERDE**

Recibido
05:19
16-01-2023

RUBRO N.11.- TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO





INFORME-GADPPz-DGA-GA-SC-001-2023		
Nombre del Proyecto		
CONSTRUCCION DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA ✓		
Provincia	Cantón	Parroquia
<i>Pastaza</i>	<i>Pastaza</i>	<i>Tarqui</i>
Fecha	Fiscalizador	Monitoreo Ambiental
<i>16/01/2023</i>	<i>Ing. Robert Quintana</i>	<i>Ing. Stalin Cáceres</i> ✓
Disponibilidad	Contratista	Beneficiarios Directos
<i>Técnico Legal</i>	<i>CONSORCIO MICH</i>	<i>Parroquia Tarqui</i>
Dirección		Sección
<i>Gestión Ambiental</i>		<i>Calidad Ambiental</i>
Desarrollo.		



1. OBJETIVO:

Verificar el cumplimiento de las medidas ambientales para prevenir y mitigar impactos ambientales que se pueden generar en la obra correspondientes al contrato de "CONSTRUCCION DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

2. ANTECEDENTES:

En la ciudad de Puyo a los 21 días del mes de septiembre de 2022 se emite el CONTRATO COTO-GADPPz-011-2022, a nombre del CONSORCIO MICH en calidad de Contratista, con fecha 13 de octubre de 2022, se emite EL ACTA DE INICIO DE OBRA ✓ para el "CONSTRUCCION DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA" ✓.

Con OFICIO 021-CM-2022, del 30 de diciembre de 2022, la Lcda. María de Lourdes Calle Villa PROCURADOR COMUN del CONSORCIO MICH en calidad de CONTRATISTA, presenta el Informe Ambiental N° 3, correspondiente al **Periodo del 01 al 30 de diciembre de 2022** siendo este el periodo erróneo por lo que con OFICIO 023-CM-2022, del 05 de enero de 2023, la Lcda. María de Lourdes Calle Villa PROCURADOR COMUN del CONSORCIO MICH rectifica el **Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022** ✓ con respecto al proyecto "CONSTRUCCION DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".



3. ALCANCE:

Corresponde la construcción de: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN MENOR O IGUAL A 10 KM y *Obras de superficie en calles, carreteras, autopistas, puentes o túneles, asfaltado de carretera, pintura y otros tipos de marcado de carretera, instalación de barreras de emergencia, señales de tráfico y elementos similares. Incluye la construcción de pistas para aeropuertos.*, en el cual se desarrollaron las actividades de "CONSTRUCCION DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

4. MARCO APLICABLE:

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA: TÍTULO VII del régimen del Buen Vivir; Capítulo Segundo: Biodiversidad y Recursos Naturales; Sección Primera: Naturaleza y Ambiente; **Art. 395**

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.

Art. 396

- La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.

CÓDIGO ORGÁNICO DE AMBIENTE (publicada en Registro Oficial Suplemento 983 de 12 de abril del 2017 y en vigencia a partir del 12 de abril de 2018).

Art. 173.-De las obligaciones del operador.

- El operador de un proyecto, obra y actividad, pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que sea posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad. Cuando se produzca algún tipo de afectación al ambiente, el operador establecerá todos los mecanismos necesarios para su restauración.
- El operador deberá promover en su actividad el uso de tecnologías ambientalmente limpias, energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto, prácticas que garanticen la transparencia y acceso a la información, así como la implementación de mejores prácticas ambientales en la producción y consumo.



TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE (TULSMA)

Mediante Acuerdo Ministerial No. 061 publicado en la Edición Especial No. 270 del Registro Oficial 316, el lunes 4 de mayo del 2015, se realiza la reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.

Art. 61 De las prohibiciones. - No depositar sustancias líquidas, pastosas o viscosas, excretas, ni desechos peligrosos o de manejo especial, en los recipientes destinados para la recolección de residuos sólidos no peligrosos.

PARÁGRAFO II DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE

Art. 62 De la separación en la fuente. - El generador de residuos sólidos no peligrosos está en la obligación de realizar la separación en la fuente, clasificando los mismos en función del Plan Integral de Gestión de Residuos, conforme lo establecido en la normativa ambiental aplicable.

- NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN ISO 3864-1:2013, SÍMBOLOS GRÁFICOS. COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE SEGURIDAD.

- Principios de Diseño para Señales de Seguridad e Indicaciones de Seguridad.

- NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN ISO 2841:2014, ESTANDARIZACIÓN DE COLORES PARA RECIPIENTES DE DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.

- Establece los colores para los recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos con el fin de fomentar la separación en la fuente de generación y la recolección selectiva.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

UBICACIÓN: Provincia Pastaza – Cantón Pastaza - Parroquia Tarqui.

FASE: Ejecución.

FECHA DE CONTROL: 16 de enero de 2023.

6. REPORTE DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

El proyecto evaluado se encuentra en su fase de construcción donde se implantan las medidas ambientales y se ha instruido en el uso correcto de las mismas a los trabajadores. Las medidas que se aplican son de cumplimiento obligatorio por parte del contratista y la fiscalización controla su efectiva implementación, las actividades generaron un impacto de nivel bajo, puesto que los trabajos fueron temporales y puntuales por lo que los factores ambientales no presentan afectaciones.



7. CONCLUSIONES:

- Para el periodo evaluado se cumplió con lo indicado en referencia al Registro Ambiental y la Guía de Buenas Prácticas Ambientales de los trabajos realizados en el proyecto.
- Por lo observado no se evidencia factores que puedan generar impacto en el ambiente.

8. RESULTADOS:

Una vez efectuado el seguimiento y monitoreo de campo, basados en la normativa ambiental, para el "CONSTRUCCION DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", se determina la **CONFORMIDAD AMBIENTAL** para el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022, del proyecto en mención.

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:
**STALIN XAVIER
CACERES
VALVERDE**

Ingeniero Stalin Xavier Cáceres Valverde
ANALISTA DE CALIDAD AMBIENTAL 1

NOTA: DECLARO BAJO JURAMENTO, LA VERACIDAD DE LA INFORMACION CONSIGNADA Y QUE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS COMO ANEXOS SON ORIGINALES Y/O FIEL COPIA DEL ORIGINAL.

Revisado por:




Firmado electrónicamente por:
**JORGE ANTONIO
VARGAS ESCOBAR**

Ingeniero Jorge Vargas
JEFE DE GESTIÓN AMBIENTAL

CONSTRUCCION DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

Trabajos Constructivos

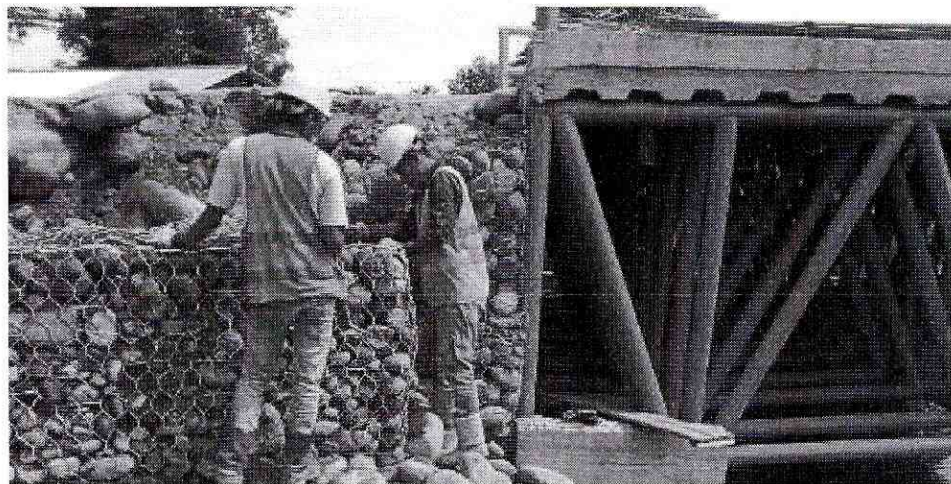

CONSORCIO MICH
RUC 1691728943001
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CALLES, AUTOPISTAS Y OTRAS VÍAS PARA
VEHÍCULOS O PEATONES.

Dir.: Calle Guayaquil y Washington Mazón Telf. Nro.: 0988595730 - 032894117


Oficio Nro. 023-CM -2022

Puyo, 05 de enero del 2023

Ing.
David Yedra Machado
DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PASTAZA.

Presente. -

De mi consideración



Fecha: 05 ENE 2023
Recibido: ORIS C.
Número: 0841-E Hora: 16:26

Yo, María de Lourdes Calle Villa con cedula de identidad Noro 160017685- 1, en calidad de Procurador Común del **CONSORCIO MICH** con Ruc. Nro. 1691728943001 a su vez adjudicatario de la obra **"CONSTRUCCION DE VARIAS VIAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.** expreso un atento saludo deseándole los mejores éxitos en este nuevo año.

En alcance al oficio Nro. 021-CM-2022, con fecha 30 de diciembre, por un error de tipeo entrego nuevamente el oficio en el cual se solicita se designe a quien corresponda la revisión del Informe de Cumplimiento Ambiental del proyecto correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre del año 2022.

Particular que comunico para los fines administrativos pertinentes

Atentamente



Firmado electrónicamente por:
MARIA DE
LOURDES CALLE
VILLA

Lcda. Lourdes Calle V.
RUC. 1691728943001
PROCURADOR COMUN CONSORCIO MICH

NOTA: Adjunto copia del oficio con el que se entregó el ICA, en el tiempo establecido.

Ing. S. VARGAS -> FASE PERTINENTE

Recibido
16-01-2023

Ing. Stalm Cáceres -> Fase y trámite pertinente 05/01/2023

CONSORCIO MICH
RUC 1691728943001
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CALLES, AUTOPISTAS Y OTRAS VÍAS PARA
VEHÍCULOS O PEATONES.

Dir.: Calle Guayaquil y Washington Mazón Telf. Nro.: 0988595730 - 032894117

Puyo, 30 de diciembre del 2022

Oficio Nro. 021-CM -2022

Ing.
David Yedra Machado
DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PASTAZA.

Presente. -

De mi consideración



Fecha: 30 DIC 2022

Recibido: Mayra Y

Número: 0816-E Hora: 8:23

Yo, María de Lourdes Calle Villa con cedula de identidad Noro 160017685- 1, en calidad de Procurador Común del **CONSORCIO MICH** con Ruc. Nro. 1691728943001 a su vez adjudicatario de la obra **"CONSTRUCCION DE VARIAS VIAS, MURO DE PROTECCION EN EL SECTOR AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.** expreso un atento saludo.

La presente tiene por objeto, designe a quien corresponda la revisión del ICA del proyecto en mención, para su respectiva aprobación del informe correspondiente al periodo del 01 al 30 de diciembre del año 2022

Particular que comunico para los fines administrativos pertinentes

Atentamente




Firmado electrónicamente por:
MARIA DE
LOURDES CALLE
VILLA

Lcda. Lourdes Calle V.
RUC. 1691728943001
PROCURADOR COMUN CONSORCIO MICH

Adjunto: ICA mes de diciembre de 2022

TADA TAANITE PERTINENTE

Recibido
04-01-2023

	<p>PROYECTO:</p> <p>"CONSTRUCCIÓN DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",</p>	<p>CONSORCIO MICH</p> <p>RUC 1691728943001</p>
		<p>Del 01 al 31 de diciembre de 2022</p>

CONSORCIO MICH.

RUC: 1691728943001

INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

DEL PROYECTO:


**"CONSTRUCCIÓN DE VARIAS VÍAS,
MURO DE PROTECCIÓN EN EL
SECTOR DE AMURISAP Y EN EL
SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA
TARQUI, CANTÓN PASTAZA,
PROVINCIA DE PASTAZA"**

CODIGO

COTO-GADPPz-011-2022




Del 01 al 31 de diciembre de 2022

	PROYECTO:	CONSORCIO MICH RUC 1691728943001
	"CONSTRUCCIÓN DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",	Del 01 al 31 de diciembre de 2022


DATOS DEL PROYECTO

DOCUMENTO:	INFORME TÉCNICO DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
CONTENIDO:	INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",
DIRIGIDO A:	Ing. Stalin Cáceres Valverde Analista de Calidad Ambiental 1
ELABORADO POR:	Ing. Jorge Luis Mopocita
CARGO:	TÉCNICO SSA
PERIODO:	Del 01 al 31 de diciembre de 2022
PLANILLA:	03
% AVANCE DE OBRA:	97.40 % (aproximadamente)

	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",	CONSORCIO MICH RUC 1691728943001
		Del 01 al 31 de diciembre de 2022

CONTENIDO

CONTENIDO.....	3
1.- ANTECEDENTES.....	4
2.- DATOS GENERALES.....	4
3.- OBJETIVO GENERAL.....	6
4.- ALCANCE.....	6
5.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADA.....	6
6.- AREA INTERVENIDA.....	7
9.- PLAN DE ACCIÓN.....	10
10.- CONCLUSIONES.....	11
11.- RECOMENDACIONES.....	11
12.- FIRMA DE RESPONSABILIDAD.....	11
13.- ANEXOS.....	12

	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",	CONSORCIO MICH RUC 1691728943001
		Del 01 al 31 de diciembre de 2022

1.- ANTECEDENTES.

Con fecha 21 de septiembre del 2022 se suscribió el contrato cuyo objeto de contratación es: "CONSTRUCCIÓN DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA". Los trabajos se ejecutarán en la Parroquia Tarqui, Cantón Pastaza, Provincia de Pastaza, con sujeción a diseños, especificaciones y más documentos contractuales, por un monto de U.S.D. 185.214,73 (ciento ochenta y cinco mil doscientos catorce con 73/100 dólares americanos), sin incluir el I.V.A., en un plazo de 90 días, por un lado la entidad proponente el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza y por otra parte el consorcio MICH en su calidad de contratante y representado por su Procurador Común la Lcda. María de Lurdes Calle Villa

El proyecto cuenta con CERTIFICADO AMBIENTAL Nro. MAAE-SUIA-DZDCH-2022-CA-0232 emitido el 28 de marzo de 2022 con su respectiva **Guía de Buenas Prácticas Ambientales**.

Cuenta con Registro Ambiental Nro. MAE-RA-2016-235605 emitido el 10 de marzo de 2016.

Se firma un acta de inicio de trabajos con fecha 13 de octubre de 2022.

El periodo de reporte, corresponde desde el 01 al 31 de diciembre de 2022

2.- DATOS GENERALES

DATOS GENERALES			
NOMBRE DEL PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"		
CÓDIGO DE PROCESO	COTO-GADPPz 011-2022		
CERTIFICADO AMBIENTAL	MAAE-SUIA-DZDCH-2022-CA-0232		
REGISTRO AMBIENTAL	MAE-RA-2016-235605		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Sector de AMURISAP y sector de los BANEÑOS, ubicada en la parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza		
COORDENADAS	17 S	X: 835281.506442	Y: 9831971.03604




PROYECTO:

"CONSTRUCCIÓN DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",

CONSORCIO MICH
RUC 1691728943001

Del 01 al 31 de diciembre de 2022

	17 S	X: 833450.447986	Y: 9831880.22676
ACTIVIDAD AMBIENTAL REGULADA	OBRAS DE SUPERFICIE EN CALLES, CARRETERAS AUTOPISTAS, PUENTES O TUNELES, ASFALTADO DE CARRETERAS, PINTURA Y OTROS TIPOS DE MARCADO DE CARRETERAS, SEÑALES DE TRAFICO Y ELEMENTOS SIMILARES. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AUTOPISTAS, VIAS DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN		
EXTENSIÓN DEL PROYECTO		FASE DE PROYECTO	Construcción
PERIODO DE INFORME	01 al 31 diciembre del 2022		
DATOS DEL PROPONENTE	Razónsocial del Promotor	GOBIERNO AUTÓNOMO ESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA	
	Representantelegal:	Ing. Jaime Guevara	
	Dirección:	Francisco de Orellana y 27 de Febrero. Puyo, Pastaza	
	Teléfono	(593) 032 994-220	
	Correo electrónico	info@pastaza.gob.ec	
	RUC del promotor	166000017001	

	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",	CONSORCIO MICH RUC 1691728943001
	Del 01 al 31 de diciembre de 2022	

DATOS DEL ICA	
No. De Informe	03
Plazo de ejecución:	90 días
Periodo de reporte	Del 01 al 31 de diciembre de 2022
% Avance económico	97.40 % (aproximadamente)
% Cumplimiento PMA	Cumplimiento 58.33 %
	No Cumplimiento 0,00 %
	No Aplicación 41.67 %

3.- OBJETIVO GENERAL

Implementar un sistema de gestión de cumplimiento a la **GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES**, emitido para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

4.- ALCANCE


Involucra a todas las actividades orientadas al cumplimiento de la "**GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES**" así como las responsabilidades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante la ejecución del proyecto.

5.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADA

En el periodo de reporte del 01 al 31 de diciembre de 2022, que son las siguientes:

VIAS AMURISAP

- Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada).
- Transporte de material pétreo de mejoramiento.

	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",	CONSORCIO MICH RUC 1691728943001
		Del 01 al 31 de diciembre de 2022

CANCHA

- Material pétreo kilo (minada, cargada y regada).
- Transporte de material pétreo kilo.

MURO DE GAVIONES


- Excavación sin clasificar (mov.de tierra)
- Desalojo de material con maquinaria.
- Relleno tendido y compactado capas 20cm-maquina.
- Muro de gaviones - calibre N 12.

6.- AREA INTERVENIDA

El área intervenida por el proyecto de "VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

7.- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"				
FASE CONSTRUCCIÓN				
ACTIVIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	Medio de verificación
7.1.- PLAN DE CONTINGENCIA				
Rotulación de información sobre contactos de emergencia	1			Se mantiene rótulos con nomenclatura de emergencia, destinando el prefijo 911 como contacto único en posibles casos de emergencia. ANEXO 01
7.2.- PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN				
Capacitación al personal de trabajos sobre primeros auxilios			1	Referirse al anexo 1 del ICA Nro. 1, se realiza charlas pre jornales.


	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",	CONSORCIO MICH RUC 1691728943001
		Del 01 al 31 de diciembre de 2022

Señalética móvil de prevención y concientización ambiental	1 ✓			En los frentes de trabajo se mantiene señalética preventiva y de control de tránsito. ANEXO 05
7.8.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL				
Entrega y control de los equipos de protección personal	1 ✓			Se continua con la supervisión del uso adecuado de los EPP. ANEXO 06
7.9.- PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA				
Retiro de maquinaria, equipos y materiales			1 ✓	Medida se ejecutará al terminar los trabajos constructivos del proyecto.

Se mantiene un rotulo informativo con datos informativos del proyecto. ANEXO 07

8.- TABLA RESUMEN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
7.1.- PLAN DE CONTINGENCIA	1	0	0
7.2.- PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN	0	0	2
7.3.- PLAN DE MANEJO DE DESECHOS	2	0	0
7.4.- PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS	0	0	1
7.5.- PLAN DE REHABILITACIÓN	0	0	1
7.6.- PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	1	0	0
7.7.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS	2	0	0
7.8.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	1	0	0
7.9.- PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA	0	0	1
TOTAL	7	0	5
%	58.33	0	41.67

	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",	CONSORCIO MICH RUC 1691728943001
		Del 01 al 31 de diciembre de 2022

Grafica de resultados del PMA del Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"




9.- PLAN DE ACCIÓN

De la evaluación del cumplimiento se desprenden las observaciones con las que se estructura el presente Plan de Acción, el cual permitirá subsanar las No Conformidades encontradas.

Durante el periodo de reporte del 01 al 31 de diciembre de 2022 no se identifican no conformidades.

Observación	Parámetro	Indicador	Medio de verificación	Estado

	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",	CONSORCIO MICH RUC 1691728943001
		Del 01 al 31 de diciembre de 2022

10.- CONCLUSIONES

Se ha dado cumplimiento a la guía de buenas prácticas ambientales, propuestas dentro del CERTIFICADO AMBIENTAL y Plan de Manejo Ambiental referido al proyecto de "CONSTRUCCIÓN DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", con Certificado ambiental Nro. MAAE-SUIA-DZDCH-2022-CA-0232 y Registro Ambiental Nro. MAE-RA-2016-235605, correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022.

Desarrollando las actividades contempladas dentro del Plan de Manejo Ambiental, se determina un cumplimiento del 58.33 % de medidas de CUMPLIMIENTO y un 41.67 de medidas NO APLICA (Medidas que ya fueron ejecutadas o medidas que dentro del periodo no se pueden aplicar).

11.- RECOMENDACIONES

- Se recomienda al contratista mantener y cumplir las medidas implementadas dentro del Plan de Manejo Ambiental, durante el desarrollo de las actividades del proyecto como se lo ha realizado hasta la fecha.
- Mantener las áreas de trabajo limpias y realizar la recolección de todo desecho generado por las actividades de construcción.
- El control y uso adecuado del EPP del personal de obra

12.- FIRMA DE RESPONSABILIDAD




Firma de la responsable por:
**MARIA DE
 LOURDES CALLE
 VILLA**

Lda. María de Lourdes
 Calle Villa
 PROCURADOR COMÚN
 CONSORCIO MICH



Firma de la responsable por:
**JORGE LUIS
 MOPOCITA**

Ing. Jorge Mopocita
 TÉCNICO AMBIENTAL
 CONSORCIO MICH

	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",	CONSORCIO MICH RUC 1691728943001
		Del 01 al 31 de diciembre de 2022


13.- ANEXOS

ANEXO 01.- Rotulación de información sobre contactos de emergencia.




ANEXO 02.- Se mantiene contenedores para recolección de desechos debidamente identificados.



	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",	CONSORCIO MICH RUC 1691728943001
		Del 01 al 31 de diciembre de 2022

ANEXO 03.- ICA correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022.

	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",	CONSORCIO MICH RUC 1691728943001
		Del 01 al 31 de diciembre de 2022

CONSORCIO MICH.

RUC: 1691728943001

INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

DEL PROYECTO:

**"CONSTRUCCIÓN DE VARIAS VÍAS,
MURO DE PROTECCIÓN EN EL
SECTOR DE AMURISAP Y EN EL
SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA
TARQUI, CANTÓN PASTAZA,
PROVINCIA DE PASTAZA"**

CODIGO

COTO-GADPPz-011-2022




Del 01 al 31 de diciembre de 2022

Email: mcallevilla@yahoo.com

1

Email: mcallevilla@yahoo.com

13

	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",	CONSORCIO MICH RUC 1691728943001
		Del 01 al 31 de diciembre de 2022

ANEXO 04.- Se delimitan las áreas de trabajo y zonas de peligro.




ANEXO 05.- Ubicación de señalización preventiva de tránsito.





ANEXO 06.- Supervisión del uso adecuado de los EPP, al personal de obra.



	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",	CONSORCIO MICH RUC 1691728943001
	Del 01 al 31 de diciembre de 2022	

Capacitación al personal de trabajo sobre procedimientos en caso de emergencias			1	Referirse al anexo 1 del ICA Nro. 1, se realiza charlas pre jornales.
7.3.- PLAN DE MANEJO DE DESECHOS				
Delimitación y rotulación de áreas de disposición temporal de desechos y escombros.			1	Se mantiene áreas para el acopio de desechos y escombros de existir; los mismos que cuentan con su debida rotulación. ANEXO 02
Ubicación de contenedores provisionales para la recolección de desechos generados durante la fase de construcción.			1	Se mantienen contenedores de 55 gl., debidamente identificados para el acopio de desechos sólidos. ANEXO 02
7.4.- PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS				
Socialización previa a la construcción del proyecto con los beneficios del predio			1	Actividad desarrollada previo al inicio de actividades del proyecto.
7.5.- PLAN DE REHABILITACIÓN				
Revegetación de áreas degeneradas			1	Al terminar las actividades de la fase constructiva se iniciará con los trabajos de revegetación de áreas intervenidas
7.6.- PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO				
Control y seguimiento al plan de manejo ambiental.			1	Se presenta el ICA del periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022. ANEXO 03
7.7.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS				
Zonificación de áreas de trabajo			1	Los frentes de trabajo se mantienen con delimitación de áreas debidamente señaladas. ANEXO 04



PROYECTO:

"CONSTRUCCIÓN DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",

CONSORCIO MICH

RUC 1691728943001

Del 01 al 31 de diciembre de 2022



ANEXO 07.- Rotulo informativo del proyecto.





Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

PROYECTO:

"CONSTRUCCIÓN DE VARIAS VÍAS, MURO DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE AMURISAP Y EN EL SECTOR LOS BANEÑOS, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",

CONSORCIO MICH

RUC 1691728943001

Del 01 al 31 de diciembre de 2022

