GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 1725

Fecha: 31/08/2021

Asiento N° 3864 Compromiso N° 209 Retención N° 001-010-000018422

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR BDE CREDITO Cta Cte No 76210011 Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **CONSORCIO FATIMA** **USD 67,756.20**

LA SUMA DE: **SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS Dolares 20/100 Ctv**

S

PUYO, 31 de Agosto del 2021

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO FATIMA.- PAGO DE LA PLANILLA DE AVANCE NRO. 23 DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA.

Usuario: FANNY

DOCUMENTOS

Fecha	Documento	No	Autorización	Valor
30/08/2021	FACTURA	001002000000044	3440000004415	130,278.01

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 2117209353	CONSORCIO FATIMA	67,756.20		

TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD 67,756.20

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IVA	13,958.36	
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORI	46,527.86	
1.2.4.97.03.001	ANTICIPO POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTERIORES-CONSTRUCCIO	46,527.86	
1.5.1.51.07.001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	116,319.65	
[illegible].3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	114,284.06	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	116,319.65	
1.1.1.03.01.009	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / BDE CREDITO		67,756.20
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES		46,527.86
1.2.4.97.03.001	ANTICIPO POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTERIORES-CONSTRUCCION DE OBRAS		46,527.86
1.2.4.97.08.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTER. DE GAD'S Y EMPR. PÚBL. CONS		46,527.86
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		116,319.65
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS		114,284.06
2.1.3.75.01.112	IMPUESTO A LA RENTA 1.75%		2,035.59
2.1.3.81.14.001	CXP IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI		13,958.36
	SUMAN o PASAN USD	453,937.44	453,937.44

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D5[illegible].518.756107.000.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		116,319.65	114,284.06

Ing. Jaime Guevara B.
Prefecto Provincial

Lic. Marilú Ordoñez
Director Financiero (e)

Lic. Marcelo Cueva
Contadora General

Lic. Carlos Tello
Tesorera

TR 118
31-08-2021

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 1725

Fecha: 31/08/2021

Asiento N° 3864 Compromiso N° 209 Retención N° 001-010-000018422

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR BDE CREDITO Cta Cte No 76210011 Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **CONSORCIO FATIMA** **USD 67,756.20**

LA SUMA DE: **SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS Dolares 20/100 Ctv**

S

PUYO, 31 de Agosto del 2021

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO FATIMA.- PAGO DE LA PLANILLA DE AVANCE NRO. 23 DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA.

Usuario: FANNY

	TOTAL GASTOS USD	0.00	116,319.65	114,284.06
380108.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GADPS		46,527.86	46,527.86
	TOTAL INGRESOS USD		46,527.86	46,527.86

1.75% = 2035.59
Ant = 46527.86
Banc = 67756.20

Ing. Jaime Guevara B.
Prefecto Provincial

Lic. Marilú Ordoñez
Director Financiero (e)

Lic. Marcelo Cueva
Contadora General

Lic. Carlos Tello
Tesorera

CONSORCIO FÁTIMA

CONSORCIO FATIMA

Dirección matriz: AV LUIS A MARTINEZ SN Y GARCIA MORENO
Dirección sucursal: AV LUIS A MARTINEZ SN Y GARCIA MORENO
Teléfono: 032790031
Email: consorciofatimapuyo@hotmail.com
Contribuyente Especial No.:
Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1691725347001

FACTURA

No.: 001-002-000000044

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
3008202101169172534700120010020000000440000004415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/8/2021 9:44:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO
3008202101169172534700120010020000000440000004415

Razón Social / Nombre y Apellidos: GAD PROVINCIAL PASTAZA

Identificación: 1660000170001 **Fecha Emisión:** 30/08/2021 **Guía Remisión:**

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Uni. Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PLANILLA	1,000000	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N23 CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO DESCENTRALIZADO DE PASTAZA		116.319,650000	0,00	116.319,65

Información Adicional

Email cliente: financiero@pastaza.gob.ec,consorciofatimapuyo@hotmail.com

Dirección cliente: FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO PASTAZA

Teléfono: 032994220

Comentarios: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N23 CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO DESCENTRALIZADO DE PASTAZA

SUBTOTAL 12%	116.319,65
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	116.319,65
TOTAL DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	13.958,36
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL (USD)	**130.278,01**

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	130.278,01	0	dias

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROMISO No: 209

Transacción No: 8473
Fecha: 30/08/2021
Proveedor: CONSORCIO FATIMA
Identificación: Ruc 1691725347001

Programa: 05 FUNCION SERVICIO CONECTIVIDAD VIALIDAD Y ENERGIA
SubPrograma: 01 CONECTIVIDAD VIALIDAD Y ENERGIA
Proyecto: D511 BANCO DE DESARROLLO
Actividad: 518 BANCO DE DESARROLLO CREDITO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
FACTURA	0010020000044	30/08/2021	130,278.01	CONTABILIDAD
MEMORANDO	1705-M	23/07/2021	130,278.01	CONTABILIDAD

DETALLE:
PLANILLA 23 DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA.

JOSE

Partida Presupuestaria		Valor	Disponibilidad Previa
05.01.D511.518.750107.000.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	116,319.65	2,730,008.32
	Total =>	116,319.65	2,730,008.32

Firmado electrónicamente por:
JOSE MAURICIO MARIN MONTERO

Jefatura Presupuestos

Control Previo

GAD PROVINCIAL DE PASTAZA
CONTROL PREVIO

CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, PROVINCIA DE PASTAZA				FINANCIERO	
CONTRATISTA:	CONSORCIO FATIMA	TIPO DE PROCESO		TIPO DE PROCESO	
DOCUMENTO:		CONTRATO	PLANILLA	CONTRATO	PLANILLA
CONCEPTO:	*PLANILLA DE AVANCE No. 23*		X		23
FECHA DEL DOCUMENTO:	19 de julio de 2021				
TIPO DE PROCESO	LICO-003-005-2019				
VALOR INCLUIDO IVA:	$ 213.845,68	APLICA		APLICA	
	CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS	SI	NO	SI	NO
1	Requerimiento	X			
2	Estudios del proyecto				
3	Informe técnico y económico				
4	Factibilidad Ambiental				
5	Certificación POA				
6	Certificación Presupuestaria				
7	Convenio				
8	Pliegos del Procedimiento				
9	Informe Técnico de Evaluación de Ofertas				
10	Resolución de Adjudicación				
11	Garantía Original de fiel Cumplimiento del contrato				
12	Garantía Original de Buen Uso del Anticipo				
13	Certificado de no Adeudar al GADPPz				
14	Documentos Personales / Representante Legal				
15	Certificación Bancaria				
16	Certificado de cumplimiento Tributario (SRI)				
17	RUC Actualizado				
18	Contrato original y disposición escrita de trabajo (proceso completo)				
	Planilla de Reajuste de de precios del Anticipo				
19	Orden de Inicio de Trabajos				
20	Planilla de obra con informe de Fiscalización (Fiscalizador Externo)	X			
21	Anexos de Obra	X			
22	Cuadro de Diferencia de Cantidades	X			
23	Conformidad Ambiental				
24	Informe de avance de Obra de Administrador de contrato	X			
25	Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales (IESS) Planilla	X			
26	Certificado de no ser obra nueva				
27	Multa				
28	Autorizacion de la máxima Autoridad para prórroga de Plazos				
29	Autorizacion de la máxima Autoridad para Rubros Nuevos				
30	Certificado que no es obra nueva				
31	Solicitud de recepción de Obra				
32	Solicitud de pago del Administrador del Contrato	X			
33	Solicitud de pago del Director de la Unidad al Financiero	X			
34	Factura/Nota de Venta				
35	Validación de la factura/Nota de Venta				
36	Acta de repecion provisional				

OBSERVACIONES:

Revisado por:

DANIEL ANIBAL RAMOS CAMPANA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE DEL TRAMITE

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICAS-2021-1705-M

Puyo, 23 de julio de 2021

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA
Pastaza
Fecha: 26 JUL 2021
Hora: 8:36

PARA: Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
Directora Financiera (E)

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO PLANILLA 23 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, PROVINCIA DE PASTAZA

De mi consideración:

Señora Directora, en atención al OFICIO No. 047-CALB-2021-PLAFIS-GADPPz suscrito por la ingeniera Carolina León Burgos, Fiscalizadora Externa, y de conformidad a lo establecido en el contrato celebrado entre el GADPPz y el CONSORCIO FÁTIMA para el "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) – I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA", CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO.- "… se cancelará mediante presentación de planillas mensuales por avance de obra debidamente aprobadas y legalizadas por fiscalización y autorizadas por el Administrador del Contrato…", me permito remitir el informe de Fiscalización y la planilla de Avance N° 23 con los siguientes montos ejecutados:

*Planilla de avance No. 23 (100%)	$116,319.65
*Planilla de excedentes No. 23	$34,853.48
*Planilla de Rubros nuevos No. 23	$39,760.51
*Planilla de avance No. 23 acumulada	$190,933.64

*Valor que no incluye IVA

Al respecto solicito se proceda con el pago pertinente de la planilla.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: JEFE (A) DE PRESUPUESTO
Pastaza
Fecha: 26 JUL 2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ejecutar el control previo al compromiso Verificando disponibilidad presupuestaria, y emitir certificación financiera, conforme a las Leyes y Reglamentos vigentes.

Documento firmado electrónicamente

Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL
Pastaza
Fecha: 26 JUL 2021

Ejecutar el control previo y efectuar La contabilización, conforme leyes y Reglamentos vigentes.

Anexos:
- informe_de_administrador_de_contrato_(2).pdf
- informe_fiscalizacion_junio_2021_planilla_23_bde-signed_(1).pdf
- oficio_047_ingreso_planilla_n°23_de_obra-signed.pdf
- 1-planilla_23_consolidada-signed-signed.pdf
- 2_0-planilla_22_cont_+_rn_100%-signed-signed01977410016270572 95.pdf

Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICAS-2021-1705-M

Puyo, 23 de julio de 2021

- 2_1-rubros_contractuales_100%-signed-signed_(1)0837102001627057295.pdf
- 2_2-rubros_nuevos_100%-signed-signed_(2)0077739001627057296.pdf
- 3_0-planilla_22_exc_rc+rn-signed-signed0708720001627057296.pdf
- 3_2-excedente_rubros_nuevos-signed-signed_(2)0950232001627057296.pdf
- diferencia_de_cantidades_p23-signed-signed.pdf
- 3_2-excedente_rubros_nuevos-signed-signed_(2)0003141001627057309.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sr. Arq. Daniel Alejandro Manosalvas Sanchez - Fiscalizador 1

Firmado electrónicamente por:
DANIEL ANIBAL
RAMOS CAMPANA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux - yasuni.pastaza.gob.ec producción

Informe Técnico No. 023-GADPPz-OOPP-DR-2021

Puyo, 19 de julio de 2021

Asunto: Planilla de Avance N° 23 del proceso LICO-GADPPz-001-2018

En base a la RESOLUCIÓN N° 002-GADPPz-2019 en la cual se me designa como Administrador de Contrato, me permito informar: El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza suscribió un contrato con el CONSORCIO FÁTIMA, contratista del proceso: LICO-GADPPz-001-2018 para la **"CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) – I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA"** con un presupuesto referencial de USD 9´622,634.2197 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO DÓLARES CON, 2197/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir IVA.

Con fecha 08 de junio de 2021, mediante OFICIO No. 047-CALB-2021-PLAFIS-GADPPz la ingeniera CAROLINA LEÓN BURGOS entrega la Planilla de Avance N° 23; la documentación de la Planilla es revisada, analizada y aprobada por la Administración de Contrato el 19 de julio de 2021.

#	REFERENCIA	DETALLE
1.	Contrato No.	LICO-GADPPz-001-2018
2.	Fecha de suscripción	15 de marzo del 2019
3.	Monto del Contrato Principal	USD 9´622,634.2197 sin IVA
4.	Objeto del Contrato	"CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) – I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA"
5.	Porcentaje del anticipo	40 %
6.	Monto del Anticipo	USD 3´849,053.69 sin IVA
7.	Plazo Contractual	(365) SETENTA Y CINCO DÍAS CALENDARIO

Los valores y cantidades ejecutados del contrato que constan en la planilla de Avance N° 23 son los siguientes:

- Periodo de la planilla de Avance N° 23: 01-jun-2021 al 30-jun-2021
- Plazo contractual: 365 Días calendario.
- Anticipo: 40%
- Monto total planilla de **Avance Contractuales** N° 23: USD 116,319.65
- Monto total planilla de **Excedentes de rubros contractuales** N° 23: USD 34,853.48
- Monto total planilla de **Rubros nuevos** N° 23: USD 39,760.51

- **Monto total planilla consolidado N° 23: USD 190,933.64**
- Porcentaje de avance acumulado del proyecto: 95.05%
- Porcentaje de avance parcial del proyecto: 1.98%

Anexo Fotográfico:





De acuerdo a la Planilla de Avance N° 23, aprobada bajo responsabilidad de la FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO, y a su vez se encuentra aprobada por el Administrador de Contrato, el valor ejecutado en este periodo es el siguiente:

*Planilla de avance No. 23 (100%)	$116,319.65
*Planilla de excedentes No. 23	$34,853.48
*Planilla de Rubros nuevos No. 23	$39,760.51
*Planilla de avance No. 23 acumulada	$190,933.64

*Valor que no incluye IVA

El valor acumulado corresponde a un avance parcial del proyecto de 95.05%.

Es todo cuanto puedo informar para los fines pertinentes.

Atentamente,

DANIEL ANIBAL RAMOS CAMPANA

Firmado digitalmente por DANIEL ANIBAL RAMOS CAMPANA
DN: cn=DANIEL ANIBAL RAMOS CAMPANA, o=BCE, ou=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION
Motivo: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2021-07-19 12:16:55:00

Ing. Daniel Ramos C.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FECHA 14 JUL. 2021
RECIBIDO
HORA 14:19 N°

PONCE & LEÓN
CONSULTORÍA Y OBRAS CIVILES

Construcción Hangares del GADPPz
Fiscalización Externa

OFICIO No. 047–CALB – 2021-PLAFIS-GADPPz

Asunto: INGRESO del informe de fiscalización, anexos y planillas del periodo N°23 del contrato de obra LICO-GADPPz-001-2018

Puyo, 14 de julio del 2021
Señor, Ingeniero
Daniel Ramos
ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA LICO-003-005-2019
En su Despacho. –

De mis consideraciones:
Quien suscribe, responsable del CONTRATO DE FISCALIZACIÓN de código LCC-GADPPz-003-2018, legalmente celebrado el 06 de marzo de 2019, a satisfacción de las partes, cuyo objeto contractual señala: ***" FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, PROVINCIA DE PASTAZA."*** en virtud de mi condición de fiscalizadora, y por las competencias prescritas en los artículos 80 de la LOSNCP, 121 del RGLOSNCP, y en concordancia con el 408-19 de las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado – NCICG, a usted con el debido respeto, comparezco y expongo lo siguiente:

Señor administrador de contrato, me dijo hacia su autoridad con el fin de poner en su consideración, una vez subsanados y cumplidos todos los requisitos previstos en el Contrato en cita por la parte contratista, y revisados por fiscalización, elevo a su autoridad, las planillas de obra, y el informe de fiscalización del VIGÉSIMO TERCER periodo del Contrato de ejecución de obra LICO-GADPPz-001-2018, planillas y anexos, planos as-built, todos aprobados por fiscalización y demás requisitos para su análisis y aprobación correspondiente, al igual que la respectiva planilla de fiscalización del mencionado periodo.
A la espera del análisis respectivo de la documentación, y la positiva respuesta presente en el informe correspondiente.

Las notificaciones que me corresponda las recibiré de acuerdo a lo que estipula la cláusula vigésima segunda del mentado contrato, Provincia de Pastaza, Cantón Pastaza, Ciudad del Puyo, Barrio el Recreo, calle uno s/n y los helechos; y al correo electrónico: kritoleon1821@gmail.com, alexander180108@yahoo.es.
Para que conste y surta valor a los oportunos y debidos efectos, con celebridad a mi pedido, le expreso mis agradecimientos.

Cordialmente

Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA LEON BURGOS

Ing. Mgs. Carolina León Burgos
FISCALIZADOR EXTERNO
180323178-4

CAROLINA LEÓN BURGOS
INGENIERA CIVIL – MGS. ESTRUCTURAS SISMO RESISTENTES
Puyo, Barrio El recreo, Calle uno y los Helechos
E-mail: kritoleon1821@gmail.com - alexander180108@yahoo.es
TELF.: 0984279657 - 032 792 894

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

M E M O R A N D O N° 28-OO.PP

FECHA : 5 de julio de 2021
DE : FISCALIZACION EXTERNA
PARA : Director de Obras Publicas - Administrador de Contrato
ASUNTO : Solicitud de pago

Agradeceré proceder a cancelar a favor del CONSORCIO FÁTIMA, contratista de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA" , el valor de USD 114560.184 conforme al siguiente detalle:

VALOR RUBROS CONTRACTUAL PLANILLA 23	$ 90703.88
VALOR RUBROS NUEVOS PLANILLA 23	$ 23856.31
REAJUSTE DE LA PLANILLA	
Total	$ 114560.18

Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA LEON BURGOS
Ing. Carolina León
FISCALIZADORA EXTERNA

OBSERVACION:
De acuerdo a la, **CLUASULA NOVENA: REAJUSTE DE PRECIOS.-** Conforme lo estipulado en el segundo inciso del Art. 131 del RGLONSNCP, el Contratista renuncia expresamente al reajuste de precios que se pudiere originar del presente Contrato.
Deacuerdo al contrato Modifictorio y Complementario se tienen rubros contractuales y rubros nuevos los mismos que se encuentra desglozados como indica el anexo.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
	1.- VIAS Y PARQUEADEROS											
	PRELIMINARES											
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE C. RODADuRA	km	1.08	494.59	534.15720	1.08		1.08	100%	534.16		534.16
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)	m3	12779.98	0.82	10479.58360	35935.51	1870.68	37806.19	296%	29467.12	1533.96	31001.08
3	EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ESTRuCTuRAS mENORES	m3	86.00	4.69	403.34000							
4	TuBERÍA DE ACERO CORRuGADO D= 1.20 m ,E=2.5 mm, mP-100	m	18.00	239.45	4310.10000	25.00		25.00	139%	5986.25		5986.25
5	muRO DE H.S. F'C=180KG./Cm2 TIPO B(CABEZALES)	m3	22.00	188.41	4145.02000	22.00		22.00	100%	4145.02		4145.02
	MATERIAL PETREO											
6	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)	m3	51821.91	2.92	151319.97720	43597.97	1911.56	45509.53	88%	127306.06	5581.76	132887.82
7	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3	m3	2589.98	10.78	27919.98440	3619.96	202.55	3822.51	148%	39023.17	2183.51	41206.68
8	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS	m3	1942.49	17.21	33430.25290	2644.85	292.01	2936.86	151%	45517.87	5025.49	50543.36
9	TRANSPORTE mATERIAL PETREODE mEJORAmIENTO	m3-km	937976.72	0.28	262633.48104	741378.36	34599.31	775977.67	83%	207585.94	9687.81	217273.75
10	TRANSPORTE DE mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3	m3-km	117701.06	0.28	32956.29680	65521.34	6189.55	71710.89	61%	18345.98	1733.07	20079.05
11	TRANSPORTE DE mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS	m3-km	34964.82	0.28	9790.14960	47871.85	5285.37	53157.22	152%	13404.12	1479.90	14884.02
	CAPA DE RODADURA											
	AMBIENTALES											
12	SEÑALES INFORmATIVAS (2.40X1.20)m	u	2.00	250.92	501.84000	2.00		2.00	100%	501.84		501.84
13	SEÑALES REGLAmENTARIAS (0.75 X 0.75)m	u	2.00	115.45	230.90000	2.00		2.00	100%	230.90		230.90
14	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)m	u	2.00	115.45	230.90000	2.00		2.00	100%	230.90		230.90
	CONSOLIDACION DE PLATAFORMAS											
15	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)	m3	43057.34	2.92	125727.44448	43057.34		43057.34	100%	125727.44		125727.44
16	TRANSPORTE mATERIAL PETREODE mEJORAmIENTO	m3-km	779043.38	0.28	218132.14640	779043.38		779043.38	100%	218132.15		218132.15
17	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV DE TIERRA)	m3	69683.19	0.82	57140.21170	69683.18		69683.18	100%	57140.21		57140.21
	2.- ESTABILIZACION TALUDES											
	PRELIMINARES											
18	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	4030.36	1.14	4594.60470		4030.36	4030.36	100%		4594.61	4594.61
19	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATA	m2	4613.56	1.46	6735.79030	2109.52	1292.01	3401.53	74%	3079.90	1886.33	4966.23
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
20	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA) ESTRuCTuRAS	m3	9606.48	4.18	40155.08640	5718.04	48.28	5766.32	60%	23901.41	201.81	24103.22
21	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	205.06	17.93	3676.72580	54.89		54.89	27%	984.18		984.18
22	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3		13.72								
23	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	85716.60	2.82	241720.79875	106119.24	1870.68	107989.92	126%	299256.26	5275.32	304531.58
	SISTEMA DE DRENAJE PLATAFORMA											
24	RASANTEO mANuAL DE ZANJAS	m3		3.22								
25	SumINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL PARA SuBDREN (TIPO NT 2400 O Sim	m2	1498.63	3.06	4585.80780	1469.00		1469.00	98%	4495.14		4495.14
26	SumINISTRO Y COLOCACIÓN DE mATERIAL FILTRANTE A mAQuINA (PIEDRA BOLA	m3	524.58	15.19	7968.37020	457.77		457.77	87%	6953.53		6953.53
27	SumINISTRO Y COLOCACIÓN mANuAL DEmATERIAL FILTRANTEPARA DRENES 1 P	m3	279.52	20.70	5786.06400	212.86		212.86	76%	4406.20		4406.20
28	SumINISTRO Y COLOCACIÓN DE TuBERIAP.V.C DIAm. INT.=160mm, PERFORADA	m		14.38								
29	Sum.Y COLOCACIÓN TuBERIA PVC. CORRuGADA DIAm INT.=160mm S5	m		9.80								
30	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT. 220 mm S5	m		14.68								
31	Sum.Y COLOCACIÓN TuBERIA PVC. CORRuGADA DIAm. INT.=315mm S5	m		20.16								

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
32	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 315A 160mm PVC Y/O POLIETILENO	u		24.07								
33	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 220A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u		21.28								
	SISTEMA TIERRA ARMADA											
34	GEOTEXTIL TEJIDO- 2400 T PARA muRO DE CONTENCION TIERRA ARmADA	m2	21276.67	3.06	65106.59490	21288.73		21288.73	100%	65143.51		65143.51
35	GEOmALLA BX-1100 TENSAR	m2	7927.94	3.19	25290.11265	7978.18		7978.18	101%	25450.39		25450.39
36	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	4074.59	17.33	70612.64470	3860.48		3860.48	95%	66902.12		66902.12
37	muRO DE GAVIONES TRIPLE TORSION	m3	3632.00	60.08	218210.56000	2866.00		2866.00	79%	172189.28		172189.28
	3.- REDES DE+E59:E141 ALCANTARILLADO SA+E59:E141NITAR											
	ALCANTARILLADO SANITARIO											
	PRELIMINARES											
38	REPLANTEO Y NIVELACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	m	490.58	1.81	887.94980	1575.58		1575.58	321%	2851.80		2851.80
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
39	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17.93								
40	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	3460.00	4.18	14462.80000	4640.34		4640.34	134%	19396.62		19396.62
41	ENTIBADO DE ZANJA	m2	160.00	11.56	1849.60000		160.00	160.00	100%		1849.60	1849.60
42	RAZANTEO DE ZANJA E= 0 20m	m2	240.00	3.22	772.80000		240.00	240.00	100%		772.80	772.80
43	ARENA DE KILO, TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	320.00	18.13	5801.60000	1135.92		1135.92	355%	20594.23		20594.23
44	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	1800.00	13.72	24696.00000	2185.73		2185.73	121%	29988.22		29988.22
45	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	900.00	6.32	5688.00000	1736.71		1736.71	193%	10976.01		10976.01
46	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	1440.00	2.82	4060.80000	3039.00		3039.00	211%	8569.99		8569.99
	TUBERIAS PVC ALCANTARILLADO											
47	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=160 mm S6	m	89.12	9.70	864.46400	273.12		273.12	306%	2649.26		2649.26
48	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT = 200 mm S6	m	450.00	15.28	6876.00000	534.05		534.05	119%	8160.28		8160.28
49	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 300 mm S5	m	50.00	20.22	1011.00000	50.00		50.00	100%	1011.00		1011.00
50	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=364 mm S6	m		23.27								
51	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 450 mm S5	m	20.00	44.36	887.20000							
52	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 220A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u	2.00	21.28	42.56000							
53	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 335A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u		24.14								
	POZOS Y CAJAS											
54	HORmIGON SImPLE EN POZOS F'C=180KG/Cm2-mEZCLA A mANO	m3	30.00	177.00	5310.00000	54.38		54.38	181%	9625.26		9625.26
55	ENCOFRADO mETALICO PARA POZOS DE REVISION	m3	30.00	20.36	610.80000	54.38		54.38	181%	1107.18		1107.18
56	SumINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS Y CERCOS H.F-210LB	u	12.00	178.06	2136.72000	19.00		19.00	158%	3383.14		3383.14
57	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm^0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	7.00	90.42	632.94000							
	ALCANTARILLADO PLUVIAL											
	PRELIMINARES											
58	REPLANTEO Y NIVELACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	m	1378.44	1.81	2494.97640	2747.01		2747.01	199%	4972.09		4972.09
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
59	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17.93								
60	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	9280.92	4.18	38794.26389	5308.06		5308.06	57%	22187.69		22187.69
61	ENTIBADO DE ZANJA	m2	308.42	11.56	3565.33520	58.42	250.00	308.42	100%	675.34	2890.00	3565.34

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
62	RAZANTEO DE ZANJA E= 0 20m	m2	849.00	3.22	2733.78000		849.00	849.00	100%		2733.78	2733.78
63	ARENA DE KILO, TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	245.00	18.13	4441.85000	1180.25		1180.25	482%	21397.93		21397.93
64	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	5196.31	13.72	71293.38000	2777.42		2777.42	53%	38106.20		38106.20
65	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	2130.00	6.32	13461.60000							
66	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	2144.69	2.82	6048.01885	3942.51		3942.51	184%	11117.87		11117.87
	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO PLUVIAL											
67	Suml E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 250 mm S5	m	608.56	16.51	10047.32560	425.52		425.52	70%	7025.34		7025.34
68	Suml E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 300 mm S5	m	140.00	20.22	2830.80000	134.29		134.29	96%	2715.34		2715.34
69	Suml E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=364 mm S6	m	50.00	23.27	1163.50000	600.00		600.00	1200%	13962.00		13962.00
70	Suml E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 450 mm S5	m	12.00	44.36	532.32000							
71	Suml E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 600 mm S5	m	878.35	107.84	94721.26400	605.84		605.84	69%	65333.79		65333.79
	POZOS Y CAJAS											
72	HORmIGON SImPLE EN POZOS F'C=180KG/Cm2-mEZCLA A mANO	m3	56.00	177.00	9912.00000	70.44		70.44	126%	12467.88		12467.88
73	ENCOFRADO mETALICO PARA POZOS DE REVISION	m3	56.00	20.36	1140.16000	70.44		70.44	126%	1434.16		1434.16
74	SumINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS Y CERCOS H.F-210LB	u	24.00	178.06	4273.44000	32.00		32.00	133%	5697.92		5697.92
75	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	22.00	90.42	1989.24000							
76	CAJA DE H.S. PARA REJILLA mETÁLICA 0.40 por 1.00 por 1.00 (F'C= 180 KG/Cm2)	u	40.00	95.58	3823.20000	24.00		24.00	60%	2293.92		2293.92
77	SumINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA H.F. (1.00 por 0.40 por 0.05)110 KG	u	40.00	130.84	5233.60000	27.00		27.00	68%	3532.68		3532.68
	FOSA SEPTICA, FILTRO ANAEROBICO Y SECADO DE LODOS											
	PRELIMINARES											
78	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1.14								
79	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATA	m2	63.51	1.46	92.72460	217.68		217.68	343%	317.81		317.81
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
80	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17.93								
81	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	211.71	4.18	884.93651	217.68		217.68	103%	909.89		909.89
82	ENTIBADO DE ZANJA	m2		11.56								
83	RAZANTEO DE ZANJA E= 0 20m	m2		3.22								
84	ARENA DE KILO, TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3		18.13								
85	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	118.67	13.72	1628.15240							
86	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	20.00	6.32	126.40000							
	TUBERIAS PVC ALCANTARILLADO											
87	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT = 200 mm S6	m	26.50	15.28	404.92000	26.50		26.50	100%	404.92		404.92
	HORMIGONES											
88	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRAN	m3	3.41	163.18	556.68857	5.50		5.50	161%	897.73		897.73
89	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRAN	m3	31.11	249.88	7773.10602	30.66		30.66	99%	7661.32		7661.32
90	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F'C=180 KG/Cm2-50por cientoP)Clm	m3		169.86								
	ACERO ESTRUCTURAL											
91	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	3652.36	1.68	6135.96542	3652.36		3652.36	100%	6135.97		6135.97
92	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	100.00	2.76	276.00000							
93	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORRO	Kg	100.00	0.11	11.00000							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
	CERRAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO											
94	CERRAmIENTO DE ALAmBRE DE PUAS-6 HILOS	m	60.00	2.14	128.40000							
95	PuERTA DE mALLA + TuBO ISO II 2"	m2	4.00	59.32	237.28000	4.80		4.80	120%	284.74		284.74
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES											
96	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	298.58	10.27	3066.41660	135.74		135.74	45%	1394.05		1394.05
97	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPO	m2	30.00	4.72	141.60000	60.86		60.86	203%	287.26		287.26
	PIEZAS SANITARIAS											
98	ACCESORIOS PLANTA DE TRATAmIENTO (Global)	u	1.00	5101.40	5101.40000	1.00		1.00	100%	5101.40		5101.40
99	FILTRO DE GRAVA CALSIFICADA DE 2 1/2" A 1/2"	m3	9.00	28.28	254.52000	2.64		2.64	29%	74.66		74.66
100	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u	9.00	75.58	680.22000	7.00		7.00	78%	529.06		529.06
	4.- NAVE PRINCIPAL- TALLERES-ADMINISTRATIVO-BODEGA GE											
	PRELIMINARES											
101	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	12327.08	1.14	14052.87120	12327.08		12327.08	100%	14052.87		14052.87
102	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATA	m2	7949.46	1.46	11606.21160	8532.44		8532.44	107%	12457.36		12457.36
103	ACOmETIDA E INST. DE AGuA POTABLE PROVISIONAL PVC 3/4"	m	90.00	8.44	759.60000	90.00		90.00	100%	759.60		759.60
104	ACOmETIDA E INST. ELÉCTRICA PROV. TuBERÍA CONDuIT 1" CABLENo.8	m	90.00	27.58	2482.20000	185.00		185.00	206%	5102.30		5102.30
105	SONDEOS DE SuELOS (COmPROBACION IN SITu) NEC-15	m	68.00	55.43	3769.24000	68.00		68.00	100%	3769.24		3769.24
106	CERRAmIENTO PROVISIONAL LISTONES + PLANCHAS DE ZINC	m2	1018.35	11.69	11904.51150	1018.35		1018.35	100%	11904.51		11904.51
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
107	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	7030.26	4.18	29386.48680	7072.92		7072.92	101%	29564.81		29564.81
108	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17.93								
109	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	4011.39	17.33	69517.38870	4015.71		4015.71	100%	69592.25		69592.25
110	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	2274.76	13.72	31209.70720	2274.97		2274.97	100%	31212.59		31212.59
111	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	7030.26	2.82	19825.33320	7030.26		7030.26	100%	19825.33		19825.33
	HORMIGONES											
112	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRAN	m3	196.42	163.18	32051.81560	208.93		208.93	106%	34093.26		34093.26
113	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF'C = 280KG./Cm2 IN	m3	1088.67	225.97	246006.75990	1121.66		1121.66	103%	253461.51		253461.51
114	HORmIGON PREmEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CO	m3	282.96	283.42	80196.52320	288.90		288.90	102%	81880.55		81880.55
115	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOm	m3	337.45	289.16	97577.04200	365.96		365.96	108%	105820.42		105820.42
116	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F'C=180 KG/Cm2-50por cientoP)Cim	m3	650.01	169.86	110410.69860	682.42		682.42	105%	115915.86		115915.86
117	HORmIGON PREmEZCLADO LOSA/ VIGAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BO	m3	200.00	193.75	38750.00000	239.02		239.02	120%	46310.35		46310.35
	ACERO ESTRUCTURAL											
118	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	188476.09	1.68	316639.83120	201660.55		201660.55	107%	338789.72		338789.72
119	PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A (36, 572, 325,193,108) (PROY. MONTAJE GF	Kg	517607.93	2.76	1428597.87576	558712.31		558712.31	108%	1542045.98		1542045.98
120	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORRO	Kg	499962.86	0.11	54995.91416	344120.53	155842.33	499962.86	100%	37853.26	17142.66	54995.92
121	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2	14243.58	4.84	68938.91268	13519.61	50.85	13570.46	95%	65434.93	246.11	65681.04
122	DECK E=0.75mm PLACA COLABORANTE-mD2-GA-101m	m2	2520.48	18.37	46301.21760	2564.28		2564.28	101.74%	47105.81		47105.81
	CONTRAPISOS											
123	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3 (CONTRAPISO E=20Cm. COmPAC. 100por ciento	m3	1043.38	10.78	11247.63640	1062.76		1062.76	102%	11456.55		11456.55
124	mATERIAL DE BASE CLASE 2 (CONTRAPISO E=15Cm, COmPAC. 100por ciento P.E	m3	1301.40	24.55	31949.37000	778.38		778.38	60%	19109.23		19109.23

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
125	CONTRAPISO HORm.S. PREmEZ. F´C=280KG/Cm2 E= 4 PuLG. (SIN BASE)	m2	1710.63	21.50	36778.54500	1344.11		1344.11	79%	28898.26		28898.26
126	JuNTA ASERRADA DILATACION PISO (INC. CORDON, Y SELLO)	m	4784.70	2.59	12392.37300	2292.35		2292.35	48%	5937.19		5937.19
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS											
127	mASILLADO DE PISOS, ENDuRECEDOR DE CuARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPE	m2	5101.87	5.62	28672.50940	4479.16		4479.16	88%	25172.88		25172.88
128	PINTuRA EPOXICA PISO INDuSTRIAL 3mm (2 COmPONENTES)	m2	5101.87	34.78	177443.03860	2125.62	163.96	2289.58	45%	73929.06	5702.53	79631.59
129	PISO PORCELANATO RECTIF. COLOR (0.50X0.50- u OTROS) INSTAL. EmPO	m2	1910.00	40.31	76992.10000	2190.29	18.41	2208.70	116%	88290.54	742.29	89032.83
130	PISO GRADAS PORCELANATO PIZARRA COLOR (0.32X0.32-O SImILAR) INSTAL. En	m2	90.00	32.72	2944.80000	20.31		20.31	23%	664.54		664.54
131	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	761.35	26.06	19840.78100	865.44		865.44	114%	22553.42		22553.42
132	BARREDERA PORCELANATO COLOR RECTIFICADA A=10Cm	m	997.67	7.70	7682.05900	1720.69		1720.69	172%	13249.31		13249.31
133	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISOS Y FILOS DE GRADA	m	150.00	2.98	447.00000	32.53		32.53	22%	96.94		96.94
134	CENEFA ACANALADA ANTILESLIZANTE FILOS GRADA A=10Cm	m	120.00	38.56	4627.20000							
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS											
135	mASILLADO E ImPERmEABILIZADO DE PISOS-LOSAS, mORTERO CEmENTO-AREN	m2	1380.00	10.40	14352.00000	1394.82		1394.82	101%	14506.09		14506.09
136	ImPERmEABILIZACION LOSA DE CuBIERTA ImPRImANTE ASFALTICO SOLuBLE AL	m2	1650.00	2.84	4686.00000	1606.65		1606.65	97%	4562.89		4562.89
137	ImPERmEABILIZACIONLOSA DE CuBIERTA LAmINAS ASFALTICAS	m2	1650.00	13.85	22852.50000	1606.65		1606.65	97%	22252.14		22252.14
	CUBIERTA											
138	CuBIERTA GALVALumEN E=0.45mm, RECuBRIENTO PINTuRA POLIESTER ASTm-65	m2	4875.00	13.92	67860.00000	5111.26		5111.26	105%	71148.74		71148.74
139	CuBIERTA POLICARBONATO E=0.80 mm, COLOR BRONCE O SImILAR, INC. ACCES	m2	946.45	14.34	13572.09300	410.43		410.43	43%	5885.57		5885.57
140	CumBRERO GALVALumEN E=0.40 mm A=0.50 m, INC. ACCES. INSTALACION	m	92.00	8.38	770.96000	91.30		91.30	99%	765.09		765.09
141	CANAL TOL GALV E= 0.70mm, H=30Cm, A=40Cm DESARR. 122 Cm, INC. GANCHOS	m	259.00	21.49	5565.91000	628.34		628.34	243%	13503.03		13503.03
	BAJANTES AGUA LLUVIA											
142	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=160mm)	m	798.00	9.91	7908.18000	740.33		740.33	93%	7336.67		7336.67
143	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm^0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	25.00	90.42	2260.50000	64.00		64.00	256%	5786.88		5786.88
144	SumI. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m	233.91	20.59	4816.20690							
145	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO DIAm. INT.= 200A 160mm PVC Y/O POLIETILE	u	15.00	20.71	310.65000							
	MAMPOSTERÍA											
146	RIOSTRAS DE H.S. F'C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3	129.00	258.83	33389.07000	122.97		122.97	95%	31827.81		31827.81
147	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=10 Cm	m2	236.00	17.71	4179.56000	26.61		26.61	11%	471.26		471.26
148	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2	4630.00	22.90	106027.00000	4078.71	14.61	4093.32	88%	93402.50	334.57	93737.07
149	PICADO Y RESANADO DE mAmPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m	3819.65	4.63	17684.98050	3476.65	343.00	3819.65	100%	16096.89	1588.09	17684.98
150	mESON H.A. F'C=180 KG/Cm2 E=7 Cm HIERRO (LAVAmANOS+mESON)	m	7.00	34.03	238.21000	20.40	43.25	63.65	909%	694.21	1471.80	2166.01
151	REVESTImIENTO mESON GRANITO	m	7.00	180.61	1264.27000	34.40		34.40	491%	6212.98		6212.98
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES											
152	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	2795.97	10.27	28714.61190	3130.57		3130.57	112%	32150.90		32150.90
153	ENLuCIDO VERTICAL PALETEADO mORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2	9060.97	8.78	79555.31660	7942.58	14.64	7957.22	88%	69735.87	128.54	69864.41
154	ENLuCIDO CON mALLA+ ImPERmEABILIZANTE, mORTERO 1:3	m2	1250.00	17.03	21287.50000	760.79		760.79	61%	12956.21		12956.21
155	ENLuCIDO HORIZONTAL PALETEADO mORTERO 1:3	m2	100.00	12.30	1230.00000							
156	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	2795.97	5.26	14706.80220	3130.57		3130.57	112%	16466.77		16466.77
157	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO INTERIOR) INC. FILOS	m2	9060.97	4.40	39868.26800	7755.59		7755.59	86%	34124.60		34124.60
158	EmPASTE HORIZONTAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	100.00	6.56	656.00000							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
159	PINTURA EPOXICA PARED INDUSTRIAL 3mm (2 COMPONENTES)	m2		34.78								
160	PINTURA DE CAUCHO SATINADO COLOR (2 MANOS) INTER. <GULA IMAGEN CORPO	m2	9060.97	4.72	42767.77840	7755.59		7755.59	86%	36606.38		36606.38
161	PINTURA DE CAUCHO SATINADA COLOR(2 MANOS) EXTERIOR (CANASTILLA) <Gul	m2	2795.97	5.72	15992.94840	2464.29		2464.29	88%	14095.74		14095.74
162	RECUBRIMIENTO ALUMINIO COLOR CYAN O SIMILAR, ALUCUBOND 5mm INC. ESTR	m2	1315.00	84.96	111722.40000							
163	RECUBRIMIENTO PLANCHA FIBROCEMENTO E=7mm	m2	50.00	20.56	1028.00000							
	CARPINTERIA METALICA											
164	VENTANA FIJA TUBO RECT 40X80X2-mALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6mm, INC	m2	540.00	41.30	22302.00000	397.17		397.17	74%	16403.12		16403.12
165	PORTON TIPO CORREDIZO RETRACTIL TUBO RECT 40X80X2mm-TOOL GALV. 0.6m	m2	990.50	61.25	60668.12500	594.12		594.12	60%	36389.85		36389.85
166	PUERTA METÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2mm (AREA RIEGO Y DRENAJE)	m2	40.30	142.73	5752.01900	40.20		40.20	100%	5737.75		5737.75
167	PUERTAS MODULARES, TAMBORADAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE E=1	m2	30.50	172.30	5255.15000	35.28		35.28	116%	6078.74		6078.74
168	DIVISIONES ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, TAMBORADAS INCLUYE ESTRU	m2	81.00	161.18	13055.58000	105.56		105.56	130%	17014.16		17014.16
	CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE											
169	PASAMANOS TUBERÍA ACERO INOXIDABLE + VIDRIO LAMINADO 8mm, EMPOTRAD	m	86.21	173.45	14953.12450	13.97		13.97	16%	2423.10		2423.10
170	PASAMANOS EN TUBERIADE ACERO INOXIDABLE EMPOTRADO EN PARED	m	26.59	45.00	1196.55000	23.15		23.15	87%	1041.75		1041.75
	CARPINTERIA DE MADERA											
171	PUERTA TAMBORADA 70Cm, ESQUELETO CANELO, mDF 9mm -LACADA-DISEÑO C	u	20.00	198.79	3975.80000	18.00		18.00	90%	3578.22		3578.22
172	PUERTA TAMBORADA 90Cm, ESQUELETO CANELO, mDF 9mm -LACADA-DISEÑO C	u	2.00	230.59	461.18000	2.00		2.00	100%	461.18		461.18
173	PUERTA TAMBORADA 100Cm, ESQUELETO CANELO, mDF 9mm -LACADA-DISEÑO	u	6.00	240.28	1441.68000	10.00		10.00	167%	2402.80		2402.80
	VENTANERIA-PUERTAS ALUMINIO VIDRIO											
174	PUERTA INGRESO PRINCIPAL-SISTEMA APERTURA AUTOMATICO 2.00X2.30m ALur	u	1.00	6646.43	6646.43000	1.00		1.00	100%	6646.43		6646.43
175	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO 10mm, INC. CERRADURA TIRADERA, PIVOTE DE S	m2	9.50	600.48	5704.56000	9.29		9.29	98%	5578.46		5578.46
176	PUERTA YMAMPARAALUMINIOS200YVIDRIOLAMINADO E=8mm CON PIVOTE	m2	9.00	190.90	1718.10000	7.88	12.60	20.48	228%	1504.29	2405.34	3909.63
177	PUERTA BATIENTE ALUMINIO Y VIDRIO FLOTADO CLARO 6mm (0.90X2.10)	u	3.00	295.00	885.00000	6.00		6.00	200%	1770.00		1770.00
178	PUERTA BATIENTE ALUMINIO Y VIDRIO FLOTADO CLARO 6mm (1.00X2.10)	u	40.00	286.07	11442.80000	34.00	6.00	40.00	100%	9726.38	1716.42	11442.80
179	VENTANA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 200-INCL. VIDRIO LAMINADO 6mm	m2	220.00	183.67	40407.40000	193.15	27.60	220.75	100%	35475.86	5069.29	40545.15
	REVESTIMIENTO DE TUMBADOS											
180	CIELO RASO FALSO - FIBRA MINERAL Y RECUB LAMINA ALUMINIO 0.60X0.60 BLAN	m2	2150.00	21.59	46418.50000	2281.57		2281.57	106%	49259.17		49259.17
181	CIELO RASO FALSO TIPO GYPSUM PARA HUMEDAD-1/2"-SIN ESTUCAR	m2	212.58	20.04	4260.10320		17.18	17.18	8%		344.29	344.29
182	ESTUCADO DE CIELO RASO	m2	212.58	6.26	1330.75080		17.18	17.18	8%		107.55	107.55
183	FRISO GALVALUMEN PREPINTADO E= 0.40 INC. FLASHING	m2	50.00	19.63	981.50000							
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS											
184	INODORO CON FLUXOMETRO LATON CROMADA 1.0 GPF DISCAPACITADOS PRIME	u	2.00	297.96	595.92000	2.00		2.00	100%	595.92		595.92
185	PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS TUBO DIAM 32mm E=1.5mm EN ACERO INO	u	2.00	281.03	562.06000	2.00	1.00	3.00	150%	562.06	281.03	843.09
186	INODORO CON FLUXOMETRO LATON CROMADA 1.0 GPF PRIMERA CALIDAD (PRO	u	39.00	297.96	11620.44000	45.00		45.00	115%	13408.20		13408.20
187	URINARIO CON FLUXOMETRO LATON CROMADA 1.0 GPF	u	6.00	261.01	1566.06000	10.00		10.00	167%	2610.10		2610.10
188	LAVABO BLANCO, LLAVE SENSOR MOVIMIENTO (CON ACCESORIOS)	u	35.00	281.39	9848.65000	37.00		37.00	106%	10411.43		10411.43
189	DISPENSOR DE PAPEL HIGIENICO DIAm=275mm, ROLLO 70mm, ABATIBLE,ACERO	u	20.00	110.71	2214.20000	24.00		24.00	120%	2657.04		2657.04
190	DISPENSOR DE PAPEL TOALLA 400-600 UNIDADES, 330X273X130mm, ACERO INO	u	20.00	113.00	2260.00000	24.00		24.00	120%	2712.00		2712.00
191	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOX AISI304, ACABADO SATINADO	u	20.00	91.28	1825.60000	24.00		24.00	120%	2190.72		2190.72
192	ESPEJO DE VIDRIO FLOTADO 4mm- MARCO DE ALUMINIO	m2	12.89	42.86	552.46540							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	09-mayo-19			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	**365** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
193	FREGADERO DE COCINA (uN POZO)	u	2.00	185.40	370.80000	1.00		1.00	50%	185.40		185.40
194	SECADOR DE mANOS ACCIONAmIENTO AuTOmATICO 260X302X150mm, ACERO IN	u	20.00	238.44	4768.80000	24.00		24.00	120%	5722.56		5722.56
195	BASuRERO CILINDRICO A PEDAL D=250mm H=385 PARA BAÑO ACERO INOX. 304	u	41.00	66.60	2730.60000	46.00		46.00	112%	3063.60		3063.60
	PUENTE GRUA BIRRIEL CAP. 16 TON (1 UNIDADES)											
196	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	407.57	1.68	684.71760							
197	PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A (36, 572, 325,193,108) (PROY. MONTAJE GR	Kg	43726.12	2.76	120684.09120	45766.78		45766.78	105%	126316.31		126316.31
198	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROS	Kg	43726.12	0.11	4809.87320	45766.78		45766.78	105%	5034.35		5034.35
199	KIT POLIPASTO BIRRIEL A CABLE + TROLEY ELEC. CAP. 16T, ELEVACION 8m, (INC	u	1.00	50538.00	50538.00000	1.00		1.00	100%	50538.00		50538.00
200	SISTEmA ELECTRIFICACION ENCAPSuLADO Lm60	m	88.00	112.21	9874.48000	64.00		64.00	73%	7181.44		7181.44
201	RIEL DE RODADuRA 50X30mm, (V. PuENTE 2X10+V CARRILERA2X88m)	m	212.00	77.83	16499.96000	145.60		145.60	69%	11332.05		11332.05
202	mONTAJE ELECTROmECANICOPARA GRuA BIRRIEL 16 TON	u	1.00	17664.00	17664.00000	1.00		1.00	100%	17664.00		17664.00
203	SIST. CONTROL REmOTO/ TELEmANDO (CON DISPLAY)	u	1.00	1955.65	1955.65000	1.00		1.00	100%	1955.65		1955.65
	EQUIPO DE MOVILIZACION VERTICAL											
204	ASENSOR DE DISCAPACITADOS L =5.0m, 1 PARADA, CAP NOmINAL 250KG	u	1.00	18732.35	18732.35000	1.00		1.00	100%	18732.35		18732.35
	5.- NAVE LAVADORA, Y TALLERES CHAPISTERIA-CARPINTERIA										NL	
	PRELIMINARES											
205	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	4407.56	1.14	5024.61840	4407.56		4407.56	100%	5024.62		5024.62
206	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATA	m2	1087.37	1.46	1587.56020	1036.79		1036.79	95%	1513.71		1513.71
207	ACOmETIDA E INST. DE AGuA POTABLE PROVISIONAL PVC 3/4"	m		8.44								
208	ACOmETIDA E INST. ELÉCTRICA PROV. TuBERÍA CONDuIT 1" CABLENo.8	m		27.58								
209	SONDEOS DE SuELOS (COmPROBACION IN SITu) NEC-15	m	61.00	55.43	3381.23000	61.00		61.00	100%	3381.23		3381.23
210	CERRAmIENTO PROVISIONAL LISTONES + PLANCHAS DE ZINC	m2		11.69								
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
211	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	311.80	4.18	1303.32400	346.94		346.94	111%	1450.21		1450.21
212	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17.93								
213	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	261.80	17.33	4536.99400	268.80		268.80	103%	4658.30		4658.30
214	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	424.00	13.72	5817.28000	409.01		409.01	96%	5611.62		5611.62
215	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	261.80	2.82	738.27600	346.94		346.94	133%	978.37		978.37
	HORMIGONES											
216	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRAN	m3	9.80	163.18	1599.16400	12.80		12.80	131%	2088.70		2088.70
217	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF'C = 280KG./Cm2 IN	m3	69.20	225.97	15637.12400	69.20		69.20	100%	15637.12		15637.12
218	HORmIGON PREmEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CO	m3	35.23	283.42	9984.88660	48.03		48.03	136%	13612.66		13612.66
219	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOm	m3	22.17	289.16	6410.67720	26.86		26.86	121%	7766.84		7766.84
220	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F'C=180 KG/Cm2-50por cientoP)Clm	m3	46.97	169.86	7978.32420	59.22		59.22	126%	10059.11		10059.11
	ACERO ESTRUCTURAL											
221	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	14998.01	1.68	25196.65680	15187.85		15187.85	101%	25515.59		25515.59
222	PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A (36, 572, 325,193,108) (PROY. MONTAJE GR	Kg	59540.80	2.76	164332.60800	61101.10	1299.37	62400.47	105%	168639.05	3586.26	172225.31
223	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROS	Kg	59540.80	0.11	6549.48800	59014.38	1299.37	60313.75	101%	6491.58	142.93	6634.51
224	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2	2420.00	4.84	11712.80000	2239.26		2239.26	93%	10838.02		10838.02
	CONTRAPISOS											

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		9622634.2197
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
225	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3 (CONTRAPISO E=20Cm. COmPAC. 100por ciento	m3	188.50	10.78	2032.03000	181.79		181.79	96%	1959.70		1959.70
226	mATERIAL DE BASE CLASE 2 (CONTRAPISO E=15Cm, COmPAC. 100por ciento P.E	m3	141.20	24.55	3466.46000	136.34		136.34	97%	3347.15		3347.15
227	CONTRAPISO HORm.S. PREmEZ. F C=280KG/Cm2 E= 4 PuLG. (SIN BASE)	m2	710.00	21.50	15265.00000							
228	JuNTA ASERRADA DILATACION PISO (INC. CORDON, Y SELLO)	m	550.00	2.59	1424.50000	401.85		401.85	73%	1040.79		1040.79
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS											
229	mASILLADO DE PISOS, ENDuRECEDOR DE CuARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPE	m2	1100.00	5.62	6182.00000	1071.05		1071.05	97%	6019.30		6019.30
230	PINTuRA EPOXICA PISO INDuSTRIAL 3mm (2 COmPONENTES)	m2	1100.00	34.78	38258.00000	521.38		521.38	47%	18133.60		18133.60
231	PISO PORCELANATO RECTIF. COLOR (0.50X0.50- u OTROS) INSTAL. EmPO	m2	35.00	40.31	1410.85000	485.73		485.73	1388%	19579.78		19579.78
232	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	72.00	26.06	1876.32000	118.77		118.77	165%	3095.15		3095.15
233	BARREDERA PORCELANATO COLOR RECTIFICADA A=10Cm	m	28.00	7.70	215.60000	143.39		143.39	512%	1104.10		1104.10
234	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISOS Y FILOS DE GRADA	m		2.98								
	CUBIERTA											
235	CuBIERTA GALVALumEN E=0.45mm, RECuBRIENTO PINTuRA POLIESTER ASTm-65	m2	1390.00	13.92	19348.80000	1193.68		1193.68	86%	16616.03		16616.03
236	CuBIERTA POLICARBONATO E=0.80 mm, COLOR BRONCE O SImILAR, INC. ACCES	m2	100.00	14.34	1434.00000	59.90		59.90	60%	858.97		858.97
237	CumBRERO GALVALumEN E=0.40 mm A=0.50 m, INC. ACCES. INSTALACION	m	54.25	8.38	454.61500	52.80		52.80	97%	442.46		442.46
238	CANAL TOL GALV E= 0.70mm, H=30Cm, A=40Cm DESARR. 122 Cm, INC. GANCHOS	m	108.50	21.49	2331.66500	105.60		105.60	97%	2269.34		2269.34
	BAJANTES AGUA LLUVIA											
239	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=160mm)	m	168.00	9.91	1664.88000	153.72		153.72	92%	1523.37		1523.37
240	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm^0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	18.00	90.42	1627.56000	12.00		12.00	67%	1085.04		1085.04
241	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m	120.00	20.59	2470.80000							
242	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO DIAm. INT.= 200A 160mm PVC Y/O POLIETILE	u	6.00	20.71	124.26000							
	MAMPOSTERIA											
243	RIOSTRAS DE H.S. F'C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3	6.50	258.83	1682.39500	6.14		6.14	94%	1589.22		1589.22
244	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=10 Cm	m2	5.00	17.71	88.55000	5.00		5.00	100%	88.55		88.55
245	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2	716.00	22.90	16396.40000	704.69		704.69	98%	16137.40		16137.40
246	PICADO Y RESANADO DE mAmPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m	168.00	4.63	777.84000	168.00		168.00	100%	777.84		777.84
247	mESON H.A. F'C=180 KG/Cm2 E=7 Cm HIERRO (LAVAmANOS+mESON)	m	3.50	34.03	119.10500		3.20	3.20	91%		108.90	108.90
248	REVESTImIENTO mESON GRANITO	m	3.50	180.61	632.13500		4.08	4.08	117%		736.89	736.89
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES											
249	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	380.00	10.27	3902.60000	380.00		380.00	100%	3902.60		3902.60
250	ENLuCIDO VERTICAL PALETEADO mORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2	1075.00	8.78	9438.50000	1001.92		1001.92	93%	8796.86		8796.86
251	ENLuCIDO CON mALLA+ ImPERmEABILIZANTE, mORTERO 1:3	m2	35.00	17.03	596.05000							
252	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	380.00	5.26	1998.80000	380.00		380.00	100%	1998.80		1998.80
253	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO INTERIOR) INC. FILOS	m2	2150.00	4.40	9460.00000	1000.72		1000.72	47%	4403.17		4403.17
254	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPO	m2	2150.00	4.72	10148.00000	1372.80		1372.80	64%	6479.63		6479.63
255	PINTuRA DE CAuCHO SATINADA COLOR(2 mANOS) EXTERIOR (CANASTILLA) <Gui	m2	380.00	5.72	2173.60000	540.53		540.53	142%	3091.83		3091.83
256	RECuBRImIENTO PLANCHA FIBROCEmENTO E=7mm	m2	50.00	20.56	1028.00000							
	CARPINTERIA METALICA											
257	VENTANA FIJA TuBO RECT 40X80X2-mALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6mm, INC	m2	182.26	41.30	7527.33800	92.74		92.74	51%	3830.16		3830.16
258	PORTON TIPO CORREDIZO RETRACTIL TuBO RECT 40X80X2mm-TOOL GALV. 0.6m	m2	156.67	61.25	9596.03750							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
259	PUERTA METÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2mm , INC. CERRADURA, BISAGRAS Y	m2	20.00	142.73	2854.60000	35.98		35.98	180%	5135.43		5135.43
260	PUERTAS MODULARES, TAMBORADAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE E=1	m2	4.00	172.30	689.20000	4.00		4.00	100%	689.20		689.20
261	DIVISIONES ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, TAMBORADAS INCLUYE ESTRU	m2	13.70	161.18	2208.16600							
	VENTANERIA-PUERTAS ALUMINIO VIDRIO											
262	PUERTA BATIENTE ALUMINIO Y VIDRIO FLOTADO CLARO 6mm (1.00X2.10)	u	3.00	286.07	858.21000		3.00	3.00	100%		858.21	858.21
263	VENTANA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 200-INCL. VIDRIO LAMINADO 6mm	m2	6.00	183.67	1102.02000		3.54	3.54	59%		650.19	650.19
	REVESTIMIENTO DE TUMBADOS											
264	CIELO RASO FALSO - FIBRA MINERAL Y RECUB LÁMINA ALUMINIO 0.60X0.60 BLAN	m2	129.01	21.59	2785.32590	95.54		95.54	74%	2062.71		2062.71
265	FRISO GALVALUMEN PREPINTADO E= 0.40 INC. FLASHING	m2		19.63								
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS											
266	INODORO CON FLUXOMETRO LATON CROMADA 1.0 GPF DISCAPACITADOS PRIME	u		297.96								
267	PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS TUBO DIAM 32mm E=1.5mm EN ACERO INO	u		281.03								
268	INODORO CON FLUXOMETRO LATON CROMADA 1.0 GPF PRIMERA CALIDAD (PRO	u	4.00	297.96	1191.84000	4.00		4.00	100%	1191.84		1191.84
269	URINARIO CON FLUXOMETRO LATON CROMADA 1.0 GPF	u	1.00	261.01	261.01000	1.00		1.00	100%	261.01		261.01
270	LAVABO BLANCO, LLAVE SENSOR MOVIMIENTO (CON ACCESORIOS)	u	3.00	281.39	844.17000	3.00		3.00	100%	844.17		844.17
271	DISPENSOR DE PAPEL HIGIENICO DIAm=275mm, ROLLO 70mm, ABATIBLE,ACERO	u	3.00	110.71	332.13000		3.00	3.00	100%		332.13	332.13
272	DISPENSOR DE PAPEL TOALLA 400-600 UNIDADES, 330X273X130mm, ACERO INO	u	2.00	113.00	226.00000		2.00	2.00	100%		226.00	226.00
273	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOX AISI304, ACABADO SATINADO	u	2.00	91.28	182.56000		2.00	2.00	100%		182.56	182.56
274	ESPEJO DE VIDRIO FLOTADO 4mm- MARCO DE ALUMINIO	m2	2.70	42.86	115.72200		2.70	2.70	100%		115.89	115.89
275	SECADOR DE MANOS ACCIONAMIENTO AUTOMATICO 260X302X150mm, ACERO IN	u	2.00	238.44	476.88000		2.00	2.00	100%		476.88	476.88
276	BASURERO CILINDRICO A PEDAL D=250mm H=385 PARA BAÑO ACERO INOX. 304	u	4.00	66.60	266.40000		4.00	4.00	100%		266.40	266.40
277	DUCHAS CON MEZCLADORA (CON ACCESORIOS)	u	1.00	135.94	135.94000		1.00	1.00	100%		135.94	135.94
	6.- NAVE RESGUARDO VEHICULAR PESADO											
	PRELIMINARES											
278	ARREGLO Y LIMPIEZA (INCLUYE DESALOJO)	m2	5783.22	1.14	6592.87080	5783.22		5783.22	100%	6592.87		6592.87
279	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQUEADERO,Y PLATA	m2	1445.85	1.46	2110.94100	3023.25		3023.25	209%	4413.95		4413.95
280	ACOMETIDA E INST. DE AGUA POTABLE PROVISIONAL PVC 3/4"	m		8.44								
281	ACOMETIDA E INST. ELÉCTRICA PROV. TUBERÍA CONDUIT 1" CABLENo.8	m		27.58								
282	SONDEOS DE SUELOS (COMPROBACION IN SITU) NEC-15	m	66.00	55.43	3658.38000	66.00		66.00	100%	3658.38		3658.38
283	CERRAMIENTO PROVISIONAL LISTONES + PLANCHAS DE ZINC	m2		11.69								
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
284	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A MAQUINA)	m3	78.36	4.18	327.54480	153.24		153.24	196%	640.54		640.54
285	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	m3		17.93								
286	SUB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COMPACTADO (MAQUINA), CAPAS 20Cm	m3	78.36	17.33	1357.97880	165.96		165.96	212%	2876.09		2876.09
287	RELLENO COMPACTADO A MAQUINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	635.58	13.72	8720.15760	592.20		592.20	93%	8124.98		8124.98
288	DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS	m3	78.36	2.82	220.97520	153.24		153.24	196%	432.14		432.14
	HORMIGONES											
289	HORMIGON PREMEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOMBEO Y TRAN	m3	7.20	163.18	1174.89600	7.20		7.20	100%	1174.90		1174.90
290	HORMIGÓN PREMEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CIMENTACIÓNF'C = 280KG./Cm2 IN	m3	29.00	225.97	6553.13000	25.34		25.34	87%	5726.08		5726.08
291	HORMIGON PREMEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CO	m3	84.75	283.42	24019.84500	84.00		84.00	99%	23807.28		23807.28

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	**365** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
292	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOm	m3	14.26	289.16	4123.42160	9.12		9.12	64%	2637.14		2637.14
293	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F'C=180 KG/Cm2-50por cientoP)Clm	m3	56.51	169.86	9598.78860	56.84		56.84	101%	9654.84		9654.84
	ACERO ESTRUCTURAL											
294	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	9807.60	1.68	16476.76800	10802.43		10802.43	110%	18148.08		18148.08
295	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2	3325.46	4.84	16095.20220	2885.88		2885.88	87%	13967.66		13967.66
	CONTRAPISOS											
296	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3 (CONTRAPISO E=20Cm, COmPAC. 100por ciento	m3	282.00	10.78	3039.96000	263.21		263.21	93%	2837.40		2837.40
297	mATERIAL DE BASE CLASE 2 (CONTRAPISO E=15Cm, COmPAC. 100por ciento P.E	m3	211.86	24.55	5201.16300	197.41		197.41	93%	4846.42		4846.42
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS											
	CUBIERTA											
	BAJANTES AGUA LLUVIA											
298	CAJA REV H.S. F'C=180KG/Cm*0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	12.00	90.42	1085.04000	12.00		12.00	100%	1085.04		1085.04
299	SumI. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m	161.40	20.59	3323.22600							
300	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO DIAm. INT.= 200A 160mm PVC Y/O POLIETILE	u		20.71								
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES											
301	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	40.00	10.27	410.80000							
302	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	40.00	5.26	210.40000							
303	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPO	m2	40.00	4.72	188.80000							
	10.- SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACIÓN											
	POZOS DE REVISION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS											
304	CAJA REVISION mEDIA TENSION 90X90X90 C/VIA, T/HA	u		169.45								
305	CAJA REVISION mEDIA TENSION 60X60X75,ACERA, T/HA	u	41.00	179.17	7345.97000	41.00		41.00	100%	7345.97		7345.97
306	PuESTA A TIERRA SImPLE EN POZO ELECTRICO CON SuELDA EXOTERmICA	u	4.00	164.46	657.84000	4.00		4.00	100%	657.84		657.84
	SISTEMA SOTERRADO DE MEDIA TENSION											
307	BAJADA DE DE mEDIA TENSION AEREA SOTERRADA	u	4.00	600.70	2402.80000	1.00		1.00	25%	600.70		600.70
308	TENDIDO DE TuBO RIGIDO 1 1/2" DOBLE	m		16.92								
309	SISTEmA A TIERRA DE mEDIA TENSION	u	1.00	1781.59	1781.59000							
310	PARARRAYOS 10 KV, CON PERNOS SuJECCION	u	3.00	84.46	253.38000							
311	SECCIONAmIENTO TRIFASICO AEREO SuBTERRANEO S3A/S, INC PARARRAYOS	u	3.00	1290.60	3871.80000	3.00		3.00	100%	3871.80		3871.80
312	TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNuDO NO. 2 AWG	m	500.00	5.92	2960.00000	602.02		602.02	120%	3563.96		3563.96
313	TENDIDO Y REGuLADO DE CABLE DE COBRE XLPE NO2-15KV	u	1600.00	14.75	23600.00000	1636.66		1636.66	102%	24140.74		24140.74
314	TENDIDO CONDuCTOR: TTu 2/0	m		36.79		369.42		369.42		13590.96		13590.96
315	TENDIDO CONDuCTOR: TTu 3/0	m		45.20								
316	mALLA DE PuESTA A TIERRA EN CENTRO DE TRANSFORmACION CON SuELDA EX	u	4.00	581.10	2324.40000	3.00		3.00	75%	1743.30		1743.30
317	BANCO DE DuCTOS 1X2 DE 110mm 1X2B1-B2	m	1800.00	32.94	59292.00000	1181.87		1181.87	66%	38930.80		38930.80
318	mONTAJE DE TRANSFORmADOR PADmOuNTED TRIFASICO TIPO mALLA DE 50KV	u	1.00	7092.79	7092.79000	1.00		1.00	100%	7092.79		7092.79
319	mONTAJE DE TRANSFORmADOR PADmOuNTED TRIFASICO TIPO mALLA DE 100K	u	1.00	12135.60	12135.60000	1.00		1.00	100%	12135.60		12135.60
320	PuNTA TERmINAL AT TIPO EXTERIOR CABLE Nº 2 AWG	u		170.72								
321	PuNTA TERmINAL AT TIPO INTERIOR CABLE Nº 2 AWG	u	3.00	170.72	512.16000							
322	ACOmETIDA PRINCIPAL ELECTRICA	m	15.00	6.22	93.30000							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
	INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO											
323	POSTES ORNAmENTALES DE 8mTS Y BRAZOS	u	57.00	799.03	45544.71000	56.00		56.00	98%	44745.68		44745.68
324	LumINARIA ORNAmENTAL LED120W	u	82.00	532.37	43654.34000	68.00		68.00	83%	36201.16		36201.16
325	LumINARIA ORNAmENTAL LED 60W	u	33.00	387.65	12792.45000	31.00		31.00	94%	12017.15		12017.15
326	TENDIDO DE CONDuCTOR 1No. NO. 4 TTu	m	4647.00	8.10	37640.70000	6163.28	611.83	6775.11	146%	49922.57	4955.82	54878.39
327	mONTAJE DE TRANSF, mONO. PADmOuNTED 10 KVA	u	1.00	5210.22	5210.22000	1.00		1.00	100%	5210.22		5210.22
	AREA ADMINISTRATIVA PLANTA BAJA											
	INSTALACION LUMINARIAS											
328	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	636.00	3.34	2124.24000	748.07		748.07	118%	2498.55		2498.55
329	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	218.00	1.18	257.24000	217.00		217.00	100%	256.06		256.06
330	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	620.00	0.56	347.20000	505.00		505.00	81%	282.80		282.80
331	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	350.00	4.87	1704.50000	322.00		322.00	92%	1568.14		1568.14
332	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	150.00	1.57	235.50000	63.00		63.00	42%	98.91		98.91
333	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AmARILLO (INC. TA	m	1043.00	2.28	2378.04000	730.10		730.10	70%	1664.63		1664.63
334	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYP	m	1043.00	1.43	1491.49000	730.10		730.10	70%	1044.04		1044.04
335	LumINARIA LED 3X18W/120 VOLTIOS	u	130.00	60.59	7876.70000	155.00		155.00	119%	9391.45		9391.45
336	LumINARIA LED 24W/120 VOLTIOS	u	14.00	58.36	817.04000	24.00	2.00	26.00	186%	1400.64	116.72	1517.36
337	INTERRuPTOR SImPLE CON TAPA	u	38.00	5.47	207.86000	47.00		47.00	124%	257.09		257.09
338	INTERRuPTOR DOBLE CON TAPA	u	14.00	6.16	86.24000							
339	INTERRuPTOR CONmuTADOR DE 3 VIAS	u	17.00	7.30	124.10000	30.00		30.00	176%	219.00		219.00
	TOMACORRIENTES GENERALES											
340	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	780.00	3.34	2605.20000	1133.82	11.46	1145.28	147%	3786.96	38.28	3825.24
341	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	260.00	1.18	306.80000	249.00	6.00	255.00	98%	293.82	7.08	300.90
342	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	570.00	0.56	319.20000	595.00	12.00	607.00	106%	333.20	6.72	339.92
343	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	390.00	4.87	1899.30000	234.00	8.00	242.00	62%	1139.58	38.96	1178.54
344	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	892.00	1.43	1275.56000	1174.63	35.44	1210.07	136%	1679.72	50.68	1730.40
345	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYP	m	892.00	1.43	1275.56000	1154.73	35.44	1190.17	133%	1651.26	50.68	1701.94
346	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE	m	892.00	1.03	918.76000	1154.73	35.44	1190.17	133%	1189.37	36.50	1225.87
347	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	130.00	1.57	204.10000	174.00		174.00	134%	273.18		273.18
348	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	130.00	7.45	968.50000	182.00		182.00	140%	1355.90		1355.90
	TOMACORRIENTES REGULADOS UPS											
349	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	195.00	3.34	651.30000	320.15		320.15	164%	1069.30		1069.30
350	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	65.00	1.18	76.70000	65.00		65.00	100%	76.70		76.70
351	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	106.00	0.56	59.36000	153.00		153.00	144%	85.68		85.68
352	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	100.00	4.87	487.00000	100.00		100.00	100%	487.00		487.00
353	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	24.00	1.57	37.68000	30.00		30.00	125%	47.10		47.10
354	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	267.00	1.43	381.81000	445.88		445.88	167%	637.61		637.61
355	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYP	m	267.00	1.43	381.81000	445.88		445.88	167%	637.61		637.61
356	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE	m	267.00	1.03	275.01000	445.88		445.88	167%	459.26		459.26
357	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	24.00	7.45	178.80000	22.00		22.00	92%	163.90		163.90

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
	AREA ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA											
	INSTALACION LUMINARIAS											
358	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	584.00	3.34	1950.56000	711.38		711.38	122%	2376.01		2376.01
359	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	194.00	1.18	228.92000	172.00		172.00	89%	202.96		202.96
360	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	570.00	0.56	319.20000	466.00		466.00	82%	260.96		260.96
361	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	500.00	4.87	2435.00000	279.00		279.00	56%	1358.73		1358.73
362	CAJETINES mETALICOS OCTOGONALES mEDIANOS CON TAPA	u	900.00	5.44	4896.00000	957.00	4.00	961.00	107%	5206.08	21.76	5227.84
363	CAJETINES mETALICOS CuADRADOS CON TAPA 10X10	u	5.00	4.99	24.95000	5.00		5.00	100%	24.95		24.95
364	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	60.00	1.57	94.20000	50.00		50.00	83%	78.50		78.50
365	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AmARILLO (INC TA	m	1200.00	2.28	2736.00000	840.00	30.00	870.00	73%	1915.20	68.40	1983.60
366	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYP	m	1200.00	1.43	1716.00000	845.00	30.00	875.00	73%	1208.35	42.90	1251.25
367	LumINARIA LED 3X18W/120 VOLTIOS	u	180.00	60.59	10906.20000	180.00		180.00	100%	10906.20		10906.20
368	LumINARIA LED 24W/120 VOLTIOS	u	33.00	58.36	1925.88000	33.00		33.00	100%	1925.88		1925.88
369	INTERRuPTOR SImPLE CON TAPA	u	50.00	5.47	273.50000	63.00		63.00	126%	344.61		344.61
370	INTERRuPTOR DOBLE CON TAPA	u	15.00	6.16	92.40000	7.00		7.00	47%	43.12		43.12
371	INTERRuPTOR TRIPLE CON TAPA	u	4.00	7.30	29.20000	2.00		2.00	50%	14.60		14.60
372	INTERRuPTOR CONmuTADOR DE 3 VIAS	u		7.30								
	TOMACORRIENTES GENERALES											
373	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	895.00	3.34	2989.30000	971.29	32.93	1004.22	112%	3244.11	109.99	3354.10
374	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	300.00	1.18	354.00000	256.00	18.00	274.00	91%	302.08	21.24	323.32
375	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	670.00	0.56	375.20000	512.00	15.00	527.00	79%	286.72	8.40	295.12
376	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	400.00	4.87	1948.00000	228.00	16.00	244.00	61%	1110.36	77.92	1188.28
377	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	4000.00	1.43	5720.00000	2800.00		2800.00	70%	4004.00		4004.00
378	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYP	m	1080.00	1.43	1544.40000	756.00		756.00	70%	1081.08		1081.08
379	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE	m	1080.00	1.03	1112.40000	756.00		756.00	70%	778.68		778.68
380	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	155.00	1.57	243.35000	165.00	5.00	170.00	110%	259.05	7.85	266.90
381	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	170.00	7.45	1266.50000	163.00		163.00	96%	1214.35		1214.35
	TOMACORRIENTES REGULADOS UPS											
382	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	368.00	3.34	1229.12000	482.38		482.38	131%	1611.15		1611.15
383	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	125.00	1.18	147.50000	121.00		121.00	97%	142.78		142.78
384	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	220.00	0.56	123.20000	225.00		225.00	102%	126.00		126.00
385	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	190.00	4.87	925.30000	129.00		129.00	68%	628.23		628.23
386	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	48.00	1.57	75.36000	58.00		58.00	121%	91.06		91.06
387	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	489.00	1.43	699.27000	611.28		611.28	125%	874.13		874.13
388	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYP	m	489.00	1.43	699.27000	611.28		611.28	125%	874.13		874.13
389	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE	m	489.00	1.03	503.67000	611.28		611.28	125%	629.62		629.62
390	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	48.00	7.45	357.60000	61.00		61.00	127%	454.45		454.45
	ALIMENTACION AIREACONDICIONADO PLANTA BAJA Y ALATA											
391	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	600.00	3.34	2004.00000	283.81		283.81	47%	947.93		947.93
392	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	250.00	1.18	295.00000	64.00		64.00	26%	75.52		75.52

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
393	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	200.00	0.56	112.00000	134.00		134.00	67%	75.04		75.04
394	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	248.00	4.87	1207.76000	162.00		162.00	65%	788.94		788.94
395	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	885.00	1.43	1265.55000	1057.82		1057.82	120%	1512.68		1512.68
396	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYP	m	885.00	1.43	1265.55000	1057.82		1057.82	120%	1512.68		1512.68
397	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE	m	885.00	1.43	1265.55000	1057.82		1057.82	120%	1512.68		1512.68
398	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	50.00	1.57	78.50000	30.00		30.00	60%	47.10		47.10
399	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 220 V	u	50.00	7.45	372.50000							
	AREA DE MECANICA PESADA Y LIVIANA											
	INSTALACION LUMINARIAS											
400	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	540.00	3.34	1803.60000	671.30		671.30	124%	2242.14		2242.14
401	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	66.00	1.18	77.88000	117.00		117.00	177%	138.06		138.06
402	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	132.00	0.56	73.92000	293.00		293.00	222%	164.08		164.08
403	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	436.00	4.87	2123.32000	286.00		286.00	66%	1392.82		1392.82
404	CAJETINES mETALICOS CuADRADOS CON TAPA 10X10	u	20.00	4.99	99.80000	10.00		10.00	50%	49.90		49.90
405	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	65.00	1.57	102.05000	30.00		30.00	46%	47.10		47.10
406	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AmARILLO (INC. TA	m	88.00	2.28	200.64000	251.73		251.73	286%	573.94		573.94
407	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYP	m	88.00	1.43	125.84000	181.56		181.56	206%	259.63		259.63
408	LumINARIA LED 3X18W/120 VOLTIOS	u	11.00	60.59	666.49000	41.00		41.00	373%	2484.19		2484.19
409	LumINARIA LED 24W/120 VOLTIOS	u		58.36								
410	INTERRuPTOR SImPLE CON TAPA	u		5.47		2.00		2.00		10.94		10.94
411	INTERRuPTOR DOBLE CON TAPA	u	1.00	6.16	6.16000	1.00		1.00	100%	6.16		6.16
412	INTERRuPTOR TRIPLE CON TAPA	u	1.00	7.30	7.30000							
413	LumINARIA LED 150W/220 VOLTIOS	u	53.00	193.85	10274.05000	53.00		53.00	100%	10274.05		10274.05
414	TENDIDO DE CABLE CONCENTRICO 2X12 AWG(INC. TAYPE)	m	710.00	3.43	2435.30000	1402.08	46.96	1449.04	204%	4809.13	161.07	4970.20
	TOMACORRIENTES GENERALES											
415	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	300.00	3.34	1002.00000	405.83		405.83	135%	1355.47		1355.47
416	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	100.00	1.18	118.00000	87.00		87.00	87%	102.66		102.66
417	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	150.00	0.56	84.00000	157.00		157.00	105%	87.92		87.92
418	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	200.00	4.87	974.00000	101.00		101.00	51%	491.87		491.87
419	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	350.00	1.43	500.50000	559.08		559.08	160%	799.48		799.48
420	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYP	m	350.00	1.43	500.50000	559.08		559.08	160%	799.48		799.48
421	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE	m	350.00	1.03	360.50000	559.08		559.08	160%	575.85		575.85
422	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	30.00	1.57	47.10000	48.00		48.00	160%	75.36		75.36
423	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	30.00	7.45	223.50000	38.00		38.00	127%	283.10		283.10
424	TuBERIA EmT 3/4 PuLGADA	m	250.00	3.47	867.50000	377.19		377.19	151%	1308.85		1308.85
425	TENDIDO DE CABLE CONCENTRICO NO.3X10 AWG (INC. TAYPE)	m	400.00	4.01	1604.00000	636.52		636.52	159%	2552.45		2552.45
426	TOmA ESPECIAL 220 VOLTIOS	u	25.00	11.10	277.50000	20.00		20.00	80%	222.00		222.00
	AREA DE CHAPISTERIA, LAVADO, TORNO, VULCANIZADORA											
	INSTALACION LUMINARIAS											
427	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	195.00	3.34	651.30000	221.78		221.78	114%	740.75		740.75

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
428	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	65.00	1.18	76.70000	44.00		44.00	68%	51.92		51.92
429	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	98.00	0.56	54.88000	162.00		162.00	165%	90.72		90.72
430	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	328.00	4.87	1597.36000	184.00		184.00	56%	896.08		896.08
431	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	26.00	1.57	40.82000	20.00		20.00	77%	31.40		31.40
432	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AmARILLO (INC. TA	m	220.00	2.28	501.60000	136.93		136.93	62%	312.20		312.20
433	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYP	m	220.00	1.43	314.60000	136.93		136.93	62%	195.81		195.81
434	LumINARIA LED3X18W/120 VOLTIOS	u	45.00	60.59	2726.55000	39.00		39.00	87%	2363.01		2363.01
435	LumINARIA LED 150W/220 VOLTIOS	u	20.00	193.85	3877.00000	16.00		16.00	80%	3101.60		3101.60
436	TENDIDO DE CABLE CONCENTRICO 2X12 AWG(INC. TAYPE)	m	150.00	3.43	514.50000	264.20		264.20	176%	906.21		906.21
437	INTERRuPTOR SImPLE CON TAPA	u	20.00	5.47	109.40000	16.00		16.00	80%	87.52		87.52
	TOMACORRIENTES GENERALES											
438	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	635.00	3.34	2120.90000	138.90		138.90	22%	463.93		463.93
439	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	212.00	1.18	250.16000	122.00		122.00	58%	143.96		143.96
440	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	315.00	0.56	176.40000	289.00		289.00	92%	161.84		161.84
441	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	428.00	4.87	2084.36000	139.00		139.00	32%	676.93		676.93
442	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	550.00	1.43	786.50000	275.00		275.00	50%	393.25		393.25
443	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYP	m	550.00	1.43	786.50000	275.00		275.00	50%	393.25		393.25
444	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE	m	550.00	1.03	566.50000	275.00		275.00	50%	283.25		283.25
445	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	40.00	7.45	298.00000	37.00		37.00	93%	275.65		275.65
446	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	42.00	1.57	65.94000	37.00		37.00	88%	58.09		58.09
447	TuBERIA EmT 3/4 PuLGADA	m	127.00	3.47	440.69000	201.68		201.68	159%	699.83		699.83
448	uNION EmT 3/4 PuLGADA	u	43.00	1.28	55.04000	63.00		63.00	147%	80.64		80.64
449	CONECTOR EmT 3/4 PuLGADA	u	86.00	0.77	66.22000	161.00		161.00	187%	123.97		123.97
450	TOmA ESPECIAL 220 VOLTIOS	u	10.00	11.10	111.00000	16.00		16.00	160%	177.60		177.60
	AREA DE RESGUARDO DE VEHICULOS											
	INSTALACION LUMINARIAS											
451	LumINARIA LED 150W/220 VOLTIOS	u	20.00	193.85	3877.00000	15.00		15.00	75%	2907.75		2907.75
452	TENDIDO DE CABLE CONCENTRICO 2X12 AWG(INC. TAYPE)	m	512.00	3.43	1756.16000	512.00		512.00	100%	1756.16		1756.16
	TOMACORRIENTES GENERALES											
453	TOmA ESPECIAL 220 VOLTIOS	u	8.00	11.10	88.80000							
454	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	8.00	1.57	12.56000							
	GRUPO ELECTROGENO											
	ACOMETIDA CENTRO DE TRANSFORMACION, GENERACION Y I											
455	mEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA INDIRECTO TRIFASICO 400/5A CLASE 0.5	u	1.00	3275.86	3275.86000	1.00		1.00	100%	3275.86		3275.86
456	CAJA DE PROTECCION GENERAL TRIFASICA NH-3X350A	u	1.00	468.19	468.19000	1.00		1.00	100%	468.19		468.19
457	GENERADOR DE EmERGENCIA EN CABINA INSONORA 50KVA TRIFASICO 127/220	u	1.00	23030.45	23030.45000	1.00		1.00	100%	23030.45		23030.45
458	TABLERO DE TRANSFERENCIA AuTOmATICO TRIFASICO 3P/300A	u	1.00	4845.70	4845.70000	1.00		1.00	100%	4845.70		4845.70
459	PRuEBAS DE ENERGIZACION Y TRAmITES EmPRESA ELECTRICA, PAGOS (Global)	u	1.00	3278.88	3278.88000	1.00		1.00	100%	3278.88		3278.88
460	SISTEmA uPS TRIFÁSICODE 30 KVA	u	1.00	24986.66	24986.66000	1.00		1.00	100%	24986.66		24986.66
461	TABLERO DE BYPASS TRIFASICO 100A CON BARRAS DE COBRE	u	1.00	2669.86	2669.86000	1.00		1.00	100%	2669.86		2669.86

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

						Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21		**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**		**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21		**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A 30-jun-21			
TOTAL	895 Días						

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
462	SISTEmA DE PROTECCION ATmOSFERICA PARRAYOS	u	2.00	1643.60	3287.20000	2.00		2.00	100%	3287.20		3287.20
	ALIMENTADORES Y SUBTABLEROS CT-1											
	ALIMENTADOR TDP-STE PB1											
463	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO.3X8+8Cu TW (INC. TAYPE)	m	18.00	12.44	223.92000	105.76		105.76	588%	1315.65		1315.65
464	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PB1	u	1.00	200.82	200.82000	1.00		1.00	100%	200.82		200.82
	ALIMENTADOR TDP-STE PB2											
465	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	31.00	14.51	449.81000	38.50		38.50	124%	558.64		558.64
466	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PB2	u	1.00	323.93	323.93000	1.00		1.00	100%	323.93		323.93
	ALIMENTADOR TDP-STE PB3											
467	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	41.00	14.51	594.91000	49.50		49.50	121%	718.25		718.25
468	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PB3	u	1.00	213.64	213.64000	2.00		2.00	200%	427.28		427.28
	ALIMENTADOR TDP-STE PB4											
469	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	32.00	14.51	464.32000	41.80		41.80	131%	606.52		606.52
470	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PB4	u	1.00	226.90	226.90000	2.00		2.00	200%	453.80		453.80
	ALIMENTADOR TPD-STE PB5											
471	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	26.00	14.51	377.26000	34.90		34.90	134%	506.40		506.40
472	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PB5	u	1.00	226.90	226.90000	3.00		3.00	300%	680.70		680.70
	ALIMENTADOR TPD-STE-PB6											
473	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	132.00	14.51	1915.32000	180.00		180.00	136%	2611.80		2611.80
474	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PB6	u	3.00	297.41	892.23000	3.00		3.00	100%	892.23		892.23
	ALIMENTADOR STD-STE-PA1											
475	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	41.00	14.51	594.91000	44.10		44.10	108%	639.89		639.89
476	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PA1	u	1.00	214.08	214.08000	1.00		1.00	100%	214.08		214.08
	ALIMENTADOR STD-STE-PA2											
477	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	111.00	14.51	1610.61000	153.90		153.90	139%	2233.09		2233.09
478	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PA2	u	3.00	297.41	892.23000	3.00		3.00	100%	892.23		892.23
	ALIMENTADOR TPD-STE-PA3											
479	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	45.00	14.51	652.95000	55.10		55.10	122%	799.50		799.50
480	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PA3	u	1.00	230.78	230.78000	1.00		1.00	100%	230.78		230.78
	ALIMENTADOR TDP-STE-PA4											
481	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	35.00	14.51	507.85000	92.40		92.40	264%	1340.72		1340.72
482	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PA4	u	1.00	304.26	304.26000	1.00		1.00	100%	304.26		304.26
	ALIMENTADOR TDP-STE-PA5											
483	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	47.00	14.51	681.97000	98.60		98.60	210%	1430.69		1430.69
484	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PA5	u	2.00	217.52	435.04000	2.00		2.00	100%	435.04		435.04
	ALIMENTADOR TDP-STE-PA6											
485	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	56.00	14.51	812.56000	67.80		67.80	121%	983.78		983.78
486	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PA6	u	1.00	310.67	310.67000	1.00		1.00	100%	310.67		310.67
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A1											
487	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	122.00	14.51	1770.22000	106.20		106.20	87%	1540.96		1540.96

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
488	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6ESPACIOS A1	u	4.00	122.27	489.08000	3.00		3.00	75%	366.81		366.81
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A2											
489	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	130.00	14.51	1886.30000	65.00		65.00	50%	943.15		943.15
490	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS A2	u	1.00	122.27	122.27000							
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR-A3											
491	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	57.00	14.51	827.07000	73.40		73.40	129%	1065.03		1065.03
492	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS A3	u	1.00	187.12	187.12000	1.00		1.00	100%	187.12		187.12
	ALIMENTADOR TPD-STE-ANGAR-A4											
493	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	92.00	14.51	1334.92000	43.10		43.10	47%	625.38		625.38
494	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS A4	u	2.00	122.27	244.54000							
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A5											
495	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	95.00	14.51	1378.45000	134.00		134.00	141%	1944.34		1944.34
496	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12ESPACIOS A5	u	1.00	200.82	200.82000	1.00		1.00	100%	200.82		200.82
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A6											
497	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	146.00	14.51	2118.46000	62.50		62.50	43%	906.88		906.88
498	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS A6	u	2.00	122.27	244.54000							
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR-A7											
499	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	82.00	14.51	1189.82000	120.40		120.40	147%	1747.00		1747.00
500	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS A7	u	1.00	228.23	228.23000	1.00		1.00	100%	228.23		228.23
	ALIMENTADOR TPD-STE-CONDENSADORES											
501	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	12.00	14.51	174.12000	32.00		32.00	267%	464.32		464.32
502	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS CONDENSADORES	u	1.00	738.12	738.12000	1.00		1.00	100%	738.12		738.12
	ALIMENTADORES Y SUBTABLEROS CT-2											
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A1											
503	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	41.00	14.51	594.91000	20.50	42.00	62.50	152%	297.46	609.42	906.88
504	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12ESPACIOS ANGAR A1	u	1.00	187.12	187.12000	1.00		1.00	100%	187.12		187.12
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A2											
505	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	80.00	14.51	1160.80000	40.00		40.00	50%	580.40		580.40
506	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS ANGAR 2	u	1.00	122.27	122.27000	1.00		1.00	100%	122.27		122.27
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR-A3											
507	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	55.00	14.51	798.05000	27.50		27.50	50%	399.03		399.03
508	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS ANGAR 3	u	1.00	122.27	122.27000	1.00		1.00	100%	122.27		122.27
	ALIMENTADOR TPD-STE-ANGAR-A4											
509	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	40.00	14.51	580.40000	20.00		20.00	50%	290.20		290.20
510	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS ANGAR 4	u	1.00	173.41	173.41000	1.00		1.00	100%	173.41		173.41
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A5											
511	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	47.00	14.51	681.97000	53.43		53.43	114%	775.27		775.27
512	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12ESPACIOS ANGAR 5	u	1.00	173.41	173.41000	1.00		1.00	100%	173.41		173.41
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A6											
513	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	168.00	14.51	2437.68000	147.86		147.86	88%	2145.45		2145.45

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
514	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS ANGAR 6	u	3.00	200.82	602.46000	5.00		5.00	167%	1004.10		1004.10
	ACOMETIDA B.V PRINCIPAL											
515	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 2/0 THHN	m	144.00	4.18	601.92000	142.00		142.00	99%	593.56		593.56
516	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 1/0 THHN	m	36.00	4.18	150.48000	22.50	63.51	86.01	239%	94.05	265.47	359.52
	ACOMETIDA DE GENERADOR - TTA											
517	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 2/0 THHN	m	120.00	4.18	501.60000	119.60		119.60	100%	499.93		499.93
518	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 1/0 THHN	m	40.00	4.18	167.20000	171.20		171.20	428%	715.62		715.62
	ACOMETIDA DE TTA - TDP-N											
519	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 1/0 THHN	m	60.00	4.18	250.80000	184.00		184.00	307%	769.12		769.12
520	TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNuDO NO. 2 AWG	m	25.00	5.92	148.00000	21.40		21.40	86%	126.69		126.69
	ACOMETIDA DE TTA - TP											
521	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 1/0 THHN	m	40.00	4.18	167.20000	42.60		42.60	107%	178.07		178.07
522	TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNuDO NO. 2 AWG	m	14.00	5.92	82.88000	46.00		46.00	329%	272.32		272.32
	CERCO ELECTRICO CERRAMIENTO											
523	INSTALACION DE CENTRAL ENERGIZADORA 5K	u		594.89			1.00	1.00			594.89	594.89
524	COLOCACION DE TuBERIA PREPARADA	u		10.70			201.00	201.00			2150.70	2150.70
525	COLOCACION DE AISLADORES DE PASO DE ESQuINA Y PASANTE	u		5.26			1205.00	1205.00			6338.30	6338.30
526	TENDIDO DE ALAmBRE SOLIDO GALVANIZADO	m		0.92			4784.40	4784.40			4401.65	4401.65
527	TENDIDO DE CONDuCTOR DE COBRE DE ALTA TENSION 1/0	m		18.77			11.60	11.60			217.73	217.73
528	INSTALACIONDE BATERIA Y SIRENA	m		962.28			1.00	1.00			962.28	962.28
529	SISTEmA DE PuESTA A TIERRA	u		60.25			1.00	1.00			60.25	60.25
	11.- SISTEMA HIDRAULICO SANITARIO Y CONTRAINCENDIOS						SH				SH	
	SITEMA DE AGUA POTABLE A PRESION CONSTANTE											
	ACOMETIDA DE AGUA POTABLE											
530	TuBERIA PVC D=63 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m	470.00	4.09	1922.30000		43.00	43.00	9%		175.87	175.87
531	CONEXION DOmICILIARIA INC.mEDIDOR,EN TuBO D=63mm	u	2.00	100.91	201.82000		2.00	2.00	100%		201.82	201.82
532	HIDRANTES D=3" INCLuYE ACCESORIOS	u	2.00	702.84	1405.68000							
	TUBERIA PVC AGUA POTABLE											
533	TuBERIA PVC ROSCABLE D=1/2" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	361.00	5.86	2115.46000	88.42		88.42	24%	518.12		518.12
534	TuBERIA PVC ROSCABLE D=3/4" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	59.58	6.59	392.63220	31.93		31.93	54%	210.42		210.42
535	TuBERIA PVC ROSCABLE D=1" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	158.67	9.78	1551.79260	166.82		166.82	105%	1631.50		1631.50
536	TuBERIA PVC ROSCABLE D=1 1/2" EN EDIFICACION+PRuEB	m	98.92	16.09	1591.62280							
537	TuBERIA PVC ROSCABLE D=2" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	45.08	14.86	669.88880	52.26	30.80	83.06	184%	776.58	457.69	1234.27
538	TuBERIA PVC ROSCABLE D=2 1/2"" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	20.04	16.38	328.25520							
539	TuBERIA PVC ROSCABLE D=3" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	335.60	17.90	6007.24000	15.04		15.04	4%	269.22		269.22
540	TuBERIA PVC ROSCABLE D=4" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	32.81	18.83	617.81230	26.95		26.95	82%	507.47		507.47
	ACCESORIOS INST. TUB PVC ROSCABLE AGUA POTABLE											
541	ANCLAJES mETALICOS PLATINA 2 por 1/2" (ABRAZADERAS), EN LOSA Y PARED	u	250.00	14.11	3527.50000	148.00		148.00	59%	2088.28		2088.28
542	S.I. PuNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGuA por punto	u	90.00	13.67	1230.30000	47.00		47.00	52%	642.49		642.49
543	S. I. PuNTO AGuA FRIA PVC ROSCABLE D = 2" por punto	u	35.00	63.31	2215.85000							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
544	VALVuLA DE BRONCE RW 2" +ACCESORIOS	u	5.00	34.99	174.95000	5.00		5.00	100%	174.95		174.95
545	LLAVE DE PASODE 1/2 PuLG	u	15.00	10.15	152.25000	15.00		15.00	100%	152.25		152.25
	SISTEMA DE AGUA CALIENTE											
546	S I PuNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGuA CALIENTE por punto	u		16.04								
547	TuBERIA AGuA CALIENTE PVC ROSCABLE D=1/2" EN EDIFICACION+PRuEBA	m		6.77								
548	CALENTADOR ELECTRICO ELECTRICO 15W	u		539.04								
	SISTEMA DE PRESION (BOMBEO) S AGUA POTABLE											
549	S I SISTEmA HIDRONEumATICO(2BOmBASHP-TANQuE 19.8GAL-CAJA CONTROL-C	u	1.00	7104.62	7104.62000	1.00		1.00	100%	7104.62		7104.62
550	S I SISTEmA HIDRONEumATICO(3BOmBASHP-TANQuE 29.5GAL-CAJA CONTROL-C	u	1.00	10425.92	10425.92000	1.00		1.00	100%	10425.92		10425.92
	SISTEMA CONTRAINCENDIOS											
551	S I TuBERÍA HG ASTmD = 2 ½" + PRuEBA	m	80.00	15.24	1219.20000	125.02		125.02	156%	1905.30		1905.30
552	S C TuBERIA HG ASTm D = 1 1/2 " + PRuEBA	m	40.00	11.54	461.60000	12.10		12.10	30%	139.63		139.63
553	S I TEE HG ASTmD = 2½"	u	2.00	8.72	17.44000	2.00		2.00	100%	17.44		17.44
554	S I CODO HG ASTm90° X D = 2 ½"	u	10.00	6.70	67.00000	8.00		8.00	80%	53.60		53.60
555	S I uNION uNIVERSAL HG ASTm D = 2 1/2"	u	5.00	12.00	60.00000	22.00		22.00	440%	264.00		264.00
556	S I VALVuLA CHECK BRONCE D = 2 1/2 "	u	1.00	79.42	79.42000	1.00		1.00	100%	79.42		79.42
557	S I REDuCTOR HG ASTmD = 2 1/2" X 1 1/2"	u	1.00	9.48	9.48000	2.00		2.00	200%	18.96		18.96
558	S I uNIÓN uNIVERSAL HG ASTmD = 1 1/2"	u	5.00	8.23	41.15000	2.00		2.00	40%	16.46		16.46
559	S I CODO HG ASTm D = 1 1/2"	u	6.00	8.93	53.58000	5.00		5.00	83%	44.65		44.65
560	ANCLAJES mETALICOS PLATINA 2 por 1/2" (ABRAZADERAS), EN LOSA Y PARED	u	80.00	14.11	1128.80000	67.00		67.00	84%	945.37		945.37
561	PuNTO H.G. ROSCABLE 1 1/2" AGuA por punto	u	2.00	74.00	148.00000	2.00		2.00	100%	148.00		148.00
562	PuNTO H G. ROSCABLE 2" AGuA por punto	u	1.00	81.83	81.83000							
563	GAB CONT INCEN INC GAB SN VID, RACK DE INC Y mANG 100FT X1½"LLAVE SPAN	u	2.00	749.90	1499.80000	2.00		2.00	100%	1499.80		1499.80
564	SIAmESA 4"X 2 1/2" X 2 1/2" DE BRONCE	u	1.00	295.97	295.97000	1.00		1.00	100%	295.97		295.97
	EXTINTORES											
565	EXTINTOR PQS CAPACIDAD 10 LBS. CON CAJA mETALICA	u	16.00	99.84	1597.44000							
566	EXTINTOR PQS CAPACIDAD 20 LBS. CON CAJA mETALICA	u	2.00	106.69	213.38000							
567	EXTINTOR CO2 CAPACIDAD 10 LBS. CON CAJA mETALICA	u	4.00	97.66	390.64000							
568	EXTINTOR CO2 CAPACIDAD 20 LBS. CON CAJA mETALICA	u	2.00	313.27	626.54000							
569	EXTINTOR CO2 CAPACIDAD TIPO SATELITE DE 50 LBS	u	1.00	578.23	578.23000							
	SISTEMA DE PRESION (BOMBEO) S CONTRAINCENDIOS											
570	S I SISTEmA HIDRONEumATICO(BOmBA-mOTOR-CAJA DE CONTROL-CONTROL D	u	1.00	7949.92	7949.92000	1.00		1.00	100%	7949.92		7949.92
571	BOmBA JOCKEY; 1 HP, Q=8.70 GPm, PRES=110m; INCLuYE TABLERO DE CONTRO	u	1.00	2762.08	2762.08000	1.00		1.00	100%	2762.08		2762.08
	SISTEMA DE REUTILIZACION DE AGUAS LLUVIAS (RIEGO Y LAV											
572	REPLANTEO Y NIVELACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	m	250.00	1.81	452.50000	66.97		66.97	27%	121.22		121.22
573	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	200.00	17.93	3586.00000							
574	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	200.00	6.32	1264.00000							
575	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm INT=160mm)	m	120.00	9.91	1189.20000	181.08		181.08	151%	1794.50		1794.50
576	CAJA REV H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	12.00	90.42	1085.04000							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
											ALL	
	TUBERIA PVC RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS											
577	SumI. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=160 mm S6	m	50.00	9.70	485.00000	513.56		513.56	1027%	4981.53		4981.53
578	SumI. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT = 200 mm S6	m		15.28								
579	SumI. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 228 mm S6	m		15.88								
580	SumI. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 250 mm S6	m	90.00	16.51	1485.90000							
581	SumI. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 300 mm S5	m	30.00	20.22	606.60000							
582	SumI. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=400 mm S5	m	428.11	38.33	16409.45630	765.70		765.70	179%	29349.28		29349.28
583	SumI. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 450 mm S5	m	30.00	44.36	1330.80000							
584	SumI. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 500 mm S5	m		74.42								
585	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 220A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u	3.00	21.28	63.84000							
586	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 335A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u	3.00	24.14	72.42000	30.00		30.00	1000%	724.20		724.20
	TUBERIA PVC PRESION RECOLECCION AGUAS LLUVIAS											
587	TuBERIA PVC D=3" 1.0 mPA + PRuBA	m	12.00	5.16	61.92000							
588	VALVuLA TIPO GLOBO (CONTROL NIVEL mECANICO)	u	2.00	17.82	35.64000							
589	ROCIADOR 3/4 Q=3.22 m3/H, RADIO COBERTuRA 15.8m, 5BAR	u		17.82								
590	TuBERIA PVC D=25 mm 1.0 mPA u/C + PRuEBA	m	80.00	2.98	238.40000							
591	TuBERIA PVC D=40 mm 1.0 mPA E/C + PRuEBA	m	20.00	3.38	67.60000							
592	TuBERIA PVC D=50 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m	20.00	3.50	70.00000							
593	TuBERIA PVC D=63 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m	47.00	4.09	192.23000							
594	TuBERIA PVC D=75 mm 1.0 mPA u/E + PRuBA	m	30.00	5.23	156.90000							
595	TuBERIA PVC D=90 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m	25.00	6.20	155.00000							
596	TuBERIA PVC D=110 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m		8.48								
597	TuBERIA PVC D=125 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m		11.54								
	SISTEMA DE PRESION (RIEGO Y LAVADORA AUTOS)											
598	GRuPO 2 BOmBAS15 HP (Q=12 L/S, TDH= 80mCA), (2BOmBA-mOTOR-CAJA DE CO	u		6465.34								
599	GRuPO 3 BOmBAS15 HP (Q=21 L/S, TDH= 80mCA), (3BOmBA-mOTOR-CAJA DE CO	u	1.00	8868.10	8868.10000	1.00		1.00	100%	8868.10		8868.10
	SISTEMA SANITARIO INTERNO											
	PRELIMINARES Y MOV. TIERRAS											
600	REPLANTEO Y NIVELACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	m	390.00	1.81	705.90000	15.91		15.91	4%	28.80		28.80
601	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	12.00	17.93	215.16000							
602	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3		6.32								
	INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE											
603	PuNTO DE DESAGuE EN PVC 50 mm	u	86.00	28.80	2476.80000	86.00		86.00	100%	2476.80		2476.80
604	PuNTO DE DESAGuE EN PVC 110 mm	u	45.00	34.43	1549.35000	41.00		41.00	91%	1411.63		1411.63
605	TuBERÍA PVC 50 mm DE DIÁmETRO (mAT/TRASP/INST)	m	125.60	5.14	645.58400	70.47		70.47	56%	362.23		362.23
606	TuBERÍA PVC 110 mm DE DIÁmETRO (mAT/TRASP/INST)	m	420.00	8.02	3368.40000	420.00		420.00	100%	3368.40		3368.40
607	TuBERÍA PVC 160 mm DE DIÁmETRO (mAT/TRASP/INST)	m	165.00	14.52	2395.80000	72.64		72.64	44%	1054.73		1054.73

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
608	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	6.00	90.42	542.52000							
	INSTALACION TUBERIA PVC DEVENTILACIÓN											
609	TuBERIA PVC D=75 mm VENTILACIÓN	m	78.00	4.27	333.06000	174.22		174.22	223%	743.92		743.92
610	PuNTO DE VENTILACIÓN PVC 75 mm por punto	u	25.00	15.61	390.25000	26.00		26.00	104%	405.86		405.86
	TANQUES DE RESERVA DE AGUA-CISTERNAS 49 M3											
	PRELIMINARES											
611	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	68.64	1.14	78.24960							
612	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATA	m2	60.00	1.46	87.60000	60.00		60.00	100%	87.60		87.60
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
613	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17.93								
614	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	201.65	4.18	842.89700	201.60		201.60	100%	842.69		842.69
615	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	m2		11.56								
616	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	41.00	13.72	562.52000	42.00		42.00	102%	576.24		576.24
617	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	10.00	6.32	63.20000							
	HORMIGONES											
618	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRAN	m3	4.10	163.18	669.03800	4.10		4.10	100%	668.91		668.91
619	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRAN	m3	29.66	249.88	7411.44080	26.85		26.85	91%	6709.28		6709.28
	ACERO ESTRUCTURAL											
620	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	2459.03	1.68	4131.17040	2459.09		2459.09	100%	4131.27		4131.27
621	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	50.00	2.76	138.00000							
622	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORRO	Kg	50.00	0.11	5.50000							
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES											
623	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	144.00	10.27	1478.88000	29.66		29.66	21%	304.61		304.61
624	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	113.00	26.06	2944.78000	127.18		127.18	113%	3314.26		3314.26
625	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPO	m2	15.00	4.72	70.80000							
626	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u	2.00	75.58	151.16000							
	TANQUES DE RESERVA DE AGUA-CISTERNAS 11 M3											
	PRELIMINARES											
627	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1.14								
628	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATA	m2	36.80	1.46	53.72800							
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
629	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	5.00	17.93	89.65000							
630	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	97.58	4.18	407.88440	79.81		79.81	82%	333.60		333.60
631	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	m2	17.00	11.56	196.52000							
632	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	55.20	13.72	757.34400	51.31		51.31	93%	703.97		703.97
633	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	5.00	6.32	31.60000							
	HORMIGONES											
634	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRAN	m3	1.66	163.18	270.87880	1.66		1.66	100%	270.88		270.88

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
635	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRAN	m3	16.93	249.88	4230.46840	13.22	3.71	16.93	100%	3302.16	927.05	4229.21
	ACERO ESTRUCTURAL											
636	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	1490.00	1.68	2503.20000	1490.00		1490.00	100%	2503.20		2503.20
637	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	40.00	2.76	110.40000							
638	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROS	Kg	40.00	0.11	4.40000							
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES											
639	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	69.83	10.27	717.15410		52.53	52.53	75%		539.43	539.43
640	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	69.83	26.06	1819.76980		52.53	52.53	75%		1368.80	1368.80
641	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPO	m2	15.00	4.72	70.80000		12.42	12.42	83%		58.62	58.62
642	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u	2.00	75.58	151.16000							
	TANQUES DE RESERVA DE AGUA-CISTERNAS 36 M3(REUTILIZA											
	PRELIMINARES											
643	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1.14								
644	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATA	m2		1.46								
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
645	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17.93								
646	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3		4.18								
647	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	m2		11.56								
648	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3		13.72								
649	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3		6.32								
	HORMIGONES											
650	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRAN	m3		163.18								
651	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRAN	m3		249.88								
	ACERO ESTRUCTURAL											
652	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg		1.68								
653	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg		2.76								
654	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROS	Kg		0.11								
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES											
655	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2		10.27								
656	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2		26.06								
657	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPO	m2		4.72								
658	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u		75.58								
	TANQUES DE RESERVA DE AGUA-CISTERNAS 20 M3(REUTILIZA											
	PRELIMINARES											
659	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1.14								
660	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATA	m2		1.46								
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
661	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17.93								

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO: *365*	Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
662	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3		4.18								
663	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	m2		11.56								
664	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3		13.72								
665	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3		6.32								
	HORMIGONES											
666	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRAN	m3		163.18								
667	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRAN	m3		249.88								
	ACERO ESTRUCTURAL											
668	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg		1.68								
669	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg		2.76								
670	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROS	Kg		0.11								
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES											
671	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2		10.27								
672	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2		26.06								
673	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPO	m2		4.72								
674	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u		75.58								
	TRAMPA DE GRASAS											
675	TRAmPA DE GRASAS 0.60 por 1.40 por H=1.70 (F'C= 210 KG/Cm2), INC. ACCESOR	u		161.89								
676	SumINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA H.F. (1.00 por 0.40 por 0.05)110 KG	u		130.84								
677	CANAL. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 , E= 10Cm + 1Ø10mm A 12Cm	m		90.42								
	12.- SISTEMA DE ING. MECANICA (CLIMATIZACIÓN, AIRE PRESU											
	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN											
678	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 9,500 BTu/H, CON TER	u		1235.36								
679	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 12000 BTu/H, CON TER	u		1318.07								
680	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 18000 BTu/H, CON TER	u		1349.08								
681	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 24,000 BTu/H, CON TEF	u	2.00	1504.15	3008.30000	2.00		2.00	100%	3008.30		3008.30
682	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 30,000 BTu/H, CON TEF	u		1561.01								
683	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 36,000 BTu/H, CON TEF	u	5.00	1767.77	8838.85000	5.00		5.00	100%	8838.85		8838.85
684	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 1/4 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉR	m	60.00	11.74	704.40000	49.45		49.45	82%	580.54		580.54
685	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 1/2 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉR	m	68.00	12.29	835.72000	49.45		49.45	73%	607.74		607.74
686	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 3/4 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉR	m	8.00	18.29	146.32000	6.33		6.33	79%	115.78		115.78
687	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 5/8 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉR	m	50.00	15.65	782.50000	69.81		69.81	140%	1092.53		1092.53
688	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 3/8 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTOTÉR	m	50.00	11.96	598.00000	68.67		68.67	137%	821.29		821.29
689	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 1-1/8 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TE	m	28.00	30.40	851.20000	22.43		22.43	80%	681.87		681.87
690	SOPORTE DE TuBERÍA DE COBRE	u	45.00	14.95	672.75000	55.00		55.00	122%	822.25		822.25
691	TuBERIA PVC DIAmETRO 50 mm	m	260.00	7.31	1900.60000	49.34		49.34	19%	360.64		360.64
692	TuBERIA PVC DIAmETRO 75 mm	m	20.00	7.42	148.40000							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
693	DuCTO DE TOL TOLGALVANIZADO	Kg		5.81								
694	REJILLA EXTRACCIÓN/SumINISTRO TIPO LOuVER CON ALETASFIJAS DE ACERO 1	u		83.69								
695	REJILLA SumINISTRO TIPO LOuVER CON ALETAS mÓVILES Y FIJAS DE ACERO 12	u		95.12								
696	DuCTO FLEXIBLE DIÁmETRO 6"	u		13.60								
697	DuCTO FLEXIBLE DIÁmETRO 4"	u		13.36								
698	VENTILADOR CENTRIFuGO EN LÍNEA PARA TumBADO 2500 CFm @ 0.35 PLG. H2O	u		1515.23								
699	VENTILADOR CENTRIFuGO EN LÍNEA PARA TumBADO 1700 CFm @ 0.32 PLG. H2O	u		1401.52								
700	VENTILADOR CENTRIFuGO TIPO DOWNBLAST PARA TECHO 500 CFm @ 0.32 PLG.	u		1378.78								
701	uNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR TIPO VRV, DC INVERTER, 118,000 BTu/H	u	2.00	9376.49	18752.98000	2.00		2.00	100%	18752.98		18752.98
702	uNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR TIPO VRV, DC INVERTER, 140,000 BTu/H	u		10286.22								
703	uNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR TIPO VRV, DC INVERTER, 158,000 BTu/H	u		12426.17								
704	uNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR TIPO VRV, DC INVERTER, 188,000 BTu/H	u		11754.19								
705	CONTROL CENTRALIZADO PARA LAS uNIDADES CONDENSADORAS	u	1.00	2505.01	2505.01000	1.00		1.00	100%	2505.01		2505.01
706	S. I. EXTRACTOR EÓLICO INDuSTRIAL,TuRBINA=112 Cm, DuCTO 61Cm; ALTuRA=85	u	50.00	326.58	16329.00000	10.00		10.00	20%	3265.80		3265.80
	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO											
707	COmPRESOR DE AIRE DE PISTÓN 15 HP, CuATRO PISTONES, LuBRICACIÓN CON	m	2.00	5513.68	11027.36000							
708	TuBERIA DE COBRE DIAmETRO 1-1/2 PLG. TIPO L, SOLDADA	m	380.00	33.29	12650.20000							
709	TuBERIA DE COBREDIAmETRO 1/2 PLG. TIPO L, SOLDADA	m	100.00	10.49	1049.00000							
710	VÁLVuLAS DE BOLA DE 1/2 PLG DE BRONCE	m	26.00	10.80	280.80000							
711	SOPORTE DE TuBERÍA DE COBRE	u	70.00	14.95	1046.50000							
	CABINA PARA PINTURA											
712	Sum E INST. CABINA PARA PINTuRA HORNO ANCHO=3.68, ALTO=3.275, LARGO=6.	u	1.00	38677.92	38677.92000							
	ELEVADOR HIDRAULICO											
713	ELEVADOR HIDRAuLICO mOVIL TIPO 4 COLumNAS, ST 1075, CAP=16500 LBS, ALT	u	1.00	43151.04	43151.04000	1.00		1.00	100%	43151.04		43151.04
	13.- SISTEMA ELECTRONICO, VOZ, DATOS, INCENDIOS)						SD				SD	
	CANALIZACION											
714	POZO DE REVISION 80X60X60Cm	u	23.00	158.53	3646.19000	23.00		23.00	100%	3646.19		3646.19
715	BANDEJA TIPO ESCALERILLA 10CmX8Cm INCLuYE ACCESORIOS	m	172.00	46.57	8010.04000	162.45	4.00	166.45	97%	7565.30	186.28	7751.58
716	BANDEJA TIPO ESCALERILLA 25CmX10Cm INCLuYE ACCESORIOS	m	324.00	100.74	32639.76000	252.24		252.24	78%	25410.66		25410.66
717	TuBERIA PVC REFORZADA 4"	m	780.00	20.27	15810.60000	366.00		366.00	47%	7418.82		7418.82
718	TuBERÍA CONDuIT EmT 1/2" DE DIÁmETRO INCLuIDO ACCESORIOS	m	50.00	7.21	360.50000							
719	TuBERÍA CONDuIT EmT 3/4" DE DIÁmETRO INCLuIDO ACCESORIOS	m	50.00	16.51	825.50000							
720	TuBERÍA CONDuIT EmT 1" DE DIÁmETRO INCLuIDO ACCESORIOS	m	120.00	19.19	2302.80000	560.69		560.69	467%	10759.64		10759.64
721	POSTE mETALICO	u		923.51								
	SISTEMA DE VOZ Y DATOS											
722	PuNTO DE RED DE DATOS CON CABLE FTP 6A	u	197.00	151.66	29877.02000	217.00		217.00	110%	32910.22		32910.22
723	RACK DE SALA DE EQuIPOS TIPO ARmARIO 42 uR	u	1.00	1817.12	1817.12000	1.00		1.00	100%	1817.12		1817.12

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
724	RACK DE SALA DE COmuNICACIONES TIPO ARmARIO 42 uR	u	1.00	1617.13	1617.13000	1.00		1.00	100%	1617.13		1617.13
725	RACK DE SALA DE COmuNICACIONES TIPO ARmARIO 12 uR	u	3.00	742.45	2227.35000	3.00		3.00	100%	2227.35		2227.35
726	PATCH PANEL 24 PuERTOS RJ45 CATEGORIA 6A BLINDADO mODuLAR	u	12.00	213.78	2565.36000	12.00		12.00	100%	2565.36		2565.36
727	PATCH COORD CATEGORIA 6A FTP 1 m	u	197.00	20.17	3973.49000	222.00		222.00	113%	4477.74		4477.74
728	PATCH COORD CATEGORIA 6A FTP 10 PIES	u	197.00	21.78	4290.66000	197.00		197.00	100%	4290.66		4290.66
729	VERIFICACION Y PRuEBAS DE CATEGORIA	u	197.00	18.92	3727.24000	217.00		217.00	110%	4105.64		4105.64
730	SWITCH 24 PuERTOS RJ45, CAPA 2, POE, mODuLAR SFP+	u	8.00	1753.78	14030.24000	8.00		8.00	100%	14030.24		14030.24
731	SWITCH 24 PuERTOS RJ45, CAPA 2, mODuLAR SFP+	u	4.00	1042.64	4170.56000	4.00		4.00	100%	4170.56		4170.56
732	SWITCH 24 PuERTOS RJ45, CAPA 3, POE, mODuLAR SFP+	u	1.00	1410.88	1410.88000	1.00		1.00	100%	1410.88		1410.88
733	mODuLO PARA SWITCH CON 2 PuERTOS DE 10 GBPS PARA STACK	u	2.00	2555.02	5110.04000							
734	CABLE FLEXIBLE PARA STACK CON 2 CONECTORES DE 10 GBPS	u	8.00	454.27	3634.16000	8.00		8.00	100%	3634.16		3634.16
735	mODuLO PARA SWITCH CON 2 PORTICOS DE 10GBPS (SFP+)	u	2.00	2557.78	5115.56000							
736	TRANSCEIVER DE 10 GBPS (SFP+)	u	8.00	3317.76	26542.08000	8.00		8.00	100%	26542.08		26542.08
737	PATCH COORD DE FIBRA OPTICA 3mT	u	10.00	62.35	623.50000	10.00		10.00	100%	623.50		623.50
738	ACCES POINT	u	9.00	643.76	5793.84000	9.00		9.00	100%	5793.84		5793.84
739	CONTROLADOR DE RED INALAmBRICA	u	2.00	4213.78	8427.56000	2.00		2.00	100%	8427.56		8427.56
740	FIBRA OPTICA muLTImODO 6 HILOS	u	500.00	15.04	7520.00000	600.00		600.00	120%	9024.00		9024.00
741	BANDEJA DE FIBRA OPTICA 12 PuERTOS CON CONECTORES LC	u	1.00	411.79	411.79000	1.00		1.00	100%	411.79		411.79
742	BANDEJA DE FIBRA OPTICA 6 PuERTOS	u	4.00	263.96	1055.84000	4.00		4.00	100%	1055.84		1055.84
743	FuSIONADO DE FIBRA OPTICA INCLuYE PIGTAIL Y CERTIFICACION	u	10.00	98.34	983.40000	16.00		16.00	160%	1573.44		1573.44
744	PuERTA ANTI FuEGO	u	2.00	2765.74	5531.48000	2.00		2.00	100%	5531.48		5531.48
745	uPS 15 KVA	u	1.00	6207.31	6207.31000	1.00		1.00	100%	6207.31		6207.31
746	TABLERO BYPASS PARA DATA CENTER	u	1.00	2070.65	2070.65000	1.00		1.00	100%	2070.65		2070.65
747	TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL PARA DATA CENTER	u	1.00	2236.86	2236.86000							
748	BORNERA DE INSTALACION A TIERRA PARA RACK	u	5.00	22.92	114.60000	5.00		5.00	100%	114.60		114.60
749	BARRA PARA CONEXIÓN A TIERRA 8mmX12mm	u	5.00	48.71	243.55000	1.00		1.00	20%	48.71		48.71
750	CABLE THHN No. 6 AWG 19H	u	100.00	17.95	1795.00000	70.00	61.50	131.50	132%	1256.50	1103.93	2360.43
751	PuNTO DE VIDEO VGA	u	7.00	127.50	892.50000	7.00		7.00	100%	892.50		892.50
752	EQuIPO uTm PARA 100 uSuARIOS INCLuYE SISTEmA DE TELEFONÍA	u	1.00	27174.40	27174.40000	1.00		1.00	100%	27174.40		27174.40
753	TELEFONO IP NORmAL	u	41.00	110.92	4547.72000	41.00		41.00	100%	4547.72		4547.72
754	TELEFONO IP GERENCIAL	u	4.00	213.78	855.12000	4.00		4.00	100%	855.12		855.12
755	PROGRAmACION Y PuESTA EN mARCHA DEL SISTEmA	u	1.00	1266.70	1266.70000	1.00		1.00	100%	1266.70		1266.70
	SISTEMA DE SONORIZACION											
756	CENTRAL DE SONIDO	u	1.00	11071.93	11071.93000	1.00		1.00	100%	11071.93		11071.93
757	PARLANTE DECORATIVO PARA CIELO FALSO CON TRANSFORmADOR DE LINEA	u	24.00	41.20	988.80000	24.00		24.00	100%	988.80		988.80
758	ALTAVOZ EXTERIOR30W (BOCINA)	u	8.00	174.70	1397.60000	8.00		8.00	100%	1397.60		1397.60
759	PuNTO DE SONIDO	u	32.00	41.17	1317.44000	32.00		32.00	100%	1317.44		1317.44

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
760	PuNTO DE mICROFONO	u	3.00	52.26	156.78000	3.00		3.00	100%	156.78		156.78
761	CONTROL DE VOLumEN	u	3.00	145.81	437.43000	3.00		3.00	100%	437.43		437.43
762	ALTAVOCES PARA AuDITORIO CON AmPLIFICADOR INCLuIDO 400W	u	4.00	625.13	2500.52000	4.00		4.00	100%	2500.52		2500.52
763	PuNTO DE SONIDO PARA AuDITORIO	u	4.00	77.68	310.72000	4.00		4.00	100%	310.72		310.72
764	CENTRAL DE SONIDO PARA AuDITORIO	u	1.00	2236.64	2236.64000	1.00		1.00	100%	2236.64		2236.64
765	PROGRAmACION Y PuESTA EN mARCHA DEL SISTEmA DE SONORIZACION	u	1.00	749.33	749.33000	1.00		1.00	100%	749.33		749.33
	SISTEMA DE INCENDIO											
766	ESTACION mANuAL DE ALARmA DE EmERGENCIA	u	24.00	93.78	2250.72000	16.00		16.00	67%	1500.48		1500.48
767	LuZ ESTROBOSCOPICA	u	24.00	133.78	3210.72000	16.00		16.00	67%	2140.48		2140.48
768	DETECTOR DE HumO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE	u	93.00	91.90	8546.70000	103.00	1.00	104.00	112%	9465.70	91.90	9557.60
769	DETECTOR TERmICO DIRECCIONABLE	u	8.00	91.90	735.20000	8.00		8.00	100%	735.20		735.20
770	PuNTO DE ALARmAS DE INCENDIO	u	153.00	73.78	11288.34000	153.00	1.00	154.00	101%	11288.34	73.78	11362.12
771	CENTRAL DE INCENDIO DIRECCIONABLE	u	1.00	3176.64	3176.64000	1.00		1.00	100%	3176.64		3176.64
772	mODuLOS DE AISLADORES DE CORTO CIRCuITO	u	5.00	81.40	407.00000	5.00		5.00	100%	407.00		407.00
773	mODuLOS DE mONITOREO DE ZONAS	u	4.00	78.54	314.16000	4.00		4.00	100%	314.16		314.16
774	ANuNCIADOR REmOTO	u	1.00	438.28	438.28000	1.00		1.00	100%	438.28		438.28
775	LAmPARAS DE EmERGENCIA	u	54.00	52.63	2842.02000	54.00		54.00	100%	2842.02		2842.02
776	LAmPARAS DE AVISO DE SALIDA	u	16.00	45.78	732.48000	16.00		16.00	100%	732.48		732.48
777	FuENTE REmOTA DE ALARmAS DE INCENDIO	u	1.00	797.28	797.28000	1.00		1.00	100%	797.28		797.28
778	SEÑALETICA INCENDIOS	u	34.00	26.35	895.90000	17.00		17.00	50%	447.95		447.95
779	PROGRAmACION Y PuESTA EN mARCHA EL SISTEmA DE INCENDIO	u	1.00	1045.26	1045.26000	1.00		1.00	100%	1045.26		1045.26
	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS											
780	CERRADuRA ELECTROmAGNETICA 600LB	u	20.00	139.78	2795.60000	18.00	4.00	22.00	110%	2516.04	559.12	3075.16
781	PuLSANTE DE SALIDA PARA CONTROL DE ACCESOS	u	11.00	29.53	324.83000	11.00	3.00	14.00	127%	324.83	88.59	413.42
782	LECTOR DE PROXImIDAD CON TECLADO	u	17.00	252.04	4284.68000	17.00		17.00	100%	4284.68		4284.68
783	CONTACTO mAGNETICO	u		15.29								
784	CONTROLADOR DE ACCESOS - CONTROL DE COmuNICACIONES	u	5.00	649.13	3245.65000	5.00		5.00	100%	3245.65		3245.65
785	TARJETAS PARA CONTROL DE ACCESOS	u	36.00	18.06	650.16000	36.00		36.00	100%	650.16		650.16
786	PuNTO PARA ELEmENTOS DE CONTROL DE ACCESOS	u	48.00	47.14	2262.72000	43.00		43.00	90%	2027.02		2027.02
787	CABLE EKKX 10 PARES	u	500.00	17.21	8605.00000	469.10		469.10	94%	8073.21		8073.21
788	DETECTORES INFRARROJOS	u	35.00	23.94	837.90000	35.00		35.00	100%	837.90		837.90
789	SIRENAS Y ALARmAS DE SEGuRIDAD	u	3.00	52.87	158.61000	3.00		3.00	100%	158.61		158.61
790	PANEL CONTROLADOR DE ALARmAS	u	2.00	187.58	375.16000	2.00		2.00	100%	375.16		375.16
791	PuNTOS DEL SISTEmA DE SEGuRIDAD	u	38.00	75.29	2861.02000	38.00		38.00	100%	2861.02		2861.02
792	SEÑALETICA DE ACCESOS	u	4.00	26.35	105.40000							
793	BARRERAS	u		1929.64								
794	LOOPS	u		134.81								

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
795	LECTOR BIOmETRICO	u	3.00	207.83	623.49000	3.00		3.00	100%	623.49		623.49
796	PROGRAmACION Y PuESTA EN mARCHA EL SISTEmA DE CONTROL DE ACCESOS	u	1.00	690.14	690.14000	1.00		1.00	100%	690.14		690.14
	SISTEMA DE CCTV											
797	VIDEOGRABADOR DIGITAL NVR	u	1.00	2926.25	2926.25000	1.00		1.00	100%	2926.25		2926.25
798	mONITOR A COLOR LED FHD 32"	u	1.00	1601.28	1601.28000	1.00		1.00	100%	1601.28		1601.28
799	CAmARA IP DE CCTV FIJA EN DOmO	u	21.00	218.46	4587.66000	21.00		21.00	100%	4587.66		4587.66
800	CAmARA IP DE CCTV TIPO BALA	u	2.00	206.92	413.84000	2.00		2.00	100%	413.84		413.84
801	CAmARA IP DE CCTV PTZ EN DOmO	u	9.00	728.00	6552.00000	9.00		9.00	100%	6552.00		6552.00
802	CAmARAIP 360 (FISHERE)	u	10.00	1039.01	10390.10000	8.00		8.00	80%	8312.08		8312.08
803	CONTROLADOR PARA CAmARA mOVIL CON TECLADO Y JOYSTICK	u	1.00	752.94	752.94000	1.00		1.00	100%	752.94		752.94
804	PROGRAmACION Y CONFIGuRACION DE CAmARAS, TASA DE GRABACION, IDENT	u	1.00	948.85	948.85000	1.00		1.00	100%	948.85		948.85
	SISTEMA DE PANTALLAS INFORMATIVAS											
805	SERVIDOR DEL SISTEmA DE INFORmACION Y TV IP	u	1.00	10774.19	10774.19000	1.00		1.00	100%	10774.19		10774.19
806	CONVERTIDOR NAVEGADOR INTERNET TV	u	1.00	2084.90	2084.90000	6.00		6.00	600%	12509.40		12509.40
807	TELEVISOR LCD 32"	u	7.00	1601.28	11208.96000	6.00		6.00	86%	9607.68		9607.68
808	PROGRAmACION Y PuESTA EN mARCHA EL SISTEmA DE PANTALLAS INFORmATI	u	1.00	867.70	867.70000	1.00		1.00	100%	867.70		867.70
	14.- CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA Y GARITA						CB			CB	CB	
	BATERIA SANITARIA GENERAL JUNTO A ZONA RECREACIONAL											
	PRELIMINARES											
809	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1.14								
810	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATA	m2		1.46								
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
811	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3		4.18								
812	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17.93								
813	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3		17.33								
814	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3		13.72								
815	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3		2.82								
	HORMIGONES											
816	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRAN	m3		163.18								
817	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF'C = 280KG./Cm2 IN	m3		225.97								
818	HORmIGON PREmEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CO	m3		283.42								
819	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOm	m3		289.16								
820	HORmIGON PREmEZCLADO LOSA/ VIGAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BO	m3		193.75								
821	BLOQuE ALIVIANADO EN LOSA.E=15X20X40 Cm	u		0.61								
	ACERO ESTRUCTURAL											
822	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg		1.68								
823	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2		4.84								
	CONTRAPISOS											

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
824	CONTRAPISO HORm.S. PREmEZ. F'C=280KG/Cm2 E= 4 PuLG. (SIN BASE)	m2		21.50								
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS											
825	mASILLADO DE PISOS, ENDuRECEDOR DE CuARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPE	m2		5.62								
826	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2		26.06								
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS											
827	mASILLADO E ImPERmEABILIZADO DE PISOS-LOSAS, mORTERO CEmENTO-AREN	m2		10.40								
828	ImPERmEABILIZACION LOSA DE CuBIERTA ImPRImANTE ASFALTICO SOLuBLE AL	m2		2.84								
829	ImPERmEABILIZACIONLOSA DE CuBIERTA LAmINAS ASFALTICAS	m2		13.85								
	BAJANTES AGUA LLUVIA											
830	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=110mm)	m		8.14								
831	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u		90.42								
832	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m		20.59								
	MAMPOSTERÍA											
833	RIOSTRAS DE H.S. F'C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3		258.83								
834	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=10 Cm	m2		17.71								
835	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2		22.90								
836	PICADO Y RESANADO DE mAmPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m		4.63								
837	mESON H.A. F'C=180 KG/Cm2 E=7 Cm HIERRO (LAVAmANOS+mESON)	m		34.03								
838	REVESTImIENTO mESON GRANITO	m		180.61								
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES											
839	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2		10.27								
840	ENLuCIDO VERTICAL PALETEADO mORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2		8.78								
841	ENLuCIDO HORIZONTAL PALETEADO mORTERO 1:3	m2		12.30								
842	EmPASTE VERTICAL Y HORIZONTAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2		6.04								
843	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPO	m2		4.72								
	CARPINTERIA METALICA											
844	PuERTA mETÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2mm , INC. CERRADuRA, BISAGRAS Y	m2		142.73								
845	PuERTAS mODuLARES, TAmBORADAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE E=1	m2		172.30								
846	DIVISIONES ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, TAmBORADAS INCLuYE ESTRuC	m2		161.18								
	VENTANERIA-PUERTAS ALUMINIO VIDRIO											
847	VENTANA CORREDIZA ALumINIO SERIE 200-INCL. VIDRIO LAmINADO 6mm	m2		183.67								
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS											
848	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF DISCAPACITADOS PRImE	u		297.96								
849	PASAmANOS PARA DISCAPACITADOS TuBO DIAm 32mm E=1.5mm EN ACERO INO	u		281.03								
850	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF PRImERA CALIDAD (PRO	u		297.96								
851	uRINARIO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF	u		261.01								
852	LAVABO BLANCO, LLAVE SENSOR mOVImIENTO (CON ACCESORIOS)	u		281.39								
853	DISPENSOR DE PAPEL HIGIENICO DIAm=275mm, ROLLO 70mm, ABATIBLE,ACERO	u		110.71								

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
854	DISPENSOR DE PAPEL TOALLA 400-600 uNIDADES, 330X273X130mm, ACERO INO	u		113.00								
855	DISPENSADOR DE JABON LIQuIDO ACERO INOX AISI304, ACABADO SATINADO	u		91.28								
856	ESPEJO DE VIDRIO FLOTADO 4mm- mARCO DE ALumINIO	m2		42.86								
857	SECADOR DE mANOS ACCIONAmIENTO AuTOmATICO 260X302X150mm, ACERO IN	u		238.44								
858	BASuRERO CILINDRICO A PEDAL D=250mm H=385 PARA BAÑO ACERO INOX. 304	u		66.60								
859	DuCHAS CON mEZCLADORA (CON ACCESORIOS)	u		135.94								
	GARITAS DE CONTROL											
	PRELIMINARES											
860	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1.14								
861	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATA	m2	34.81	1.46	50.82260	36.88		36.88	106%	53.84		53.84
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
862	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	37.47	4.18	156.62460	6.75		6.75	18%	28.22		28.22
863	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17.93								
864	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	9.26	17.33	160.47580							
865	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	23.08	13.72	316.65760							
866	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	37.47	2.82	105.66540	6.75		6.75	18%	19.04		19.04
	HORMIGONES											
867	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRAN	m3	1.00	163.18	163.18000	1.00		1.00	100%	163.18		163.18
868	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF'C = 280KG./Cm2 IN	m3	2.00	225.97	451.94000	2.40		2.40	120%	542.33		542.33
869	HORmIGON PREmEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CO	m3	1.13	283.42	320.26460	1.11		1.11	98%	314.60		314.60
870	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOm	m3	0.30	289.16	86.74800	0.18		0.18	60%	52.05		52.05
871	HORmIGON PREmEZCLADO LOSA/ VIGAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BO	m3	5.55	193.75	1075.31250	4.03		4.03	73%	781.15		781.15
872	BLOQuE ALIVIANADO EN LOSA.E=15X20X40 Cm	u		0.61								
	ACERO ESTRUCTURAL											
873	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	836.00	1.68	1404.48000	836.00		836.00	100%	1404.48		1404.48
874	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2	77.00	4.84	372.68000	69.31		69.31	90%	335.46		335.46
	CONTRAPISOS											
875	CONTRAPISO HORm.S. PREmEZ. F'C=280KG/Cm2 E= 4 PuLG. (SIN BASE)	m2	33.50	21.50	720.25000	25.40		25.40	76%	546.10		546.10
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS											
876	mASILLADO DE PISOS, ENDuRECEDOR DE CuARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPE	m2		5.62								
877	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	38.00	26.06	990.28000							
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS											
878	mASILLADO E ImPERmEABILIZADO DE PISOS-LOSAS, mORTERO CEmENTO-AREN	m2	41.10	10.40	427.44000							
879	ImPERmEABILIZACION LOSA DE CuBIERTA ImPRImANTE ASFALTICO SOLuBLE AL	m2	41.10	2.84	116.72400	43.53		43.53	106%	123.63		123.63
880	ImPERmEABILIZACIONLOSA DE CuBIERTA LAmINAS ASFALTICAS	m2	41.10	13.85	569.23500	43.53		43.53	106%	602.89		602.89
	BAJANTES AGUA LLUVIA											
881	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=110mm)	m	10.00	8.14	81.40000	237.09		237.09	2371%	1929.91		1929.91
882	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	3.00	90.42	271.26000	2.00		2.00	67%	180.84		180.84

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
883	SumI. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m	30.00	20.59	617.70000							
	MAMPOSTERÍA											
884	RIOSTRAS DE H.S. F'C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3	0.61	258.83	157.88630							
885	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=10 Cm	m2		17.71								
886	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2	72.50	22.90	1660.25000	56.42		56.42	78%	1292.02		1292.02
887	PICADO Y RESANADO DE mAmPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m	52.36	4.63	242.42680		52.36	52.36	100%		242.43	242.43
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES											
888	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	135.50	10.27	1391.58500	55.04		55.04	41%	565.22		565.22
889	ENLuCIDO VERTICAL PALETEADO mORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2	73.00	8.78	640.94000	57.96		57.96	79%	508.92		508.92
890	ENLuCIDO HORIZONTAL PALETEADO mORTERO 1:3	m2		12.30								
891	EmPASTE VERTICAL Y HORIZONTAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	208.50	6.04	1259.34000	55.04		55.04	26%	332.42		332.42
892	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPO	m2	399.10	4.72	1883.75200							
	CARPINTERIA METALICA											
893	PuERTA mETÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2mm , INC. CERRADuRA, BISAGRAS Y	m2	14.20	142.73	2026.76600							
894	PuERTA TAmBORADA 70Cm, ESQuELETO CANELO, mDF 9mm -LACADA-DISEÑO C	u	4.41	198.79	876.66390		4.41	4.41	100%		876.66	876.66
	VENTANERIA-PUERTAS ALUMINIO VIDRIO											
895	VENTANA CORREDIZA ALumINIO SERIE 200-INCL. VIDRIO LAmINADO 6mm	m2	14.50	183.67	2663.21500	11.25		11.25	78%	2065.92		2065.92
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS											
896	INODORO BLANCO (CON ACCESORIOS)	u	3.00	114.30	342.90000		2.00	2.00	67%		228.60	228.60
897	LAVABO BLANCO (CON ACCESORIOS)	u	3.00	115.74	347.22000		2.00	2.00	67%		231.48	231.48
898	DuCHAS (CON ACCESORIOS)	u		50.24								
	15.- CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y PORTO						CC			CC	CC	
	PRELIMINARES											
899	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	1765.78	1.14	2012.98920		4011.32	4011.32	227%		4572.90	4572.90
900	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATA	m2	882.89	1.46	1289.01940	878.84		878.84	100%	1283.11		1283.11
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
901	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	671.86	4.18	2808.37480		460.51	460.51	69%		1924.93	1924.93
902	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	30.00	17.93	537.90000							
903	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	404.00	13.72	5542.88000		515.79	515.79	128%		7076.64	7076.64
904	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	671.86	2.82	1894.64520		460.51	460.51	69%		1298.64	1298.64
	HORMIGONES											
905	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRAN	m3	9.34	163.18	1524.10120	8.23	0.51	8.74	94%	1342.97	83.22	1426.19
906	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF'C = 280KG./Cm2 IN	m3	15.35	225.97	3468.63950	15.76		15.76	103%	3561.29		3561.29
907	HORmIGON PREmEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CO	m3	30.84	283.42	8740.67280	19.61	5.98	25.59	83%	5557.87	1694.85	7252.72
908	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOm	m3	89.64	289.16	25920.30240	13.76	11.77	25.53	28%	3978.84	3403.41	7382.25
909	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F'C=180 KG/Cm2-50por cientoP)CIm	m3	43.60	169.86	7405.89600	90.41	6.24	96.65	222%	15357.04	1059.93	16416.97
	ACERO ESTRUCTURAL											
910	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	5740.62	1.68	9644.24160	5123.17	79.97	5203.14	91%	8606.93	134.35	8741.28

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
911	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	4678.00	2.76	12911.28000	2075.41	367.72	2443.13	52%	5728.13	1014.91	6743.04
912	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROS	Kg	4678.00	0.11	514.58000	2075.41	367.72	2443.13	52%	228.30	40.45	268.75
	MAMPOSTERIA											
913	RIOSTRAS DE H.S. F'C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3	12.50	258.83	3235.37500	7.57		7.57	61%	1959.34		1959.34
914	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2	680.00	22.90	15572.00000	908.88		908.88	134%	20813.35		20813.35
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES											
915	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	2110.10	10.27	21670.72700	1996.16		1996.16	95%	20500.56		20500.56
916	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	2110.10	5.26	11099.12600	1996.16		1996.16	95%	10499.80		10499.80
917	TEXTuRADO GRAFIATO GRuESO DE PAREDES, COLOR INSTITuCIONAL GADPPZ	m2	1112.60	6.04	6720.10400	559.54		559.54	50%	3379.62		3379.62
918	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPO	m2	1995.00	4.72	9416.40000	2048.27		2048.27	103%	9667.84		9667.84
	CARPINTERIA METALICA											
919	CERRAmIENTO TuBO ISO2 H.G. 2 "-mALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6mm, INC. F	m2	1054.50	36.37	38352.16500							
920	CERRAmIENTO VERJA DE TuBO AGuA ISO2 HG 2" Y TuBO RECT 80X40X2, INC. PIN	m2	400.00	70.48	28192.00000							
921	PORTON CORREDIZO TuBOISO 2 2", mARCO TuBO RECT 50X150X2mm, INC. PINTu	m2	138.40	68.64	9499.77600							
	NAVE DE DESECHOS											
	- VIAS Y PARQUEADEROS											
	)LIDACION DE PLATAFORMAS											
15	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	m3	537.97	2.92	1570.87240							
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREODE MEJORAMIENTO	m3-km	9683.46	0.28	2711.36880							
	2.- ESTABILIZACIÓN TALUDES											
	SISTEMA TIERRA ARMADA											
34	GEOTEXTIL TEJIDO- 2400 T PARA MURO DE CONTENCION TIERRA ARMADA	m2	320.00	3.06	979.20000	272.80		272.80	85%	834.77		834.77
35	GEOMALLA BX-11OO TENSAR	m2	64.40	3.19	205.43600	30.00		30.00	47%	95.70		95.70
	16. NAVE DE DESECHOS											
	REVESTIMIENTO DE TUMBADOS											
181	CIELO RASO FALSO TIPO GYPSUM PARA HUMEDAD-1/2"-SIN ESTUCAR	m2	115.00	20.04	2304.60000							
	PRELIMINARES											
206	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQUEADERO,Y PLATA	m2	347.75	1.46	507.71500							
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
211	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A MAQUINA)	m3	103.04	4.18	430.70720	28.08		28.08	27%	117.37		117.37
213	SUB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COMPACTADO (MAQUINA), CAPAS 20CM	m3	103.04	17.33	1785.68320	103.00		103.00	100%	1784.99		1784.99
214	RELLENO COMPACTADO A MAQUINA CON LASTRE TNM=8" (EN CAPAS DE 20 CM)	m3	140.54	13.72	1928.20880							
215	DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS	m3	133.95	2.82	377.73900							
	HORMIGONES											
216	HORMIGON PREMEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/CM2 INC. BOMBEO Y TRAN	m3	3.00	163.18	489.54000	5.84		5.84	195%	952.97		952.97
217	HORMIGÓN PREMEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CIMENTACIÓNF'C = 280KG./CM2 IN	m3	12.00	225.97	2711.64000	3.92		3.92	33%	885.80		885.80
218	HORMIGON PREMEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/CM2 INC. ENCOFRADO INC. CO	m3	12.78	283.42	3622.10760	13.18		13.18	103%	3735.48		3735.48
219	HORMIGON PREMEZCLADO COLUMNAS F'C=280 KG/CM2 INC. ENCOFRADO, BOM	m3	4.55	289.16	1315.67800							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
220	HORMIGÓN CICLÓPEO (50POR CIENTO H.S. F'C=180 KG/CM2-50POR CIENTOP)CIM	m3	17.04	169.86	2894.41440							
	ACERO ESTRUCTURAL											
221	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	Kg	4596.88	1.68	7722.75840	4813.19		4813.19	105%	8086.16		8086.16
222	PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A (36, 572, 325,193,108) (PROY. MONTAJE GF	Kg	18285.00	2.76	50466.60000	20478.06		20478.06	112%	56519.45		56519.45
223	TRATAMIENTO PINTURA ESTRUCTURA ACERO A36 (FONDO+PINTURA ANTICORRO	Kg	18285.00	0.11	2011.35000	20478.06		20478.06	112%	2252.59		2252.59
224	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6MM	m2	382.53	4.84	1851.42100	344.25		344.25	90%	1666.17		1666.17
	CONTRAPISOS											
225	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3 (CONTRAPISO E=20CM, COMPAC. 100POR CIEN	m3	62.46	10.78	673.31880							
226	MATERIAL DE BASE CLASE 2 (CONTRAPISO E=15CM, COMPAC. 100POR CIENTO F	m3	46.85	24.55	1150.16750	30.32		30.32	65%	744.36		744.36
227	CONTRAPISO HORM.S. PREMEZ. F'C=280KG/CM2 E= 4 PULG. (SIN BASE)	m2	347.75	21.50	7476.62500							
228	JUNTA ASERRADA DILATACION PISO (INC. CORDON, Y SELLO)	m	90.00	2.59	233.10000							
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS											
229	MASILLADO DE PISOS, ENDURECEDOR DE CUARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPE	m2	347.75	5.62	1954.35500	344.25		344.25	99%	1934.69		1934.69
230	PINTURA EPOXICA PISO INDUSTRIAL 3MM (2 COMPONENTES)	m2	310.00	34.78	10781.80000	310.00		310.00	100%	10781.80		10781.80
232	CERAMICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EMP	m2	94.00	26.06	2449.64000	66.63		66.63	71%	1736.38		1736.38
	CUBIERTA											
235	CUBIERTA GALVALUMEN E=0.45MM, RECUBRIENTO PINTURA POLIESTER ASTM-6	m2	486.35	13.92	6769.99200	446.90		446.90	92%	6220.85		6220.85
237	CUMBRERO GALVALUMEN E=0.40 MM A=0.50 M, INC. ACCES. INSTALACION	m	35.50	8.38	297.49000	35.20		35.20	99%	294.98		294.98
238	CANAL TOL GALV E= 0.70MM, H=30CM, A=40CM DESARR. 122 CM, INC. GANCHOS	m	71.00	21.49	1525.79000	70.40		70.40	99%	1512.90		1512.90
	BAJANTES AGUA LLUVIA											
239	BAJANTES DE AGUA LLUVIA (PVC DIAM. INT=160MM)	m	70.00	9.91	693.70000	29.96		29.96	43%	296.90		296.90
240	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/CM²0.60 POR 0.60 CON TAPA E= 7CM + 1Ø10MM A 12C	u	10.00	90.42	904.20000	8.00		8.00	80%	723.36		723.36
242	SUMIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO DIAM. INT.= 200A 160MM PVC Y/O POLIETILE	u	1.00	20.71	20.71000							
	MAMPOSTERÍA											
243	RIOSTRAS DE H.S. F'C=240KG/CM2 INC. ENCOFRADO	m3	8.48	258.83	2194.87840	4.42		4.42	52%	1144.03		1144.03
244	MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO VIBRADO 4MPAE=10 CM	m2	20.00	17.71	354.20000	17.58		17.58	88%	311.34		311.34
245	MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO VIBRADO 4MPAE=15 CM	m2	490.00	22.90	11221.00000	411.38		411.38	84%	9420.60		9420.60
246	PICADO Y RESANADO DE MAMPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m	120.00	4.63	555.60000		120.00	120.00	100%		555.60	555.60
247	MESON H.A. F'C=180 KG/CM2 E=7 CM HIERRO (LAVAMANOS+MESON)	m	3.50	34.03	119.10500		3.30	3.30	94%		112.30	112.30
248	REVESTIMIENTO MESON GRANITO	m	3.50	180.61	632.13500		4.95	4.95	141%		894.02	894.02
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES											
249	ENLUCIDO CON IMPERMEABILIZANTE MORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	392.72	10.27	4033.23440	251.76		251.76	64%	2585.58		2585.58
250	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO MORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2	450.00	8.78	3951.00000	638.03		638.03	142%	5601.90		5601.90
251	ENLUCIDO CON MALLA+ IMPERMEABILIZANTE, MORTERO 1:3	m2	25.00	17.03	425.75000							
252	EMPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	392.72	5.26	2065.70720	251.76		251.76	64%	1324.26		1324.26
253	EMPASTE VERTICAL (ACRILICO INTERIOR) INC. FILOS	m2	475.00	4.40	2090.00000	650.31		650.31	137%	2861.36		2861.36
254	PINTURA DE CAUCHO SATINADO COLOR (2 MANOS) INTER. <GUIA IMAGEN CORP	m2	475.00	4.72	2242.00000	702.93		702.93	148%	3317.83		3317.83
255	PINTURA DE CAUCHO SATINADA COLOR(2 MANOS) EXTERIOR (CANASTILLA) <GU	m2	392.72	5.72	2246.35840	332.28		332.28	85%	1900.64		1900.64
	CARPINTERIA METALICA											

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
257	VENTANA FIJA TUBO RECT 40X80X2-MALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6MM, INC	m2	39.06	41.30	1613.17800	39.06		39.06	100%	1613.18		1613.18
258	PORTON TIPO CORREDIZO RETRACTIL TUBO RECT 40X80X2MM-TOOL GALV. 0.6M	m2	4.40	61.25	269.50000							
259	PUERTA METÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2MM , INC. CERRADURA, BISAGRAS Y	m2	40.00	142.73	5709.20000		36.00	36.00	90%		5138.28	5138.28
260	PUERTAS MODULARES, TAMBORADAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE E=1	m2	1.00	172.30	172.30000		1.00	1.00	100%		172.30	172.30
	REVESTIMIENTO DE TUMBADOS											
264	CIELO RASO FALSO - FIBRA MINERAL Y RECUB LÁMINA ALUMINIO 0.60X0.60 BLAN	m2	324.75	21.59	7011.35250							
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS											
268	INODORO CON FLUXOMETRO LATON CROMADA 1.0 GPF PRIMERA CALIDAD (PRO	u	1.00	297.96	297.96000	1.00		1.00	100%	297.96		297.96
270	LAVABO BLANCO, LLAVE SENSOR MOVIMIENTO (CON ACCESORIOS)	u	2.00	281.39	562.78000	2.00		2.00	100%	562.78		562.78
271	DISPENSOR DE PAPEL HIGIENICO DIAM=275MM, ROLLO 70MM, ABATIBLE,ACERO	u	1.00	110.71	110.71000		1.00	1.00	100%		110.71	110.71
272	DISPENSOR DE PAPEL TOALLA 400-600 UNIDADES, 330X273X130MM, ACERO INO	u	1.00	113.00	113.00000		1.00	1.00	100%		113.00	113.00
273	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOX AISI304, ACABADO SATINADO	u	1.00	91.28	91.28000		1.00	1.00	100%		91.28	91.28
274	ESPEJO DE VIDRIO FLOTADO 4MM- MARCO DE ALUMINIO	m2	2.70	42.86	115.72200		2.70	2.70	100%		115.72	115.72
276	BASURERO CILINDRICO A PEDAL D=250MM H=385 PARA BAÑO ACERO INOX. 304	u	1.00	66.60	66.60000		1.00	1.00	100%		66.60	66.60
277	DUCHAS CON MEZCLADORA (CON ACCESORIOS)	u	1.00	135.94	135.94000		1.00	1.00	100%		135.94	135.94
	10.- SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACIÓN											
	POZOS DE REVISION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS											
305	CAJA REVISION MEDIA TENSION 60X60X75,ACERA, T/HA	u	1.00	179.17	179.17000							
306	PUESTA A TIERRA SIMPLE EN POZO ELECTRICO CON SUELDA EXOTERMICA	u	1.00	164.46	164.46000							
	INSTALACION LUMINARIAS											
362	CAJETINES METALICOS OCTOGONALES MEDIANOS CON TAPA	u	30.00	5.44	163.20000	71.00		71.00	237%	386.24		386.24
	INSTALACION LUMINARIAS											
427	TUBERIA EMT 1/2 PULGADA	m	70.00	3.34	233.80000	138.97		138.97	199%	464.16		464.16
428	UNION EMT 1/2 PULGADA	u	40.00	1.18	47.20000	37.00		37.00	93%	43.66		43.66
429	CONECTOR EMT 1/2 PULGADA	u	60.00	0.56	33.60000	92.00		92.00	153%	51.52		51.52
430	FIJACION DE TUBOS EN LOZA CON GRAPA METALICA EMT 1/2 PULGADA	u	30.00	4.87	146.10000	61.00		61.00	203%	297.07		297.07
431	CAJETINES METALICOS RECTANGULARES PROFUNDOS	u	10.00	1.57	15.70000	5.00		5.00	50%	7.85		7.85
432	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AMARILLO (INC. TA	m	70.00	2.28	159.60000	122.51		122.51	175%	279.32		279.32
433	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYP	m	70.00	1.43	100.10000	108.32		108.32	155%	154.90		154.90
434	LUMINARIA LED3X18W/120 VOLTIOS	u	30.00	60.59	1817.70000	17.00		17.00	57%	1030.03		1030.03
437	INTERRUPTOR SIMPLE CON TAPA	u	7.00	5.47	38.29000	5.00		5.00	71%	27.35		27.35
	TOMACORRIENTES GENERALES											
438	TUBERIA EMT 1/2 PULGADA	m	50.00	3.34	167.00000	41.91		41.91	84%	139.98		139.98
439	UNION EMT 1/2 PULGADA	u	15.00	1.18	17.70000	17.00		17.00	113%	20.06		20.06
440	CONECTOR EMT 1/2 PULGADA	u	10.00	0.56	5.60000	21.00		21.00	210%	11.76		11.76
441	FIJACION DE TUBOS EN LOZA CON GRAPA METALICA EMT 1/2 PULGADA	u	10.00	4.87	48.70000	25.00		25.00	250%	121.75		121.75
442	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZUL (INC. TAYPE)	m	50.00	1.43	71.50000	56.03		56.03	112%	80.12		80.12
443	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYP	m	50.00	1.43	71.50000	56.03		56.03	112%	80.12		80.12
444	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE	m	50.00	1.03	51.50000	56.03		56.03	112%	57.71		57.71

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
445	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	13.00	7.45	96.85000	4.00		4.00	31%	29.80		29.80
446	CAJETINES METALICOS RECTANGULARES PROFUNDOS	u	13.00	1.57	20.41000	4.00		4.00	31%	6.28		6.28
	ALIMENTADORES Y SUBTABLEROS CT-1											
	ALIMENTADOR TPD-STE-ANGAR-A4											
509	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 CU TW (INC. TAYPE)	m	20.00	14.51	290.20000							
510	SUBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS ANGAR 4	u	1.00	173.41	173.41000	1.00		1.00	100%	173.41		173.41
	11.- SISTEMA HIDRAULICO SANITARIO Y CONTRAINCENDIOS											
	SITEMA DE AGUA POTABLE A PRESIÓN CONSTANTE											
	TUBERIA PVC AGUA POTABLE											
533	TUBERIA PVC ROSCABLE D=1/2" EN EDIFICACION+PRUEBA	m	12.00	5.86	70.32000							
535	TUBERIA PVC ROSCABLE D=1" EN EDIFICACION+PRUEBA	m	45.00	9.78	440.10000							
	ACCESORIOS INST. TUB PVC ROSCABLE AGUA POTABLE											
541	ANCLAJES METALICOS PLATINA 2 POR 1/2" (ABRAZADERAS), EN LOSA Y PARED	u	10.00	14.11	141.10000							
542	S.I. PUNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGUA POR PUNTO	u	2.00	13.67	27.34000							
	EXTINTORES											
565	EXTINTOR PQS CAPACIDAD 10 LBS. CON CAJA METALICA	u	1.00	99.84	99.84000							
568	EXTINTOR CO2 CAPACIDAD 20 LBS. CON CAJA METALICA	u	1.00	313.27	313.27000							
	SISTEMA SANITARIO INTERNO											
	PRELIMINARES Y MOV. TIERRAS											
601	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	2.00	17.93	35.86000							
602	RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL (CAPAS 20 CM)	m3	3.00	6.32	18.96000							
	INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE											
603	PUNTO DE DESAGUE EN PVC 50 MM	u	3.00	28.80	86.40000							
604	PUNTO DE DESAGUE EN PVC 110 MM	u	1.00	34.43	34.43000							
605	TUBERÍA PVC 50 MM DE DIÁMETRO (MAT/TRASP/INST)	m	12.00	5.14	61.68000							
606	TUBERÍA PVC 110 MM DE DIÁMETRO (MAT/TRASP/INST)	m	5.00	8.02	40.10000							
607	TUBERÍA PVC 160 MM DE DIÁMETRO (MAT/TRASP/INST)	m	18.00	14.52	261.36000							
608	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/CM²0.60 POR 0.60 CON TAPA E= 7CM + 1Ø10MM A 12C	u	1.00	90.42	90.42000							
	INSTALACION TUBERIA PVC DEVENTILACIÓN											
609	TUBERIA PVC D=75 MM VENTILACIÓN	m	6.00	4.27	25.62000							
610	PUNTO DE VENTILACIÓN PVC 75 MM POR PUNTO	u	1.00	15.61	15.61000							
	13.- SISTEMA ELECTRONICO, VOZ, DATOS, INCENDIOS)											
	CANALIZACION											
714	POZO DE REVISION 80X60X60CM	u	1.00	158.53	158.53000							
715	BANDEJA TIPO ESCALERILLA 10CMX8CM INCLUYE ACCESORIOS	m	25.00	46.57	1164.25000							
717	TUBERIA PVC REFORZADA 4"	m	15.00	20.27	304.05000							
719	TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4" DE DIÁMETRO INCLUIDO ACCESORIOS	m	40.00	16.51	660.40000							
	SISTEMA DE INCENDIO											
766	ESTACION MANUAL DE ALARMA DE EMERGENCIA	u	1.00	93.78	93.78000							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
767	LUZ ESTROBOSCOPICA	u	1.00	133.78	133.78000							
768	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE	u	3.00	91.90	275.70000							
769	DETECTOR TERMICO DIRECCIONABLE	u	3.00	91.90	275.70000							
770	PUNTO DE ALARMAS DE INCENDIO	u	8.00	73.78	590.24000							
776	LAMPARAS DE AVISO DE SALIDA	u	1.00	45.78	45.78000							
778	SEÑALETICA INCENDIOS	u	1.00	26.35	26.35000							
	NAVE DE RESGUARDO											
	ACERO ESTRUCTURAL											
1	PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A (36, 572, 325,193,108) (PROY. MONTAJE GF	Kg	94474.86	2.76	260750.61360	94474.86		94474.86	100%	260750.61		260750.61
2	TRATAMIENTO PINTURA ESTRUCTURA ACERO A36 (FONDO+PINTURA ANTICORRO	Kg	94474.86	0.11	10392.23460	94474.86		94474.86	100%	10392.23		10392.23
	CONTRAPISOS											
3	JUNTA ASERRADA DILATACION PISO (INC. CORDON, Y SELLO)	m	857.00	2.59	2219.63000	581.30		581.30	68%	1505.57		1505.57
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS											
4	MASILLADO DE PISOS, ENDURECEDOR DE CUARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPE	m2	1445.85	5.62	8125.67700	1442.94		1442.94	100%	8109.32		8109.32
	CUBIERTA											
5	CUBIERTA GALVALUMEN E=0.45MM, RECUBRIENTO PINTURA POLIESTER ASTM-6	m2	1660.00	13.92	23107.20000	1681.75		1681.75	101%	23409.96		23409.96
6	CUBIERTA POLICARBONATO E=0.80 MM, COLOR BRONCE O SIMILAR, INC. ACCES	m2	190.00	14.34	2724.60000	94.85		94.85	50%	1360.15		1360.15
7	CUMBRERO GALVALUMEN E=0.40 MM A=0.50 M, INC. ACCES. INSTALACION	m	43.25	8.38	362.43500	43.50		43.50	101%	364.53		364.53
8	CANAL TOL GALV E= 0.70MM, H=30CM, A=40CM DESARR. 122 CM, INC. GANCHOS	m	86.50	21.49	1858.88500	87.00		87.00	101%	1869.63		1869.63
	CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS											
RN-1	GROUTING DE NIVELACIÓN	M3	3.35	1634.03	5474.00050	3.85		3.85	115%	6291.02		6291.02
RN-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE ASTM 193 B7	U	1416.00	49.44	70007.04000	1804.00		1804.00	127%	89189.76		89189.76
RN-3	BORDILLO DE H.S 180 KG/CM2 TIPO CUNETA	ML	2261.84	23.58	53334.18720	1294.71		1294.71	57%	30529.26		30529.26
RN-4	ACERAS DE H.S. F'C=180KG/CM2 E=7CM, ESCOBILLADA.	M2	3878.20	18.85	73104.07000	2616.27	171.97	2788.24	72%	49316.69	3241.63	52558.32
RN-5	ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACIÓN	L	19492.62	0.85	16568.72700							
RN-6	CAPA DE RODADURA HORMIGÓN ASFÁLTICO MEZCLADO EN PLANTA, E=3".	M2	12995.08	12.53	162828.35240							
RN-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO DE 500KG EN PUERTA DE IN	U	4.00	1081.08	4324.32000		4.00	4.00	100%		4324.32	4324.32
RN-8	PINTURA DE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN EN PARQUEADEROS Y PASOS PEATONALE	ML	669.42	0.62	415.04040							
RN-9	TOPES PARA ESTACIONAMIENTO H.S = 180 KG/CM2 . INCLUYE PINTURA REFLECT	U	88.00	12.91	1136.08000		88.00	88.00	100%		1136.08	1136.08
RN-10	JARDINERAS DE H.S= 180KG/CM2	ML	26.00	15.02	390.52000							
RN-11	PLANTAS ORNAMENTALES	ML	26.00	10.99	285.74000		534.20	534.20	2055%		5870.86	5870.86
RN-12	PALMERAS BOTELLAS ENANAS	U	7.00	34.74	243.18000		7.00	7.00	100%		243.18	243.18
RN-13	TAPAJUNTA DE ALUMINIO PISO-PISO A= 15CM	ML	35.00	16.25	568.75000							
RN-14	TAPAJUNTA DE ALUMINIO PISO-PARED A= 15CM EN INTERIORES	ML	65.00	16.90	1098.50000							
RN-15	TAPAJUNTA EXTERIOR TOOL GALVANIZADO	ML	40.00	14.53	581.20000							
RN-16	TAPAJUNTA DE HORMIGÓN LOSA-LOSA	ML	56.00	42.28	2367.68000	39.55		39.55	71%	1672.17		1672.17
RN-17	DUCHA ELÉCTRICA 110 V	U	7.00	29.03	203.21000		7.00	7.00	100%		203.21	203.21
RN-18	LLAVE DE DUCHA	U	7.00	20.90	146.30000		7.00	7.00	100%		146.30	146.30
RN-19	REJILLAS DE PISO 50 MM	U	42.00	4.84	203.28000		75.00	75.00	179%		363.00	363.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
RN-20	SUMIDERO DE CUBIERTA DE 110MM INCLUYE REJILLA TIPO CÚPULA	U	20.00	51.11	1022.20000	17.00	4.00	21.00	105%	868.87	204.44	1073.31
RN-21	BORDILLO PARA TINETA DE BAÑO REVESTIDA CON CERÁMICA (0,10MX0,15M)	ML	6.00	16.50	99.00000		6.80	6.80	113%		112.20	112.20
RN-22	MUEBLES AÉREOS DE MDF PARA COCINA	ML	7.00	180.68	1264.76000							
RN-23	MUEBLES BAJOS DE MDF PARA COCINA	ML	7.00	180.68	1264.76000							
RN-24	HORMIGÓN PREMEZCLADO PARA LOSA DE PISO F'C=280 KG/CM2 INC. ENCOFRA	M3	1204.92	209.28	252165.65760	1431.02		1431.02	119%	299483.87		299483.87
RN-25	FILOS INTERIORES Y EXTERIORES	ML	830.00	3.76	3120.80000	831.15		831.15	100%	3125.12		3125.12
RN-26	ENLUCIDO MEDIAS CAÑAS	ML	960.00	2.28	2188.80000	893.92		893.92	93%	2038.14		2038.14
RN-27	CUADRADA DE BOQUETES PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	1150.00	4.64	5336.00000	1024.34		1024.34	89%	4752.94		4752.94
RN-28	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON POLIESTIRENO EXPANDIDO 50 MM	M2	530.00	5.64	2989.20000							
RN-29	JUNTA DE DILATACIÓN TIPO LLAVE - LOSAS DE PISOS	ML	3200.00	2.36	7552.00000	2873.65		2873.65	90%	6781.81		6781.81
RN-30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS EXPANSIVOS 5/8 -6" PARA ANCLAJE DE	U	30.00	4.27	128.10000							
RN-31	CHICOTE D=12MM PARA ARRIOSTRAMIENTO DE MAMPOSTERÍA	U	1750.00	1.55	2712.50000	828.00		828.00	47%	1283.40		1283.40
RN-32	CAJA DE PASO H.S. F'C=180KG/Cm² 0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A	U	10.00	52.94	529.40000	10.00		10.00	100%	529.40		529.40
	ELÉCTRICOS											
RN-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR DE MEDICIÓN - TRAFOMIX	U	1.00	9602.82	9602.82000	1.00		1.00	100%	9602.82		9602.82
RN-34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO METÁLICO PARA DOS CIRCUITOS DE I	U	4.00	487.88	1951.52000	4.00		4.00	100%	1951.52		1951.52
RN-35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO METÁLICO PARA UN CIRCUITO DE ILUI	U	2.00	396.56	793.12000	3.00		3.00	150%	1189.68		1189.68
RN-36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL TDP100KVA	U	1.00	5982.02	5982.02000	1.00		1.00	100%	5982.02		5982.02
RN-37	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL TDP 50KVA	U	2.00	2431.38	4862.76000	2.00		2.00	100%	4862.76		4862.76
RN-38	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE DE HA DE 12MTS 500KG	U	7.00	495.52	3468.64000	7.00		7.00	100%	3468.64		3468.64
RN-39	TENDIDO DE CONDUCTOR AL DESNUDO ACSR# 1/0 AWG	M	500.00	2.69	1345.00000	522.30		522.30	104%	1404.99		1404.99
RN-40	TENDIDO DE CONDUCTOR AL DESNUDO ACSR# 2 AWG	M	160.00	2.33	372.80000	174.10		174.10	109%	405.65		405.65
RN-41	TENDIDO DE CONDUCTOR PREEMSAMBLADO AL AISLADO 2x1/0+1/0 AWG	M	150.00	6.37	955.50000	154.60		154.60	103%	984.80		984.80
RN-42	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SUJECCION PARA EL NEUTRO	U	8.00	22.13	177.04000	8.00		8.00	100%	177.04		177.04
RN-43	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3F CENTRADA PASANTE 13.8KV -	U	3.00	187.73	563.19000	3.00		3.00	100%	563.19		563.19
RN-44	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3F CENTRADA DOBLE RETENCION	U	1.00	431.15	431.15000	1.00		1.00	100%	431.15		431.15
RN-45	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3F CENTRADA RETENCION O TER	U	4.00	287.70	1150.80000	4.00		4.00	100%	1150.80		1150.80
RN-46	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE	U	3.00	31.54	94.62000	3.00		3.00	100%	94.62		94.62
RN-47	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCI	U	4.00	40.08	160.32000	4.00		4.00	100%	160.32		160.32
RN-48	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR DOBLE A TIERRA - TTD	U	4.00	116.68	466.72000	4.00		4.00	100%	466.72		466.72
RN-49	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION AEREO - SUBTERRANEO PARA BAJ	U	2.00	243.82	487.64000	3.00		3.00	150%	731.46		731.46
RN-50	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED 200W, CON FOTOCELULA, EN POST	U	7.00	637.26	4460.82000	7.00		7.00	100%	4460.82		4460.82
RN-51	CAJA REVISIÓN MEDIA TENSIÓN 90X90X90 C/VIA, CON TAPA DE HIERRO NODULA	U	20.00	318.78	6375.60000	18.00		18.00	90%	5738.04		5738.04
RN-52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO DE CONDENSADORES AUTOMATICO DE 60K	U	1.00	10209.14	10209.14000	1.00		1.00	100%	10209.14		10209.14
RN-53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO DE CONDENSADORES AUTOMATICO DE 30K	U	1.00	7969.49	7969.49000	1.00		1.00	100%	7969.49		7969.49
	CLIMATIZACIÓN											
RN-54	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE PARED INVERTER CAPACIDAD	U	2.00	1728.67	3457.34000	2.00		2.00	100%	3457.34		3457.34
RN-55	EXTRACTOR DE OLORES EN BAÑOS 6"X6"	U	20.00	42.70	854.00000	18.00		18.00	90%	768.60		768.60
	PAREDES INDUSTRIALES											

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO.----------OO.PP.

PLANILLA DE AVANCE No 23

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA"

							Parcial	Acumulado
FECHA DE CONTATO:	15-mar-19	**FECHA PLANILLA:**	05-jul-21			**V. CONTRATO**		**9622634.2197**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO FÁTIMA**	**INICIO DEL PLAZO:**	**09-mayo-19**			**V. PLANILLA**	190933.64	9146497.27
PLAZO:	***365*** Días a partir de la orden de inicio	**TERMINACION DEL PLAZO:**	19-oct-21			**% DE AVANCE**	1.98	**95.05**
AMPLIACIONES:	530 Días	**PERIODO:**	01-jun-21	A	30-jun-21			
TOTAL	895 Días							

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CONTRATO		CANTIDADES				IMPORTE		
				PRECIO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
RN-56	PAREDES DE GALVALUMEN E=0.45mm, RECUBRIMIENTO PINTURA POLIESTER A	M2	1849.90	16.19	29949.88100	3091.84	194.10	3285.94	178%	50056.89	3142.48	53199.37
	ORDEN DE TRABAJO - RUBROS NUEVOS											
RNA1	CERRAmIENTO TuBO ISO2 H.G. 2 "-mALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6mm, INC. P	M2	1054.50	22.99		898.96	143.51	366.71	35%	20667.09	3299.29	23966.38
RNA2	CERRAmIENTO VERJA DE TuBO AGuA ISO2 HG 2" Y TuBO RECT 80X40X2, INC. PIN	M2	400.00	60.18		223.20	92.88	893.75	223%	13432.18	5589.52	19021.70
RNA3	RECuBRImIENTO ALumINIO COLOR CYAN O SImILAR, ALuCuBOND 5mm INC. ESTR	M2	1315.00	67.32		800.87	176.53	176.53	13%	53914.57	11884.00	65798.57
	VALOR RUBROS CONTRACTUAL PLANILLA 23										151173.13	
	VALOR RUBROS NUEVOS PLANILLA 23										39760.51	
				monto del contrato $.	**9622634.21970**							

DESCUENTOS:	TOTAL			
		8955563.63	**190933.64**	**9146497.27**
Anticipo 40%	$	3582225.45	76373.46	3658598.91
	$			
	$			
Multa por mora	$			
LIQUIDO US $ --------->			$	**114560.18**

SON: CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA CON 18

Firmado electrónicamente por:
PEDRO ELICIO RAMOS IDROVO

Ing. Pedro Ramos
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO FÁTIMA

Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA LEON BURGOS

Ing. Carolina León
FISCALIZADOR
EXTERNO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

"CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, PROVINCIA DE PASTAZA."

FISCALIZADOR EXTERNO

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRA No. 23

PROYECTO:	LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA:	CONSORCIO FÁTIMA
MONTO DEL CONTRATO:	USD.9'622,634.21 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 21/100 CENTAVOS), SIN INCLUIR IVA.
PERIODO DEL INFORME:	01/06/2021 – 30/06/2021
FECHA DE ELABORACIÓN:	13 DE JULIO DEL 2021

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN:

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, PROVINCIA DE PASTAZA.
CÓDIGO DEL PROCESO:	LICO-GADPPz-001-2018
MONTO DEL CONTRATO:	9'622,634.21970
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15 DE MARZO DE 2019
PLAZO CONTRACTUAL:	365 DÍAS
MONTO DEL ANTICIPO:	3'849,053.69
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO 1:	29 DE ABRIL DE 2019
FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO 2:	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO:	19 DE OCTUBRE DEL 2020
FECHA DE INICIO DE TRABAJO:	09 DE MAYO DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	21 DE FEBRERO DEL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO:	19 DE OCTUBRE DEL 2021
SUSPENSIÓN DE TRABAJO #01:	16 DE MAYO DE 2019
FECHA DE REINICIO DE TRABAJO#01 :	16 DE JULIO DE 2019
SUSPENSIÓN DE TRABAJO #02:	03 DE OCTUBRE DE 2019
FECHA DE REINICIO DE TRABAJO#02 :	14 DE OCTUBRE DE 2019
SUSPENSIÓN DE TRABAJO #03:	17 DE MARZO DE 2020
FECHA DE REINICIO DE TRABAJO#03 :	15 DE JUNIO DE 2020
AMPLIACIÓN DE PLAZO:	SI
AMPLIACION DE PLAZO #4	128 DIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO FÁTIMA

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN:

OBJETO DEL CONTRATO:	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA GADPPz - I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, PROVINCIA DE PASTAZA.
CÓDIGO DEL PROCESO:	LCC-03-2018
MONTO DEL CONTRATO:	USD. 388,027.50
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	06 DE MARZO DE 2019
PLAZO CONTRACTUAL:	365 DÍAS
MONTO DEL ANTICIPO:	USD. 155,211.00
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:	30 DE ABRIL DE 2019
FECHA DE INICIO DE TRABAJO:	09 DE MAYO DE 2019

FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	18 DE JULIO DE 2020
SUSPENSION DE TRABAJOS #01:	17 DE MARZO DEL 2020
REINICIO DE TRABAJOS #01:	15 DE JUNIO DEL 2020
AMPLIACIÓN DE PLAZO :	4
AMPLIACION DE PLAZO #1:	24 DE ABRIL DEL 2020
TERMINACION DE PLAZO #1:	18 DE JULIO DEL 2020
AMPLIACION DE PLAZO #2:	30 DE JUNIO DEL 2020
TERMINACION DE PLAZO #2:	16 DE OCTUBRE DEL 2020
AMPLIACION DE PLAZO #3:	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
TERMINACION DE PLAZO #3:	21 DE FEBRERO DEL 2021
AMPLIACION DE PLAZO #4:	28 DE ENERO DEL 2021
TERMINACION DE PLAZO #4:	21 DE FEBRERO DEL 2022
CONTRATISTA:	ING. MGS. CAROLINA LEÓN BURGOS

3. PERIODO DEL INFORME

El siguiente informe de actividades pertenece al periodo de avance de obra de la Planilla No.23, correspondiente a la fecha del 01 de JUNIO al 30 de JUNIO del 2021

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE PERÍODO.

4.1.- VIAS Y PARQUEADEROS

MATEREAL PETREO

- Excavación sin clasificar (mov.de tierra)
- Excavación y relleno de estructuras menores

MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y. regada)
- Material de subbase clase 3
- Material de base granular de agregados
- Transporte material pétreo de mejoramiento
- Transporte de material de subbase clase 3
- Transporte de material de base granular de agregados

ESTABILIZACIÓN TALUDES

- Arreglo y limpieza (incluye desalojo)
- Trazo, replanteo y nivelación de edificaciones, parqueadero, y plataformas (eq. topográfico)
- Desalojo mecánico volqueta tierra/escombros

4.2.- REDES DE+E59:E141 ALCANTARILLADO SA+E59:E141NITARIO, PLUVIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRASMOVIMIENTOS DE TIERRAS

ALCANTARILLADO SANITARIO
MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Entibado de zanja
- Razanteo de zanja e= 0.20m

POZOS Y CAJAS

- Hormigón simple en pozos f'c=180kg/cm2-mezcla a mano
- Encofrado metálico para pozos de revisión
- Suministro y colocación de tapas y cercos h.f-210lb

ALCANTARILLADO PLUVIAL
MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Entibado de zanja
- Razanteo de zanja e= 0.20m

4.3.- NAVE PRINCIPAL- TALLERES-ADMINISTRATIVO-BODEGA GENERAL

ACERO ESTRUCTURAL

- Tratamiento pintura estructura acero a36 (fondo + pintura anticorrosiva), a compresor.
- Malla electrosoldada 15x15x6mm.

MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS

- Pintura epoxica piso industrial 3mm (2 componentes)

MAMPOSTERÍA

- Mamposteria bloque pesado vibrado 4mpae=15 cm
- Picado y resanado de mamposteria para instalaciones
- Meson h.a. f'c=180 kg/cm2 e=7 cm hierro (lavamanos+meson)

VENTANERIA-PUERTAS ALUMINIO VIDRIO

- Puerta ymamparaaluminios200 y vidrio laminado e=8mm con pivote.
- Puerta batiente aluminio y vidrio flotado claro 6mm (1.00x2.10).
- Ventana corrediza aluminio serie 200-incl. vidrio laminado 6mm.

REVESTIMIENTO DE TUMBADOS

- Cielo raso falso tipo gypsum para humedad-1/2"-sin estucar
- Estucado de cielo ras

PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS

- Pasamanos para discapacitados tubo diam 32mm e=1.5mm en acero inoxidable aisi 304, acabado satinado (juego)

4.4.- NAVE LAVADORA, Y TALLERES CHAPISTERIA-CARPINTERIA MAMPOSTERÍA

- Meson h.a. f'c=180 kg/cm2 e=7 cm hierro (lavamanos + meson)
- Revestimiento meson granito

VENTANERIA-PUERTAS ALUMINIO VIDRIO

- Puerta batiente aluminio y vidrio flotado claro 6mm (1.00x2.10)
- Ventana corrediza aluminio serie 200-incl. vidrio laminado 6mm

PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS

- Dispensor de papel higienico diam=275mm, rollo 70mm, abatible,acero inox e=8mm, aisi 304. acabado s
- Dispensor de papel toalla 400-600 unidades, 330x273x130mm, acero inox e=8mm aisi 304, acabado satinad
- Dispensador de jabon liquido acero inox aisi304, acabado satinado
- Espejo de vidrio flotado 4mm- marco de aluminio
- Secador de manos accionamiento automatico 260x302x150mm, acero inox. 304, lamina1.5mm 110v-60hz
- Basurero cilindrico a pedal d=250mm h=385 para baño acero inox. 304
- Duchas con mezcladora (con accesorios)

4.5.- SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACIÓN

INSTALACION ALUMBRADO PÚBLICO

- Tendido de conductor 1No. NO. 4 TTU

AREA ADMINISTRATIVA PLANTA BAJA Y ALTA
INSTALACION LUMINARIAS

- Luminaria led 24w/120 voltios

TOMACORRIENTES GENERALES

- Tuberia emt 1/2 pulgada
- Union emt 1/2 pulgada
- Conector emt 1/2 pulgada
- Fijacion de tubos en loza con grapa metalica emt 1/2 pulgada
- Tendido de cable flexible de cobre no.10 awg color azul (inc. taype)
- Tendido de cable flexible de cobre no.10 awg color blanco (inc. taype
- Tendido de cable flexible de cobre no.14 awg color verde (inc. taype)

AREA ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA
INSTALACION LUMINARIAS

- Cajetines metalicos octogonales medianos con tapa

- Tendido de cable flexible de cobre no.12 awg color amarillo (inc. taype)
- Tendido de cable flexible de cobre no.12 awg color blanco (inc. taype) .

TOMACORRIENTES GENERALES

- Tubería emt 1/2 pulgada .
- Unión emt 1/2 pulgada .
- Conector emt 1/2 pulgada.
- Fijación de tubos en loza con grapa metalica emt 1/2 pulgada.
- Cajetines metálicos rectangulares profundos.

AREA DE MECANICA PESADA Y LIVIANA
INSTALACION LUMINARIAS

- Tendido de cable concéntrico 2x12 awg(inc. taype)

ALIMENTADORES Y SUBTABLEROS CT-2
ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A1

- Tendido de cable no. 3x6+6 Cu TW (INC. TAYPE)

ACOMETIDA B.V PRINCIPAL

- Tendido de cable de cobre no. 1/0 THH

CERCO ELECTRICO CERRAMIENTO

- Instalación de central energizadora 5k
- Colocación de tubería preparada
- Colocación de aisladores de paso de esquina y pasante
- Tendido de alambre solido galvanizado
- Tendido de conductor de cobre de alta tension 1/0
- Instalación de batería y sirena
- sistema de puesta a tierra

4.6.- SISTEMA HIDRAULICO SANITARIO Y CONTRAINCENDIOS
SITEMA DE AGUA POTABLE A PRESIÓN CONSTANTE
ACOMETIDA DE AGUA POTABLE

- Tubería PVC d=63 mm 1.0 mpa u/e + prueba.
- Conexión domiciliaria inc.medidor,en tubo d=63mm.

TUBERIA PVC AGUA POTABLE

- Tuberia pvc roscable d=2" en edificacion+prueba.

HORMIGONES

- Hormigon premezcladof'c=210 kg/cm2 inc. encofrado + bombeo y transporte.

ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES

- Enlucido con impermeabilizante mortero 1:3 (exterior).
- Cerámica color piso y pared antideslizante 0.30x0.30-instal. y emp.
- Pintura de caucho satinado color (2 manos) inter. <guia imagen corporativa gadppz>.

4.7.- SISTEMA ELECTRONICO, VOZ, DATOS, INCENDIOS)
CANALIZACIÓN

- Bandeja tipo escalerilla 25cmx10cm incluye accesorios

SISTEMA DE VOZ Y DATOS

- Cable THHN No. 6 AWG 19H .

SISTEMA DE INCENDIO

- Detector de humo fotoeléctrico direccionable.
- Punto DE Alarmas DE INCENDIO .

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS

- Cerradura electromagnética 600lb
- Pulsante de salida para control de accesos

4.8.- CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA Y GARITA
BATERIA SANITARIA GENERAL JUNTO A ZONA RECREACIONAL
MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS

- Cerámica color piso y pared antideslizante 0.30x0.30-instal. y emp .

MAMPOSTERÍA

- Picado y resanado de mampostería para instalaciones .

CARPINTERIA METALICA

- Puerta tamborada 70cm, esqueleto canelo, mdf 9mm -lacada-diseño corporativo.

PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS

- Inodoro blanco (con accesorios)
- Lavabo blanco (con accesorios)

4.9.- CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y PORTONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Arreglo y limpieza (incluye desalojo)

HORMIGONES

- Hormigón premezclado replantillo f'c=180 kg/cm2 inc. bombeo y transporte
- Hormigón premezclado cadenas f'c=280 kg/cm2 inc. encofrado inc. conbeo y transporte
- Hormigón premezclado columnas f'c=280 kg/cm2 inc. encofrado, bomba y transport

4.10. NAVE DE DESECHOS

MAMPOSTERÍA

- Picado y resanado de mampostería para instalaciones
- Mesón h.a. f'c=180 kg/cm2 e=7 cm hierro (lavamanos+meson)
- Revestimiento mesón granito

CARPINTERIA METALICA

- Puerta metálica panelada tool galv. 2mm , inc. cerradura, bisagras y pintura
- Puertas modulares, tamboradas para baños en acero inoxidable e=1mm aisi 304, incluye estructura y her

PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS

- Dispensor de papel higienico diam=275mm, rollo 70mm, abatible,acero inox e=8mm, aisi 304. acabado s
- Dispensor de papel toalla 400-600 unidades, 330x273x130mm, acero inox e=8mm aisi 304, acabado satinad
- Dispensador de jabon liquido acero inox aisi304, acabado satinado
- Espejo de vidrio flotado 4mm- marco de aluminio.
- Basurero cilindrico a pedal d=250mm h=385 para baño acero inox. 304
- Duchas con mezcladora (con accesorios)

CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS

- Aceras de h.s. f'c=180kg/cm2 e=7cm, escobillada.
- Suministro e instalación de motor eléctrico de 500kg en puerta de ingreso de cerramiento.
- Topes para estacionamiento h.s = 180 kg/cm2 . incluye pintura reflectiva.
- Plantas ornamentales
- Palmeras botellas enanas
- Tapajunta de aluminio piso-piso a= 15cm
- Tapajunta de aluminio piso-pared a= 15cm en interiores
- Tapajunta exterior tool galvanizado
- Ducha eléctrica 110 v
- Llave de duch
- Rejillas de piso 50 mm
- Sumidero de cubierta de 110mm incluye rejilla tipo cúpula
- Bordillo para tineta de baño revestida con cerámica (0,10mx0,15m).

PAREDES INDUSTRIALES

- Cerramiento tubo h.g. 2 "-malla electrosoldada 10x10x6mm, inc. pintura a compresor
- Cerramiento verja de tubo hg 2" y tubo rect 80x40x2, inc. pintura compreso

4.11.- AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

MONTO TOTAL DEL PROYECTO: USD $ 9'622,634.21 100,00 %

VALOR ANTICIPO ENTREGADO: USD $ 3'849,053.69 40,00 %

PLANILLA AVANCE N° 23	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 FECHA: 13 DE JULIO DEL 2021
VALOR PLANILLA AVANCE DE OBRA:	**190.933,64 USD**
VALOR PLANILLA INCREMENTO DE OBRA	**43.805,13 USD**
PORCENTAJE PROPORCIONAL ANTICIPO DESCONTADO 40%:	**76.373,46 USD**
TOTAL DESCUENTOS:	**76.373,46 USD**
VALOR LIQUIDO A PAGARSE:	***114,560.18 USD***
VALOR A RECIBIR EN ESTE PERIODO	
VALOR LIQUIDO PLANILLA AVANCE N°23:	***114,560.18 USD***
VALOR LIQUIDO PLANILLA DE INCREMENTO N°23:	***26.283,08 USD***
REAJUSTE ANTICIPO:	**0.00 USD**
TOTAL:	***114,560.18 USD***
SON: CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA CON 18/100	

PLANILLA INCREMENTO N° 23	PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO 2021 FECHA: 13 DE JULIO DEL 2021
VALOR PLANILLA INCREMENTO DE OBRA:	43.805,13 USD
PORCENTAJE PROPORCIONAL ANTICIPO DESCONTADO 40% INCREMENTO DE OBRA:	17.522,05 USD
TOTAL DESCUENTOS:	17.522,05 USD
VALOR LIQUIDO A PAGARSE:	***26.283,08 USD***
VALOR A RECIBIR EN ESTE PERIODO	
VALOR LIQUIDO PLANILLA INCREMENTO N°23:	***26.283,08 USD***
REAJUSTE ANTICIPO:	0.00 USD
TOTAL:	***26.283,08 USD***
SON: VEINTE Y SEIS DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 08/100	

4.12. REPROGRAMACIONES APROBADAS

CRONOGRAMA	PLANILLA	MONTO PROGRAMADO	PERIÓDO	
OFERTADO	1	334.046,38	MAYO (8 dias)	
SUSPENSION N°01			MAYO-JULIO (60 dias)	
AMPLIACION Y REPROGRAMACION N°01	1	47.353,00	MAYO (8 dias)	
	2	190.359,16	JULIO (15 dias)	30 DE JULIO
	3	353.862,42	AGOSTO (31 dias)	
	4	559.367,09	SEPTIEMBRE (30 dias)	
SUSPENSION N°02			OCTUBRE (11 dias)	
AMPLIACION Y REPROGRAMACION N°02	5	164.028,000	OCTUBRE (20 dias)	30 DE OCT
	6	215.905,340	NOVIEMBRE (30 dias)	
	7	251.354,960	DICIEMBRE (31 dias)	
	8	224.666,900	ENERO (31 dias)	
	9	513.022,610	FEBRERO (29 dias)	
	10	206.602,980	MARZO (17 dias)	
SUSPENSION N°03			MARZO-JUNIO (90 dias	
AMPLIACION Y REPROGRAMACION N°03	11	219.336,12	JUNIO (16 DIAS)	29 DE JUNIO
	12	361.169,72	JULIO (31 dias)	
	13	456.931,39	AGOSTO (31 dias)	
AMPLIACION: CLIMA-%PERSONAL EN OBRA-REDISEÑOS				
AMPLIACION Y REPROGRAMACION N°04	14	659.549,86	SEPTIEMBRE (30 dias)	29 DE SEPT
ACTUALIZACION DE RECURSOS ACORDE A LA AMPLIACION DE PLAZO N°04 (128 dias)				
REPROGRAMACION	15	1.595.634,46	OCTUBRE (31 dias)	29 DE OCT
REPROGRAMACION DE RECURSOS ENFUNCION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO-MODIFICATORIO				
REPROGRAMACION N°05 (Apegado a la Clausula septima del Contrato Modificatorio y Complementario)	16	800.830,76	NOVIEMBRE (30 dias)	21 DE NOV
	17	700.951,53	DICIEMBRE (31 dias)	
	18	299.886,99	ENERO (31 dias)	
	19	293.375,28	FEBRERO (28 dias)	
	20	285.309,53	MARZO (31 dias)	
	21	243.777,42	ABRIL (30 dias)	
	22	202.607,72	MAYO (31 dias)	
	23	190.544,13	JUNIO (30 dias)	
	24	170.375,21	JULIO (31 dias)	
	25	153.423,65	AGOSTO (31 dias)	
	26	138.775,90	SEPTIEMBRE (30 dias)	
	27	123.631,74	OCTUBRE (19 dias)	

MONTOS PROPUESTOS Y EJECUTADOS:

PLANILLAS	MES	MONTO DE OBRA (USD) PROGRAMADO		MONTO DE OBRA (USD) EJECUTADO	
		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
AVANCE- 01	MAYO 2019	47.353,00	47.353,00	41.411,67	41.411,67
INCREMENTOS	MAYO 2019			5.941,33	5.941,33
RUBROS NUEVOS	MAYO 2019				
TOTAL, AVANCE PERIODO 1		**47.353,00**	**47.353,00**	**47.353,00**	**47.353,00**
AVANCE - 02	JULIO 2019	190.359,16	237.712,16	138.952,71	180.364,38
INCREMENTOS	JULIO 2019			51.406,45	57.347,78
RUBROS NUEVOS	JULIO 2019				
TOTAL, AVANCE PERIODO 2		**190.359,16**	**237.712,16**	**190.359,16**	**237.712,16**

AVANCE - 03	AGOST 2019	353.862,43	591.574,59	250.333,84	430.698,22
INCREMENTOS	AGOST 2019			103.528,59	160.876,37
RUBROS NUEVOS	AGOSTO 2019				
TOTAL, AVANCE PERIODO 3		**353.862,43**	**591.574,59**	**353.862,43**	**591.574,59**
AVANCE - 04	SEPT 2019	559.367,09	1.150.941,68	418.261,50	848.959,72
INCREMENTOS	SEPT 2019			141.105,59	301.981,96
RUBROS NUEVOS	SEPT2019				
TOTAL, AVANCE PERIODO 4		**559.367,09**	**1.150.941,68**	**559.367,09**	**1.150.941,68**
AVANCE - 05	OCT 2019	164.028,00	1.314.969,68	146.636,04	995.595,76
INCREMENTOS	OCT 2019			17.391,96	319.373,92
RUBROS NUEVOS	OCT 2019				
TOTAL, AVANCE PERIODO 5		**164.028,00**	**1.314.969,68**	**164.028,00**	**1.314.969,68**
AVANCE - 06	NOVIEM 2019	215.905,34	1.530.875,02	207.551,52	1.203.147,28
INCREMENTOS	NOVIEM 2019			8.353,82	327.727,74
RUBROS NUEVOS	NOVIEM 2019				
TOTAL, AVANCE PERIODO 6		**215.905,34**	**1.530.875,02**	**215.905,34**	**1.530.875,02**
AVANCE - 07	DICIEM 2019	251.354,96	1.782.229,98	244.636,12	1.447.783,40
INCREMENTOS	DICIEM 2019			6.718,84	334.446,58
RUBROS NUEVOS	DICIEM2019				
TOTAL, AVANCE PERIODO 7		**251.354,96**	**1.782.229,98**	**251.354,96**	**1.782.229,98**
AVANCE - 08	ENERO 2020	224.666,90	2.006.896,88	223.753,02	1.671.536,42
INCREMENTOS	ENERO 2020			913,88	335.360,46
RUBROS NUEVOS	ENERO 2020				
TOTAL, AVANCE PERIODO 8		**224.666,90**	**2.006.896,88**	**224.666,90**	**2.006.896,88**
AVANCE - 09	FEB 2020	513.022,61	2.519.919,49	513.022,61	2.184.559,03
INCREMENTOS	FEB 2020			0,00	335.360,46
RUBROS NUEVOS	FEB2020				
TOTAL, AVANCE PERIODO 9		**513.022,61**	**2.519.919,49**	**513.022,61**	**2.519.919,49**
AVANCE 100% - 10	MARZO 2020	206.602,98	2.726.522,47	206.602,98	2.391.162,01
INCREMENTOS	MARZO 2020			0,00	335.360,46
RUBROS NUEVOS	MARZO 2020				
TOTAL, AVANCE PERIODO 10		**206.602,98**	**2.726.522,47**	**206.602,98**	**2.726.522,47**
AVANCE - 11	JUNIO 2020	219.336,12	2.945.858,59	219.336,12	2.610.498,13
INCREMENTOS	JUNIO 2020			0,00	335.360,46
RUBROS NUEVOS	JUNIO 2020				
TOTAL, AVANCE PERIODO 11		**219.336,12**	**2.945.858,59**	**219.336,12**	**2.945.858,59**
AVANCE - 12	JULIO 2020	361.169,72	3.307.028,31	361.169,72	2.971.667,85
INCREMENTOS	JULIO 2020			0,00	335.360,46
RUBROS NUEVOS	JULIO 2020				
TOTAL, AVANCE PERIODO 12		**361.169,72**	**3.307.028,31**	**361.169,72**	**3.307.028,31**
AVANCE - 13	AGOST 2020	456.931,39	3.763.959,70	456.931,39	3.428.599,24
INCREMENTOS	AGOST 2020			0,00	335.360,46
RUBROS NUEVOS	AGOSTO 2020				
TOTAL, AVANCE PERIODO 13		**456.931,39**	**3.763.959,70**	**456.931,39**	**3.763.959,70**
AVANCE -14	SEPT 2020	659.549,86	4.423.509,56	659.549,86	4.088.149,10
INCREMENTOS	SEPT 2020			0,00	335.360,46
RUBROS NUEVOS	SEPT 2020				
TOTAL, AVANCE PERIODO 14		**659.549,86**	**4.423.509,56**	**659.549,86**	**4.423.509,56**

CONTRATO COMPLEMENTARIO-MODIFICATORIO					
AVANCE TOTAL 15	OCT 2020	1.595.634,46	6.019.144,03	1.595.634,46	6.019.144,03
AVANCE CONTRATUAL 15	OCT 2020			1.210.336,33	5.633.845,89
RUBROS NUEVOS **(CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)**	OCT 2020			385.298,13	385.298,13
AVANCE TOTAL 16	NOV. 2020	800.830,76	6.819.974,77	800.830,76	6.819.974,79
AVANCE CONTRACTUAL 16	NOV. 2020			789.722,74	6.423.568,63
RUBROS NUEVOS **(CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)**	NOV. 2020			11.108,02	396.406,15
AVANCETOTAL 17	DICIEM. 2020	700.951,53	7.520.926,31	700.992,56	7.520.967,35
AVANCE CONTRACTUAL 17	DICIEM. 2020			566.445,35	6.990.013,99
RUBROS NUEVOS **(CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)**	DICIEM. 2020			134.547,21	530.953,36
AVANCETOTAL 18	ENERO. 2021	299.886,99	7.820.813,30	301.023,05	7.821.990,40
AVANCE CONTRACTUAL 18	ENERO. 2021			226.526,99	7.216.540,98
RUBROS NUEVOS **(CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)**	ENERO. 2021			74.496,06	605.449,42
AVANCETOTAL 19	FEBR. 2021	293.375,28	8.114.188,58	293.488,63	8.115.479,04
AVANCE CONTRACTUAL 19	FEBR. 2021			261.668,82	7.478.209,77
RUBROS NUEVOS **(CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)**	FEBR. 2021			31.819,81	637.269,24
AVANCETOTAL 20	MARZO. 2021	285.309,53	8.399.498,11	285.470,83	8.400.949,87
AVANCE CONTRACTUAL 20	MARZO. 2021			285.470,83	7.763.680,60
RUBROS NUEVOS **(CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)**	MARZO. 2021			0.00	637.269,24
AVANCETOTAL 21	ABRIL. 2021	243.777,42	8.643.275,53	252.825,15	8.653.775,02
AVANCE CONTRACTUAL 21	ABRIL. 2021			245.073,83	8.008.754,43
RUBROS NUEVOS **(CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)**	ABRIL. 2021			7.751,77	645.021,01
AVANCETOTAL 22	MAYO. 2021	202.607,72	8.845.883,25	301.788,61	8.955.563,63
AVANCE CONTRACTUAL 22	MAYO. 2021			246.644,83	8.255.399,26
RUBROS NUEVOS **(CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)**	MAYO. 2021			55.143,78	700.164,35

AVANCETOTAL 23	JUNIO. 2021	190.544,13	9.036.427,38	190.933,64	9.146.497,27
AVANCE CONTRACTUAL 23	JUNIO. 2021			151.173,13	8.406.572,39
RUBROS NUEVOS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	JUNIO. 2021			39.760,51	739.924,88

DESGLOSE DE PLANILLA

ANALISIS DE PLANILLAS AL 100% DE AVANCE

PLANILLAS	MES	MONTO (USD)			
		PROGRAMADO		EJECUTADO	
		PROPUESTO	ACUMULADO	EJECUTADO	ACUMULADO
AVANCE 01	MAYO 2019	334,046.38	**334,046.38**	47.353,00	**47.353,00**
MONTO TOTAL	**334,046.38**			**47.353,00**	
REINICIO DE TRABAJOS – REPROGRAMACION					
PLANILLAS	**MES**	REPROGRAMADO		EJECUTADO	
		PROPUESTO	ACUMULADO	EJECUTADO	ACUMULADO
AVANCE 01	MAYO 2019	47.353,00	**47.353,00**	41,411.67	**41,411.67**
			TOTAL AVANCE PERIODO 1	***41,411.67***	
AVANCE 02	JULIO 2019	190.359,16	**237.712,16**	138,952.71	**180,364.38**
			TOTAL AVANCE PERIODO 2	***138,952.71***	
AVANCE 03	AGOST 2019	353.862,43	**591.574,58**	250,333.84	**430,698.22**
			TOTAL AVANCE PERIODO 3	**250,333.84**	
AVANCE 04	SEP 2019	559.367,09	**1.150.941,67**	418,261.50	**848,959.72**
			TOTAL, AVANCE PERIODO 4	**418,261.50**	
AVANCE 05	OCT 2019	164.028,00	**1.314.969,67**	146,636.04	**995,595.76**
			TOTAL, AVANCE PERIODO 5	**146,636.04**	
AVANCE 06	NOVI 2019	215.905,34	**1.530.875,01**	207,551.52	**1,203,147.28**
			TOTAL, AVANCE PERIODO 6	**207,551.52**	
AVANCE 07	DICIEM 2019	251.354,96	**1.782.229,97**	244,636.12	**1,447,783.40**
			TOTAL, AVANCE PERIODO 7	**244,636.12**	
AVANCE 08	ENERO 2020	224.666,90	**2.006.896,87**	223,753.02	**1,671,536.43**
			TOTAL AVANCE PERIODO 8	**223,753.02**	
AVANCE 09	FEBRE 2020	513.022,61	**2.519.919,48**	513,022.61	**2,184,559.04**
			TOTAL AVANCE PERIODO 9	**513,022.61**	
AVANCE 10	MARZO 2020	206.602,98	**2.726.522,46**	206,602.98	**2,391,162.02**
			TOTAL AVANCE PERIODO 10	**206,602.98**	
AVANCE 11	JUNIO 2020	219.336,12	**2.945.858,58**	219,336.12	**2,610,498.14**
			TOTAL AVANCE PERIODO 11	**219,336.12**	
AVANCE 12	JULIO 2020	361.169,72	**3.307.028,30**	361,169.72	**2,971,667.86**
			TOTAL AVANCE PERIODO 12	**361,169.72**	
AVANCE 13	AGOST 2020	456.931,39	**3.763.959,69**	456,931.39	**3,428,599.25**
			TOTAL AVANCE PERIODO 13	**456,931.39**	
AVANCE 14	SEPT 2020	659.549,86	**4.423.509,55**	659,549.86	**4,088,149.11**
			TOTAL AVANCE PERIODO 14	**659,549.86**	

CONTRATO COMPLEMENTARIO-MODIFICATORIO					
AVANCE CONTRACTUAL 15	OCT 2020	1.595,634.46	**6,019,144.02**	1.210.336,33	
RUBROS NUEVOS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	OCT 2020			385.298,13	
INCREMENTO ARRASTRE PLANILLAS (1-8) HOY PLANILLAS AL 100%	OCT 202				335.360,46
			TOTAL AVANCE PERIODO 15	**1.595.634,46**	**1.930.994,92**
			VALORES QUE HOY SON INCRMEENTOS, ANTES FUERON PARTE DEL 100% (PLANILLA 1-14)		**-33.517,57**
			VALOR PLANILLA 15 AL 100% DEL CONTRATO MODIF. Y COMPLEMENTARIO	**1.897.477,35**	**5.985.626,46**
AVANCE CONTRACTUAL 16	NOV 2020	800.830,76	**6.819.974,77**	789.722,74	
RUBROS NUEVOS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	NOV 2020			11.108,02	
			TOTAL AVANCE PERIODO 16	**800.830,76**	**6.786.457,22**
AVANCE CONTRACTUAL 17	DIC. 2020	700.951,53	**7.520.926,31**	516.126,30	
RUBROS NUEVOS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	DIC 2020			**66.828,38**	
			TOTAL AVANCE PERIODO 17	**582.954,68**	**7.369.411,90**
AVANCE CONTRACTUAL 18	ENERO 2021	299.886,99	**7.820.813,30**	126.301,02	
RUBROS NUEVOS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	ENERO 2021			**74.496,06**	
			TOTAL AVANCE PERIODO 18	**200.797,08**	**7.570.208,96**
AVANCE CONTRACTUAL 19	FEBRERO 2021	293.375,28	**8.114.188,58**	214.043,20	
RUBROS NUEVOS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	FEBRERO 2021			**19.342,43**	
			TOTAL AVANCE PERIODO 19	**233.385,63**	**7.803.594,59**
AVANCE CONTRACTUAL 20	MARZO 2021	285.309,53	**8.399.498,11**	**133.565,55**	
RUBROS NUEVOS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	MARZO 2021			**0.00**	
			TOTAL AVANCE PERIODO 20	**133.565,55**	**7.937.160,14**
AVANCE CONTRACTUAL 21	ABRIL 2021	243.777,42	**8.643.275,53**	**140.405,07**	
RUBROS NUEVOS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	ABRIL 2021			**0.00**	
			TOTAL AVANCE PERIODO 21	**140.405,07**	**8.077.565,21**
AVANCE CONTRACTUAL 22	MAYO 2021	202.607,72	**8.845.883,25**	**138.416,92**	
RUBROS NUEVOS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	MAYO 2021			**54.899,96**	
			TOTAL AVANCE PERIODO 22	**193.316,88**	**8.270.882,09**

AVANCE CONTRACTUAL 23	JUNIO 2021	190.544,13	9.036.427,38	116.319,65	
RUBROS NUEVOS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	JUNIO 2021			30.808,88	
TOTAL AVANCE PERIODO 22				147.128,54	8.418.010,63

ANALISIS DE PLANILLAS DE INCREMENTOS

PLANILLAS	MES	MONTO (USD)			
		PROGRAMADO		EJECUTADO	
		PROPUESTO	ACUMULADO	EJECUTADO	ACUMULADO
INCREMENTOS 1	may-19			5,941.33	5,941.33
RUBROS NUEVOS	may-19				
MONTO TOTAL				*5,941.33*	
REINICIO DE TRABAJOS – REPROGRAMACION					
PLANILLAS	MES	REPROGRAMADO		EJECUTADO	
		PROPUESTO	ACUMULADO	EJECUTADO	ACUMULADO
INCREMENTOS 1	may-19			5,941.33	5,941.33
RUBROS NUEVOS	may-19				
TOTAL AVANCE PERIODO 1				*5,941.33*	
INCREMENTOS 2	jul-19			51,406.45	57,347.78
RUBROS NUEVOS	jul-19				
TOTAL AVANCE PERIODO 2				*51,406.45*	
INCREMENTOS 3	ago-19			103,528.59	160,876.37
RUBROS NUEVOS	ago-19				
TOTAL AVANCE PERIODO 3				103,528.59	
INCREMENTOS 4	sep-19			141,105.59	301,981.96
RUBROS NUEVOS	sep-19				
TOTAL AVANCE PERIODO 4				141,105.59	
INCREMENTOS 5	oct-19			17,391.96	319,373.92
RUBROS NUEVOS	oct-19				
TOTAL AVANCE PERIODO 5				17,391.96	
INCREMENTOS 6	nov-19			8,353.83	327,727.75
RUBROS NUEVOS	nov-19				
TOTAL AVANCE PERIODO 6				8,353.83	
INCREMENTOS 7	dic-19			6,718.84	334,446.59
RUBROS NUEVOS	dic-19				
TOTAL AVANCE PERIODO 7				6,718.84	

INCREMENTOS 8	ene-20			913.88	335,360.46
RUBROS NUEVOS	ene-20				
			TOTAL AVANCE PERIODO 8	913.88	
INCREMENTOS 9	feb-20			0,00	335,360.46
RUBROS NUEVOS	feb-20				
			TOTAL AVANCE PERIODO 9	0,00	
INCREMENTOS 10	marzo-20			0,00	335,360.46
RUBROS NUEVOS	marzo-20				
			TOTAL AVANCE PERIODO 10	0,00	
INCREMENTOS 11	junio-20			0,00	335,360.46
RUBROS NUEVOS	junio-20				
			TOTAL AVANCE PERIODO 11	0,00	
INCREMENTOS 12	julio-20			0,00	335,360.46
RUBROS NUEVOS	julio-20				
			TOTAL AVANCE PERIODO 12	0,00	
INCREMENTOS 13	Agosto-20			0,00	335,360.46
RUBROS NUEVOS	agosto-20				
			TOTAL AVANCE PERIODO 13	0,00	
INCREMENTOS 14	sept-20			0,00	335,360.46
RUBROS NUEVOS	sept-20				
			TOTAL AVANCE PERIODO 14	0,00	
CONTRATO COMPLEMENTARIO-MODIFICATORIO					
INCREMENTO CONTRACTUAL 15	oct -20			0,00	0,00
INCREMENTO QUE FORMO PARTE DE LAS PLA(1-8), QUE HOY PASA AL 100%	oct -20			-335.360,46	0,00
VALORES QUE HOY SON INCRMENTOS, ANTES FUERON PARTE DEL 100% (PLANILLA 1-14) (PAGADAS)	oct -20			33,517.57	33,517.57
			TOTAL AVANCE PERIODO 15	-301,842.89	33,517.57
INCREMENTO CONTRACTUAL 16	nov -20			0.00	0.00
RUBROS NUEVOS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	nov-20			0.00	0.00
			TOTAL AVANCE PERIODO 16	0.00	33,517.57
INCREMENTO CONTRACTUAL 17	dic -20			50.319,05	50.319,05
RUBROS NUEVOS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	dic -20			67.718,83	67.718,83
			TOTAL AVANCE PERIODO 17	118.037,88	151.555,45
INCREMENTO CONTRACTUAL 18	enero -21			100.225,97	150.545,02
RUBROS NUEVOS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	enero -21			0.00	67.718,83
			TOTAL AVANCE PERIODO 18	100.225,97	251.781,42

INCREMENTO CONTRACTUAL 19	febrero-21			47.625,62	198.170,64
RUBROS NUEVOS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	febrero-21			12.477,38	80.196,21
TOTAL AVANCE PERIODO 19				60.103,00	311.884,42
INCREMENTO CONTRACTUAL 20	Marzo-21			151.905,28	350.075,92
RUBROS NUEVOS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	Marzo-21			0.00	80.196,21
TOTAL AVANCE PERIODO 20				151.905,28	463.789,70
INCREMENTO CONTRACTUAL 21	Abril-21			104.668,31	454.744,23
RUBROS NUEVOS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	Abril-21			7.751,77	87.947,98
TOTAL AVANCE PERIODO 21				112.420,08	576.209,78
INCREMENTO CONTRACTUAL 22	Mayo-21			108.227,91	562.972,14
RUBROS NUEVOS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	Mayo-21			243,82	88.191,80
TOTAL AVANCE PERIODO 22				108.471,73	684.681,51
INCREMENTO CONTRACTUAL 23	Junio-21			34.853,48	597.825,62
RUBROS NUEVOS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	Junio-21			8.951,63	97.143,43
TOTAL AVANCE PERIODO 23				43.805,13	728.486,64

5. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO:

PLANILLAS	MES	PORCENTAJES %			
		AVANCE PROGRAMADO %		AVANCE EJECUTADO %	
		PROPUESTO	ACUMULADO	EJECUTADO	ACUMULADO
AVANCE 01	MAYO 2019	3.47	**3.47**	0.49	**0.49**
INCREMENTOS	MAYO 2019			0.06	0.06
RUBROS NUEVOS	MAYO 2019				
PORCENTAJE TOTAL		**3.47**		**0.49**	
REINICIO DE TRABAJOS – REPROGRAMACION					
PLANILLAS	MES	PROGRAMADO		EJECUTADO	
		PROPUESTO	ACUMULADO	EJECUTADO	ACUMULADO
AVANCE 01	MAYO 2019	0.49	**0.49**	0.49	**0.49**
INCREMENTOS	MAYO 2019			0.06	0.06
RUBROS NUEVOS	MAYO 2019				
AVANCE 02	JULIO 2019	1.98	**2.47**	1.98	**2.47**
INCREMENTOS	JULIO 2019			0.54	0.60
RUBROS NUEVOS	MAYO 2019				
AVANCE 03	AGOST 2019	3.68	**6.15**	3.68	**6.15**
INCREMENTOS	AGOST 2019			1.07	1.67
RUBROS NUEVOS	AGOST 2019				
AVANCE 04	SEPT 2019	5.81	**11.96**	5.81	**11.96**
INCREMENTOS	SEPT 2019			1.47	3.14
RUBROS NUEVOS	SEPT 2019				

AVANCE 05	OCT 2019	1.71	**13.67**	1.71	**13.67**
INCREMENTOS	OCT 2019			0.18	3.32
RUBROS NUEVOS	OCT 2019				
AVANCE 06	NOV 2019	2.24	**15.91**	2.24	**15.91**
INCREMENTOS	NOV 2019			0.09	3.41
RUBROS NUEVOS	NOV 2019				
AVANCE 07	DICI 2019	2.61	**18.52**	2.61	**18.52**
INCREMENTOS	DICI 2019			0.07	3.48
RUBROS NUEVOS	DICI 2019				
AVANCE 08	ENERO 2020	2.34	**20.86**	2.34	**20.86**
INCREMENTOS	ENERO 2020			0.01	3.49
RUBROS NUEVOS	ENERO 2020				
AVANCE 09	FEBR2020	5.33	**26.19**	5.33	**26.19**
INCREMENTOS	FEBR 2020			0.00	3.49
RUBROS NUEVOS	FEBR 2020				
AVANCE 10	MARZO 2020	2.15	**28.35**	2.15	**28.35**
INCREMENTOS	MARZO 2020			0.00	3.49
RUBROS NUEVOS	MARZO 2020				
AVANCE 11	JUNIO 2020	2.28	**30.61**	2.28	**30.61**
INCREMENTOS	JUNIO 2020			0.00	3.49
RUBROS NUEVOS	JUNIO 2020				
AVANCE 12	JULIO 2020	3.75	**34.37**	3.75	**34.37**
INCREMENTOS	JULIO 2020			0.00	3.49
RUBROS NUEVOS	JULIO 2020				
AVANCE 13	AGOST 2020	4.75	**39.12**	4.75	**39.12**
INCREMENTOS	AGOST 2020			0.00	3.49
RUBROS NUEVOS	AGOST 2020				
AVANCE 14	SEPT 2020	6.85	**45.97**	6.85	**45.97**
INCREMENTOS	SEPT 2020			0.00	3.49
RUBROS NUEVOS	SEPT 2020				
CONTRATO COMPLEMENTARIO-MODIFICATORIO					
AVANCE TOTAL 15	OCT 2020	15.69	**61.54**	16.58	**62,55**
AVANCE CONTRACTUAL 15	OCT 2020			12.58	58.55
RUBROS NUEVOS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	OCT 2020			4.00	4.00
AVANCE TOTAL 16	NOV 2020	8.32	**70.87**	8.33	**70.87**
AVANCE CONTRACTUAL 16	NOV. 2020			8.20	66.75
RUBROS NUEVS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	NOV. 2020			0.13	4.13

AVANCE TOTAL 17	DIC.2020	7.28	**78.16**	7.29	**78.16**
AVANCE CONTRACTUAL 17	DIC. 2020			5.89	72.64
RUBROS NUEVOS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	DIC. 2020			1.40	5.52
AVANCE TOTAL 18	ENERO. 2021	3.12	**81.28**	3.13	**81.29**
AVANCE CONTRACTUAL 18	ENERO 2021			2.35	74.99
RUBROS NUEVS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	ENERO 2021			0.78	6.30
AVANCE TOTAL 19	FEB.2021	3.05	**84.32**	3.05	**84.33**
AVANCE CONTRACTUAL 19	FEBR 2021			2.72	77.70
RUBROS NUEVS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	FEBR 2021			0.33	6.63
AVANCE TOTAL 20	MARZO 2021	2.97	**87.29**	2.97	**87.30**
AVANCE CONTRACTUAL 20	MARZO 2021			2.97	80.67
RUBROS NUEVS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	MARZO 2021			0.00	6.63
AVANCE TOTAL 21	ABRIL 2021	2.53	**89.82**	2.63	**89.93**
AVANCE CONTRACTUAL 21	ABRIL 2021			2.55	83.22
RUBROS NUEVS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	ABRIL 2021			0.08	6.71
AVANCE TOTAL 22	MAYO 2021	2.11	**91.93**	3.14	**93.07**
AVANCE CONTRACTUAL 22	MAYO 2021			2.57	85.79
RUBROS NUEVS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	MAYO 2021			0.57	7.28
AVANCE TOTAL 23	JUNIO 2021	1.98	**93.91**	1.98	**95.05**
AVANCE CONTRACTUAL 23	JUNIO 2021			1.57	87.36
RUBROS NUEVOS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	JUNIO 2021			0.41	7.69

DESGLOCE DE PLANILLA:

ANALISIS DE % DE AVANCE DE PLANILLAS AL 100%

PLANILLAS	MES	PORCENTAJES %			
		AVANCE PROGRAMADO %		AVANCE EJECUTADO %	
		PROPUESTO	ACUMULADO	EJECUTADO	ACUMULADO
AVANCE 01	MAYO 2019	3.47	**3.47**	0.49	**0.43**
PORCENTAJE TOTAL		**3.47**		**0.49**	

REINICIO DE TRABAJOS – REPROGRAMACION					
PLANILLAS	MES	PROGRAMADO		EJECUTADO	
		PROPUESTO	ACUMULADO	EJECUTADO	ACUMULADO
AVANCE 01	MAYO 2019	0.49	**0.48**	0.49	**0.43**
AVANCE 02	JULIO 2019	1.98	**2,47**	1.98	**1.87**
AVANCE 03	AGOSTO 2019	3.68	**6.15**	3.68	**4.48**
AVANCE 04	SEP 2019	5.81	**11.96**	5.81	**8.82**
AVANCE 05	OCT. 2019	1,71	**13.67**	1,71	**10.35**
AVANCE 06	NOV. 2019	2,24	**15.91**	2,24	**12.5**
AVANCE 07	DIC. 2020	2,61	**18.52**	2,61	**15.04**
AVANCE 08	ENERO 2020	2,34	**20.86**	2,34	**17.37**
AVANCE 09	FEB. 2020	5.33	**26.19**	5.33	**22.70**
AVANCE 10	MARZO 2020	2.15	**28.33**	2.15	**24.85**
AVANCE 11	JUNIO 2020	2.28	**30.61**	2.28	**27.12**
AVANCE 12	JULIO 2020	3.75	**34.37**	3.75	**30.88**
AVANCE 13	AGOSTO 2020	4.75	**39.12**	4.75	**35.63**
AVANCE 14	SEPT. 2020	6.85	**45.97**	6.85	**42.48**
CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO N°1					
AVANCE CONTRACTUAL 15	OCTUBRE 2020	16.58	**62.55**	12.58	
RUBROS NUEVOS (CONTRATO MODIF. Y COMPLEM.)	OCTUBRE 2020			4.00	
INCREMENTO ARRASTRE PLANILLAS (1-8) HOY PLANILLAS AL 100%	OCTUBRE 2020			0.00	**3.49**
PORCENTAJE TOTAL 15		62.55		16.58	**20.07**
VALORES QUE HOY SON INCRMEENTOS, ANTES FUERON PARTE DEL 100% (PLANILLA 1-14)					**-0.35**
VALOR PLANILLA 15 AL 100% DEL CONTRATO MODIF. Y COMPLEMENTARIO				19.72	**62.20**
AVANCE CONTRACTUAL 16	NOV. 2020	8.32	**70.87**	8.92	
RUBROS NUEVOS(CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO 16	NOV. 2020			1.44	
PORCENTAJE TOTAL 16		**70.87**		8.33	**70.53**
AVANCE CONTRACTUAL 17	DIC. 2020	**7.28**	**78.15**	5.36	
RUBROS NUEVOS(CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO 17	DIC. 2020			0.69	
PORCENTAJE TOTAL 17		**78.15**		6.05	**76.58**

AVANCE CONTRACTUAL 18	ENERO 2021	3.12	81.28	1.31	
RUBROS NUEVOS(CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO 18	ENERO 2021			0.78	
PORCENTAJE TOTAL 18		81.27		2.09	78.67
AVANCE CONTRACTUAL 19	FEBRERO 2021	3.05	84.33	2.22	
RUBROS NUEVOS(CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO 19	FEBRERO 2021			0.21	
PORCENTAJE TOTAL 19		84.33		2.43	81.10
AVANCE CONTRACTUAL 20	MARZO 2021	2.96	87.29	1.38	
RUBROS NUEVOS(CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO 20	MARZO 2021			0.00	
PORCENTAJE TOTAL 20		87.29		1.38	82.48
AVANCE CONTRACTUAL 21	ABRIL 2021	2.53	89.82	1.46	
RUBROS NUEVOS(CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO 21	ABRIL 2021			0.00	
PORCENTAJE TOTAL 21		89.82		1.46	83.94
AVANCE CONTRACTUAL 22	MAYO 2021	2.11	91.93	1.44	
RUBROS NUEVOS(CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO 22	MAYO 2021			0.57	
PORCENTAJE TOTAL 22		91.93		2.01	85.95
AVANCE CONTRACTUAL 23	JUNIO 2021	1.98		1.21	
RUBROS NUEVOS(CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO 23	JUNIO 2021			0.32	
PORCENTAJE TOTAL 23		93.91		1.53	87.48

ANALISIS DE % DE AVANCE PLANILLAS DE INCREMENTOS

PLANILLAS	MES	PORCENTAJES %			
		AVANCE PROGRAMADO %		AVANCE EJECUTADO %	
		PROPUESTO	ACUMULADO	EJECUTADO	ACUMULADO
INCREMENTOS	may-19			0.06	0.06
RUBROS NUEVOS	may-19				
PORCENTAJE TOTAL		3.47		0.49	

REINICIO DE TRABAJOS – REPROGRAMACION

PLANILLAS	MES	PROGRAMADO		EJECUTADO	
		PROPUESTO	ACUMULADO	EJECUTADO	ACUMULADO
INCREMENTOS PLANILLA 01	may-19	0.49	0.49	0.06	0.06
RUBROS NUEVOS	may-19				

INCREMENTOS PLANILLA 02	jul-19	1.98	2.47	0.54	0.6
RUBROS NUEVOS	jul-19				
INCREMENTOS PLANILLA 03	ago-19	3.68	6.15	1.07	1.67
RUBROS NUEVOS	ago-19				
INCREMENTOS PLANILLA 04	sep-19	5.81	11.96	1.47	3.14
RUBROS NUEVOS	sep-19				
INCREMENTOS PLANILLA 05	oct-19	1.70	13.67	0.18	3.32
RUBROS NUEVOS	oct-19				
INCREMENTOS PLANILLA 06	nov-19	2.24	15.91	0.09	3.41
RUBROS NUEVOS	nov-19				
INCREMENTOS PLANILLA 07	dic-19	2.61	18.52	0.07	3.48
RUBROS NUEVOS	dic-19				
INCREMENTOS PLANILLA 08	ene-20	2.33	20.86	0.01	3.49
RUBROS NUEVOS	ene-20				
INCREMENTOS PLANILLA 09	feb-20	5.33	26.19	0.00	3.49
RUBROS NUEVOS	feb-20				
INCREMENTOS DE PLANILLA 10	Marz-20	2.15	28.33	0.00	3.49
RUBROS NUEVOS	Marz-20				
INCREMENTOS DE PLANILLA 11	Junio-20	2.28	30.61	0.00	3.49
RUBROS NUEVOS	Junio-20				
INCREMENTOS DE PLANILLA 12	Julio-20	3.75	34.37	0.00	3.49
RUBROS NUEVOS	Julio-20				
INCREMENTOS DE PLANILLA 13	Agosto-20	4.75	39.12	0.00	3.49
RUBROS NUEVOS	Agosto-20				
INCREMENTOS DE PLANILLA 14	Septiem-20	6.85	45.97	0.00	3.49
RUBROS NUEVOS	Septiem-20				

CONTRATO COMPLEMENTARIO-MODIFICATORIO					
INCREMENTO CONTRACTUAL PLANILLA 15	Oct 2020			0.00	0.00
INCREMENTO QUE FORMO PARTE DE LAS PLA(1-8), QUE HOY PASA AL 100%	Oct 2020			-3.49	0.00
VALORES QUE HOY SON INCRMENTOS, ANTES FUERON PARTE DEL 100% (PLANILLA 1-14) (PAGADAS)	Oct 2020			0.35	0.35
PORCENTAJE TOTAL				**-3.14**	**0.35**
INCREMENTO CONTRACTUAL PLANILLA 16	Noviembre 2020			0.00	0.00
RUBROS NUEVOS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	Noviembre 2020			**0.00**	0.00
PORCENTAJE TOTAL				**0.00**	**0.35**
INCREMENTO CONTRACTUAL PLANILLA 17	Diciembre 2020			0.57	0.57
RUBROS NUEVOS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	Diciembre 2020			0.52	0.52
PORCENTAJE TOTAL				**1.22**	**1.57**
INCREMENTO CONTRACTUAL PLANILLA 18	Enero 2021			1.05	1.62
RUBROS NUEVOS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	Enero 2021			0.00	0.52
PORCENTAJE TOTAL				**1.05**	**2.62**
INCREMENTO CONTRACTUAL PLANILLA 19	Febrero 2021			0.49	2.11
RUBROS NUEVOS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	Febrero 2021			0.13	0.65
PORCENTAJE TOTAL				**0.62**	**3.24**
INCREMENTO CONTRACTUAL PLANILLA 20	Marzo 2021			1.58	3.68
RUBROS NUEVOS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	Marzo 2021			0.00	0.65
PORCENTAJE TOTAL				**1.58**	**4.82**
INCREMENTO CONTRACTUAL PLANILLA 21	Abril 2021			1.09	4.77
RUBROS NUEVOS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	Abril 2021			0.08	0.73
PORCENTAJE TOTAL				**1.17**	**5.99**

INCREMENTO CONTRACTUAL PLANILLA 22	Mayo 2021			1.12	5.89
RUBROS NUEVOS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	Mayo 2021			0.003	0.733
PORCENTAJE TOTAL				**1.123**	**7.113**
INCREMENTO CONTRACTUAL PLANILLA 23	Junio 2021			0.37	6.26
RUBROS NUEVOS (CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO)	Junio 2021			0.09	0.823
PORCENTAJE TOTAL				**0.46**	**7.57**

NOTA: "El avance total de la obra es la suma entre la planilla al 100% más el avance de planilla de incrementos"

Total **238 días** transcurridos del plazo contractual. ***(contrato principal)***

Total **224 días** transcurridos del plazo contractual. ***(contrato modificatorio y complementario)***

PLAZO TOTAL CONTRATO PRINCIPAL: 530 días **Plazo contractual:** 365 días

PLAZO CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO: 365 días

Total **530 días** transcurridos del plazo total del contrato principal.

Total **254** días transcurridos del plazo total del contractual del contrato modificatorio y complementario.

DESCRIPCIÓN	DÍAS	OBSERVACIONES
DÍAS TRANSCURRIDOS	08	PLANILLA AVANCE N°01-MAYO
DIAS SUSPENDIDOS	60	SUSPENSION (MAYO-JUNIO-JULIO)
DÍAS TRANSCURRIDOS	15	PLANILLA AVANCE N°02-JULIO
DÍAS TRANSCURRIDOS	31	PLANILLA AVANCE N°03-AGOSTO
DÍAS TRANSCURRIDOS	30	PLANILLA AVANCE N°04-SEPTIEMBRE
DÍAS SUSPENDIDOS	11	SUSPENSION-OCTUBRE
DÍAS TRANSCURRIDOS	20	PLANILLA AVANCE N°05-OCTUBRE
DÍAS TRANSCURRIDOS	30	PLANILLA AVANCE N°06-NOVIEMBRE
DÍAS TRANSCURRIDOS	31	PLANILLA AVANCE N°07-DICIEMBRE
DÍAS TRANSCURRIDOS	31	PLANILLA AVANCE N°08-ENERO
DIAS TRANSCURRIDOS	29	PLANILLA AVANCE N°09 FEBRERO
DIAS TRANSCURRIDOS	17	PLANILLA AVANCE N°10 MARZO
DIAS SUSPENDIDOS	90	SUSPENSION (MARZO-JUNIO)
DIAS TRANSCURRIDOS	16	PLANILLA AVANCE N°11 JUNIO
DIAS TRANSCURRIDOS	31	PLANILLA AVANCE N°12 JULIO
DIAS TRANSCURRIDOS	31	PLANILLA AVANCE N°13 AGOSTO
DIAS TRANSCURRIDOS	30	PLANILLA AVANCE N°14 SEPTIEMBRE
DIAS TRANSCURRIDOS	31	PLANILLA AVANCE N°15 OCTUBRE
DIAS TRANSCURRIDOS	30	PLANILLA AVANCE N°16 NOVIEMBRE
DIAS TRASCURRIDOS	31	PLANILLA AVANCE N°17 DICIEMBRE
DIAS TRANSCURRIDOS	31	PLANILLA AVANCE N°18 ENERO

DIAS TRANSCURRIDOS	28	PLANILLA AVANCE N°19 FEBRERO
DIAS TRANSCURRIDOS	31	PLANILLA AVANCE N°20 MARZO
DIAS TRANSCURRIDOS	30	PLANILLA AVANCE N°21 ABRIL
DIAS TRANSCURRIDOS	31	PLANILLA AVANCE N°22 MAYO
DIAS TRANSCURRIDOS	30	PLANILLA AVANCE N°23 JUNIO
TOTAL:	**784**	**87.60%**

6. RESUMEN DE MONTOS EJECUTADOS PLANILLAS CONTRACTUALES

	MES	MONTO DE OBRA PROGRAMADO	PORCENTAJE DE OBRA PROGRAMADO	MONTO DE OBRA EJECUTADO	PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO
001	MAYO 2019	334,046.38	3.47%	47,353.00	0.49%
REPROGRAMACION					
PLANILLA N°	**MES**	**MONTO DE OBRA PROGRAMADO**	**PORCENTAJE DE OBRA PROGRAMADO**	**MONTO DE OBRA EJECUTADO**	**PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO**
001	MAYO 2019	47.353,00	0.49%	47,353.00	0.49%
002	JULIO 2019	190,359.16	1.98%	190,359.16	1.98%
003	AGOST. 2019	353,862.42	3.68%	353,862.42	3.68%
004	SEPT. 2019	559,367.09	5.81%	559,367.09	5.81%
005	OCT. 2019	164,028.00	1.71%	164,028.00	1.71%
006	NOV. 2019	215,905.35	2.24%	215,905.35	2.24%
007	DIC. 2019	251,354.96	2.61%	251,354.96	2.61%
008	ENERO. 2020	224,666.90	2.34%	224,666.90	2.34%
009	FEB. 2020	513,022.61	5.33%	513,022.61	5.33%
010	MARZO2020	206,602.98	2.15%	206,602.98	2.15%
011	JUNIO 2020	219,336.12	2.27%	219,336.12	2.27%
012	JULIO 2020	361,169.72	3.76%	361,169.72	3.76%
013	AGOST 2020	456,931.39	4.75%	456,931.39	4.75%
014	SEPT.2020	659,549.86	6.85%	659,549.86	6.85%
CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO N°1					
015	OCT 2020	1.595,634.46	16.58%	1.595,634.46	16.58%
016	NOV. 2020	800,830.76	8.32%	800,830.76	8.32%
017	DIC. 2020	700.951,53	7.29%	700.992,56	7.29%
018	ENER. 2021	299.886,99	3.12%	301.023,05	3.13%
019	FEBR. 2021	293.375,28	3.05%	293.488,63	3.05%
020	MARZO 2021	285.309,53	2.96%	285.470,83	2.97%
021	ABRIL 2021	243.777,42	2.53%	252.825,15	2.63%
022	MAYO 2021	202.607,72	2.11%	301.788,61	3.14%
023	JUNIO 2021	190.544,13	1.98	190.933,64	1.98%
	TOTAL:	**9.036.427,38**	***93.91%***	**9.146.497,27**	***95.05%***

7. RESUMEN FINANCIERO Y DE AVANCE A LA FECHA DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	MONTO (USD)	PORCENTAJE (%)
MONTO DEL CONTRATO:	9'622,634.22	100.00%
PLANILLAS CONTRACTUALES:	8.406.572,39	*87.36%*
MONTO DE INCREMENTOS PAGADOS:	33.517,57	*0.35%*
CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO (RUBROS NUEVOS):	739.924,88	7.69%
COSTO+PORCENTAJE:	0.00	0.00

8. ACCIONES EFECTUADAS POR LA FISCALIZACIÓN

Las actividades y acciones efectuadas por el equipo de Fiscalización del Proyecto están determinadas por el Contrato de Consultoría y por los términos de referencia:

1. Revisión de la documentación proporcionada por la Entidad Contratante en función del avance de los trabajos.
2. Reuniones periódicas de trabajo con representantes del Consorcio FATIMA, Administrador del Contrato y Fiscalización del Proyecto.
3. Se ha ejercido la supervisión continua de los equipos, personal y materiales requeridos para la correcta ejecución del Proyecto.
4. Se han atendido oportunamente las consultas y requerimientos del Contratista.
5. Se ha controlado el avance de todos los trabajos realizados.
6. Se ha vigilado el cumplimiento de las leyes laborales y reglamentos de seguridad industrial, ambiental, etc.
7. Oportunamente se ha dado soluciones técnicas a los problemas surgidos durante la ejecución de la obra.
8. Control de calidad y control de cumplimiento de especificaciones técnicas de los trabajos ejecutados y materiales empleados.
9. Verificación del cumplimiento del informe del plan de manejo ambiental emitido por el consorcio FÁTIMA, en el cual consta el acatamiento de ley de seguridad social, y seguridad industrial y salud ocupacional.

9. VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL:

Verificación realizada conforme los rubros que se han venido ejecutando:

PERSONAL OFERTADO	TITULACION ACADEMICA	CANT.	PERSONAL EN OBRA	CHEK LIST
SUPERINTENDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL	1	✓	CUMPLE
RESIDENTE DE OBRA 1	INGENIERO CIVIL	1	✓	CUMPLE

RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL	3	✓	CUMPLE
TÉCNICO HIDRÁULICO	INGENIERO CIVIL	1	✓	CUMPLE
TÉCNICO ELÉCTRICO	INGENIERO ELECTRICO	1	✓	CUMPLE
TÉCNICO ELECTRÓNICO	INGENIERO EN ELECTRONICA Y CONTROL	1	✓	CUMPLE
TÉCNICO MECÁNICO	INGENIERO MECANICO	1	✓	CUMPLE
TÉCNICO AMBIENTAL	INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE	1	✓	CUMPLE
TÉCNICO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	INGENIERO INDUSTRIAL	1	✓	CUMPLE
TÉCNICO DE APOYO	ARQUITECTO	2	✓	CUMPLE

10. VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA:

Verificación realizada conforme los rubros que se han venido ejecutando:

EQUIPO Y MAQUINARIA OFERTADO	CANT.	ESTADO EQUIPO Y MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA	CHEK LIST
ALISADORA DE PISO	3	BUENO	CUMPLE
CAMIÓN CISTERNA	1	BUENO	CUMPLE
COMPACTADOR DOBLE RODILLO	2	BUENO	CUMPLE
COMPACTADOR PLANCHA	4	BUENO	CUMPLE
CONCRETERA	5	BUENO	CUMPLE
EQUIPO TOPOGRÁFICO	2	BUENO	CUMPLE
EXCAVADORA SOBRE ORUGA	3	BUENO	CUMPLE
GRÚA PLUMA MÓVIL	1	BUENO	CUMPLE
MOTONIVELADORA	1	BUENO	CUMPLE
MIXER	1	BUENO	CUMPLE
RODILLO AUTOPROPULSADO VIBRATORIO	1	BUENO	CUMPLE
TRACTOR DE ORUGA MINADOR	1	BUENO	CUMPLE
TRACTOR DE ORUGA REGADOR	1	BUENO	CUMPLE
MOTOSOLDADORA	4	BUENO	CUMPLE
VIBRADOR	4	BUENO	CUMPLE
VOLQUETA	6	BUENO	CUMPLE
BOMBA DE HORMIGÓN	1	BUENO	CUMPLE
PLUMA GRÚA ESTÁTICA	1	BUENO	CUMPLE
GENERADOR	1	BUENO	CUMPLE
MINICARGADORA	1	BUENO	CUMPLE

11. INCIDENCIAS PRODUCIDAS EN LA OBRA

Durante el periodo del 01 al 30 de junio del 2021 correspondiente a la planilla de avance N°23, no se ha producido incidencias.

12. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES

- En el Proyecto se están empleando Materiales Pétreos de minas de la localidad que cuentan con el Titulo Minero y la Licencia Ambiental correspondiente. El proveedor de material para el Consorcio Fátima es López Abril Dolores

Maricela, titular de la concesión minera "MARICELA", con código 20000497, ubicada en la provincia de Pastaza, cantón Mera, parroquia Shell.

- Control topográfico durante la ejecución de los trabajos de movimientos de tierra y colocación de mejoramientos, a todos se los hace un control de abscisas, cotas de proyecto, pendientes y anchos.
- Control de calidad de hormigones mediante el uso del cono de Abrams y toma de muestras de hormigón, (cilindros), para posteriormente ser ensayados en laboratorio.
- Control en la colocación del material de sub-base clase 3 en la conformación de cada módulo en la conformación del contrapiso en el área de nave principal, verificando que su porcentaje de compactación sea un 100% como mínimo, en base a lo que detalla las normas MOP-001F-2002.
- Control en la colocación del material de base clase 2 en la conformación de cada módulo en la conformación del contrapiso en el área de nave principal, verificando que su porcentaje de compactación sea un 100% como mínimo, en base a lo que detalla las normas MOP-001F-2002.
- Control de calidad del acero del perfil estructural con sus respectivos ensayos comprobatorios; metalografía, tintas penetrantes y certificación de calidad del material.

13. ACOPIO Y PROVISIÓN DE MATERIALES PÉTREOS

DESCRIPCIÓN	ACOPIO	PROVISIÓN	OBSERVACIONES
MATERIALES PÉTREOS	BODEGA 01 (STOCK)	MINA "MARICELA" 20000497	Basado en el estudio la longitud de centro de gravedad al proyecto está considerada de 18,10km.

OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

ENVIADOS:

DOCUMENTO	FECHA	ASUNTO
Oficio No. 037-CALB-2021-PLAFIS-GADPPZ	07/05/2021	INGRESO INFORME DE FISCALIZACION, ANEXOS Y PLANILLA DE OBRA N°20
Oficio No. 035-CALB-2021-PLAFIS-GADPPZ	07/05/2021	ENTREGA DEL INFORME DE APROBACION DEL PERIODO N°21 DE AVANCE DE OBRA
Oficio N°. 109- CF-2021-FIS-GADPPz	11/05/2021	EVALUACION DEL AVANCE DE TRABAJOS EJECUTADOS DE LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE MAYO
Oficio No. 111-CF-2021-FIS-GADPPZ	12/05/2021	CORRECCIONES A LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°21
Oficio No. 112-CF-2021-FIS-GADPPZ	12/05/2021	ACLARACION AL OFICIO N°070-CF-2021-FIS GADPPz PARA ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PUERTASDE MADERA
Oficio No. 114-CF-2021-FIS-GADPPZ	26/05/2021	CORRECIONES AL REINGRESO DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°21 CORREGIDA
Oficio No. 110-CF-2021-FIS-GADPPZ	11/05/2021	PROPUESTA DE ILUMINACION EXTERIOR, CERCO ELECTRICO Y ACOMETIDAS DE CISTERNAS

Oficio No. 115-CF-2021-FIS-GADPPZ	17/05/2021	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACION TECNICA
Oficio No. 015-CALB-2021-INFOFIS-GADPPZ	19/05/2021	REINGRESO DEL INFORME DE FISCALIZACION, ANEXOS Y PLANILLAS DEL PERIODO N°22 DEL CONTRATO DE FISCALIZACION.
Oficio No. 060-CALB-2021-FIS-GADPPZ	07/05/2021	RESPUESTA AL CORREO ELECTRONICO EMITIDO POR EL BDE

RECIBIDOS:

OFICIO NRO.	FECHA	ASUNTO
Oficio No. CF-331-FIS	03/05/2021	ENTREGA DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°20 INGRESO
Oficio No. CF-332-FIS	05/05/2021	ENTREGA DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°21 INGRESO
Oficio No. CF-333-FIS	13/05/2021	RESPUESTA: PROPUESTA ILUMINACION EXTERIOR, CERCO ELECTRICO Y ACOMETIDAS CISTERNA
Oficio No. CF-336-FIS	19/05/2021	ENTREGA DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°21 REINGRESO

14. CONCLUSIONES

1. Durante el tiempo que lleva el contrato se ha realizado una inspección continua del impacto ambiental que tiene la obra, para así evitar algún tipo de daño ambiental, de igual forma se ha controlado el cumplimiento de normas de seguridad industrial que deben cumplir los trabajadores que están participando en esta.


2. Los resultados obtenidos de las pruebas de resistencia a la compresión en el hormigón para distintos elementos no estructurales en varios de los frentes de trabajo que cuenta la obra y de acuerdo a la especificación técnica debe cumplir con una resistencia de (f´c=180 kg/cm2),a sus 28 días de fraguado, como se puede evidenciar en la tabla a continuación los ensayos realizados a los 7 días de edad en su mayoría sobre pasan el 80% de la resistencia permitida, y a sus 28 días tiene una resistencia de 192,22 kg/cm2 y un 106,79% en relación a la resistencia que menciona en la especificación técnica.

ELEMENTO	FECHA DE FUNDICIÓN	EDAD DIAS	FECHA ENSAYO	CARGA (KN)	RESISTENCIA (Kg/cm2)	% Obtenido	PR
TRAMPA DE GRASA EN NAVE DE LAVADO Y ENGRASADO BASE	07-feb-21	28	07-mar-21	352,1	203	113	106
	07-feb-21	28	07-mar-21	321,9	186	103	
	07-feb-21	28	07-mar-21	318,8	184	102	
TRAMPA DE GRASA EN NAVE DE MECANICA PESADA PAREDES	07-feb-21	28	07-mar-21	319,7	184	102	104
	07-feb-21	28	07-mar-21	325,9	188	104	
	07-feb-21	28	07-mar-21	330,1	190	106	
TRAMPA DE GRASA EN NAVE DE MECANICA PESADA BASE	03-feb-21	28	03-mar-21	328,1	189	105	106
	03-feb-21	28	03-mar-21	344,9	199	111	
	03-feb-21	28	03-mar-21	319,1	184	102	

TRAMPA DE GRASA EN NAVE DE LIVIANA PESADA PAREDES	24-ene-21	28	21-feb-21	328,1	189	105	107
	24-ene-21	28	21-feb-21	334,9	193	107	
	24-ene-21	28	21-feb-21	342,1	197	110	
TRAMPA DE GRASA EN NAVE DE LIVIANA PESADA BASE	22-ene-21	28	19-feb-21	348,7	201	112	108
	22-ene-21	28	19-feb-21	335,9	194	108	
	22-ene-21	28	19-feb-21	321,9	186	103	
ACERA PERMETRASL EN VIA A Y SOBRE MURO DE TALUD	29-jun-21	7	06-jul-21	224,4	129	72	76
	29-jun-21	7	06-jul-21	249,5	144	80	
TRAMPA DE GRASA EN NAVE DE LAVADO PAREDES	28-feb-21	28	28-mar-21	348,5	201	112	110
	28-feb-21	28	28-mar-21	351,9	203	113	
	28-feb-21	28	28-mar-21	327,6	189	105	

3. El tipo de falla que predomino en las muestras de hormigón ensayadas es la Tipo 5 el cual se presenta generalmente cuando se ensaya con cabezales no adheridos al cilindro antes que haya alcanzado la capacidad última del cilindro.

Esquema de los patrones de tipos de fracturas



Tipo 4
Fractura, diagonal sin grieta en las bases; golpear con martillo para diferenciar del tipo I.

Tipo 5
Fracturas de I lado en las bases (superior o inferior) ocurren comúnmente con las capas de embonado.

Tipo 6
Similar al tipo 5 pero el terminal del cilindro es acentuado

4. La evaluación de las resistencias obtenidas a los 28 días se basa en 2 criterios de aceptación conforme a la NEC-15, NEC-SE-HM, CAPITULO 9.7.4.

   4.1. Todos los promedios aritméticos de tres resultados de pruebas de resistencia consecutivos deben ser iguales o superiores a la resistencia especificada f'c.
   4.2. Ningún resultado individual de la prueba de resistencia (promedio de 2 probetas) debe ser menor que f'c – 3.5 MPa

5. La evaluación de las resistencias obtenidas a los 28 días se basa en 2 criterios de aceptación conforme a la NEC-15, NEC-SE-HM, CAPITULO 9.7.4
   Todos los promedios aritméticos de tres resultados de pruebas de resistencia consecutivos deben ser iguales o superiores a la resistencia especificada f'c.
   Ningún resultado individual de la prueba de resistencia (promedio de 2 probetas) debe ser menor que f'c – 3.5 MPa.

Identificación	CARGA Pu	Esfuerzo σ		FECHA DE MUESTREO	FECHA DE ENSAYO	Edad de muestra	Resistencia promedio		NEC-15	
TRAMPA DE GRASA EN NAVE DE LAVADO Y ENGRASADO BASE	35904	203	19,9	07/02/2021	07/03/2021	28	191	18,7	CUMPLE	CUMPLE
	32824	186	18,2	07/02/2021	07/03/2021	28				
	32508	184	18,0	07/02/2021	07/03/2021	28				
TRAMPA DE GRASA EN NAVE DE MECANICA PESADA PAREDES	32600	184	18,0	07/02/2021	07/03/2021	28	187	18,3	CUMPLE	CUMPLE
	33232	188	18,4	07/02/2021	07/03/2021	28				
	33660	190	18,6	07/02/2021	07/03/2021	28				
TRAMPA DE GRASA EN NAVE DE MECANICA PESADA BASE	33456	189	18,5	03/02/2021	03/03/2021	28	191	18,7	CUMPLE	CUMPLE
	35169	199	19,5	03/02/2021	03/03/2021	28				
	32539	184	18,0	03/02/2021	03/03/2021	28				
TRAMPA DE GRASA EN NAVE DE LIVIANA PESADA PAREDES	33456	189	18,5	24/01/2021	21/02/2021	28	193	18,9	CUMPLE	CUMPLE
	34150	193	18,9	24/01/2021	21/02/2021	28				
	34884	197	19,3	24/01/2021	21/02/2021	28				
TRAMPA DE GRASA EN NAVE DE LIVIANA PESADA BASE	35557	201	19,7	22/01/2021	19/02/2021	28	194	19,0	CUMPLE	CUMPLE
	34252	194	19,0	22/01/2021	19/02/2021	28				
	32824	186	18,2	22/01/2021	19/02/2021	28				
TRAMPA DE GRASA EN NAVE DE LAVADO PAREDES	35537	201	19,7	28/02/2021	28/03/2021	28	198	19,4	CUMPLE	CUMPLE
	35883	203	19,9	28/02/2021	28/03/2021	28				
	33405	189	18,5	28/02/2021	28/03/2021	28				

6. Conforme a los artículos 74 y 75 de la LOSNCP exige a los Contratistas que otorguen garantías de: Fiel cumplimiento y, Por anticipo. En tal virtud conforme al art. 73, numeral 2 de la LOSNCP, el consorcio FATIMA presentan las siguientes pólizas:

GARANTIAS:	BUEN USO DE ANTICIPO	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
TIPO:	RENOVACION	RENOVACION
# POLIZA:	29095-83809-22	44612-0-0
SUMA ASEGURADA:	2'213,794.03	38,489.76
VIGENCIA:	DESDE 03/05/2021 HASTA 02/06/2021	DESDE 02/06/2021 HASTA 02/07/2021	DESDE 16/10/2020 HASTA 16/10/2021
	30 DIAS	365 DIAS
COMPAÑÍA:	ORIENTE SEGUROS S.A.	ORIENTE SEGUROS S.A.

15. RECOMENDACIONES

En virtud de los elementos facticos y jurídicos expuestos en el presente informe, bajo principio de conservación de la norma, y por competencias prescritas en los artículos 80 de la LOSNCP, 121 del RGLOSNCP, y en concordancia con el 408-19 de las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado – NCICG, a usted con el debido respeto, RECOMIENDO lo siguiente:

1. Al tenor de lo dispuesto en el Contrato de Ejecución de Obra LICO-GADPPz-001-2018 la cláusula sexta. - forma de pago del trámite de planillas y requisitos previos al pago de planillas. Una vez que se ha completado con todos los requisitos para planillas, y subsanado las correcciones solicitadas por Fiscalización a la parte Contratista, se procede a revisar la información pertinente, esto es: memorias de cálculos, planos y todo el expediente que obra en el presente informe, por consiguiente, se da por **APROBADA** la planilla de avance de obra No. 23, en base a los términos establecidos en el Contrato de ejecución de obra en referencia.

2. Refiriéndose a la inversión y disposición de recursos económicos, de materiales, de equipo, y personal, el Contratista **SI CUMPLE** de acuerdo a la oferta que es parte integral del contrato LICO-03-005-2019, en base con los términos establecidos en el Contrato de Ejecución de Obra en referencia.

3. Una vez hecha la verificación del control de calidad de los ensayos a los cilindros de hormigón recomiendo que es procedente realizar el pago de los rubros de hormigón ya que **CUMPLE** con la norma ASTM C-31 y rigurosamente cumple la especificación técnica.

4. Conforme a la garantía Constitucional del debido proceso determinado en artículo 76, numeral 1 de nuestra norma suprema, preceptúa que, corresponde a la autoridad administrativa garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. A lo dispuesto por norma suprema, **RECOMIENDO** efectuar de manera ordinaria la liquidación de: **LA PLANILLA DE AVANCE No. 23,** de los trabajos inherentes al contrato en mención, los que son necesarios para el cumplimiento del objeto contractual prescrito en la cláusula cuarta del contrato, y, demás obligaciones claras, expresas, y exigibles dentro de lo que estipula el contrato en cita.

Señor Administrador de Contrato, en el presente informe, pongo a su sana critica, todos los elementos de convicción, con observancia de la ley, estableciendo la causalidad entre la ley, el hecho, el objeto de mi actuación administrativa, y el fin que estos persiguen, en la satisfacción del interés público y de los fines institucionales del GADPPz

16. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME:

NOMBRE:	Ing. Mgs. Carolina Alexandra León Burgos
DIRECCIÓN:	Calle Uno y los Helechos, Barrio El Recreo
CIUDAD:	Puyo
TELÉFONO- FAX:	032 792 894
CELULAR:	+593 984 279 657
CORREO ELECTRÓNICO:	kritoleon1821@gmail.com

Atentamente,

CAROLINA ALEXANDRA LEON BURGOS


Ing. Mgs. Carolina León Burgos
FISCALIZADORA EXTERNA
180323178-4


17. ANEXOS FOTOGRÁFICOS







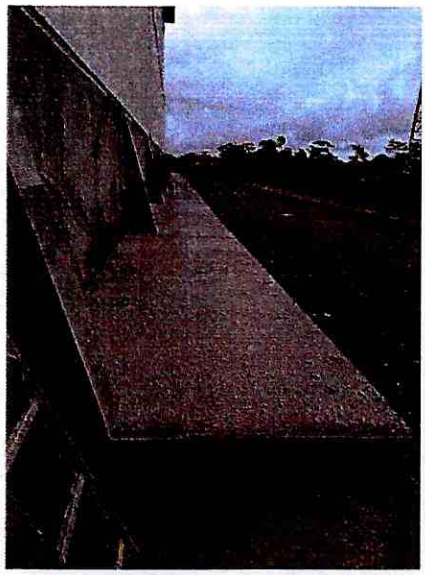

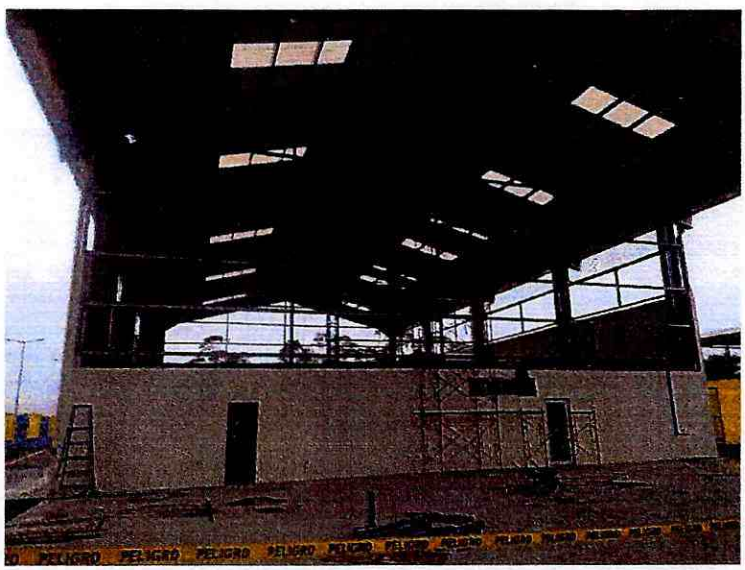
PELIGRO PELIGRO PELIGRO PELIGRO PELIGRO PELIGRO

FATIMA
CONSORCIO

"CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIAL DE PASTAZA" (CÓDIGO: LICO-GADPPz-001-2018),

PLANILLA N° 23

LICO-GADPPZ-001-2018

PERIODO

1-Junio-2021 al 30-Junio-2021

CONTRATISTA

CONSORCIO FATIMA

FISCALIZACION

ING. CAROLINA LEÓN

FATIMA
CONSORCIO

PLANILLA Nº 23

Avance de obra

1-Junio-2021 al 30-Junio-2021

OFICIOS PARA TRAMITE DE PLANILLA

FÁTIMA
CONSORCIO

Puyo, Julio 05 del 2021

Oficio N° CF-0350 – FIS

PARA: Ing. Msc. Carolina León
FISCALIZADORA DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GADPPZ-1 ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA.

ASUNTO: ENTREGA DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 23

De mi consideración:

Con respecto al proyecto "**CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA**" (CÓDIGO: LICO-GADPPz-001-2018), le comento lo siguiente:

Adjunto a la presente, envió la Planilla de Avance de Obra N° 23, del contrato en mención, del periodo 1 al 30 de junio del 2021; para su revisión y aprobación correspondiente.

Es importante indicar que las presentes planillas han sido corregidas todas las observaciones emitidas por parte de Fiscalización.

Sin otro particular más por el momento, me suscribo de usted.

Atentamente,

Recibido
05-07-2021
16H45

Firma electrónicamente por:
PEDRO ELICIO RAMOS IDROVO

Ing. Pedro Ramos.
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO FÁTIMA

Dirección: Calle Luis A. Martínez No. 220
E-mail: consorciofatimapuyo@hotmail.es
Teléfono: 032790152 / 0993679997
Pastaza - Ecuador

OFICIO No. 145–CF – 2021-FIS-GADPPz
Asunto: CORRECCIONES A LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°23
Puyo, 09 de julio del 2021
Señor, Ingeniero
Pedro Elicio Ramos Idrovo
PROCURADOR COMUN CONSORCIO FÁTIMA
En su Despacho. –

De mis consideraciones:
Quien suscribe, responsable del CONTRATO DE FISCALIZACIÓN de código LCC-GADPPz-003-2018, en virtud de mi condición de fiscalizadora, y por las competencias prescritas en los artículos 80 de la LOSNCP, 121 del RGLOSNCP, y en concordancia con el 408-19 de las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado – NCICG, a usted con el debido respeto, comparezco y expongo lo siguiente:

1. **Rubro N°03: Excavacion y relleno de estructuras menores**

Corregir anexo gráfico y de cálculo, verificar la cuantificación del material ya que existe una cantidad en contra del contratista que no está siendo considerada y detallar de mejor manera cortes transversales.

2. **Rubro N°121: Malla electro soldada 15x15x6mm**

Corregir la cuantificación del volumen del material colocado, puesto que las dimensiones con las que presenta en la planilla no concuerda con lo colocado en obra ya que la fiscalización lleva el control de la cuantificación de volúmenes.

3. **Rubro N°148: Mampostería bloque pesado vibrado 4mpae=15 cm**

Corregir la cuantificación del volumen del material colocado, puesto que las dimensiones con las que presenta en la planilla no concuerda con lo colocado en obra ya que la fiscalización lleva el control de la cuantificación de volúmenes.

4. **Rubro N°153: Enlucido vertical paleteado mortero 1:3 (interior)**

Corregir la cuantificación del volumen del material colocado, puesto que las dimensiones con las que presenta en la planilla no concuerda con lo colocado en obra ya que la fiscalización lleva el control de la cuantificación de volúmenes.

4. **Rubro N°185: Pasamanos para discapacitados tubo diam 32mm e=1.5mm en acero inoxidable aisi 304, acabado satinado (juego)**

Corregir la cuantificación del volumen del material colocado, puesto que las dimensiones con las que presenta en la planilla no concuerda con lo colocado en obra ya que la fiscalización lleva el control de la cuantificación de volúmenes.

Además, no presenta anexos de cálculo ni anexos gráficos de los rubros eléctricos, de tal manera no se puede proceder a la verificación de cantidades.

CAROLINA LEÓN BURGOS
INGENIERA CIVIL – MGS. ESTRUCTURAS SISMO RESISTENTES
Puyo, Barrio El recreo, Calle uno y los Helechos
E-mail: kritoleon1821@gmail.com - alexander180108@yahoo.es
TELF.: 0984279657 - 032 792 894

Y de acuerdo a la sabana correspondiente a la planilla N°23, del periodo del 01 al 30 de junio del 2021, recibido el 05 de julio del 2021; luego de la revisión correspondiente por parte de fiscalización, se observa que no se encuentran los documentos habilitantes para tramite de planillas, tales como:

- Libro de obra
- Cronograma de ejecución

las cuales se pone en consideración al contratista en el check list adjuntado al oficio de ingreso de la planilla en mención recordándole también que se debe considerar los trabajos realizados dentro del periodo para la cuantificación del monto de la planilla.

Luego de las observaciones expuestas anteriormente, me permito informar que NO se puede proceder al trámite respectivo de a cuerdo lo citado en el Contrato De Obra, CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: "(…) se continuará de forma inmediata el trámite y se procederá al pago (…)", por tal motivo se notifica que de no existir un acuerdo con los volúmenes de fiscalización se procederá al trámite de pago de planillas con las cantidades de obra calculadas por fiscalización las cuales fueron controladas y verificadas a lo largo del periodo de 01 de junio al 30 de junio del 2021.

Para que conste y surta valor a los oportunos y debidos efectos, con celebridad a mi pedido, le expreso mis agradecimientos.

Cordialmente

Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA LEON BURGOS

Carolina León Burgos
FISCALIZADOR EXTERNO
180323178-4

Recibido
09-07-21
12:00 AM

FATIMA
CONSORCIO

Puyo, Julio 013 del 2021

Oficio N° CF-0357 – FIS

PARA: Ing. Msc. Carolina León
FISCALIZADORA DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GADPPZ-1 ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA.

ASUNTO: REINGRESO DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 23

De mi consideración:

Con respecto al proyecto "**CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA**" (CÓDIGO: LICO-GADPPz-001-2018), le comento lo siguiente:

Adjunto a la presente, envió la Planilla de Avance de Obra N° 23, del contrato en mención, del periodo 1 al 30 de junio del 2021; para su revisión y aprobación correspondiente.

Es importante indicar que las presentes planillas han sido corregidas todas las observaciones emitidas por parte de Fiscalización.

Sin otro particular más por el momento, me suscribo de usted.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
PEDRO ELICIO RAMOS IDROVO

Ing. Pedro Ramos.
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO FÁTIMA

Recibido
13/07/2021
16:16

Dirección: Calle Luis A. Martínez No. 220
E-mail: consorciofatimapuyo@hotmail.es
Teléfono: 032790152 / 0993679997
Pastaza - Ecuador

FATIMA
CONSORCIO

PLANILLA Nº 23

Avance de obra

1-Junio-2021 al 30-Junio-2021

PLANILLA DE OBRA

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR

CUADRO INFORMATIVO DE PLANILLAS TRAMITADAS

Contrato No.	LICO - GADPPz - 001 - 2018	**AVANCE FISICO**
Contratista:	CONSORCIO FATIMA	95,05%
Objeto:	"CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA".	

Monto del Contrato:	9.622.634,2197	***Monto del Anticipo entregado (20%):**	3.849.053,69	40%
Plazo en días:	365	**Fecha entrega de anticipo:**	29/04/2019	
Fecha acta de inicio:	15/10/2020	**Fecha fin contractual:**	21/02/2021	
Ampliaciones de plazo:	4	**Suspención de trabajos:**	17/03/2020	
Plazo Contrato Modif. Y Complementario:	365	**Nueva fecha final ampliación #4:**	21/02/2021	
Suspensión Total de plazo:	165	**Fecha de Inicio de Contrato Modf. Y Complementario:**	19/10/2020	
Total de en dias:	895	**Fecha de Final Contrato Modf. Y Complementario:**	19/10/2021	

PLANILLA No.	PLANILLA OBRA	PLANILLA INCREMENTO	PLANILLA C + %	PLANILLA REAJUSTE	TOTAL PLANILLAS	ANTICIPO DEVENGADO
1	47.353,00				28.411,80	18.941,20
2	190.359,16				114.215,49	76.143,67
3	353.862,43				212.317,46	141.544,97
4	559.367,09				335.620,25	223.746,84
5	164.028,00				98.416,80	65.611,20
6	215.905,34				129.543,20	86.362,14
7	251.354,96				150.812,98	100.541,98
8	224.666,90				134.800,14	89.866,76
9	513.022,61				307.813,57	205.209,04
10	206.602,98				123.961,79	82.641,19
11	219336,12				131601,67	87.734,45
12	361169,72				216701,83	144.467,89
13	456931,39				274158,83	182.772,56
14	659549,86				395729,92	263.819,94
15	1.595.634,46				957.380,68	638.253,78
16	800.830,76				480.498,46	320.332,30
17	700.992,56				420.595,54	280.397,02
18	301023,05				180613,83	120.409,22
19	293.488,63				176.093,18	117.395,45
20	285.470,83				171.282,50	114.188,33
21	252.825,15				151.695,09	101.130,06
22	301.788,61				181.073,17	120.715,44
23	190.933,64				114.560,18	76.373,46
INCREMENTO DE OBRA N° 00						
REAJUSTE PROVISIONAL / DEFINITIVO DE ANTICIPO						
LIQUIDACIÓN DE REAJUSTES DEL CONTRATO						
PLANILLA	(A+B)				**A CANCELAR**	
15	**6.019.144,03**				**3.611.486,42**	**2.407.657,60**
16	**6.819.974,79**				**4.091.984,88**	**2.727.989,91**
17	**7.520.967,35**				**4.512.580,42**	**3.008.386,93**
18	**7.821.990,40**				**4.693.194,24**	**3.128.796,16**
19	**8.115.479,04**				**4.869.287,42**	**3.246.191,61**
20	**8.400.949,87**				**5.040.569,93**	**3.360.379,94**
21	**8.653.775,02**				**5.192.265,01**	**3.461.510,01**
22	**8.955.563,63**				**5.373.338,18**	**3.582.225,45**
23	**9.146.497,27**				**5.487.898,36**	**3.658.598,91**
%	**95,05%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**57,03%**	**95,05%**
		TOTAL EJECUTADO :	**9.146.497,27**			
		% RESPECTO DEL MONTO CONTRACTUAL :	**95,05%**			
					ANTICIPO POR DEVENGAR	**190.454,78**

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
PEDRO ELICIO RAMOS IDROVO

ING. PEDRO RAMOS IDROVO
CONSORCIO FATIMA

Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA LEON BURGOS

ING. CAROLINA LEON B.
FISCALIZACIÓN EXTERNA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	PRIMERA ETAPA											
	1.- VIAS Y PARQUEADEROS						VP					
	PRELIMINARES											
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE C. RODADuRA	km	1,08	494,59	534,15720	1,08		1,08	534,160		534,160	100,00
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)	m3	12.779,98	0,82	10.479,58360	35.935,51	1.870,68	37.806,19	29.467,13	1.533,96	31.001,09	295,82%
3	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRuCTuRAS mENORES	m3	86,00	4,69	403,34000				-		-	
4	TuBERÍA DE ACERO CORRuGADO D= 1,20 m ,E=2.5 mm, mP-100	m	18,00	239,45	4.310,10000	25,00		25,00	5.986,250		5.986,250	139%
5	muRO DE H.S. F'C=180KG./Cm2 TIPO B(CABEZALES)	m3	22,00	188,41	4.145,02000	22,00		22,00	4.145,020		4.145,020	100%
	MATERIAL PETREO											
6	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)	m3	51.821,91	2,92	151.319,97720	43.597,97	1.911,56	45.509,53	127.306,070	5.581,76	132.887,830	87,82
7	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3	m3	2.589,98	10,78	27.919,98440	3.619,96	202,55	3.822,51	39.023,170	2.183,51	41.206,680	147,59%
8	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS	m3	1.942,49	17,21	33.430,25290	2.644,85	292,01	2.936,86	45.517,870	5.025,49	50.543,360	151,19%
9	TRANSPORTE mATERIAL PETREODE mEJORAmIENTO	m3-km	937.976,72	0,28	262.633,48104	741.378,36	34.599,31	775.977,67	207.585,950	9.687,81	217.273,760	82,73
10	TRANSPORTE DE mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3	m3-km	117.701,06	0,28	32.956,29680	65.521,34	6.189,55	71.710,89	18.345,970	1.733,07	20.079,040	60,93
11	TRANSPORTE DE mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS	m3-km	34.964,82	0,28	9.790,14960	47.871,85	5.285,37	53.157,22	13.404,120	1.479,90	14.884,020	152,03%
	CAPA DE RODADURA											
	AMBIENTALES											
12	SEÑALES INFORmATIVAS (2.40X1.20)m	u	2,00	250,92	501,84000	2,00		2,00	501,840		501,840	100,00
13	SEÑALES REGLAmENTARIAS (0.75 X 0.75)m	u	2,00	115,45	230,90000	2,00		2,00	230,900		230,900	100,00
14	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)m	u	2,00	115,45	230,90000	2,00		2,00	230,900		230,900	100,00
	CONSOLIDACION DE PLATAFORMAS						CP					
15	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)	m3	43.057,34	2,92	125.727,44448	43.057,34		43.057,34	125.727,450		125.727,450	100,00
16	TRANSPORTE mATERIAL PETREODE mEJORAmIENTO	m3-km	779.043,38	0,28	218.132,14640	779.043,38		779.043,38	218.132,170		218.132,170	100,00
17	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)	m3	69.683,19	0,82	57.140,21170	69.683,18		69.683,18	57.140,210		57.140,210	100,00%
	2.- ESTABILIZACIÓN TALUDES						ET					
	PRELIMINARES											
18	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	4.030,36	1,14	4.594,60470	-	4.030,36	4.030,36	-	4.594,61	4.594,610	100,00
19	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	4.613,56	1,46	6.735,79030	2.109,52	1.292,01	3.401,53	3.079,900	1.886,33	4.966,230	73,73%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
20	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA) ESTRuCTuRAS	m3	9.606,48	4,18	40.155,08640	5.718,04	48,28	5.766,32	23.901,410	201,81	24.103,220	60,03%
21	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	205,06	17,93	3.676,72580	54,89		54,89	984,180		984,180	26,77%
22	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3		13,72		-		-	-		-	
23	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	85.716,60	2,82	241.720,79875	106.119,24	1.870,68	107.989,92	299.256,250	5.275,32	304.531,570	125,98%
	SISTEMA DE DRENAJE PLATAFORMA						SD					
24	RASANTEO mANuAL DE ZANJAS	m3		3,22		-		-	-		-	
25	SumINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL PARA SuBDREN (TIPO NT 2400 O SImILAR)	m2	1.498,63	3,06	4.585,80780	1.469,00		1.469,00	4.495,140		4.495,140	98,02
26	SumINISTRO Y COLOCACIÓN DE mATERIAL FILTRANTE A mAQuINA (PIEDRA BOLA mAX =2")	m3	524,58	15,19	7.968,37020	457,77		457,77	6.953,530		6.953,530	87,26
27	SumINISTRO Y COLOCACIÓN mANuAL DEmATERIAL FILTRANTEPARA DRENES 1 PuLG	m3	279,52	20,70	5.786,06400	212,86		212,86	4.406,207		4.406,207	76,15
28	SumINISTRO Y COLOCACIÓN DE TuBERIAP.V.C.DIAm. INT.=160mm, PERFORADA	m		14,38		-		-	-		-	
29	Sum.Y COLOCACIÓN TuBERIA PVC. CORRuGADA DIAm INT.=160mm S5	m		9,80		-		-	-		-	
30	Sum. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT. 220 mm S5	m		14,68		-		-	-		-	
31	Sum.Y COLOCACIÓN TuBERIA PVC. CORRuGADA DIAm. INT.=315mm S5	m		20,16		-		-	-		-	
32	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 315A 160mm PVC Y/O POLIETILENO	u		24,07		-		-	-		-	
33	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 220A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u		21,28		-		-	-		-	
	SISTEMA TIERRA ARMADA											

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
34	GEOTEXTIL TEJIDO- 2400 T PARA muRO DE CONTENCION TIERRA ARmADA	m2	21.276,67	3,06	65.106,59490	21.288,73		21.288,73	65.143,520		65.143,520	100,06
35	GEOmALLA BX-1100 TENSAR	m2	7.927,94	3,19	25.290,11265	7.978,18		7.978,18	25.450,400		25.450,400	100,63
36	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	4.074,59	17,33	70.612,64470	3.860,48		3.860,48	66.902,120		66.902,120	94,75
37	muRO DE GAVIONES TRIPLE TORSION	m3	3.632,00	60,08	218.210,56000	2.866,00		2.866,00	172.189,280		172.189,280	78,91
	3.- REDES DE+E59:E141 ALCANTARILLADO SA+E59:E141NITARIO, PLUVIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS						RA					
	ALCANTARILLADO SANITARIO											
	PRELIMINARES											
38	REPLANTEO Y NIVELACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	m	490,58	1,81	887,94980	1.575,58		1.575,58	2.851,800		2.851,800	321,17
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
39	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-	-		-	
40	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	3.460,00	4,18	14.462,80000	4.640,34		4.640,34	19.396,620		19.396,620	134,11%
41	ENTIBADO DE ZANJA	m2	160,00	11,56	1.849,60000	-	160,00	160,00	-	1.849,60	1.849,600	100,00
42	RAZANTEO DE ZANJA E= 0.20m	m2	240,00	3,22	772,80000	-	240,00	240,00	-	772,80	772,800	100,00
43	ARENA DE KILO, TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	320,00	18,13	5.801,60000	1.135,92		1.135,92	20.594,230		20.594,230	354,98%
44	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	1.800,00	13,72	24.696,00000	2.185,73		2.185,73	29.988,220		29.988,220	121,43%
45	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	900,00	6,32	5.688,00000	1.736,71		1.736,71	10.976,010		10.976,010	193%
46	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	1.440,00	2,82	4.060,80000	3.039,00		3.039,00	8.569,990		8.569,990	211,04%
	TUBERIAS PVC ALCANTARILLADO											
47	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=160 mm S6	m	89,12	9,70	864,46400	273,12		273,12	2.649,260		2.649,260	306%
48	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT = 200 mm S6	m	450,00	15,28	6.876,00000	534,05		534,05	8.160,280		8.160,280	119%
49	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 300 mm S5	m	50,00	20,22	1.011,00000	50,00		50,00	1.011,000		1.011,000	100%
50	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=364 mm S6	m		23,27		-		-	-		-	
51	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 450 mm S5	m	20,00	44,36	887,20000	-		-	-		-	
52	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 220A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u	2,00	21,28	42,56000	-		-	-		-	
53	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 335A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u		24,14		-		-	-		-	
	POZOS Y CAJAS											
54	HORmIGON SImPLE EN POZOS F'C=180KG/Cm2-mEZCLA A mANO	m3	30,00	177,00	5.310,00000	54,38		54,38	9.625,260		9.625,260	181,27%
55	ENCOFRADO mETALICO PARA POZOS DE REVISION	m3	30,00	20,36	610,80000	54,38		54,38	1.107,180		1.107,180	181,27%
56	SumINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS Y CERCOS H.F-210LB	u	12,00	178,06	2.136,72000	19,00		19,00	3.383,140		3.383,140	158,33%
57	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	7,00	90,42	632,94000	-		-	-		-	
	ALCANTARILLADO PLUVIAL											
	PRELIMINARES											
58	REPLANTEO Y NIVELACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	m	1.378,44	1,81	2.494,97640	2.747,01		2.747,01	4.972,090		4.972,090	199,28%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
59	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-	-		-	
60	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	9.280,92	4,18	38.794,26389	5.308,06		5.308,06	22.187,680		22.187,680	57,19%
61	ENTIBADO DE ZANJA	m2	308,42	11,56	3.565,33520	58,42	250,00	308,42	675,340	2.890,00	3.565,340	100%
62	RAZANTEO DE ZANJA E= 0.20m	m2	849,00	3,22	2.733,78000	-	849,00	849,00	-	2.733,78	2.733,780	100,00
63	ARENA DE KILO, TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	245,00	18,13	4.441,85000	1.180,25		1.180,25	21.397,930		21.397,930	482%
64	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	5.196,31	13,72	71.293,38000	2.777,42		2.777,42	38.106,200		38.106,200	53,45%
65	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	2.130,00	6,32	13.461,60000	-		-	-		-	
66	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	2.144,69	2,82	6.048,01885	3.942,51		3.942,51	11.117,860		11.117,860	183,83%
	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO PLUVIAL											
67	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 250 mm S5	m	608,56	16,51	10.047,32560	425,52		425,52	7.025,340		7.025,340	69,92%
68	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 300 mm S5	m	140,00	20,22	2.830,80000	134,29		134,29	2.715,340		2.715,340	95,92%
69	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=364 mm S6	m	50,00	23,27	1.163,50000	600,00		600,00	13.962,000		13.962,000	1200%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
70	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 450 mm S5	m	12,00	44,36	532,32000	-		-	-		-	-
71	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 600 mm S5	m	878,35	107,84	94.721,26400	605,84		605,84	65.333,780		65.333,780	68,97
	POZOS Y CAJAS											
72	HORmIGON SImPLE EN POZOS F'C=180KG/Cm2-mEZCLA A mANO	m3	56,00	177,00	9.912,00000	70,44		70,44	12.467,880		12.467,880	125,79
73	ENCOFRADO mETALICO PARA POZOS DE REVISION	m3	56,00	20,36	1.140,16000	70,44		70,44	1.434,160		1.434,160	125,79
74	SumINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS Y CERCOS H.F-210LB	u	24,00	178,06	4.273,44000	32,00		32,00	5.697,920		5.697,920	133,33%
75	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	22,00	90,42	1.989,24000	-		-	-		-	
76	CAJA DE H.S. PARA REJILLA mETÁLICA 0.40 por 1.00 por 1.00 (F'C= 180 KG/Cm2)	u	40,00	95,58	3.823,20000	24,00		24,00	2.293,920		2.293,920	60,00%
77	SumINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA H.F. (1.00 por 0.40 por 0.05)110 KG	u	40,00	130,84	5.233,60000	27,00		27,00	3.532,680		3.532,680	67,50%
	FOSA SEPTICA, FILTRO ANAEROBICO Y SECADO DE LODOS											
	PRELIMINARES											
78	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1,14		-		-	-		-	
79	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	63,51	1,46	92,72460	217,68		217,68	317,810		317,810	342,75%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
80	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-	-		-	
81	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	211,71	4,18	884,93651	217,68		217,68	909,890		909,890	102,82%
82	ENTIBADO DE ZANJA	m2		11,56		-		-	-		-	
83	RAZANTEO DE ZANJA E= 0.20m	m2		3,22		-		-	-		-	
84	ARENA DE KILO, TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3		18,13		-		-	-		-	
85	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	118,67	13,72	1.628,15240	-		-	-		-	
86	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	20,00	6,32	126,40000	-		-	-		-	
	TUBERIAS PVC ALCANTARILLADO											
87	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT = 200 mm S6	m	26,50	15,28	404,92000	26,50		26,50	404,920		404,920	100%
	HORMIGONES											
88	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	3,41	163,18	556,68857	5,50		5,50	897,740		897,740	161,26%
89	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	31,11	249,88	7.773,10602	30,66		30,66	7.661,320		7.661,320	98,56%
90	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F´C=180 KG/Cm2-50por cientoP)CIm	m3		169,86		-		-	-		-	
	ACERO ESTRUCTURAL											
91	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	3.652,36	1,68	6.135,96542	3.652,36		3.652,36	6.135,960		6.135,960	100,00
92	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	100,00	2,76	276,00000	-		-	-		-	
93	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	100,00	0,11	11,00000	-		-	-		-	
	CERRAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO											
94	CERRAmIENTO DE ALAmBRE DE PÚAS-6 HILOS	m	60,00	2,14	128,40000	-		-	-		-	
95	PuERTA DE mALLA + TuBO ISO II 2"	m2	4,00	59,32	237,28000	4,80		4,80	284,740		284,740	120,00%
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES											
96	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	298,58	10,27	3.066,41660	135,74		135,74	1.394,050		1.394,050	45,46%
97	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	30,00	4,72	141,60000	60,86		60,86	287,260		287,260	202,87%
	PIEZAS SANITARIAS											
98	ACCESORIOS PLANTA DE TRATAmIENTO (Global)	u	1,00	5.101,40	5.101,40000	1,00		1,00	5.101,400		5.101,400	100,00%
99	FILTRO DE GRAVA CALSIFICADA DE 2 1/2" A 1/2"	m3	9,00	28,28	254,52000	2,64		2,64	74,660		74,660	29,33%
100	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u	9,00	75,58	680,22000	7,00		7,00	529,060		529,060	77,78%
	4.- NAVE PRINCIPAL- TALLERES-ADMINISTRATIVO-BODEGA GENERAL						NP					
	PRELIMINARES											
101	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	12.327,08	1,14	14.052,87120	12.327,08		12.327,08	14.052,870		14.052,870	100,00
102	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	7.949,46	1,46	11.606,21160	8.532,44		8.532,44	12.457,360		12.457,360	107,33

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
103	ACOmETIDA E INST. DE AGuA POTABLE PROVISIONAL PVC 3/4"	m	90,00	8,44	759,60000	90,00		90,00	759,600		759,600	100%
104	ACOmETIDA E INST. ELÉCTRICA PROV. TuBERÍA CONDuIT 1" CABLENo.8	m	90,00	27,58	2.482,20000	185,00		185,00	5.102,300		5.102,300	205,56
105	SONDEOS DE SuELOS (COmPROBACION IN SITu) NEC-15	m	68,00	55,43	3.769,24000	68,00		68,00	3.769,240		3.769,240	100,00
106	CERRAmIENTO PROVISIONAL LISTONES + PLANCHAS DE ZINC	m2	1.018,35	11,69	11.904,51150	1.018,35		1.018,35	11.904,510		11.904,510	100,00
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
107	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	7.030,26	4,18	29.386,48680	7.072,92		7.072,92	29.564,810		29.564,810	100,61
108	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-	-		-	
109	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	4.011,39	17,33	69.517,38870	4.015,71		4.015,71	69.592,250		69.592,250	100,11
110	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	2.274,76	13,72	31.209,70720	2.274,97		2.274,97	31.212,590		31.212,590	100,01
111	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	7.030,26	2,82	19.825,33320	7.030,26		7.030,26	19.825,330		19.825,330	100,00
	HORMIGONES											
112	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	196,42	163,18	32.051,81560	208,93		208,93	34.093,270		34.093,270	106,37
113	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF´C = 280KG./Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	1.088,67	225,97	246.006,75990	1.121,66		1.121,66	253.461,510		253.461,510	103,03
114	HORmIGON PREmEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	282,96	283,42	80.196,52320	288,90		288,90	81.880,560		81.880,560	102,10
115	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	337,45	289,16	97.577,04200	365,96		365,96	105.820,400		105.820,400	108,45
116	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F´C=180 KG/Cm2-50por cientoP)CIm	m3	650,01	169,86	110.410,69860	682,42		682,42	115.915,870		115.915,870	104,99
117	HORmIGON PREmEZCLADO LOSA/ VIGAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	200,00	193,75	38.750,00000	239,02		239,02	46.310,360		46.310,360	119,51
	ACERO ESTRUCTURAL											
118	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	188.476,09	1,68	316.639,83120	201.660,55		201.660,55	338.789,710		338.789,710	107,00
119	PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A (36, 572, 325,193,108) (PROY. MONTAJE GRUA)	Kg	517.607,93	2,76	1.428.597,87576	558.712,31		558.712,31	1.542.045,980		1.542.045,980	107,94%
120	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	499.962,86	0,11	54.995,91416	344.120,53	155.842,33	499.962,86	37.853,260	17.142,66	54.995,920	100,00%
121	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2	14.243,58	4,84	68.938,91268	13.519,61	50,85	13.570,46	65.434,930	246,11	65.681,040	95,27
122	DECK E=0.75mm PLACA COLABORANTE-mD2-GA-101m	m2	2.520,48	18,37	46.301,21760	2.564,28		2.564,28	47.105,810		47.105,810	101,74
	CONTRAPISOS											
123	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3 (CONTRAPISO E=20Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	1.043,38	10,78	11.247,63640	1.062,76		1.062,76	11.456,560		11.456,560	101,86
124	mATERIAL DE BASE CLASE 2 (CONTRAPISO E=15Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	1.301,40	24,55	31.949,37000	778,38		778,38	19.109,230		19.109,230	59,81
125	CONTRAPISO HORm.S. PREmEZ. F´C=280KG/Cm2 E= 4 PuLG. (SIN BASE)	m2	1.710,63	21,50	36.778,54500	1.344,11		1.344,11	28.898,260		28.898,260	78,57
126	JuNTA ASERRADA DILATACION PISO (INC. CORDON, Y SELLO)	m	4.784,70	2,59	12.392,37300	2.292,35		2.292,35	5.937,190		5.937,190	47,91%
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS											
127	mASILLADO DE PISOS, ENDuRECEDOR DE CuARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5mm)	m2	5.101,87	5,62	28.672,50940	4.479,16		4.479,16	25.172,880		25.172,880	87,79%
128	PINTuRA EPOXICA PISO INDuSTRIAL 3mm (2 COmPONENTES)	m2	5.101,87	34,78	177.443,03860	2.125,62	163,96	2.289,58	73.929,060	5.702,53	79.631,590	44,88%
129	PISO PORCELANATO RECTIF. COLOR (0.50X0.50- u OTROS) INSTAL. EmPO	m2	1.910,00	40,31	76.992,10000	2.190,29	18,41	2.208,70	88.290,530	742,29	89.032,820	115,64%
130	PISO GRADAS PORCELANATO PIZARRA COLOR (0.32X0.32-O SImILAR) INSTAL. EmPO.	m2	90,00	32,72	2.944,80000	20,31		20,31	664,540		664,540	22,57%
131	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	761,35	26,06	19.840,78100	865,44		865,44	22.553,420		22.553,420	113,67%
132	BARREDERA PORCELANATO COLOR RECTIFICADA A=10Cm	m	997,67	7,70	7.682,05900	1.720,69		1.720,69	13.249,310		13.249,310	172%
133	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISOS Y FILOS DE GRADA	m	150,00	2,98	447,00000	32,53		32,53	96,940		96,940	21,69%
134	CENEFA ACANALADA ANTILESLIZANTE FILOS GRADA A=10Cm	m	120,00	38,56	4.627,20000	-		-	-		-	
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS											
135	mASILLADO E ImPERmEABILIZADO DE PISOS-LOSAS, mORTERO CEmENTO-ARENA 1:3 +(PEGANTE + ImPERm.) LOSAS EXT	m2	1.380,00	10,40	14.352,00000	1.394,82		1.394,82	14.506,090		14.506,090	101,07
136	ImPERmEABILIZACION LOSA DE CuBIERTA ImPRImANTE ASFALTICO SOLuBLE AL AGuA	m2	1.650,00	2,84	4.686,00000	1.606,65		1.606,65	4.562,900		4.562,900	97,37%
137	ImPERmEABILIZACIONLOSA DE CuBIERTA LAmINAS ASFALTICAS	m2	1.650,00	13,85	22.852,50000	1.606,65		1.606,65	22.252,140		22.252,140	97,37%
	CUBIERTA											

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
138	CuBIERTA GALVALumEN E=0.45mm, RECuBRIENTO PINTuRA POLIESTER ASTm-653A (COLOR INSTITuCIONAL), INC, PER	m2	4.875,00	13,92	67.860,00000	5.111,26		5.111,26	71.148,740		71.148,740	104,85%
139	CuBIERTA POLICARBONATO E=0.80 mm, COLOR BRONCE O SImILAR, INC. ACCESORIOS INSTALCION	m2	946,45	14,34	13.572,09300	410,43		410,43	5.885,570		5.885,570	43,37%
140	CumBRERO GALVALumEN E=0.40 mm A=0.50 m, INC. ACCES. INSTALACION	m	92,00	8,38	770,96000	91,30		91,30	765,090		765,090	99,24%
141	CANAL TOL GALV E= 0.70mm, H=30Cm, A=40Cm DESARR. 122 Cm, INC. GANCHOS	m	259,00	21,49	5.565,91000	628,34		628,34	13.503,030		13.503,030	242,60%
	BAJANTES AGUA LLUVIA											
142	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=160mm)	m	798,00	9,91	7.908,18000	740,33		740,33	7.336,670		7.336,670	92,77
143	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	25,00	90,42	2.260,50000	64,00		64,00	5.786,880		5.786,880	256,00%
144	SumI. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m	233,91	20,59	4.816,20690	-		-	-		-	
145	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO DIAm. INT.= 200A 160mm PVC Y/O POLIETILENO	u	15,00	20,71	310,65000	-		-	-		-	
	MAMPOSTERÍA											
146	RIOSTRAS DE H.S. F'C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3	129,00	258,83	33.389,07000	122,97		122,97	31.827,810		31.827,810	95,32
147	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=10 Cm	m2	236,00	17,71	4.179,56000	26,61		26,61	471,260		471,260	11,28%
148	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2	4.630,00	22,90	106.027,00000	4.078,71	14,61	4.093,32	93.402,500	334,57	93.737,070	88,41
149	PICADO Y RESANADO DE mAmPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m	3.819,65	4,63	17.684,98050	3.476,65	343,00	3.819,65	16.096,890	1.588,09	17.684,980	100,00%
150	mESON H.A. F'C=180 KG/Cm2 E=7 Cm HIERRO (LAVAmANOS+mESON)	m	7,00	34,03	238,21000	20,40	43,25	63,65	694,210	1.471,80	2.166,010	909,29%
151	REVESTImIENTO mESON GRANITO	m	7,00	180,61	1.264,27000	34,40		34,40	6.212,990		6.212,990	491,43%
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES											
152	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	2.795,97	10,27	28.714,61190	3.130,57		3.130,57	32.150,910		32.150,910	111,97
153	ENLuCIDO VERTICAL PALETEADO mORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2	9.060,97	8,78	79.555,31660	7.942,58	14,64	7.957,22	69.735,870	128,54	69.864,410	87,82%
154	ENLuCIDO CON mALLA+ ImPERmEABILIZANTE, mORTERO 1:3	m2	1.250,00	17,03	21.287,50000	760,79		760,79	12.956,210		12.956,210	60,86%
155	ENLuCIDO HORIZONTAL PALETEADO mORTERO 1:3	m2	100,00	12,30	1.230,00000	-		-	-		-	
156	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	2.795,97	5,26	14.706,80220	3.130,57		3.130,57	16.466,780		16.466,780	111,97%
157	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO INTERIOR) INC. FILOS	m2	9.060,97	4,40	39.868,26800	7.755,59		7.755,59	34.124,600		34.124,600	85,59%
158	EmPASTE HORIZONTAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	100,00	6,56	656,00000	-		-	-		-	
159	PINTuRA EPOXICA PARED INDuSTRIAL 3mm (2 COmPONENTES)	m2		34,78		-		-	-		-	
160	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	9.060,97	4,72	42.767,77840	7.755,59		7.755,59	36.606,390		36.606,390	85,59%
161	PINTuRA DE CAuCHO SATINADA COLOR(2 mANOS) EXTERIOR (CANASTILLA) <GuÍA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	2.795,97	5,72	15.992,94840	2.464,29		2.464,29	14.095,740		14.095,740	88,14%
162	RECuBRImIENTO ALumINIO COLOR CYAN O SImILAR, ALuCuBOND 5mm INC. ESTRuCT. E INST<GuÍA ImAGEN CORPORATI	m2	1.315,00	84,96	111.722,40000	-		-	-		-	
163	RECuBRImIENTO PLANCHA FIBROCEmENTO E=7mm	m2	50,00	20,56	1.028,00000	-		-	-		-	
	CARPINTERIA METALICA											
164	VENTANA FIJA TuBO RECT 40X80X2-mALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6mm, INC PINTuRA ANTICORROSIVA, A COmPRESOR	m2	540,00	41,30	22.302,00000	397,17		397,17	16.403,120		16.403,120	73,55%
165	PORTON TIPO CORREDIZO RETRACTIL TuBO RECT 40X80X2mm-TOOL GALV. 0.6mm	m2	990,50	61,25	60.668,12500	594,12		594,12	36.389,850		36.389,850	59,98%
166	PuERTA mETÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2mm (AREA RIEGO Y DRENAJE)	m2	40,30	142,73	5.752,01900	40,20		40,20	5.737,750		5.737,750	99,75%
167	PuERTAS mODuLARES, TAmBORADAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, INCLuYE ESTRuCTuRA Y HER	m2	30,50	172,30	5.255,15000	35,28		35,28	6.078,740		6.078,740	115,67%
168	DIVISIONES ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, TAmBORADAS INCLuYE ESTRuCTuRA, EmPOTRAmIENTO PISO PARED (	m2	81,00	161,18	13.055,58000	105,56		105,56	17.014,160		17.014,160	130,32%
	CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE											
169	PASAmANOS TuBERÍA ACERO INOXIDABLE + VIDRIO LAmINADO 8mm, EmPOTRADA PISO H=1.00m (GRADAINTERIORES)	m	86,21	173,45	14.953,12450	13,97		13,97	2.423,100		2.423,100	16,20%
170	PASAmANOS EN TuBERIADE ACERO INOXIDABLE EmPOTRADO EN PARED	m	26,59	45,00	1.196,55000	23,15		23,15	1.041,750		1.041,750	87,06%
	CARPINTERIA DE MADERA											
171	PuERTA TAmBORADA 70Cm, ESQuELETO CANELO, mDF 9mm -LACADA-DISEÑO CORPORATIVO	u	20,00	198,79	3.975,80000	18,00		18,00	3.578,220		3.578,220	90,00%
172	PuERTA TAmBORADA 90Cm, ESQuELETO CANELO, mDF 9mm -LACADA-DISEÑO CORPORATIVO	u	2,00	230,59	461,18000	2,00		2,00	461,180		461,180	100,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
173	PuERTA TAmBORADA 100Cm, ESQuELETO CANELO, mDF 9mm -LACADA-DISEÑO CORPORATIVO	u	6,00	240,28	1.441,68000	10,00		10,00	2.402,800		2.402,800	166,67%
	VENTANERIA-PUERTAS ALUMINIO VIDRIO											
174	PuERTA INGRESO PRINCIPAL-SISTEmA APERTuRA AuTOmATICO 2.00X2.30m ALumINO Y VIDRIO TEmPLADO DE 10mm	u	1,00	6.646,43	6.646,43000	1,00		1,00	6.646,430		6.646,430	100,00%
175	PuERTA DE VIDRIO TEmPLADO 10mm, INC. CERRADuRA TIRADERA, PIVOTE DE SuJECCION (PREFEXTuRA Y AuDITORIO)	m2	9,50	600,48	5.704,56000	9,29		9,29	5.578,460		5.578,460	97,79%
176	PuERTA YmAmPARAALumINIOS200YVIDRIOLAmINADO E=8mm CON PIVOTE	m2	9,00	190,90	1.718,10000	7,88	12,60	20,48	1.504,290	2.405,34	3.909,630	227,56%
177	PuERTA BATIENTE ALumINIO Y VIDRIO FLOTADO CLARO 6mm (0.90X2.10)	u	3,00	295,00	885,00000	6,00		6,00	1.770,000		1.770,000	200%
178	PuERTA BATIENTE ALumINIO Y VIDRIO FLOTADO CLARO 6mm (1.00X2.10)	u	40,00	286,07	11.442,80000	34,00	6,00	40,00	9.726,380	1.716,42	11.442,800	100,00%
179	VENTANA CORREDIZA ALumINIO SERIE 200-INCL. VIDRIO LAmINADO 6mm	m2	220,00	183,67	40.407,40000	193,15	27,60	220,75	35.475,860	5.069,29	40.545,150	100,34%
	REVESTIMIENTO DE TUMBADOS											
180	CIELO RASO FALSO - FIBRA mINERAL Y RECuB LÁmINA ALumINIO 0.60X0.60 BLANCO, TIPO AmSTRONG O SImILAR	m2	2.150,00	21,59	46.418,50000	2.281,57		2.281,57	49.259,180		49.259,180	106,12%
181	CIELO RASO FALSO TIPO GYPSum PARA HumEDAD-1/2"-SIN ESTuCAR	m2	212,58	20,04	4.260,10320	-	17,18	17,18	-	344,29	344,290	8,08
182	ESTuCADO DE CIELO RASO	m2	212,58	6,26	1.330,75080	-	17,18	17,18	-	107,55	107,550	8,08
183	FRISO GALVALumEN PREPINTADO E= 0.40 INC. FLASHING	m2	50,00	19,63	981,50000	-		-	-		-	
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS											
184	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF DISCAPACITADOS PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u	2,00	297,96	595,92000	2,00		2,00	595,920		595,920	100,00%
185	PASAmANOS PARA DISCAPACITADOS TuBO DIAm 32mm E=1.5mm EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO SATINADO (Juego)	u	2,00	281,03	562,06000	2,00	1,00	3,00	562,060	281,03	843,090	150,00%
186	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u	39,00	297,96	11.620,44000	45,00		45,00	13.408,200		13.408,200	115,38%
187	uRINARIO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF	u	6,00	261,01	1.566,06000	10,00		10,00	2.610,100		2.610,100	166,67%
188	LAVABO BLANCO, LLAVE SENSOR mOVImIENTO (CON ACCESORIOS)	u	35,00	281,39	9.848,65000	37,00		37,00	10.411,430		10.411,430	105,71%
189	DISPENSOR DE PAPEL HIGIENICO DIAm=275mm, ROLLO 70mm, ABATIBLE,ACERO INOX E=8mm, AISI 304. ACABADO S	u	20,00	110,71	2.214,20000	24,00		24,00	2.657,040		2.657,040	120,00%
190	DISPENSOR DE PAPEL TOALLA 400-600 uNIDADES, 330X273X130mm, ACERO INOX E=8mm AISI 304, ACABADO SATINAD	u	20,00	113,00	2.260,00000	24,00		24,00	2.712,000		2.712,000	120,00%
191	DISPENSADOR DE JABON LIQuIDO ACERO INOX AISI304, ACABADO SATINADO	u	20,00	91,28	1.825,60000	24,00		24,00	2.190,720		2.190,720	120,00%
192	ESPEJO DE VIDRIO FLOTADO 4mm- mARCO DE ALumINIO	m2	12,89	42,86	552,46540	-		-	-		-	
193	FREGADERO DE COCINA (uN POZO)	u	2,00	185,40	370,80000	1,00		1,00	185,400		185,400	50,00%
194	SECADOR DE mANOS ACCIONAmIENTO AuTOmATICO 260X302X150mm, ACERO INOX. 304, LAmINA1.5mm 110V-60HZ	u	20,00	238,44	4.768,80000	24,00		24,00	5.722,560		5.722,560	120,00%
195	BASuRERO CILINDRICO A PEDAL D=250mm H=385 PARA BAÑO ACERO INOX. 304	u	41,00	66,80	2.730,60000	46,00		46,00	3.063,600		3.063,600	112,20%
	PUENTE GRUA BIRRIEL CAP. 16 TON (1 UNIDADES)											
196	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	407,57	1,68	684,71760	-		-	-		-	
197	PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A (36, 572, 325,193,108) (PROY. MONTAJE GRUA)	Kg	43.726,12	2,76	120.684,09120	45.766,78		45.766,78	126.316,310		126.316,310	104,67%
198	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	43.726,12	0,11	4.809,87320	45.766,78		45.766,78	5.034,350		5.034,350	104,67%
199	KIT POLIPASTO BIRRIEL A CABLE + TROLEY ELEC, CAP. 16T, ELEVACION 8m, (INC. CARROS TESTEROS+ SISTEm EL	u	1,00	50.538,00	50.538,00000	1,00		1,00	50.538,000		50.538,000	100,00%
200	SISTEmA ELECTRIFICACION ENCAPSuLADO Lm60	m	88,00	112,21	9.874,48000	64,00		64,00	7.181,440		7.181,440	72,73%
201	RIEL DE RODADuRA 50X30mm, (V. PuENTE 2X10+V CARRILERA2X88m)	m	212,00	77,83	16.499,96000	145,60		145,60	11.332,050		11.332,050	68,68%
202	mONTAJE ELECTROmECANICOPARA GRuA BIRRIEL 16 TON	u	1,00	17.664,00	17.664,00000	1,00		1,00	17.664,000		17.664,000	100%
203	SIST. CONTROL REmOTO/ TELEmANDO (CON DISPLAY)	u	1,00	1.955,65	1.955,65000	1,00		1,00	1.955,650		1.955,650	100%
	EQUIPO DE MOVILIZACIÓN VERTICAL											
204	ASERSOR DE DISCAPACITADOS L =5.0m, 1 PARADA, CAP. NOmINAL 250KG.	u	1,00	18.732,35	18.732,35000	1,00		1,00	18.732,350		18.732,350	100,00%
	5.- NAVE LAVADORA, Y TALLERES CHAPISTERIA-CARPINTERIA						NL					
	PRELIMINARES											

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
205	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	4.407,56	1,14	5.024,61840	4.407,56		4.407,56	5.024,620		5.024,620	100,00
206	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	1.087,37	1,46	1.587,56020	1.036,79		1.036,79	1.513,710		1.513,710	95,35
207	ACOmETIDA E INST. DE AGuA POTABLE PROVISIONAL PVC 3/4"	m		8,44		-		-	-		-	
208	ACOmETIDA E INST. ELÉCTRICA PROV. TuBERÍA CONDuIT 1" CABLENo.8	m		27,58		-		-	-		-	
209	SONDEOS DE SuELOS (COmPROBACION IN SITu) NEC-15	m	61,00	55,43	3.381,23000	61,00		61,00	3.381,230		3.381,230	100,00
210	CERRAmIENTO PROVISIONAL LISTONES + PLANCHAS DE ZINC	m2		11,69		-		-	-		-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
211	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	311,80	4,18	1.303,32400	346,94		346,94	1.450,210		1.450,210	111,27
212	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-	-		-	
213	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	261,80	17,33	4.536,99400	268,80		268,80	4.658,300		4.658,300	102,67
214	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	424,00	13,72	5.817,28000	409,01		409,01	5.611,620		5.611,620	96,46
215	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	261,80	2,82	738,27600	346,94		346,94	978,370		978,370	132,52
	HORMIGONES											
216	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	9,80	163,18	1.599,16400	12,80		12,80	2.088,700		2.088,700	130,61
217	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF'C = 280KG./Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	69,20	225,97	15.637,12400	69,20		69,20	15.637,120		15.637,120	100%
218	HORmIGON PREmEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	35,23	283,42	9.984,88660	48,03		48,03	13.612,670		13.612,670	136,33
219	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	22,17	289,16	6.410,67720	26,86		26,86	7.766,850		7.766,850	121,15
220	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F'C=180 KG/Cm2-50por cientoP)CIm	m3	46,97	169,86	7.978,32420	59,22		59,22	10.059,110		10.059,110	126,08
	ACERO ESTRUCTURAL											
221	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	14.998,01	1,68	25.196,65680	15.187,85		15.187,85	25.515,590		25.515,590	101,27
222	PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A (36, 572, 325,193,108) (PROY. MONTAJE GRUA)	Kg	59.540,80	2,76	164.332,60800	61.101,10	1.299,37	62.400,47	168.639,050	3.586,26	172.225,310	104,80%
223	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	59.540,80	0,11	6.549,48800	59.014,38	1.299,37	60.313,75	6.491,580	142,93	6.634,510	101,30%
224	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2	2.420,00	4,84	11.712,80000	2.239,26		2.239,26	10.838,010		10.838,010	92,53%
	CONTRAPISOS											
225	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3 (CONTRAPISO E=20Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	188,50	10,78	2.032,03000	181,79		181,79	1.959,700		1.959,700	96,44
226	mATERIAL DE BASE CLASE 2 (CONTRAPISO E=15Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	141,20	24,55	3.466,46000	136,34		136,34	3.347,150		3.347,150	96,56%
227	CONTRAPISO HORm.S. PREmEZ. F'C=280KG/Cm2 E= 4 PuLG. (SIN BASE)	m2	710,00	21,50	15.265,00000	-		-	-		-	
228	JuNTA ASERRADA DILATACION PISO (INC. CORDON, Y SELLO)	m	550,00	2,59	1.424,50000	401,85		401,85	1.040,790		1.040,790	73,06%
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS											
229	mASILLADO DE PISOS, ENDuRECEDOR DE CuARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5mm)	m2	1.100,00	5,62	6.182,00000	1.071,05		1.071,05	6.019,300		6.019,300	97,37%
230	PINTuRA EPOXICA PISO INDuSTRIAL 3mm (2 COmPONENTES)	m2	1.100,00	34,78	38.258,00000	521,38		521,38	18.133,600		18.133,600	47,40%
231	PISO PORCELANATO RECTIF. COLOR (0.50X0.50- u OTROS) INSTAL. EmPO	m2	35,00	40,31	1.410,85000	485,73		485,73	19.579,780		19.579,780	1387,80%
232	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	72,00	26,06	1.876,32000	118,77		118,77	3.095,150		3.095,150	164,96%
233	BARREDERA PORCELANATO COLOR RECTIFICADA A=10Cm	m	28,00	7,70	215,60000	143,39		143,39	1.104,100		1.104,100	512,11%
234	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISOS Y FILOS DE GRADA	m		2,98		-		-	-		-	
	CUBIERTA											
235	CuBIERTA GALVALumEN E=0.45mm, RECuBRIENTO PINTuRA POLIESTER ASTm-653A (COLOR INSTITuCIONAL), INC, PER	m2	1.390,00	13,92	19.348,80000	1.193,68		1.193,68	16.616,030		16.616,030	85,88%
236	CuBIERTA POLICARBONATO E=0.80 mm, COLOR BRONCE O SImILAR, INC. ACCESORIOS INSTALCION	m2	100,00	14,34	1.434,00000	59,90		59,90	858,970		858,970	59,90%
237	CumBRERO GALVALumEN E=0.40 mm A=0.50 m, INC. ACCES. INSTALACION	m	54,25	8,38	454,61500	52,80		52,80	442,460		442,460	97,33%
238	CANAL TOL GALV E= 0.70mm, H=30Cm, A=40Cm DESARR. 122 Cm, INC. GANCHOS	m	108,50	21,49	2.331,66500	105,60		105,60	2.269,340		2.269,340	97,33%
	BAJANTES AGUA LLUVIA											
239	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=160mm)	m	168,00	9,91	1.664,88000	153,72		153,72	1.523,370		1.523,370	0,92
240	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	18,00	90,42	1.627,56000	12,00		12,00	1.085,040		1.085,040	66,67%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
241	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m	120,00	20,59	2.470,80000	-		-	-		-	
242	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO DIAm. INT.= 200A 160mm PVC Y/O POLIETILENO	u	6,00	20,71	124,26000	-		-	-		-	
	MAMPOSTERÍA											
243	RIOSTRAS DE H.S. F'C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3	6,50	258,83	1.682,39500	6,14		6,14	1.589,220		1.589,220	94,46%
244	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=10 Cm	m2	5,00	17,71	88,55000	5,00		5,00	88,550		88,550	100,00%
245	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2	716,00	22,90	16.396,40000	704,69		704,69	16.137,400		16.137,400	98,42%
246	PICADO Y RESANADO DE mAmPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m	168,00	4,63	777,84000	168,00		168,00	777,840		777,840	100%
247	mESON H.A. F'C=180 KG/Cm2 E=7 Cm HIERRO (LAVAmANOS+mESON)	m	3,50	34,03	119,10500	-	3,20	3,20	-	108,90	108,900	91,43
248	REVESTImIENTO mESON GRANITO	m	3,50	180,61	632,13500	-	4,08	4,08	-	736,89	736,890	116,57
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES											
249	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	380,00	10,27	3.902,60000	380,00		380,00	3.902,600		3.902,600	100,00%
250	ENLuCIDO VERTICAL PALETEADO mORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2	1.075,00	8,78	9.438,50000	1.001,92		1.001,92	8.796,860		8.796,860	93,20%
251	ENLuCIDO CON mALLA+ ImPERmEABILIZANTE, mORTERO 1:3	m2	35,00	17,03	596,05000	-		-	-		-	
252	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	380,00	5,26	1.998,80000	380,00		380,00	1.998,800		1.998,800	100,00%
253	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO INTERIOR) INC. FILOS	m2	2.150,00	4,40	9.460,00000	1.000,72		1.000,72	4.403,170		4.403,170	46,55%
254	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	2.150,00	4,72	10.148,00000	1.372,80		1.372,80	6.479,630		6.479,630	63,85%
255	PINTuRA DE CAuCHO SATINADA COLOR(2 mANOS) EXTERIOR (CANASTILLA) <GuÍA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	380,00	5,72	2.173,60000	540,53		540,53	3.091,830		3.091,830	142,24%
256	RECuBRImIENTO PLANCHA FIBROCEmENTO E=7mm	m2	50,00	20,56	1.028,00000	-		-	-		-	
	CARPINTERIA METALICA											
257	VENTANA FIJA TuBO RECT 40X80X2-mALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6mm, INC PINTuRA ANTICORROSIVA, A COmPRESOR	m2	182,26	41,30	7.527,33800	92,74		92,74	3.830,160		3.830,160	50,88%
258	PORTON TIPO CORREDIZO RETRACTIL TuBO RECT 40X80X2mm-TOOL GALV. 0.6mm	m2	156,67	61,25	9.596,03750	-		-	-		-	
259	PuERTA mETÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2mm , INC. CERRADuRA, BISAGRAS Y PINTuRA	m2	20,00	142,73	2.854,60000	35,98		35,98	5.135,430		5.135,430	179,90%
260	PuERTAS mODuLARES, TAmBORADAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, INCLuYE ESTRuCTuRA Y HER	m2	4,00	172,30	689,20000	4,00		4,00	689,200		689,200	100,00%
261	DIVISIONES ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, TAmBORADAS INCLuYE ESTRuCTuRA, EmPOTRAmIENTO PISO PARED (	m2	13,70	161,18	2.208,16600	-		-	-		-	
	VENTANERIA-PUERTAS ALUMINIO VIDRIO											
262	PuERTA BATIENTE ALumINIO Y VIDRIO FLOTADO CLARO 6mm (1.00X2.10)	u	3,00	286,07	858,21000	-	3,00	3,00	-	858,21	858,210	100,00
263	VENTANA CORREDIZA ALumINIO SERIE 200-INCL. VIDRIO LAmINADO 6mm	m2	6,00	183,67	1.102,02000	-	3,54	3,54	-	650,19	650,190	59,00
	REVESTIMIENTO DE TUMBADOS											
264	CIELO RASO FALSO - FIBRA mINERAL Y RECuB LÁmINA ALumINIO 0.60X0.60 BLANCO, TIPO AmSTRONG O SImILAR	m2	129,01	21,59	2.785,32590	95,54		95,54	2.062,710		2.062,710	74,06%
265	FRISO GALVALumEN PREPINTADO E= 0.40 INC. FLASHING	m2		19,63		-		-	-		-	
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS											
266	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF DISCAPACITADOS PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u		297,96		-		-	-		-	
267	PASAmANOS PARA DISCAPACITADOS TuBO DIAm 32mm E=1.5mm EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO SATINADO (Juego)	u		281,03		-		-	-		-	
268	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u	4,00	297,96	1.191,84000	4,00		4,00	1.191,840		1.191,840	100,00%
269	uRINARIO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF	u	1,00	261,01	261,01000	1,00		1,00	261,010		261,010	100,00%
270	LAVABO BLANCO, LLAVE SENSOR mOVImIENTO (CON ACCESORIOS)	u	3,00	281,39	844,17000	3,00		3,00	844,170		844,170	100,00%
271	DISPENSOR DE PAPEL HIGIENICO DIAm=275mm, ROLLO 70mm, ABATIBLE,ACERO INOX E=8mm, AISI 304. ACABADO S	u	3,00	110,71	332,13000	-	3,00	3,00	-	332,13	332,130	100,00
272	DISPENSOR DE PAPEL TOALLA 400-600 uNIDADES, 330X273X130mm, ACERO INOX E=8mm AISI 304, ACABADO SATINAD	u	2,00	113,00	226,00000	-	2,00	2,00	-	226,00	226,000	100,00
273	DISPENSADOR DE JABON LIQuIDO ACERO INOX AISI304, ACABADO SATINADO	u	2,00	91,28	182,56000	-	2,00	2,00	-	182,56	182,560	100,00
274	ESPEJO DE VIDRIO FLOTADO 4mm- mARCO DE ALumINIO	m2	2,70	42,86	115,72200	-	2,70	2,70	-	115,89	115,890	100,15

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
275	SECADOR DE mANOS ACCIONAmIENTO AuTOmATICO 260X302X150mm, ACERO INOX. 304, LAmINA1.5mm 110V-60HZ	u	2,00	238,44	476,88000	-	2,00	2,00	-	476,88	476,880	100,00
276	BASuRERO CILINDRICO A PEDAL D=250mm H=385 PARA BAÑO ACERO INOX. 304	u	4,00	66,60	266,40000	-	4,00	4,00	-	266,40	266,400	100,00
277	DuCHAS CON mEZCLADORA (CON ACCESORIOS)	u	1,00	135,94	135,94000	-	1,00	1,00	-	135,94	135,940	100,00
	6.- NAVE RESGUARDO VEHICULAR PESADO						NR					
	PRELIMINARES											
278	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	5.783,22	1,14	6.592,87080	5.783,22		5.783,22	6.592,870		6.592,870	100,00
279	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	1.445,85	1,46	2.110,94100	3.023,25		3.023,25	4.413,950		4.413,950	209,10
280	ACOmETIDA E INST. DE AGuA POTABLE PROVISIONAL PVC 3/4"	m		8,44		-		-	-		-	
281	ACOmETIDA E INST. ELÉCTRICA PROV. TuBERÍA CONDuIT 1" CABLENo.8	m		27,58		-		-	-		-	
282	SONDEOS DE SuELOS (COmPROBACION IN SITu) NEC-15	m	66,00	55,43	3.658,38000	66,00		66,00	3.658,380		3.658,380	100,00
283	CERRAmIENTO PROVISIONAL LISTONES + PLANCHAS DE ZINC	m2		11,69		-		-	-		-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
284	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	78,36	4,18	327,54480	153,24		153,24	640,540		640,540	195,56
285	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-	-		-	
286	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	78,36	17,33	1.357,97880	165,96		165,96	2.876,090		2.876,090	211,79
287	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	635,58	13,72	8.720,15760	592,20		592,20	8.124,980		8.124,980	93,17
288	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	78,36	2,82	220,97520	153,24		153,24	432,140		432,140	195,56
	HORMIGONES											
289	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	7,20	163,18	1.174,89600	7,20		7,20	1.174,900		1.174,900	100,00
290	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF´C = 280KG./Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	29,00	225,97	6.553,13000	25,34		25,34	5.726,080		5.726,080	87,38
291	HORmIGON PREmEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	84,75	283,42	24.019,84500	84,00		84,00	23.807,280		23.807,280	99,12%
292	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	14,26	289,16	4.123,42160	9,12		9,12	2.637,140		2.637,140	63,96
293	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F´C=180 KG/Cm2-50por cientoP)CIm	m3	56,51	169,86	9.598,78860	56,84		56,84	9.654,840		9.654,840	100,58
	ACERO ESTRUCTURAL											
294	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	9.807,60	1,68	16.476,76800	10.802,43		10.802,43	18.148,080		18.148,080	110,14
295	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2	3.325,46	4,84	16.095,20220	2.885,88		2.885,88	13.967,660		13.967,660	86,78%
	CONTRAPISOS											
296	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3 (CONTRAPISO E=20Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	282,00	10,78	3.039,96000	263,21		263,21	2.837,400		2.837,400	93,34
297	mATERIAL DE BASE CLASE 2 (CONTRAPISO E=15Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	211,86	24,55	5.201,16300	197,41		197,41	4.846,420		4.846,420	93,18%
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS											
	CUBIERTA											
	BAJANTES AGUA LLUVIA											
298	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	12,00	90,42	1.085,04000	12,00		12,00	1.085,040		1.085,040	100,00%
299	SumI. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m	161,40	20,59	3.323,22600	-		-	-		-	
300	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO DIAm. INT.= 200A 160mm PVC Y/O POLIETILENO	u		20,71		-		-	-		-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES											
301	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	40,00	10,27	410,80000	-		-	-		-	
302	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	40,00	5,26	210,40000	-		-	-		-	
303	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	40,00	4,72	188,80000	-		-	-		-	
	10.- SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACIÓN						SE					
	POZOS DE REVISION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS											
304	CAJA REVISION mEDIA TENSION 90X90X90 C/VIA, T/HA	u		169,45		-		-	-		-	
305	CAJA REVISION mEDIA TENSION 60X60X75,ACERA, T/HA	u	41,00	179,17	7.345,97000	41,00		41,00	7.345,970		7.345,970	100,00%
306	PuESTA A TIERRA SImPLE EN POZO ELECTRICO CON SuELDA EXOTERmICA	u	4,00	164,46	657,84000	4,00		4,00	657,840		657,840	100,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	SISTEMA SOTERRADO DE MEDIA TENSION											
307	BAJADA DE DE mEDIA TENSION AEREA SOTERRADA	u	4,00	600,70	2.402,80000	1,00		1,00	600,700		600,700	25,00%
308	TENDIDO DE TuBO RIGIDO 1 1/2" DOBLE	m		16,92		-		-	-		-	
309	SISTEmA A TIERRA DE mEDIA TENSION	u	1,00	1.781,59	1.781,59000	-		-	-		-	
310	PARARRAYOS 10 KV, CON PERNOS SuJECCION	u	3,00	84,46	253,38000	-		-	-		-	
311	SECCIONAmIENTO TRIFASICO AEREO SuBTERRANEO S3A/S, INC. PARARRAYOS	u	3,00	1.290,60	3.871,80000	3,00		3,00	3.871,800		3.871,800	100,00%
312	TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNuDO NO. 2 AWG	m	500,00	5,92	2.960,00000	602,02		602,02	3.563,960		3.563,960	120,40%
313	TENDIDO Y REGuLADO DE CABLE DE COBRE XLPE NO2-15KV	u	1.600,00	14,75	23.600,00000	1.636,66		1.636,66	24.140,740		24.140,740	102,00%
314	TENDIDO CONDuCTOR: TTu 2/0	m		36,79		369,42		369,42	13.590,960		13.590,960	100%
315	TENDIDO CONDuCTOR: TTu 3/0	m		45,20		-		-	-		-	
316	mALLA DE PuESTA A TIERRA EN CENTRO DE TRANSFORmACION CON SuELDA EXOTERmICA	u	4,00	581,10	2.324,40000	3,00		3,00	1.743,300		1.743,300	75,00%
317	BANCO DE DuCTOS 1X2 DE 110mm 1X2B1-B2	m	1.800,00	32,94	59.292,00000	1.181,87		1.181,87	38.930,800		38.930,800	66,00%
318	mONTAJE DE TRANSFORmADOR PADmOuNTED TRIFASICO TIPO mALLA DE 50KVA-13.8KV-127/220V	u	1,00	7.092,79	7.092,79000	1,00		1,00	7.092,790		7.092,790	100,00%
319	mONTAJE DE TRANSFORmADOR PADmOuNTED TRIFASICO TIPO mALLA DE 100KVA-13.8KV-127/220V	u	1,00	12.135,60	12.135,60000	1,00		1,00	12.135,600		12.135,600	100,00%
320	PuNTA TERmINAL AT TIPO EXTERIOR CABLE Nº 2 AWG	u		170,72		-		-	-		-	
321	PuNTA TERmINAL AT TIPO INTERIOR CABLE Nº 2 AWG	u	3,00	170,72	512,16000	-		-	-		-	
322	ACOmETIDA PRINCIPAL ELECTRICA	m	15,00	6,22	93,30000	-		-	-		-	
	INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO											
323	POSTES ORNAmENTALES DE 8mTS Y BRAZOS	u	57,00	799,03	45.544,71000	56,00		56,00	44.745,680		44.745,680	98,25%
324	LumINARIA ORNAmENTAL LED120W	u	82,00	532,37	43.654,34000	68,00		68,00	36.201,160		36.201,160	82,93%
325	LumINARIA ORNAmENTAL LED 60W	u	33,00	387,65	12.792,45000	31,00		31,00	12.017,150		12.017,150	93,94%
326	TENDIDO DE CONDuCTOR 1No. NO. 4 TTu	m	4.647,00	8,10	37.640,70000	6.163,28	611,83	6.775,11	49.922,570	4.955,82	54.878,390	146,00%
327	mONTAJE DE TRANSF. mONO. PADmOuNTED 10 KVA	u	1,00	5.210,22	5.210,22000	1,00		1,00	5.210,220		5.210,220	100,00%
	AREA ADMINISTRATIVA PLANTA BAJA											
	INSTALACION LUMINARIAS											
328	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	636,00	3,34	2.124,24000	748,07		748,07	2.498,550		2.498,550	118,00%
329	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	218,00	1,18	257,24000	217,00		217,00	256,060		256,060	100,00%
330	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	620,00	0,56	347,20000	505,00		505,00	282,800		282,800	81,00%
331	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	350,00	4,87	1.704,50000	322,00		322,00	1.568,140		1.568,140	92,00%
332	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	150,00	1,57	235,50000	63,00		63,00	98,910		98,910	42,00%
333	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AmARILLO (INC. TAYPE)	m	1.043,00	2,28	2.378,04000	730,10		730,10	1.664,630		1.664,630	70,00%
334	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	1.043,00	1,43	1.491,49000	730,10		730,10	1.044,040		1.044,040	70,00%
335	LumINARIA LED 3X18W/120 VOLTIOS	u	130,00	60,59	7.876,70000	155,00		155,00	9.391,450		9.391,450	119,23%
336	LumINARIA LED 24W/120 VOLTIOS	u	14,00	58,36	817,04000	24,00	2,00	26,00	1.400,640	116,72	1.517,360	185,71%
337	INTERRuPTOR SImPLE CON TAPA	u	38,00	5,47	207,86000	47,00		47,00	257,090		257,090	123,68%
338	INTERRuPTOR DOBLE CON TAPA	u	14,00	6,16	86,24000	-		-	-		-	
339	INTERRuPTOR CONmuTADOR DE 3 VIAS	u	17,00	7,30	124,10000	30,00		30,00	219,000		219,000	176,47%
	TOMACORRIENTES GENERALES											
340	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	780,00	3,34	2.605,20000	1.133,82	11,46	1.145,28	3.786,960	38,28	3.825,240	147,00%
341	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	260,00	1,18	306,80000	249,00	6,00	255,00	293,820	7,08	300,900	98,00%
342	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	570,00	0,56	319,20000	595,00	12,00	607,00	333,200	6,72	339,920	106,00%
343	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	390,00	4,87	1.899,30000	234,00	8,00	242,00	1.139,580	38,96	1.178,540	62,00%
344	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	892,00	1,43	1.275,56000	1.174,63	35,44	1.210,07	1.679,720	50,68	1.730,400	135,66%
345	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	892,00	1,43	1.275,56000	1.154,73	35,44	1.190,17	1.651,260	50,68	1.701,940	133,43%
346	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	892,00	1,03	918,76000	1.154,73	35,44	1.190,17	1.189,370	36,50	1.225,870	133,43%
347	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	130,00	1,57	204,10000	174,00		174,00	273,180		273,180	134,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
348	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	130,00	7,45	968,50000	182,00		182,00	1.355,900		1.355,900	140,00%
	TOMACORRIENTES REGULADOS UPS											
349	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	195,00	3,34	651,30000	320,15		320,15	1.069,300		1.069,300	164,00%
350	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	65,00	1,18	76,70000	65,00		65,00	76,700		76,700	100,00%
351	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	106,00	0,56	59,36000	153,00		153,00	85,680		85,680	144,00%
352	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	100,00	4,87	487,00000	100,00		100,00	487,000		487,000	100,00%
353	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	24,00	1,57	37,68000	30,00		30,00	47,100		47,100	125,00%
354	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	267,00	1,43	381,81000	445,88		445,88	637,610		637,610	167,00%
355	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	267,00	1,43	381,81000	445,88		445,88	637,610		637,610	167,00%
356	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	267,00	1,03	275,01000	445,88		445,88	459,260		459,260	167,00%
357	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	24,00	7,45	178,80000	22,00		22,00	163,900		163,900	91,67%
	AREA ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA											
	INSTALACION LUMINARIAS											
358	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	584,00	3,34	1.950,56000	711,38		711,38	2.376,010		2.376,010	122,00%
359	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	194,00	1,18	228,92000	172,00		172,00	202,960		202,960	89,00%
360	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	570,00	0,56	319,20000	466,00		466,00	260,960		260,960	82,00%
361	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	500,00	4,87	2.435,00000	279,00		279,00	1.358,730		1.358,730	56,00%
362	CAJETINES mETALICOS OCTOGONALES mEDIANOS CON TAPA	u	900,00	5,44	4.896,00000	957,00	4,00	961,00	5.206,080	21,76	5.227,840	107,00%
363	CAJETINES mETALICOS CuADRADOS CON TAPA 10X10	u	5,00	4,99	24,95000	5,00		5,00	24,950		24,950	100,00%
364	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	60,00	1,57	94,20000	50,00		50,00	78,500		78,500	83,00%
365	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AmARILLO (INC. TAYPE)	m	1.200,00	2,28	2.736,00000	840,00	30,00	870,00	1.915,200	68,40	1.983,600	72,50%
366	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	1.200,00	1,43	1.716,00000	845,00	30,00	875,00	1.208,350	42,90	1.251,250	72,92%
367	LumINARIA LED 3X18W/120 VOLTIOS	u	180,00	60,59	10.906,20000	180,00		180,00	10.906,200		10.906,200	100,00%
368	LumINARIA LED 24W/120 VOLTIOS	u	33,00	58,36	1.925,88000	33,00		33,00	1.925,880		1.925,880	100,00%
369	INTERRuPTOR SImPLE CON TAPA	u	50,00	5,47	273,50000	63,00		63,00	344,610		344,610	126,00%
370	INTERRuPTOR DOBLE CON TAPA	u	15,00	6,16	92,40000	7,00		7,00	43,120		43,120	46,67%
371	INTERRuPTOR TRIPLE CON TAPA	u	4,00	7,30	29,20000	2,00		2,00	14,600		14,600	50,00%
372	INTERRuPTOR CONmuTADOR DE 3 VIAS	u		7,30		-		-	-		-	
	TOMACORRIENTES GENERALES											
373	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	895,00	3,34	2.989,30000	971,29	32,93	1.004,22	3.244,110	109,99	3.354,100	112,00%
374	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	300,00	1,18	354,00000	256,00	18,00	274,00	302,080	21,24	323,320	91,00%
375	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	670,00	0,56	375,20000	512,00	15,00	527,00	286,720	8,40	295,120	79,00%
376	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	400,00	4,87	1.948,00000	228,00	16,00	244,00	1.110,360	77,92	1.188,280	61,00%
377	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	4.000,00	1,43	5.720,00000	2.800,00		2.800,00	4.004,000		4.004,000	70,00%
378	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	1.080,00	1,43	1.544,40000	756,00		756,00	1.081,080		1.081,080	70,00%
379	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	1.080,00	1,03	1.112,40000	756,00		756,00	778,680		778,680	70,00%
380	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	155,00	1,57	243,35000	165,00	5,00	170,00	259,050	7,85	266,900	110,00%
381	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	170,00	7,45	1.266,50000	163,00		163,00	1.214,350		1.214,350	95,88%
	TOMACORRIENTES REGULADOS UPS											
382	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	368,00	3,34	1.229,12000	482,38		482,38	1.611,150		1.611,150	131,00%
383	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	125,00	1,18	147,50000	121,00		121,00	142,780		142,780	97,00%
384	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	220,00	0,56	123,20000	225,00		225,00	126,000		126,000	102,00%
385	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	190,00	4,87	925,30000	129,00		129,00	628,230		628,230	68,00%
386	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	48,00	1,57	75,36000	58,00		58,00	91,060		91,060	121,00%
387	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	489,00	1,43	699,27000	611,28		611,28	874,130		874,130	125,01%
388	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	489,00	1,43	699,27000	611,28		611,28	874,130		874,130	125,01%
389	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	489,00	1,03	503,67000	611,28		611,28	629,620		629,620	125,01%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
390	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	48,00	7,45	357,60000	61,00		61,00	454,450		454,450	127,08%
	ALIMENTACION AIREACONDICIONADO PLANTA BAJA Y ALATA											
391	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	600,00	3,34	2.004,00000	283,81		283,81	947,930		947,930	47,00%
392	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	250,00	1,18	295,00000	64,00		64,00	75,520		75,520	26,00%
393	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	200,00	0,56	112,00000	134,00		134,00	75,040		75,040	67,00%
394	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	248,00	4,87	1.207,76000	162,00		162,00	788,940		788,940	65,00%
395	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	885,00	1,43	1.265,55000	1.057,82		1.057,82	1.512,690		1.512,690	119,53%
396	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	885,00	1,43	1.265,55000	1.057,82		1.057,82	1.512,690		1.512,690	119,53%
397	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	885,00	1,43	1.265,55000	1.057,82	-	1.057,82	1.512,690		1.512,690	119,53%
398	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	50,00	1,57	78,50000	30,00		30,00	47,100		47,100	60,00%
399	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 220 V	u	50,00	7,45	372,50000	-		-	-		-	
	AREA DE MECANICA PESADA Y LIVIANA											
	INSTALACION LUMINARIAS											
400	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	540,00	3,34	1.803,60000	671,30		671,30	2.242,140		2.242,140	124,31%
401	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	66,00	1,18	77,88000	117,00		117,00	138,060		138,060	177,27%
402	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	132,00	0,56	73,92000	293,00		293,00	164,080		164,080	221,97%
403	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	436,00	4,87	2.123,32000	286,00		286,00	1.392,820		1.392,820	65,60%
404	CAJETINES mETALICOS CuADRADOS CON TAPA 10X10	u	20,00	4,99	99,80000	10,00		10,00	49,900		49,900	50,00%
405	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	65,00	1,57	102,05000	30,00		30,00	47,100		47,100	46,15%
406	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AmARILLO (INC. TAYPE)	m	88,00	2,28	200,64000	251,73		251,73	573,950		573,950	286,06%
407	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	88,00	1,43	125,84000	181,56		181,56	259,630		259,630	206,32%
408	LumINARIA LED 3X18W/120 VOLTIOS	u	11,00	60,59	666,49000	41,00		41,00	2.484,190		2.484,190	372,73%
409	LumINARIA LED 24W/120 VOLTIOS	u		58,36		-		-	-		-	
410	INTERRuPTOR SImPLE CON TAPA	u		5,47		2,00		2,00	10,940		10,940	100,00%
411	INTERRuPTOR DOBLE CON TAPA	u	1,00	6,16	6,16000	1,00		1,00	6,160		6,160	100,00%
412	INTERRuPTOR TRIPLE CON TAPA	u	1,00	7,30	7,30000	-		-	-		-	
413	LumINARIA LED 150W/220 VOLTIOS	u	53,00	193,85	10.274,05000	53,00		53,00	10.274,050		10.274,050	100,00%
414	TENDIDO DE CABLE CONCENTRICO 2X12 AWG(INC. TAYPE)	m	710,00	3,43	2.435,30000	1.402,08	46,96	1.449,04	4.809,140	161,07	4.970,210	204,09%
	TOMACORRIENTES GENERALES											
415	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	300,00	3,34	1.002,00000	405,83		405,83	1.355,470		1.355,470	135,28%
416	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	100,00	1,18	118,00000	87,00		87,00	102,660		102,660	87,00%
417	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	150,00	0,56	84,00000	157,00		157,00	87,920		87,920	104,67%
418	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	200,00	4,87	974,00000	101,00		101,00	491,870		491,870	50,50%
419	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	350,00	1,43	500,50000	559,08		559,08	799,480		799,480	159,74%
420	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	350,00	1,43	500,50000	559,08		559,08	799,480		799,480	159,74%
421	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	350,00	1,03	360,50000	559,08		559,08	575,860		575,860	159,74%
422	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	30,00	1,57	47,10000	48,00		48,00	75,360		75,360	160,00%
423	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	30,00	7,45	223,50000	38,00		38,00	283,100		283,100	126,67%
424	TuBERIA EmT 3/4 PuLGADA	m	250,00	3,47	867,50000	377,19		377,19	1.308,850		1.308,850	150,88%
425	TENDIDO DE CABLE CONCENTRICO NO.3X10 AWG (INC. TAYPE)	m	400,00	4,01	1.604,00000	636,52		636,52	2.552,450		2.552,450	159,13%
426	TOmA ESPECIAL 220 VOLTIOS	u	25,00	11,10	277,50000	20,00		20,00	222,000		222,000	80,00%
	AREA DE CHAPISTERIA, LAVADO, TORNO, VULCANIZADORA											
	INSTALACION LUMINARIAS											
427	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	195,00	3,34	651,30000	221,78		221,78	740,750		740,750	113,73%
428	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	65,00	1,18	76,70000	44,00		44,00	51,920		51,920	67,69%
429	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	98,00	0,56	54,88000	162,00		162,00	90,720		90,720	165,31%
430	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	328,00	4,87	1.597,36000	184,00		184,00	896,080		896,080	56,10%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
431	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	26,00	1,57	40,82000	20,00		20,00	31,400		31,400	76,92%
432	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AmARILLO (INC. TAYPE)	m	220,00	2,28	501,60000	136,93		136,93	312,200		312,200	62,24%
433	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	220,00	1,43	314,60000	136,93		136,93	195,810		195,810	62,24%
434	LumINARIA LED3X18W/120 VOLTIOS	u	45,00	60,59	2.726,55000	39,00		39,00	2.363,010		2.363,010	86,67%
435	LumINARIA LED 150W/220 VOLTIOS	u	20,00	193,85	3.877,00000	16,00		16,00	3.101,600		3.101,600	80,00%
436	TENDIDO DE CABLE CONCENTRICO 2X12 AWG(INC. TAYPE)	m	150,00	3,43	514,50000	264,20		264,20	906,210		906,210	176,13%
437	INTERRuPTOR SImPLE CON TAPA	u	20,00	5,47	109,40000	16,00		16,00	87,520		87,520	80,00%
	TOMACORRIENTES GENERALES											
438	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	635,00	3,34	2.120,90000	138,90		138,90	463,920		463,920	21,87%
439	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	212,00	1,18	250,16000	122,00		122,00	143,960		143,960	57,55%
440	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	315,00	0,56	176,40000	289,00		289,00	161,840		161,840	91,75%
441	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	428,00	4,87	2.084,36000	139,00		139,00	676,930		676,930	32,48%
442	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	550,00	1,43	786,50000	275,00		275,00	393,250		393,250	50,00%
443	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	550,00	1,43	786,50000	275,00		275,00	393,250		393,250	50,00%
444	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	550,00	1,03	566,50000	275,00		275,00	283,250		283,250	50,00%
445	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	40,00	7,45	298,00000	37,00		37,00	275,650		275,650	92,50%
446	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	42,00	1,57	65,94000	37,00		37,00	58,090		58,090	88,10%
447	TuBERIA EmT 3/4 PuLGADA	m	127,00	3,47	440,69000	201,68		201,68	699,830		699,830	158,80%
448	uNION EmT 3/4 PuLGADA	u	43,00	1,28	55,04000	63,00		63,00	80,640		80,640	146,51%
449	CONECTOR EmT 3/4 PuLGADA	u	86,00	0,77	66,22000	161,00		161,00	123,970		123,970	187,21%
450	TOmA ESPECIAL 220 VOLTIOS	u	10,00	11,10	111,00000	16,00		16,00	177,600		177,600	160,00%
	AREA DE RESGUARDO DE VEHICULOS											
	INSTALACION LUMINARIAS											
451	LumINARIA LED 150W/220 VOLTIOS	u	20,00	193,85	3.877,00000	15,00		15,00	2.907,750		2.907,750	75,00%
452	TENDIDO DE CABLE CONCENTRICO 2X12 AWG(INC. TAYPE)	m	512,00	3,43	1.756,16000	512,00		512,00	1.756,160		1.756,160	100,00%
	TOMACORRIENTES GENERALES											
453	TOmA ESPECIAL 220 VOLTIOS	u	8,00	11,10	88,80000	-		-	-		-	
454	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	8,00	1,57	12,56000	-		-	-		-	
	GRUPO ELECTROGENO											
	ACOMETIDA CENTRO DE TRANSFORMACION, GENERACION Y MEDICION DE ENERGIA											
455	mEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA INDIRECTO TRIFASICO 400/5A CLASE 0.5	u	1,00	3.275,86	3.275,86000	1,00		1,00	3.275,860		3.275,860	100,00%
456	CAJA DE PROTECCION GENERAL TRIFASICA NH-3X350A	u	1,00	468,19	468,19000	1,00		1,00	468,190		468,190	100,00%
457	GENERADOR DE EmERGENCIA EN CABINA INSONORA 50KVA TRIFASICO 127/220V	u	1,00	23.030,45	23.030,45000	1,00		1,00	23.030,450		23.030,450	100,00%
458	TABLERO DE TRANSFERENCIA AuTOmATICO TRIFASICO 3P/300A	u	1,00	4.845,70	4.845,70000	1,00		1,00	4.845,700		4.845,700	100,00%
459	PRuEBAS DE ENERGIZACION Y TRAmITES EmPRESA ELECTRICA, PAGOS (Global)	u	1,00	3.278,88	3.278,88000	1,00		1,00	3.278,880		3.278,880	100,00%
460	SISTEmA uPS TRIFÁSICODE 30 KVA	u	1,00	24.986,66	24.986,66000	1,00		1,00	24.986,660		24.986,660	100,00%
461	TABLERO DE BYPASS TRIFASICO 100A CON BARRAS DE COBRE	u	1,00	2.669,86	2.669,86000	1,00		1,00	2.669,860		2.669,860	100,00%
462	SISTEmA DE PROTECCION ATmOSFERICA PARRAYOS	u	2,00	1.643,60	3.287,20000	2,00		2,00	3.287,200		3.287,200	100,00%
	ALIMENTADORES Y SUBTABLEROS CT-1											
	ALIMENTADOR TDP-STE PB1											
463	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO.3X8+8Cu TW (INC. TAYPE)	m	18,00	12,44	223,92000	105,76		105,76	1.315,650		1.315,650	587,55%
464	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PB1	u	1,00	200,82	200,82000	1,00		1,00	200,820		200,820	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE PB2											
465	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	31,00	14,51	449,81000	38,50		38,50	558,640		558,640	124,00%
466	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PB2	u	1,00	323,93	323,93000	1,00		1,00	323,930		323,930	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE PB3											
467	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	41,00	14,51	594,91000	49,50		49,50	718,250		718,250	121,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
468	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PB3	u	1,00	213,64	213,64000	2,00		2,00	427,280		427,280	200,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE PB4											
469	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	32,00	14,51	464,32000	41,80		41,80	606,520		606,520	131,00%
470	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PB4	u	1,00	226,90	226,90000	2,00		2,00	453,800		453,800	200,00%
	ALIMENTADOR TPD-STE PB5											
471	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	26,00	14,51	377,26000	34,90		34,90	506,400		506,400	134,00%
472	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PB5	u	1,00	226,90	226,90000	3,00		3,00	680,700		680,700	300,00%
	ALIMENTADOR TPD-STE-PB6											
473	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	132,00	14,51	1.915,32000	180,00		180,00	2.611,800		2.611,800	136,00%
474	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PB6	u	3,00	297,41	892,23000	3,00		3,00	892,230		892,230	100,00%
	ALIMENTADOR STD-STE-PA1											
475	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	41,00	14,51	594,91000	44,10		44,10	639,890		639,890	108,00%
476	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PA1	u	1,00	214,08	214,08000	1,00		1,00	214,080		214,080	100,00%
	ALIMENTADOR STD-STE-PA2											
477	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	111,00	14,51	1.610,61000	153,90		153,90	2.233,090		2.233,090	139,00%
478	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PA2	u	3,00	297,41	892,23000	3,00		3,00	892,230		892,230	100,00%
	ALIMENTADOR TPD-STE-PA3											
479	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	45,00	14,51	652,95000	55,10		55,10	799,500		799,500	122,00%
480	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PA3	u	1,00	230,78	230,78000	1,00		1,00	230,780		230,780	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-PA4											
481	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	35,00	14,51	507,85000	92,40		92,40	1.340,720		1.340,720	264,00%
482	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PA4	u	1,00	304,26	304,26000	1,00		1,00	304,260		304,260	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-PA5											
483	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	47,00	14,51	681,97000	98,60		98,60	1.430,690		1.430,690	210,00%
484	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PA5	u	2,00	217,52	435,04000	2,00		2,00	435,040		435,040	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-PA6											
485	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	56,00	14,51	812,56000	67,80		67,80	983,780		983,780	121,00%
486	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PA6	u	1,00	310,67	310,67000	1,00		1,00	310,670		310,670	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A1											
487	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	122,00	14,51	1.770,22000	106,20		106,20	1.540,960		1.540,960	87,05%
488	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6ESPACIOS A1	u	4,00	122,27	489,08000	3,00		3,00	366,810		366,810	75,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A2											
489	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	130,00	14,51	1.886,30000	65,00		65,00	943,150		943,150	50,00%
490	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS A2	u	1,00	122,27	122,27000	-		-	-		-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR-A3											
491	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	57,00	14,51	827,07000	73,40		73,40	1.065,040		1.065,040	128,77%
492	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS A3	u	1,00	187,12	187,12000	1,00		1,00	187,120		187,120	100,00%
	ALIMENTADOR TPD-STE-ANGAR-A4											
493	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	92,00	14,51	1.334,92000	43,10		43,10	625,380		625,380	46,85%
494	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS A4	u	2,00	122,27	244,54000	-		-	-		-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A5											
495	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	95,00	14,51	1.378,45000	134,00		134,00	1.944,350		1.944,350	141,05%
496	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12ESPACIOS A5	u	1,00	200,82	200,82000	1,00		1,00	200,820		200,820	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A6											
497	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	146,00	14,51	2.118,46000	62,50		62,50	906,870		906,870	42,81%
498	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS A6	u	2,00	122,27	244,54000	-		-	-		-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR-A7											

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
499	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	82,00	14,51	1.189,82000	120,40		120,40	1.747,000		1.747,000	146,83%
500	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS A7	u	1,00	228,23	228,23000	1,00		1,00	228,230		228,230	100,00%
	ALIMENTADOR TPD-STE-CONDENSADORES											
501	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	12,00	14,51	174,12000	32,00		32,00	464,320		464,320	267,00%
502	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS CONDENSADORES	u	1,00	738,12	738,12000	1,00		1,00	738,120		738,120	100,00%
	ALIMENTADORES Y SUBTABLEROS CT-2											
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A1											
503	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	41,00	14,51	594,91000	20,50	42,00	62,50	297,460	609,42	906,880	152,44%
504	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12ESPACIOS ANGAR A1	u	1,00	187,12	187,12000	1,00		1,00	187,120		187,120	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A2											
505	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	80,00	14,51	1.160,80000	40,00		40,00	580,400		580,400	50,00%
506	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS ANGAR 2	u	1,00	122,27	122,27000	1,00		1,00	122,270		122,270	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR-A3											
507	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	55,00	14,51	798,05000	27,50		27,50	399,030		399,030	50,00%
508	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS ANGAR 3	u	1,00	122,27	122,27000	1,00		1,00	122,270		122,270	100,00%
	ALIMENTADOR TPD-STE-ANGAR-A4											
509	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	40,00	14,51	580,40000	20,00		20,00	290,200		290,200	50,00%
510	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS ANGAR 4	u	1,00	173,41	173,41000	1,00		1,00	173,410		173,410	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A5											
511	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	47,00	14,51	681,97000	53,43		53,43	775,270		775,270	113,68%
512	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12ESPACIOS ANGAR 5	u	1,00	173,41	173,41000	1,00		1,00	173,410		173,410	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A6											
513	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	168,00	14,51	2.437,68000	147,86		147,86	2.145,450		2.145,450	88,01%
514	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS ANGAR 6	u	3,00	200,82	602,46000	5,00		5,00	1.004,100		1.004,100	166,67%
	ACOMETIDA B.V PRINCIPAL											
515	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 2/0 THHN	m	144,00	4,18	601,92000	142,00		142,00	593,560		593,560	98,61%
516	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 1/0 THHN	m	36,00	4,18	150,48000	22,50	63,51	86,01	94,050	265,47	359,520	238,92%
	ACOMETIDA DE GENERADOR - TTA											
517	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 2/0 THHN	m	120,00	4,18	501,60000	119,60		119,60	499,930		499,930	99,67%
518	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 1/0 THHN	m	40,00	4,18	167,20000	171,20		171,20	715,620		715,620	428,00%
	ACOMETIDA DE TTA - TDP-N											
519	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 1/0 THHN	m	60,00	4,18	250,80000	184,00		184,00	769,120		769,120	306,67%
520	TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNuDO NO. 2 AWG	m	25,00	5,92	148,00000	21,40		21,40	126,690		126,690	85,60%
	ACOMETIDA DE TTA - TP											
521	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 1/0 THHN	m	40,00	4,18	167,20000	42,60		42,60	178,070		178,070	106,50%
522	TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNuDO NO. 2 AWG	m	14,00	5,92	82,88000	46,00		46,00	272,320		272,320	328,57%
	CERCO ELECTRICO CERRAMIENTO											
523	INSTALACION DE CENTRAL ENERGIZADORA 5K	u		594,89		-	1,00	1,00	-	594,89	594,890	100,00%
524	COLOCACION DE TuBERIA PREPARADA	u		10,70		-	201,00	201,00	-	2.150,70	2.150,700	100,00%
525	COLOCACION DE AISLADORES DE PASO DE ESQuINA Y PASANTE	u		5,26		-	1.205,00	1.205,00	-	6.338,30	6.338,300	100,00%
526	TENDIDO DE ALAmBRE SOLIDO GALVANIZADO	m		0,92		-	4.784,40	4.784,40	-	4.401,65	4.401,650	100,00%
527	TENDIDO DE CONDuCTOR DE COBRE DE ALTA TENSION 1/0	m		18,77		-	11,60	11,60	-	217,73	217,730	100,00%
528	INSTALACIONDE BATERIA Y SIRENA	m		962,28		-	1,00	1,00	-	962,28	962,280	100,00%
529	SISTEmA DE PuESTA A TIERRA	u		60,25		-	1,00	1,00	-	60,25	60,250	100,00%
	11.- SISTEMA HIDRAULICO SANITARIO Y CONTRAINCENDIOS						SH					
	SITEMA DE AGUA POTABLE A PRESIÓN CONSTANTE											
	ACOMETIDA DE AGUA POTABLE											

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
530	TuBERIA PVC D=63 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m	470,00	4,09	1.922,30000	-	43,00	43,00	-	175,87	175,870	9,15
531	CONEXION DOmICILIARIA INC.mEDIDOR,EN TuBO D=63mm	u	2,00	100,91	201,82000	-	2,00	2,00	-	201,82	201,820	100,00
532	HIDRANTES D=3" INCLuYE ACCESORIOS	u	2,00	702,84	1.405,68000	-		-	-		-	
	TUBERIA PVC AGUA POTABLE											
533	TuBERIA PVC ROSCABLE D=1/2" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	361,00	5,86	2.115,46000	88,42		88,42	518,120		518,120	24,49%
534	TuBERIA PVC ROSCABLE D=3/4" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	59,58	6,59	392,63220	31,93		31,93	210,420		210,420	53,59%
535	TuBERIA PVC ROSCABLE D=1" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	158,67	9,78	1.551,79260	166,82		166,82	1.631,500		1.631,500	105,14%
536	TuBERIA PVC ROSCABLE D=1 1/2" EN EDIFICACION+PRuEB	m	98,92	16,09	1.591,62280	-		-	-		-	
537	TuBERIA PVC ROSCABLE D=2" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	45,08	14,86	669,88880	52,26	30,80	83,06	776,580	457,69	1.234,270	184,25%
538	TuBERIA PVC ROSCABLE D=2 1/2"" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	20,04	16,38	328,25520	-		-	-		-	
539	TuBERIA PVC ROSCABLE D=3" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	335,60	17,90	6.007,24000	15,04		15,04	269,220		269,220	4,48%
540	TuBERIA PVC ROSCABLE D=4" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	32,81	18,83	617,81230	26,95		26,95	507,470		507,470	82,14%
	ACCESORIOS INST. TUB PVC ROSCABLE AGUA POTABLE											
541	ANCLAJES mETALICOS PLATINA 2 por 1/2" (ABRAZADERAS), EN LOSA Y PARED	u	250,00	14,11	3.527,50000	148,00		148,00	2.088,280		2.088,280	59,20%
542	S.I. PuNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGuA por punto	u	90,00	13,67	1.230,30000	47,00		47,00	642,490		642,490	52,22%
543	S. I. PuNTO AGuA FRIA PVC ROSCABLE D = 2" por punto	u	35,00	63,31	2.215,85000	-		-	-		-	
544	VALVuLA DE BRONCE RW 2" +ACCESORIOS	u	5,00	34,99	174,95000	5,00		5,00	174,950		174,950	100,00%
545	LLAVE DE PASODE 1/2 PuLG	u	15,00	10,15	152,25000	15,00		15,00	152,250		152,250	100,00%
	SISTEMA DE AGUA CALIENTE											
546	S.I. PuNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGuA CALIENTE por punto	u		16,04		-		-	-		-	
547	TuBERIA AGuA CALIENTE PVC ROSCABLE D=1/2" EN EDIFICACION+PRuEBA	m		6,77		-		-	-		-	
548	CALENTADOR ELECTRICO ELECTRICO 15W	u		539,04		-		-	-		-	
	SISTEMA DE PRESION (BOMBEO) S AGUA POTABLE											
549	S. I. SISTEmA HIDRONEumATICO(2BOmBA5HP-TANQuE 19.8GAL-CAJA CONTROL-CONT. NIVEL-VÁLVuLA CHEQuE), uSO	u	1,00	7.104,62	7.104,62000	1,00		1,00	7.104,620		7.104,620	100,00%
550	S. I. SISTEmA HIDRONEumATICO(3BOmBA5HP-TANQuE 29.5GAL-CAJA CONTROL-CONT. NIVEL-VÁLVuLA CHEQuE), uSO	u	1,00	10.425,92	10.425,92000	1,00		1,00	10.425,920		10.425,920	100,00%
	SISTEMA CONTRAINCENDIOS											
551	S. I. TuBERÍA HG ASTmD = 2 ½" + PRuEBA	m	80,00	15,24	1.219,20000	125,02		125,02	1.905,300		1.905,300	156,27%
552	S.C. TuBERIA HG ASTm D = 1 1/2 " + PRuEBA	m	40,00	11,54	461,60000	12,10		12,10	139,630		139,630	30,25%
553	S. I. TEE HG ASTmD = 2½"	u	2,00	8,72	17,44000	2,00		2,00	17,440		17,440	100,00%
554	S. I. CODO HG ASTm90° X D = 2 ½"	u	10,00	6,70	67,00000	8,00		8,00	53,600		53,600	80,00%
555	S.I. uNION uNIVERSAL HG ASTm D = 2 1/2"	u	5,00	12,00	60,00000	22,00		22,00	264,000		264,000	440,00%
556	S.I. VALVuLA CHECK BRONCE D = 2 1/2 "	u	1,00	79,42	79,42000	1,00		1,00	79,420		79,420	100,00%
557	S. I. REDuCTOR HG ASTmD = 2 1/2" X 1 1/2"	u	1,00	9,48	9,48000	2,00		2,00	18,960		18,960	200,00%
558	S. I. uNIÓN uNIVERSAL HG ASTmD = 1 1/2"	u	5,00	8,23	41,15000	2,00		2,00	16,460		16,460	40,00%
559	S. I. CODO HG ASTm D = 1 1/2"	u	6,00	8,93	53,58000	5,00		5,00	44,650		44,650	83,33%
560	ANCLAJES mETALICOS PLATINA 2 por 1/2" (ABRAZADERAS), EN LOSA Y PARED	u	80,00	14,11	1.128,80000	67,00		67,00	945,370		945,370	83,75%
561	PuNTO H.G. ROSCABLE 1 1/2" AGuA por punto	u	2,00	74,00	148,00000	2,00		2,00	148,000		148,000	100,00%
562	PuNTO H.G. ROSCABLE 2" AGuA por punto	u	1,00	81,83	81,83000	-		-	-		-	
563	GAB CONT INCEN INC GAB SN VID, RACK DE INC Y mANG 100FT X1½"LLAVE SPANNER1½"NACHA, NIPLE DE BRONC Y P	u	2,00	749,90	1.499,80000	2,00		2,00	1.499,800		1.499,800	100,00%
564	SIAmESA 4"X 2 1/2" X 2 1/2" DE BRONCE	u	1,00	295,97	295,97000	1,00		1,00	295,970		295,970	100,00%
	EXTINTORES											
565	EXTINTOR PQS CAPACIDAD 10 LBS. CON CAJA mETALICA	u	16,00	99,84	1.597,44000	-		-	-		-	
566	EXTINTOR PQS CAPACIDAD 20 LBS. CON CAJA mETALICA	u	2,00	106,69	213,38000	-		-	-		-	
567	EXTINTOR CO2 CAPACIDAD 10 LBS. CON CAJA mETALICA	u	4,00	97,66	390,64000	-		-	-		-	
568	EXTINTOR CO2 CAPACIDAD 20 LBS. CON CAJA mETALICA	u	2,00	313,27	626,54000	-		-	-		-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22	
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21
PLAZO:	365	DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
569	EXTINTOR CO2 CAPACIDAD TIPO SATELITE DE 50 LBS	u	1,00	578,23	578,23000	-		-	-		-	
	SISTEMA DE PRESION (BOMBEO) S CONTRAINCENDIOS											
570	S. I. SISTEmA HIDRONEumATICO(BOmBA-mOTOR-CAJA DE CONTROL-CONTROL DE NIVEL-VÁLVuLA CHEQuE), uSOCON	u	1,00	7.949,92	7.949,92000	1,00		1,00	7.949,920		7.949,920	100,00%
571	BOmBA JOCKEY; 1 HP, Q=8.70 GPm, PRES=110m; INCLuYE TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS	u	1,00	2.762,08	2.762,08000	1,00		1,00	2.762,080		2.762,080	100,00%
	SISTEMA DE REUTILIZACION DE AGUAS LLUVIAS (RIEGO Y LAVADORA AUTO)											
572	REPLANTEO Y NIVELACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	m	250,00	1,81	452,50000	66,97		66,97	121,220		121,220	26,79%
573	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	200,00	17,93	3.586,00000	-		-	-		-	
574	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	200,00	6,32	1.264,00000	-		-	-		-	
575	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=160mm)	m	120,00	9,91	1.189,20000	181,08		181,08	1.794,500		1.794,500	150,90%
576	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	12,00	90,42	1.085,04000	-		-	-		-	
	TUBERIA PVC RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS						ALL					
577	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=160 mm S6	m	50,00	9,70	485,00000	513,56		513,56	4.981,530		4.981,530	1027,12%
578	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT = 200 mm S6	m		15,28		-		-	-		-	
579	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 228 mm S6	m		15,88		-		-	-		-	
580	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 250 mm S6	m	90,00	16,51	1.485,90000	-		-	-		-	
581	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 300 mm S5	m	30,00	20,22	606,60000	-		-	-		-	
582	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=400 mm S5	m	428,11	38,33	16.409,45630	765,70		765,70	29.349,290		29.349,290	178,86%
583	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 450 mm S5	m	30,00	44,36	1.330,80000	-		-	-		-	
584	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 500 mm S5	m		74,42		-		-	-		-	
585	SumlN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 220A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u	3,00	21,28	63,84000	-		-	-		-	
586	SumlN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 335A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u	3,00	24,14	72,42000	30,00		30,00	724,200		724,200	1000,00%
	TUBERIA PVC PRESIÓN RECOLECCION AGUAS LLUVIAS											
587	TuBERIA PVC D=3" 1.0 mPA + PRuBA	m	12,00	5,16	61,92000	-		-	-		-	
588	VALVuLA TIPO GLOBO (CONTROL NIVEL mECANICO)	u	2,00	17,82	35,64000	-		-	-		-	
589	ROCIADOR 3/4 Q=3.22 m3/H, RADIO COBERTuRA 15.8m, 5BAR	u		17,82		-		-	-		-	
590	TuBERIA PVC D=25 mm 1.0 mPA u/C + PRuEBA	m	80,00	2,98	238,40000	-		-	-		-	
591	TuBERIA PVC D=40 mm 1.0 mPA E/C + PRuEBA	m	20,00	3,38	67,60000	-		-	-		-	
592	TuBERIA PVC D=50 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m	20,00	3,50	70,00000	-		-	-		-	
593	TuBERIA PVC D=63 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m	47,00	4,09	192,23000	-		-	-		-	
594	TuBERIA PVC D=75 mm 1.0 mPA u/E + PRuBA	m	30,00	5,23	156,90000	-		-	-		-	
595	TuBERIA PVC D=90 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m	25,00	6,20	155,00000	-		-	-		-	
596	TuBERIA PVC D=110 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m		8,48		-		-	-		-	
597	TuBERIA PVC D=125 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m		11,54		-		-	-		-	
	SISTEMA DE PRESION (RIEGO Y LAVADORA AUTOS)											
598	GRuPO 2 BOmBAS15 HP (Q=12 L/S, TDH= 80mCA), (2BOmBA-mOTOR-CAJA DE CONTROL-CONTROL DE NIVEL-VÁLVuLA CH	u		6.465,34		-		-	-		-	
599	GRuPO 3 BOmBAS15 HP (Q=21 L/S, TDH= 80mCA), (3BOmBA-mOTOR-CAJA DE CONTROL-CONTROL DE NIVEL-VÁLVuLA CH	u	1,00	8.868,10	8.868,10000	1,00		1,00	8.868,100		8.868,100	100,00%
	SISTEMA SANITARIO INTERNO											
	PRELIMINARES Y MOV. TIERRAS											
600	REPLANTEO Y NIVELACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	m	390,00	1,81	705,90000	15,91		15,91	28,800		28,800	4,08
601	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	12,00	17,93	215,16000	-		-	-		-	
602	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3		6,32		-		-	-		-	
	INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE											
603	PuNTO DE DESAGuE EN PVC 50 mm	u	86,00	28,80	2.476,80000	86,00		86,00	2.476,800		2.476,800	100,00%
604	PuNTO DE DESAGuE EN PVC 110 mm	u	45,00	34,43	1.549,35000	41,00		41,00	1.411,630		1.411,630	91,11%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
605	TuBERÌA PVC 50 mm DE DIÁmETRO (mAT/TRASP/INST)	m	125,60	5,14	645,58400	70,47		70,47	362,230		362,230	56,11%
606	TuBERÌA PVC 110 mm DE DIÁmETRO (mAT/TRASP/INST)	m	420,00	8,02	3.368,40000	420,00		420,00	3.368,400		3.368,400	100,00%
607	TuBERÌA PVC 160 mm DE DIÁmETRO (mAT/TRASP/INST)	m	165,00	14,52	2.395,80000	72,64		72,64	1.054,730		1.054,730	44,02%
608	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	6,00	90,42	542,52000	-		-	-		-	
	INSTALACION TUBERIA PVC DEVENTILACIÓN											
609	TuBERIA PVC D=75 mm VENTILACIÓN	m	78,00	4,27	333,06000	174,22		174,22	743,920		743,920	223,36%
610	PuNTO DE VENTILACIÓN PVC 75 mm por punto	u	25,00	15,61	390,25000	26,00		26,00	405,860		405,860	104,00%
	TANQUES DE RESERVA DE AGUA-CISTERNAS 49 M3											
	PRELIMINARES											
611	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	68,64	1,14	78,24960	-		-	-		-	
612	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	60,00	1,46	87,60000	60,00		60,00	87,600		87,600	100,00%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
613	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-	-		-	
614	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	201,65	4,18	842,89700	201,60		201,60	842,690		842,690	99,98%
615	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	m2		11,56		-		-	-		-	
616	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	41,00	13,72	562,52000	42,00		42,00	576,240		576,240	102,44%
617	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	10,00	6,32	63,20000	-		-	-		-	
	HORMIGONES											
618	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	4,10	163,18	669,03800	4,10		4,10	668,910		668,910	99,98%
619	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	29,66	249,88	7.411,44080	26,85		26,85	6.709,280		6.709,280	90,53%
	ACERO ESTRUCTURAL											
620	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	2.459,03	1,68	4.131,17040	2.459,09		2.459,09	4.131,270		4.131,270	100,00%
621	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	50,00	2,76	138,00000	-		-	-		-	
622	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	50,00	0,11	5,50000	-		-	-		-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES											
623	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	144,00	10,27	1.478,88000	29,66		29,66	304,610		304,610	20,60%
624	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	113,00	26,06	2.944,78000	127,18		127,18	3.314,260		3.314,260	112,55%
625	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	15,00	4,72	70,80000	-		-	-		-	
626	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u	2,00	75,58	151,16000	-		-	-		-	
	TANQUES DE RESERVA DE AGUA-CISTERNAS 11 M3											
	PRELIMINARES											
627	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1,14		-		-	-		-	
628	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	36,80	1,46	53,72800	-		-	-		-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
629	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	5,00	17,93	89,65000	-		-	-		-	
630	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	97,58	4,18	407,88440	79,81		79,81	333,600		333,600	81,79%
631	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	m2	17,00	11,56	196,52000	-		-	-		-	
632	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	55,20	13,72	757,34400	51,31		51,31	703,970		703,970	92,95%
633	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	5,00	6,32	31,60000	-		-	-		-	
	HORMIGONES											
634	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	1,66	163,18	270,87880	1,66		1,66	270,880		270,880	100,00%
635	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	16,93	249,88	4.230,46840	13,22	3,71	16,93	3.302,160	927,05	4.229,210	99,97%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	ACERO ESTRUCTURAL											
636	ACERO DE REFuERZO FʼY= 4200 Kg/Cm2	Kg	1.490,00	1,68	2.503,20000	1.490,00		1.490,00	2.503,200		2.503,200	100,00%
637	PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A (36, 572, 325,193,108) (PROY. MONTAJE GRUA)	Kg	40,00	2,76	110,40000	-		-	-		-	
638	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	40,00	0,11	4,40000	-		-	-		-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES											
639	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	69,83	10,27	717,15410	-	52,53	52,53	-	539,43	539,430	75,22
640	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	69,83	26,06	1.819,76980	-	52,53	52,53	-	1.368,80	1.368,800	75,22
641	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	15,00	4,72	70,80000	-	12,42	12,42	-	58,62	58,620	82,80
642	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u	2,00	75,58	151,16000	-		-	-		-	
	TANQUES DE RESERVA DE AGUA-CISTERNAS 36 M3(REUTILIZACION AGUA LLUVIA)											
	PRELIMINARES											
643	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1,14		-		-	-		-	
644	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2		1,46		-		-	-		-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
645	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-	-		-	
646	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3		4,18		-		-	-		-	
647	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	m2		11,56		-		-	-		-	
648	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3		13,72		-		-	-		-	
649	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3		6,32		-		-	-		-	
	HORMIGONES											
650	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO FʼC=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3		163,18		-		-	-		-	
651	HORmIGON PREmEZCLADOFʼC=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRANSPORTE	m3		249,88		-		-	-		-	
	ACERO ESTRUCTURAL											
652	ACERO DE REFuERZO FʼY= 4200 Kg/Cm2	Kg		1,68		-		-	-		-	
653	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg		2,76		-		-	-		-	
654	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg		0,11		-		-	-		-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES											
655	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2		10,27		-		-	-		-	
656	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2		26,06		-		-	-		-	
657	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2		4,72		-		-	-		-	
658	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u		75,58		-		-	-		-	
	TANQUES DE RESERVA DE AGUA-CISTERNAS 20 M3(REUTILIZACION AGUA LLUVIA)											
	PRELIMINARES											
659	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1,14		-		-	-		-	
660	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2		1,46		-		-	-		-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
661	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-	-		-	
662	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3		4,18		-		-	-		-	
663	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	m2		11,56		-		-	-		-	
664	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3		13,72		-		-	-		-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
665	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3		6,32		-		-	-		-	
	HORMIGONES											
666	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3		163,18		-		-	-		-	
667	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRANSPORTE	m3		249,88		-		-	-		-	
	ACERO ESTRUCTURAL											
668	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg		1,68		-		-	-		-	
669	PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A (36, 572, 325,193,108) (PROY. MONTAJE GRUA)	Kg		2,76		-		-	-		-	
670	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg		0,11		-		-	-		-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES											
671	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2		10,27		-		-	-		-	
672	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2		26,06		-		-	-		-	
673	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2		4,72		-		-	-		-	
674	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u		75,58		-		-	-		-	
	TRAMPA DE GRASAS											
675	TRAmPA DE GRASAS 0.60 por 1.40 por H=1.70 (F'C= 210 KG/Cm2), INC. ACCESORIOS	u		161,89		-		-	-		-	
676	SumINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA H.F. (1.00 por 0.40 por 0.05)110 KG	u		130,84		-		-	-		-	
677	CANAL. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 , E= 10Cm + 1Ø10mm A 12Cm	m		90,42		-		-	-		-	
	12.- SISTEMA DE ING. MECANICA (CLIMATIZACIÓN, AIRE PRESURIZADO, ELEVADORES HIDRAULICO, CABINA PINTURA											
	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN											
678	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 9,500 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CON	u		1.235,36		-		-	-		-	
679	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 12000 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CON	u		1.318,07		-		-	-		-	
680	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 18000 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CON	u		1.349,08		-		-	-		-	
681	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 24,000 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CO	u	2,00	1.504,15	3.008,30000	2,00		2,00	3.008,300		3.008,300	100,00%
682	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 30,000 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CO	u		1.561,01		-		-	-		-	
683	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 36,000 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CO	u	5,00	1.767,77	8.838,85000	5,00		5,00	8.838,850		8.838,850	100,00%
684	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 1/4 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉRmICO	m	60,00	11,74	704,40000	49,45		49,45	580,540		580,540	82,42%
685	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 1/2 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉRmICO	m	68,00	12,29	835,72000	49,45		49,45	607,740		607,740	72,72%
686	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 3/4 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉRmICO	m	8,00	18,29	146,32000	6,33		6,33	115,780		115,780	79,13%
687	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 5/8 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉRmICO	m	50,00	15,65	782,50000	69,81		69,81	1.092,530		1.092,530	139,62%
688	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 3/8 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTOTÉRmICO	m	50,00	11,96	598,00000	68,67		68,67	821,290		821,290	137,34%
689	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 1-1/8 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉRmICO	m	28,00	30,40	851,20000	22,43		22,43	681,870		681,870	80,11%
690	SOPORTE DE TuBERÍA DE COBRE	u	45,00	14,95	672,75000	55,00		55,00	822,250		822,250	122,22%
691	TuBERIA PVC DIAmETRO 50 mm	m	260,00	7,31	1.900,60000	49,34		49,34	360,640		360,640	18,98%
692	TuBERIA PVC DIAmETRO 75 mm	m	20,00	7,42	148,40000	-		-	-		-	
693	DuCTO DE TOL TOLGALVANIZADO	Kg		5,81		-		-	-		-	
694	REJILLA EXTRACCIÓN/SumINISTRO TIPO LOuVER CON ALETASFIJAS DE ACERO 12X12,INCLuYE CAJA mETALICA	u		83,69		-		-	-		-	
695	REJILLA SumINISTRO TIPO LOuVER CON ALETAS mÓVILES Y FIJAS DE ACERO 12X12,INCLuYE CAJA mETALICA	u		95,12		-		-	-		-	
696	DuCTO FLEXIBLE DIÁmETRO 6"	u		13,60		-		-	-		-	
697	DuCTO FLEXIBLE DIÁmETRO 4"	u		13,36		-		-	-		-	
698	VENTILADOR CENTRIFuGO EN LÍNEA PARA TumBADO 2500 CFm @ 0.35 PLG. H2O,1,5 HP	u		1.515,23		-		-	-		-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
699	VENTILADOR CENTRIFuGO EN LÍNEA PARA TumBADO 1700 CFm @ 0.32 PLG. H2O,1HP	u		1.401,52		-		-	-		-	
700	VENTILADOR CENTRIFuGO TIPO DOWNBLAST PARA TECHO 500 CFm @ 0.32 PLG. H2O,1,4HP	u		1.378,78		-		-	-		-	
701	uNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR TIPO VRV, DC INVERTER, 118,000 BTu/H	u	2,00	9.376,49	18.752,98000	2,00		2,00	18.752,980		18.752,980	100,00%
702	uNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR TIPO VRV, DC INVERTER, 140,000 BTu/H	u		10.286,22		-		-	-		-	
703	uNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR TIPO VRV, DC INVERTER, 158,000 BTu/H	u		12.426,17		-		-	-		-	
704	uNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR TIPO VRV, DC INVERTER, 188,000 BTu/H	u		11.754,19		-		-	-		-	
705	CONTROL CENTRALIZADO PARA LAS uNIDADES CONDENSADORAS	u	1,00	2.505,01	2.505,01000	1,00		1,00	2.505,010		2.505,010	100,00%
706	S. I. EXTRACTOR EÓLICO INDuSTRIAL,TuRBINA=112 Cm, DuCTO 61Cm; ALTuRA=85Cm,ASPAS ALumINIO BASE GALVA	u	50,00	326,58	16.329,00000	10,00		10,00	3.265,800		3.265,800	20,00%
	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO											
707	COmPRESOR DE AIRE DE PISTÓN 15 HP, CuATRO PISTONES, LuBRICACIÓN CON ACEITE,220 V, TRIFASICO, 60 HZ	m	2,00	5.513,68	11.027,36000	-		-	-		-	
708	TuBERIA DE COBRE DIAmETRO 1-1/2 PLG. TIPO L, SOLDADA	m	380,00	33,29	12.650,20000	-		-	-		-	
709	TuBERIA DE COBREDIAmETRO 1/2 PLG. TIPO L, SOLDADA	m	100,00	10,49	1.049,00000	-		-	-		-	
710	VÁLVuLAS DE BOLA DE 1/2 PLG DE BRONCE	m	26,00	10,80	280,80000	-		-	-		-	
711	SOPORTE DE TuBERÍA DE COBRE	u	70,00	14,95	1.046,50000	-		-	-		-	
	CABINA PARA PINTURA											
712	Sum E INST. CABINA PARA PINTuRA HORNO ANCHO=3.68, ALTO=3.275, LARGO=6.80; ESPESOR PARED 40mm, NOmINAL	u	1,00	38.677,92	38.677,92000	-		-	-		-	
	ELEVADOR HIDRAULICO											
713	ELEVADOR HIDRAuLICO mOVIL TIPO 4 COLumNAS, ST 1075, CAP=16500 LBS, ALT ELEVACION =73", 3 HP/4HP POR C	u	1,00	43.151,04	43.151,04000	1,00		1,00	43.151,040		43.151,040	100,00%
	13.- SISTEMA ELECTRONICO, VOZ, DATOS, INCENDIOS)						SD					
	CANALIZACION											
714	POZO DE REVISION 60X60X60Cm	u	23,00	158,53	3.646,19000	23,00		23,00	3.646,190		3.646,190	100,00%
715	BANDEJA TIPO ESCALERILLA 10CmX8Cm INCLuYE ACCESORIOS	m	172,00	46,57	8.010,04000	162,45	4,00	166,45	7.565,300	186,28	7.751,580	96,77%
716	BANDEJA TIPO ESCALERILLA 25CmX10Cm INCLuYE ACCESORIOS	m	324,00	100,74	32.639,76000	252,24		252,24	25.410,670		25.410,670	77,85%
717	TuBERIA PVC REFORZADA 4"	m	780,00	20,27	15.810,60000	366,00		366,00	7.418,820		7.418,820	46,92
718	TuBERÍA CONDuIT EmT 1/2" DE DIÁmETRO INCLuIDO ACCESORIOS	m	50,00	7,21	360,50000	-		-	-		-	
719	TuBERÍA CONDuIT EmT 3/4" DE DIÁmETRO INCLuIDO ACCESORIOS	m	50,00	16,51	825,50000	-		-	-		-	
720	TuBERÍA CONDuIT EmT 1" DE DIÁmETRO INCLuIDO ACCESORIOS	m	120,00	19,19	2.302,80000	560,69		560,69	10.759,650		10.759,650	467,24%
721	POSTE mETALICO	u		923,51		-		-	-		-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	SISTEMA DE VOZ Y DATOS											
722	PuNTO DE RED DE DATOS CON CABLE FTP 6A	u	197,00	151,66	29.877,02000	217,00		217,00	32.910,220		32.910,220	110,15%
723	RACK DE SALA DE EQuIPOS TIPO ARmARIO 42 uR	u	1,00	1.817,12	1.817,12000	1,00		1,00	1.817,120		1.817,120	100,00%
724	RACK DE SALA DE COmuNICACIONES TIPO ARmARIO 42 uR	u	1,00	1.617,13	1.617,13000	1,00		1,00	1.617,130		1.617,130	100,00%
725	RACK DE SALA DE COmuNICACIONES TIPO ARmARIO 12 uR	u	3,00	742,45	2.227,35000	3,00		3,00	2.227,350		2.227,350	100,00%
726	PATCH PANEL 24 PuERTOS RJ45 CATEGORIA 6A BLINDADO mODuLAR	u	12,00	213,78	2.565,36000	12,00		12,00	2.565,360		2.565,360	100,00%
727	PATCH COORD CATEGORIA 6A FTP 1 m	u	197,00	20,17	3.973,49000	222,00		222,00	4.477,740		4.477,740	112,69%
728	PATCH COORD CATEGORIA 6A FTP 10 PIES	u	197,00	21,78	4.290,66000	197,00		197,00	4.290,660		4.290,660	100,00%
729	VERIFICACION Y PRuEBAS DE CATEGORIA	u	197,00	18,92	3.727,24000	217,00		217,00	4.105,640		4.105,640	110,15%
730	SWITCH 24 PuERTOS RJ45, CAPA 2, POE, mODuLAR SFP+	u	8,00	1.753,78	14.030,24000	8,00		8,00	14.030,240		14.030,240	100,00%
731	SWITCH 24 PuERTOS RJ45, CAPA 2, mODuLAR SFP+	u	4,00	1.042,64	4.170,56000	4,00		4,00	4.170,560		4.170,560	100,00%
732	SWITCH 24 PuERTOS RJ45, CAPA 3, POE, mODuLAR SFP+	u	1,00	1.410,88	1.410,88000	1,00		1,00	1.410,880		1.410,880	100,00%
733	mODuLO PARA SWITCH CON 2 PuERTOS DE 10 GBPS PARA STACK	u	2,00	2.555,02	5.110,04000	-		-	-		-	
734	CABLE FLEXIBLE PARA STACK CON 2 CONECTORES DE 10 GBPS	u	8,00	454,27	3.634,16000	8,00		8,00	3.634,160		3.634,160	100,00%
735	mODuLO PARA SWITCH CON 2 PORTICOS DE 10GBPS (SFP+)	u	2,00	2.557,78	5.115,56000	-		-	-		-	
736	TRANSCEIVER DE 10 GBPS (SFP+)	u	8,00	3.317,76	26.542,08000	8,00		8,00	26.542,080		26.542,080	100,00%
737	PATCH COORD DE FIBRA OPTICA 3mT	u	10,00	62,35	623,50000	10,00		10,00	623,500		623,500	100,00%
738	ACCES POINT	u	9,00	643,76	5.793,84000	9,00		9,00	5.793,840		5.793,840	100,00%
739	CONTROLADOR DE RED INALAmBRICA	u	2,00	4.213,78	8.427,56000	2,00		2,00	8.427,560		8.427,560	100,00%
740	FIBRA OPTICA muLTImODO 6 HILOS	u	500,00	15,04	7.520,00000	600,00		600,00	9.024,000		9.024,000	120,00%
741	BANDEJA DE FIBRA OPTICA 12 PuERTOS CON CONECTORES LC	u	1,00	411,79	411,79000	1,00		1,00	411,790		411,790	100,00%
742	BANDEJA DE FIBRA OPTICA 6 PuERTOS	u	4,00	263,96	1.055,84000	4,00		4,00	1.055,840		1.055,840	100,00%
743	FuSIONADO DE FIBRA OPTICA INCLuYE PIGTAIL Y CERTIFICACION	u	10,00	98,34	983,40000	16,00		16,00	1.573,440		1.573,440	160,00%
744	PuERTA ANTI FuEGO	u	2,00	2.765,74	5.531,48000	2,00		2,00	5.531,480		5.531,480	100,00%
745	uPS 15 KVA	u	1,00	6.207,31	6.207,31000	1,00		1,00	6.207,310		6.207,310	100,00%
746	TABLERO BYPASS PARA DATA CENTER	u	1,00	2.070,65	2.070,65000	1,00		1,00	2.070,650		2.070,650	100,00%
747	TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL PARA DATA CENTER	u	1,00	2.236,86	2.236,86000	-		-	-		-	
748	BORNERA DE INSTALACION A TIERRA PARA RACK	u	5,00	22,92	114,60000	5,00		5,00	114,600		114,600	100,00%
749	BARRA PARA CONEXIÓN A TIERRA 8mmX12mm	u	5,00	48,71	243,55000	1,00		1,00	48,710		48,710	20,00%
750	CABLE THHN No. 6 AWG 19H	u	100,00	17,95	1.795,00000	70,00	61,50	131,50	1.256,500	1.103,93	2.360,430	131,50%
751	PuNTO DE VIDEO VGA	u	7,00	127,50	892,50000	7,00		7,00	892,500		892,500	100,00%
752	EQuIPO uTm PARA 100 uSuARIOS INCLuYE SISTEmA DE TELEFONÍA	u	1,00	27.174,40	27.174,40000	1,00		1,00	27.174,400		27.174,400	100,00%
753	TELEFONO IP NORmAL	u	41,00	110,92	4.547,72000	41,00		41,00	4.547,720		4.547,720	100,00%
754	TELEFONO IP GERENCIAL	u	4,00	213,78	855,12000	4,00		4,00	855,120		855,120	100,00%
755	PROGRAmACION Y PuESTA EN mARCHA DEL SISTEmA	u	1,00	1.266,70	1.266,70000	1,00		1,00	1.266,700		1.266,700	100,00%
	SISTEMA DE SONORIZACION											
756	CENTRAL DE SONIDO	u	1,00	11.071,93	11.071,93000	1,00		1,00	11.071,930		11.071,930	100,00%
757	PARLANTE DECORATIVO PARA CIELO FALSO CON TRANSFORmADOR DE LINEA	u	24,00	41,20	988,80000	24,00		24,00	988,800		988,800	100,00%
758	ALTAVOZ EXTERIOR30W (BOCINA)	u	8,00	174,70	1.397,60000	8,00		8,00	1.397,600		1.397,600	100,00%
759	PuNTO DE SONIDO	u	32,00	41,17	1.317,44000	32,00		32,00	1.317,440		1.317,440	100,00%
760	PuNTO DE mICROFONO	u	3,00	52,26	156,78000	3,00		3,00	156,780		156,780	100,00%
761	CONTROL DE VOLumEN	u	3,00	145,81	437,43000	3,00		3,00	437,430		437,430	100,00%
762	ALTAVOCES PARA AuDITORIO CON AmPLIFICADOR INCLuIDO 400W	u	4,00	625,13	2.500,52000	4,00		4,00	2.500,520		2.500,520	100,00%
763	PuNTO DE SONIDO PARA AuDITORIO	u	4,00	77,68	310,72000	4,00		4,00	310,720		310,720	100,00%
764	CENTRAL DE SONIDO PARA AuDITORIO	u	1,00	2.236,64	2.236,64000	1,00		1,00	2.236,640		2.236,640	100,00%
765	PROGRAmACION Y PuESTA EN mARCHA DEL SISTEmA DE SONORIZACION	u	1,00	749,33	749,33000	1,00		1,00	749,330		749,330	100,00%
	SISTEMA DE INCENDIO											

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
766	ESTACION mANuAL DE ALARmA DE EmERGENCIA	u	24,00	93,78	2.250,72000	16,00		16,00	1.500,480		1.500,480	66,67%
767	LuZ ESTROBOSCOPICA	u	24,00	133,78	3.210,72000	16,00		16,00	2.140,480		2.140,480	66,67%
768	DETECTOR DE HumO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE	u	93,00	91,90	8.546,70000	103,00	1,00	104,00	9.465,700	91,90	9.557,600	111,83%
769	DETECTOR TERmICO DIRECCIONABLE	u	8,00	91,90	735,20000	8,00		8,00	735,200		735,200	100,00%
770	PuNTO DE ALARmAS DE INCENDIO	u	153,00	73,78	11.288,34000	153,00	1,00	154,00	11.288,340	73,78	11.362,120	100,65%
771	CENTRAL DE INCENDIO DIRECCIONABLE	u	1,00	3.176,64	3.176,64000	1,00		1,00	3.176,640		3.176,640	100,00%
772	mODuLOS DE AISLADORES DE CORTO CIRCuITO	u	5,00	81,40	407,00000	5,00		5,00	407,000		407,000	100,00%
773	mODuLOS DE mONITOREO DE ZONAS	u	4,00	78,54	314,16000	4,00		4,00	314,160		314,160	100,00%
774	ANuNCIADOR REmOTO	u	1,00	438,28	438,28000	1,00		1,00	438,280		438,280	100,00%
775	LAmPARAS DE EmERGENCIA	u	54,00	52,63	2.842,02000	54,00		54,00	2.842,020		2.842,020	100,00%
776	LAmPARAS DE AVISO DE SALIDA	u	16,00	45,78	732,48000	16,00		16,00	732,480		732,480	100,00%
777	FuENTE REmOTA DE ALARmAS DE INCENDIO	u	1,00	797,28	797,28000	1,00		1,00	797,280		797,280	100,00%
778	SEÑALETICA INCENDIOS	u	34,00	26,35	895,90000	17,00		17,00	447,950		447,950	50,00%
779	PROGRAmACION Y PuESTA EN mARCHA EL SISTEmA DE INCENDIO	u	1,00	1.045,26	1.045,26000	1,00		1,00	1.045,260		1.045,260	100,00%
	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS											
780	CERRADuRA ELECTROmAGNETICA 600LB	u	20,00	139,78	2.795,60000	18,00	4,00	22,00	2.516,040	559,12	3.075,160	110,00
781	PuLSANTE DE SALIDA PARA CONTROL DE ACCESOS	u	11,00	29,53	324,83000	11,00	3,00	14,00	324,830	88,59	413,420	127,27
782	LECTOR DE PROXImIDAD CON TECLADO	u	17,00	252,04	4.284,68000	17,00		17,00	4.284,680		4.284,680	100,00%
783	CONTACTO mAGNETICO	u		15,29		-		-	-		-	
784	CONTROLADOR DE ACCESOS - CONTROL DE COmuNICACIONES	u	5,00	649,13	3.245,65000	5,00		5,00	3.245,650		3.245,650	100,00%
785	TARJETAS PARA CONTROL DE ACCESOS	u	36,00	18,06	650,16000	36,00		36,00	650,160		650,160	100,00%
786	PuNTO PARA ELEmENTOS DE CONTROL DE ACCESOS	u	48,00	47,14	2.262,72000	43,00		43,00	2.027,020		2.027,020	89,58%
787	CABLE EKKX 10 PARES	u	500,00	17,21	8.605,00000	469,10		469,10	8.073,210		8.073,210	93,82%
788	DETECTORES INFRARROJOS	u	35,00	23,94	837,90000	35,00		35,00	837,900		837,900	100,00%
789	SIRENAS Y ALARmAS DE SEGuRIDAD	u	3,00	52,87	158,61000	3,00		3,00	158,610		158,610	100,00%
790	PANEL CONTROLADOR DE ALARmAS	u	2,00	187,58	375,16000	2,00		2,00	375,160		375,160	100,00%
791	PuNTOS DEL SISTEmA DE SEGuRIDAD	u	38,00	75,29	2.861,02000	38,00		38,00	2.861,020		2.861,020	100,00%
792	SEÑALETICA DE ACCESOS	u	4,00	26,35	105,40000	-		-	-		-	
793	BARRERAS	u		1.929,64		-		-	-		-	
794	LOOPS	u		134,81		-		-	-		-	
795	LECTOR BIOmETRICO	u	3,00	207,83	623,49000	3,00		3,00	623,490		623,490	100,00%
796	PROGRAmACION Y PuESTA EN mARCHA EL SISTEmA DE CONTROL DE ACCESOS	u	1,00	690,14	690,14000	1,00		1,00	690,140		690,140	100,00%
	SISTEMA DE CCTV											
797	VIDEOGRABADOR DIGITAL NVR	u	1,00	2.926,25	2.926,25000	1,00		1,00	2.926,250		2.926,250	100,00%
798	mONITOR A COLOR LED FHD 32"	u	1,00	1.601,28	1.601,28000	1,00		1,00	1.601,280		1.601,280	100,00%
799	CAmARA IP DE CCTV FIJA EN DOmO	u	21,00	218,46	4.587,66000	21,00		21,00	4.587,660		4.587,660	100,00%
800	CAmARA IP DE CCTV TIPO BALA	u	2,00	206,92	413,84000	2,00		2,00	413,840		413,840	100,00%
801	CAmARA IP DE CCTV PTZ EN DOmO	u	9,00	728,00	6.552,00000	9,00		9,00	6.552,000		6.552,000	100,00%
802	CAmARAIP 360 (FISHERE)	u	10,00	1.039,01	10.390,10000	8,00		8,00	8.312,080		8.312,080	80,00%
803	CONTROLADOR PARA CAmARA mOVIL CON TECLADO Y JOYSTICK	u	1,00	752,94	752,94000	1,00		1,00	752,940		752,940	100,00%
804	PROGRAmACION Y CONFIGuRACION DE CAmARAS, TASA DE GRABACION, IDENTIFICACION DE AREAS	u	1,00	948,85	948,85000	1,00		1,00	948,850		948,850	100,00%
	SISTEMA DE PANTALLAS INFORMATIVAS											
805	SERVIDOR DEL SISTEmA DE INFORmACION Y TV IP	u	1,00	10.774,19	10.774,19000	1,00		1,00	10.774,190		10.774,190	100,00%
806	CONVERTIDOR NAVEGADOR INTERNET TV	u	1,00	2.084,90	2.084,90000	6,00		6,00	12.509,400		12.509,400	600,00%
807	TELEVISOR LCD 32"	u	7,00	1.601,28	11.208,96000	6,00		6,00	9.607,680		9.607,680	85,71%
808	PROGRAmACION Y PuESTA EN mARCHA EL SISTEmA DE PANTALLAS INFORmATIVAS	u	1,00	867,70	867,70000	1,00		1,00	867,700		867,700	100,00%
	14.- CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA Y GARITA						CB					

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	BATERIA SANITARIA GENERAL JUNTO A ZONA RECREACIONAL											
	PRELIMINARES											
809	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1,14		-		-	-		-	
810	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2		1,46		-		-	-		-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
811	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3		4,18		-		-	-		-	
812	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-	-		-	
813	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3		17,33		-		-	-		-	
814	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3		13,72		-		-	-		-	
815	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3		2,82		-		-	-		-	
	HORMIGONES											
816	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3		163,18		-		-	-		-	
817	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF'C = 280KG./Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3		225,97		-		-	-		-	
818	HORMIGON PREMEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3		283,42		-		-	-		-	
819	HORMIGON PREMEZCLADO COLUMNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	m3		289,16		-		-	-		-	
820	HORMIGON PREMEZCLADO LOSA/ VIGAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	m3		193,75		-		-	-		-	
821	BLOQuE ALIVIANADO EN LOSA,E=15X20X40 Cm	u		0,61		-		-	-		-	
	ACERO ESTRUCTURAL											
822	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg		1,68		-		-	-		-	
823	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2		4,84		-		-	-		-	
	CONTRAPISOS											
824	CONTRAPISO HORm.S. PREmEZ. F'C=280KG/Cm2 E= 4 PuLG. (SIN BASE)	m2		21,50		-		-	-		-	
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS											
825	mASILLADO DE PISOS, ENDuRECEDOR DE CuARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5mm)	m2		5,62		-		-	-		-	
826	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2		26,06		-		-	-		-	
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS											
827	mASILLADO E ImPERmEABILIZADO DE PISOS-LOSAS, mORTERO CEmENTO-ARENA 1:3 +(PEGANTE + ImPERm.) LOSAS EXT	m2		10,40		-		-	-		-	
828	ImPERmEABILIZACION LOSA DE CuBIERTA ImPRImANTE ASFALTICO SOLuBLE AL AGuA	m2		2,84		-		-	-		-	
829	ImPERmEABILIZACIONLOSA DE CuBIERTA LAmINAS ASFALTICAS	m2		13,85		-		-	-		-	
	BAJANTES AGUA LLUVIA											
830	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=110mm)	m		8,14		-		-	-		-	
831	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u		90,42		-		-	-		-	
832	Sumi. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m		20,59		-		-	-		-	
	MAMPOSTERÍA											
833	RIOSTRAS DE H.S. F'C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3		258,83		-		-	-		-	
834	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=10 Cm	m2		17,71		-		-	-		-	
835	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2		22,90		-		-	-		-	
836	PICADO Y RESANADO DE mAmPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m		4,63		-		-	-		-	
837	mESON H.A. F'C=180 KG/Cm2 E=7 Cm HIERRO (LAVAmANOS+mESON)	m		34,03		-		-	-		-	
838	REVESTImIENTO mESON GRANITO	m		180,61		-		-	-		-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES											
839	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2		10,27		-		-	-		-	
840	ENLuCIDO VERTICAL PALETEADO mORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2		8,76		-		-	-		-	
841	ENLuCIDO HORIZONTAL PALETEADO mORTERO 1:3	m2		12,30		-		-	-		-	
842	EmPASTE VERTICAL Y HORIZONTAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2		6,04		-		-	-		-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
843	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2		4,72		-		-	-		-	
	CARPINTERIA METALICA											
844	PuERTA mETÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2mm , INC. CERRADuRA, BISAGRAS Y PINTuRA	m2		142,73		-		-	-		-	
845	PuERTAS mODuLARES, TAmBORADAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, INCLuYE ESTRuCTuRA Y HER	m2		172,30		-		-	-		-	
846	DIVISIONES ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, TAmBORADAS INCLuYE ESTRuCTuRA, EmPOTRAmIENTO PISO PARED (	m2		161,18		-		-	-		-	
	VENTANERIA-PUERTAS ALUMINIO VIDRIO											
847	VENTANA CORREDIZA ALumINIO SERIE 200-INCL. VIDRIO LAmINADO 6mm	m2		183,67		-		-	-		-	
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS											
848	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF DISCAPACITADOS PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u		297,96		-		-	-		-	
849	PASAmANOS PARA DISCAPACITADOS TuBO DIAm 32mm E=1.5mm EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO SATINADO (Juego)	u		281,03		-		-	-		-	
850	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u		297,96		-		-	-		-	
851	uRINARIO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF	u		261,01		-		-	-		-	
852	LAVABO BLANCO, LLAVE SENSOR mOVImIENTO (CON ACCESORIOS)	u		281,39		-		-	-		-	
853	DISPENSOR DE PAPEL HIGIENICO DIAm=275mm, ROLLO 70mm, ABATIBLE,ACERO INOX E=8mm, AISI 304, ACABADO S	u		110,71		-		-	-		-	
854	DISPENSOR DE PAPEL TOALLA 400-600 uNIDADES, 330X273X130mm, ACERO INOX E=8mm AISI 304, ACABADO SATINAD	u		113,00		-		-	-		-	
855	DISPENSADOR DE JABON LIQuIDO ACERO INOX AISI304, ACABADO SATINADO	u		91,28		-		-	-		-	
856	ESPEJO DE VIDRIO FLOTADO 4mm- mARCO DE ALumINIO	m2		42,86		-		-	-		-	
857	SECADOR DE mANOS ACCIONAmIENTO AuTOmATICO 260X302X150mm, ACERO INOX. 304, LAmINA1.5mm 110V-60HZ	u		238,44		-		-	-		-	
858	BASuRERO CILINDRICO A PEDAL D=250mm H=385 PARA BAÑO ACERO INOX. 304	u		66,60		-		-	-		-	
859	DuCHAS CON mEZCLADORA (CON ACCESORIOS)	u		135,94		-		-	-		-	
	GARITAS DE CONTROL											
	PRELIMINARES											
860	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1,14		-		-	-		-	
861	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	34,81	1,46	50,82260	36,88		36,88	53,840		53,840	105,94%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
862	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	37,47	4,18	156,62460	6,75		6,75	28,220		28,220	18,02%
863	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-	-		-	
864	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	9,26	17,33	160,47580	-		-	-		-	
865	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	23,08	13,72	316,65760	-		-	-		-	
866	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	37,47	2,82	105,66540	6,75		6,75	19,040		19,040	18,02%
	HORMIGONES											
867	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	1,00	163,18	163,18000	1,00		1,00	163,180		163,180	100,00%
868	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF´C = 280KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	2,00	225,97	451,94000	2,40		2,40	542,330		542,330	120,00%
869	HORmIGON PREmEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	1,13	283,42	320,26460	1,11		1,11	314,600		314,600	98,23%
870	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	0,30	289,16	86,74800	0,18		0,18	52,050		52,050	60,00%
871	HORmIGON PREmEZCLADO LOSA/ VIGAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	5,55	193,75	1.074,62000	4,03		4,03	781,150		781,150	72,69%
872	BLOQuE ALIVIANADO EN LOSA.E=15X20X40 Cm	u		0,61		-		-	-		-	
	ACERO ESTRUCTURAL											
873	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	836,00	1,68	1.404,48000	836,00		836,00	1.404,480		1.404,480	100,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
874	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2	77,00	4,84	372,68000	69,31		69,31	335,460		335,460	90,01%
	CONTRAPISOS											
875	CONTRAPISO HORm.S. PREmEZ. F´C=280KG/Cm2 E= 4 PuLG. (SIN BASE)	m2	33,50	21,50	720,25000	25,40		25,40	546,100		546,100	75,82%
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS											
876	mASILLADO DE PISOS, ENDuRECEDOR DE CuARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5mm)	m2		5,62		-		-	-		-	
877	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	38,00	26,06	990,28000	-	-	-	-		-	
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS											
878	mASILLADO E ImPERmEABILIZADO DE PISOS-LOSAS, mORTERO CEmENTO-ARENA 1:3 +(PEGANTE + ImPERm.) LOSAS EXT	m2	41,10	10,40	427,44000	-		-	-		-	
879	ImPERmEABILIZACION LOSA DE CuBIERTA ImPRImANTE ASFALTICO SOLuBLE AL AGuA	m2	41,10	2,84	116,72400	43,53		43,53	123,630		123,630	105,92%
880	ImPERmEABILIZACIONLOSA DE CuBIERTA LAmINAS ASFALTICAS	m2	41,10	13,85	569,23500	43,53		43,53	602,890		602,890	105,91%
	BAJANTES AGUA LLUVIA											
881	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=110mm)	m	10,00	8,14	81,40000	237,09		237,09	1.929,910		1.929,910	2370,90%
882	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	3,00	90,42	271,26000	2,00		2,00	180,840		180,840	66,67%
883	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m	30,00	20,59	617,70000	-		-	-		-	
	MAMPOSTERÍA											
884	RIOSTRAS DE H.S. F´C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3	0,61	258,83	157,88630	-		-	-		-	
885	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=10 Cm	m2		17,71		-		-	-		-	
886	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2	72,50	22,90	1.660,25000	56,42		56,42	1.292,020		1.292,020	77,82%
887	PICADO Y RESANADO DE mAmPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m	52,36	4,63	242,42680	-	52,36	52,36	-	242,43	242,430	100,00
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES											
888	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	135,50	10,27	1.391,58500	55,04		55,04	565,220		565,220	40,62%
889	ENLuCIDO VERTICAL PALETEADO mORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2	73,00	8,78	640,94000	57,96		57,96	508,920		508,920	79,40%
890	ENLuCIDO HORIZONTAL PALETEADO mORTERO 1:3	m2		12,30		-		-	-		-	
891	EmPASTE VERTICAL Y HORIZONTAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	208,50	6,04	1.259,34000	55,04		55,04	332,420		332,420	26,40%
892	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	399,10	4,72	1.883,75200	-		-	-		-	
	CARPINTERIA METALICA											
893	PuERTA mETÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2mm , INC. CERRADuRA, BISAGRAS Y PINTuRA	m2	14,20	142,73	2.026,76600	-		-	-		-	
894	PuERTA TAmBORADA 70Cm, ESQuELETO CANELO, mDF 9mm -LACADA-DISEÑO CORPORATIVO	u	4,41	198,79	876,66390	-	4,41	4,41	-	876,66	876,660	100,00
	VENTANERIA-PUERTAS ALUMINIO VIDRIO											
895	VENTANA CORREDIZA ALumINIO SERIE 200-INCL. VIDRIO LAmINADO 6mm	m2	14,50	183,67	2.663,21500	11,25		11,25	2.065,920		2.065,920	77,57%
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS											
896	INODORO BLANCO (CON ACCESORIOS)	u	3,00	114,30	342,90000	-	2,00	2,00	-	228,60	228,600	66,67
897	LAVABO BLANCO (CON ACCESORIOS)	u	3,00	115,74	347,22000	-	2,00	2,00	-	231,48	231,480	66,67
898	DuCHAS (CON ACCESORIOS)	u		50,24		-		-	-		-	
	15.- CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y PORTONES						CC					
	PRELIMINARES											
899	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	1.765,78	1,14	2.012,98920	-	4.011,32	4.011,32	-	4.572,90	4.572,900	227,17
900	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	882,89	1,46	1.289,01940	878,84		878,84	1.283,110		1.283,110	99,54
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
901	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	671,86	4,18	2.808,37480	-	460,51	460,51	-	1.924,93	1.924,930	68,54
902	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	30,00	17,93	537,90000	-		-	-		-	
903	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	404,00	13,72	5.542,88000	-	515,79	515,79	-	7.076,64	7.076,640	127,67
904	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	671,86	2,82	1.894,64520	-	460,51	460,51	-	1.298,64	1.298,640	68,54
	HORMIGONES											
905	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	9,34	163,18	1.524,10120	8,23	0,51	8,74	1.342,980	83,22	1.426,200	93,58%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
906	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF´C = 280KG./Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	15,35	225,97	3.468,63950	15,76		15,76	3.561,280		3.561,280	102,67
907	HORmIGON PREmEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	30,84	283,42	8.740,67280	19,61	5,98	25,59	5.557,860	1.694,85	7.252,710	82,98%
908	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	89,64	289,16	25.920,30240	13,76	11,77	25,53	3.978,840	3.403,41	7.382,250	28,48%
909	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F´C=180 KG/Cm2-50por cientoP)CIm	m3	43,60	169,86	7.405,89600	90,41	6,24	96,65	15.357,040	1.059,93	16.416,970	221,67%
	ACERO ESTRUCTURAL											
910	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	5.740,62	1,68	9.644,24160	5.123,17	79,97	5.203,14	8.606,920	134,35	8.741,270	90,64%
911	PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A (36, 572, 325,193,108) (PROY. MONTAJE GRUA)	Kg	4.678,00	2,76	12.911,28000	2.075,41	367,72	2.443,13	5.728,130	1.014,91	6.743,040	52,23%
912	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	4.678,00	0,11	514,58000	2.075,41	367,72	2.443,13	228,300	40,45	268,750	52,23%
	MAMPOSTERÍA											
913	RIOSTRAS DE H.S. F´C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3	12,50	258,83	3.235,37500	7,57		7,57	1.959,340		1.959,340	60,56%
914	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2	680,00	22,90	15.572,00000	908,88		908,88	20.813,350		20.813,350	133,66
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES											
915	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	2.110,10	10,27	21.670,72700	1.996,16		1.996,16	20.500,560		20.500,560	94,60%
916	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	2.110,10	5,26	11.099,12600	1.996,16		1.996,16	10.499,800		10.499,800	94,60%
917	TEXTuRADO GRAFIATO GRuESO DE PAREDES, COLOR INSTITuCIONAL GADPPZ	m2	1.112,60	6,04	6.720,10400	559,54		559,54	3.379,620		3.379,620	50,29%
918	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	1.995,00	4,72	9.416,40000	2.048,27		2.048,27	9.667,840		9.667,840	103%
	CARPINTERIA METALICA											
919	CERRAmIENTO TuBO ISO2 H.G. 2 "-mALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6mm, INC. PINTuRA A COmPRESOR	m2	1.054,50	36,37	38.352,16500	-		-	-		-	
920	CERRAmIENTO VERJA DE TuBO AGuA ISO2 HG 2" Y TuBO RECT 80X40X2, INC. PINTuRA COmPRESOR	m2	400,00	70,48	28.192,00000	-		-	-		-	
921	PORTON CORREDIZO TuBOISO 2 2", mARCO TuBO RECT 50X150X2mm, INC. PINTuRA COmPRESOR	m2	138,40	68,64	9.499,77600	-		-	-		-	
					8.364.474,94							
	NAVE DE DESECHOS											
	1.- VIAS Y PARQUEADEROS											
	CONSOLIDACION DE PLATAFORMAS											
15	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	m3	537,97	2,92	1570,87	-		-	-		-	-
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREODE MEJORAMIENTO	m3-km	9.583,46	0,28	2711,37	-		-	-		-	-
	2.- ESTABILIZACIÓN TALUDES											
	SISTEMA TIERRA ARMADA											
34	GEOTEXTIL TEJIDO- 2400 T PARA MURO DE CONTENCION TIERRA ARMADA	m2	320,00	3,06	979,20	272,80		272,80	834,770		834,770	85%
35	GEOMALLA BX-1100 TENSAR	m2	64,40	3,19	205,44	30,00		30,00	95,700		95,700	47%
	16. NAVE DE DESECHOS											
	REVESTIMIENTO DE TUMBADOS											
181	CIELO RASO FALSO TIPO GYPSUM PARA HUMEDAD-1/2"-SIN ESTUCAR	m2	115,00	20,04	2304,60	-		-	-		-	-
	PRELIMINARES											
206	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQUEADERO,Y PLATAFORMAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	347,75	1,46	507,72	-		-	-		-	-
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
211	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A MAQUINA)	m3	103,04	4,18	430,71	28,08		28,08	117,370		117,370	27,25%
213	SUB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COMPACTADO (MAQUINA), CAPAS 20CM	m3	103,04	17,33	1785,68	103,00		103,00	1.784,990		1.784,990	100%
214	RELLENO COMPACTADO A MAQUINA CON LASTRE TNM=8" (EN CAPAS DE 20 CM)	m3	140,54	13,72	1928,21	-		-	-		-	
215	DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS	m3	133,95	2,82	377,74	-		-	-		-	-
	HORMIGONES											
216	HORMIGON PREMEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/CM2 INC. BOMBEO Y TRANSPORTE	m3	3,00	163,18	489,54	5,84		5,84	952,970		952,970	194,67%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
217	HORMIGÓN PREMEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CIMENTACIÓNF'C = 280KG./CM2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	m3	12,00	225,97	2711,64	3,92		3,92	885,800		885,800	32,67%
218	HORMIGON PREMEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/CM2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	12,78	283,42	3622,11	13,18		13,18	3.735,480		3.735,480	103,13%
219	HORMIGON PREMEZCLADO COLUMNAS F'C=280 KG/CM2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	m3	4,55	289,16	1315,68	-		-	-		-	
220	HORMIGÓN CICLÓPEO (50POR CIENTO H.S. F'C=180 KG/CM2-50POR CIENTOP)CIM	m3	17,04	169,86	2894,41	-		-	-		-	-
	ACERO ESTRUCTURAL											
221	ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2	Kg	4596,88	1,68	7722,76	4.813,19		4.813,19	8.086,160		8.086,160	104,71%
222	PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A (36, 572, 325,193,108) (PROY. MONTAJE GRUA)	Kg	18285	2,76	50466,60	20.478,06		20.478,06	56.519,450		56.519,450	111,99%
223	TRATAMIENTO PINTURA ESTRUCTURA ACERO A36 (FONDO+PINTURA ANTICORROSIVA), A COMPRESOR	Kg	18285	0,11	2011,35	20.478,06		20.478,06	2.252,590		2.252,590	111,99%
224	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6MM	m2	382,525	4,84	1851,42	344,25		344,25	1.666,170		1.666,170	89,99%
	CONTRAPISOS											
225	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3 (CONTRAPISO E=20CM, COMPAC. 100POR CIENTO P.E.M.)	m3	62,46	10,78	673,32	-		-	-		-	-
226	MATERIAL DE BASE CLASE 2 (CONTRAPISO E=15CM, COMPAC. 100POR CIENTO P.E.M.)	m3	46,85	24,55	1150,17	30,32		30,32	744,360		744,360	64,72%
227	CONTRAPISO HORM.S. PREMEZ. F'C=280KG/CM2 E= 4 PULG. (SIN BASE)	m2	347,75	21,5	7476,63	-		-	-		-	-
228	JUNTA ASERRADA DILATACION PISO (INC. CORDON, Y SELLO)	m	90,00	2,59	233,10	-		-	-		-	-
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS											
229	MASILLADO DE PISOS, ENDURECEDOR DE CUARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5MM)	m2	347,75	5,62	1954,36	344,25		344,25	1.934,690		1.934,690	98,99%
230	PINTURA EPOXICA PISO INDUSTRIAL 3MM (2 COMPONENTES)	m2	310,00	34,78	10781,80	310,00		310,00	10.781,800		10.781,800	100%
232	CERAMICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EMP	m2	94,00	26,06	2449,64	66,63		66,63	1.736,380		1.736,380	70,88%
	CUBIERTA											
235	CUBIERTA GALVALUMEN E=0.45MM, RECUBRIENTO PINTURA POLIESTER ASTM-653A (COLOR INSTITUCIONAL), INC, PER	m2	486,35	13,92	6769,99	446,90		446,90	6.220,850		6.220,850	91,89%
237	CUMBRERO GALVALUMEN E=0.40 MM A=0.50 M, INC. ACCES. INSTALACION	m	35,50	8,38	297,49	35,20		35,20	294,980		294,980	99,16%
238	CANAL TOL GALV E= 0.70MM, H=30CM, A=40CM DESARR. 122 CM, INC. GANCHOS	m	71,00	21,49	1525,79	70,40		70,40	1.512,900		1.512,900	99,16%
	BAJANTES AGUA LLUVIA											
239	BAJANTES DE AGUA LLUVIA (PVC DIAM. INT=160MM)	m	70,00	9,91	693,70	29,96		29,96	296,900		296,900	42,80%
240	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/CM²0.60 POR 0.60 CON TAPA E= 7CM + 1Ø10MM A 12CM	u	10	90,42	904,20	8,00000		8,00	723,360		723,360	80,00%
242	SUMIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO DIAM. INT.= 200A 160MM PVC Y/O POLIETILENO	u	1,00	20,71	20,71	-		-	-		-	-
	MAMPOSTERÍA											
243	RIOSTRAS DE H.S. F'C=240KG/CM2 INC. ENCOFRADO	m3	8,48	258,83	2194,88	4,42		4,42	1.144,030		1.144,030	52,12%
244	MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO VIBRADO 4MPAE=10 CM	m2	20,00	17,71	354,20	17,58		17,58	311,340		311,340	87,90%
245	MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO VIBRADO 4MPAE=15 CM	m2	490,00	22,90	11221,00	411,38		411,38	9.420,600		9.420,600	83,96%
246	PICADO Y RESANADO DE MAMPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m	120,00	4,63	555,60	-	120,00	120,00	-	555,60	555,600	100%
247	MESON H.A. F'C=180 KG/CM2 E=7 CM HIERRO (LAVAMANOS+MESON)	m	3,50	34,03	119,11	-	3,30	3,30	-	112,30	112,300	94,28%
248	REVESTIMIENTO MESON GRANITO	m	3,50	180,61	632,14	-	4,95	4,95	-	894,02	894,020	141,43%
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES											
249	ENLUCIDO CON IMPERMEABILIZANTE MORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	392,72	10,27	4033,23	251,76		251,76	2.585,580		2.585,580	64,11%
250	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO MORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2	450,00	8,78	3951,00	638,03		638,03	5.601,900		5.601,900	141,78%
251	ENLUCIDO CON MALLA+ IMPERMEABILIZANTE, MORTERO 1:3	m2	25,00	17,03	425,75	-		-	-		-	-
252	EMPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	392,72	5,26	2065,71	251,76		251,76	1.324,260		1.324,260	64,11%
253	EMPASTE VERTICAL (ACRILICO INTERIOR) INC. FILOS	m2	475,00	4,40	2090,00	650,31		650,31	2.861,360		2.861,360	136,91%
254	PINTURA DE CAUCHO SATINADO COLOR (2 MANOS) INTER. <GUIA IMAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	475,00	4,72	2242,00	702,93		702,93	3.317,830		3.317,830	147,99%
255	PINTURA DE CAUCHO SATINADA COLOR(2 MANOS) EXTERIOR (CANASTILLA) <GUÍA IMAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	392,72	5,72	2246,36	332,28		332,28	1.900,640		1.900,640	84,61%
	CARPINTERIA METALICA											
257	VENTANA FIJA TUBO RECT 40X80X2-MALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6MM, INC PINTURA ANTICORROSIVA, A COMPRESOR	m2	39,06	41,3	1613,18	39,06		39,06	1.613,180		1.613,180	100%
258	PORTON TIPO CORREDIZO RETRACTIL TUBO RECT 40X80X2MM-TOOL GALV. 0.6MM	m2	4,40	61,25	269,50	-		-	-		-	-
259	PUERTA METÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2MM , INC. CERRADURA, BISAGRAS Y PINTURA	m2	40,000	142,730	5709,20	-	36,00	36,00	-	5.138,28	5.138,280	90,00%
260	PUERTAS MODULARES, TAMBORADAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE E=1MM AISI 304, INCLUYE ESTRUCTURA Y HER	m2	1,00	172,30	172,30	-	1,00	1,00	-	172,30	172,300	1,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	REVESTIMIENTO DE TUMBADOS											
264	CIELO RASO FALSO - FIBRA MINERAL Y RECUB LÁMINA ALUMINIO 0.60X0.60 BLANCO, TIPO AMSTRONG O SIMILAR	m2	324,75	21,59	7011,35	-		-	-		-	-
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS											
268	INODORO CON FLUXOMETRO LATON CROMADA 1.0 GPF PRIMERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u	1,00	297,96	297,96	1,00		1,00	297,960		297,960	100%
270	LAVABO BLANCO, LLAVE SENSOR MOVIMIENTO (CON ACCESORIOS)	u	2,00	281,39	562,78	2,00		2,00	562,780		562,780	100%
271	DISPENSOR DE PAPEL HIGIENICO DIAM=275MM, ROLLO 70MM, ABATIBLE,ACERO INOX E=8MM, AISI 304, ACABADO S	u	1,00	110,71	110,71	-	1,00	1,00	-	110,71	110,710	100%
272	DISPENSOR DE PAPEL TOALLA 400-600 UNIDADES, 330X273X130MM, ACERO INOX E=8MM AISI 304, ACABADO SATINAD	u	1,00	113,00	113,00	-	1,00	1,00	-	113,00	113,000	100%
273	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOX AISI304, ACABADO SATINADO	u	1,00	91,28	91,28	-	1,00	1,00	-	91,28	91,280	100%
274	ESPEJO DE VIDRIO FLOTADO 4MM- MARCO DE ALUMINIO	m2	2,70	42,86	115,72	-	2,70	2,70	-	115,72	115,720	100%
276	BASURERO CILINDRICO A PEDAL D=250MM H=385 PARA BAÑO ACERO INOX. 304	u	1,00	66,60	66,60	-	1,00	1,00	-	66,60	66,600	100%
277	DUCHAS CON MEZCLADORA (CON ACCESORIOS)	u	1,00	135,94	135,94	-	1,00	1,00	-	135,94	135,940	100%
	10.- SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACIÓN											
	POZOS DE REVISION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS											
305	CAJA REVISION MEDIA TENSION 60X60X75,ACERA, T/HA	u	1,00	179,17	179,17	-		-	-		-	-
306	PUESTA A TIERRA SIMPLE EN POZO ELECTRICO CON SUELDA EXOTERMICA	u	1,0	164,5	164,46	-		-	-		-	-
	INSTALACION LUMINARIAS											
362	CAJETINES METALICOS OCTOGONALES MEDIANOS CON TAPA	u	30,00	5,44	163,20	71,00		71,00	386,240		386,240	236,67%
	INSTALACION LUMINARIAS											
427	TUBERIA EMT 1/2 PULGADA	m	70,00	3,34	233,80	138,97		138,97	464,160		464,160	198,53%
428	UNION EMT 1/2 PULGADA	u	40,00	1,18	47,20	37,00		37,00	43,660		43,660	92,50%
429	CONECTOR EMT 1/2 PULGADA	u	60,00	0,56	33,60	92,00		92,00	51,520		51,520	153,33%
430	FIJACION DE TUBOS EN LOZA CON GRAPA METALICA EMT 1/2 PULGADA	u	30,00	4,87	146,10	61,00		61,00	297,070		297,070	203,33%
431	CAJETINES METALICOS RECTANGULARES PROFUNDOS	u	10,00	1,57	15,70	5,00		5,00	7,850		7,850	50,00%
432	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AMARILLO (INC. TAYPE)	m	70,00	2,28	159,60	122,51		122,51	279,320		279,320	175,01%
433	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	70,00	1,43	100,10	108,32		108,32	154,900		154,900	154,75%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
434	LUMINARIA LED3X18W/120 VOLTIOS	u	30,00	60,59	1817,70	17,00		17,00	1.030,030		1.030,030	56,67%
437	INTERRUPTOR SIMPLE CON TAPA	u	7,00	5,47	38,29	5,00		5,00	27,350		27,350	71,43%
	TOMACORRIENTES GENERALES											
438	TUBERIA EMT 1/2 PULGADA	m	50,00	3,34	167,00	41,91		41,91	139,980		139,980	83,82%
439	UNION EMT 1/2 PULGADA	u	15,00	1,18	17,70	17,00		17,00	20,060		20,060	113,33%
440	CONECTOR EMT 1/2 PULGADA	u	10,00	0,56	5,60	21,00		21,00	11,760		11,760	210%
441	FIJACION DE TUBOS EN LOZA CON GRAPA METALICA EMT 1/2 PULGADA	u	10,00	4,87	48,70	25,00		25,00	121,750		121,750	250,00%
442	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZUL (INC. TAYPE)	m	50,00	1,43	71,50	56,03		56,03	80,120		80,120	112,06%
443	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	50,00	1,43	71,50	56,03		56,03	80,120		80,120	112,06%
444	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	50,00	1,03	51,50	56,03		56,03	57,710		57,710	112,06%
445	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	13,00	7,45	96,85	4,00		4,00	29,800		29,800	30,77%
446	CAJETINES METALICOS RECTANGULARES PROFUNDOS	u	13,00	1,57	20,41	4,00		4,00	6,280		6,280	30,77%
	ALIMENTADORES Y SUBTABLEROS CT-1											
	ALIMENTADOR TPD-STE-ANGAR-A4											
509	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 CU TW (INC. TAYPE)	m	20,00	14,51	290,20	-		-	-		-	-
510	SUBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS ANGAR 4	u	1,00	173,41	173,41	1,00		1,00	173,410		173,410	1,00
	11.- SISTEMA HIDRAULICO SANITARIO Y CONTRAINCENDIOS											
	SITEMA DE AGUA POTABLE A PRESIÓN CONSTANTE											
	TUBERIA PVC AGUA POTABLE											
533	TUBERIA PVC ROSCABLE D=1/2" EN EDIFICACION+PRUEBA	m	12,00	5,86	70,32	-		-	-		-	-
535	TUBERIA PVC ROSCABLE D=1" EN EDIFICACION+PRUEBA	m	45,00	9,78	440,10	-		-	-		-	-
	ACCESORIOS INST. TUB PVC ROSCABLE AGUA POTABLE											
541	ANCLAJES METALICOS PLATINA 2 POR 1/2" (ABRAZADERAS), EN LOSA Y PARED	u	10,00	14,11	141,10	-		-	-		-	-
542	S.I. PUNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGUA POR PUNTO	u	2,00	13,67	27,34	-		-	-		-	-
	EXTINTORES											
565	EXTINTOR POS CAPACIDAD 10 LBS. CON CAJA METALICA	u	1,00	99,84	99,84	-		-	-		-	-
568	EXTINTOR CO2 CAPACIDAD 20 LBS. CON CAJA METALICA	u	1,00	313,27	313,27	-		-	-		-	-
	SISTEMA SANITARIO INTERNO											
	PRELIMINARES Y MOV. TIERRAS											
601	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	2,00	17,93	35,86	-		-	-		-	-
602	RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL (CAPAS 20 CM)	m3	3,00	6,32	18,96	-		-	-		-	-
	INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE											
603	PUNTO DE DESAGUE EN PVC 50 MM	u	3,00	28,80	86,40	-		-	-		-	-
604	PUNTO DE DESAGUE EN PVC 110 MM	u	1,00	34,43	34,43	-		-	-		-	-
605	TUBERÍA PVC 50 MM DE DIÁMETRO (MAT/TRASP/INST)	m	12,0	5,1	61,68	-		-	-		-	
606	TUBERÍA PVC 110 MM DE DIÁMETRO (MAT/TRASP/INST)	m	5,00	8,02	40,10	-		-	-		-	
607	TUBERÍA PVC 160 MM DE DIÁMETRO (MAT/TRASP/INST)	m	18,00	14,52	261,36	-		-	-		-	
608	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/CM²0.60 POR 0.60 CON TAPA E= 7CM + 1Ø10MM A 12CM	u	1	90,42	90,42			-	-		-	
	INSTALACION TUBERIA PVC DEVENTILACIÓN											
609	TUBERIA PVC D=75 MM VENTILACIÓN	m	6,00	4,27	25,62	-		-	-		-	
610	PUNTO DE VENTILACIÓN PVC 75 MM POR PUNTO	u	1,00	15,61	15,61	-		-	-		-	
	13.- SISTEMA ELECTRONICO, VOZ, DATOS, INCENDIOS)											
	CANALIZACION											
714	POZO DE REVISION 60X60X60CM	u	1,0	158,5	158,53	-		-	-		-	
715	BANDEJA TIPO ESCALERILLA 10CMX8CM INCLUYE ACCESORIOS	m	25,0	46,6	1164,25	-		-	-		-	
717	TUBERIA PVC REFORZADA 4"	m	15,00	20,27	304,05	-		-	-		-	
719	TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4" DE DIÁMETRO INCLUIDO ACCESORIOS	m	40,00	16,51	660,40	-		-	-		-	
	SISTEMA DE INCENDIO											
766	ESTACION MANUAL DE ALARMA DE EMERGENCIA	u	1,00	93,78	93,78	-		-	-		-	
767	LUZ ESTROBOSCOPICA	u	1,00	133,78	133,78	-		-	-		-	
768	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE	u	3,00	91,90	275,70	-		-	-		-	
769	DETECTOR TERMICO DIRECCIONABLE	u	3,00	91,90	275,70	-		-	-		-	
770	PUNTO DE ALARMAS DE INCENDIO	u	8,00	73,78	590,24	-		-	-		-	
776	LAMPARAS DE AVISO DE SALIDA	u	1,00	45,78	45,78	-		-	-		-	
778	SEÑALETICA INCENDIOS	u	1,00	26,35	26,35	-		-	-		-	
	NAVE DE RESGUARDO											

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	ACERO ESTRUCTURAL											
1	PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A (36, 572, 325,193,108) (PROY. MONTAJE GRUA)	Kg	94474,86	2,76	260750,61	94.474,86		94.474,86	260.750,610		260.750,610	100%
2	TRATAMIENTO PINTURA ESTRUCTURA ACERO A36 (FONDO+PINTURA ANTICORROSIVA), A COMPRESOR	Kg	94474,86	0,11	10392,23	94.474,86		94.474,86	10.392,230		10.392,230	100%
	CONTRAPISOS											
3	JUNTA ASERRADA DILATACION PISO (INC. CORDON, Y SELLO)	m	857,00	2,59	2219,63	581,30		581,30	1.505,570		1.505,570	67,83%
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS											
4	MASILLADO DE PISOS, ENDURECEDOR DE CUARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5MM)	m2	1445,85	5,62	8125,68	1.442,94		1.442,94	8.109,320		8.109,320	100%
	CUBIERTA											
5	CUBIERTA GALVALUMEN E=0.45MM, RECUBRIENTO PINTURA POLIESTER ASTM-653A (COLOR INSTITUCIONAL), INC, PER	m2	1660,00	13,92	23107,20	1.681,75		1.681,75	23.409,960		23.409,960	101%
6	CUBIERTA POLICARBONATO E=0.80 MM, COLOR BRONCE O SIMILAR, INC. ACCESORIOS INSTALCION	m2	190,00	14,34	2724,60	94,85		94,85	1.360,150		1.360,150	49,92%
7	CUMBRERO GALVALUMEN E=0.40 MM A=0.50 M, INC. ACCES. INSTALACION	m	43,25	8,38	362,44	43,50		43,50	364,540		364,540	101%
8	CANAL TOL GALV E= 0.70MM, H=30CM, A=40CM DESARR. 122 CM, INC. GANCHOS	m	86,50	21,49	1858,89	87,00		87,00	1.869,640		1.869,640	101%
	CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS											
RN-1	GROUTING DE NIVELACIÓN	M3	3,35	$ 1.634,03	$ 5.474,00	3,85		3,85	6.291,020		6.291,020	115%
RN-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE ASTM 193 B7	U	1416,00	$ 49,44	$ 70.007,04	1.804,00		1.804,00	89.189,760		89.189,760	127%
RN-3	BORDILLO DE H.S 180 KG/CM2 TIPO CUNETA	ML	2261,84	$ 23,58	$ 53.334,19	1.294,71		1.294,71	30.529,260		30.529,260	57,24%
RN-4	ACERAS DE H.S. F'C=180KG/CM2 E=7CM, ESCOBILLADA.	M2	3878,20	$ 18,85	$ 73.104,07	2.616,27	171,97	2.788,24	49.316,690	3.241,63	52.558,320	71,90%
RN-5	ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACIÓN	L	19492,62	$ 0,85	$ 16.568,73	-		-	-		-	
RN-6	CAPA DE RODADURA HORMIGÓN ASFÁLTICO MEZCLADO EN PLANTA, E=3".	M2	12995,08	$ 12,53	$ 162.828,35	-		-	-		-	
RN-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO DE 500KG EN PUERTA DE INGRESO DE CERRAMIENTO	U	4,00	$ 1.081,08	$ 4.324,32	-	4,00	4,00	-	4.324,32	4.324,320	100,00%
RN-8	PINTURA DE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN EN PARQUEADEROS Y PASOS PEATONALES	ML	669,42	$ 0,62	$ 415,04	-		-	-		-	
RN-9	TOPES PARA ESTACIONAMIENTO H.S = 180 KG/CM2 . INCLUYE PINTURA REFLECTIVA	U	88,00	$ 12,91	$ 1.136,08	-	88,00	88,00	-	1.136,08	1.136,080	100%
RN-10	JARDINERAS DE H.S= 180KG/CM2	ML	26,00	$ 15,02	$ 390,52	-		-	-		-	
RN-11	PLANTAS ORNAMENTALES	ML	26,00	$ 10,99	$ 285,74	-	534,20	534,20	-	5.870,86	5.870,860	2055%
RN-12	PALMERAS BOTELLAS ENANAS	U	7,00	$ 34,74	$ 243,18	-	7,00	7,00	-	243,18	243,180	100%
RN-13	TAPAJUNTA DE ALUMINIO PISO-PISO A= 15CM	ML	35,00	$ 16,25	$ 568,75	-		-	-		-	
RN-14	TAPAJUNTA DE ALUMINIO PISO-PARED A= 15CM EN INTERIORES	ML	65,00	$ 16,90	$ 1.098,50	-		-	-		-	
RN-15	TAPAJUNTA EXTERIOR TOOL GALVANIZADO	ML	40,00	$ 14,53	$ 581,20	-		-	-		-	
RN-16	TAPAJUNTA DE HORMIGÓN LOSA-LOSA	ML	56,00	$ 42,28	$ 2.367,68	39,55		39,55	1.672,170		1.672,170	71%
RN-17	DUCHA ELÉCTRICA 110 V	U	7,00	$ 29,03	$ 203,21	-	7,00	7,00	-	203,21	203,210	100%
RN-18	LLAVE DE DUCHA	U	7,00	$ 20,90	$ 146,30	-	7,00	7,00	-	146,30	146,300	100%
RN-19	REJILLAS DE PISO 50 MM	U	42,00	$ 4,84	$ 203,28	-	75,00	75,00	-	363,00	363,000	179%
RN-20	SUMIDERO DE CUBIERTA DE 110MM INCLUYE REJILLA TIPO CÚPULA	U	20,00	$ 51,11	$ 1.022,20	17,00	4,00	21,00	868,870	204,44	1.073,310	105,00%
RN-21	BORDILLO PARA TINETA DE BAÑO REVESTIDA CON CERÁMICA (0,10MX0,15M)	ML	6,00	$ 16,50	$ 99,00	-	6,80	6,80	-	112,20	112,200	113,33%
RN-22	MUEBLES AÉREOS DE MDF PARA COCINA	ML	7,00	$ 180,68	$ 1.264,76	-		-	-		-	
RN-23	MUEBLES BAJOS DE MDF PARA COCINA	ML	7,00	$ 180,68	$ 1.264,76	-		-	-		-	
RN-24	HORMIGÓN PREMEZCLADO PARA LOSA DE PISO F'C=280 KG/CM2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	M3	1204,92	$ 209,28	$ 252.165,66	1.431,02		1.431,02	299.483,870		299.483,870	118,76%
RN-25	FILOS INTERIORES Y EXTERIORES	ML	830,00	$ 3,76	$ 3.120,80	831,15		831,15	3.125,120		3.125,120	100,14%
RN-26	ENLUCIDO MEDIAS CAÑAS	ML	960,00	$ 2,28	$ 2.188,80	893,92		893,92	2.038,140		2.038,140	93,12%
RN-27	CUADRADA DE BOQUETES PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	1150,00	$ 4,64	$ 5.336,00	1.024,34		1.024,34	4.752,940		4.752,940	89,07%
RN-28	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON POLIESTIRENO EXPANDIDO 50 MM	M2	530,00	$ 5,64	$ 2.989,20	-		-	-		-	
RN-29	JUNTA DE DILATACIÓN TIPO LLAVE - LOSAS DE PISOS	ML	3200,00	$ 2,36	$ 7.552,00	2.873,65		2.873,65	6.781,810		6.781,810	89,80%
RN-30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS EXPANSIVOS 5/8 -6" PARA ANCLAJE DE PLACAS	U	30,00	$ 4,27	$ 128,10	-		-	-		-	
RN-31	CHICOTE D=12MM PARA ARRIOSTRAMIENTO DE MAMPOSTERÍA	U	1750,00	$ 1,55	$ 2.712,50	828,00		828,00	1.283,400		1.283,400	47,31%
RN-32	CAJA DE PASO H.S. F'C=180KG/Cm² 0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	U	10,00	$ 52,94	$ 529,40	10,00		10,00	529,400		529,400	100,00%
	ELÉCTRICOS											
RN-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR DE MEDICIÓN - TRAFOMIX	U	1,00	$ 9.602,82	$ 9.602,82	1,00		1,00	9.602,820		9.602,820	100%
RN-34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO METÁLICO PARA DOS CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN	U	4,00	$ 487,88	$ 1.951,52	4,00		4,00	1.951,520		1.951,520	100%
RN-35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO METÁLICO PARA UN CIRCUITO DE ILUMINACIÓN	U	2,00	$ 396,56	$ 793,12	3,00		3,00	1.189,680		1.189,680	150%
RN-36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL TDP100KVA	U	1,00	$ 5.982,02	$ 5.982,02	1,00		1,00	5.982,020		5.982,020	100%
RN-37	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL TDP 50KVA	U	2,00	$ 2.431,38	$ 4.862,76	2,00		2,00	4.862,760		4.862,760	100%
RN-38	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE DE HA DE 12MTS 500KG	U	7,00	495,52	$ 3.468,64	7,00		7,00	3.468,640		3.468,640	100%
RN-39	TENDIDO DE CONDUCTOR AL DESNUDO ACSR# 1/0 AWG	M	500,00	$ 2,69	$ 1.345,00	522,30		522,30	1.404,990		1.404,990	104%
RN-40	TENDIDO DE CONDUCTOR AL DESNUDO ACSR# 2 AWG	M	160,00	$ 2,33	$ 372,80	174,10		174,10	405,650		405,650	109%
RN-41	TENDIDO DE CONDUCTOR PREEMSAMBLADO AL AISLADO 2x1/0+1/0 AWG	M	150,00	$ 6,37	$ 955,50	154,60		154,60	984,800		984,800	103%
RN-42	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SUJECCION PARA EL NEUTRO	U	8,00	$ 22,13	$ 177,04	8,00		8,00	177,040		177,040	100%
RN-43	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3F CENTRADA PASANTE 13.8KV - 3CPT	U	3,00	$ 187,73	$ 563,19	3,00		3,00	563,190		563,190	100%
RN-44	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3F CENTRADA DOBLE RETENCION 13.8KV - 3CDT	U	1,00	$ 431,15	$ 431,15	1,00		1,00	431,150		431,150	100%
RN-45	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3F CENTRADA RETENCION O TERMINAL 13.8KV - 3CRT	U	4,00	$ 287,70	$ 1.150,80	4,00		4,00	1.150,800		1.150,800	100%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
RN-46	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	U	3,00	$ 31,54	$ 94,62	3,00		3,00	94,620		94,620	100%
RN-47	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	U	4,00	$ 40,08	$ 160,32	4,00		4,00	160,320		160,320	100%
RN-48	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR DOBLE A TIERRA - TTD	U	4,00	$ 116,68	$ 466,72	4,00		4,00	466,720		466,720	100%
RN-49	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION AEREO - SUBTERRANEO PARA BAJO VOLTAJE	U	2,00	$ 243,82	$ 487,64	3,00		3,00	731,460		731,460	150%
RN-50	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED 200W, CON FOTOCELULA, EN POSTE CON RED PREENSABLADA	U	7,00	$ 637,26	$ 4.460,82	7,00		7,00	4.460,820		4.460,820	100%
RN-51	CAJA REVISIÓN MEDIA TENSIÓN 90X90X90 C/VIA, CON TAPA DE HIERRO NODULAR 125 KN	U	20,00	$ 318,78	$ 6.375,60	18,00		18,00	5.738,040		5.738,040	90,00%
RN-52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO DE CONDENSADORES AUTOMATICO DE 60KVAR, 3F, 230V	U	1,00	$ 10.209,14	$ 10.209,14	1,00		1,00	10.209,140		10.209,140	100%
RN-53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO DE CONDENSADORES AUTOMATICO DE 30KVAR, 3F, 230V	U	1,00	$ 7.969,49	$ 7.969,49	1,00		1,00	7.969,490		7.969,490	100%
	CLIMATIZACIÓN											
RN-54	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE PARED INVERTER CAPACIDAD DE 18.000 BTU/H , INCLUYE COMPRESOR.	U	2,00	$ 1.728,67	$ 3.457,34	2,00		2,00	3.457,340		3.457,340	100%
RN-55	EXTRACTOR DE OLORES EN BAÑOS 6"X6"	U	20,00	$ 42,70	$ 854,00	18,00		18,00	768,600		768,600	90,00%
	PAREDES INDUSTRIALES											
RN-56	PAREDES DE GALVALUMEN E=0.45mm, RECUBRIMIENTO PINTURA POLIESTER ASTm-653A (COLOR INSTITUCIONAL).	M2	1849,90	$ 16,19	$ 29.949,88	3.091,84	194,10	3.285,94	50.056,890	3.142,48	53.199,370	177,63%
RN-57	CERRAMIENTO TUBO H.G. 2"-MALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6mm, INC. PINTURA A COMPRESOR	M2	1054,50	$ 22,99	$ 24.242,96	898,96	143,51	1.042,47	20.667,090	3.299,29	23.966,380	98,86%
RN-58	CERRAMIENTO VERJA DE TUBO HG 2" Y TUBO RECT 80X40X2, INC. PINTURA COMPRESOR	M2	400,00	$ 60,18	$ 24.072,00	223,20	92,88	316,08	13.432,180	5.589,52	19.021,700	79,02%
RN-59	RECUBRIMIENTO ALUMINIO COLOR CYAN O SIMILAR, ALUCUBOND 4mm INC. ESTRUCT. E INST<GUIA IMAGEN CORPORATI	M2	1315,00	$ 67,32	$ 88.525,80	800,87	176,53	977,40	53.914,570	11.884,00	65.798,570	74,33%
	MONTO TOTAL				9.622.634,22				8.955.563,63	190.933,64	9.146.497,27	95,05%

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	9-may.-19		
FIN PLAZO CONTRACTUAL	8-may.-20		
SUSPENSION DIAS	60	DIAS	
SUSPENSION DIAS	11	DIAS	
AMPLIACIÓN POR PANDEMIA	90	DIAS	
AMPLIACIÓN POR CLIMA-REDISEÑO-% POR COVID	128	DIAS	
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN	21-feb.-21		
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO MODIFICATORIO COMPLEMENTARIO	19-oct.-21		
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	5-jul.-21		
FECHA DE APROBACIÓN	13-jul.-21		

VALOR PLANILLADO AVANCE DE OBRA	8.955.563,63	190.933,64	9.146.497,27
AMPLAICIÓN DIAS 128 DIAS			
TOTAL PLANILLADO	8.955.563,63	190.933,64	9.146.497,27

DESCUENTOS Y RETENCIONES			
ANTICIPO : 40%	3.582.225,45	76.373,46	3.658.598,91
OTROS:			
TOTAL DE DESCUENTOS:	3.582.225,45	76.373,46	3.658.598,91
VALOR LIQUIDO ESTA PLANILLA :	5.373.338,18	114.560,18	5.487.898,36

Firmado electrónicamente por:
PEDRO ELICIO RAMOS IDROVO

ING. PEDRO RAMOS IDROVO
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA LEON BURGOS

CAROLINA LEON BURGOS
FISCALIZACIÓN

FATIMA
CONSORCIO

PLANILLA Nº 23

Avance de obra

1-Junio-2021 al 30-Junio-2021

PLANILLA DE OBRA

100%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23(100%)

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	PRIMERA ETAPA											
	1.- VIAS Y PARQUEADEROS						VP					
	PRELIMINARES											
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE C. RODADuRA	km	1,08	494,59	534,15720	1,08		1,08	534,16		534,160	100,00%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)	m3	12.779,98	0,82	10.479,58360	12.779,98		12.779,98	10.479,58		10.479,58	100,00%
3	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRuCTuRAS mENORES	m3	86,00	4,69	403,34000	-		-			-	
4	TuBERÍA DE ACERO CORRuGADO D= 1,20 m ,E=2.5 mm, mP-100	m	18,00	239,45	4.310,10000	18,00		18,00	4.310,10		4.310,100	100%
5	muRO DE H.S. F'C=180KG./Cm2 TIPO B(CABEZALES)	m3	22,00	188,41	4.145,02000	22,00		22,00	4.145,02		4.145,020	100%
	MATERIAL PETREO											
6	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)	m3	51.821,91	2,92	151.319,97720	43.597,97	1.911,56	45.509,53	127.306,06	5.581,76	132.887,820	87,82%
7	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3	m3	2.589,98	10,78	27.919,98440	2.589,98		2.589,98	27.919,98		27.919,980	100,00%
8	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS	m3	1.942,49	17,21	33.430,25290	1.942,49		1.942,49	33.430,25		33.430,250	100,00%
9	TRANSPORTE mATERIAL PETREODE mEJORAmIENTO	m3-km	937.976,72	0,28	262.633,48104	741.378,36	34.599,31	775.977,67	207.585,94	9.687,81	217.273,750	82,73%
10	TRANSPORTE DE mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3	m3-km	117.701,06	0,28	32.956,29680	46.619,64	6.189,55	52.809,19	13.053,50	1.733,07	14.786,570	44,87%
11	TRANSPORTE DE mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS	m3-km	34.964,82	0,28	9.790,14960	34.964,82		34.964,82	9.790,15		9.790,150	100,00%
	CAPA DE RODADURA											
	AMBIENTALES											
12	SEÑALES INFORmATIVAS (2.40X1.20)m	u	2,00	250,92	501,84000	2,00		2,00	501,84		501,840	100,00%
13	SEÑALES REGLAmENTARIAS (0.75 X 0.75)m	u	2,00	115,45	230,90000	2,00		2,00	230,90		230,900	100,00%
14	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)m	u	2,00	115,45	230,90000	2,00		2,00	230,90		230,900	100,00%
	CONSOLIDACION DE PLATAFORMAS						CP					
15	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)	m3	43.057,34	2,92	125.727,44448	43.057,34		43.057,34	125.727,44		125.727,440	100,00%
16	TRANSPORTE mATERIAL PETREODE mEJORAmIENTO	m3-km	779.043,38	0,28	218.132,14640	779.043,38		779.043,38	218.132,15		218.132,150	100,00%
17	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)	m3	69.683,19	0,82	57.140,21170	69.683,18		69.683,18	57.140,21		57.140,210	100,00%
	2.- ESTABILIZACIÓN TALUDES						ET					
	PRELIMINARES											
18	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	4.030,36	1,14	4.594,60470	-	4.030,36	4.030,36		4.594,61	4.594,610	100,00
19	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	4.613,56	1,46	6.735,79030	2.109,52	1.292,01	3.401,53	3.079,90	1.886,33	4.966,230	73,73%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
20	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA) ESTRuCTuRAS	m3	9.606,48	4,18	40.155,08640	5.718,04	48,28	5.766,32	23.901,41	201,81	24.103,220	60,03%
21	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	205,06	17,93	3.676,72580	54,89		54,89	984,18		984,180	26,77%
22	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3		13,72		-		-			-	
23	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	85.716,60	2,82	241.720,79875	85.716,60		85.716,60	241.720,80		241.720,800	100%
	SISTEMA DE DRENAJE PLATAFORMA						SD					
24	RASANTEO mANuAL DE ZANJAS	m3		3,22		-		-			-	
25	SumINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL PARA SuBDREN (TIPO NT 2400 O SImILAR)	m2	1.498,63	3,06	4.585,80780	1.469,00		1.469,00	4.495,14		4.495,140	98,02
26	SumINISTRO Y COLOCACIÓN DE mATERIAL FILTRANTE A mAQuINA (PIEDRA BOLA mAX =2")	m3	524,58	15,19	7.968,37020	457,77		457,77	6.953,53		6.953,530	87,26
27	SumINISTRO Y COLOCACIÓN mANuAL DEmATERIAL FILTRANTEPARA DRENES 1 PuLG	m3	279,52	20,70	5.786,06400	212,86		212,86	4.406,21		4.406,210	76,15
28	SumINISTRO Y COLOCACIÓN DE TuBERIAP.V.C.DIAm. INT.=160mm, PERFORADA	m		14,38		-		-			-	
29	Sum.Y COLOCACIÓN TuBERIA PVC. CORRuGADA DIAm INT.=160mm S5	m		9,80		-		-			-	
30	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT. 220 mm S5	m		14,68		-		-			-	
31	Sum.Y COLOCACIÓN TuBERIA PVC. CORRuGADA DIAm. INT.=315mm S5	m		20,16		-		-			-	
32	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 315A 160mm PVC Y/O POLIETILENO	u		24,07		-		-			-	
33	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 220A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u		21,28		-		-			-	
	SISTEMA TIERRA ARMADA											
34	GEOTEXTIL TEJIDO- 2400 T PARA muRO DE CONTENCION TIERRA ARmADA	m2	21.276,67	3,06	65.106,59490	21.276,67		21.276,67	65.106,59		65.106,590	100,00
35	GEOmALLA BX-1100 TENSAR	m2	7.927,94	3,19	25.290,11265	7.927,94		7.927,94	25.290,12		25.290,120	100,00
36	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	4.074,59	17,33	70.612,64470	3.860,48		3.860,48	66.902,12		66.902,120	94,75

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23(100%)

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
37	muRO DE GAVIONES TRIPLE TORSION	m3	3.632,00	60,08	218.210,56000	2.866,00		2.866,00	172.189,28		172.189,280	78,91
	3.- REDES DE+E59:E141 ALCANTARILLADO SA+E59:E141NITARIO, PLUVIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS						RA					
	ALCANTARILLADO SANITARIO											
	PRELIMINARES											
38	REPLANTEO Y NIVELACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	m	490,58	1,81	887,94980	490,58		490,58	887,95		887,950	100,00
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
39	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-			-	
40	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	3.460,00	4,18	14.462,80000	3.631,00		3.631,00	15.177,58		15.177,580	104,94%
41	ENTIBADO DE ZANJA	m2	160,00	11,56	1.849,60000	-	160,00	160,00		1.849,60	1.849,600	100,00
42	RAZANTEO DE ZANJA E= 0.20m	m2	240,00	3,22	772,80000	-	240,00	240,00		772,80	772,800	100,00
43	ARENA DE KILO, TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	320,00	18,13	5.801,60000	320,00		320,00	5.801,60		5.801,600	100,00%
44	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	1.800,00	13,72	24.696,00000	1.800,00		1.800,00	24.696,00		24.696,000	100,00%
45	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	900,00	6,32	5.688,00000	900,00		900,00	5.688,00		5.688,000	100%
46	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	1.440,00	2,82	4.060,80000	1.440,00		1.440,00	4.060,80		4.060,800	100,00%
	TUBERIAS PVC ALCANTARILLADO											
47	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=160 mm S6	m	89,12	9,70	864,46400	89,12		89,12	864,46		864,460	100,00
48	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT = 200 mm S6	m	450,00	15,28	6.876,00000	450,00		450,00	6.876,00		6.876,000	100,00
49	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 300 mm S5	m	50,00	20,22	1.011,00000	50,00		50,00	1.011,00		1.011,000	100,00%
50	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=364 mm S6	m		23,27		-		-			-	
51	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 450 mm S5	m	20,00	44,36	887,20000	-		-			-	
52	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 220A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u	2,00	21,28	42,56000	-		-			-	
53	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 335A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u		24,14		-		-			-	
	POZOS Y CAJAS											
54	HORmIGON SImPLE EN POZOS F'C=180KG/Cm2-mEZCLA A mANO	m3	30,00	177,00	5.310,00000	30,00		30,00	5.310,00		5.310,000	100,00%
55	ENCOFRADO mETALICO PARA POZOS DE REVISION	m3	30,00	20,36	610,80000	30,00		30,00	610,80		610,800	100,00%
56	SumINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS Y CERCOS H.F-210LB	u	12,00	178,06	2.136,72000	12,00		12,00	2.136,72		2.136,720	100,00%
57	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	7,00	90,42	632,94000	-		-			-	
	ALCANTARILLADO PLUVIAL											
	PRELIMINARES											
58	REPLANTEO Y NIVELACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	m	1.378,44	1,81	2.494,97640	1.378,44		1.378,44	2.494,98		2.494,980	100%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
59	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-			-	
60	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	9.280,92	4,18	38.794,26389	5.308,06		5.308,06	22.187,69		22.187,690	57,19%
61	ENTIBADO DE ZANJA	m2	308,42	11,56	3.565,33520	58,42	250,00	308,42	675,34	2.890,00	3.565,340	100,00
62	RAZANTEO DE ZANJA E= 0.20m	m2	849,00	3,22	2.733,78000	-	849,00	849,00		2.733,78	2.733,780	100,00
63	ARENA DE KILO, TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	245,00	18,13	4.441,85000	245,00		245,00	4.441,85		4.441,850	100,00%
64	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	5.196,31	13,72	71.293,38000	2.777,42		2.777,42	38.106,20		38.106,200	53,45%
65	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	2.130,00	6,32	13.461,60000	-		-			-	
66	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	2.144,69	2,82	6.048,01885	2.144,69		2.144,69	6.048,02		6.048,020	100,00%
	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO PLUVIAL											
67	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 250 mm S5	m	608,56	16,51	10.047,32560	425,52		425,52	7.025,34		7.025,340	69,92%
68	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 300 mm S5	m	140,00	20,22	2.830,80000	134,29		134,29	2.715,34		2.715,340	95,92%
69	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=364 mm S6	m	50,00	23,27	1.163,50000	50,00		50,00	1.163,50		1.163,500	100,00%
70	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 450 mm S5	m	12,00	44,36	532,32000	-		-			-	
71	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 600 mm S5	m	878,35	107,84	94.721,26400	605,84		605,84	65.333,79		65.333,790	68,97
	POZOS Y CAJAS											
72	HORmIGON SImPLE EN POZOS F'C=180KG/Cm2-mEZCLA A mANO	m3	56,00	177,00	9.912,00000	56,00		56,00	9.912,00		9.912,000	100,00
73	ENCOFRADO mETALICO PARA POZOS DE REVISION	m3	56,00	20,36	1.140,16000	56,00		56,00	1.140,16		1.140,160	100,00
74	SumINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS Y CERCOS H.F-210LB	u	24,00	178,06	4.273,44000	24,00		24,00	4.273,44		4.273,440	100%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23(100%)

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
75	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	22,00	90,42	1.989,24000	-		-			-	
76	CAJA DE H.S. PARA REJILLA mETÁLICA 0.40 por 1.00 por 1.00 (F'C= 180 KG/Cm2)	u	40,00	95,58	3.823,20000	24,00		24,00	2.293,92		2.293,920	60,00%
77	SumINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA H.F. (1.00 por 0.40 por 0.05)110 KG	u	40,00	130,84	5.233,60000	27,00		27,00	3.532,68		3.532,680	67,50%
	FOSA SEPTICA, FILTRO ANAEROBICO Y SECADO DE LODOS											
	PRELIMINARES											
78	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1,14		-		-			-	
79	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	63,51	1,46	92,72460	63,51		63,51	92,72		92,720	100,00%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
80	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-			-	
81	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	211,71	4,18	884,93651	211,71		211,71	884,94		884,940	100,00%
82	ENTIBADO DE ZANJA	m2		11,56		-		-			-	
83	RAZANTEO DE ZANJA E= 0.20m	m2		3,22		-		-			-	
84	ARENA DE KILO, TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3		18,13		-		-			-	
85	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	118,67	13,72	1.628,15240	-		-			-	
86	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	20,00	6,32	126,40000	-		-			-	
	TUBERIAS PVC ALCANTARILLADO											
87	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT = 200 mm S6	m	26,50	15,28	404,92000	26,50		26,50	404,92		404,920	100%
	HORMIGONES											
88	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	3,41	163,18	556,68857	3,41		3,41	556,69		556,690	100,00%
89	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	31,11	249,88	7.773,10602	30,66		30,66	7.661,32		7.661,320	98,56%
90	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F´C=180 KG/Cm2-50por cientoP)Clm	m3		169,86		-		-			-	
	ACERO ESTRUCTURAL											
91	ACERO DE REFuERZO F"Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	3.652,36	1,68	6.135,96542	3.652,36		3.652,36	6.135,96		6.135,960	100,00
92	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	100,00	2,76	276,00000	-		-			-	
93	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	100,00	0,11	11,00000	-		-			-	
	CERRAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO											
94	CERRAmIENTO DE ALAmBRE DE PÚAS-6 HILOS	m	60,00	2,14	128,40000	-		-			-	
95	PuERTA DE mALLA + TuBO ISO II 2"	m2	4,00	59,32	237,28000	4,00		4,00	237,28		237,280	100,00%
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES											
96	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	298,58	10,27	3.066,41660	135,74		135,74	1.394,05		1.394,050	45,46%
97	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	30,00	4,72	141,60000	30,00		30,00	141,60		141,600	100,00%
	PIEZAS SANITARIAS											
98	ACCESORIOS PLANTA DE TRATAmIENTO (Global)	u	1,00	5.101,40	5.101,40000	1,00		1,00	5.101,40		5.101,400	100,00%
99	FILTRO DE GRAVA CALSIFICADA DE 2 1/2" A 1/2"	m3	9,00	28,28	254,52000	2,64		2,64	74,66		74,660	29,33%
100	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u	9,00	75,58	680,22000	7,00		7,00	529,06		529,060	77,78%
	4.- NAVE PRINCIPAL- TALLERES-ADMINISTRATIVO-BODEGA GENERAL						NP					
	PRELIMINARES											
101	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	12.327,08	1,14	14.052,87120	12.327,08		12.327,08	14.052,87		14.052,870	100,00
102	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	7.949,46	1,46	11.606,21160	7.949,46		7.949,46	11.606,21		11.606,210	100,00
103	ACOmETIDA E INST. DE AGuA POTABLE PROVISIONAL PVC 3/4"	m	90,00	8,44	759,60000	90,00		90,00	759,60		759,600	100%
104	ACOmETIDA E INST. ELÉCTRICA PROV. TuBERÍA CONDuIT 1" CABLENo.8	m	90,00	27,58	2.482,20000	90,00		90,00	2.482,20		2.482,200	100,00
105	SONDEOS DE SuELOS (COmPROBACION IN SITu) NEC-15	m	68,00	55,43	3.769,24000	68,00		68,00	3.769,24		3.769,240	100,00
106	CERRAmIENTO PROVISIONAL LISTONES + PLANCHAS DE ZINC	m2	1.018,35	11,69	11.904,51150	1.018,35		1.018,35	11.904,51		11.904,510	100,00
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
107	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	7.030,26	4,18	29.386,48680	7.030,26		7.030,26	29.386,49		29.386,490	100,00
108	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-			-	
109	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	4.011,39	17,33	69.517,38870	4.011,39		4.011,39	69.517,39		69.517,390	100,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23(100%)

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
110	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	2.274,76	13,72	31.209,70720	2.274,76		2.274,76	31.209,71		31.209,710	100,00
111	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	7.030,26	2,82	19.825,33320	7.030,26		7.030,26	19.825,33		19.825,330	100,00
	HORMIGONES											
112	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	196,42	163,18	32.051,81560	196,42		196,42	32.051,82		32.051,820	100,00
113	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF'C = 280KG./Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	1.088,67	225,97	246.006,75990	1.088,67		1.088,67	246.006,76		246.006,760	100,00
114	HORMIGON PREMEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/CM2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	282,96	283,42	80.196,52320	282,96		282,96	80.196,52		80.196,520	100,00
115	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	337,45	289,16	97.577,04200	337,45		337,45	97.577,04		97.577,040	100,00
116	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F'C=180 KG/Cm2-50por cientoP)CIm	m3	650,01	169,86	110.410,69860	650,01		650,01	110.410,70		110.410,700	100,00
117	HORMIGON PREMEZCLADO LOSAS VIGAS F'C=280 KG/CM2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	m3	200,00	193,75	38.750,00000	200,00		200,00	38.750,00		38.750,000	100,00
	ACERO ESTRUCTURAL											
118	ACERO DE REFuERZO FY= 4200 Kg/Cm2	Kg	188.476,09	1,68	316.639,83120	188.476,09		188.476,09	316.639,83		316.639,830	100,00
119	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	517.607,93	2,76	1.428.597,87576	517.607,93		517.607,93	1.428.597,89		1.428.597,890	100,00
120	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	499.962,86	0,11	54.995,91416	316.476,38	155.842,33	472.318,71	34.812,40	17.142,66	51.955,060	94,47
121	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2	14.243,58	4,84	68.938,91268	13.519,61	50,85	13.570,46	65.434,93	246,11	65.681,040	95,27
122	DECK E=0.75mm PLACA COLABORANTE-mD2-GA-101m	m2	2.520,48	18,37	46.301,21760	2.520,48		2.520,48	46.301,22		46.301,220	100,00
	CONTRAPISOS											
123	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3 (CONTRAPISO E=20Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	1.043,38	10,78	11.247,63640	1.043,38		1.043,38	11.247,64		11.247,640	100,00
124	mATERIAL DE BASE CLASE 2 (CONTRAPISO E=15Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	1.301,40	24,55	31.949,37000	778,38		778,38	19.109,23		19.109,230	59,81
125	CONTRAPISO HORm.S. PREmEZ. F'C=280KG/Cm2 E= 4 PuLG. (SIN BASE)	m2	1.710,63	21,50	36.778,54500	1.344,11		1.344,11	28.898,26		28.898,260	78,57
126	JuNTA ASERRADA DILATACION PISO (INC. CORDON, Y SELLO)	m	4.784,70	2,59	12.392,37300	2.292,35		2.292,35	5.937,19		5.937,190	47,91%
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS											
127	mASILLADO DE PISOS, ENDuRECEDOR DE CuARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5mm)	m2	5.101,87	5,62	28.672,50940	4.479,16		4.479,16	25.172,88		25.172,880	87,79%
128	PINTuRA EPOXICA PISO INDuSTRIAL 3mm (2 COmPONENTES)	m2	5.101,87	34,78	177.443,03860	2.125,62	163,96	2.289,58	73.929,06	5.702,53	79.631,590	44,88%
129	PISO PORCELANATO RECTIF. COLOR (0.50X0.50- u OTROS) INSTAL. EmPO	m2	1.910,00	40,31	76.992,10000	1.910,00		1.910,00	76.992,09		76.992,090	100,00%
130	PISO GRADAS PORCELANATO PIZARRA COLOR (0.32X0.32-O SImILAR) INSTAL. EmPO.	m2	90,00	32,72	2.944,80000	20,31		20,31	664,54		664,540	22,57%
131	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	761,35	26,06	19.840,78100	761,35		761,35	19.840,78		19.840,780	100,00%
132	BARREDERA PORCELANATO COLOR RECTIFICADA A=10Cm	m	997,67	7,70	7.682,05900	997,67		997,67	7.682,06		7.682,060	100,00%
133	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISOS Y FILOS DE GRADA	m	150,00	2,98	447,00000	32,53		32,53	96,94		96,940	21,69%
134	CENEFA ACANALADA ANTILESLIZANTE FILOS GRADA A=10Cm	m	120,00	38,56	4.627,20000	-		-			-	
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS											
135	mASILLADO E ImPERmEABILIZADO DE PISOS-LOSAS, mORTERO CEmENTO-ARENA 1:3 +(PEGANTE + ImPERm.) LOSAS EXT	m2	1.380,00	10,40	14.352,00000	1.380,00		1.380,00	14.352,00		14.352,000	100,00
136	ImPERmEABILIZACION LOSA DE CuBIERTA ImPRImANTE ASFALTICO SOLuBLE AL AGuA	m2	1.650,00	2,84	4.686,00000	1.606,65		1.606,65	4.562,90		4.562,900	97,37%
137	ImPERmEABILIZACIONLOSA DE CuBIERTA LAmINAS ASFALTICAS	m2	1.650,00	13,85	22.852,50000	1.606,65		1.606,65	22.252,14		22.252,140	97,37%
	CUBIERTA											
138	CuBIERTA GALVALumEN E=0.45mm, RECuBRIENTO PINTuRA POLIESTER ASTm-653A (COLOR INSTITuCIONAL), INC, PER	m2	4.875,00	13,92	67.860,00000	4.875,00		4.875,00	67.860,00		67.860,000	100,00%
139	CuBIERTA POLICARBONATO E=0.80 mm, COLOR BRONCE O SImILAR, INC. ACCESORIOS INSTALCION	m2	946,45	14,34	13.572,09300	410,43		410,43	5.885,57		5.885,570	43,37%
140	CumBRERO GALVALumEN E=0.40 mm A=0.50 m, INC. ACCES. INSTALACION	m	92,00	8,38	770,96000	91,30		91,30	765,09		765,090	99,24%
141	CANAL TOL GALV E= 0.70mm, H=30Cm, A=40Cm DESARR. 122 Cm, INC. GANCHOS	m	259,00	21,49	5.565,91000	259,00		259,00	5.565,91		5.565,910	100,00%
	BAJANTES AGUA LLUVIA											
142	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=160mm)	m	798,00	9,91	7.908,18000	740,33		740,33	7.336,67		7.336,670	92,77
143	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	25,00	90,42	2.260,50000	25,00		25,00	2.260,50		2.260,500	100,00%
144	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m	233,91	20,59	4.816,20690	-		-			-	
145	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO DIAm. INT.= 200A 160mm PVC Y/O POLIETILENO	u	15,00	20,71	310,65000	-		-			-	
	MAMPOSTERÍA											
146	RIOSTRAS DE H.S. F'C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3	129,00	258,83	33.389,07000	122,97		122,97	31.827,81		31.827,810	95,32
147	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=10 Cm	m2	236,00	17,71	4.179,56000	26,61		26,61	471,26		471,260	11,28%
148	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2	4.630,00	22,90	106.027,00000	4.078,71	14,61	4.093,32	93.402,50	334,57	93.737,070	88,41

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23(100%)

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
149	PICADO Y RESANADO DE mAmPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m	3.819,65	4,63	17.684,98050	3.476,65	343,00	3.819,65	16.096,89	1.588,09	17.684,980	100,00%
150	mESON H.A. F'C=180 KG/Cm2 E=7 Cm HIERRO (LAVAmANOS+mESON)	m	7,00	34,03	238,21000	7,00		7,00	238,21		238,210	100%
151	REVESTImIENTO mESON GRANITO	m	7,00	180,61	1.264,27000	7,00		7,00	1.264,27		1.264,270	100,00%
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES											
152	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	2.795,97	10,27	28.714,61190	2.795,97		2.795,97	28.714,61		28.714,610	100,00
153	ENLuCIDO VERTICAL PALETEADO mORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2	9.060,97	8,78	79.555,31660	7.942,58	14,64	7.957,22	69.735,87	128,54	69.864,410	87,82%
154	ENLuCIDO CON mALLA+ ImPERmEABILIZANTE, mORTERO 1:3	m2	1.250,00	17,03	21.287,50000	760,79		760,79	12.956,21		12.956,210	60,86%
155	ENLuCIDO HORIZONTAL PALETEADO mORTERO 1:3	m2	100,00	12,30	1.230,00000	-		-			-	
156	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	2.795,97	5,26	14.706,80220	2.795,97		2.795,97	14.706,81		14.706,810	100,00%
157	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO INTERIOR) INC. FILOS	m2	9.060,97	4,40	39.868,26800	7.755,59		7.755,59	34.124,60		34.124,600	85,59%
158	EmPASTE HORIZONTAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	100,00	6,56	656,00000	-		-			-	
159	PINTuRA EPOXICA PARED INDuSTRIAL 3mm (2 COmPONENTES)	m2		34,78		-		-			-	
160	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	9.060,97	4,72	42.767,77840	7.755,59		7.755,59	36.606,39		36.606,390	85,59%
161	PINTuRA DE CAuCHO SATINADA COLOR(2 mANOS) EXTERIOR (CANASTILLA) <GuÍA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	2.795,97	5,72	15.992,94840	2.464,29		2.464,29	14.095,74		14.095,740	88,14%
162	RECuBRImIENTO ALumINIO COLOR CYAN O SImILAR, ALuCuBOND 5mm INC. ESTRuCT. E INST<GuÍA ImAGEN CORPORATI	m2	1.315,00	84,96	111.722,40000	-		-			-	
163	RECuBRImIENTO PLANCHA FIBROCEmENTO E=7mm	m2	50,00	20,56	1.028,00000	-		-			-	
	CARPINTERIA METALICA											
164	VENTANA FIJA TuBO RECT 40X80X2-mALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6mm, INC PINTuRA ANTICORROSIVA, A COmPRESOR	m2	540,00	41,30	22.302,00000	397,17		397,17	16.403,12		16.403,120	73,55%
165	PORTON TIPO CORREDIZO RETRACTIL TuBO RECT 40X80X2mm-TOOL GALV. 0.6mm	m2	990,50	61,25	60.668,12500	594,12		594,12	36.389,85		36.389,850	59,98%
166	PuERTA mETÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2mm (AREA RIEGO Y DRENAJE)	m2	40,30	142,73	5.752,01900	40,20		40,20	5.737,75		5.737,750	99,75%
167	PuERTAS mODuLARES, TAmBORADAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, INCLuYE ESTRuCTuRA Y HER	m2	30,50	172,30	5.255,15000	30,50		30,50	5.255,15		5.255,150	100,00%
168	DIVISIONES ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, TAmBORADAS INCLuYE ESTRuCTuRA, EmPOTRAmIENTO PISO PARED (	m2	81,00	161,18	13.055,58000	81,00		81,00	13.055,58		13.055,580	100,00%
	CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE											
169	PASAmANOS TuBERÍA ACERO INOXIDABLE + VIDRIO LAmINADO 8mm, EmPOTRADA PISO H=1.00m (GRADAINTERIORES)	m	86,21	173,45	14.953,12450	13,97		13,97	2.423,10		2.423,100	16,20%
170	PASAmANOS EN TuBERIADE ACERO INOXIDABLE EmPOTRADO EN PARED	m	26,59	45,00	1.196,55000	23,15		23,15	1.041,75		1.041,750	87,06%
	CARPINTERIA DE MADERA											
171	PuERTA TAmBORADA 70Cm, ESQuELETO CANELO, mDF 9mm -LACADA-DISEÑO CORPORATIVO	u	20,00	198,79	3.975,80000	18,00		18,00	3.578,22		3.578,220	90,00%
172	PuERTA TAmBORADA 90Cm, ESQuELETO CANELO, mDF 9mm -LACADA-DISEÑO CORPORATIVO	u	2,00	230,59	461,18000	2,00		2,00	461,18		461,180	100,00%
173	PuERTA TAmBORADA 100Cm, ESQuELETO CANELO, mDF 9mm -LACADA-DISEÑO CORPORATIVO	u	6,00	240,28	1.441,68000	6,00		6,00	1.441,68		1.441,680	100,00%
	VENTANERIA-PUERTAS ALUMINIO VIDRIO											
174	PuERTA INGRESO PRINCIPAL-SISTEmA APERTuRA AuTOmATICO 2.00X2.30m ALumINO Y VIDRIO TEmPLADO DE 10mm	u	1,00	6.646,43	6.646,43000	1,00		1,00	6.646,43		6.646,430	100,00%
175	PuERTA DE VIDRIO TEmPLADO 10mm, INC. CERRADuRA TIRADERA, PIVOTE DE SuJECCION (PREFEXTuRA Y AuDITORIO)	m2	9,50	600,48	5.704,56000	9,29		9,29	5.578,46		5.578,460	97,79%
176	PuERTA YmAmPARAALumINIOS200YVIDRIOLAmINADO E=8mm CON PIVOTE	m2	9,00	190,90	1.718,10000	7,88	12,60	20,48	1.504,29	2.405,34	3.909,630	227,56%
177	PuERTA BATIENTE ALumINIO Y VIDRIO FLOTADO CLARO 6mm (0.90X2.10)	u	3,00	295,00	885,00000	3,00		3,00	885,00		885,000	100,00%
178	PuERTA BATIENTE ALumINIO Y VIDRIO FLOTADO CLARO 6mm (1.00X2.10)	u	40,00	286,07	11.442,80000	34,00	6,00	40,00	9.726,38	1.716,42	11.442,800	100,00%
179	VENTANA CORREDIZA ALumINIO SERIE 200-INCL. VIDRIO LAmINADO 6mm	m2	220,00	183,67	40.407,40000	163,15	26,85	220,00	35.475,86	4.931,54	40.407,400	100,00%
	REVESTIMIENTO DE TUMBADOS											
180	CIELO RASO FALSO - FIBRA mINERAL Y RECuB LÁmINA ALumINIO 0.60X0.60 BLANCO, TIPO AmSTRONG O SImILAR	m2	2.150,00	21,59	46.418,50000	2.150,00		2.150,00	46.418,51		46.418,510	100,00%
181	CIELO RASO FALSO TIPO GYPSum PARA HumEDAD-1/2"-SIN ESTuCAR	m2	212,58	20,04	4.260,10320	-	17,18	17,18		344,29	344,290	8,08
182	ESTuCADO DE CIELO RASO	m2	212,58	6,26	1.330,75080	-	17,18	17,18		107,55	107,550	8,08
183	FRISO GALVALumEN PREPINTADO E= 0.40 INC. FLASHING	m2	50,00	19,63	981,50000	-		-			-	
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS											

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23(100%)

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
184	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF DISCAPACITADOS PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u	2,00	297,96	595,92000	2,00		2,00	595,92		595,920	100,00%
185	PASAmANOS PARA DISCAPACITADOS TuBO DIAm 32mm E=1.5mm EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO SATINADO (Juego)	u	2,00	281,03	562,06000	2,00		2,00	562,06		562,060	100,00%
186	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u	39,00	297,96	11.620,44000	39,00		39,00	11.620,44		11.620,440	100,00%
187	uRINARIO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF	u	6,00	261,01	1.566,06000	6,00		6,00	1.566,06		1.566,060	100,00%
188	LAVABO BLANCO, LLAVE SENSOR mOVImIENTO (CON ACCESORIOS)	u	35,00	281,39	9.848,65000	35,00		35,00	9.848,65		9.848,650	100,00%
189	DISPENSOR DE PAPEL HIGIENICO DIAm=275mm, ROLLO 70mm, ABATIBLE,ACERO INOX E=8mm, AISI 304, ACABADO S	u	20,00	110,71	2.214,20000	20,00		20,00	2.214,20		2.214,200	100,00%
190	DISPENSOR DE PAPEL TOALLA 400-600 uNIDADES, 330X273X130mm, ACERO INOX E=8mm AISI 304, ACABADO SATINAD	u	20,00	113,00	2.260,00000	20,00		20,00	2.260,00		2.260,000	100,00%
191	DISPENSADOR DE JABON LIQuIDO ACERO INOX AISI304, ACABADO SATINADO	u	20,00	91,28	1.825,60000	20,00		20,00	1.825,60		1.825,600	100,00%
192	ESPEJO DE VIDRIO FLOTADO 4mm- mARCO DE ALumINIO	m2	12,89	42,86	552,46540	-		-			-	
193	FREGADERO DE COCINA (uN POZO)	u	2,00	185,40	370,80000	1,00		1,00	185,40		185,400	50,00%
194	SECADOR DE mANOS ACCIONAmIENTO AuTOmATICO 260X302X150mm, ACERO INOX. 304, LAmINA1.5mm 110V-60HZ	u	20,00	238,44	4.768,80000	20,00		20,00	4.768,80		4.768,800	100,00%
195	BASuRERO CILINDRICO A PEDAL D=250mm H=385 PARA BAÑO ACERO INOX. 304	u	41,00	66,60	2.730,60000	41,00		41,00	2.730,60		2.730,600	100,00%
	PUENTE GRUA BIRRIEL CAP. 16 TON (1 UNIDADES)											
196	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	407,57	1,68	684,71760	-		-			-	
197	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	43.726,12	2,76	120.684,09120	43.726,12		43.726,12	120.684,09		120.684,090	100,00
198	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	43.726,12	0,11	4.809,87320	43.726,12		43.726,12	4.809,87		4.809,870	100,00%
199	KIT POLIPASTO BIRRIEL A CABLE + TROLEY ELEC, CAP. 16T, ELEVACION 8m, (INC. CARROS TESTEROS+ SISTEm EL	u	1,00	50.538,00	50.538,00000	1,00		1,00	50.538,00		50.538,000	100,00%
200	SISTEmA ELECTRIFICACION ENCAPSuLADO Lm60	m	88,00	112,21	9.874,48000	64,00		64,00	7.181,44		7.181,440	72,73%
201	RIEL DE RODADuRA 50X30mm, (V. PuENTE 2X10+V CARRILERA2X88m)	m	212,00	77,83	16.499,96000	145,60		145,60	11.332,05		11.332,050	68,68%
202	mONTAJE ELECTROmECANICOPARA GRuA BIRRIEL 16 TON	u	1,00	17.664,00	17.664,00000	1,00		1,00	17.664,00		17.664,000	100,00%
203	SIST. CONTROL REmOTO/ TELEmANDO (CON DISPLAY)	u	1,00	1.955,65	1.955,65000	1,00		1,00	1.955,65		1.955,650	100%
	EQUIPO DE MOVILIZACIÓN VERTICAL											
204	ASERSOR DE DISCAPACITADOS L =5.0m, 1 PARADA, CAP. NOmINAL 250KG.	u	1,00	18.732,35	18.732,35000	1,00		1,00	18.732,35		18.732,350	100,00%
	5.- NAVE LAVADORA, Y TALLERES CHAPISTERIA-CARPINTERIA						NL					
	PRELIMINARES											
205	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	4.407,56	1,14	5.024,61840	4.407,56		4.407,56	5.024,62		5.024,620	100,00
206	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	1.087,37	1,46	1.587,56020	1.036,79		1.036,79	1.513,71		1.513,710	95,35
207	ACOmETIDA E INST. DE AGuA POTABLE PROVISIONAL PVC 3/4"	m		8,44		-		-			-	
208	ACOmETIDA E INST. ELÉCTRICA PROV. TuBERÍA CONDuIT 1" CABLENo.8	m		27,58		-		-			-	
209	SONDEOS DE SuELOS (COmPROBACION IN SITu) NEC-15	m	61,00	55,43	3.381,23000	61,00		61,00	3.381,23		3.381,230	100,00
210	CERRAmIENTO PROVISIONAL LISTONES + PLANCHAS DE ZINC	m2		11,69		-		-			-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
211	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	311,80	4,18	1.303,32400	311,80		311,80	1.303,32		1.303,320	100,00
212	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-			-	
213	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	261,80	17,33	4.536,99400	261,80		261,80	4.536,99		4.536,990	100,00
214	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	424,00	13,72	5.817,28000	409,01		409,01	5.611,62		5.611,620	96,46
215	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	261,80	2,82	738,27600	261,80		261,80	738,28		738,280	100,00
	HORMIGONES											
216	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	9,80	163,18	1.599,16400	9,80		9,80	1.599,16		1.599,160	100,00
217	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF'C = 280KG./Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	69,20	225,97	15.637,12400	69,20		69,20	15.637,12		15.637,120	100%
218	HORMIGON PREMEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	35,23	283,42	9.984,88660	35,23		35,23	9.984,89		9.984,890	100,00
219	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	22,17	289,16	6.410,67720	22,17		22,17	6.410,68		6.410,680	100,00
220	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F'C=180 KG/Cm2-50por cientoP)Clm	m3	46,97	169,86	7.978,32420	46,97		46,97	7.978,32		7.978,320	100,00
	ACERO ESTRUCTURAL											

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23(100%)

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
221	ACERO DE REFuERZO FY= 4200 Kg/Cm2	Kg	14.998,01	1,68	25.196,65680	14.998,01		14.998,01	25.196,66		25.196,660	100,00
222	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	59.540,80	2,76	164.332,60800	59.540,80		59.540,80	164.332,61		164.332,610	100,00%
223	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	59.540,80	0,11	6.549,48800	59.014,38	526,42	59.540,80	6.491,58	57,91	6.549,490	100,00%
224	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2	2.420,00	4,84	11.712,80000	2.239,26		2.239,26	10.838,01		10.838,010	92,53%
	CONTRAPISOS											
225	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3 (CONTRAPISO E=20Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	188,50	10,78	2.032,03000	181,79		181,79	1.959,70		1.959,700	96,44
226	mATERIAL DE BASE CLASE 2 (CONTRAPISO E=15Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	141,20	24,55	3.466,46000	136,34		136,34	3.347,15		3.347,150	96,56%
227	CONTRAPISO HORm.S. PREmEZ. F'C=280KG/Cm2 E= 4 PuLG. (SIN BASE)	m2	710,00	21,50	15.265,00000	-		-			-	
228	JuNTA ASERRADA DILATACION PISO (INC. CORDON, Y SELLO)	m	550,00	2,59	1.424,50000	401,85		401,85	1.040,79		1.040,790	73,06%
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS											
229	mASILLADO DE PISOS, ENDuRECEDOR DE CuARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5mm)	m2	1.100,00	5,62	6.182,00000	1.071,05		1.071,05	6.019,30		6.019,300	97,37%
230	PINTuRA EPOXICA PISO INDuSTRIAL 3mm (2 COmPONENTES)	m2	1.100,00	34,78	38.258,00000	521,38		521,38	18.133,60		18.133,600	47,40%
231	PISO PORCELANATO RECTIF. COLOR (0.50X0.50- u OTROS) INSTAL. EmPO	m2	35,00	40,31	1.410,85000	35,00		35,00	1.410,85		1.410,850	100,00%
232	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	72,00	26,06	1.876,32000	72,00		72,00	1.876,32		1.876,320	100,00%
233	BARREDERA PORCELANATO COLOR RECTIFICADA A=10Cm	m	28,00	7,70	215,60000	28,00		28,00	215,60		215,600	100,00%
234	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISOS Y FILOS DE GRADA	m		2,98		-		-			-	
	CUBIERTA											
235	CuBIERTA GALVALumEN E=0.45mm, RECuBRIENTO PINTuRA POLIESTER ASTm-653A (COLOR INSTITuCIONAL), INC, PER	m2	1.390,00	13,92	19.348,80000	1.193,68		1.193,68	16.616,03		16.616,030	85,88%
236	CuBIERTA POLICARBONATO E=0.80 mm, COLOR BRONCE O SImILAR, INC. ACCESORIOS INSTALCION	m2	100,00	14,34	1.434,00000	59,90		59,90	858,97		858,970	59,90%
237	CumBRERO GALVALumEN E=0.40 mm A=0.50 m, INC. ACCES. INSTALACION	m	54,25	8,38	454,61500	52,80		52,80	442,46		442,460	97,33%
238	CANAL TOL GALV E= 0.70mm, H=30Cm, A=40Cm DESARR. 122 Cm, INC. GANCHOS	m	108,50	21,49	2.331,66500	105,60		105,60	2.269,34		2.269,340	97,33%
	BAJANTES AGUA LLUVIA											
239	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=160mm)	m	168,00	9,91	1.664,88000	153,72		153,72	1.523,37		1.523,370	91,50
240	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	18,00	90,42	1.627,56000	12,00		12,00	1.085,04		1.085,040	66,67%
241	SumI. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m	120,00	20,59	2.470,80000	-		-			-	
242	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO DIAm. INT.= 200A 160mm PVC Y/O POLIETILENO	u	6,00	20,71	124,26000	-		-			-	
	MAMPOSTERÍA											
243	RIOSTRAS DE H.S. F'C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3	6,50	258,83	1.682,39500	6,14		6,14	1.589,22		1.589,220	94,46%
244	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=10 Cm	m2	5,00	17,71	88,55000	5,00		5,00	88,55		88,550	100,00%
245	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2	716,00	22,90	16.396,40000	704,69		704,69	16.137,40		16.137,400	98,42%
246	PICADO Y RESANADO DE mAmPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m	168,00	4,63	777,84000	168,00		168,00	777,84		777,840	100%
247	mESON H.A. F'C=180 KG/Cm2 E=7 Cm HIERRO (LAVAmANOS+mESON)	m	3,50	34,03	119,10500	-	3,20	3,20		108,90	108,900	91,43
248	REVESTImIENTO mESON GRANITO	m	3,50	180,61	632,13500	-	3,50	3,50		632,14	632,140	100,00
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES											
249	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	380,00	10,27	3.902,60000	380,00		380,00	3.902,60		3.902,600	100,00%
250	ENLuCIDO VERTICAL PALETEADO mORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2	1.075,00	8,78	9.438,50000	1.001,92		1.001,92	8.796,86		8.796,860	93,20%
251	ENLuCIDO CON mALLA+ ImPERmEABILIZANTE, mORTERO 1:3	m2	35,00	17,03	596,05000	-		-			-	
252	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	380,00	5,26	1.998,80000	380,00		380,00	1.998,80		1.998,800	100,00%
253	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO INTERIOR) INC. FILOS	m2	2.150,00	4,40	9.460,00000	1.000,72		1.000,72	4.403,17		4.403,170	46,55%
254	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	2.150,00	4,72	10.148,00000	1.372,80		1.372,80	6.479,63		6.479,630	63,85%
255	PINTuRA DE CAuCHO SATINADA COLOR(2 mANOS) EXTERIOR (CANASTILLA) <GuÍA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	380,00	5,72	2.173,60000	380,00		380,00	2.173,60		2.173,600	100,00%
256	RECuBRImIENTO PLANCHA FIBROCEmENTO E=7mm	m2	50,00	20,56	1.028,00000	-		-			-	
	CARPINTERIA METALICA											
257	VENTANA FIJA TuBO RECT 40X80X2-mALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6mm, INC PINTuRA ANTICORROSIVA, A COmPRESOR	m2	182,26	41,30	7.527,33800	92,74		92,74	3.830,16		3.830,160	50,88%
258	PORTON TIPO CORREDIZO RETRACTIL TuBO RECT 40X80X2mm-TOOL GALV. 0.6mm	m2	156,67	61,25	9.596,03750	-		-			-	
259	PuERTA mETÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2mm , INC. CERRADuRA, BISAGRAS Y PINTuRA	m2	20,00	142,73	2.854,60000	20,00		20,00	2.854,60		2.854,600	100,00%
260	PuERTAS mODuLARES, TAmBORADAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, INCLuYE ESTRuCTuRA Y HER	m2	4,00	172,30	689,20000	4,00		4,00	689,20		689,200	100,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23(100%)

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
261	DIVISIONES ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, TAmBORADAS INCLuYE ESTRuCTuRA, EmPOTRAmIENTO PISO PARED (	m2	13,70	161,18	2.208,16600	-		-			-	
	VENTANERIA-PUERTAS ALUMINIO VIDRIO											
262	PuERTA BATIENTE ALumINIO Y VIDRIO FLOTADO CLARO 6mm (1.00X2.10)	u	3,00	286,07	858,21000	-	3,00	3,00		858,21	858,210	100,00
263	VENTANA CORREDIZA ALumINIO SERIE 200-INCL. VIDRIO LAmINADO 6mm	m2	6,00	183,67	1.102,02000	-	3,54	3,54		650,19	650,190	59,00
	REVESTIMIENTO DE TUMBADOS											
264	CIELO RASO FALSO - FIBRA mINERAL Y RECuB LÁmINA ALumINIO 0.60X0.60 BLANCO, TIPO AmSTRONG O SImILAR	m2	129,01	21,59	2.785,32590	95,54		95,54	2.062,71		2.062,710	74,06%
265	FRISO GALVALumEN PREPINTADO E= 0.40 INC. FLASHING	m2		19,63		-		-			-	
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS											
266	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF DISCAPACITADOS PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u		297,96		-		-			-	
267	PASAmANOS PARA DISCAPACITADOS TuBO DIAm 32mm E=1.5mm EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO SATINADO (Juego)	u		281,03		-		-			-	
268	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u	4,00	297,96	1.191,84000	4,00		4,00	1.191,84		1.191,840	100,00%
269	uRINARIO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF	u	1,00	261,01	261,01000	1,00		1,00	261,01		261,010	100,00%
270	LAVABO BLANCO, LLAVE SENSOR mOVImIENTO (CON ACCESORIOS)	u	3,00	281,39	844,17000	3,00		3,00	844,17		844,170	100,00%
271	DISPENSOR DE PAPEL HIGIENICO DIAm=275mm, ROLLO 70mm, ABATIBLE,ACERO INOX E=8mm, AISI 304. ACABADO S	u	3,00	110,71	332,13000	-	3,00	3,00		332,13	332,130	100,00
272	DISPENSOR DE PAPEL TOALLA 400-600 uNIDADES, 330X273X130mm, ACERO INOX E=8mm AISI 304, ACABADO SATINAD	u	2,00	113,00	226,00000	-	2,00	2,00		226,00	226,000	100,00
273	DISPENSADOR DE JABON LIQuIDO ACERO INOX AISI304, ACABADO SATINADO	u	2,00	91,28	182,56000	-	2,00	2,00		182,56	182,560	100,00
274	ESPEJO DE VIDRIO FLOTADO 4mm- mARCO DE ALumINIO	m2	2,70	42,86	115,72200	-	2,70	2,70		115,89	115,890	100,15
275	SECADOR DE mANOS ACCIONAmIENTO AuTOmATICO 260X302X150mm, ACERO INOX. 304, LAmINA1.5mm 110V-60HZ	u	2,00	238,44	476,88000	-	2,00	2,00		476,88	476,880	100,00
276	BASuRERO CILINDRICO A PEDAL D=250mm H=385 PARA BAÑO ACERO INOX. 304	u	4,00	66,60	266,40000	-	4,00	4,00		266,40	266,400	100,00
277	DuCHAS CON mEZCLADORA (CON ACCESORIOS)	u	1,00	135,94	135,94000	-	1,00	1,00		135,94	135,940	100,00
	6.- NAVE RESGUARDO VEHICULAR PESADO						NR					
	PRELIMINARES											
278	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	5.783,22	1,14	6.592,87080	5.783,22		5.783,22	6.592,87		6.592,870	100,00
279	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	1.445,85	1,46	2.110,94100	1.445,85		1.445,85	2.110,94		2.110,940	100,00
280	ACOmETIDA E INST. DE AGuA POTABLE PROVISIONAL PVC 3/4"	m		8,44		-		-			-	
281	ACOmETIDA E INST. ELÉCTRICA PROV. TuBERÍA CONDuIT 1" CABLENo.8	m		27,58		-		-			-	
282	SONDEOS DE SuELOS (COmPROBACION IN SITu) NEC-15	m	66,00	55,43	3.658,38000	66,00		66,00	3.658,38		3.658,380	100,00
283	CERRAmIENTO PROVISIONAL LISTONES + PLANCHAS DE ZINC	m2		11,69		-		-			-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
284	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	78,36	4,18	327,54480	78,36		78,36	327,54		327,540	100,00
285	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-			-	
286	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	78,36	17,33	1.357,97880	78,36		78,36	1.357,98		1.357,980	100,00
287	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	635,58	13,72	8.720,15760	592,20		592,20	8.124,98		8.124,980	93,17
288	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	78,36	2,82	220,97520	78,36		78,36	220,98		220,980	100,00
	HORMIGONES											
289	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	7,20	163,18	1.174,89600	7,20		7,20	1.174,90		1.174,900	100,00
290	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF´C = 280KG./Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	29,00	225,97	6.553,13000	25,34		25,34	5.726,08		5.726,080	87,38
291	HORMIGON PREMEZCLADO CADENAS F´C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	84,75	283,42	24.019,84500	84,00		84,00	23.807,28		23.807,280	99,12%
292	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	14,26	289,16	4.123,42160	9,12		9,12	2.637,14		2.637,140	63,96
293	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F´C=180 KG/Cm2-50por cientoP)Clm	m3	56,51	169,86	9.598,78860	56,51		56,51	9.598,79		9.598,790	100,00
	ACERO ESTRUCTURAL											
294	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	9.807,60	1,68	16.476,76800	9.807,60		9.807,60	16.476,77		16.476,770	100,00
295	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2	3.325,46	4,84	16.095,20220	2.885,88		2.885,88	13.967,66		13.967,660	86,78%
	CONTRAPISOS											

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23(100%)

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
296	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3 (CONTRAPISO E=20Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	282,00	10,78	3.039,96000	263,21		263,21	2.837,40		2.837,400	93,34
297	mATERIAL DE BASE CLASE 2 (CONTRAPISO E=15Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	211,86	24,55	5.201,16300	197,41		197,41	4.846,42		4.846,420	93,18%
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS											
	CUBIERTA											
	BAJANTES AGUA LLUVIA											
298	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	12,00	90,42	1.085,04000	12,00		12,00	1.085,04		1.085,040	100,00%
299	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m	161,40	20,59	3.323,22600	-		-			-	
300	SumlN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO DIAm. INT.= 200A 160mm PVC Y/O POLIETILENO	u		20,71		-		-			-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES											
301	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	40,00	10,27	410,80000	-		-			-	
302	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	40,00	5,26	210,40000	-		-			-	
303	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	40,00	4,72	188,80000	-		-			-	
	10.- SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACIÓN						SE					
	POZOS DE REVISION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS											
304	CAJA REVISION mEDIA TENSION 90X90X90 C/VIA, T/HA	u		169,45		-		-			-	
305	CAJA REVISION mEDIA TENSION 60X60X75,ACERA, T/HA	u	41,00	179,17	7.345,97000	41,00		41,00	7.345,97		7.345,970	100,00%
306	PuESTA A TIERRA SImPLE EN POZO ELECTRICO CON SuELDA EXOTERmICA	u	4,00	164,46	657,84000	4,00		4,00	657,84		657,840	100,00%
	SISTEMA SOTERRADO DE MEDIA TENSION											
307	BAJADA DE DE mEDIA TENSION AEREA SOTERRADA	u	4,00	600,70	2.402,80000	1,00		1,00	600,70		600,700	25,00%
308	TENDIDO DE TuBO RIGIDO 1 1/2" DOBLE	m		16,92		-		-			-	
309	SISTEmA A TIERRA DE mEDIA TENSION	u	1,00	1.781,59	1.781,59000	-		-			-	
310	PARARRAYOS 10 KV, CON PERNOS SuJECCION	u	3,00	84,46	253,38000	-		-			-	
311	SECCIONAmIENTO TRIFASICO AEREO SuBTERRANEO S3A/S, INC. PARARRAYOS	u	3,00	1.290,60	3.871,80000	3,00		3,00	3.871,80		3.871,800	100,00%
312	TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNuDO NO. 2 AWG	m	500,00	5,92	2.960,00000	500,00		500,00	2.960,00		2.960,000	100%
313	TENDIDO Y REGuLADO DE CABLE DE COBRE XLPE NO2-15KV	u	1.600,00	14,75	23.600,00000	1.600,00		1.600,00	23.600,00		23.600,000	100,00%
314	TENDIDO CONDuCTOR: TTu 2/0	m		36,79		369,42		369,42	13.590,96		13.590,960	100%
315	TENDIDO CONDuCTOR: TTu 3/0	m		45,20		-		-			-	
316	mALLA DE PuESTA A TIERRA EN CENTRO DE TRANSFORmACION CON SuELDA EXOTERmICA	u	4,00	581,10	2.324,40000	3,00		3,00	1.743,30		1.743,300	75,00%
317	BANCO DE DuCTOS 1X2 DE 110mm 1X2B1-B2	m	1.800,00	32,94	59.292,00000	1.181,87		1.181,87	38.930,80		38.930,800	66,00%
318	mONTAJE DE TRANSFORmADOR PADmOuNTED TRIFASICO TIPO mALLA DE 50KVA-13.8KV-127/220V	u	1,00	7.092,79	7.092,79000	1,00		1,00	7.092,79		7.092,790	100,00%
319	mONTAJE DE TRANSFORmADOR PADmOuNTED TRIFASICO TIPO mALLA DE 100KVA-13.8KV-127/220V	u	1,00	12.135,60	12.135,60000	1,00		1,00	12.135,60		12.135,600	100,00%
320	PuNTA TERmINAL AT TIPO EXTERIOR CABLE N° 2 AWG	u		170,72		-		-			-	
321	PuNTA TERmINAL AT TIPO INTERIOR CABLE N° 2 AWG	u	3,00	170,72	512,16000	-		-			-	
322	ACOmETIDA PRINCIPAL ELECTRICA	m	15,00	6,22	93,30000	-		-			-	
	INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO											
323	POSTES ORNAmENTALES DE 8mTS Y BRAZOS	u	57,00	799,03	45.544,71000	56,00		56,00	44.745,68		44.745,680	98,25%
324	LumINARIA ORNAmENTAL LED120W	u	82,00	532,37	43.654,34000	68,00		68,00	36.201,16		36.201,160	82,93%
325	LumINARIA ORNAmENTAL LED 60W	u	33,00	387,65	12.792,45000	31,00		31,00	12.017,15		12.017,150	93,94%
326	TENDIDO DE CONDuCTOR 1No. NO. 4 TTu	m	4.647,00	8,10	37.640,70000	4.647,00		4.647,00	37.640,70		37.640,700	100,00%
327	mONTAJE DE TRANSF, mONO. PADmOuNTED 10 KVA	u	1,00	5.210,22	5.210,22000	1,00		1,00	5.210,22		5.210,220	100,00%
	AREA ADMINISTRATIVA PLANTA BAJA											
	INSTALACION LUMINARIAS											
328	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	636,00	3,34	2.124,24000	636,00		636,00	2.124,24		2.124,240	100,00%
329	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	218,00	1,18	257,24000	217,00		217,00	256,06		256,060	100,00%
330	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	620,00	0,56	347,20000	505,00		505,00	282,80		282,800	81,00%
331	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	350,00	4,87	1.704,50000	322,00		322,00	1.568,14		1.568,140	92,00%
332	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	150,00	1,57	235,50000	63,00		63,00	98,91		98,910	42,00%
333	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AmARILLO (INC. TAYPE)	m	1.043,00	2,28	2.378,04000	730,10		730,10	1.664,63		1.664,630	70,00%
334	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	1.043,00	1,43	1.491,49000	730,10		730,10	1.044,04		1.044,040	70,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23(100%)

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
335	LumINARIA LED 3X18W/120 VOLTIOS	u	130,00	60,59	7.876,70000	130,00		130,00	7.876,70		7.876,700	100,00%
336	LumINARIA LED 24W/120 VOLTIOS	u	14,00	58,36	817,04000	14,00		14,00	817,04		817,040	100,00%
337	INTERRuPTOR SImPLE CON TAPA	u	38,00	5,47	207,86000	38,00		38,00	207,86		207,860	100,00%
338	INTERRuPTOR DOBLE CON TAPA	u	14,00	6,16	86,24000	-		-			-	
339	INTERRuPTOR CONmuTADOR DE 3 VIAS	u	17,00	7,30	124,10000	17,00		17,00	124,10		124,100	100,00%
	TOMACORRIENTES GENERALES											
340	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	780,00	3,34	2.605,20000	780,00		780,00	2.605,20		2.605,200	100,00%
341	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	260,00	1,18	306,80000	249,00	6,00	255,00	293,82	7,08	300,900	98,00%
342	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	570,00	0,56	319,20000	570,00		570,00	319,20		319,200	100,00%
343	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	390,00	4,87	1.899,30000	234,00	8,00	242,00	1.139,58	38,96	1.178,540	62,00%
344	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	892,00	1,43	1.275,56000	892,00		892,00	1.275,56		1.275,560	100,00%
345	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	892,00	1,43	1.275,56000	892,00		892,00	1.275,56		1.275,560	100,00%
346	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	892,00	1,03	918,76000	892,00		892,00	918,76		918,760	100,00%
347	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	130,00	1,57	204,10000	130,00		130,00	204,10		204,100	100,00%
348	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	130,00	7,45	968,50000	130,00		130,00	968,50		968,500	100,00%
	TOMACORRIENTES REGULADOS UPS											
349	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	195,00	3,34	651,30000	195,00		195,00	651,30		651,300	100,00%
350	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	65,00	1,18	76,70000	49,00		49,00	57,82		57,820	75,00%
351	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	106,00	0,56	59,36000	106,00		106,00	59,36		59,360	100,00%
352	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	100,00	4,87	487,00000	100,00		100,00	487,00		487,000	100,00%
353	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	24,00	1,57	37,68000	24,00		24,00	37,68		37,680	100,00%
354	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	267,00	1,43	381,81000	267,00		267,00	381,81		381,810	100,00%
355	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	267,00	1,43	381,81000	267,00		267,00	381,81		381,810	100,00%
356	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	267,00	1,03	275,01000	267,00		267,00	275,01		275,010	100,00%
357	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	24,00	7,45	178,80000	22,00		22,00	163,90		163,900	91,67%
	AREA ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA											
	INSTALACION LUMINARIAS											
358	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	584,00	3,34	1.950,56000	584,00		584,00	1.950,56		1.950,560	100,00%
359	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	194,00	1,18	228,92000	172,00		172,00	202,96		202,960	89,00%
360	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	570,00	0,56	319,20000	466,00		466,00	260,96		260,960	82,00%
361	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	500,00	4,87	2.435,00000	279,00		279,00	1.358,73		1.358,730	56,00%
362	CAJETINES mETALICOS OCTOGONALES mEDIANOS CON TAPA	u	900,00	5,44	4.896,00000	900,00		900,00	4.896,00		4.896,000	100,00%
363	CAJETINES mETALICOS CuADRADOS CON TAPA 10X10	u	5,00	4,99	24,95000	5,00		5,00	24,95		24,950	100,00%
364	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	60,00	1,57	94,20000	50,00		50,00	78,50		78,500	83,00%
365	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AmARILLO (INC. TAYPE)	m	1.200,00	2,28	2.736,00000	840,00	30,00	870,00	1.915,20	68,40	1.983,600	72,50%
366	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	1.200,00	1,43	1.716,00000	845,00	30,00	875,00	1.208,35	42,90	1.251,250	72,92%
367	LumINARIA LED 3X18W/120 VOLTIOS	u	180,00	60,59	10.906,20000	180,00		180,00	10.906,20		10.906,200	100,00%
368	LumINARIA LED 24W/120 VOLTIOS	u	33,00	58,36	1.925,88000	33,00		33,00	1.925,88		1.925,880	100,00%
369	INTERRuPTOR SImPLE CON TAPA	u	50,00	5,47	273,50000	50,00		50,00	273,50		273,500	100,00%
370	INTERRuPTOR DOBLE CON TAPA	u	15,00	6,16	92,40000	7,00		7,00	43,12		43,120	46,67%
371	INTERRuPTOR TRIPLE CON TAPA	u	4,00	7,30	29,20000	2,00		2,00	14,60		14,600	50,00%
372	INTERRuPTOR CONmuTADOR DE 3 VIAS	u		7,30		-		-			-	
	TOMACORRIENTES GENERALES											
373	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	895,00	3,34	2.989,30000	895,00		895,00	2.989,30		2.989,300	100,00%
374	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	300,00	1,18	354,00000	256,00	18,00	274,00	302,08	21,24	323,320	91,00%
375	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	670,00	0,56	375,20000	512,00	15,00	527,00	286,72	8,40	295,120	79,00%
376	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	400,00	4,87	1.948,00000	228,00	16,00	244,00	1.110,36	77,92	1.188,280	61,00%
377	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	4.000,00	1,43	5.720,00000	2.800,00		2.800,00	4.004,00		4.004,000	70,00%
378	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	1.080,00	1,43	1.544,40000	756,00		756,00	1.081,08		1.081,080	70,00%
379	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	1.080,00	1,03	1.112,40000	756,00		756,00	778,68		778,680	70,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23(100%)

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
380	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	155,00	1,57	243,35000	155,00		155,00	243,35		243,350	100,00%
381	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	170,00	7,45	1.266,50000	163,00		163,00	1.214,35		1.214,350	95,88%
	TOMACORRIENTES REGULADOS UPS											
382	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	368,00	3,34	1.229,12000	368,00		368,00	1.229,12		1.229,120	100,00%
383	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	125,00	1,18	147,50000	121,00		121,00	142,78		142,780	97,00%
384	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	220,00	0,56	123,20000	220,00		220,00	123,20		123,200	100,00%
385	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	190,00	4,87	925,30000	129,00		129,00	628,23		628,230	68,00%
386	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	48,00	1,57	75,36000	48,00		48,00	75,36		75,360	100,00%
387	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	489,00	1,43	699,27000	489,00		489,00	699,27		699,270	100,00%
388	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	489,00	1,43	699,27000	489,00		489,00	699,27		699,270	100,00%
389	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	489,00	1,03	503,67000	489,00		489,00	503,67		503,670	100,00%
390	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	48,00	7,45	357,60000	48,00		48,00	357,60		357,600	100,00%
	ALIMENTACION AIREACONDICIONADO PLANTA BAJA Y ALATA											
391	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	600,00	3,34	2.004,00000	283,81		283,81	947,93		947,930	47,00%
392	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	250,00	1,18	295,00000	64,00		64,00	75,52		75,520	26,00%
393	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	200,00	0,56	112,00000	134,00		134,00	75,04		75,040	67,00%
394	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	248,00	4,87	1.207,76000	162,00		162,00	788,94		788,940	65,00%
395	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	885,00	1,43	1.265,55000	885,00		885,00	1.265,56		1.265,560	100,00%
396	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	885,00	1,43	1.265,55000	885,00		885,00	1.265,56		1.265,560	100,00%
397	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	885,00	1,43	1.265,55000	885,00		885,00	1.265,56		1.265,560	100,00%
398	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	50,00	1,57	78,50000	30,00		30,00	47,10		47,100	60,00%
399	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 220 V	u	50,00	7,45	372,50000	-		-			-	
	AREA DE MECANICA PESADA Y LIVIANA											
	INSTALACION LUMINARIAS											
400	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	540,00	3,34	1.803,60000	540,00		540,00	1.803,60		1.803,600	100,00%
401	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	66,00	1,18	77,88000	66,00		66,00	77,88		77,880	100,00%
402	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	132,00	0,56	73,92000	132,00		132,00	73,92		73,920	100,00%
403	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	436,00	4,87	2.123,32000	286,00		286,00	1.392,82		1.392,820	65,60%
404	CAJETINES mETALICOS CuADRADOS CON TAPA 10X10	u	20,00	4,99	99,80000	10,00		10,00	49,90		49,900	50,00%
405	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	65,00	1,57	102,05000	30,00		30,00	47,10		47,100	46,15%
406	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AmARILLO (INC. TAYPE)	m	88,00	2,28	200,64000	88,00		88,00	200,64		200,640	100,00%
407	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	88,00	1,43	125,84000	88,00		88,00	125,84		125,840	100,00%
408	LumINARIA LED 3X18W/120 VOLTIOS	u	11,00	60,59	666,49000	41,00		41,00	2.484,19		2.484,190	372,73%
409	LumINARIA LED 24W/120 VOLTIOS	u		58,36		-		-			-	
410	INTERRuPTOR SImPLE CON TAPA	u		5,47		2,00		2,00	10,94		10,940	1,00
411	INTERRuPTOR DOBLE CON TAPA	u	1,00	6,16	6,16000	1,00		1,00	6,16		6,160	100,00%
412	INTERRuPTOR TRIPLE CON TAPA	u	1,00	7,30	7,30000	-		-			-	
413	LumINARIA LED 150W/220 VOLTIOS	u	53,00	193,85	10.274,05000	53,00		53,00	10.274,05		10.274,050	100,00%
414	TENDIDO DE CABLE CONCENTRICO 2X12 AWG(INC. TAYPE)	m	710,00	3,43	2.435,30000	710,00		710,00	2.435,30		2.435,300	100,00%
	TOMACORRIENTES GENERALES											
415	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	300,00	3,34	1.002,00000	300,00		300,00	1.002,00		1.002,000	100,00%
416	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	100,00	1,18	118,00000	87,00		87,00	102,66		102,660	87,00%
417	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	150,00	0,56	84,00000	150,00		150,00	84,00		84,000	100,00%
418	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	200,00	4,87	974,00000	101,00		101,00	491,87		491,870	50,50%
419	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	350,00	1,43	500,50000	350,90		350,90	501,79		501,790	100,26%
420	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	350,00	1,43	500,50000	350,90		350,90	501,79		501,790	100,26%
421	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	350,00	1,03	360,50000	350,90		350,90	361,43		361,430	100,26%
422	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	30,00	1,57	47,10000	30,00		30,00	47,10		47,100	100,00%
423	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	30,00	7,45	223,50000	30,00		30,00	223,50		223,500	100,00%
424	TuBERIA EmT 3/4 PuLGADA	m	250,00	3,47	867,50000	250,00		250,00	867,50		867,500	100,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23(100%)

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
425	TENDIDO DE CABLE CONCENTRICO NO.3X10 AWG (INC. TAYPE)	m	400,00	4,01	1.604,00000	400,00		400,00	1.604,00		1.604,000	100,00%
426	TOmA ESPECIAL 220 VOLTIOS	u	25,00	11,10	277,50000	20,00		20,00	222,00		222,000	80,00%
	AREA DE CHAPISTERIA, LAVADO, TORNO, VULCANIZADORA											
	INSTALACION LUMINARIAS											
427	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	195,00	3,34	651,30000	195,00		195,00	651,30		651,300	100,00%
428	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	65,00	1,18	76,70000	44,00		44,00	51,92		51,920	67,69%
429	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	98,00	0,56	54,88000	98,00		98,00	54,88		54,880	100,00%
430	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	328,00	4,87	1.597,36000	184,00		184,00	896,08		896,080	56,10%
431	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	26,00	1,57	40,82000	20,00		20,00	31,40		31,400	76,92%
432	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AmARILLO (INC. TAYPE)	m	220,00	2,28	501,60000	136,93		136,93	312,20		312,200	62,24%
433	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	220,00	1,43	314,60000	136,93		136,93	195,81		195,810	62,24%
434	LumINARIA LED3X18W/120 VOLTIOS	u	45,00	60,59	2.726,55000	39,00		39,00	2.363,01		2.363,010	86,67%
435	LumINARIA LED 150W/220 VOLTIOS	u	20,00	193,85	3.877,00000	16,00		16,00	3.101,60		3.101,600	80,00%
436	TENDIDO DE CABLE CONCENTRICO 2X12 AWG(INC. TAYPE)	m	150,00	3,43	514,50000	150,00		150,00	514,50		514,500	100,00%
437	INTERRuPTOR SImPLE CON TAPA	u	20,00	5,47	109,40000	16,00		16,00	87,52		87,520	80,00%
	TOMACORRIENTES GENERALES											
438	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	635,00	3,34	2.120,90000	138,90		138,90	463,92		463,920	21,87%
439	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	212,00	1,18	250,16000	122,00		122,00	143,96		143,960	57,55%
440	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	315,00	0,56	176,40000	289,00		289,00	161,84		161,840	91,75%
441	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	428,00	4,87	2.084,36000	139,00		139,00	676,93		676,930	32,48%
442	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	550,00	1,43	786,50000	275,00		275,00	393,25		393,250	50,00%
443	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	550,00	1,43	786,50000	275,00		275,00	393,25		393,250	50,00%
444	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	550,00	1,03	566,50000	275,00		275,00	283,25		283,250	50,00%
445	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	40,00	7,45	298,00000	37,00		37,00	275,65		275,650	92,50%
446	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	42,00	1,57	65,94000	37,00		37,00	58,09		58,090	88,10%
447	TuBERIA EmT 3/4 PuLGADA	m	127,00	3,47	440,69000	127,00		127,00	440,69		440,690	100,00%
448	uNION EmT 3/4 PuLGADA	u	43,00	1,28	55,04000	43,00		43,00	55,04		55,040	100,00%
449	CONECTOR EmT 3/4 PuLGADA	u	86,00	0,77	66,22000	86,00		86,00	66,22		66,220	100,00%
450	TOmA ESPECIAL 220 VOLTIOS	u	10,00	11,10	111,00000	10,00		10,00	111,00		111,000	100,00%
	AREA DE RESGUARDO DE VEHICULOS											
	INSTALACION LUMINARIAS											
451	LumINARIA LED 150W/220 VOLTIOS	u	20,00	193,85	3.877,00000	15,00		15,00	2.907,75		2.907,750	75,00%
452	TENDIDO DE CABLE CONCENTRICO 2X12 AWG(INC. TAYPE)	m	512,00	3,43	1.756,16000	512,00		512,00	1.756,16		1.756,160	100,00%
	TOMACORRIENTES GENERALES											
453	TOmA ESPECIAL 220 VOLTIOS	u	8,00	11,10	88,80000	-		-			-	
454	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	8,00	1,57	12,56000	-		-			-	
	GRUPO ELECTROGENO											
	ACOMETIDA CENTRO DE TRANSFORMACION, GENERACION Y MEDICION DE ENERGIA											
455	mEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA INDIRECTO TRIFASICO 400/5A CLASE 0.5	u	1,00	3.275,86	3.275,86000	1,00		1,00	3.275,86		3.275,860	100,00%
456	CAJA DE PROTECCION GENERAL TRIFASICA NH-3X350A	u	1,00	468,19	468,19000	1,00		1,00	468,19		468,190	100,00%
457	GENERADOR DE EmERGENCIA EN CABINA INSONORA 50KVA TRIFASICO 127/220V	u	1,00	23.030,45	23.030,45000	1,00		1,00	23.030,45		23.030,450	100,00%
458	TABLERO DE TRANSFERENCIA AuTOmATICO TRIFASICO 3P/300A	u	1,00	4.845,70	4.845,70000	1,00		1,00	4.845,70		4.845,700	100,00%
459	PRuEBAS DE ENERGIZACION Y TRAmITES EmPRESA ELECTRICA, PAGOS (Global)	u	1,00	3.278,88	3.278,88000	1,00		1,00	3.278,88		3.278,880	100,00%
460	SISTEmA uPS TRIFÁSICODE 30 KVA	u	1,00	24.986,66	24.986,66000	1,00		1,00	24.986,66		24.986,660	100,00%
461	TABLERO DE BYPASS TRIFASICO 100A CON BARRAS DE COBRE	u	1,00	2.669,86	2.669,86000	1,00		1,00	2.669,86		2.669,860	100,00%
462	SISTEmA DE PROTECCION ATmOSFERICA PARRAYOS	u	2,00	1.643,60	3.287,20000	2,00		2,00	3.287,20		3.287,200	100,00%
	ALIMENTADORES Y SUBTABLEROS CT-1											
	ALIMENTADOR TDP-STE PB1											
463	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO.3X8+8Cu TW (INC. TAYPE)	m	18,00	12,44	223,92000	18,00		18,00	223,92		223,920	100,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23(100%)

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
464	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PB1	u	1,00	200,82	200,82000	1,00		1,00	200,82		200,820	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE PB2											
465	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	31,00	14,51	449,81000	31,00		31,00	449,81		449,810	100,00%
466	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PB2	u	1,00	323,93	323,93000	1,00		1,00	323,93		323,930	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE PB3											
467	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	41,00	14,51	594,91000	41,00		41,00	594,91		594,910	100,00%
468	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PB3	u	1,00	213,64	213,64000	1,00		1,00	213,64		213,640	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE PB4											
469	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	32,00	14,51	464,32000	32,00		32,00	464,32		464,320	100,00%
470	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PB4	u	1,00	226,90	226,90000	1,00		1,00	226,90		226,900	100,00%
	ALIMENTADOR TPD-STE PB5											
471	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	26,00	14,51	377,26000	26,00		26,00	377,26		377,260	100,00%
472	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PB5	u	1,00	226,90	226,90000	1,00		1,00	226,90		226,900	100,00%
	ALIMENTADOR TPD-STE-PB6											
473	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	132,00	14,51	1.915,32000	132,00		132,00	1.915,32		1.915,320	100,00%
474	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PB6	u	3,00	297,41	892,23000	3,00		3,00	892,23		892,230	100,00%
	ALIMENTADOR STD-STE-PA1											
475	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	41,00	14,51	594,91000	41,00		41,00	594,91		594,910	100,00%
476	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PA1	u	1,00	214,08	214,08000	1,00		1,00	214,08		214,080	100,00%
	ALIMENTADOR STD-STE-PA2											
477	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	111,00	14,51	1.610,61000	111,00		111,00	1.610,61		1.610,610	100,00%
478	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PA2	u	3,00	297,41	892,23000	3,00		3,00	892,23		892,230	100,00%
	ALIMENTADOR TPD-STE-PA3											
479	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	45,00	14,51	652,95000	45,00		45,00	652,95		652,950	100,00%
480	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PA3	u	1,00	230,78	230,78000	1,00		1,00	230,78		230,780	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-PA4											
481	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	35,00	14,51	507,85000	35,00		35,00	507,85		507,850	100,00%
482	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PA4	u	1,00	304,26	304,26000	1,00		1,00	304,26		304,260	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-PA5											
483	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	47,00	14,51	681,97000	47,00		47,00	681,97		681,970	100,00%
484	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PA5	u	2,00	217,52	435,04000	2,00		2,00	435,04		435,040	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-PA6											
485	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	56,00	14,51	812,56000	56,00		56,00	812,56		812,560	100,00%
486	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PA6	u	1,00	310,67	310,67000	1,00		1,00	310,67		310,670	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A1											
487	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	122,00	14,51	1.770,22000	106,20		106,20	1.540,96		1.540,960	87,05%
488	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6ESPACIOS A1	u	4,00	122,27	489,08000	3,00		3,00	366,81		366,810	75,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A2											
489	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	130,00	14,51	1.886,30000	65,00		65,00	943,15		943,150	50,00%
490	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS A2	u	1,00	122,27	122,27000	-		-			-	-
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR-A3											
491	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	57,00	14,51	827,07000	57,00		57,00	827,08		827,080	100,00%
492	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS A3	u	1,00	187,12	187,12000	1,00		1,00	187,12		187,120	100,00%
	ALIMENTADOR TPD-STE-ANGAR-A4											
493	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	92,00	14,51	1.334,92000	43,10		43,10	625,38		625,380	46,85%
494	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS A4	u	2,00	122,27	244,54000	-		-			-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A5											
495	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	95,00	14,51	1.378,45000	95,00		95,00	1.378,46		1.378,460	100,00%
496	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12ESPACIOS A5	u	1,00	200,82	200,82000	1,00		1,00	200,82		200,820	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A6											

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23(100%)

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
497	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	146,00	14,51	2.118,46000	62,50		62,50	906,87		906,870	42,81%
498	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS A6	u	2,00	122,27	244,54000	-		-			-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR-A7											
499	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	82,00	14,51	1.189,82000	82,00		82,00	1.189,82		1.189,820	100,00%
500	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS A7	u	1,00	228,23	228,23000	1,00		1,00	228,23		228,230	100,00%
	ALIMENTADOR TPD-STE-CONDENSADORES											
501	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	12,00	14,51	174,12000	12,00		12,00	174,12		174,120	100,00%
502	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS CONDENSADORES	u	1,00	738,12	738,12000	1,00		1,00	738,12		738,120	100,00%
	ALIMENTADORES Y SUBTABLEROS CT-2											
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A1											
503	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	41,00	14,51	594,91000	20,50	21,50	42,00	297,46	311,97	609,430	102,44%
504	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12ESPACIOS ANGAR A1	u	1,00	187,12	187,12000	1,00		1,00	187,12		187,120	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A2											
505	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	80,00	14,51	1.160,80000	40,00		40,00	580,40		580,400	50,00%
506	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS ANGAR 2	u	1,00	122,27	122,27000	1,00		1,00	122,27		122,270	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR-A3											
507	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	55,00	14,51	798,05000	27,50		27,50	399,03		399,030	50,00%
508	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS ANGAR 3	u	1,00	122,27	122,27000	1,00		1,00	122,27		122,270	100,00%
	ALIMENTADOR TPD-STE-ANGAR-A4											
509	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	40,00	14,51	580,40000	20,00		20,00	290,20		290,200	50,00%
510	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS ANGAR 4	u	1,00	173,41	173,41000	1,00		1,00	173,41		173,410	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A5											
511	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	47,00	14,51	681,97000	47,00		47,00	681,98		681,980	100,00%
512	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12ESPACIOS ANGAR 5	u	1,00	173,41	173,41000	1,00		1,00	173,41		173,410	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A6											
513	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	168,00	14,51	2.437,68000	147,86		147,86	2.145,45		2.145,450	88,01%
514	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS ANGAR 6	u	3,00	200,82	602,46000	3,00		3,00	602,46		602,460	100,00%
	ACOMETIDA B.V PRINCIPAL											
515	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 2/0 THHN	m	144,00	4,18	601,92000	142,00		142,00	593,56		593,560	98,61%
516	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 1/0 THHN	m	36,00	4,18	150,48000	22,50	13,50	36,00	94,05	56,43	150,480	100,00
	ACOMETIDA DE GENERADOR - TTA											
517	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 2/0 THHN	m	120,00	4,18	501,60000	119,60		119,60	499,93		499,930	99,67%
518	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 1/0 THHN	m	40,00	4,18	167,20000	40,00		40,00	167,20		167,200	100,00%
	ACOMETIDA DE TTA - TDP-N											
519	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 1/0 THHN	m	60,00	4,18	250,80000	60,00		60,00	250,80		250,800	100,00%
520	TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNuDO NO. 2 AWG	m	25,00	5,92	148,00000	21,40		21,40	126,69		126,690	85,60%
	ACOMETIDA DE TTA - TP											
521	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 1/0 THHN	m	40,00	4,18	167,20000	40,00		40,00	167,20		167,200	100,00%
522	TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNuDO NO. 2 AWG	m	14,00	5,92	82,88000	14,00		14,00	82,88		82,880	100,00%
	CERCO ELECTRICO CERRAMIENTO											
523	INSTALACION DE CENTRAL ENERGIZADORA 5K	u		594,89		-	1,00	1,00		594,89	594,890	100%
524	COLOCACION DE TuBERIA PREPARADA	u		10,70		-	201,00	201,00		2.150,70	2.150,700	100%
525	COLOCACION DE AISLADORES DE PASO DE ESQuINA Y PASANTE	u		5,26		-	1.205,00	1.205,00		6.338,30	6.338,300	100%
526	TENDIDO DE ALAmBRE SOLIDO GALVANIZADO	m		0,92		-	4.784,40	4.784,40		4.401,65	4.401,650	100%
527	TENDIDO DE CONDuCTOR DE COBRE DE ALTA TENSION 1/0	m		18,77		-	11,60	11,60		217,73	217,730	100%
528	INSTALACIONDE BATERIA Y SIRENA	m		962,28		-	1,00	1,00		962,28	962,280	100%
529	SISTEmA DE PuESTA A TIERRA	u		60,25		-	1,00	1,00		60,25	60,250	100%
	11.- SISTEMA HIDRAULICO SANITARIO Y CONTRAINCENDIOS						SH					
	SITEMA DE AGUA POTABLE A PRESIÓN CONSTANTE											
	ACOMETIDA DE AGUA POTABLE											

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23(100%)

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
530	TuBERIA PVC D=63 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m	470,00	4,09	1.922,30000	-	43,00	43,00		175,87	175,870	9,15
531	CONEXION DOmICILIARIA INC.mEDIDOR,EN TuBO D=63mm	u	2,00	100,91	201,82000	-	2,00	2,00		201,82	201,820	100,00
532	HIDRANTES D=3" INCLuYE ACCESORIOS	u	2,00	702,84	1.405,68000	-		-			-	
	TUBERIA PVC AGUA POTABLE											
533	TuBERIA PVC ROSCABLE D=1/2" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	361,00	5,86	2.115,46000	88,42		88,42	518,12		518,120	24,49%
534	TuBERIA PVC ROSCABLE D=3/4" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	59,58	6,59	392,63220	31,93		31,93	210,42		210,420	53,59%
535	TuBERIA PVC ROSCABLE D=1" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	158,67	9,78	1.551,79260	158,67		158,67	1.551,79		1.551,790	100,00%
536	TuBERIA PVC ROSCABLE D=1 1/2" EN EDIFICACION+PRuEB	m	98,92	16,09	1.591,62280	-		-			-	
537	TuBERIA PVC ROSCABLE D=2" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	45,08	14,86	669,88880	45,08		45,08	669,89		669,890	100,00%
538	TuBERIA PVC ROSCABLE D=2 1/2"" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	20,04	16,38	328,25520	-		-			-	
539	TuBERIA PVC ROSCABLE D=3" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	335,60	17,90	6.007,24000	15,04		15,04	269,22		269,220	4,48%
540	TuBERIA PVC ROSCABLE D=4" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	32,81	18,83	617,81230	-		-			-	
	ACCESORIOS INST. TUB PVC ROSCABLE AGUA POTABLE											
541	ANCLAJES mETALICOS PLATINA 2 por 1/2" (ABRAZADERAS), EN LOSA Y PARED	u	250,00	14,11	3.527,50000	148,00		148,00	2.088,28		2.088,280	59,20%
542	S.I. PuNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGuA por punto	u	90,00	13,67	1.230,30000	47,00		47,00	642,49		642,490	52,22%
543	S. I. PuNTO AGuA FRIA PVC ROSCABLE D = 2" por punto	u	35,00	63,31	2.215,85000	-		-			-	
544	VALVuLA DE BRONCE RW 2" +ACCESORIOS	u	5,00	34,99	174,95000	5,00		5,00	174,95		174,950	100,00%
545	LLAVE DE PASODE 1/2 PuLG	u	15,00	10,15	152,25000	15,00		15,00	152,25		152,250	100,00%
	SISTEMA DE AGUA CALIENTE											
546	S.I. PuNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGuA CALIENTE por punto	u		16,04		-		-			-	
547	TuBERIA AGuA CALIENTE PVC ROSCABLE D=1/2" EN EDIFICACION+PRuEBA	m		6,77		-		-			-	
548	CALENTADOR ELECTRICO ELECTRICO 15W	u		539,04		-		-			-	
	SISTEMA DE PRESION (BOMBEO) S AGUA POTABLE											
549	S. I. SISTEmA HIDRONEumATICO(2BOmBA5HP-TANQuE 19.8GAL-CAJA CONTROL-CONT. NIVEL-VÁLVuLA CHEQuE), uSO	u	1,00	7.104,62	7.104,62000	1,00		1,00	7.104,62		7.104,620	100,00%
550	S. I. SISTEmA HIDRONEumATICO(3BOmBA5HP-TANQuE 29.5GAL-CAJA CONTROL-CONT. NIVEL-VÁLVuLA CHEQuE), uSO	u	1,00	10.425,92	10.425,92000	1,00		1,00	10.425,92		10.425,920	100,00%
	SISTEMA CONTRAINCENDIOS											
551	S. I. TuBERÍA HG ASTmD = 2 ½" + PRuEBA	m	80,00	15,24	1.219,20000	80,00		80,00	1.219,20		1.219,200	100,00%
552	S.C. TuBERIA HG ASTm D = 1 1/2 " + PRuEBA	m	40,00	11,54	461,60000	12,10		12,10	139,63		139,630	30,25%
553	S. I. TEE HG ASTmD = 2½"	u	2,00	8,72	17,44000	2,00		2,00	17,44		17,440	100,00%
554	S. I. CODO HG ASTm90º X D = 2 ½"	u	10,00	6,70	67,00000	8,00		8,00	53,60		53,600	80,00%
555	S.I. uNION uNIVERSAL HG ASTm D = 2 1/2"	u	5,00	12,00	60,00000	5,00		5,00	60,00		60,000	100,00%
556	S.I. VALVuLA CHECK BRONCE D = 2 1/2 "	u	1,00	79,42	79,42000	1,00		1,00	79,42		79,420	100,00%
557	S. I. REDuCTOR HG ASTmD = 2 1/2" X 1 1/2"	u	1,00	9,48	9,48000	1,00		1,00	9,48		9,480	100,00%
558	S. I. uNIÓN uNIVERSAL HG ASTmD = 1 1/2"	u	5,00	8,23	41,15000	2,00		2,00	16,46		16,460	40,00%
559	S. I. CODO HG ASTm D = 1 1/2"	u	6,00	8,93	53,58000	5,00		5,00	44,65		44,650	83,33%
560	ANCLAJES mETALICOS PLATINA 2 por 1/2" (ABRAZADERAS), EN LOSA Y PARED	u	80,00	14,11	1.128,80000	67,00		67,00	945,37		945,370	83,75%
561	PuNTO H.G. ROSCABLE 1 1/2" AGuA por punto	u	2,00	74,00	148,00000	2,00		2,00	148,00		148,000	100,00%
562	PuNTO H.G. ROSCABLE 2" AGuA por punto	u	1,00	81,83	81,83000	-		-			-	
563	GAB CONT INCEN INC GAB SN VID, RACK DE INC Y mANG 100FT X1½"LLAVE SPANNER1½"NACHA, NIPLE DE BRONC Y P	u	2,00	749,90	1.499,80000	2,00		2,00	1.499,80		1.499,800	100,00%
564	SIAmESA 4"X 2 1/2" X 2 1/2" DE BRONCE	u	1,00	295,97	295,97000	1,00		1,00	295,97		295,970	100,00%
	EXTINTORES											
565	EXTINTOR PQS CAPACIDAD 10 LBS. CON CAJA mETALICA	u	16,00	99,84	1.597,44000	-		-			-	
566	EXTINTOR PQS CAPACIDAD 20 LBS. CON CAJA mETALICA	u	2,00	106,69	213,38000	-		-			-	
567	EXTINTOR CO2 CAPACIDAD 10 LBS. CON CAJA mETALICA	u	4,00	97,66	390,64000	-		-			-	
568	EXTINTOR CO2 CAPACIDAD 20 LBS. CON CAJA mETALICA	u	2,00	313,27	626,54000	-		-			-	
569	EXTINTOR CO2 CAPACIDAD TIPO SATELITE DE 50 LBS	u	1,00	578,23	578,23000	-		-			-	
	SISTEMA DE PRESION (BOMBEO) S CONTRAINCENDIOS											

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23(100%)

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
570	S. I. SISTEmA HIDRONEumATICO(BOmBA-mOTOR-CAJA DE CONTROL-CONTROL DE NIVEL-VÁLVuLA CHEQuE), uSOCON	u	1,00	7.949,92	7.949,92000	1,00		1,00	7.949,92		7.949,920	100,00%
571	BOmBA JOCKEY; 1 HP, Q=8.70 GPm, PRES=110m; INCLuYE TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS	u	1,00	2.762,08	2.762,08000	1,00		1,00	2.762,08		2.762,080	100,00%
	SISTEMA DE REUTILIZACION DE AGUAS LLUVIAS (RIEGO Y LAVADORA AUTO)											
572	REPLANTEO Y NIVELACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	m	250,00	1,81	452,50000	66,97		66,97	121,22		121,220	26,79%
573	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	200,00	17,93	3.586,00000	-		-			-	
574	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	200,00	6,32	1.264,00000	-		-			-	
575	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=160mm)	m	120,00	9,91	1.189,20000	120,00		120,00	1.189,20		1.189,200	100,00%
576	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	12,00	90,42	1.085,04000	-		-			-	
	TUBERIA PVC RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS						ALL					
577	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=160 mm S6	m	50,00	9,70	485,00000	50,00		50,00	485,00		485,000	100,00%
578	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT = 200 mm S6	m		15,28		-		-			-	
579	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 228 mm S6	m		15,88		-		-			-	
580	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 250 mm S6	m	90,00	16,51	1.485,90000	-		-			-	
581	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 300 mm S5	m	30,00	20,22	606,60000	-		-			-	
582	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=400 mm S5	m	428,11	38,33	16.409,45630	428,11		428,11	16.409,46		16.409,460	100,00%
583	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 450 mm S5	m	30,00	44,36	1.330,80000	-		-			-	
584	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 500 mm S5	m		74,42		-		-			-	
585	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 220A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u	3,00	21,28	63,84000	-		-			-	
586	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 335A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u	3,00	24,14	72,42000	3,00		3,00	72,42		72,420	100,00%
	TUBERIA PVC PRESIÓN RECOLECCION AGUAS LLUVIAS											
587	TuBERIA PVC D=3" 1.0 mPA + PRuBA	m	12,00	5,16	61,92000	-		-			-	
588	VALVuLA TIPO GLOBO (CONTROL NIVEL mECANICO)	u	2,00	17,82	35,64000	-		-			-	
589	ROCIADOR 3/4 Q=3.22 m3/H, RADIO COBERTuRA 15.8m, 5BAR	u		17,82		-		-			-	
590	TuBERIA PVC D=25 mm 1.0 mPA u/C + PRuEBA	m	80,00	2,98	238,40000	-		-			-	
591	TuBERIA PVC D=40 mm 1.0 mPA E/C + PRuEBA	m	20,00	3,38	67,60000	-		-			-	
592	TuBERIA PVC D=50 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m	20,00	3,50	70,00000	-		-			-	
593	TuBERIA PVC D=63 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m	47,00	4,09	192,23000	-		-			-	
594	TuBERIA PVC D=75 mm 1.0 mPA u/E + PRuBA	m	30,00	5,23	156,90000	-		-			-	
595	TuBERIA PVC D=90 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m	25,00	6,20	155,00000	-		-			-	
596	TuBERIA PVC D=110 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m		8,48		-		-			-	
597	TuBERIA PVC D=125 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m		11,54		-		-			-	
	SISTEMA DE PRESION (RIEGO Y LAVADORA AUTOS)											
598	GRuPO 2 BOmBAS15 HP (Q=12 L/S, TDH= 80mCA), (2BOmBA-mOTOR-CAJA DE CONTROL-CONTROL DE NIVEL-VÁLVuLA CH	u		6.465,34		-		-			-	
599	GRuPO 3 BOmBAS15 HP (Q=21 L/S, TDH= 80mCA), (3BOmBA-mOTOR-CAJA DE CONTROL-CONTROL DE NIVEL-VÁLVuLA CH	u	1,00	8.868,10	8.868,10000	1,00		1,00	8.868,10		8.868,100	100,00%
	SISTEMA SANITARIO INTERNO											
	PRELIMINARES Y MOV. TIERRAS											
600	REPLANTEO Y NIVELACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	m	390,00	1,81	705,90000	15,91		15,91	28,80		28,800	4,08
601	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	12,00	17,93	215,16000	-		-			-	
602	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3		6,32		-		-			-	
	INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE											
603	PuNTO DE DESAGuE EN PVC 50 mm	u	86,00	28,80	2.476,80000	86,00		86,00	2.476,80		2.476,800	100,00
604	PuNTO DE DESAGuE EN PVC 110 mm	u	45,00	34,43	1.549,35000	41,00		41,00	1.411,63		1.411,630	91,11
605	TuBERÍA PVC 50 mm DE DIÁmETRO (mAT/TRASP/INST)	m	125,60	5,14	645,58400	70,47		70,47	362,23		362,230	56,11
606	TuBERÍA PVC 110 mm DE DIÁmETRO (mAT/TRASP/INST)	m	420,00	8,02	3.368,40000	420,00		420,00	3.368,40		3.368,400	100,00
607	TuBERÍA PVC 160 mm DE DIÁmETRO (mAT/TRASP/INST)	m	165,00	14,52	2.395,80000	72,64		72,64	1.054,73		1.054,730	44,02%
608	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	6,00	90,42	542,52000	-		-			-	
	INSTALACION TUBERIA PVC DEVENTILACIÓN											
609	TuBERIA PVC D=75 mm VENTILACIÓN	m	78,00	4,27	333,06000	78,00		78,00	333,06		333,060	100,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23(100%)

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
610	PUNTO DE VENTILACIÓN PVC 75 mm por punto	u	25,00	15,61	390,25000	25,00		25,00	390,25		390,250	100,00%
	TANQUES DE RESERVA DE AGUA-CISTERNAS 49 M3											
	PRELIMINARES											
611	ARREGLO Y LIMPIEZA (INCLUYE DESALOJO)	m2	68,64	1,14	78,24960	-		-			-	
612	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQUEADERO,Y PLATAFORMAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	60,00	1,46	87,60000	60,00		60,00	87,60		87,600	100,00%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
613	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-			-	
614	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A MAQUINA)	m3	201,65	4,18	842,89700	201,60		201,60	842,69		842,690	99,98%
615	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	m2		11,56		-		-			-	
616	RELLENO COMPACTADO A MAQUINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	41,00	13,72	562,52000	41,00		41,00	562,52		562,520	100,00%
617	RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL (CAPAS 20 Cm)	m3	10,00	6,32	63,20000	-		-			-	
	HORMIGONES											
618	HORMIGON PREMEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOMBEO Y TRANSPORTE	m3	4,10	163,18	669,03800	4,10		4,10	668,91		668,910	99,98%
619	HORMIGON PREMEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOMBEO Y TRANSPORTE	m3	29,66	249,88	7.411,44080	26,85		26,85	6.709,28		6.709,280	90,53%
	ACERO ESTRUCTURAL											
620	ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	2.459,03	1,68	4.131,17040	2.459,09		2.459,09	4.131,27		4.131,270	100,00%
621	PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTm A36 (PROV. MONTAJE GRUA)	Kg	50,00	2,76	138,00000	-		-			-	
622	TRATAMIENTO PINTURA ESTRUCTURA ACERO A36 (FONDO+PINTURA ANTICORROSIVA), A COMPRESOR	Kg	50,00	0,11	5,50000	-		-			-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES											
623	ENLUCIDO CON IMPERMEABILIZANTE MORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	144,00	10,27	1.478,88000	29,66		29,66	304,61		304,610	20,60%
624	CERAMICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EMP	m2	113,00	26,06	2.944,78000	113,00		113,00	2.944,78		2.944,780	100,00%
625	PINTURA DE CAUCHO SATINADO COLOR (2 MANOS) INTER. <GUIA IMAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	15,00	4,72	70,80000	-		-			-	
626	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm MARCO ANG. 25 por 3 mm	u	2,00	75,58	151,16000	-		-			-	
	TANQUES DE RESERVA DE AGUA-CISTERNAS 11 M3											
	PRELIMINARES											
627	ARREGLO Y LIMPIEZA (INCLUYE DESALOJO)	m2		1,14		-		-			-	
628	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQUEADERO,Y PLATAFORMAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	36,80	1,46	53,72800	-		-			-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
629	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	5,00	17,93	89,65000	-		-			-	
630	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A MAQUINA)	m3	97,58	4,18	407,88440	79,81		79,81	333,60		333,600	81,79%
631	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	m2	17,00	11,56	196,52000	-		-			-	
632	RELLENO COMPACTADO A MAQUINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	55,20	13,72	757,34400	51,31		51,31	703,97		703,970	92,95%
633	RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL (CAPAS 20 Cm)	m3	5,00	6,32	31,60000	-		-			-	
	HORMIGONES											
634	HORMIGON PREMEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOMBEO Y TRANSPORTE	m3	1,66	163,18	270,87880	1,66		1,66	270,88		270,880	100,00%
635	HORMIGON PREMEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOMBEO Y TRANSPORTE	m3	16,93	249,88	4.230,46840	13,22	3,71	16,93	3.302,16	927,05	4.229,210	99,97
	ACERO ESTRUCTURAL											
636	ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	1.490,00	1,68	2.503,20000	1.490,00		1.490,00	2.503,20		2.503,200	100,00%
637	PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTm A36 (PROV. MONTAJE GRUA)	Kg	40,00	2,76	110,40000	-		-			-	
638	TRATAMIENTO PINTURA ESTRUCTURA ACERO A36 (FONDO+PINTURA ANTICORROSIVA), A COMPRESOR	Kg	40,00	0,11	4,40000	-		-			-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES											
639	ENLUCIDO CON IMPERMEABILIZANTE MORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	69,83	10,27	717,15410	-	52,53	52,53		539,43	539,430	75,22
640	CERAMICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EMP	m2	69,83	26,06	1.819,76980	-	52,53	52,53		1.368,80	1.368,800	75,22
641	PINTURA DE CAUCHO SATINADO COLOR (2 MANOS) INTER. <GUIA IMAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	15,00	4,72	70,80000	-	12,42	12,42		58,62	58,620	82,80
642	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm MARCO ANG. 25 por 3 mm	u	2,00	75,58	151,16000	-		-			-	
	TANQUES DE RESERVA DE AGUA-CISTERNAS 36 M3(REUTILIZACION AGUA LLUVIA)											
	PRELIMINARES											

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23(100%)

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
643	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1,14		-		-			-	
644	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2		1,46		-		-			-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
645	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-			-	
646	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3		4,18		-		-			-	
647	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	m2		11,56		-		-			-	
648	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3		13,72		-		-			-	
649	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3		6,32		-		-			-	
	HORMIGONES											
650	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3		163,18		-		-			-	
651	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRANSPORTE	m3		249,88		-		-			-	
	ACERO ESTRUCTURAL											
652	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg		1,68		-		-			-	
653	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg		2,76		-		-			-	
654	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg		0,11		-		-			-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES											
655	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2		10,27		-		-			-	
656	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2		26,06		-		-			-	
657	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2		4,72		-		-			-	
658	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u		75,58		-		-			-	
	TANQUES DE RESERVA DE AGUA-CISTERNAS 20 M3(REUTILIZACION AGUA LLUVIA)											
	PRELIMINARES											
659	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1,14		-		-			-	
660	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2		1,46		-		-			-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
661	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-			-	
662	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3		4,18		-		-			-	
663	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	m2		11,56		-		-			-	
664	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3		13,72		-		-			-	
665	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3		6,32		-		-			-	
	HORMIGONES											
666	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3		163,18		-		-			-	
667	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRANSPORTE	m3		249,88		-		-			-	
	ACERO ESTRUCTURAL											
668	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg		1,68		-		-			-	
669	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg		2,76		-		-			-	
670	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg		0,11		-		-			-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES											
671	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2		10,27		-		-			-	
672	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2		26,06		-		-			-	
673	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2		4,72		-		-			-	
674	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u		75,58		-		-			-	
	TRAMPA DE GRASAS											
675	TRAmPA DE GRASAS 0.60 por 1.40 por H=1.70 (F'C= 210 KG/Cm2), INC. ACCESORIOS	u		161,89		-		-			-	
676	SumINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA H.F. (1.00 por 0.40 por 0.05)110 KG	u		130,84		-		-			-	
677	CANAL. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 , E= 10Cm + 1Ø10mm A 12Cm	m		90,42		-		-			-	
	12.- SISTEMA DE ING. MECANICA (CLIMATIZACIÓN, AIRE PRESURIZADO, ELEVADORES HIDRAULICO, CABINA PINTURA											

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23(100%)

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN											
678	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 9,500 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CON	u		1.235,36		-		-			-	
679	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 12000 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CON	u		1.318,07		-		-			-	
680	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 18000 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CON	u		1.349,08		-		-			-	
681	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 24,000 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CO	u	2,00	1.504,15	3.008,30000	2,00		2,00	3.008,30		3.008,300	100,00%
682	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 30,000 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CO	u		1.561,01		-		-			-	
683	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 36,000 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CO	u	5,00	1.767,77	8.838,85000	5,00		5,00	8.838,85		8.838,850	100,00%
684	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 1/4 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉRmICO	m	60,00	11,74	704,40000	49,45		49,45	580,54		580,540	82,42%
685	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 1/2 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉRmICO	m	68,00	12,29	835,72000	49,45		49,45	607,74		607,740	72,72%
686	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 3/4 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉRmICO	m	8,00	18,29	146,32000	6,33		6,33	115,78		115,780	79,13%
687	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 5/8 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉRmICO	m	50,00	15,65	782,50000	50,00		50,00	782,50		782,500	100,00%
688	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 3/8 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTOTÉRmICO	m	50,00	11,96	598,00000	50,00		50,00	598,00		598,000	100,00%
689	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 1-1/8 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉRmICO	m	28,00	30,40	851,20000	22,43		22,43	681,87		681,870	80,11%
690	SOPORTE DE TuBERÍA DE COBRE	u	45,00	14,95	672,75000	45,00		45,00	672,75		672,750	100,00%
691	TuBERIA PVC DIAmETRO 50 mm	m	260,00	7,31	1.900,60000	49,34		49,34	360,64		360,640	18,98%
692	TuBERIA PVC DIAmETRO 75 mm	m	20,00	7,42	148,40000	-		-			-	
693	DuCTO DE TOL TOLGALVANIZADO	Kg		5,81		-		-			-	
694	REJILLA EXTRACCIÓN/SumINISTRO TIPO LOuVER CON ALETASFIJAS DE ACERO 12X12,INCLuYE CAJA mETALICA	u		83,69		-		-			-	
695	REJILLA SumINISTRO TIPO LOuVER CON ALETAS mÓVILES Y FIJAS DE ACERO 12X12,INCLuYE CAJA mETALICA	u		95,12		-		-			-	
696	DuCTO FLEXIBLE DIÁmETRO 6"	u		13,60		-		-			-	
697	DuCTO FLEXIBLE DIÁmETRO 4"	u		13,36		-		-			-	
698	VENTILADOR CENTRIFuGO EN LÍNEA PARA TumBADO 2500 CFm @ 0.35 PLG. H2O,1,5 HP	u		1.515,23		-		-			-	
699	VENTILADOR CENTRIFuGO EN LÍNEA PARA TumBADO 1700 CFm @ 0.32 PLG. H2O,1HP	u		1.401,52		-		-			-	
700	VENTILADOR CENTRIFuGO TIPO DOWNBLAST PARA TECHO 500 CFm @ 0.32 PLG. H2O,1,4HP	u		1.378,78		-		-			-	
701	uNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR TIPO VRV, DC INVERTER, 118,000 BTu/H	u	2,00	9.376,49	18.752,98000	2,00		2,00	18.752,98		18.752,980	100,00%
702	uNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR TIPO VRV, DC INVERTER, 140,000 BTu/H	u		10.286,22		-		-			-	
703	uNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR TIPO VRV, DC INVERTER, 158,000 BTu/H	u		12.426,17		-		-			-	
704	uNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR TIPO VRV, DC INVERTER, 188,000 BTu/H	u		11.754,19		-		-			-	
705	CONTROL CENTRALIZADO PARA LAS uNIDADES CONDENSADORAS	u	1,00	2.505,01	2.505,01000	1,00		1,00	2.505,01		2.505,010	100%
706	S. I. EXTRACTOR EÓLICO INDuSTRIAL,TuRBINA=112 Cm, DuCTO 61Cm; ALTuRA=85Cm,ASPAS ALumINIO BASE GALVA	u	50,00	326,58	16.329,00000	10,00		10,00	3.265,80		3.265,800	20,00%
	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO											
707	COmPRESOR DE AIRE DE PISTÓN 15 HP, CuATRO PISTONES, LuBRICACIÓN CON ACEITE,220 V, TRIFASICO, 60 HZ	m	2,00	5.513,68	11.027,36000	-		-			-	
708	TuBERIA DE COBRE DIAmETRO 1-1/2 PLG. TIPO L, SOLDADA	m	380,00	33,29	12.650,20000	-		-			-	
709	TuBERIA DE COBREDIAmETRO 1/2 PLG. TIPO L, SOLDADA	m	100,00	10,49	1.049,00000	-		-			-	
710	VÁLVuLAS DE BOLA DE 1/2 PLG DE BRONCE	m	25,00	10,80	280,80000	-		-			-	
711	SOPORTE DE TuBERÍA DE COBRE	u	70,00	14,95	1.046,50000	-		-			-	
	CABINA PARA PINTURA											
712	Sum E INST. CABINA PARA PINTuRA HORNO ANCHO=3.68, ALTO=3.275, LARGO=6.80; ESPESOR PARED 40mm, NOmINAL	u	1,00	38.677,92	38.677,92000	-		-			-	
	ELEVADOR HIDRAULICO											
713	ELEVADOR HIDRAuLICO mOVIL TIPO 4 COLumNAS, ST 1075, CAP=16500 LBS, ALT ELEVACION =73", 3 HP/4HP POR C	u	1,00	43.151,04	43.151,04000	1,00		1,00	43.151,04		43.151,040	100,00%
	13.- SISTEMA ELECTRONICO, VOZ, DATOS, INCENDIOS)						**SD**					
	CANALIZACION											

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23(100%)

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
714	POZO DE REVISION 60X60X60Cm	u	23,00	158,53	3.646,19000	23,00		23,00	3.646,19		3.646,190	100,00%
715	BANDEJA TIPO ESCALERILLA 10CmX8Cm INCLuYE ACCESORIOS	m	172,00	46,57	8.010,04000	162,45	4,00	166,45	7.565,30	186,28	7.751,580	96,77%
716	BANDEJA TIPO ESCALERILLA 25CmX10Cm INCLuYE ACCESORIOS	m	324,00	100,74	32.639,76000	252,24		252,24	25.410,67		25.410,670	77,85%
717	TuBERIA PVC REFORZADA 4"	m	780,00	20,27	15.810,60000	366,00		366,00	7.418,82		7.418,820	46,92
718	TuBERÍA CONDuIT EmT 1/2" DE DIÁmETRO INCLuIDO ACCESORIOS	m	50,00	7,21	360,50000	-		-			-	
719	TuBERÍA CONDuIT EmT 3/4" DE DIÁmETRO INCLuIDO ACCESORIOS	m	50,00	16,51	825,50000	-		-			-	
720	TuBERÍA CONDuIT EmT 1" DE DIÁmETRO INCLuIDO ACCESORIOS	m	120,00	19,19	2.302,80000	120,00		120,00	2.302,80		2.302,800	100,00%
721	POSTE mETALICO	u		923,51		-		-			-	
	SISTEMA DE VOZ Y DATOS											
722	PuNTO DE RED DE DATOS CON CABLE FTP 6A	u	197,00	151,66	29.877,02000	197,00		197,00	29.877,02		29.877,020	100,00%
723	RACK DE SALA DE EQuIPOS TIPO ARmARIO 42 uR	u	1,00	1.817,12	1.817,12000	1,00		1,00	1.817,12		1.817,120	100,00%
724	RACK DE SALA DE COmuNICACIONES TIPO ARmARIO 42 uR	u	1,00	1.617,13	1.617,13000	1,00		1,00	1.617,13		1.617,130	100,00%
725	RACK DE SALA DE COmuNICACIONES TIPO ARmARIO 12 uR	u	3,00	742,45	2.227,35000	3,00		3,00	2.227,35		2.227,350	100,00%
726	PATCH PANEL 24 PuERTOS RJ45 CATEGORIA 6A BLINDADO mODuLAR	u	12,00	213,78	2.565,36000	12,00		12,00	2.565,36		2.565,360	100,00%
727	PATCH COORD CATEGORIA 6A FTP 1 m	u	197,00	20,17	3.973,49000	197,00		197,00	3.973,49		3.973,490	100,00%
728	PATCH COORD CATEGORIA 6A FTP 10 PIES	u	197,00	21,78	4.290,66000	197,00		197,00	4.290,66		4.290,660	100,00%
729	VERIFICACION Y PRuEBAS DE CATEGORIA	u	197,00	18,92	3.727,24000	197,00		197,00	3.727,24		3.727,240	100,00%
730	SWITCH 24 PuERTOS RJ45, CAPA 2, POE, mODuLAR SFP+	u	8,00	1.753,78	14.030,24000	8,00		8,00	14.030,24		14.030,240	100,00%
731	SWITCH 24 PuERTOS RJ45, CAPA 2, mODuLAR SFP+	u	4,00	1.042,64	4.170,56000	4,00		4,00	4.170,56		4.170,560	100,00%
732	SWITCH 24 PuERTOS RJ45, CAPA 3, POE, mODuLAR SFP+	u	1,00	1.410,88	1.410,88000	1,00		1,00	1.410,88		1.410,880	100,00%
733	mODuLO PARA SWITCH CON 2 PuERTOS DE 10 GBPS PARA STACK	u	2,00	2.555,02	5.110,04000	-		-			-	
734	CABLE FLEXIBLE PARA STACK CON 2 CONECTORES DE 10 GBPS	u	8,00	454,27	3.634,16000	8,00		8,00	3.634,16		3.634,160	100,00%
735	mODuLO PARA SWITCH CON 2 PORTICOS DE 10GBPS (SFP+)	u	2,00	2.557,78	5.115,56000	-		-			-	
736	TRANSCEIVER DE 10 GBPS (SFP+)	u	8,00	3.317,76	26.542,08000	8,00		8,00	26.542,08		26.542,080	100,00%
737	PATCH COORD DE FIBRA OPTICA 3mT	u	10,00	62,35	623,50000	10,00		10,00	623,50		623,500	100,00%
738	ACCES POINT	u	9,00	643,76	5.793,84000	9,00		9,00	5.793,84		5.793,840	100,00%
739	CONTROLADOR DE RED INALAmBRICA	u	2,00	4.213,78	8.427,56000	2,00		2,00	8.427,56		8.427,560	100,00%
740	FIBRA OPTICA muLTImODO 6 HILOS	u	500,00	15,04	7.520,00000	500,00		500,00	7.520,00		7.520,000	100,00%
741	BANDEJA DE FIBRA OPTICA 12 PuERTOS CON CONECTORES LC	u	1,00	411,79	411,79000	1,00		1,00	411,79		411,790	100,00%
742	BANDEJA DE FIBRA OPTICA 6 PuERTOS	u	4,00	263,96	1.055,84000	4,00		4,00	1.055,84		1.055,840	100,00%
743	FuSIONADO DE FIBRA OPTICA INCLuYE PIGTAIL Y CERTIFICACION	u	10,00	98,34	983,40000	10,00		10,00	983,40		983,400	100,00%
744	PuERTA ANTI FuEGO	u	2,00	2.765,74	5.531,48000	2,00		2,00	5.531,48		5.531,480	100,00%
745	uPS 15 KVA	u	1,00	6.207,31	6.207,31000	1,00		1,00	6.207,31		6.207,310	100,00%
746	TABLERO BYPASS PARA DATA CENTER	u	1,00	2.070,65	2.070,65000	1,00		1,00	2.070,65		2.070,650	100,00%
747	TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL PARA DATA CENTER	u	1,00	2.236,86	2.236,86000	-		-			-	
748	BORNERA DE INSTALACION A TIERRA PARA RACK	u	5,00	22,92	114,60000	5,00		5,00	114,60		114,600	100,00%
749	BARRA PARA CONEXIÓN A TIERRA 8mmX12mm	u	5,00	48,71	243,55000	1,00		1,00	48,71		48,710	20,00%
750	CABLE THHN No. 6 AWG 19H	u	100,00	17,95	1.795,00000	70,00	30,00	100,00	1.256,50	538,50	1.795,000	100,00%
751	PuNTO DE VIDEO VGA	u	7,00	127,50	892,50000	7,00		7,00	892,50		892,500	100,00%
752	EQuIPO uTm PARA 100 uSuARIOS INCLuYE SISTEmA DE TELEFONÍA	u	1,00	27.174,40	27.174,40000	1,00		1,00	27.174,40		27.174,400	100,00%
753	TELEFONO IP NORmAL	u	41,00	110,92	4.547,72000	41,00		41,00	4.547,72		4.547,720	100,00%
754	TELEFONO IP GERENCIAL	u	4,00	213,78	855,12000	4,00		4,00	855,12		855,120	100,00%
755	PROGRAmACION Y PuESTA EN mARCHA DEL SISTEmA	u	1,00	1.266,70	1.266,70000	1,00		1,00	1.266,70		1.266,700	100,00%
	SISTEMA DE SONORIZACION											
756	CENTRAL DE SONIDO	u	1,00	11.071,93	11.071,93000	1,00		1,00	11.071,93		11.071,930	100,00%
757	PARLANTE DECORATIVO PARA CIELO FALSO CON TRANSFORmADOR DE LINEA	u	24,00	41,20	988,80000	24,00		24,00	988,80		988,800	100,00%
758	ALTAVOZ EXTERIOR30W (BOCINA)	u	8,00	174,70	1.397,60000	8,00		8,00	1.397,60		1.397,600	100,00%
759	PuNTO DE SONIDO	u	32,00	41,17	1.317,44000	32,00		32,00	1.317,44		1.317,440	100,00%
760	PuNTO DE mICROFONO	u	3,00	52,26	156,78000	3,00		3,00	156,78		156,780	100,00%
761	CONTROL DE VOLumEN	u	3,00	145,81	437,43000	3,00		3,00	437,43		437,430	100,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23(100%)

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
762	ALTAVOCES PARA AuDITORIO CON AmPLIFICADOR INCLuIDO 400W	u	4,00	625,13	2.500,52000	4,00		4,00	2.500,52		2.500,520	100,00%
763	PuNTO DE SONIDO PARA AuDITORIO	u	4,00	77,68	310,72000	4,00		4,00	310,72		310,720	100,00%
764	CENTRAL DE SONIDO PARA AuDITORIO	u	1,00	2.236,64	2.236,64000	1,00		1,00	2.236,64		2.236,640	100,00%
765	PROGRAmACION Y PuESTA EN mARCHA DEL SISTEmA DE SONORIZACION	u	1,00	749,33	749,33000	1,00		1,00	749,33		749,330	100,00%
	SISTEMA DE INCENDIO											
766	ESTACION mANuAL DE ALARmA DE EmERGENCIA	u	24,00	93,78	2.250,72000	16,00		16,00	1.500,48		1.500,480	66,67%
767	LuZ ESTROBOSCOPICA	u	24,00	133,78	3.210,72000	16,00		16,00	2.140,48		2.140,480	66,67%
768	DETECTOR DE HumO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE	u	93,00	91,90	8.546,70000	93,00		93,00	8.546,70		8.546,700	100,00%
769	DETECTOR TERmICO DIRECCIONABLE	u	8,00	91,90	735,20000	8,00		8,00	735,20		735,200	100,00%
770	PuNTO DE ALARmAS DE INCENDIO	u	153,00	73,78	11.288,34000	153,00		153,00	11.288,34		11.288,340	100,00%
771	CENTRAL DE INCENDIO DIRECCIONABLE	u	1,00	3.176,64	3.176,64000	1,00		1,00	3.176,64		3.176,640	100,00%
772	mODuLOS DE AISLADORES DE CORTO CIRCuITO	u	5,00	81,40	407,00000	5,00		5,00	407,00		407,000	100,00%
773	mODuLOS DE mONITOREO DE ZONAS	u	4,00	78,54	314,16000	4,00		4,00	314,16		314,160	100,00%
774	ANuNCIADOR REmOTO	u	1,00	438,28	438,28000	1,00		1,00	438,28		438,280	100,00%
775	LAmPARAS DE EmERGENCIA	u	54,00	52,63	2.842,02000	54,00		54,00	2.842,02		2.842,020	100,00%
776	LAmPARAS DE AVISO DE SALIDA	u	16,00	45,78	732,48000	16,00		16,00	732,48		732,480	100,00%
777	FuENTE REmOTA DE ALARmAS DE INCENDIO	u	1,00	797,28	797,28000	1,00		1,00	797,28		797,280	100,00%
778	SEÑALETICA INCENDIOS	u	34,00	26,35	895,90000	17,00		17,00	447,95		447,950	50,00%
779	PROGRAmACION Y PuESTA EN mARCHA EL SISTEmA DE INCENDIO	u	1,00	1.045,26	1.045,26000	1,00		1,00	1.045,26		1.045,260	100,00%
	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS											
780	CERRADuRA ELECTROmAGNETICA 600LB	u	20,00	139,78	2.795,60000	18,00	2,00	20,00	2.516,04	279,56	2.795,600	100,00
781	PuLSANTE DE SALIDA PARA CONTROL DE ACCESOS	u	11,00	29,53	324,83000	11,00	3,00	14,00	324,83	88,59	413,420	127,27
782	LECTOR DE PROXImIDAD CON TECLADO	u	17,00	252,04	4.284,68000	17,00		17,00	4.284,68		4.284,680	100,00%
783	CONTACTO mAGNETICO	u		15,29		-		-			-	
784	CONTROLADOR DE ACCESOS - CONTROL DE COmuNICACIONES	u	5,00	649,13	3.245,65000	5,00		5,00	3.245,65		3.245,650	100,00%
785	TARJETAS PARA CONTROL DE ACCESOS	u	36,00	18,06	650,16000	36,00		36,00	650,16		650,160	100,00%
786	PuNTO PARA ELEmENTOS DE CONTROL DE ACCESOS	u	48,00	47,14	2.262,72000	43,00		43,00	2.027,02		2.027,020	89,58%
787	CABLE EKKX 10 PARES	u	500,00	17,21	8.605,00000	469,10		469,10	8.073,21		8.073,210	93,82%
788	DETECTORES INFRARROJOS	u	35,00	23,94	837,90000	35,00		35,00	837,90		837,900	100,00%
789	SIRENAS Y ALARmAS DE SEGuRIDAD	u	3,00	52,87	158,61000	3,00		3,00	158,61		158,610	100,00%
790	PANEL CONTROLADOR DE ALARmAS	u	2,00	187,58	375,16000	2,00		2,00	375,16		375,160	100,00%
791	PuNTOS DEL SISTEmA DE SEGuRIDAD	u	38,00	75,29	2.861,02000	38,00		38,00	2.861,02		2.861,020	100,00%
792	SEÑALETICA DE ACCESOS	u	4,00	26,35	105,40000	-		-			-	
793	BARRERAS	u		1.929,64		-		-			-	
794	LOOPS	u		134,81		-		-			-	
795	LECTOR BIOmETRICO	u	3,00	207,83	623,49000	3,00		3,00	623,49		623,490	100,00%
796	PROGRAmACION Y PuESTA EN mARCHA EL SISTEmA DE CONTROL DE ACCESOS	u	1,00	690,14	690,14000	1,00		1,00	690,14		690,140	100,00%
	SISTEMA DE CCTV											
797	VIDEOGRABADOR DIGITAL NVR	u	1,00	2.926,25	2.926,25000	1,00		1,00	2.926,25		2.926,250	100,00%
798	mONITOR A COLOR LED FHD 32"	u	1,00	1.601,28	1.601,28000	1,00		1,00	1.601,28		1.601,280	100,00%
799	CAmARA IP DE CCTV FIJA EN DOmO	u	21,00	218,46	4.587,66000	21,00		21,00	4.587,66		4.587,660	100,00%
800	CAmARA IP DE CCTV TIPO BALA	u	2,00	206,92	413,84000	2,00		2,00	413,84		413,840	100,00%
801	CAmARA IP DE CCTV PTZ EN DOmO	u	9,00	728,00	6.552,00000	9,00		9,00	6.552,00		6.552,000	100,00%
802	CAmARAIP 360 (FISHERE)	u	10,00	1.039,01	10.390,10000	8,00		8,00	8.312,08		8.312,080	80,00%
803	CONTROLADOR PARA CAmARA mOVIL CON TECLADO Y JOYSTICK	u	1,00	752,94	752,94000	1,00		1,00	752,94		752,940	100,00%
804	PROGRAMACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS, TASA DE GRABACION, IDENTIFICACION DE AREAS	u	1,00	948,85	948,85000	1,00		1,00	948,85		948,850	100,00%
	SISTEMA DE PANTALLAS INFORMATIVAS											
805	SERVIDOR DEL SISTEmA DE INFORmACION Y TV IP	u	1,00	10.774,19	10.774,19000	1,00		1,00	10.774,19		10.774,190	100,00%
806	CONVERTIDOR NAVEGADOR INTERNET TV	u	1,00	2.084,90	2.084,90000	1,00		1,00	2.084,90		2.084,900	100,00%
807	TELEVISOR LCD 32"	u	7,00	1.601,28	11.208,96000	6,00		6,00	9.607,68		9.607,680	85,71%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23(100%)

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
808	PROGRAmACION Y PuESTA EN mARCHA EL SISTEmA DE PANTALLAS INFORmATIVAS	u	1,00	867,70	867,70000	1,00		1,00	867,70		867,700	100,00%
	14.- CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA Y GARITA						**CB**					
	BATERIA SANITARIA GENERAL JUNTO A ZONA RECREACIONAL											
	PRELIMINARES											
809	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1,14		-		-			-	
810	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2		1,46		-		-			-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
811	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3		4,18		-		-			-	
812	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-			-	
813	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3		17,33		-		-			-	
814	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3		13,72		-		-			-	
815	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3		2,82		-		-			-	
	HORMIGONES											
816	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3		163,18		-		-			-	
817	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF'C = 280KG./Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3		225,97		-		-			-	
818	HORMIGON PREMEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3		283,42		-		-			-	
819	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3		289,16		-		-			-	
820	HORMIGON PREMEZCLADO LOSA/ VIGAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	m3		193,75		-		-			-	
821	BLOQuE ALIVIANADO EN LOSA.E=15X20X40 Cm	u		0,61		-		-			-	
	ACERO ESTRUCTURAL											
822	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg		1,68		-		-			-	
823	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2		4,84		-		-			-	
	CONTRAPISOS											
824	CONTRAPISO HORm.S. PREmEZ. F'C=280KG/Cm2 E= 4 PuLG. (SIN BASE)	m2		21,50		-		-			-	
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS											
825	mASILLADO DE PISOS, ENDuRECEDOR DE CuARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5mm)	m2		5,62		-		-			-	
826	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2		26,06		-		-			-	
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS											
827	mASILLADO E ImPERmEABILIZADO DE PISOS-LOSAS, mORTERO CEmENTO-ARENA 1:3 +(PEGANTE + ImPERm.) LOSAS EXT	m2		10,40		-		-			-	
828	ImPERmEABILIZACION LOSA DE CuBIERTA ImPRImANTE ASFALTICO SOLuBLE AL AGuA	m2		2,84		-		-			-	
829	ImPERmEABILIZACIONLOSA DE CuBIERTA LAmINAS ASFALTICAS	m2		13,85		-		-			-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23(100%)

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	BAJANTES AGUA LLUVIA											
830	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=110mm)	m		8,14		-		-			-	
831	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u		90,42		-		-			-	
832	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m		20,59		-		-			-	
	MAMPOSTERÍA											
833	RIOSTRAS DE H.S. F´C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3		258,83		-		-			-	
834	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=10 Cm	m2		17,71		-		-			-	
835	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2		22,90		-		-			-	
836	PICADO Y RESANADO DE mAmPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m		4,63		-		-			-	
837	mESON H.A. F'C=180 KG/Cm2 E=7 Cm HIERRO (LAVAmANOS+mESON)	m		34,03		-		-			-	
838	REVESTImIENTO mESON GRANITO	m		180,61		-		-			-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES											
839	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2		10,27		-		-			-	
840	ENLuCIDO VERTICAL PALETEADO mORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2		8,78		-		-			-	
841	ENLuCIDO HORIZONTAL PALETEADO mORTERO 1:3	m2		12,30		-		-			-	
842	EmPASTE VERTICAL Y HORIZONTAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2		6,04		-		-			-	
843	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2		4,72		-		-			-	
	CARPINTERIA METALICA											
844	PuERTA mETÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2mm , INC. CERRADuRA, BISAGRAS Y PINTuRA	m2		142,73		-		-			-	
845	PuERTAS mODuLARES, TAmBORADAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, INCLuYE ESTRuCTuRA Y HER	m2		172,30		-		-			-	
846	DIVISIONES ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, TAmBORADAS INCLuYE ESTRuCTuRA, EmPOTRAmIENTO PISO PARED (	m2		161,18		-		-			-	
	VENTANERIA-PUERTAS ALUMINIO VIDRIO											
847	VENTANA CORREDIZA ALumINIO SERIE 200-INCL. VIDRIO LAmINADO 6mm	m2		183,67		-		-			-	
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS											
848	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF DISCAPACITADOS PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u		297,96		-		-			-	
849	PASAmANOS PARA DISCAPACITADOS TuBO DIAm 32mm E=1.5mm EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO SATINADO (Juego)	u		281,03		-		-			-	
850	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u		297,96		-		-			-	
851	uRINARIO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF	u		261,01		-		-			-	
852	LAVABO BLANCO, LLAVE SENSOR mOVImIENTO (CON ACCESORIOS)	u		281,39		-		-			-	
853	DISPENSOR DE PAPEL HIGIENICO DIAm=275mm, ROLLO 70mm, ABATIBLE,ACERO INOX E=8mm, AISI 304. ACABADO S	u		110,71		-		-			-	
854	DISPENSOR DE PAPEL TOALLA 400-600 uNIDADES, 330X273X130mm, ACERO INOX E=8mm AISI 304, ACABADO SATINAD	u		113,00		-		-			-	
855	DISPENSADOR DE JABON LIQuIDO ACERO INOX AISI304, ACABADO SATINADO	u		91,28		-		-			-	
856	ESPEJO DE VIDRIO FLOTADO 4mm- mARCO DE ALumINIO	m2		42,86		-		-			-	
857	SECADOR DE mANOS ACCIONAmIENTO AuTOmATICO 260X302X150mm, ACERO INOX. 304, LAmINA1.5mm 110V-60HZ	u		238,44		-		-			-	
858	BASuRERO CILINDRICO A PEDAL D=250mm H=385 PARA BAÑO ACERO INOX. 304	u		66,60		-		-			-	
859	DuCHAS CON mEZCLADORA (CON ACCESORIOS)	u		135,94		-		-			-	
	GARITAS DE CONTROL											
	PRELIMINARES											
860	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1,14		-		-			-	
861	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	34,81	1,46	50,82260	34,81		34,81	50,82		50,820	99,99%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
862	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	37,47	4,18	156,62460	6,75		6,75	28,22		28,220	18,02%
863	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-			-	
864	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	9,26	17,33	160,47580	-		-			-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23(100%)

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
865	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	23,08	13,72	316,65760	-		-			-	
866	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	37,47	2,82	105,66540	6,75		6,75	19,04		19,040	18,02%
	HORMIGONES											
867	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	1,00	163,18	163,18000	1,00		1,00	163,18		163,180	100,00%
868	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF´C = 280KG./Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	2,00	225,97	451,94000	2,00		2,00	451,94		451,940	100,00%
869	HORMIGON PREMEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	1,13	283,42	320,26460	1,11		1,11	314,60		314,600	98,23%
870	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	0,30	289,16	86,74800	0,18		0,18	52,05		52,050	60,00%
871	HORMIGON PREMEZCLADO LOSA/ VIGAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	m3	5,55	193,75	1.074,62000	4,03		4,03	781,15		781,150	72,69%
872	BLOQuE ALIVIANADO EN LOSA.E=15X20X40 Cm	u		0,61		-		-			-	
	ACERO ESTRUCTURAL											
873	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	836,00	1,68	1.404,48000	836,00		836,00	1.404,48		1.404,480	100,00%
874	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2	77,00	4,84	372,68000	69,31		69,31	335,46		335,460	90,01%
	CONTRAPISOS											
875	CONTRAPISO HORm.S. PREmEZ. F´C=280KG/Cm2 E= 4 PuLG. (SIN BASE)	m2	33,50	21,50	720,25000	25,40		25,40	546,10		546,100	75,82%
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS											
876	mASILLADO DE PISOS, ENDuRECEDOR DE CuARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5mm)	m2		5,62		-		-			-	
877	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	38,00	26,06	990,28000	-	-	-			-	
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS											
878	mASILLADO E ImPERmEABILIZADO DE PISOS-LOSAS, mORTERO CEmENTO-ARENA 1:3 +(PEGANTE + ImPERm.) LOSAS EXT	m2	41,10	10,40	427,44000	-		-			-	
879	ImPERmEABILIZACION LOSA DE CuBIERTA ImPRImANTE ASFALTICO SOLuBLE AL AGuA	m2	41,10	2,84	116,72400	41,10		41,10	116,72		116,720	100,00%
880	ImPERmEABILIZACIONLOSA DE CuBIERTA LAmINAS ASFALTICAS	m2	41,10	13,85	569,23500	41,10		41,10	569,24		569,240	100,00%
	BAJANTES AGUA LLUVIA											
881	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=110mm)	m	10,00	8,14	81,40000	8,14		8,14	66,26		66,260	81,40%
882	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	3,00	90,42	271,26000	2,00		2,00	180,84		180,840	66,67%
883	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m	30,00	20,59	617,70000	-		-			-	
	MAMPOSTERÍA											
884	RIOSTRAS DE H.S. F´C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3	0,61	258,83	157,88630	-		-			-	
885	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=10 Cm	m2		17,71		-		-			-	
886	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2	72,50	22,90	1.660,25000	56,42		56,42	1.292,02		1.292,020	77,82%
887	PICADO Y RESANADO DE mAmPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m	52,36	4,63	242,42680	-	52,36	52,36		242,43	242,430	100,00
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES											
888	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	135,50	10,27	1.391,58500	55,04		55,04	565,22		565,220	40,62%
889	ENLuCIDO VERTICAL PALETEADO mORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2	73,00	8,78	640,94000	57,96		57,96	508,92		508,920	79,40%
890	ENLuCIDO HORIZONTAL PALETEADO mORTERO 1:3	m2		12,30		-		-			-	
891	EmPASTE VERTICAL Y HORIZONTAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	208,50	6,04	1.259,34000	55,04		55,04	332,42		332,420	26,40%
892	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	399,10	4,72	1.883,75200	-		-			-	
	CARPINTERIA METALICA											
893	PuERTA mETÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2mm , INC. CERRADuRA, BISAGRAS Y PINTuRA	m2	14,20	142,73	2.026,76600	-		-			-	
894	PuERTA TAmBORADA 70Cm, ESQuELETO CANELO, mDF 9mm -LACADA-DISEÑO CORPORATIVO	u	4,41	198,79	876,66390	-	4,41	4,41		876,66	876,660	100,00
	VENTANERIA-PUERTAS ALUMINIO VIDRIO											
895	VENTANA CORREDIZA ALumINIO SERIE 200-INCL. VIDRIO LAmINADO 6mm	m2	14,50	183,67	2.663,21500	11,25		11,25	2.065,92		2.065,920	77,57%
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS											
896	INODORO BLANCO (CON ACCESORIOS)	u	3,00	114,30	342,90000	-	2,00	2,00		228,60	228,600	66,67
897	LAVABO BLANCO (CON ACCESORIOS)	u	3,00	115,74	347,22000	-	2,00	2,00		231,48	231,480	66,67
898	DuCHAS (CON ACCESORIOS)	u		50,24		-		-			-	
	15.- CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y PORTONES						CC					
	PRELIMINARES											
899	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	1.765,78	1,14	2.012,98920	-	1.765,78	1.765,78		2.012,99	2.012,990	100,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23(100%)

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
900	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	882,89	1,46	1.289,01940	878,84		878,84	1.283,11		1.283,110	99,54
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
901	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	671,86	4,18	2.808,37480	-	460,51	460,51		1.924,93	1.924,930	68,54
902	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	30,00	17,93	537,90000	-		-			-	
903	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	404,00	13,72	5.542,88000	-	404,00	404,00		5.542,88	5.542,880	100,00
904	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	671,86	2,82	1.894,64520	-	460,51	460,51		1.298,64	1.298,640	68,54
	HORMIGONES											
905	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	9,34	163,18	1.524,10120	8,23	0,51	8,74	1.342,97	83,22	1.426,190	94%
906	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS ClmENTACIÓNF´C = 280KG./Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	15,35	225,97	3.468,63950	15,35		15,35	3.468,64		3.468,640	100
907	HORMIGON PREMEZCLADO CADENAS F´C=280 KG/CM2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	30,84	283,42	8.740,67280	19,61	5,98	25,59	5.557,87	1.694,85	7.252,720	0,83
908	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	89,64	289,16	25.920,30240	13,76	11,77	25,53	3.978,84	3.403,41	7.382,250	0,28
909	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F´C=180 KG/Cm2-50por cientoP)Clm	m3	43,60	169,86	7.405,89600	43,60		43,60	7.405,90		7.405,900	100
	ACERO ESTRUCTURAL											
910	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	5.740,62	1,68	9.644,24160	5.123,17	79,97	5.203,14	8.606,93	134,35	8.741,280	91%
911	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	4.678,00	2,76	12.911,28000	2.075,41	367,72	2.443,13	5.728,13	1.014,91	6.743,040	52,23%
912	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	4.678,00	0,11	514,58000	2.075,41	367,72	2.443,13	228,30	40,45	268,750	52,23%
	MAMPOSTERÍA											
913	RIOSTRAS DE H.S. F´C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3	12,50	258,83	3.235,37500	7,57		7,57	1.959,34		1.959,340	60,56%
914	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2	680,00	22,90	15.572,00000	680,00		680,00	15.572,00		15.572,000	100
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES											
915	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	2.110,10	10,27	21.670,72700	1.996,16		1.996,16	20.500,56		20.500,560	94,60
916	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	2.110,10	5,26	11.099,12600	1.996,16		1.996,16	10.499,80		10.499,800	95
917	TEXTuRADO GRAFIATO GRuESO DE PAREDES, COLOR INSTITuCIONAL GADPPZ	m2	1.112,60	6,04	6.720,10400	559,54		559,54	3.379,62		3.379,620	50,29%
918	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	1.995,00	4,72	9.416,40000	1.995,00		1.995,00	9.416,40		9.416,400	100,00%
	CARPINTERIA METALICA											
919	CERRAmIENTO TuBO ISO2 H.G. 2 "-mALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6mm, INC. PINTuRA A COmPRESOR	m2	1.054,50	36,37	38.352,16500	-		-			-	
920	CERRAMIENTO VERJA DE TUBO AGUA ISO2 HG 2" TUBO RECT 80X40X2, INC. PINTURA COMPRESOR	m2	400,00	70,48	28.192,00000	-		-			-	
921	PORTON CORREDIZO TuBOISO 2 2", mARCO TuBO RECT 50X150X2mm, INC. PINTuRA COmPRESOR	m2	138,40	68,64	9.499,77600	-		-			-	
					8.364.474,94							
	NAVE DE DESECHOS											
	1.- VIAS Y PARQUEADEROS											
	CONSOLIDACION DE PLATAFORMAS											
15	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	m3	537,97	2,92	1570,87	-		-			-	-
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREODE MEJORAMIENTO	m3-km	9.683,46	0,28	2711,37	-		-			-	-
	2.- ESTABILIZACIÓN TALUDES											
	SISTEMA TIERRA ARMADA											
34	GEOTEXTIL TEJIDO- 2400 T PARA MURO DE CONTENCION TIERRA ARMADA	m2	320,00	3,06	979,20	272,80		272,80	834,77		834,770	85,25%
35	GEOMALLA BX-1100 TENSAR	m2	64,40	3,19	205,44	30,00		30,00	95,70		95,700	46,58%
	16. NAVE DE DESECHOS											
	REVESTIMIENTO DE TUMBADOS											
181	CIELO RASO FALSO TIPO GYPSUM PARA HUMEDAD-1/2"-SIN ESTUCAR	m2	115,00	20,04	2304,60	-		-			-	-
	PRELIMINARES											
206	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQUEADERO,Y PLATAFORMAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	347,75	1,46	507,72	-		-			-	-
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
211	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A MAQUINA)	m3	103,04	4,18	430,71	26,08		26,08	117,37		117,370	27,25%
213	SUB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COMPACTADO (MAQUINA), CAPAS 20CM	m3	103,04	17,33	1785,68	103,00		103,00	1.784,99		1.784,990	99,96%
214	RELLENO COMPACTADO A MAQUINA CON LASTRE TNM=8" (EN CAPAS DE 20 CM)	m3	140,54	13,72	1928,21	-		-			-	-

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23(100%)

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
215	DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS	m3	133,95	2,82	377,74	-		-			-	-
	HORMIGONES											
216	HORMIGON PREMEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/CM2 INC. BOMBEO Y TRANSPORTE	m3	3,00	163,18	489,54	3,00		3,00	489,54		489,540	100%
217	HORMIGÓN PREMEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CIMENTACIÓNF'C = 280KG./CM2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	m3	12,00	225,97	2711,64	3,92		3,92	885,80		885,800	32,67%
218	HORMIGON PREMEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/CM2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	12,78	283,42	3622,11	12,78		12,78	3.622,11		3.622,110	100%
219	HORMIGON PREMEZCLADO COLUMNAS F'C=280 KG/CM2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	m3	4,55	289,16	1315,68	-		-			-	
220	HORMIGÓN CICLÓPEO (50POR CIENTO H.S. F'C=180 KG/CM2-50POR CIENTOP)CIM	m3	17,04	169,86	2894,41	-		-			-	-
	ACERO ESTRUCTURAL											
221	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	Kg	4596,88	1,68	7722,76	4.596,88		4.596,88	7.722,76		7.722,760	100,00%
222	PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A (36, 572, 325,193,106) (PROV. MONTAJE GRUA)	Kg	18285	2,76	50466,60	18.285,00		18.285,00	50.466,60		50.466,600	100,00%
223	TRATAMIENTO PINTURA ESTRUCTURA ACERO A36 (FONDO+PINTURA ANTICORROSIVA), A COMPRESOR	Kg	18285	0,11	2011,35	18.285,00		18.285,00	2.011,35		2.011,350	100,00%
224	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15Ø6MM	m2	382,525	4,84	1851,42	344,25		344,25	1.666,17		1.666,170	89,99%
	CONTRAPISOS											
225	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3 (CONTRAPISO E=20CM, COMPAC. 100POR CIENTO P.E.M.)	m3	62,46	10,78	673,32	-		-			-	-
226	MATERIAL DE BASE CLASE 2 (CONTRAPISO E=15CM, COMPAC. 100POR CIENTO P.E.M.)	m3	46,85	24,55	1150,17	30,32		30,32	744,36		744,360	64,72%
227	CONTRAPISO HORM.S. PREMEZ. F'C=280KG/CM2 E= 4 PULG. (SIN BASE)	m2	347,75	21,5	7476,63	-		-			-	-
228	JUNTA ASERRADA DILATACION PISO (INC. CORDON, Y SELLO)	m	90,00	2,59	233,10	-		-			-	-
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS											
229	MASILLADO DE PISOS, ENDURECEDOR DE CUARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5MM)	m2	347,75	5,62	1954,36	344,25		344,25	1.934,69		1.934,690	98,99%
230	PINTURA EPOXICA PISO INDUSTRIAL 3MM (2 COMPONENTES)	m2	310,00	34,78	10781,80	310,00		310,00	10.781,80		10.781,800	100%
232	CERAMICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EMP	m2	94,00	26,06	2449,64	66,63		66,63	1.736,38		1.736,380	70,88%
	CUBIERTA											
235	CUBIERTA GALVALUMEN E=0.45MM, RECUBRIENTO PINTURA POLIESTER ASTM-653A (COLOR INSTITUCIONAL), INC, PER	m2	486,35	13,92	6769,99	446,90		446,90	6.220,85		6.220,850	91,89%
237	CUMBRERO GALVALUMEN E=0,40 MM A=0.50 M, INC. ACCES. INSTALACION	m	35,50	8,38	297,49	35,20		35,20	294,98		294,980	99,16%
238	CANAL TOL GALV E= 0.70MM, H=30CM, A=40CM DESARR. 122 CM, INC. GANCHOS	m	71,00	21,49	1525,79	70,40		70,40	1.512,90		1.512,900	99,16%
	BAJANTES AGUA LLUVIA											
239	BAJANTES DE AGUA LLUVIA (PVC DIAM. INT=160MM)	m	70,00	9,91	693,70	29,96		29,96	296,90		296,900	42,80%
240	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/CM²0.60 POR 0.60 CON TAPA E= 7CM + 1Ø10MM A 12CM	u	10,00	90,42	904,20	8,00		8,00	723,36		723,360	80,00%
242	SUMIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO DIAM. INT.= 200A 160MM PVC Y/O POLIETILENO	u	1,00	20,71	20,71	-		-			-	-
	MAMPOSTERÍA											
243	RIOSTRAS DE H.S. F'C=240KG/CM2 INC. ENCOFRADO	m3	8,48	258,83	2194,88	4,42		4,42	1.144,03		1.144,030	52,12%
244	MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO VIBRADO 4MPAE=10 CM	m2	20,00	17,71	354,20	17,58		17,58	311,34		311,340	87,90%
245	MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO VIBRADO 4MPAE=15 CM	m2	490,00	22,90	11221,00	411,38		411,38	9.420,60		9.420,600	83,96%
246	PICADO Y RESANADO DE MAMPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m	120,00	4,63	555,60	-	120,00	120,00		555,60	555,600	100%
247	MESON H.A. F'C=180 KG/CM2 E=7 CM HIERRO (LAVAMANOS+MESON)	m	3,50	34,03	119,11	-	3,30	3,30		112,30	112,300	94%
248	REVESTIMIENTO MESON GRANITO	m	3,50	180,61	632,14	-	3,50	3,50		632,14	632,140	100%
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES											
249	ENLUCIDO CON IMPERMEABILIZANTE MORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	392,72	10,27	4033,23	251,76		251,76	2.585,58		2.585,580	64,11%
250	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO MORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2	450,00	8,78	3951,00	450,00		450,00	3.951,00		3.951,000	100%
251	ENLUCIDO CON MALLA+ IMPERMEABILIZANTE, MORTERO 1:3	m2	25,00	17,03	425,75	-		-			-	-
252	EMPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	392,72	5,26	2065,71	251,76		251,76	1.324,26		1.324,260	64%
253	EMPASTE VERTICAL (ACRILICO INTERIOR) INC. FILOS	m2	475,00	4,40	2090,00	475,00		475,00	2.090,00		2.090,000	100%
254	PINTURA DE CAUCHO SATINADO COLOR (2 MANOS) INTER. <GUIA IMAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	475,00	4,72	2242,00	475,00		475,00	2.242,00		2.242,000	100%
255	PINTURA DE CAUCHO SATINADA COLOR(2 MANOS) EXTERIOR (CANASTILLA) <GUIA IMAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	392,72	5,72	2246,36	332,28		332,28	1.900,64		1.900,640	84,61%
	CARPINTERIA METALICA											
257	VENTANA FIJA TUBO RECT 40X80X2-MALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6MM, INC PINTURA ANTICORROSIVA, A COMPRESOR	m2	39,06	41,3	1613,18	39,06		39,06	1.613,18		1.613,180	100%
258	PORTON TIPO CORREDIZO RETRACTIL TUBO RECT 40X80X2MM-TOOL GALV. 0.6MM	m2	4,40	61,25	269,50	-		-			-	-
259	PUERTA METÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2MM , INC. CERRADURA, BISAGRAS Y PINTURA	m2	40,000	142,730	5709,20	-	36,00	36,00		5.138,28	5.138,280	90,00%
260	PUERTAS MODULARES, TAMBORADAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE E=1MM AISI 304, INCLUYE ESTRUCTURA Y HER	m2	1,00	172,30	172,30	-	1,00	1,00		172,30	172,300	100,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23(100%)

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	REVESTIMIENTO DE TUMBADOS											
264	CIELO RASO FALSO - FIBRA MINERAL Y RECUB LÁMINA ALUMINIO 0.60X0.60 BLANCO, TIPO AMSTRONG O SIMILAR	m2	324,75	21,59	7011,35	-		-			-	-
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS											
268	INODORO CON FLUXOMETRO LATON CROMADA 1.0 GPF PRIMERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u	1,00	297,96	297,96	1,00		1,00	297,96		297,960	100%
270	LAVABO BLANCO, LLAVE SENSOR MOVIMIENTO (CON ACCESORIOS)	u	2,00	281,39	562,78	2,00		2,00	562,78		562,780	100%
271	DISPENSOR DE PAPEL HIGIENICO DIAM=275MM, ROLLO 70MM, ABATIBLE,ACERO INOX E=8MM, AISI 304. ACABADO S	u	1,00	110,71	110,71	-	1,00	1,00		110,71	110,710	100,00%
272	DISPENSOR DE PAPEL TOALLA 400-600 UNIDADES, 330X273X130MM, ACERO INOX E=8MM AISI 304, ACABADO SATINAD	u	1,00	113,00	113,00	-	1,00	1,00		113,00	113,000	100,00%
273	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOX AISI304, ACABADO SATINADO	u	1,00	91,28	91,28	-	1,00	1,00		91,28	91,280	100,00%
274	ESPEJO DE VIDRIO FLOTADO 4MM- MARCO DE ALUMINIO	m2	2,70	42,86	115,72	-	2,70	2,70		115,72	115,720	100,00%
276	BASURERO CILINDRICO A PEDAL D=250MM H=385 PARA BAÑO ACERO INOX. 304	u	1,00	66,60	66,60	-	1,00	1,00		66,60	66,600	100,00%
277	DUCHAS CON MEZCLADORA (CON ACCESORIOS)	u	1,00	135,94	135,94	-	1,00	1,00		135,94	135,940	100,00%
	10.- SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACIÓN											
	POZOS DE REVISION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS											
305	CAJA REVISION MEDIA TENSION 60X60X75,ACERA, T/HA	u	1,00	179,17	179,17	-		-			-	-
306	PUESTA A TIERRA SIMPLE EN POZO ELECTRICO CON SUELDA EXOTERMICA	u	1,0	164,5	164,46	-		-			-	-
	INSTALACION LUMINARIAS											
362	CAJETINES METALICOS OCTOGONALES MEDIANOS CON TAPA	u	30,00	5,44	163,20	30,00		30,00	163,20		163,200	100,00%
	INSTALACION LUMINARIAS											
427	TUBERIA EMT 1/2 PULGADA	m	70,00	3,34	233,80	70,00		70,00	233,80		233,800	100,00%
428	UNION EMT 1/2 PULGADA	u	40,00	1,18	47,20	37,00		37,00	43,66		43,660	92,50%
429	CONECTOR EMT 1/2 PULGADA	u	60,00	0,56	33,60	60,00		60,00	33,60		33,600	100,00%
430	FIJACION DE TUBOS EN LOZA CON GRAPA METALICA EMT 1/2 PULGADA	u	30,00	4,87	146,10	30,00		30,00	146,10		146,100	100,00%
431	CAJETINES METALICOS RECTANGULARES PROFUNDOS	u	10,00	1,57	15,70	5,00		5,00	7,85		7,850	50,00%
432	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AMARILLO (INC. TAYPE)	m	70,00	2,28	159,60	70,00		70,00	159,60		159,600	100,00%
433	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	70,00	1,43	100,10	70,00		70,00	100,10		100,100	100,00%
434	LUMINARIA LED3X18W/120 VOLTIOS	u	30,00	60,59	1817,70	17,00		17,00	1.030,03		1.030,030	56,67%
437	INTERRUPTOR SIMPLE CON TAPA	u	7,00	5,47	38,29	5,00		5,00	27,35		27,350	71,43%
	TOMACORRIENTES GENERALES											
438	TUBERIA EMT 1/2 PULGADA	m	50,00	3,34	167,00	41,91		41,91	139,98		139,980	83,82%
439	UNION EMT 1/2 PULGADA	u	15,00	1,18	17,70	15,00		15,00	17,70		17,700	100,00%
440	CONECTOR EMT 1/2 PULGADA	u	10,00	0,56	5,60	10,00		10,00	5,60		5,600	100,00%
441	FIJACION DE TUBOS EN LOZA CON GRAPA METALICA EMT 1/2 PULGADA	u	10,00	4,87	48,70	10,00		10,00	48,70		48,700	100,00%
442	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZUL (INC. TAYPE)	m	50,00	1,43	71,50	50,00		50,00	71,50		71,500	100,00%
443	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	50,00	1,43	71,50	50,00		50,00	71,50		71,500	100,00%
444	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	50,00	1,03	51,50	50,00		50,00	51,50		51,500	100,00%
445	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	13,00	7,45	96,85	4,00		4,00	29,80		29,800	30,77%
446	CAJETINES METALICOS RECTANGULARES PROFUNDOS	u	13,00	1,57	20,41	4,00		4,00	6,28		6,280	30,77%
	ALIMENTADORES Y SUBTABLEROS CT-1											
	ALIMENTADOR TPD-STE-ANGAR-A4											
509	TENDIDO DE CABLE NO. 3X5+6 CU TW (INC. TAYPE)	m	20,00	14,51	290,20	-		-			-	-
510	SUBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS ANGAR 4	u	1,00	173,41	173,41	1,00		1,00	173,41		173,410	100%
	11.- SISTEMA HIDRAULICO SANITARIO Y CONTRAINCENDIOS											
	SITEMA DE AGUA POTABLE A PRESIÓN CONSTANTE											
	TUBERIA PVC AGUA POTABLE											
533	TUBERIA PVC ROSCABLE D=1/2" EN EDIFICACION+PRUEBA	m	12,00	5,86	70,32	-		-			-	-
535	TUBERIA PVC ROSCABLE D=1" EN EDIFICACION+PRUEBA	m	45,00	9,78	440,10	-		-			-	-
	ACCESORIOS INST. TUB PVC ROSCABLE AGUA POTABLE											
541	ANCLAJES METALICOS PLATINA 2 POR 1/2" (ABRAZADERAS), EN LOSA Y PARED	u	10,00	14,11	141,10	-		-			-	-
542	S.I. PUNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGUA POR PUNTO	u	2,00	13,67	27,34	-		-			-	-
	EXTINTORES											
565	EXTINTOR PQS CAPACIDAD 10 LBS. CON CAJA METALICA	u	1,00	99,84	99,84	-		-			-	-
568	EXTINTOR CO2 CAPACIDAD 20 LBS. CON CAJA METALICA	u	1,00	313,27	313,27	-		-			-	-

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23(100%)

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	SISTEMA SANITARIO INTERNO											
	PRELIMINARES Y MOV. TIERRAS											
601	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	2,00	17,93	35,86	-		-			-	-
602	RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL (CAPAS 20 CM)	m3	3,00	6,32	18,96	-		-			-	-
	INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE											
603	PUNTO DE DESAGUE EN PVC 50 MM	u	3,00	28,80	86,40	-		-			-	-
604	PUNTO DE DESAGUE EN PVC 110 MM	u	1,00	34,43	34,43	-		-			-	-
605	TUBERÍA PVC 50 MM DE DIÁMETRO (MAT/TRASP/INST)	m	12,0	5,1	61,68	-		-			-	-
606	TUBERÍA PVC 110 MM DE DIÁMETRO (MAT/TRASP/INST)	m	5,00	8,02	40,10	-		-			-	-
607	TUBERÍA PVC 160 MM DE DIÁMETRO (MAT/TRASP/INST)	m	18,00	14,52	261,36	-		-			-	-
608	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/CM^0.60 POR 0.60 CON TAPA E= 7CM + 1Ø10MM A 12CM	u	1,00	90,42	90,42	-		-			-	-
	INSTALACION TUBERIA PVC DEVENTILACIÓN											
609	TUBERIA PVC D=75 MM VENTILACIÓN	m	6,00	4,27	25,62	-		-			-	-
610	PUNTO DE VENTILACIÓN PVC 75 MM POR PUNTO	u	1,00	15,61	15,61	-		-			-	-
	13.- SISTEMA ELECTRONICO, VOZ, DATOS, INCENDIOS)											
	CANALIZACION											
714	POZO DE REVISION 60X60X60CM	u	1,0	158,5	158,53	-		-			-	-
715	BANDEJA TIPO ESCALERILLA 10CMX8CM INCLUYE ACCESORIOS	m	25,0	46,6	1164,25	-		-			-	-
717	TUBERIA PVC REFORZADA 4"	m	15,00	20,27	304,05	-		-			-	-
719	TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4" DE DIÁMETRO INCLUIDO ACCESORIOS	m	40,00	16,51	660,40	-		-			-	-
	SISTEMA DE INCENDIO											
766	ESTACION MANUAL DE ALARMA DE EMERGENCIA	u	1,00	93,78	93,78	-		-			-	-
767	LUZ ESTROBOSCOPICA	u	1,00	133,78	133,78	-		-			-	-
768	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE	u	3,00	91,90	275,70	-		-			-	
769	DETECTOR TERMICO DIRECCIONABLE	u	3,00	91,90	275,70	-		-			-	-
770	PUNTO DE ALARMAS DE INCENDIO	u	8,00	73,78	590,24	-		-			-	-
776	LAMPARAS DE AVISO DE SALIDA	u	1,00	45,78	45,78	-		-			-	-
778	SEÑALETICA INCENDIOS	u	1,00	26,35	26,35	-		-			-	-
	NAVE DE RESGUARDO											
	ACERO ESTRUCTURAL											
1	PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A (36, 572, 325,193,108) (PROY. MONTAJE GRUA)	Kg	94474,86	2,76	260750,61	94.474,86		94.474,86	260.750,61		260.750,610	100%
2	TRATAMIENTO PINTURA ESTRUCTURA ACERO A36 (FONDO+PINTURA ANTICORROSIVA), A COMPRESOR	Kg	94474,86	0,11	10392,23	94.474,86		94.474,86	10.392,23		10.392,230	100%
	CONTRAPISOS											
3	JUNTA ASERRADA DILATACION PISO (INC. CORDON, Y SELLO)	m	857,00	2,59	2219,63	581,30		581,30	1.505,57		1.505,570	67,83%
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS											
4	MASILLADO DE PISOS, ENDURECEDOR DE CUARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5MM)	m2	1445,85	5,62	8125,68	1.442,94		1.442,94	8.109,32		8.109,320	99,80%
	CUBIERTA											
5	CUBIERTA GALVALUMEN E=0.45MM, RECUBRIENTO PINTURA POLIESTER ASTM-653A (COLOR INSTITUCIONAL), INC, PER	m2	1660,00	13,92	23107,20	1.660,00		1.660,00	23.107,20		23.107,200	100%
6	CUBIERTA POLICARBONATO E=0.80 MM, COLOR BRONCE O SIMILAR, INC. ACCESORIOS INSTALCION	m2	190,00	14,34	2724,60	94,85		94,85	1.360,15		1.360,150	49,92%
7	CUMBRERO GALVALUMEN E=0.40 MM A=0.50 M, INC. ACCES. INSTALACION	m	43,25	8,38	362,44	43,25		43,25	362,44		362,440	100%
8	CANAL TOL GALV E= 0.70MM, H=30CM, A=40CM DESARR. 122 CM, INC. GANCHOS	m	86,50	21,49	1858,89	86,50		86,50	1.858,89		1.858,890	100%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23(100%)

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS											
RN-1	GROUTING DE NIVELACIÓN	M3	3,35	$ 1.634,03	$ 5.474,00	3,35		3,35	5.474,00		5.474,000	100%
RN-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE ASTM 193 B7	U	1416,00	$ 49,44	$ 70.007,04	1.416,00		1.416,00	70.007,04		70.007,040	100%
RN-3	BORDILLO DE H.S 180 KG/CM2 TIPO CUNETA	ML	2261,84	$ 23,58	$ 53.334,19	1.294,71		1.294,71	30.529,26		30.529,260	57,24%
RN-4	ACERAS DE H.S. F'C=180KG/CM2 E=7CM, ESCOBILLADA.	M2	3878,20	$ 18,85	$ 73.104,07	2.616,27	171,97	2.788,24	49.316,69	3.241,63	52.558,320	71,90%
RN-5	ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACIÓN	L	19492,62	$ 0,85	$ 16.568,73	-		-			-	-
RN-6	CAPA DE RODADURA HORMIGÓN ASFÁLTICO MEZCLADO EN PLANTA, E=3".	M2	12995,08	$ 12,53	$ 162.828,35	-		-			-	-
RN-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO DE 500KG EN PUERTA DE INGRESO DE CERRAMIENTO	U	4,00	$ 1.081,08	$ 4.324,32	-	4,00	4,00		4.324,32	4.324,320	100%
RN-8	PINTURA DE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN EN PARQUEADEROS Y PASOS PEATONALES	ML	669,42	$ 0,62	$ 415,04	-		-			-	-
RN-9	TOPES PARA ESTACIONAMIENTO H.S = 180 KG/CM2 . INCLUYE PINTURA REFLECTIVA	U	88,00	$ 12,91	$ 1.136,08	-	88,00	88,00		1.136,08	1.136,080	100,00%
RN-10	JARDINERAS DE H.S= 180KG/CM2	ML	26,00	$ 15,02	$ 390,52	-		-			-	-
RN-11	PLANTAS ORNAMENTALES	ML	26,00	$ 10,99	$ 285,74	-	26,00	26,00		285,74	285,740	100,00%
RN-12	PALMERAS BOTELLAS ENANAS	U	7,00	$ 34,74	$ 243,18	-	7,00	7,00		243,18	243,180	100,00%
RN-13	TAPAJUNTA DE ALUMINIO PISO-PISO A= 15CM	ML	35,00	$ 16,25	$ 568,75	-		-			-	-
RN-14	TAPAJUNTA DE ALUMINIO PISO-PARED A= 15CM EN INTERIORES	ML	65,00	$ 16,90	$ 1.098,50	-		-			-	-
RN-15	TAPAJUNTA EXTERIOR TOOL GALVANIZADO	ML	40,00	$ 14,53	$ 581,20	-		-			-	-
RN-16	TAPAJUNTA DE HORMIGÓN LOSA-LOSA	ML	56,00	$ 42,28	$ 2.367,68	39,55		39,55	1.672,17		1.672,170	70,62%
RN-17	DUCHA ELÉCTRICA 110 V	U	7,00	$ 29,03	$ 203,21	-	7,00	7,00		203,21	203,210	100,00%
RN-18	LLAVE DE DUCHA	U	7,00	$ 20,90	$ 146,30	-	7,00	7,00		146,30	146,300	100,00%
RN-19	REJILLAS DE PISO 50 MM	U	42,00	$ 4,84	$ 203,28	-	42,00	42,00		203,28	203,280	1,00
RN-20	SUMIDERO DE CUBIERTA DE 110MM INCLUYE REJILLA TIPO CÚPULA	U	20,00	$ 51,11	$ 1.022,20	17,00	3,00	20,00	868,87	153,33	1.022,200	100,00%
RN-21	BORDILLO PARA TINETA DE BAÑO REVESTIDA CON CERÁMICA (0,10MX0,15M)	ML	6,00	$ 16,50	$ 99,00	-	6,00	6,00		99,00	99,000	100,00%
RN-22	MUEBLES AÉREOS DE MDF PARA COCINA	ML	7,00	$ 180,68	$ 1.264,76	-		-			-	-
RN-23	MUEBLES BAJOS DE MDF PARA COCINA	ML	7,00	$ 180,68	$ 1.264,76	-		-			-	-
RN-24	HORMIGÓN PREMEZCLADO PARA LOSA DE PISO F'C=280 KG/CM2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	M3	1204,92	$ 209,28	$ 252.165,66	1.204,92		1.204,92	252.165,66		252.165,660	100%
RN-25	FILOS INTERIORES Y EXTERIORES	ML	830,00	$ 3,76	$ 3.120,80	830,00		830,00	3.120,80		3.120,800	100%
RN-26	ENLUCIDO MEDIAS CAÑAS	ML	960,00	$ 2,28	$ 2.188,80	893,92		893,92	2.038,14		2.038,140	93,12%
RN-27	CUADRADA DE BOQUETES PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	1150,00	$ 4,64	$ 5.336,00	1.024,34		1.024,34	4.752,94		4.752,940	89,07%
RN-28	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON POLIESTIRENO EXPANDIDO 50 MM	M2	530,00	$ 5,64	$ 2.989,20	-		-			-	-
RN-29	JUNTA DE DILATACIÓN TIPO LLAVE - LOSAS DE PISOS	ML	3200,00	$ 2,36	$ 7.552,00	2.873,65		2.873,65	6.781,81		6.781,810	89,80%
RN-30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS EXPANSIVOS 5/8 -6" PARA ANCLAJE DE PLACAS	U	30,00	$ 4,27	$ 128,10	-		-			-	-
RN-31	CHICOTE D=12MM PARA ARRIOSTRAMIENTO DE MAMPOSTERÍA	U	1750,00	$ 1,55	$ 2.712,50	828,00		828,00	1.283,40		1.283,400	47,31%
RN-32	CAJA DE PASO H.S. F'C=180KG/Cm² 0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	U	10,00	$ 52,94	$ 529,40	10,00		10,00	529,40		529,400	100,00%
	ELÉCTRICOS											
RN-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR DE MEDICIÓN - TRAFOMIX	U	1,00	$ 9.602,82	$ 9.602,82	1,00		1,00	9.602,82		9.602,820	100%
RN-34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO METÁLICO PARA DOS CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN	U	4,00	$ 487,88	$ 1.951,52	4,00		4,00	1.951,52		1.951,520	100%
RN-35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO METÁLICO PARA UN CIRCUITO DE ILUMINACIÓN	U	2,00	$ 396,56	$ 793,12	2,00		2,00	793,12		793,120	100%
RN-36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL TDP100KVA	U	1,00	$ 5.982,02	$ 5.982,02	1,00		1,00	5.982,02		5.982,020	100%
RN-37	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL TDP 50KVA	U	2,00	$ 2.431,38	$ 4.862,76	2,00		2,00	4.862,76		4.862,760	100%
RN-38	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE DE HA DE 12MTS 500KG	U	7,00	495,52	$ 3.468,64	7,00		7,00	3.468,64		3.468,640	100%
RN-39	TENDIDO DE CONDUCTOR AL DESNUDO ACSR# 1/0 AWG	M	500,00	$ 2,69	$ 1.345,00	500,00		500,00	1.345,00		1.345,000	100%
RN-40	TENDIDO DE CONDUCTOR AL DESNUDO ACSR# 2 AWG	M	160,00	$ 2,33	$ 372,80	160,00		160,00	372,80		372,800	100%
RN-41	TENDIDO DE CONDUCTOR PREEMSAMBLADO AL AISLADO 2x1/0+1/0 AWG	M	150,00	$ 6,37	$ 955,50	150,00		150,00	955,50		955,500	100%
RN-42	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SUJECCION PARA EL NEUTRO	U	8,00	$ 22,13	$ 177,04	8,00		8,00	177,04		177,040	100%
RN-43	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3F CENTRADA PASANTE 13,8KV - 3CPT	U	3,00	$ 187,73	$ 563,19	3,00		3,00	563,19		563,190	100%
RN-44	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3F CENTRADA DOBLE RETENCION 13,8KV - 3CDT	U	1,00	$ 431,15	$ 431,15	1,00		1,00	431,15		431,150	100%
RN-45	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3F CENTRADA RETENCION O TERMINAL 13,8KV - 3CRT	U	4,00	$ 287,70	$ 1.150,80	4,00		4,00	1.150,80		1.150,800	100%
RN-46	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	U	3,00	$ 31,54	$ 94,62	3,00		3,00	94,62		94,620	100%
RN-47	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	U	4,00	$ 40,08	$ 160,32	4,00		4,00	160,32		160,320	100%
RN-48	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR DOBLE A TIERRA - TTD	U	4,00	$ 116,68	$ 466,72	4,00		4,00	466,72		466,720	100%
RN-49	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION AEREO - SUBTERRANEO PARA BAJO VOLTAJE	U	2,00	$ 243,82	$ 487,64	2,00		2,00	487,64		487,640	100%
RN-50	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED 200W, CON FOTOCELULA, EN POSTE CON RED PREENSABLADA	U	7,00	$ 637,26	$ 4.460,82	7,00		7,00	4.460,82		4.460,820	100%
RN-51	CAJA REVISIÓN MEDIA TENSIÓN 90X90X90 C/VIA, CON TAPA DE HIERRO NODULAR 125 KN	U	20,00	$ 318,78	$ 6.375,60	18,00		18,00	5.738,04		5.738,040	90,00%
RN-52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO DE CONDENSADORES AUTOMATICO DE 60KVAR, 3F, 230V	U	1,00	$ 10.209,14	$ 10.209,14	1,00		1,00	10.209,14		10.209,140	100%
RN-53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO DE CONDENSADORES AUTOMATICO DE 30KVAR, 3F, 230V	U	1,00	$ 7.969,49	$ 7.969,49	1,00		1,00	7.969,49		7.969,490	100%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23(100%)

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	CLIMATIZACIÓN											
RN-54	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE PARED INVERTER CAPACIDAD DE 18.000 BTU/H , INCLUYE COMPRESOR	U	2,00	$ 1.728,67	$ 3.457,34	2,00		2,00	3.457,34		3.457,340	100%
RN-55	EXTRACTOR DE OLORES EN BAÑOS 6"X6"	U	20,00	$ 42,70	$ 854,00	18,00		18,00	768,60		768,600	90,00%
	PAREDES INDUSTRIALES											
RN-56	PAREDES DE GALVALUMEN E=0.45mm, RECUBRIMIENTO PINTURA POLIESTER ASTm-653A (COLOR INSTITUCIONAL).	M2	1849,90	$ 16,19	$ 29.949,88	1.849,90		1.849,90	29.949,88		29.949,880	100,00%
RN-57	CERRAMIENTO TuBO H.G. 2 "-mALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6mm, INC. PINTuRA A COmPRESOR	M2	1054,50	$ 22,99	$ 24.242,96	898,96	143,51	1.042,47	20.667,09	3.299,29	23.966,380	98,86%
RN-58	CERRAMIENTO VERJA DE TuBO HG 2" Y TuBO RECT 80X40X2, INC. PINTuRA COmPRESOR	M2	400,00	$ 60,18	$ 24.072,00	223,20	92,88	316,08	13.432,18	5.589,52	19.021,700	79,02%
RN-59	RECuBRIMIENTO ALumINIO COLOR CYAN O SImILAR, ALuCuBOND 4mm INC. ESTRuCT. E INST<GuÍA ImAGEN CORPORATI	M2	1315,00	$ 67,32	$ 88.525,80	800,87	176,53	977,40	53.914,57	11.884,00	65.798,570	74,33%
	MONTO TOTAL				9.622.634,22				8.270.882,09	147.128,54	8.418.010,63	87,48%

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	9-may.-19		
FIN PLAZO CONTRACTUAL	8-may.-20		
SUSPENSION DIAS	60	DIAS	
SUSPENSION DIAS	11	DIAS	
AMPLIACIÓN POR PANDEMIA	90	DIAS	
AMPLIACIÓN POR CLIMA-REDISEÑO-% POR COVID	128	DIAS	
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN	21-feb.-21		
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO MODIFICATORIO COMPLEMENTARIO	19-oct.-21		
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	5-jul.-21		
FECHA DE APROBACIÓN	13-jul.-21		

VALOR PLANILLADO AVANCE DE OBRA	8.270.882,09	147.128,54	8.418.010,63
AMPLAICIÓN DIA: 128 DIAS			
TOTAL PLANILLADO	8.270.882,09	147.128,54	8.418.010,63

DESCUENTOS Y RETENCIONES			
ANTICIPO : 40%	3.308.352,84	58.851,42	3.367.204,26
OTROS:			
TOTAL DE DESCUENTOS:	3.308.352,84	58.851,42	3.367.204,26
VALOR LIQUIDO ESTA PLANILLA :	4.962.529,25	88.277,12	5.050.806,37

Firmado electrónicamente por:
PEDRO ELICIO RAMOS IDROVO

ING. PEDRO RAMOS IDROVO
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA LEON BURGOS

ING. CAROLINA LEON BURGOS
FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	PRIMERA ETAPA											
	1.- VIAS Y PARQUEADEROS						VP					
	PRELIMINARES											
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE C. RODADuRA	km	1,08	494,59	534,15720	1,08		1,08	534,15		534,160	100,00%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)	m3	12.779,98	0,82	10.479,58360	12.779,98		12.779,98	10.479,58		10.479,58	100,00%
3	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRuCTuRAS mENORES	m3	86,00	4,69	403,34000	-		-			-	
4	TuBERÍA DE ACERO CORRuGADO D= 1,20 m ,E=2.5 mm, mP-100	m	18,00	239,45	4.310,10000	18,00		18,00	4.310,10		4.310,100	100,00%
5	muRO DE H.S. F'C=180KG./Cm2 TIPO B(CABEZALES)	m3	22,00	188,41	4.145,02000	22,00		22,00	4.145,02		4.145,020	100,00%
	MATERIAL PETREO											
6	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)	m3	51.821,91	2,92	151.319,97720	43.597,97	1.911,56	45.509,53	127.306,06	5.581,76	132.887,820	87,82%
7	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3	m3	2.589,98	10,78	27.919,98440	2.589,98		2.589,98	27.919,98		27.919,980	100,00%
8	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS	m3	1.942,49	17,21	33.430,25290	1.942,49		1.942,49	33.430,25		33.430,250	100%
9	TRANSPORTE mATERIAL PETREODE mEJORAmIENTO	m3-km	937.976,72	0,28	262.633,48104	741.378,36	34.599,31	775.977,67	207.585,94	9.687,81	217.273,750	82,73%
10	TRANSPORTE DE mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3	m3-km	117.701,06	0,28	32.956,29680	46.619,64	6.189,55	52.809,19	13.053,50	1.733,07	14.786,570	44,87%
11	TRANSPORTE DE mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS	m3-km	34.964,82	0,28	9.790,14960	34.964,82		34.964,82	9.790,15		9.790,150	100,00%
	CAPA DE RODADURA											
	AMBIENTALES											
12	SEÑALES INFORmATIVAS (2.40X1.20)m	u	2,00	250,92	501,84000	2,00		2,00	501,84		501,840	100,00%
13	SEÑALES REGLAmENTARIAS (0.75 X 0.75)m	u	2,00	115,45	230,90000	2,00		2,00	230,90		230,900	100,00%
14	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)m	u	2,00	115,45	230,90000	2,00		2,00	230,90		230,900	100,00%
	CONSOLIDACION DE PLATAFORMAS						CP					
15	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)	m3	43.057,34	2,92	125.727,44448	43.057,34		43.057,34	125.727,44		125.727,440	100,00%
16	TRANSPORTE mATERIAL PETREODE mEJORAmIENTO	m3-km	779.043,38	0,28	218.132,14640	779.043,38		779.043,38	218.132,15		218.132,150	100,00%
17	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)	m3	69.683,19	0,82	57.140,21170	69.683,18		69.683,18	57.140,21		57.140,210	100,00%
	2.- ESTABILIZACIÓN TALUDES						ET					
	PRELIMINARES											
18	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	4.030,36	1,14	4.594,60470	-	4.030,36	4.030,36		4.594,61	4.594,610	100,00
19	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	4.613,56	1,46	6.735,79030	2.109,52	1.292,01	3.401,53	3.079,90	1.886,33	4.966,230	73,73%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
20	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA) ESTRuCTuRAS	m3	9.606,48	4,18	40.155,08640	5.718,04	48,28	5.766,32	23.901,41	201,81	24.103,220	60,03%
21	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	205,06	17,93	3.676,72580	54,89		54,89	984,18		984,180	27%
22	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3		13,72		-		-			-	
23	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	85.716,60	2,82	241.720,79875	85.716,60		85.716,60	241.720,80		241.720,800	100%
	SISTEMA DE DRENAJE PLATAFORMA						SD					
24	RASANTEO mANuAL DE ZANJAS	m3		3,22		-		-			-	
25	SumINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL PARA SuBDREN (TIPO NT 2400 O SImILAR)	m2	1.498,63	3,06	4.585,80780	1.469,00		1.469,00	4.495,14		4.495,140	98,02
26	SumINISTRO Y COLOCACIÓN DE mATERIAL FILTRANTE A mAQuINA (PIEDRA BOLA mAX =2")	m3	524,58	15,19	7.968,37020	457,77		457,77	6.953,53		6.953,530	87,26
27	SumINISTRO Y COLOCACIÓN mANuAL DEmATERIAL FILTRANTEPARA DRENES 1 PuLG	m3	279,52	20,70	5.786,06400	212,86		212,86	4.406,21		4.406,210	76,15
28	SumINISTRO Y COLOCACIÓN DE TuBERIAP.V.C.DIAm. INT.=160mm, PERFORADA	m		14,38		-		-			-	
29	Sum.Y COLOCACIÓN TuBERIA PVC. CORRuGADA DIAm INT.=160mm S5	m		9,80		-		-			-	
30	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT. 220 mm S5	m		14,68		-		-			-	
31	Sum.Y COLOCACIÓN TuBERIA PVC. CORRuGADA DIAm. INT.=315mm S5	m		20,16		-		-			-	
32	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 315A 160mm PVC Y/O POLIETILENO	u		24,07		-		-			-	
33	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 220A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u		21,28		-		-			-	
	SISTEMA TIERRA ARMADA											
34	GEOTEXTIL TEJIDO- 2400 T PARA muRO DE CONTENCION TIERRA ARmADA	m2	21.276,67	3,06	65.106,59490	21.276,67		21.276,67	65.106,59		65.106,590	100,00
35	GEOmALLA BX-11OO TENSAR	m2	7.927,94	3,19	25.290,11265	7.927,94		7.927,94	25.290,12		25.290,120	100,00
36	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	4.074,59	17,33	70.612,64470	3.860,48		3.860,48	66.902,12		66.902,120	94,75

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
37	muRO DE GAVIONES TRIPLE TORSION	m3	3.632,00	60,08	218.210,56000	2.866,00		2.866,00	172.189,28		172.189,280	78,91
	3.- REDES DE+E59:E141 ALCANTARILLADO SA+E59:E141NITARIO, PLUVIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS						RA					
	ALCANTARILLADO SANITARIO											
	PRELIMINARES											
38	REPLANTEO Y NIVELACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	m	490,58	1,81	887,94980	490,58		490,58	887,95		887,950	100,00
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
39	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-			-	
40	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	3.460,00	4,18	14.462,80000	3.631,00		3.631,00	15.177,58		15.177,580	104,94%
41	ENTIBADO DE ZANJA	m2	160,00	11,56	1.849,60000	-	160,00	160,00		1.849,60	1.849,600	100,00
42	RAZANTEO DE ZANJA E= 0.20m	m2	240,00	3,22	772,80000	-	240,00	240,00		772,80	772,800	100,00
43	ARENA DE KILO, TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	320,00	18,13	5.801,60000	320,00		320,00	5.801,60		5.801,600	100,00%
44	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	1.800,00	13,72	24.696,00000	1.800,00		1.800,00	24.696,00		24.696,000	100%
45	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	900,00	6,32	5.688,00000	900,00		900,00	5.688,00		5.688,000	100%
46	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	1.440,00	2,82	4.060,80000	1.440,00		1.440,00	4.060,80		4.060,800	100,00%
	TUBERIAS PVC ALCANTARILLADO											
47	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=160 mm S6	m	89,12	9,70	864,46400	89,12		89,12	864,46		864,460	100,00
48	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT = 200 mm S6	m	450,00	15,28	6.876,00000	450,00		450,00	6.876,00		6.876,000	100,00
49	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 300 mm S5	m	50,00	20,22	1.011,00000	50,00		50,00	1.011,00		1.011,000	100,00%
50	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=364 mm S6	m		23,27		-		-			-	
51	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 450 mm S5	m	20,00	44,36	887,20000	-		-			-	
52	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 220A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u	2,00	21,28	42,56000	-		-			-	
53	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 335A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u		24,14		-		-			-	
	POZOS Y CAJAS											
54	HORmIGON SImPLE EN POZOS F'C=180KG/Cm2-mEZCLA A mANO	m3	30,00	177,00	5.310,00000	30,00		30,00	5.310,00		5.310,000	100,00%
55	ENCOFRADO mETALICO PARA POZOS DE REVISION	m3	30,00	20,36	610,80000	30,00		30,00	610,80		610,800	100,00%
56	SumINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS Y CERCOS H.F-210LB	u	12,00	178,06	2.136,72000	12,00		12,00	2.136,72		2.136,720	100%
57	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	7,00	90,42	632,94000	-		-			-	
	ALCANTARILLADO PLUVIAL											
	PRELIMINARES											
58	REPLANTEO Y NIVELACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	m	1.378,44	1,81	2.494,97640	1.378,44		1.378,44	2.494,98		2.494,980	100%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
59	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-			-	
60	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	9.280,92	4,18	38.794,26389	5.308,06		5.308,06	22.187,59		22.187,690	57,19%
61	ENTIBADO DE ZANJA	m2	308,42	11,56	3.565,33520	58,42	250,00	308,42	675,34	2.890,00	3.565,340	100,00
62	RAZANTEO DE ZANJA E= 0.20m	m2	849,00	3,22	2.733,78000	-	849,00	849,00		2.733,78	2.733,780	100,00
63	ARENA DE KILO, TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	245,00	18,13	4.441,85000	245,00		245,00	4.441,85		4.441,850	100,00%
64	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	5.196,31	13,72	71.293,38000	2.777,42		2.777,42	38.106,20		38.106,200	53,45%
65	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	2.130,00	6,32	13.461,60000	-		-			-	
66	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	2.144,69	2,82	6.048,01885	2.144,69		2.144,69	6.048,02		6.048,020	100,00%
	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO PLUVIAL											
67	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 250 mm S5	m	608,56	16,51	10.047,32560	425,52		425,52	7.025,34		7.025,340	69,92%
68	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 300 mm S5	m	140,00	20,22	2.830,80000	134,29		134,29	2.715,34		2.715,340	95,92%
69	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=364 mm S6	m	50,00	23,27	1.163,50000	50,00		50,00	1.163,50		1.163,500	100%
70	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 450 mm S5	m	12,00	44,36	532,32000	-		-			-	
71	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 600 mm S5	m	878,35	107,84	94.721,26400	605,84		605,84	65.333,79		65.333,790	68,97
	POZOS Y CAJAS											
72	HORmIGON SImPLE EN POZOS F'C=180KG/Cm2-mEZCLA A mANO	m3	56,00	177,00	9.912,00000	56,00		56,00	9.912,00		9.912,000	100,00
73	ENCOFRADO mETALICO PARA POZOS DE REVISION	m3	56,00	20,36	1.140,16000	56,00		56,00	1.140,16		1.140,160	100,00
74	SumINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS Y CERCOS H.F-210LB	u	24,00	178,06	4.273,44000	24,00		24,00	4.273,44		4.273,440	100%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
75	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	22,00	90,42	1.989,24000	-		-			-	
76	CAJA DE H.S. PARA REJILLA mETÁLICA 0.40 por 1.00 por 1.00 (F'C= 180 KG/Cm2)	u	40,00	95,58	3.823,20000	24,00		24,00	2.293,92		2.293,920	60%
77	SumINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA H.F. (1.00 por 0.40 por 0.05)110 KG	u	40,00	130,84	5.233,60000	27,00		27,00	3.532,68		3.532,680	68%
	FOSA SEPTICA, FILTRO ANAEROBICO Y SECADO DE LODOS											
	PRELIMINARES											
78	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1,14		-		-			-	
79	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	63,51	1,46	92,72460	63,51		63,51	92,72		92,720	100,00%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
80	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-			-	
81	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	211,71	4,18	884,93651	211,71		211,71	884,94		884,940	100,00%
82	ENTIBADO DE ZANJA	m2		11,56		-		-			-	
83	RAZANTEO DE ZANJA E= 0.20m	m2		3,22		-		-			-	
84	ARENA DE KILO, TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3		18,13		-		-			-	
85	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	118,67	13,72	1.628,15240	-		-			-	
86	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	20,00	6,32	126,40000	-		-			-	
	TUBERIAS PVC ALCANTARILLADO											
87	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT = 200 mm S6	m	26,50	15,28	404,92000	26,50		26,50	404,92		404,920	100%
	HORMIGONES											
88	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	3,41	163,18	556,68857	3,41		3,41	556,69		556,690	100,00%
89	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	31,11	249,88	7.773,10602	30,66		30,66	7.661,32		7.661,320	98,56%
90	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F´C=180 KG/Cm2-50por cientoP)CIm	m3		169,86		-		-			-	
	ACERO ESTRUCTURAL											
91	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	3.652,36	1,68	6.135,96542	3.652,36		3.652,36	6.135,96		6.135,960	100,00
92	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	100,00	2,76	276,00000	-		-			-	
93	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	100,00	0,11	11,00000	-		-			-	
	CERRAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO											
94	CERRAmIENTO DE ALAmBRE DE PÚAS-6 HILOS	m	60,00	2,14	128,40000	-		-			-	
95	PuERTA DE mALLA + TuBO ISO II 2"	m2	4,00	59,32	237,28000	4,00		4,00	237,28		237,280	100%
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES											
96	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	298,58	10,27	3.066,41660	135,74		135,74	1.394,05		1.394,050	45%
97	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	30,00	4,72	141,60000	30,00		30,00	141,60		141,600	100%
	PIEZAS SANITARIAS											
98	ACCESORIOS PLANTA DE TRATAmIENTO (Global)	u	1,00	5.101,40	5.101,40000	1,00		1,00	5.101,40		5.101,400	100%
99	FILTRO DE GRAVA CALSIFICADA DE 2 1/2" A 1/2"	m3	9,00	28,28	254,52000	2,64		2,64	74,66		74,660	29%
100	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u	9,00	75,58	680,22000	7,00		7,00	529,06		529,060	78%
	4.- NAVE PRINCIPAL- TALLERES-ADMINISTRATIVO-BODEGA GENERAL						**NP**					
	PRELIMINARES											
101	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	12.327,08	1,14	14.052,87120	12.327,08		12.327,08	14.052,87		14.052,870	100,00
102	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	7.949,46	1,46	11.606,21160	7.949,46		7.949,46	11.606,21		11.606,210	100,00
103	ACOmETIDA E INST. DE AGuA POTABLE PROVISIONAL PVC 3/4"	m	90,00	8,44	759,60000	90,00		90,00	759,60		759,600	100,00
104	ACOmETIDA E INST. ELÉCTRICA PROV. TuBERÍA CONDuIT 1" CABLENo.8	m	90,00	27,58	2.482,20000	90,00		90,00	2.482,20		2.482,200	100,00
105	SONDEOS DE SuELOS (COmPROBACION IN SITu) NEC-15	m	68,00	55,43	3.769,24000	68,00		68,00	3.769,24		3.769,240	100,00
106	CERRAmIENTO PROVISIONAL LISTONES + PLANCHAS DE ZINC	m2	1.018,35	11,69	11.904,51150	1.018,35		1.018,35	11.904,51		11.904,510	100,00
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
107	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	7.030,26	4,18	29.386,48680	7.030,26		7.030,26	29.386,49		29.386,490	100,00
108	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-			-	
109	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	4.011,39	17,33	69.517,38870	4.011,39		4.011,39	69.517,39		69.517,390	100,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
110	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	2.274,76	13,72	31.209,70720	2.274,76		2.274,76	31.209,71		31.209,710	100,00
111	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	7.030,26	2,82	19.825,33320	7.030,26		7.030,26	19.825,33		19.825,330	100,00
	HORMIGONES											
112	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	196,42	163,18	32.051,81560	196,42		196,42	32.051,82		32.051,820	100,00
113	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF´C = 280KG./Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	1.088,67	225,97	246.006,75990	1.088,67		1.088,67	246.006,76		246.006,760	100,00
114	HORMIGON PREMEZCLADO CADENAS F´C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	282,96	283,42	80.196,52320	282,96		282,96	80.196,52		80.196,520	100,00
115	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	337,45	289,16	97.577,04200	337,45		337,45	97.577,04		97.577,040	100,00
116	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F´C=180 KG/Cm2-50por cientoP)Clm	m3	650,01	169,86	110.410,69860	650,01		650,01	110.410,70		110.410,700	100,00
117	HORMIGON PREMEZCLADO LOSA/ VIGAS F´C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	m3	200,00	193,75	38.750,00000	200,00		200,00	38.750,00		38.750,000	100,00
	ACERO ESTRUCTURAL											
118	ACERO DE REFuERZO FY= 4200 Kg/Cm2	Kg	188.476,09	1,68	316.639,83120	188.476,09		188.476,09	316.639,83		316.639,830	100,00
119	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	517.607,93	2,76	1.428.597,87576	517.607,93		517.607,93	1.428.597,89		1.428.597,890	100,00
120	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	499.962,86	0,11	54.995,91416	316.476,38	155.842,33	472.318,71	34.812,40	17.142,66	51.955,060	94,47
121	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2	14.243,58	4,84	68.938,91268	13.519,61	50,85	13.570,46	65.434,93	246,11	65.681,040	95,27
122	DECK E=0.75mm PLACA COLABORANTE-mD2-GA-101m	m2	2.520,48	18,37	46.301,21760	2.520,48		2.520,48	46.301,22		46.301,220	100,00
	CONTRAPISOS											
123	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3 (CONTRAPISO E=20Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	1.043,38	10,78	11.247,63640	1.043,38		1.043,38	11.247,64		11.247,640	100,00
124	mATERIAL DE BASE CLASE 2 (CONTRAPISO E=15Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	1.301,40	24,55	31.949,37000	778,38		778,38	19.109,23		19.109,230	59,81
125	CONTRAPISO HORm.S. PREmEZ. F´C=280KG/Cm2 E= 4 PuLG. (SIN BASE)	m2	1.710,63	21,50	36.778,54500	1.344,11		1.344,11	28.898,26		28.898,260	78,57
126	JuNTA ASERRADA DILATACION PISO (INC. CORDON, Y SELLO)	m	4.784,70	2,59	12.392,37300	2.292,35		2.292,35	5.937,19		5.937,190	47,91%
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS											
127	mASILLADO DE PISOS, ENDuRECEDOR DE CuARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5mm)	m2	5.101,87	5,62	28.672,50940	4.479,16		4.479,16	25.172,88		25.172,880	87,79%
128	PINTuRA EPOXICA PISO INDuSTRIAL 3mm (2 COmPONENTES)	m2	5.101,87	34,78	177.443,03860	2.125,62	163,96	2.289,58	73.929,06	5.702,53	79.631,590	44,88%
129	PISO PORCELANATO RECTIF. COLOR (0.50X0.50- u OTROS) INSTAL. EmPO	m2	1.910,00	40,31	76.992,10000	1.910,00		1.910,00	76.992,09		76.992,090	100,00%
130	PISO GRADAS PORCELANATO PIZARRA COLOR (0.32X0.32-O SImILAR) INSTAL. EmPO.	m2	90,00	32,72	2.944,80000	20,31		20,31	664,54		664,540	22,57%
131	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	761,35	26,06	19.840,78100	761,35		761,35	19.840,78		19.840,780	100,00%
132	BARREDERA PORCELANATO COLOR RECTIFICADA A=10Cm	m	997,67	7,70	7.682,05900	997,67		997,67	7.682,06		7.682,060	100,00%
133	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISOS Y FILOS DE GRADA	m	150,00	2,98	447,00000	32,53		32,53	96,94		96,940	22%
134	CENEFA ACANALADA ANTILESLIZANTE FILOS GRADA A=10Cm	m	120,00	38,56	4.627,20000	-		-			-	
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS											
135	mASILLADO E ImPERmEABILIZADO DE PISOS-LOSAS, mORTERO CEmENTO-ARENA 1:3 +(PEGANTE + ImPERm.) LOSAS EXT	m2	1.380,00	10,40	14.352,00000	1.380,00		1.380,00	14.352,00		14.352,000	100,00
136	ImPERmEABILIZACION LOSA DE CuBIERTA ImPRImANTE ASFALTICO SOLuBLE AL AGuA	m2	1.650,00	2,84	4.686,00000	1.606,65		1.606,65	4.562,90		4.562,900	97,37%
137	ImPERmEABILIZACIONLOSA DE CuBIERTA LAmINAS ASFALTICAS	m2	1.650,00	13,85	22.852,50000	1.606,65		1.606,65	22.252,14		22.252,140	97,37%
	CUBIERTA											
138	CuBIERTA GALVALumEN E=0.45mm, RECuBRIENTO PINTuRA POLIESTER ASTm-653A (COLOR INSTITuCIONAL), INC, PER	m2	4.875,00	13,92	67.860,00000	4.875,00		4.875,00	67.860,00		67.860,000	100,00%
139	CuBIERTA POLICARBONATO E=0.80 mm, COLOR BRONCE O SImILAR, INC. ACCESORIOS INSTALCION	m2	946,45	14,34	13.572,09300	410,43		410,43	5.885,57		5.885,570	43,37%
140	CumBRERO GALVALumEN E=0.40 mm A=0.50 m, INC. ACCES. INSTALACION	m	92,00	8,38	770,96000	91,30		91,30	765,09		765,090	99,24%
141	CANAL TOL GALV E= 0.70mm, H=30Cm, A=40Cm DESARR. 122 Cm, INC. GANCHOS	m	259,00	21,49	5.565,91000	259,00		259,00	5.565,91		5.565,910	100,00%
	BAJANTES AGUA LLUVIA											
142	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=160mm)	m	798,00	9,91	7.908,18000	740,33		740,33	7.336,67		7.336,670	92,77
143	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm*0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	25,00	90,42	2.260,50000	25,00		25,00	2.260,50		2.260,500	100%
144	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m	233,91	20,59	4.816,20690	-		-			-	
145	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO DIAm. INT.= 200A 160mm PVC Y/O POLIETILENO	u	15,00	20,71	310,65000	-		-			-	
	MAMPOSTERÍA											
146	RIOSTRAS DE H.S. F´C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3	129,00	258,83	33.389,07000	122,97		122,97	31.827,81		31.827,810	95,32
147	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=10 Cm	m2	236,00	17,71	4.179,56000	26,61		26,61	471,26		471,260	11,28%
148	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2	4.630,00	22,90	106.027,00000	4.078,71	14,61	4.093,32	93.402,50	334,57	93.737,070	88,41

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
149	PICADO Y RESANADO DE mAmPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m	3.819,65	4,63	17.684,98050	3.476,65	343,00	3.819,65	16.096,89	1.588,09	17.684,980	100,00%
150	mESON H.A. F'C=180 KG/Cm2 E=7 Cm HIERRO (LAVAmANOS+mESON)	m	7,00	34,03	238,21000	7,00		7,00	238,21		238,210	100%
151	REVESTImIENTO mESON GRANITO	m	7,00	180,61	1.264,27000	7,00		7,00	1.264,27		1.264,270	100%
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES											
152	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	2.795,97	10,27	28.714,61190	2.795,97		2.795,97	28.714,61		28.714,610	100,00
153	ENLuCIDO VERTICAL PALETEADO mORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2	9.060,97	8,78	79.555,31660	7.942,58	14,64	7.957,22	69.735,87	128,54	69.864,410	87,82%
154	ENLuCIDO CON mALLA+ ImPERmEABILIZANTE, mORTERO 1:3	m2	1.250,00	17,03	21.287,50000	760,79		760,79	12.956,21		12.956,210	60,86%
155	ENLuCIDO HORIZONTAL PALETEADO mORTERO 1:3	m2	100,00	12,30	1.230,00000	-		-			-	
156	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	2.795,97	5,26	14.706,80220	2.795,97		2.795,97	14.706,81		14.706,810	100,00%
157	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO INTERIOR) INC. FILOS	m2	9.060,97	4,40	39.868,26800	7.755,59		7.755,59	34.124,60		34.124,600	85,59%
158	EmPASTE HORIZONTAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	100,00	6,56	656,00000	-		-			-	
159	PINTuRA EPOXICA PARED INDuSTRIAL 3mm (2 COmPONENTES)	m2		34,78		-		-			-	
160	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	9.060,97	4,72	42.767,77840	7.755,59		7.755,59	36.606,39		36.606,390	85,59%
161	PINTuRA DE CAuCHO SATINADA COLOR(2 mANOS) EXTERIOR (CANASTILLA) <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	2.795,97	5,72	15.992,94840	2.464,29		2.464,29	14.095,74		14.095,740	88,14%
162	RECuBRImIENTO ALumINIO COLOR CYAN O SImILAR, ALuCuBOND 5mm INC. ESTRuCT. E INST<GuIA ImAGEN CORPORATI	m2	1.315,00	84,96	111.722,40000	-		-			-	
163	RECuBRImIENTO PLANCHA FIBROCEmENTO E=7mm	m2	50,00	20,56	1.028,00000	-		-			-	
	CARPINTERIA METALICA											
164	VENTANA FIJA TuBO RECT 40X80X2-mALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6mm, INC PINTuRA ANTICORROSIVA, A COmPRESOR	m2	540,00	41,30	22.302,00000	397,17		397,17	16.403,12		16.403,120	73,55%
165	PORTON TIPO CORREDIZO RETRACTIL TuBO RECT 40X80X2mm-TOOL GALV. 0.6mm	m2	990,50	61,25	60.668,12500	594,12		594,12	36.389,85		36.389,850	59,98%
166	PuERTA mETÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2mm (AREA RIEGO Y DRENAJE)	m2	40,30	142,73	5.752,01900	40,20		40,20	5.737,75		5.737,750	99,75%
167	PuERTAS mODuLARES, TAmBORADAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, INCLuYE ESTRuCTuRA Y HER	m2	30,50	172,30	5.255,15000	30,50		30,50	5.255,15		5.255,150	100,00%
168	DIVISIONES ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, TAmBORADAS INCLuYE ESTRuCTuRA, EmPOTRAmIENTO PISO PARED (	m2	81,00	161,18	13.055,58000	81,00		81,00	13.055,58		13.055,580	100,00%
	CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE											
169	PASAmANOS TuBERÍA ACERO INOXIDABLE + VIDRIO LAmINADO 8mm, EmPOTRADA PISO H=1.00m (GRADAINTERIORES)	m	86,21	173,45	14.953,12450	13,97		13,97	2.423,10		2.423,100	16,20%
170	PASAmANOS EN TuBERIADE ACERO INOXIDABLE EmPOTRADO EN PARED	m	26,59	45,00	1.196,55000	23,15		23,15	1.041,75		1.041,750	87,06%
	CARPINTERIA DE MADERA											
171	PuERTA TAmBORADA 70Cm, ESQuELETO CANELO, mDF 9mm -LACADA-DISEÑO CORPORATIVO	u	20,00	198,79	3.975,80000	18,00		18,00	3.578,22		3.578,220	90,00%
172	PuERTA TAmBORADA 90Cm, ESQuELETO CANELO, mDF 9mm -LACADA-DISEÑO CORPORATIVO	u	2,00	230,59	461,18000	2,00		2,00	461,18		461,180	100,00%
173	PuERTA TAmBORADA 100Cm, ESQuELETO CANELO, mDF 9mm -LACADA-DISEÑO CORPORATIVO	u	6,00	240,28	1.441,68000	6,00		6,00	1.441,68		1.441,680	100,00%
	VENTANERIA-PUERTAS ALUMINIO VIDRIO											
174	PuERTA INGRESO PRINCIPAL-SISTEmA APERTuRA AuTOmATICO 2.00X2.30m ALumINO Y VIDRIO TEmPLADO DE 10mm	u	1,00	6.646,43	6.646,43000	1,00		1,00	6.646,43		6.646,430	100,00%
175	PuERTA DE VIDRIO TEmPLADO 10mm, INC. CERRADuRA TIRADERA, PIVOTE DE SuJECCION (PREFEXTuRA Y AuDITORIO)	m2	9,50	600,48	5.704,56000	9,29		9,29	5.578,46		5.578,460	97,79%
176	PuERTA YmAmPARAALumINIOS200YVIDRIOLAmINADO E=8mm CON PIVOTE	m2	9,00	190,90	1.718,10000	7,88	12,60	20,48	1.504,29	2.405,34	3.909,630	227,56%
177	PuERTA BATIENTE ALumINIO Y VIDRIO FLOTADO CLARO 6mm (0.90X2.10)	u	3,00	295,00	885,00000	3,00		3,00	885,00		885,000	100,00%
178	PuERTA BATIENTE ALumINIO Y VIDRIO FLOTADO CLARO 6mm (1.00X2.10)	u	40,00	286,07	11.442,80000	34,00	6,00	40,00	9.726,38	1.716,42	11.442,800	100,00%
179	VENTANA CORREDIZA ALumINIO SERIE 200-INCL. VIDRIO LAmINADO 6mm	m2	220,00	183,67	40.407,40000	193,15	26,85	220,00	35.475,86	4.931,54	40.407,400	100,00%
	REVESTIMIENTO DE TUMBADOS											
180	CIELO RASO FALSO - FIBRA mINERAL Y RECuB LÁmINA ALumINIO 0.60X0.60 BLANCO, TIPO AmSTRONG O SImILAR	m2	2.150,00	21,59	46.418,50000	2.150,00		2.150,00	46.418,51		46.418,510	100,00%
181	CIELO RASO FALSO TIPO GYPSum PARA HumEDAD-1/2"-SIN ESTuCAR	m2	212,58	20,04	4.260,10320	-	17,18	17,18		344,29	344,290	8,08
182	ESTuCADO DE CIELO RASO	m2	212,58	6,26	1.330,75080	-	17,18	17,18		107,55	107,550	8,08
183	FRISO GALVALumEN PREPINTADO E= 0.40 INC. FLASHING	m2	50,00	19,63	981,50000	-		-			-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS											
184	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF DISCAPACITADOS PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u	2,00	297,96	595,92000	2,00		2,00	595,92		595,920	100,00%
185	PASAmANOS PARA DISCAPACITADOS TuBO DIAm 32mm E=1.5mm EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO SATINADO (Juego)	u	2,00	281,03	562,06000	2,00		2,00	562,06		562,060	100,00%
186	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u	39,00	297,96	11.620,44000	39,00		39,00	11.620,44		11.620,440	100,00%
187	uRINARIO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF	u	6,00	261,01	1.566,06000	6,00		6,00	1.566,06		1.566,060	100,00%
188	LAVABO BLANCO, LLAVE SENSOR mOVImIENTO (CON ACCESORIOS)	u	35,00	281,39	9.848,65000	35,00		35,00	9.848,65		9.848,650	100,00%
189	DISPENSOR DE PAPEL HIGIENICO DIAm=275mm, ROLLO 70mm, ABATIBLE,ACERO INOX E=8mm, AISI 304. ACABADO S	u	20,00	110,71	2.214,20000	20,00		20,00	2.214,20		2.214,200	100,00%
190	DISPENSOR DE PAPEL TOALLA 400-600 uNIDADES, 330X273X130mm, ACERO INOX E=8mm AISI 304, ACABADO SATINAD	u	20,00	113,00	2.260,00000	20,00		20,00	2.260,00		2.260,000	100,00%
191	DISPENSADOR DE JABON LIQuIDO ACERO INOX AISI304, ACABADO SATINADO	u	20,00	91,28	1.825,60000	20,00		20,00	1.825,60		1.825,600	100,00%
192	ESPEJO DE VIDRIO FLOTADO 4mm- mARCO DE ALumINIO	m2	12,89	42,86	552,46540	-		-			-	
193	FREGADERO DE COCINA (uN POZO)	u	2,00	185,40	370,80000	1,00		1,00	185,40		185,400	50,00%
194	SECADOR DE mANOS ACCIONAmIENTO AuTOmATICO 260X302X150mm, ACERO INOX. 304, LAmINA1.5mm 110V-60HZ	u	20,00	238,44	4.768,80000	20,00		20,00	4.768,80		4.768,800	100,00%
195	BASuRERO CILINDRICO A PEDAL D=250mm H=385 PARA BAÑO ACERO INOX. 304	u	41,00	66,60	2.730,60000	41,00		41,00	2.730,60		2.730,600	100,00%
	PUENTE GRUA BIRRIEL CAP. 16 TON (1 UNIDADES)											
196	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	407,57	1,68	684,71760	-		-			-	
197	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	43.726,12	2,76	120.684,09120	43.726,12		43.726,12	120.684,09		120.684,090	100,00
198	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	43.726,12	0,11	4.809,87320	43.726,12		43.726,12	4.809,87		4.809,870	100,00%
199	KIT POLIPASTO BIRRIEL A CABLE + TROLEY ELEC, CAP. 16T, ELEVACION 8m, (INC. CARROS TESTEROS+ SISTEm EL	u	1,00	50.538,00	50.538,00000	1,00		1,00	50.538,00		50.538,000	100,00%
200	SISTEmA ELECTRIFICACION ENCAPSuLADO Lm60	m	88,00	112,21	9.874,48000	64,00		64,00	7.181,44		7.181,440	72,73%
201	RIEL DE RODADuRA 50X30mm, (V. PuENTE 2X10+V CARRILERA2X88m)	m	212,00	77,83	16.499,96000	145,60		145,60	11.332,05		11.332,050	68,68%
202	mONTAJE ELECTROmECANICOPARA GRuA BIRRIEL 16 TON	u	1,00	17.664,00	17.664,00000	1,00		1,00	17.664,00		17.664,000	100,00%
203	SIST. CONTROL REmOTO/ TELEmANDO (CON DISPLAY)	u	1,00	1.955,65	1.955,65000	1,00		1,00	1.955,65		1.955,650	100,00%
	EQUIPO DE MOVILIZACIÓN VERTICAL											
204	ASERSOR DE DISCAPACITADOS L =5.0m, 1 PARADA, CAP. NOmINAL 250KG.	u	1,00	18.732,35	18.732,35000	1,00		1,00	18.732,35		18.732,350	100,00%
	5.- NAVE LAVADORA, Y TALLERES CHAPISTERIA-CARPINTERIA						**NL**					
	PRELIMINARES											
205	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	4.407,56	1,14	5.024,61840	4.407,56		4.407,56	5.024,62		5.024,620	100,00
206	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	1.087,37	1,46	1.587,56020	1.036,79		1.036,79	1.513,71		1.513,710	95,35
207	ACOmETIDA E INST. DE AGuA POTABLE PROVISIONAL PVC 3/4"	m		8,44		-		-			-	
208	ACOmETIDA E INST. ELÉCTRICA PROV. TuBERÍA CONDuIT 1" CABLENo.8	m		27,58		-		-			-	
209	SONDEOS DE SuELOS (COmPROBACION IN SITu) NEC-15	m	61,00	55,43	3.381,23000	61,00		61,00	3.381,23		3.381,230	100,00
210	CERRAmIENTO PROVISIONAL LISTONES + PLANCHAS DE ZINC	m2		11,69		-		-			-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
211	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	311,80	4,18	1.303,32400	311,80		311,80	1.303,32		1.303,320	100,00
212	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-			-	
213	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	261,80	17,33	4.536,99400	261,80		261,80	4.536,99		4.536,990	100,00
214	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	424,00	13,72	5.817,28000	409,01		409,01	5.611,62		5.611,620	96,46
215	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	261,80	2,82	738,27600	261,80		261,80	738,28		738,280	100,00
	HORMIGONES										-	
216	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	9,80	163,18	1.599,16400	9,80		9,80	1.599,16		1.599,160	100,00
217	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF´C = 280KG./Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	69,20	225,97	15.637,12400	69,20		69,20	15.637,12		15.637,120	100,00%
218	HORMIGON PREMEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/CM2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	35,23	283,42	9.984,88660	35,23		35,23	9.984,89		9.984,890	100,00
219	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	22,17	289,16	6.410,67720	22,17		22,17	6.410,68		6.410,680	100,00
220	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F´C=180 KG/Cm2-50por cientoP)Clm	m3	46,97	169,86	7.978,32420	46,97		46,97	7.978,32		7.978,320	100,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	ACERO ESTRUCTURAL											
221	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	14.998,01	1,68	25.196,65680	14.998,01		14.998,01	25.196,66		25.196,660	100,00
222	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	59.540,80	2,76	164.332,60800	59.540,80		59.540,80	164.332,61		164.332,610	100,00%
223	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	59.540,80	0,11	6.549,48800	59.014,38	526,42	59.540,80	6.491,58	57,91	6.549,490	100,00%
224	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2	2.420,00	4,84	11.712,80000	2.239,26		2.239,26	10.838,01		10.838,010	92,53%
	CONTRAPISOS											
225	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3 (CONTRAPISO E=20Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	188,50	10,78	2.032,03000	181,79		181,79	1.959,70		1.959,700	96,44
226	mATERIAL DE BASE CLASE 2 (CONTRAPISO E=15Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	141,20	24,55	3.466,46000	136,34		136,34	3.347,15		3.347,150	96,56%
227	CONTRAPISO HORm.S. PREmEZ. F´C=280KG/Cm2 E= 4 PuLG. (SIN BASE)	m2	710,00	21,50	15.265,00000	-		-			-	
228	JuNTA ASERRADA DILATACION PISO (INC. CORDON, Y SELLO)	m	550,00	2,59	1.424,50000	401,85		401,85	1.040,79		1.040,790	73,06%
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS											
229	mASILLADO DE PISOS, ENDuRECEDOR DE CuARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5mm)	m2	1.100,00	5,62	6.182,00000	1.071,05		1.071,05	6.019,30		6.019,300	97,37%
230	PINTuRA EPOXICA PISO INDuSTRIAL 3mm (2 COmPONENTES)	m2	1.100,00	34,78	38.258,00000	521,38		521,38	18.133,60		18.133,600	47,40%
231	PISO PORCELANATO RECTIF. COLOR (0.50X0.50- u OTROS) INSTAL. EmPO	m2	35,00	40,31	1.410,85000	35,00		35,00	1.410,85		1.410,850	100,00%
232	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	72,00	26,06	1.876,32000	72,00		72,00	1.876,32		1.876,320	100,00%
233	BARREDERA PORCELANATO COLOR RECTIFICADA A=10Cm	m	28,00	7,70	215,60000	28,00		28,00	215,60		215,600	100,00%
234	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISOS Y FILOS DE GRADA	m		2,98		-		-			-	
	CUBIERTA											
235	CuBIERTA GALVALumEN E=0.45mm, RECuBRIENTO PINTuRA POLIESTER ASTm-653A (COLOR INSTITuCIONAL), INC, PER	m2	1.390,00	13,92	19.348,80000	1.193,68		1.193,68	16.616,03		16.616,030	85,88%
236	CuBIERTA POLICARBONATO E=0.80 mm, COLOR BRONCE O SImILAR, INC. ACCESORIOS INSTALCION	m2	100,00	14,34	1.434,00000	59,90		59,90	858,97		858,970	59,90%
237	CumBRERO GALVALumEN E=0.40 mm A=0.50 m, INC. ACCES. INSTALACION	m	54,25	8,38	454,61500	52,80		52,80	442,46		442,460	97,33%
238	CANAL TOL GALV E= 0.70mm, H=30Cm, A=40Cm DESARR. 122 Cm, INC. GANCHOS	m	108,50	21,49	2.331,66500	105,60		105,60	2.269,34		2.269,340	97,33%
	BAJANTES AGUA LLUVIA											
239	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=160mm)	m	168,00	9,91	1.664,88000	153,72		153,72	1.523,37		1.523,370	91,50
240	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	18,00	90,42	1.627,56000	12,00		12,00	1.085,04		1.085,040	66,67%
241	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m	120,00	20,59	2.470,80000	-		-			-	
242	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO DIAm. INT.= 200A 160mm PVC Y/O POLIETILENO	u	6,00	20,71	124,26000	-		-			-	
	MAMPOSTERÍA											
243	RIOSTRAS DE H.S. F´C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3	6,50	258,83	1.682,39500	6,14		6,14	1.589,22		1.589,220	94,46%
244	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=10 Cm	m2	5,00	17,71	88,55000	5,00		5,00	88,55		88,550	100,00%
245	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2	716,00	22,90	16.396,40000	704,69		704,69	16.137,40		16.137,400	98,42%
246	PICADO Y RESANADO DE mAmPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m	168,00	4,63	777,84000	168,00		168,00	777,84		777,840	100,00%
247	mESON H.A. F'C=180 KG/Cm2 E=7 Cm HIERRO (LAVAmANOS+mESON)	m	3,50	34,03	119,10500	-	3,20	3,20		108,90	108,900	91,43
248	REVESTImIENTO mESON GRANITO	m	3,50	180,61	632,13500	-	3,50	3,50		632,14	632,140	100,00
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES											
249	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	380,00	10,27	3.902,60000	380,00		380,00	3.902,60		3.902,600	100,00%
250	ENLuCIDO VERTICAL PALETEADO mORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2	1.075,00	8,78	9.438,50000	1.001,92		1.001,92	8.796,86		8.796,860	93,20%
251	ENLuCIDO CON mALLA+ ImPERmEABILIZANTE, mORTERO 1:3	m2	35,00	17,03	596,05000	-		-			-	
252	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	380,00	5,26	1.998,80000	380,00		380,00	1.998,80		1.998,800	100,00%
253	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO INTERIOR) INC. FILOS	m2	2.150,00	4,40	9.460,00000	1.000,72		1.000,72	4.403,17		4.403,170	46,55%
254	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	2.150,00	4,72	10.148,00000	1.372,80		1.372,80	6.479,63		6.479,630	63,85%
255	PINTuRA DE CAuCHO SATINADA COLOR(2 mANOS) EXTERIOR (CANASTILLA) <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	380,00	5,72	2.173,60000	380,00		380,00	2.173,60		2.173,600	100,00%
256	RECuBRImIENTO PLANCHA FIBROCEmENTO E=7mm	m2	50,00	20,56	1.028,00000	-		-			-	
	CARPINTERIA METALICA											
257	VENTANA FIJA TuBO RECT 40X80X2-mALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6mm, INC PINTuRA ANTICORROSIVA, A COmPRESOR	m2	182,26	41,30	7.527,33800	92,74		92,74	3.830,16		3.830,160	50,88%
258	PORTON TIPO CORREDIZO RETRACTIL TuBO RECT 40X80X2mm-TOOL GALV. 0.6mm	m2	156,67	61,25	9.596,03750	-		-			-	
259	PuERTA mETÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2mm , INC. CERRADuRA, BISAGRAS Y PINTuRA	m2	20,00	142,73	2.854,60000	20,00		20,00	2.854,60		2.854,600	100,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
260	PUERTAS mODULARES, TAmBORADAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, INCLUYE ESTRUCTURA Y HER	m2	4,00	172,30	689,20000	4,00		4,00	689,20		689,200	100,00%
261	DIVISIONES ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, TAmBORADAS INCLUYE ESTRUCTURA, EmPOTRAmIENTO PISO PARED (	m2	13,70	161,18	2.208,16600	-		-			-	
	VENTANERIA-PUERTAS ALUMINIO VIDRIO											
262	PUERTA BATIENTE ALUmINIO Y VIDRIO FLOTADO CLARO 6mm (1.00X2.10)	u	3,00	286,07	858,21000	-	3,00	3,00		858,21	858,210	100,00
263	VENTANA CORREDIZA ALUmINIO SERIE 200-INCL. VIDRIO LAmINADO 6mm	m2	6,00	183,67	1.102,02000	-	3,54	3,54		650,19	650,190	59,00
	REVESTIMIENTO DE TUMBADOS											
264	CIELO RASO FALSO - FIBRA mINERAL Y RECUB LÁmINA ALUmINIO 0.60X0.60 BLANCO, TIPO AmSTRONG O SImILAR	m2	129,01	21,59	2.785,32590	95,54		95,54	2.062,71		2.062,710	74,06%
265	FRISO GALVALumEN PREPINTADO E= 0.40 INC. FLASHING	m2		19,63		-		-			-	
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS											
266	INODORO CON FLUXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF DISCAPACITADOS PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u		297,96		-		-			-	
267	PASAmANOS PARA DISCAPACITADOS TUBO DIAm 32mm E=1.5mm EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO SATINADO (Juego)	u		281,03		-		-			-	
268	INODORO CON FLUXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u	4,00	297,96	1.191,84000	4,00		4,00	1.191,84		1.191,840	100,00%
269	URINARIO CON FLUXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF	u	1,00	261,01	261,01000	1,00		1,00	261,01		261,010	100,00%
270	LAVABO BLANCO, LLAVE SENSOR mOVImIENTO (CON ACCESORIOS)	u	3,00	281,39	844,17000	3,00		3,00	844,17		844,170	100,00%
271	DISPENSOR DE PAPEL HIGIENICO DIAm=275mm, ROLLO 70mm, ABATIBLE,ACERO INOX E=8mm, AISI 304. ACABADO S	u	3,00	110,71	332,13000	-	3,00	3,00		332,13	332,130	100,00
272	DISPENSOR DE PAPEL TOALLA 400-600 UNIDADES, 330X273X130mm, ACERO INOX E=8mm AISI 304, ACABADO SATINAD	u	2,00	113,00	226,00000	-	2,00	2,00		226,00	226,000	100,00
273	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOX AISI304, ACABADO SATINADO	u	2,00	91,28	182,56000	-	2,00	2,00		182,56	182,560	100,00
274	ESPEJO DE VIDRIO FLOTADO 4mm- mARCO DE ALumINIO	m2	2,70	42,86	115,72200	-	2,70	2,70		115,89	115,890	100,15
275	SECADOR DE mANOS ACCIONAmIENTO AUTOmATICO 260X302X150mm, ACERO INOX. 304, LAmINA1.5mm 110V-60HZ	u	2,00	238,44	476,88000	-	2,00	2,00		476,88	476,880	100,00
276	BASURERO CILINDRICO A PEDAL D=250mm H=385 PARA BAÑO ACERO INOX. 304	u	4,00	66,60	266,40000	-	4,00	4,00		266,40	266,400	100,00
277	DUCHAS CON mEZCLADORA (CON ACCESORIOS)	u	1,00	135,94	135,94000	-	1,00	1,00		135,94	135,940	100,00
	6.- NAVE RESGUARDO VEHICULAR PESADO						NR					
	PRELIMINARES											
278	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLUYE DESALOJO)	m2	5.783,22	1,14	6.592,87080	5.783,22		5.783,22	6.592,87		6.592,870	100,00
279	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQUEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	1.445,85	1,46	2.110,94100	1.445,85		1.445,85	2.110,94		2.110,940	100,00
280	ACOmETIDA E INST. DE AGUA POTABLE PROVISIONAL PVC 3/4"	m		8,44		-		-			-	
281	ACOmETIDA E INST. ELÉCTRICA PROV. TUBERÍA CONDUIT 1" CABLENo.8	m		27,58		-		-			-	
282	SONDEOS DE SUELOS (COmPROBACION IN SITU) NEC-15	m	66,00	55,43	3.658,38000	66,00		66,00	3.658,38		3.658,380	100,00
283	CERRAmIENTO PROVISIONAL LISTONES + PLANCHAS DE ZINC	m2		11,69		-		-			-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
284	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQUINA)	m3	78,36	4,18	327,54480	78,36		78,36	327,54		327,540	100,00
285	EXCAVACION mANUAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-			-	
286	SUB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQUINA), CAPAS 20Cm	m3	78,36	17,33	1.357,97880	78,36		78,36	1.357,98		1.357,980	100,00
287	RELLENO COmPACTADO A mAQUINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	635,58	13,72	8.720,15760	592,20		592,20	8.124,98		8.124,980	93,17
288	DESALOJO mECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	78,36	2,82	220,97520	78,36		78,36	220,98		220,980	100,00
	HORMIGONES											
289	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	7,20	163,18	1.174,89600	7,20		7,20	1.174,90		1.174,900	100,00
290	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF'C = 280KG./Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	29,00	225,97	6.553,13000	25,34		25,34	5.726,08		5.726,080	87,38
291	HORMIGON PREMEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	84,75	283,42	24.019,84500	84,00		84,00	23.807,28		23.807,280	99,12%
292	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	14,26	289,16	4.123,42160	9,12		9,12	2.637,14		2.637,140	63,96
293	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F'C=180 KG/Cm2-50por cientoP)CIm	m3	56,51	169,86	9.598,78860	56,51		56,51	9.598,79		9.598,790	100,00
	ACERO ESTRUCTURAL											
294	ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	9.807,60	1,68	16.476,76800	9.807,60		9.807,60	16.476,77		16.476,770	100,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
295	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2	3.325,46	4,84	16.095,20220	2.885,88		2.885,88	13.967,66		13.967,660	86,78%
	CONTRAPISOS											
296	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3 (CONTRAPISO E=20Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	282,00	10,78	3.039,96000	263,21		263,21	2.837,40		2.837,400	93,34
297	mATERIAL DE BASE CLASE 2 (CONTRAPISO E=15Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	211,86	24,55	5.201,16300	197,41		197,41	4.846,42		4.846,420	93,18%
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS											
	CUBIERTA											
	BAJANTES AGUA LLUVIA											
298	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	12,00	90,42	1.085,04000	12,00		12,00	1.085,04		1.085,040	100,00%
299	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m	161,40	20,59	3.323,22600	-		-			-	
300	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO DIAm. INT.= 200A 160mm PVC Y/O POLIETILENO	u		20,71		-		-			-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES											
301	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	40,00	10,27	410,80000	-		-			-	
302	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	40,00	5,26	210,40000	-		-			-	
303	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	40,00	4,72	188,80000	-		-			-	
	10.- SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACIÓN						**SE**					
	POZOS DE REVISION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS											
304	CAJA REVISION mEDIA TENSION 90X90X90 CAVIA, T/HA	u		169,45		-		-			-	
305	CAJA REVISION mEDIA TENSION 60X60X75,ACERA, T/HA	u	41,00	179,17	7.345,97000	41,00		41,00	7.345,97		7.345,970	100,00%
306	PuESTA A TIERRA SImPLE EN POZO ELECTRICO CON SuELDA EXOTERmICA	u	4,00	164,46	657,84000	4,00		4,00	657,84		657,840	100,00%
	SISTEMA SOTERRADO DE MEDIA TENSION											
307	BAJADA DE DE mEDIA TENSION AEREA SOTERRADA	u	4,00	600,70	2.402,80000	1,00		1,00	600,70		600,700	25,00%
308	TENDIDO DE TuBO RIGIDO 1 1/2" DOBLE	m		16,92		-		-			-	
309	SISTEmA A TIERRA DE mEDIA TENSION	u	1,00	1.781,59	1.781,59000	-		-			-	
310	PARARRAYOS 10 KV, CON PERNOS SuJECCION	u	3,00	84,46	253,38000	-		-			-	
311	SECCIONAmIENTO TRIFASICO AEREO SuBTERRANEO S3A/S, INC. PARARRAYOS	u	3,00	1.290,60	3.871,80000	3,00		3,00	3.871,80		3.871,800	100,00%
312	TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNuDO NO. 2 AWG	m	500,00	5,92	2.960,00000	500,00		500,00	2.960,00		2.960,000	100,00%
313	TENDIDO Y REGuLADO DE CABLE DE COBRE XLPE NO2-15KV	u	1.600,00	14,75	23.600,00000	1.600,00		1.600,00	23.600,00		23.600,000	100,00%
314	TENDIDO CONDuCTOR: TTu 2/0	m		36,79		369,42		369,42	13.590,96		13.590,960	100,00%
315	TENDIDO CONDuCTOR: TTu 3/0	m		45,20		-		-			-	
316	mALLA DE PuESTA A TIERRA EN CENTRO DE TRANSFORmACION CON SuELDA EXOTERmICA	u	4,00	581,10	2.324,40000	3,00		3,00	1.743,30		1.743,300	75,00%
317	BANCO DE DuCTOS 1X2 DE 110mm 1X2B1-B2	m	1.800,00	32,94	59.292,00000	1.181,87		1.181,87	38.930,80		38.930,800	66,00%
318	mONTAJE DE TRANSFORmADOR PADmOuNTED TRIFASICO TIPO mALLA DE 50KVA-13.8KV-127/220V	u	1,00	7.092,79	7.092,79000	1,00		1,00	7.092,79		7.092,790	100,00%
319	mONTAJE DE TRANSFORmADOR PADmOuNTED TRIFASICO TIPO mALLA DE 100KVA-13.8KV-127/220V	u	1,00	12.135,60	12.135,60000	1,00		1,00	12.135,60		12.135,600	100,00%
320	PuNTA TERmINAL AT TIPO EXTERIOR CABLE N° 2 AWG	u		170,72		-		-			-	
321	PuNTA TERmINAL AT TIPO INTERIOR CABLE N° 2 AWG	u	3,00	170,72	512,16000	-		-			-	
322	ACOmETIDA PRINCIPAL ELECTRICA	m	15,00	6,22	93,30000	-		-			-	
	INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO											
323	POSTES ORNAmENTALES DE 8mTS Y BRAZOS	u	57,00	799,03	45.544,71000	56,00		56,00	44.745,68		44.745,680	98,25%
324	LumINARIA ORNAmENTAL LED120W	u	82,00	532,37	43.654,34000	68,00		68,00	36.201,16		36.201,160	82,93%
325	LumINARIA ORNAmENTAL LED 60W	u	33,00	387,65	12.792,45000	31,00		31,00	12.017,15		12.017,150	93,94%
326	TENDIDO DE CONDuCTOR 1No. NO. 4 TTu	m	4.647,00	8,10	37.640,70000	4.647,00		4.647,00	37.640,70		37.640,700	100,00%
327	mONTAJE DE TRANSF, mONO. PADmOuNTED 10 KVA	u	1,00	5.210,22	5.210,22000	1,00		1,00	5.210,22		5.210,220	100,00%
	AREA ADMINISTRATIVA PLANTA BAJA											
	INSTALACION LUMINARIAS											
328	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	636,00	3,34	2.124,24000	636,00		636,00	2.124,24		2.124,240	100,00%
329	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	218,00	1,18	257,24000	217,00		217,00	256,06		256,060	100,00%
330	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	620,00	0,56	347,20000	505,00		505,00	282,80		282,800	81,00%
331	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	350,00	4,87	1.704,50000	322,00		322,00	1.568,14		1.568,140	92,00%
332	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	150,00	1,57	235,50000	63,00		63,00	98,91		98,910	42,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
333	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AmARILLO (INC. TAYPE)	m	1.043,00	2,28	2.378,04000	730,10		730,10	1.664,63		1.664,630	70,00%
334	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	1.043,00	1,43	1.491,49000	730,10		730,10	1.044,04		1.044,040	70,00%
335	LumINARIA LED 3X18W/120 VOLTIOS	u	130,00	60,59	7.876,70000	130,00		130,00	7.876,70		7.876,700	100,00%
336	LumINARIA LED 24W/120 VOLTIOS	u	14,00	58,36	817,04000	14,00		14,00	817,04		817,040	100,00%
337	INTERRuPTOR SImPLE CON TAPA	u	38,00	5,47	207,86000	38,00		38,00	207,86		207,860	100,00%
338	INTERRuPTOR DOBLE CON TAPA	u	14,00	6,16	86,24000	-		-			-	
339	INTERRuPTOR CONmuTADOR DE 3 VIAS	u	17,00	7,30	124,10000	17,00		17,00	124,10		124,100	100,00%
	TOMACORRIENTES GENERALES											
340	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	780,00	3,34	2.605,20000	780,00		780,00	2.605,20		2.605,200	100,00%
341	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	260,00	1,18	306,80000	249,00	6,00	255,00	293,82	7,08	300,900	98,00%
342	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	570,00	0,56	319,20000	570,00		570,00	319,20		319,200	100,00%
343	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	390,00	4,87	1.899,30000	234,00	8,00	242,00	1.139,58	38,96	1.178,540	62,00%
344	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	892,00	1,43	1.275,56000	892,00		892,00	1.275,56		1.275,560	100,00%
345	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	892,00	1,43	1.275,56000	892,00		892,00	1.275,56		1.275,560	100,00%
346	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	892,00	1,03	918,76000	892,00		892,00	918,76		918,760	100,00%
347	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	130,00	1,57	204,10000	130,00		130,00	204,10		204,100	100,00%
348	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	130,00	7,45	968,50000	130,00		130,00	968,50		968,500	100,00%
	TOMACORRIENTES REGULADOS UPS											
349	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	195,00	3,34	651,30000	195,00		195,00	651,30		651,300	100,00%
350	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	65,00	1,18	76,70000	49,00		49,00	57,82		57,820	75,00%
351	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	106,00	0,56	59,36000	106,00		106,00	59,36		59,360	100,00%
352	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	100,00	4,87	487,00000	100,00		100,00	487,00		487,000	100,00%
353	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	24,00	1,57	37,68000	24,00		24,00	37,68		37,680	100,00%
354	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	267,00	1,43	381,81000	267,00		267,00	381,81		381,810	100,00%
355	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	267,00	1,43	381,81000	267,00		267,00	381,81		381,810	100,00%
356	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	267,00	1,03	275,01000	267,00		267,00	275,01		275,010	100,00%
357	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	24,00	7,45	178,80000	22,00		22,00	163,90		163,900	100,00%
	AREA ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA											
	INSTALACION LUMINARIAS											
358	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	584,00	3,34	1.950,56000	584,00		584,00	1.950,56		1.950,560	100,00%
359	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	194,00	1,18	228,92000	172,00		172,00	202,96		202,960	89,00%
360	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	570,00	0,56	319,20000	466,00		466,00	260,96		260,960	82,00%
361	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	500,00	4,87	2.435,00000	279,00		279,00	1.358,73		1.358,730	56,00%
362	CAJETINES mETALICOS OCTOGONALES mEDIANOS CON TAPA	u	900,00	5,44	4.896,00000	900,00		900,00	4.896,00		4.896,000	100,00%
363	CAJETINES mETALICOS CuADRADOS CON TAPA 10X10	u	5,00	4,99	24,95000	5,00		5,00	24,95		24,950	100,00%
364	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	60,00	1,57	94,20000	50,00		50,00	78,50		78,500	83,00%
365	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AmARILLO (INC. TAYPE)	m	1.200,00	2,28	2.736,00000	840,00	30,00	870,00	1.915,20	68,40	1.983,600	72,50%
366	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	1.200,00	1,43	1.716,00000	845,00	30,00	875,00	1.208,35	42,90	1.251,250	72,92%
367	LumINARIA LED 3X18W/120 VOLTIOS	u	180,00	60,59	10.906,20000	180,00		180,00	10.906,20		10.906,200	100,00%
368	LumINARIA LED 24W/120 VOLTIOS	u	33,00	58,36	1.925,88000	33,00		33,00	1.925,88		1.925,880	100,00%
369	INTERRuPTOR SImPLE CON TAPA	u	50,00	5,47	273,50000	50,00		50,00	273,50		273,500	100,00%
370	INTERRuPTOR DOBLE CON TAPA	u	15,00	6,16	92,40000	7,00		7,00	43,12		43,120	100,00%
371	INTERRuPTOR TRIPLE CON TAPA	u	4,00	7,30	29,20000	2,00		2,00	14,60		14,600	100,00%
372	INTERRuPTOR CONmuTADOR DE 3 VIAS	u		7,30		-		-			-	
	TOMACORRIENTES GENERALES											
373	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	895,00	3,34	2.989,30000	895,00		895,00	2.989,30		2.989,300	100,00%
374	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	300,00	1,18	354,00000	256,00	18,00	274,00	302,08	21,24	323,320	91,00%
375	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	670,00	0,56	375,20000	512,00	15,00	527,00	286,72	8,40	295,120	79,00%
376	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	400,00	4,87	1.948,00000	228,00	16,00	244,00	1.110,36	77,92	1.188,280	61,00%
377	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	4.000,00	1,43	5.720,00000	2.800,00		2.800,00	4.004,00		4.004,000	70,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
378	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	1.080,00	1,43	1.544,40000	756,00		756,00	1.081,08		1.081,080	70,00%
379	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	1.080,00	1,03	1.112,40000	756,00		756,00	778,68		778,680	70,00%
380	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	155,00	1,57	243,35000	155,00		155,00	243,35		243,350	100,00%
381	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	170,00	7,45	1.266,50000	163,00		163,00	1.214,35		1.214,350	100,00%
	TOMACORRIENTES REGULADOS UPS											
382	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	368,00	3,34	1.229,12000	368,00		368,00	1.229,12		1.229,120	100,00%
383	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	125,00	1,18	147,50000	121,00		121,00	142,78		142,780	97,00%
384	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	220,00	0,56	123,20000	220,00		220,00	123,20		123,200	100,00%
385	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	190,00	4,87	925,30000	129,00		129,00	628,23		628,230	68,00%
386	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	48,00	1,57	75,36000	48,00		48,00	75,36		75,360	100,00%
387	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	489,00	1,43	699,27000	489,00		489,00	699,27		699,270	100,00%
388	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	489,00	1,43	699,27000	489,00		489,00	699,27		699,270	100,00%
389	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	489,00	1,03	503,67000	489,00		489,00	503,67		503,670	100,00%
390	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	48,00	7,45	357,60000	48,00		48,00	357,60		357,600	100,00%
	ALIMENTACION AIREACONDICIONADO PLANTA BAJA Y ALATA											
391	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	600,00	3,34	2.004,00000	283,81		283,81	947,93		947,930	47,00%
392	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	250,00	1,18	295,00000	64,00		64,00	75,52		75,520	26,00%
393	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	200,00	0,56	112,00000	134,00		134,00	75,04		75,040	67,00%
394	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	248,00	4,87	1.207,76000	162,00		162,00	788,94		788,940	65,00%
395	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	885,00	1,43	1.265,55000	885,00		885,00	1.265,56		1.265,560	100,00%
396	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	885,00	1,43	1.265,55000	885,00		885,00	1.265,56		1.265,560	100,00%
397	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	885,00	1,43	1.265,55000	885,00		885,00	1.265,56		1.265,560	100,00%
398	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	50,00	1,57	78,50000	30,00		30,00	47,10		47,100	60,00%
399	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 220 V.	u	50,00	7,45	372,50000	-		-			-	
	AREA DE MECANICA PESADA Y LIVIANA											
	INSTALACION LUMINARIAS											
400	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	540,00	3,34	1.803,60000	540,00		540,00	1.803,60		1.803,600	100,00%
401	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	66,00	1,18	77,88000	66,00		66,00	77,88		77,880	100,00%
402	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	132,00	0,56	73,92000	132,00		132,00	73,92		73,920	100,00%
403	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	436,00	4,87	2.123,32000	286,00		286,00	1.392,82		1.392,820	100,00%
404	CAJETINES mETALICOS CuADRADOS CON TAPA 10X10	u	20,00	4,99	99,80000	10,00		10,00	49,90		49,900	100,00%
405	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	65,00	1,57	102,05000	30,00		30,00	47,10		47,100	100,00%
406	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AmARILLO (INC. TAYPE)	m	88,00	2,28	200,64000	88,00		88,00	200,64		200,640	100,00%
407	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	88,00	1,43	125,84000	88,00		88,00	125,84		125,840	100,00%
408	LumINARIA LED 3X18W/120 VOLTIOS	u	11,00	60,59	666,49000	41,00		41,00	2.484,19		2.484,190	100,00%
409	LumINARIA LED 24W/120 VOLTIOS	u		58,36		-		-			-	
410	INTERRuPTOR SImPLE CON TAPA	u		5,47		2,00		2,00	10,94		10,940	1,00
411	INTERRuPTOR DOBLE CON TAPA	u	1,00	6,16	6,16000	1,00		1,00	6,16		6,160	100,00%
412	INTERRuPTOR TRIPLE CON TAPA	u	1,00	7,30	7,30000	-		-			-	
413	LumINARIA LED 150W/220 VOLTIOS	u	53,00	193,85	10.274,05000	53,00		53,00	10.274,05		10.274,050	100,00%
414	TENDIDO DE CABLE CONCENTRICO 2X12 AWG(INC. TAYPE)	m	710,00	3,43	2.435,30000	710,00		710,00	2.435,30		2.435,300	100,00%
	TOMACORRIENTES GENERALES											
415	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	300,00	3,34	1.002,00000	300,00		300,00	1.002,00		1.002,000	100,00%
416	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	100,00	1,18	118,00000	87,00		87,00	102,66		102,660	100,00%
417	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	150,00	0,56	84,00000	150,00		150,00	84,00		84,000	100,00%
418	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	200,00	4,87	974,00000	101,00		101,00	491,87		491,870	100,00%
419	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	350,00	1,43	500,50000	350,90		350,90	501,79		501,790	100,00%
420	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	350,00	1,43	500,50000	350,90		350,90	501,79		501,790	100,00%
421	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	350,00	1,03	360,50000	350,90		350,90	361,43		361,430	100,00%
422	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	30,00	1,57	47,10000	30,00		30,00	47,10		47,100	100,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
423	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	30,00	7,45	223,50000	30,00		30,00	223,50		223,500	100,00%
424	TuBERIA EmT 3/4 PuLGADA	m	250,00	3,47	867,50000	250,00		250,00	867,50		867,500	100,00%
425	TENDIDO DE CABLE CONCENTRICO NO.3X10 AWG (INC. TAYPE)	m	400,00	4,01	1.604,00000	400,00		400,00	1.604,00		1.604,000	100,00%
426	TOmA ESPECIAL 220 VOLTIOS	u	25,00	11,10	277,50000	20,00		20,00	222,00		222,000	100,00%
	AREA DE CHAPISTERIA, LAVADO, TORNO, VULCANIZADORA											
	INSTALACION LUMINARIAS											
427	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	195,00	3,34	651,30000	195,00		195,00	651,30		651,300	100,00%
428	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	65,00	1,18	76,70000	44,00		44,00	51,92		51,920	100,00%
429	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	98,00	0,56	54,88000	98,00		98,00	54,88		54,880	100,00%
430	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	328,00	4,87	1.597,36000	184,00		184,00	896,08		896,080	100,00%
431	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	26,00	1,57	40,82000	20,00		20,00	31,40		31,400	100,00%
432	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AmARILLO (INC. TAYPE)	m	220,00	2,28	501,60000	136,93		136,93	312,20		312,200	100,00%
433	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	220,00	1,43	314,60000	136,93		136,93	195,81		195,810	100,00%
434	LumINARIA LED3X18W/120 VOLTIOS	u	45,00	60,59	2.726,55000	39,00		39,00	2.363,01		2.363,010	86,67%
435	LumINARIA LED 150W/220 VOLTIOS	u	20,00	193,85	3.877,00000	16,00		16,00	3.101,60		3.101,600	80,00%
436	TENDIDO DE CABLE CONCENTRICO 2X12 AWG(INC. TAYPE)	m	150,00	3,43	514,50000	150,00		150,00	514,50		514,500	100,00%
437	INTERRuPTOR SImPLE CON TAPA	u	20,00	5,47	109,40000	16,00		16,00	87,52		87,520	100,00%
	TOMACORRIENTES GENERALES											
438	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	635,00	3,34	2.120,90000	138,90		138,90	463,92		463,920	100,00%
439	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	212,00	1,18	250,16000	122,00		122,00	143,96		143,960	100,00%
440	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	315,00	0,56	176,40000	289,00		289,00	161,84		161,840	100,00%
441	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	428,00	4,87	2.084,36000	139,00		139,00	676,93		676,930	100,00%
442	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	550,00	1,43	786,50000	275,00		275,00	393,25		393,250	100,00%
443	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	550,00	1,43	786,50000	275,00		275,00	393,25		393,250	100,00%
444	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	550,00	1,03	566,50000	275,00		275,00	283,25		283,250	100,00%
445	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	40,00	7,45	298,00000	37,00		37,00	275,65		275,650	100,00%
446	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	42,00	1,57	65,94000	37,00		37,00	58,09		58,090	100,00%
447	TuBERIA EmT 3/4 PuLGADA	m	127,00	3,47	440,69000	127,00		127,00	440,69		440,690	100,00%
448	uNION EmT 3/4 PuLGADA	u	43,00	1,28	55,04000	43,00		43,00	55,04		55,040	100,00%
449	CONECTOR EmT 3/4 PuLGADA	u	86,00	0,77	66,22000	86,00		86,00	66,22		66,220	100,00%
450	TOmA ESPECIAL 220 VOLTIOS	u	10,00	11,10	111,00000	10,00		10,00	111,00		111,000	100,00%
	AREA DE RESGUARDO DE VEHICULOS											
	INSTALACION LUMINARIAS											
451	LumINARIA LED 150W/220 VOLTIOS	u	20,00	193,85	3.877,00000	15,00		15,00	2.907,75		2.907,750	75,00%
452	TENDIDO DE CABLE CONCENTRICO 2X12 AWG(INC. TAYPE)	m	512,00	3,43	1.756,16000	512,00		512,00	1.756,16		1.756,160	100,00%
	TOMACORRIENTES GENERALES											
453	TOmA ESPECIAL 220 VOLTIOS	u	8,00	11,10	88,80000	-		-			-	
454	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	8,00	1,57	12,56000	-		-			-	
	GRUPO ELECTROGENO											
	ACOMETIDA CENTRO DE TRANSFORMACION, GENERACION Y MEDICION DE ENERGIA											
455	mEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA INDIRECTO TRIFASICO 400/5A CLASE 0.5	u	1,00	3.275,86	3.275,86000	1,00		1,00	3.275,86		3.275,860	100,00%
456	CAJA DE PROTECCION GENERAL TRIFASICA NH-3X350A	u	1,00	468,19	468,19000	1,00		1,00	468,19		468,190	100,00%
457	GENERADOR DE EmERGENCIA EN CABINA INSONORA 50KVA TRIFASICO 127/220V	u	1,00	23.030,45	23.030,45000	1,00		1,00	23.030,45		23.030,450	100,00%
458	TABLERO DE TRANSFERENCIA AuTOmATICO TRIFASICO 3P/300A	u	1,00	4.845,70	4.845,70000	1,00		1,00	4.845,70		4.845,700	100,00%
459	PRuEBAS DE ENERGIZACION Y TRAmITES EmPRESA ELECTRICA, PAGOS (Global)	u	1,00	3.278,88	3.278,88000	1,00		1,00	3.278,88		3.278,880	100,00%
460	SISTEmA uPS TRIFÁSICODE 30 KVA	u	1,00	24.986,66	24.986,66000	1,00		1,00	24.986,66		24.986,660	100,00%
461	TABLERO DE BYPASS TRIFASICO 100A CON BARRAS DE COBRE	u	1,00	2.669,86	2.669,86000	1,00		1,00	2.669,86		2.669,860	100,00%
462	SISTEmA DE PROTECCION ATmOSFERICA PARRAYOS	u	2,00	1.643,60	3.287,20000	2,00		2,00	3.287,20		3.287,200	100,00%
	ALIMENTADORES Y SUBTABLEROS CT-1											

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	ALIMENTADOR TDP-STE PB1											
463	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO.3X8+8Cu TW (INC. TAYPE)	m	18,00	12,44	223,92000	18,00		18,00	223,92		223,920	100,00%
464	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PB1	u	1,00	200,82	200,82000	1,00		1,00	200,82		200,820	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE PB2											
465	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	31,00	14,51	449,81000	31,00		31,00	449,81		449,810	100,00%
466	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PB2	u	1,00	323,93	323,93000	1,00		1,00	323,93		323,930	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE PB3											
467	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	41,00	14,51	594,91000	41,00		41,00	594,91		594,910	100,00%
468	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PB3	u	1,00	213,64	213,64000	1,00		1,00	213,64		213,640	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE PB4											
469	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	32,00	14,51	464,32000	32,00		32,00	464,32		464,320	100,00%
470	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PB4	u	1,00	226,90	226,90000	1,00		1,00	226,90		226,900	100,00%
	ALIMENTADOR TPD-STE PB5											
471	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	26,00	14,51	377,26000	26,00		26,00	377,26		377,260	100,00%
472	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PB5	u	1,00	226,90	226,90000	1,00		1,00	226,90		226,900	100,00%
	ALIMENTADOR TPD-STE-PB6											
473	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	132,00	14,51	1.915,32000	132,00		132,00	1.915,32		1.915,320	100,00%
474	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PB6	u	3,00	297,41	892,23000	3,00		3,00	892,23		892,230	100,00%
	ALIMENTADOR STD-STE-PA1											
475	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	41,00	14,51	594,91000	41,00		41,00	594,91		594,910	100,00%
476	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PA1	u	1,00	214,08	214,08000	1,00		1,00	214,08		214,080	100,00%
	ALIMENTADOR STD-STE-PA2											
477	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	111,00	14,51	1.610,61000	111,00		111,00	1.610,61		1.610,610	100,00%
478	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PA2	u	3,00	297,41	892,23000	3,00		3,00	892,23		892,230	100,00%
	ALIMENTADOR TPD-STE-PA3											
479	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	45,00	14,51	652,95000	45,00		45,00	652,95		652,950	100,00%
480	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PA3	u	1,00	230,78	230,78000	1,00		1,00	230,78		230,780	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-PA4											
481	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	35,00	14,51	507,85000	35,00		35,00	507,85		507,850	100,00%
482	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PA4	u	1,00	304,26	304,26000	1,00		1,00	304,26		304,260	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-PA5											
483	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	47,00	14,51	681,97000	47,00		47,00	681,97		681,970	100,00%
484	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PA5	u	2,00	217,52	435,04000	2,00		2,00	435,04		435,040	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-PA6											
485	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	56,00	14,51	812,56000	56,00		56,00	812,56		812,560	100,00%
486	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PA6	u	1,00	310,67	310,67000	1,00		1,00	310,67		310,670	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A1											
487	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	122,00	14,51	1.770,22000	106,20		106,20	1.540,96		1.540,960	87,05%
488	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6ESPACIOS A1	u	4,00	122,27	489,08000	3,00		3,00	366,81		366,810	75,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A2											
489	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	130,00	14,51	1.886,30000	65,00		65,00	943,15		943,150	50,00%
490	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS A2	u	1,00	122,27	122,27000	-		-			-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR-A3											
491	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	57,00	14,51	827,07000	57,00		57,00	827,08		827,080	100,00%
492	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS A3	u	1,00	187,12	187,12000	1,00		1,00	187,12		187,120	100,00%
	ALIMENTADOR TPD-STE-ANGAR-A4											
493	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	92,00	14,51	1.334,92000	43,10		43,10	625,38		625,380	46,85%
494	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS A4	u	2,00	122,27	244,54000	-		-			-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A5											
495	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	95,00	14,51	1.378,45000	95,00		95,00	1.378,46		1.378,460	100,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
496	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12ESPACIOS A5	u	1,00	200,82	200,82000	1,00		1,00	200,82		200,820	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A6											
497	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	146,00	14,51	2.118,46000	62,50		62,50	906,87		906,870	42,81%
498	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS A6	u	2,00	122,27	244,54000	-		-			-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR-A7											
499	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	82,00	14,51	1.189,82000	82,00		82,00	1.189,82		1.189,820	100,00%
500	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS A7	u	1,00	228,23	228,23000	1,00		1,00	228,23		228,230	100,00%
	ALIMENTADOR TPD-STE-CONDENSADORES											
501	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	12,00	14,51	174,12000	12,00		12,00	174,12		174,120	100,00%
502	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS CONDENSADORES	u	1,00	738,12	738,12000	1,00		1,00	738,12		738,120	100,00%
	ALIMENTADORES Y SUBTABLEROS CT-2											
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A1											
503	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	41,00	14,51	594,91000	20,50	21,50	42,00	297,46	311,97	609,430	102,44%
504	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12ESPACIOS ANGAR A1	u	1,00	187,12	187,12000	1,00		1,00	187,12		187,120	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A2											
505	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	80,00	14,51	1.160,80000	40,00		40,00	580,40		580,400	50,00%
506	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS ANGAR 2	u	1,00	122,27	122,27000	1,00		1,00	122,27		122,270	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR-A3											
507	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	55,00	14,51	798,05000	27,50		27,50	399,03		399,030	50,00%
508	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS ANGAR 3	u	1,00	122,27	122,27000	1,00		1,00	122,27		122,270	100,00%
	ALIMENTADOR TPD-STE-ANGAR-A4											
509	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	40,00	14,51	580,40000	20,00		20,00	290,20		290,200	50,00%
510	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS ANGAR 4	u	1,00	173,41	173,41000	1,00		1,00	173,41		173,410	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A5											
511	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	47,00	14,51	681,97000	47,00		47,00	681,98		681,980	100,00%
512	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12ESPACIOS ANGAR 5	u	1,00	173,41	173,41000	1,00		1,00	173,41		173,410	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A6											
513	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	168,00	14,51	2.437,68000	147,86		147,86	2.145,45		2.145,450	88,01%
514	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS ANGAR 6	u	3,00	200,82	602,46000	3,00		3,00	602,46		602,460	100,00%
	ACOMETIDA B.V PRINCIPAL											
515	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 2/0 THHN	m	144,00	4,18	601,92000	142,00		142,00	593,56		593,560	98,61%
516	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 1/0 THHN	m	36,00	4,18	150,48000	22,50	13,50	36,00	94,05	56,43	150,480	100,00
	ACOMETIDA DE GENERADOR - TTA											
517	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 2/0 THHN	m	120,00	4,18	501,60000	119,60		119,60	499,93		499,930	99,67%
518	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 1/0 THHN	m	40,00	4,18	167,20000	40,00		40,00	167,20		167,200	100,00%
	ACOMETIDA DE TTA - TDP-N											
519	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 1/0 THHN	m	60,00	4,18	250,80000	60,00		60,00	250,80		250,800	100,00%
520	TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNuDO NO. 2 AWG	m	25,00	5,92	148,00000	21,40		21,40	126,69		126,690	100,00%
	ACOMETIDA DE TTA - TP											
521	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 1/0 THHN	m	40,00	4,18	167,20000	40,00		40,00	167,20		167,200	100,00%
522	TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNuDO NO. 2 AWG	m	14,00	5,92	82,88000	14,00		14,00	82,88		82,880	100,00%
	CERCO ELECTRICO CERRAMIENTO											
523	INSTALACION DE CENTRAL ENERGIZADORA 5K	u		594,89		-	1,00	1,00		594,89	594,890	100%
524	COLOCACION DE TuBERIA PREPARADA	u		10,70		-	201,00	201,00		2.150,70	2.150,700	100%
525	COLOCACION DE AISLADORES DE PASO DE ESQuINA Y PASANTE	u		5,26		-	1.205,00	1.205,00		6.338,30	6.338,300	100%
526	TENDIDO DE ALAmBRE SOLIDO GALVANIZADO	m		0,92		-	4.784,40	4.784,40		4.401,65	4.401,650	100%
527	TENDIDO DE CONDuCTOR DE COBRE DE ALTA TENSION 1/0	m		18,77		-	11,60	11,60		217,73	217,730	100%
528	INSTALACIONDE BATERIA Y SIRENA	m		962,28		-	1,00	1,00		962,28	962,280	100%
529	SISTEmA DE PuESTA A TIERRA	u		60,25		-	1,00	1,00		60,25	60,250	100%
	11.- SISTEMA HIDRAULICO SANITARIO Y CONTRAINCENDIOS						**SH**					

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	SITEMA DE AGUA POTABLE A PRESIÓN CONSTANTE											
	ACOMETIDA DE AGUA POTABLE											
530	TuBERIA PVC D=63 mm 1,0 mPA u/E + PRuEBA	m	470,00	4,09	1.922,30000	-	43,00	43,00		175,87	175,870	9,15
531	CONEXION DOmICILIARIA INC.mEDIDOR,EN TuBO D=63mm	u	2,00	100,91	201,82000	-	2,00	2,00		201,82	201,820	100,00
532	HIDRANTES D=3" INCLuYE ACCESORIOS	u	2,00	702,84	1.405,68000	-		-			-	
	TUBERIA PVC AGUA POTABLE											
533	TuBERIA PVC ROSCABLE D=1/2" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	361,00	5,86	2.115,46000	88,42		88,42	518,12		518,120	24,49%
534	TuBERIA PVC ROSCABLE D=3/4" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	59,58	6,59	392,63220	31,93		31,93	210,42		210,420	53,59%
535	TuBERIA PVC ROSCABLE D=1" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	158,67	9,78	1.551,79260	158,67		158,67	1.551,79		1.551,790	100,00%
536	TuBERIA PVC ROSCABLE D=1 1/2" EN EDIFICACION+PRuEB	m	98,92	16,09	1.591,62280	-		-			-	
537	TuBERIA PVC ROSCABLE D=2" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	45,08	14,86	669,88880	45,08		45,08	669,89		669,890	100,00%
538	TuBERIA PVC ROSCABLE D=2 1/2"" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	20,04	16,38	328,25520	-		-			-	
539	TuBERIA PVC ROSCABLE D=3" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	335,60	17,90	6.007,24000	15,04		15,04	269,22		269,220	4,48%
540	TuBERIA PVC ROSCABLE D=4" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	32,81	18,83	617,81230	-		-			-	
	ACCESORIOS INST. TUB PVC ROSCABLE AGUA POTABLE											
541	ANCLAJES mETALICOS PLATINA 2 por 1/2" (ABRAZADERAS), EN LOSA Y PARED	u	250,00	14,11	3.527,50000	148,00		148,00	2.088,28		2.088,280	59,20%
542	S.I. PuNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGuA por punto	u	90,00	13,67	1.230,30000	47,00		47,00	642,49		642,490	52,22%
543	S. I. PuNTO AGuA FRIA PVC ROSCABLE D = 2" por punto	u	35,00	63,31	2.215,85000	-		-			-	
544	VALVuLA DE BRONCE RW 2" +ACCESORIOS	u	5,00	34,99	174,95000	5,00		5,00	174,95		174,950	100,00%
545	LLAVE DE PASODE 1/2 PuLG	u	15,00	10,15	152,25000	15,00		15,00	152,25		152,250	100,00%
	SISTEMA DE AGUA CALIENTE											
546	S.I. PuNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGuA CALIENTE por punto	u		16,04		-		-			-	
547	TuBERIA AGuA CALIENTE PVC ROSCABLE D=1/2" EN EDIFICACION+PRuEBA	m		6,77		-		-			-	
548	CALENTADOR ELECTRICO ELECTRICO 15W	u		539,04		-		-			-	
	SISTEMA DE PRESION (BOMBEO) S AGUA POTABLE											
549	S. I. SISTEmA HIDRONEumATICO(2BOmBA5HP-TANQuE 19.8GAL-CAJA CONTROL-CONT. NIVEL-VÁLVuLA CHEQuE), uSO	u	1,00	7.104,62	7.104,62000	1,00		1,00	7.104,62		7.104,620	100,00%
550	S. I. SISTEmA HIDRONEumATICO(3BOmBA5HP-TANQuE 29.5GAL-CAJA CONTROL-CONT. NIVEL-VÁLVuLA CHEQuE), uSO	u	1,00	10.425,92	10.425,92000	1,00		1,00	10.425,92		10.425,920	100,00%
	SISTEMA CONTRAINCENDIOS											
551	S. I. TuBERÍA HG ASTmD = 2 ½" + PRuEBA	m	80,00	15,24	1.219,20000	80,00		80,00	1.219,20		1.219,200	100,00%
552	S.C. TuBERIA HG ASTm D = 1 1/2 " + PRuEBA	m	40,00	11,54	461,60000	12,10		12,10	139,63		139,630	100,00%
553	S. I. TEE HG ASTmD = 2½"	u	2,00	8,72	17,44000	2,00		2,00	17,44		17,440	100,00%
554	S. I. CODO HG ASTm90º X D = 2 ½"	u	10,00	6,70	67,00000	8,00		8,00	53,60		53,600	100,00%
555	S.I. uNION uNIVERSAL HG ASTm D = 2 1/2"	u	5,00	12,00	60,00000	5,00		5,00	60,00		60,000	100,00%
556	S.I. VALVuLA CHECK BRONCE D = 2 1/2 "	u	1,00	79,42	79,42000	1,00		1,00	79,42		79,420	100,00%
557	S. I. REDuCTOR HG ASTmD = 2 1/2" X 1 1/2"	u	1,00	9,48	9,48000	1,00		1,00	9,48		9,480	100,00%
558	S. I. uNIÓN uNIVERSAL HG ASTmD = 1 1/2"	u	5,00	8,23	41,15000	2,00		2,00	16,46		16,460	100,00%
559	S. I. CODO HG ASTm D = 1 1/2"	u	6,00	8,93	53,58000	5,00		5,00	44,65		44,650	100,00%
560	ANCLAJES mETALICOS PLATINA 2 por 1/2" (ABRAZADERAS), EN LOSA Y PARED	u	80,00	14,11	1.128,80000	67,00		67,00	945,37		945,370	100,00%
561	PuNTO H.G. ROSCABLE 1 1/2" AGuA por punto	u	2,00	74,00	148,00000	2,00		2,00	148,00		148,000	100,00%
562	PuNTO H.G. ROSCABLE 2" AGuA por punto	u	1,00	81,83	81,83000	-		-			-	
563	GAB CONT INCEN INC GAB SN VID, RACK DE INC Y mANG 100FT X1½"LLAVE SPANNER1½"NACHA, NIPLE DE BRONC Y P	u	2,00	749,90	1.499,80000	2,00		2,00	1.499,80		1.499,800	100,00%
564	SlAmESA 4"X 2 1/2" X 2 1/2" DE BRONCE	u	1,00	295,97	295,97000	1,00		1,00	295,97		295,970	100,00%
	EXTINTORES											
565	EXTINTOR PQS CAPACIDAD 10 LBS. CON CAJA mETALICA	u	16,00	99,84	1.597,44000	-		-			-	
566	EXTINTOR PQS CAPACIDAD 20 LBS. CON CAJA mETALICA	u	2,00	106,69	213,38000	-		-			-	
567	EXTINTOR CO2 CAPACIDAD 10 LBS. CON CAJA mETALICA	u	4,00	97,66	390,64000	-		-			-	
568	EXTINTOR CO2 CAPACIDAD 20 LBS. CON CAJA mETALICA	u	2,00	313,27	626,54000	-		-			-	
569	EXTINTOR CO2 CAPACIDAD TIPO SATELITE DE 50 LBS	u	1,00	578,23	578,23000	-		-			-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	SISTEMA DE PRESION (BOMBEO) S CONTRAINCENDIOS											
570	S. I. SISTEmA HIDRONEumATICO(BOmBA-mOTOR-CAJA DE CONTROL-CONTROL DE NIVEL-VÁLVuLA CHEQuE), uSOCON	u	1,00	7.949,92	7.949,92000	1,00		1,00	7.949,92		7.949,920	100,00%
571	BOmBA JOCKEY; 1 HP, Q=8.70 GPm, PRES=110m; INCLuYE TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS	u	1,00	2.762,08	2.762,08000	1,00		1,00	2.762,08		2.762,080	100,00%
	SISTEMA DE REUTILIZACION DE AGUAS LLUVIAS (RIEGO Y LAVADORA AUTO)											
572	REPLANTEO Y NIVELACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	m	250,00	1,81	452,50000	66,97		66,97	121,22		121,220	26,79%
573	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	200,00	17,93	3.586,00000	-		-			-	
574	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	200,00	6,32	1.264,00000	-		-			-	
575	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=160mm)	m	120,00	9,91	1.189,20000	120,00		120,00	1.189,20		1.189,200	100,00%
576	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	12,00	90,42	1.085,04000	-		-			-	
	TUBERIA PVC RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS						ALL					
577	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=160 mm S6	m	50,00	9,70	485,00000	50,00		50,00	485,00		485,000	100,00%
578	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT = 200 mm S6	m		15,28		-		-			-	
579	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 228 mm S6	m		15,88		-		-			-	
580	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 250 mm S6	m	90,00	16,51	1.485,90000	-		-			-	
581	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 300 mm S5	m	30,00	20,22	606,60000	-		-			-	
582	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=400 mm S5	m	428,11	38,33	16.409,45630	428,11		428,11	16.409,46		16.409,460	100,00%
583	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 450 mm S5	m	30,00	44,36	1.330,80000	-		-			-	
584	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 500 mm S5	m		74,42		-		-			-	
585	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 220A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u	3,00	21,28	63,84000	-		-			-	
586	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 335A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u	3,00	24,14	72,42000	3,00		3,00	72,42		72,420	100,00%
	TUBERIA PVC PRESIÓN RECOLECCION AGUAS LLUVIAS											
587	TuBERIA PVC D=3" 1.0 mPA + PRuBA	m	12,00	5,16	61,92000	-		-			-	
588	VALVuLA TIPO GLOBO (CONTROL NIVEL mECANICO)	u	2,00	17,82	35,64000	-		-			-	
589	ROCIADOR 3/4 Q=3.22 m3/H, RADIO COBERTuRA 15.8m, 5BAR	u		17,82		-		-			-	
590	TuBERIA PVC D=25 mm 1.0 mPA u/C + PRuEBA	m	80,00	2,98	238,40000	-		-			-	
591	TuBERIA PVC D=40 mm 1.0 mPA E/C + PRuEBA	m	20,00	3,38	67,60000	-		-			-	
592	TuBERIA PVC D=50 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m	20,00	3,50	70,00000	-		-			-	
593	TuBERIA PVC D=63 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m	47,00	4,09	192,23000	-		-			-	
594	TuBERIA PVC D=75 mm 1.0 mPA u/E + PRuBA	m	30,00	5,23	156,90000	-		-			-	
595	TuBERIA PVC D=90 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m	25,00	6,20	155,00000	-		-			-	
596	TuBERIA PVC D=110 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m		8,48		-		-			-	
597	TuBERIA PVC D=125 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m		11,54		-		-			-	
	SISTEMA DE PRESION (RIEGO Y LAVADORA AUTOS)											
598	GRuPO 2 BOmBAS15 HP (Q=12 L/S, TDH= 80mCA), (2BOmBA-mOTOR-CAJA DE CONTROL-CONTROL DE NIVEL-VÁLVuLA CH	u		6.465,34		-		-			-	
599	GRuPO 3 BOmBAS15 HP (Q=21 L/S, TDH= 80mCA), (3BOmBA-mOTOR-CAJA DE CONTROL-CONTROL DE NIVEL-VÁLVuLA CH	u	1,00	8.868,10	8.868,10000	1,00		1,00	8.868,10		8.868,100	100,00%
	SISTEMA SANITARIO INTERNO											
	PRELIMINARES Y MOV. TIERRAS											
600	REPLANTEO Y NIVELACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	m	390,00	1,81	705,90000	15,91		15,91	28,80		28,800	4,08
601	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	12,00	17,93	215,16000	-		-			-	
602	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3		6,32		-		-			-	
	INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE											
603	PuNTO DE DESAGuE EN PVC 50 mm	u	86,00	28,80	2.476,80000	86,00		86,00	2.476,80		2.476,800	100,00
604	PuNTO DE DESAGuE EN PVC 110 mm	u	45,00	34,43	1.549,35000	41,00		41,00	1.411,63		1.411,630	91,11
605	TuBERÍA PVC 50 mm DE DIÁmETRO (mAT/TRASP/INST)	m	125,60	5,14	645,58400	70,47		70,47	362,23		362,230	56,11
606	TuBERÍA PVC 110 mm DE DIÁmETRO (mAT/TRASP/INST)	m	420,00	8,02	3.368,40000	420,00		420,00	3.368,40		3.368,400	100,00
607	TuBERÍA PVC 160 mm DE DIÁmETRO (mAT/TRASP/INST)	m	165,00	14,52	2.395,80000	72,64		72,64	1.054,73		1.054,730	44,02%
608	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	6,00	90,42	542,52000	-		-			-	
	INSTALACION TUBERIA PVC DEVENTILACIÓN											

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
609	TuBERIA PVC D=75 mm VENTILACIÓN	m	78,00	4,27	333,06000	78,00		78,00	333,06		333,060	100,00%
610	PuNTO DE VENTILACIÓN PVC 75 mm por punto	u	25,00	15,61	390,25000	25,00		25,00	390,25		390,250	100,00%
	TANQUES DE RESERVA DE AGUA-CISTERNAS 49 M3											
	PRELIMINARES											
611	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	68,64	1,14	78,24960	-		-			-	
612	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	60,00	1,46	87,60000	60,00		60,00	87,60		87,600	100,00%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
613	EXCAVACIÓN mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-			-	
614	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	201,65	4,18	842,89700	201,60		201,60	842,69		842,690	99,98%
615	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	m2		11,56		-		-			-	
616	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	41,00	13,72	562,52000	41,00		41,00	562,52		562,520	100,00%
617	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	10,00	6,32	63,20000	-		-			-	
	HORMIGONES											
618	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	4,10	163,18	669,03800	4,10		4,10	668,91		668,910	99,98%
619	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	29,66	249,88	7.411,44080	26,85		26,85	6.709,28		6.709,280	90,53%
	ACERO ESTRUCTURAL											
620	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	2.459,03	1,68	4.131,17040	2.459,09		2.459,09	4.131,27		4.131,270	100,00%
621	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	50,00	2,76	138,00000	-		-			-	
622	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	50,00	0,11	5,50000	-		-			-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES											
623	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	144,00	10,27	1.478,88000	29,66		29,66	304,61		304,610	20,60%
624	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	113,00	26,06	2.944,78000	113,00		113,00	2.944,78		2.944,780	100,00%
625	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	15,00	4,72	70,80000	-		-			-	
626	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u	2,00	75,58	151,16000	-		-			-	
	TANQUES DE RESERVA DE AGUA-CISTERNAS 11 M3											
	PRELIMINARES											
627	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1,14		-		-			-	
628	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	36,80	1,46	53,72800	-		-			-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
629	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	5,00	17,93	89,65000	-		-			-	
630	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	97,58	4,18	407,88440	79,81		79,81	333,60		333,600	81,79%
631	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	m2	17,00	11,56	196,52000	-		-			-	
632	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	55,20	13,72	757,34400	51,31		51,31	703,97		703,970	92,95%
633	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	5,00	6,32	31,60000	-		-			-	
	HORMIGONES											
634	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	1,66	163,18	270,87880	1,66		1,66	270,88		270,880	100,00%
635	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	16,93	249,88	4.230,46840	13,22	3,71	16,93	3.302,16	927,05	4.229,210	99,97
	ACERO ESTRUCTURAL											
636	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	1.490,00	1,68	2.503,20000	1.490,00		1.490,00	2.503,20		2.503,200	100,00%
637	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	40,00	2,76	110,40000	-		-			-	
638	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	40,00	0,11	4,40000	-		-			-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES											
639	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	69,83	10,27	717,15410	-	52,53	52,53		539,43	539,430	75,22
640	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	69,83	26,06	1.819,76980	-	52,53	52,53		1.368,80	1.368,800	75,22
641	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	15,00	4,72	70,80000	-	12,42	12,42		58,62	58,620	82,80
642	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u	2,00	75,58	151,16000	-		-			-	
	TANQUES DE RESERVA DE AGUA-CISTERNAS 36 M3(REUTILIZACION AGUA LLUVIA)											

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	PRELIMINARES											
643	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1,14		-		-			-	
644	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2		1,46		-		-			-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
645	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-			-	
646	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3		4,18		-		-			-	
647	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	m2		11,56		-		-			-	
648	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3		13,72		-		-			-	
649	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3		6,32		-		-			-	
	HORMIGONES											
650	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3		163,18		-		-			-	
651	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRANSPORTE	m3		249,88		-		-			-	
	ACERO ESTRUCTURAL											
652	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg		1,68		-		-			-	
653	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg		2,76		-		-			-	
654	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg		0,11		-		-			-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES											
655	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2		10,27		-		-			-	
656	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2		26,06		-		-			-	
657	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2		4,72		-		-			-	
658	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u		75,58		-		-			-	
	TANQUES DE RESERVA DE AGUA-CISTERNAS 20 M3(REUTILIZACION AGUA LLUVIA)											
	PRELIMINARES											
659	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1,14		-		-			-	
660	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2		1,46		-		-			-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
661	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-			-	
662	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3		4,18		-		-			-	
663	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	m2		11,56		-		-			-	
664	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3		13,72		-		-			-	
665	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3		6,32		-		-			-	
	HORMIGONES											
666	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3		163,18		-		-			-	
667	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRANSPORTE	m3		249,88		-		-			-	
	ACERO ESTRUCTURAL											
668	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg		1,68		-		-			-	
669	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg		2,76		-		-			-	
670	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg		0,11		-		-			-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES											
671	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2		10,27		-		-			-	
672	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2		26,06		-		-			-	
673	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2		4,72		-		-			-	
674	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u		75,58		-		-			-	
	TRAMPA DE GRASAS											
675	TRAmPA DE GRASAS 0.60 por 1.40 por H=1.70 (F'C= 210 KG/Cm2), INC. ACCESORIOS	u		161,89		-		-			-	
676	SumINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA H.F. (1.00 por 0.40 por 0.05)110 KG	u		130,84		-		-			-	
677	CANAL. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 , E= 10Cm + 1Ø10mm A 12Cm	m		90,42		-		-			-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	12.- SISTEMA DE ING. MECANICA (CLIMATIZACIÓN, AIRE PRESURIZADO, ELEVADORES HIDRAULICO, CABINA PINTURA											
	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN											
678	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 9,500 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CON	u		1.235,36		-		-			-	
679	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 12000 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CON	u		1.318,07		-		-			-	
680	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 18000 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CON	u		1.349,08		-		-			-	
681	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 24,000 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CO	u	2,00	1.504,15	3.008,30000	2,00		2,00	3.008,30		3.008,300	100,00%
682	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 30,000 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CO	u		1.561,01		-		-			-	
683	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 36,000 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CO	u	5,00	1.767,77	8.838,85000	5,00		5,00	8.838,85		8.838,850	100,00%
684	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 1/4 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉRmICO	m	60,00	11,74	704,40000	49,45		49,45	580,54		580,540	82,42%
685	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 1/2 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉRmICO	m	68,00	12,29	835,72000	49,45		49,45	607,74		607,740	72,72%
686	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 3/4 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉRmICO	m	8,00	18,29	146,32000	6,33		6,33	115,78		115,780	79,13%
687	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 5/8 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉRmICO	m	50,00	15,65	782,50000	50,00		50,00	782,50		782,500	100,00%
688	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 3/8 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTOTÉRmICO	m	50,00	11,96	598,00000	50,00		50,00	598,00		598,000	100,00%
689	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 1-1/8 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉRmICO	m	28,00	30,40	851,20000	22,43		22,43	681,87		681,870	80,11%
690	SOPORTE DE TuBERÍA DE COBRE	u	45,00	14,95	672,75000	45,00		45,00	672,75		672,750	100,00%
691	TuBERIA PVC DIAmETRO 50 mm	m	260,00	7,31	1.900,60000	49,34		49,34	360,64		360,640	18,98%
692	TuBERIA PVC DIAmETRO 75 mm	m	20,00	7,42	148,40000	-		-			-	
693	DuCTO DE TOL TOLGALVANIZADO	Kg		5,81		-		-			-	
694	REJILLA EXTRACCIÓN/SumINISTRO TIPO LOuVER CON ALETASFIJAS DE ACERO 12X12,INCLuYE CAJA mETALICA	u		83,69		-		-			-	
695	REJILLA SumINISTRO TIPO LOuVER CON ALETAS mÓVILES Y FIJAS DE ACERO 12X12,INCLuYE CAJA mETALICA	u		95,12		-		-			-	
696	DuCTO FLEXIBLE DIÁmETRO 6"	u		13,60		-		-			-	
697	DuCTO FLEXIBLE DIÁmETRO 4"	u		13,36		-		-			-	
698	VENTILADOR CENTRIFuGO EN LÍNEA PARA TumBADO 2500 CFm @ 0.35 PLG. H2O,1,5 HP	u		1.515,23		-		-			-	
699	VENTILADOR CENTRIFuGO EN LÍNEA PARA TumBADO 1700 CFm @ 0.32 PLG. H2O,1HP	u		1.401,52		-		-			-	
700	VENTILADOR CENTRIFuGO TIPO DOWNBLAST PARA TECHO 500 CFm @ 0.32 PLG. H2O,1,4HP	u		1.378,78		-		-			-	
701	uNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR TIPO VRV, DC INVERTER, 118,000 BTu/H	u	2,00	9.376,49	18.752,98000	2,00		2,00	18.752,98		18.752,980	100,00%
702	uNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR TIPO VRV, DC INVERTER, 140,000 BTu/H	u		10.286,22		-		-			-	
703	uNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR TIPO VRV, DC INVERTER, 158,000 BTu/H	u		12.426,17		-		-			-	
704	uNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR TIPO VRV, DC INVERTER, 188,000 BTu/H	u		11.754,19		-		-			-	
705	CONTROL CENTRALIZADO PARA LAS uNIDADES CONDENSADORAS	u	1,00	2.505,01	2.505,01000	1,00		1,00	2.505,01		2.505,010	100,00%
706	S. I. EXTRACTOR EÓLICO INDuSTRIAL,TuRBINA=112 Cm, DuCTO 61Cm; ALTuRA=85Cm,ASPAS ALumINIO BASE GALVA	u	50,00	326,58	16.329,00000	10,00		10,00	3.265,80		3.265,800	20,00%
	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO											
707	COmPRESOR DE AIRE DE PISTÓN 15 HP, CuATRO PISTONES, LuBRICACIÓN CON ACEITE,220 V, TRIFASICO, 60 HZ	m	2,00	5.513,68	11.027,36000	-		-			-	
708	TuBERIA DE COBRE DIAmETRO 1-1/2 PLG. TIPO L, SOLDADA	m	380,00	33,29	12.650,20000	-		-			-	
709	TuBERIA DE COBREDIAmETRO 1/2 PLG. TIPO L, SOLDADA	m	100,00	10,49	1.049,00000	-		-			-	
710	VÁLVuLAS DE BOLA DE 1/2 PLG DE BRONCE	m	26,00	10,80	280,80000	-		-			-	
711	SOPORTE DE TuBERÍA DE COBRE	u	70,00	14,95	1.046,50000	-		-			-	
	CABINA PARA PINTURA											
712	Sum E INST. CABINA PARA PINTuRA HORNO ANCHO=3.68, ALTO=3.275, LARGO=6.80; ESPESOR PARED 40mm, NOmINAL	u	1,00	38.677,92	38.677,92000	-		-			-	
	ELEVADOR HIDRAULICO											
713	ELEVADOR HIDRAuLICO mOVIL TIPO 4 COLumNAS, ST 1075, CAP=16500 LBS, ALT ELEVACION =73", 3 HP/4HP POR C	u	1,00	43.151,04	43.151,04000	1,00		1,00	43.151,04		43.151,040	100,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	13.- SISTEMA ELECTRONICO, VOZ, DATOS, INCENDIOS)						SD					
	CANALIZACION											
714	POZO DE REVISION 60X60X60Cm	u	23,00	158,53	3.646,19000	23,00		23,00	3.646,19		3.646,190	100,00%
715	BANDEJA TIPO ESCALERILLA 10CmX8Cm INCLuYE ACCESORIOS	m	172,00	46,57	8.010,04000	162,45	4,00	166,45	7.555,30	186,28	7.751,580	96,77%
716	BANDEJA TIPO ESCALERILLA 25CmX10Cm INCLuYE ACCESORIOS	m	324,00	100,74	32.639,76000	252,24		252,24	25.410,67		25.410,670	77,85%
717	TuBERIA PVC REFORZADA 4"	m	780,00	20,27	15.810,60000	366,00		366,00	7.418,82		7.418,820	46,92
718	TuBERÍA CONDuIT EmT 1/2" DE DIÁmETRO INCLuIDO ACCESORIOS	m	50,00	7,21	360,50000	-		-			-	
719	TuBERÍA CONDuIT EmT 3/4" DE DIÁmETRO INCLuIDO ACCESORIOS	m	50,00	16,51	825,50000	-		-			-	
720	TuBERÍA CONDuIT EmT 1" DE DIÁmETRO INCLuIDO ACCESORIOS	m	120,00	19,19	2.302,80000	120,00		120,00	2.302,80		2.302,800	100,00%
721	POSTE mETALICO	u		923,51		-		-			-	
	SISTEMA DE VOZ Y DATOS											
722	PuNTO DE RED DE DATOS CON CABLE FTP 6A	u	197,00	151,66	29.877,02000	197,00		197,00	29.877,02		29.877,020	100,00%
723	RACK DE SALA DE EQuIPOS TIPO ARmARIO 42 uR	u	1,00	1.817,12	1.817,12000	1,00		1,00	1.817,12		1.817,120	100,00%
724	RACK DE SALA DE COmuNICACIONES TIPO ARmARIO 42 uR	u	1,00	1.617,13	1.617,13000	1,00		1,00	1.617,13		1.617,130	100,00%
725	RACK DE SALA DE COmuNICACIONES TIPO ARmARIO 12 uR	u	3,00	742,45	2.227,35000	3,00		3,00	2.227,35		2.227,350	100,00%
726	PATCH PANEL 24 PuERTOS RJ45 CATEGORIA 6A BLINDADO mODuLAR	u	12,00	213,78	2.565,36000	12,00		12,00	2.565,36		2.565,360	100,00%
727	PATCH COORD CATEGORIA 6A FTP 1 m	u	197,00	20,17	3.973,49000	197,00		197,00	3.973,49		3.973,490	100,00%
728	PATCH COORD CATEGORIA 6A FTP 10 PIES	u	197,00	21,78	4.290,66000	197,00		197,00	4.290,66		4.290,660	100,00%
729	VERIFICACION Y PRuEBAS DE CATEGORIA	u	197,00	18,92	3.727,24000	197,00		197,00	3.727,24		3.727,240	100,00%
730	SWITCH 24 PuERTOS RJ45, CAPA 2, POE, mODuLAR SFP+	u	8,00	1.753,78	14.030,24000	8,00		8,00	14.030,24		14.030,240	100,00%
731	SWITCH 24 PuERTOS RJ45, CAPA 2, mODuLAR SFP+	u	4,00	1.042,64	4.170,56000	4,00		4,00	4.170,56		4.170,560	100,00%
732	SWITCH 24 PuERTOS RJ45, CAPA 3, POE, mODuLAR SFP+	u	1,00	1.410,88	1.410,88000	1,00		1,00	1.410,88		1.410,880	100,00%
733	mODuLO PARA SWITCH CON 2 PuERTOS DE 10 GBPS PARA STACK	u	2,00	2.555,02	5.110,04000	-		-			-	
734	CABLE FLEXIBLE PARA STACK CON 2 CONECTORES DE 10 GBPS	u	8,00	454,27	3.634,16000	8,00		8,00	3.634,16		3.634,160	100,00%
735	mODuLO PARA SWITCH CON 2 PORTICOS DE 10GBPS (SFP+)	u	2,00	2.557,78	5.115,56000	-		-			-	
736	TRANSCEIVER DE 10 GBPS (SFP+)	u	8,00	3.317,76	26.542,08000	8,00		8,00	26.542,08		26.542,080	100,00%
737	PATCH COORD DE FIBRA OPTICA 3mT	u	10,00	62,35	623,50000	10,00		10,00	623,50		623,500	100,00%
738	ACCES POINT	u	9,00	643,76	5.793,84000	9,00		9,00	5.793,84		5.793,840	100,00%
739	CONTROLADOR DE RED INALAmBRICA	u	2,00	4.213,78	8.427,56000	2,00		2,00	8.427,56		8.427,560	100,00%
740	FIBRA OPTICA muLTImODO 6 HILOS	u	500,00	15,04	7.520,00000	500,00		500,00	7.520,00		7.520,000	100,00%
741	BANDEJA DE FIBRA OPTICA 12 PuERTOS CON CONECTORES LC	u	1,00	411,79	411,79000	1,00		1,00	411,79		411,790	100,00%
742	BANDEJA DE FIBRA OPTICA 6 PuERTOS	u	4,00	263,96	1.055,84000	4,00		4,00	1.055,84		1.055,840	100,00%
743	FuSIONADO DE FIBRA OPTICA INCLuYE PIGTAIL Y CERTIFICACION	u	10,00	98,34	983,40000	10,00		10,00	983,40		983,400	100,00%
744	PuERTA ANTI FuEGO	u	2,00	2.765,74	5.531,48000	2,00		2,00	5.531,48		5.531,480	100,00%
745	uPS 15 KVA	u	1,00	6.207,31	6.207,31000	1,00		1,00	6.207,31		6.207,310	100,00%
746	TABLERO BYPASS PARA DATA CENTER	u	1,00	2.070,65	2.070,65000	1,00		1,00	2.070,65		2.070,650	100,00%
747	TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL PARA DATA CENTER	u	1,00	2.236,86	2.236,86000	-		-			-	
748	BORNERA DE INSTALACION A TIERRA PARA RACK	u	5,00	22,92	114,60000	5,00		5,00	114,60		114,600	100,00%
749	BARRA PARA CONEXIÓN A TIERRA 8mmX12mm	u	5,00	48,71	243,55000	1,00		1,00	48,71		48,710	100,00%
750	CABLE THHN No. 6 AWG 19H	u	100,00	17,95	1.795,00000	70,00	30,00	100,00	1.256,50	538,50	1.795,000	100,00%
751	PuNTO DE VIDEO VGA	u	7,00	127,50	892,50000	7,00		7,00	892,50		892,500	100,00%
752	EQuIPO uTm PARA 100 uSuARIOS INCLuYE SISTEmA DE TELEFONÍA	u	1,00	27.174,40	27.174,40000	1,00		1,00	27.174,40		27.174,400	100,00%
753	TELEFONO IP NORmAL	u	41,00	110,92	4.547,72000	41,00		41,00	4.547,72		4.547,720	100,00%
754	TELEFONO IP GERENCIAL	u	4,00	213,78	855,12000	4,00		4,00	855,12		855,120	100,00%
755	PROGRAmACION Y PuESTA EN mARCHA DEL SISTEmA	u	1,00	1.266,70	1.266,70000	1,00		1,00	1.266,70		1.266,700	100,00%
	SISTEMA DE SONORIZACION											
756	CENTRAL DE SONIDO	u	1,00	11.071,93	11.071,93000	1,00		1,00	11.071,93		11.071,930	100,00%
757	PARLANTE DECORATIVO PARA CIELO FALSO CON TRANSFORmADOR DE LINEA	u	24,00	41,20	988,80000	24,00		24,00	988,80		988,800	100,00%
758	ALTAVOZ EXTERIOR30W (BOCINA)	u	8,00	174,70	1.397,60000	8,00		8,00	1.397,60		1.397,600	100,00%
759	PuNTO DE SONIDO	u	32,00	41,17	1.317,44000	32,00		32,00	1.317,44		1.317,440	100,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
760	PuNTO DE mICROFONO	u	3,00	52,26	156,78000	3,00		3,00	156,78		156,780	100,00%
761	CONTROL DE VOLumEN	u	3,00	145,81	437,43000	3,00		3,00	437,43		437,430	100,00%
762	ALTAVOCES PARA AuDITORIO CON AmPLIFICADOR INCLuIDO 400W	u	4,00	625,13	2.500,52000	4,00		4,00	2.500,52		2.500,520	100,00%
763	PuNTO DE SONIDO PARA AuDITORIO	u	4,00	77,68	310,72000	4,00		4,00	310,72		310,720	100,00%
764	CENTRAL DE SONIDO PARA AuDITORIO	u	1,00	2.236,64	2.236,64000	1,00		1,00	2.236,64		2.236,640	100,00%
765	PROGRAmACION Y PuESTA EN mARCHA DEL SISTEmA DE SONORIZACION	u	1,00	749,33	749,33000	1,00		1,00	749,33		749,330	100,00%
	SISTEMA DE INCENDIO											
766	ESTACION mANuAL DE ALARmA DE EmERGENCIA	u	24,00	93,78	2.250,72000	16,00		16,00	1.500,48		1.500,480	66,67%
767	LuZ ESTROBOSCOPICA	u	24,00	133,78	3.210,72000	16,00		16,00	2.140,48		2.140,480	66,67%
768	DETECTOR DE HumO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE	u	93,00	91,90	8.546,70000	93,00		93,00	8.546,70		8.546,700	100,00%
769	DETECTOR TERmICO DIRECCIONABLE	u	8,00	91,90	735,20000	8,00		8,00	735,20		735,200	100,00%
770	PuNTO DE ALARmAS DE INCENDIO	u	153,00	73,78	11.288,34000	153,00		153,00	11.288,34		11.288,340	100,00%
771	CENTRAL DE INCENDIO DIRECCIONABLE	u	1,00	3.176,64	3.176,64000	1,00		1,00	3.176,64		3.176,640	100,00%
772	mODuLOS DE AISLADORES DE CORTO CIRCuITO	u	5,00	81,40	407,00000	5,00		5,00	407,00		407,000	100,00%
773	mODuLOS DE mONITOREO DE ZONAS	u	4,00	78,54	314,16000	4,00		4,00	314,16		314,160	100,00%
774	ANuNCIADOR REmOTO	u	1,00	438,28	438,28000	1,00		1,00	438,28		438,280	100,00%
775	LAmPARAS DE EmERGENCIA	u	54,00	52,63	2.842,02000	54,00		54,00	2.842,02		2.842,020	100,00%
776	LAmPARAS DE AVISO DE SALIDA	u	16,00	45,78	732,48000	16,00		16,00	732,48		732,480	100,00%
777	FuENTE REmOTA DE ALARmAS DE INCENDIO	u	1,00	797,28	797,28000	1,00		1,00	797,28		797,280	100,00%
778	SEÑALETICA INCENDIOS	u	34,00	26,35	895,90000	17,00		17,00	447,95		447,950	50,00%
779	PROGRAmACION Y PuESTA EN mARCHA EL SISTEmA DE INCENDIO	u	1,00	1.045,26	1.045,26000	1,00		1,00	1.045,26		1.045,260	100,00%
	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS											
780	CERRADuRA ELECTROmAGNETICA 600LB	u	20,00	139,78	2.795,60000	18,00	2,00	20,00	2.516,04	279,56	2.795,600	100,00
781	PuLSANTE DE SALIDA PARA CONTROL DE ACCESOS	u	11,00	29,53	324,83000	11,00	3,00	14,00	324,83	88,59	413,420	127,27
782	LECTOR DE PROXImIDAD CON TECLADO	u	17,00	252,04	4.284,68000	17,00		17,00	4.284,68		4.284,680	100,00%
783	CONTACTO mAGNETICO	u		15,29		-		-			-	
784	CONTROLADOR DE ACCESOS - CONTROL DE COmuNICACIONES	u	5,00	649,13	3.245,65000	5,00		5,00	3.245,65		3.245,650	100,00%
785	TARJETAS PARA CONTROL DE ACCESOS	u	36,00	18,06	650,16000	36,00		36,00	650,16		650,160	100,00%
786	PuNTO PARA ELEmENTOS DE CONTROL DE ACCESOS	u	48,00	47,14	2.262,72000	43,00		43,00	2.027,02		2.027,020	89,58%
787	CABLE EKKX 10 PARES	u	500,00	17,21	8.605,00000	469,10		469,10	8.073,21		8.073,210	93,82%
788	DETECTORES INFRARROJOS	u	35,00	23,94	837,90000	35,00		35,00	837,90		837,900	100,00%
789	SIRENAS Y ALARmAS DE SEGuRIDAD	u	3,00	52,87	158,61000	3,00		3,00	158,61		158,610	100,00%
790	PANEL CONTROLADOR DE ALARmAS	u	2,00	187,58	375,16000	2,00		2,00	375,16		375,160	100,00%
791	PuNTOS DEL SISTEmA DE SEGuRIDAD	u	38,00	75,29	2.861,02000	38,00		38,00	2.861,02		2.861,020	100,00%
792	SEÑALETICA DE ACCESOS	u	4,00	26,35	105,40000	-		-			-	
793	BARRERAS	u		1.929,64		-		-			-	
794	LOOPS	u		134,81		-		-			-	
795	LECTOR BIOmETRICO	u	3,00	207,83	623,49000	3,00		3,00	623,49		623,490	100,00%
796	PROGRAmACION Y PuESTA EN mARCHA EL SISTEmA DE CONTROL DE ACCESOS	u	1,00	690,14	690,14000	1,00		1,00	690,14		690,140	100,00%
	SISTEMA DE CCTV											
797	VIDEOGRABADOR DIGITAL NVR	u	1,00	2.926,25	2.926,25000	1,00		1,00	2.926,25		2.926,250	100,00%
798	mONITOR A COLOR LED FHD 32"	u	1,00	1.601,28	1.601,28000	1,00		1,00	1.601,28		1.601,280	100,00%
799	CAmARA IP DE CCTV FIJA EN DOmO	u	21,00	218,46	4.587,66000	21,00		21,00	4.587,66		4.587,660	100,00%
800	CAmARA IP DE CCTV TIPO BALA	u	2,00	206,92	413,84000	2,00		2,00	413,84		413,840	100,00%
801	CAmARA IP DE CCTV PTZ EN DOmO	u	9,00	728,00	6.552,00000	9,00		9,00	6.552,00		6.552,000	100,00%
802	CAmARAIP 360 (FISHERE)	u	10,00	1.039,01	10.390,10000	8,00		8,00	8.312,08		8.312,080	80,00%
803	CONTROLADOR PARA CAmARA mOVIL CON TECLADO Y JOYSTICK	u	1,00	752,94	752,94000	1,00		1,00	752,94		752,940	100,00%
804	PROGRAMACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS, TASA DE GRABACION, IDENTIFICACION DE AREAS	u	1,00	948,85	948,85000	1,00		1,00	948,85		948,850	100,00%
	SISTEMA DE PANTALLAS INFORMATIVAS											
805	SERVIDOR DEL SISTEmA DE INFORmACION Y TV IP	u	1,00	10.774,19	10.774,19000	1,00		1,00	10.774,19		10.774,190	100,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
806	CONVERTIDOR NAVEGADOR INTERNET TV	u	1,00	2.084,90	2.084,90000	1,00		1,00	2.084,90		2.084,900	100,00%
807	TELEVISOR LCD 32"	u	7,00	1.601,28	11.208,96000	6,00		6,00	9.607,68		9.607,680	85,71%
808	PROGRAmACION Y PuESTA EN mARCHA EL SISTEmA DE PANTALLAS INFORmATIVAS	u	1,00	867,70	867,70000	1,00		1,00	867,70		867,700	100,00%
	14.- CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA Y GARITA						CB					
	BATERIA SANITARIA GENERAL JUNTO A ZONA RECREACIONAL											
	PRELIMINARES											
809	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1,14		-		-			-	
810	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2		1,46		-		-			-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
811	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3		4,18		-		-			-	
812	EXCAVACIÓN mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-			-	
813	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3		17,33		-		-			-	
814	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3		13,72		-		-			-	
815	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3		2,82		-		-			-	
	HORMIGONES											
816	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3		163,18		-		-			-	
817	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF´C = 280KG./Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3		225,97		-		-			-	
818	HORMIGON PREMEZCLADO CADENAS F´C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3		283,42		-		-			-	
819	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3		289,16		-		-			-	
820	HORMIGON PREMEZCLADO LOSA/ VIGAS F´C=280 KG/CM2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	m3		193,75		-		-			-	
821	BLOQuE ALIVIANADO EN LOSA.E=15X20X40 Cm	u		0,61		-		-			-	
	ACERO ESTRUCTURAL											
822	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg		1,68		-		-			-	
823	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2		4,84		-		-			-	
	CONTRAPISOS											
824	CONTRAPISO HORm.S. PREmEZ. F´C=280KG/Cm2 E= 4 PuLG. (SIN BASE)	m2		21,50		-		-			-	
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS											
825	mASILLADO DE PISOS, ENDuRECEDOR DE CuARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5mm)	m2		5,62		-		-			-	
826	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2		26,06		-		-			-	
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS											
827	mASILLADO E ImPERmEABILIZADO DE PISOS-LOSAS, mORTERO CEmENTO-ARENA 1:3 +(PEGANTE + ImPERm.) LOSAS EXT	m2		10,40		-		-			-	
828	ImPERmEABILIZACION LOSA DE CuBIERTA ImPRImANTE ASFALTICO SOLuBLE AL AGuA	m2		2,84		-		-			-	
829	ImPERmEABILIZACIONLOSA DE CuBIERTA LAmINAS ASFALTICAS	m2		13,85		-		-			-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	BAJANTES AGUA LLUVIA											
830	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=110mm)	m		8,14		-		-			-	
831	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u		90,42		-		-			-	
832	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m		20,59		-		-			-	
	MAMPOSTERÍA											
833	RIOSTRAS DE H.S. F´C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3		258,83		-		-			-	
834	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=10 Cm	m2		17,71		-		-			-	
835	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2		22,90		-		-			-	
836	PICADO Y RESANADO DE mAmPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m		4,63		-		-			-	
837	mESON H.A. F'C=180 KG/Cm2 E=7 Cm HIERRO (LAVAmANOS+mESON)	m		34,03		-		-			-	
838	REVESTImIENTO mESON GRANITO	m		180,61		-		-			-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES											
839	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2		10,27		-		-			-	
840	ENLuCIDO VERTICAL PALETEADO mORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2		8,78		-		-			-	
841	ENLuCIDO HORIZONTAL PALETEADO mORTERO 1:3	m2		12,30		-		-			-	
842	EmPASTE VERTICAL Y HORIZONTAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2		6,04		-		-			-	
843	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2		4,72		-		-			-	
	CARPINTERIA METALICA											
844	PuERTA mETÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2mm , INC. CERRADuRA, BISAGRAS Y PINTuRA	m2		142,73		-		-			-	
845	PuERTAS mODuLARES, TAmBORADAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, INCLuYE ESTRuCTuRA Y HER	m2		172,30		-		-			-	
846	DIVISIONES ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, TAmBORADAS INCLuYE ESTRuCTuRA, EmPOTRAmIENTO PISO PARED (	m2		161,18		-		-			-	
	VENTANERIA-PUERTAS ALUMINIO VIDRIO											
847	VENTANA CORREDIZA ALumINIO SERIE 200-INCL. VIDRIO LAmINADO 6mm	m2		183,67		-		-			-	
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS											
848	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF DISCAPACITADOS PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u		297,96		-		-			-	
849	PASAmANOS PARA DISCAPACITADOS TuBO DIAm 32mm E=1.5mm EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO SATINADO (Juego)	u		281,03		-		-			-	
850	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u		297,96		-		-			-	
851	uRINARIO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF	u		261,01		-		-			-	
852	LAVABO BLANCO, LLAVE SENSOR mOVImIENTO (CON ACCESORIOS)	u		281,39		-		-			-	
853	DISPENSOR DE PAPEL HIGIENICO DIAm=275mm, ROLLO 70mm, ABATIBLE,ACERO INOX E=8mm, AISI 304. ACABADO S	u		110,71		-		-			-	
854	DISPENSOR DE PAPEL TOALLA 400-600 uNIDADES, 330X273X130mm, ACERO INOX E=8mm AISI 304, ACABADO SATINAD	u		113,00		-		-			-	
855	DISPENSADOR DE JABON LIQuIDO ACERO INOX AISI304, ACABADO SATINADO	u		91,28		-		-			-	
856	ESPEJO DE VIDRIO FLOTADO 4mm- mARCO DE ALumINIO	m2		42,86		-		-			-	
857	SECADOR DE mANOS ACCIONAmIENTO AuTOmATICO 260X302X150mm, ACERO INOX. 304, LAmINA1.5mm 110V-60HZ	u		238,44		-		-			-	
858	BASuRERO CILINDRICO A PEDAL D=250mm H=385 PARA BAÑO ACERO INOX. 304	u		66,60		-		-			-	
859	DuCHAS CON mEZCLADORA (CON ACCESORIOS)	u		135,94		-		-			-	
	GARITAS DE CONTROL											
	PRELIMINARES											
860	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1,14		-		-			-	
861	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	34,81	1,46	50,82260	34,81		34,81	50,82		50,820	99,99%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
862	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	37,47	4,18	156,62460	6,75		6,75	28,22		28,220	
863	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-		-			-	
864	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	9,26	17,33	160,47580	-		-			-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
865	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	23,08	13,72	316,65760	-		-			-	
866	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	37,47	2,82	105,66540	6,75		6,75	19,04		19,040	
	HORMIGONES											
867	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	1,00	163,18	163,18000	1,00		1,00	163,18		163,180	100,00%
868	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF´C = 280KG./Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	2,00	225,97	451,94000	2,00		2,00	451,94		451,940	100,00%
869	HORMIGON PREMEZCLADO CADENAS F´C=280 KG/CM2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	1,13	283,42	320,26460	1,11		1,11	314,60		314,600	98,23%
870	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	0,30	289,16	86,74800	0,18		0,18	52,05		52,050	60,00%
871	HORmIGON PREmEZCLADO LOSA/ VIGAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	5,55	193,75	1.074,62000	4,03		4,03	781,15		781,150	
872	BLOQuE ALIVIANADO EN LOSA.E=15X20X40 Cm	u		0,61		-		-			-	
	ACERO ESTRUCTURAL											
873	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	836,00	1,68	1.404,48000	836,00		836,00	1.404,48		1.404,480	100,00%
874	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2	77,00	4,84	372,68000	69,31		69,31	335,46		335,460	90,01%
	CONTRAPISOS											
875	CONTRAPISO HORm.S. PREmEZ. F´C=280KG/Cm2 E= 4 Pul.G. (SIN BASE)	m2	33,50	21,50	720,25000	25,40		25,40	546,10		546,100	75,82%
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS											
876	mASILLADO DE PISOS, ENDuRECEDOR DE CuARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5mm)	m2		5,62		-		-			-	
877	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	38,00	26,06	990,28000	-	-	-			-	
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS											
878	mASILLADO E ImPERmEABILIZADO DE PISOS-LOSAS, mORTERO CEmENTO-ARENA 1:3 +(PEGANTE + ImPERm.) LOSAS EXT	m2	41,10	10,40	427,44000	-		-			-	
879	ImPERmEABILIZACION LOSA DE CuBIERTA ImPRImANTE ASFALTICO SOLuBLE AL AGuA	m2	41,10	2,84	116,72400	41,10		41,10	116,72		116,720	100,00%
880	ImPERmEABILIZACIONLOSA DE CuBIERTA LAmINAS ASFALTICAS	m2	41,10	13,85	569,23500	41,10		41,10	569,24		569,240	100,00%
	BAJANTES AGUA LLUVIA											
881	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=110mm)	m	10,00	8,14	81,40000	8,14		8,14	66,26		66,260	81,40%
882	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	3,00	90,42	271,26000	2,00		2,00	180,84		180,840	66,67%
883	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m	30,00	20,59	617,70000	-		-			-	
	MAMPOSTERÍA											
884	RIOSTRAS DE H.S. F´C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3	0,61	258,83	157,88630	-		-			-	
885	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=10 Cm	m2		17,71		-		-			-	
886	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2	72,50	22,90	1.660,25000	56,42		56,42	1.292,02		1.292,020	100,00%
887	PICADO Y RESANADO DE mAmPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m	52,36	4,63	242,42680	-	52,36	52,36		242,43	242,430	100,00
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES											
888	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	135,50	10,27	1.391,58500	55,04		55,04	565,22		565,220	100,00%
889	ENLuCIDO VERTICAL PALETEADO mORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2	73,00	8,78	640,94000	57,96		57,96	508,92		508,920	100,00%
890	ENLuCIDO HORIZONTAL PALETEADO mORTERO 1:3	m2		12,30		-		-			-	
891	EmPASTE VERTICAL Y HORIZONTAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	208,50	6,04	1.259,34000	55,04		55,04	332,42		332,420	100,00%
892	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	399,10	4,72	1.883,75200	-		-			-	
	CARPINTERIA METALICA											
893	PuERTA mETÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2mm , INC. CERRADuRA, BISAGRAS Y PINTuRA	m2	14,20	142,73	2.026,76600	-		-			-	
894	PuERTA TAmBORADA 70Cm, ESQuELETO CANELO, mDF 9mm -LACADA-DISEÑO CORPORATIVO	u	4,41	198,79	876,66390	-	4,41	4,41		876,66	876,660	100,00
	VENTANERIA-PUERTAS ALUMINIO VIDRIO											
895	VENTANA CORREDIZA ALumINIO SERIE 200-INCL. VIDRIO LAmINADO 6mm	m2	14,50	183,67	2.663,21500	11,25		11,25	2.065,92		2.065,920	100,00%
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS											
896	INODORO BLANCO (CON ACCESORIOS)	u	3,00	114,30	342,90000	-	2,00	2,00		228,60	228,600	66,67
897	LAVABO BLANCO (CON ACCESORIOS)	u	3,00	115,74	347,22000	-	2,00	2,00		231,48	231,480	66,67
898	DuCHAS (CON ACCESORIOS)	u		50,24		-		-			-	
	15.- CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y PORTONES						CC					
	PRELIMINARES											
899	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	1.765,78	1,14	2.012,98920	-	1.765,78	1.765,78		2.012,99	2.012,990	100,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
900	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	882,89	1,46	1.289,01940	878,84		878,84	1.283,11		1.283,110	99,54
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
901	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	671,86	4,18	2.808,37480	-	460,51	460,51		1.924,93	1.924,930	68,54
902	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	30,00	17,93	537,90000	-		-			-	
903	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	404,00	13,72	5.542,88000	-	404,00	404,00		5.542,88	5.542,880	100,00
904	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	671,86	2,82	1.894,64520	-	460,51	460,51		1.298,64	1.298,640	68,54
	HORMIGONES											
905	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	9,34	163,18	1.524,10120	8,23	0,51	8,74	1.342,97	83,22	1.426,190	93,58%
906	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF´C = 280KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	15,35	225,97	3.468,63950	15,35		15,35	3.468,64		3.468,640	100
907	HORMIGON PREMEZCLADO CADENAS F´C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	30,84	283,42	8.740,67280	19,61	5,98	25,59	5.557,87	1.694,85	7.252,720	82,98%
908	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	89,64	289,16	25.920,30240	13,76	11,77	25,53	3.978,84	3.403,41	7.382,250	28,48%
909	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F´C=180 KG/Cm2-50por cientoP)Clm	m3	43,60	169,86	7.405,89600	43,60		43,60	7.405,90		7.405,900	100
	ACERO ESTRUCTURAL											
910	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	5.740,62	1,68	9.644,24160	5.123,17	79,97	5.203,14	8.606,93	134,35	8.741,280	90,64%
911	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	4.678,00	2,76	12.911,28000	2.075,41	367,72	2.443,13	5.728,13	1.014,91	6.743,040	52,23%
912	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	4.678,00	0,11	514,58000	2.075,41	367,72	2.443,13	228,30	40,45	268,750	52,23%
	MAMPOSTERÍA											
913	RIOSTRAS DE H.S. F´C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3	12,50	258,83	3.235,37500	7,57		7,57	1.959,34		1.959,340	60,56%
914	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2	680,00	22,90	15.572,00000	680,00		680,00	15.572,00		15.572,000	100
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES											
915	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	2.110,10	10,27	21.670,72700	1.996,16		1.996,16	20.500,56		20.500,560	94,60
916	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	2.110,10	5,26	11.099,12600	1.996,16		1.996,16	10.499,80		10.499,800	94,60%
917	TEXTuRADO GRAFIATO GRuESO DE PAREDES, COLOR INSTITuCIONAL GADPPZ	m2	1.112,60	6,04	6.720,10400	559,54		559,54	3.379,62		3.379,620	100,00%
918	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	1.995,00	4,72	9.416,40000	1.995,00		1.995,00	9.416,40		9.416,400	100,00%
	CARPINTERIA METALICA											
919	CERRAmIENTO TuBO ISO2 H.G. 2"-mALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6mm, INC. PINTuRA A COmPRESOR	m2	1.054,50	36,37	38.352,16500	-		-			-	
920	CERRAMIENTO VERJA DE TUBO AGUA ISO2 HG 2" Y TUBO RECT 50X40X2, INC. PINTURA COmPRESOR	m2	400,00	70,48	28.192,00000	-		-			-	
921	PORTON CORREDIZO TuBOISO 2 2", mARCO TuBO RECT 50X150X2mm, INC. PINTuRA COmPRESOR	m2	138,40	68,64	9.499,77600	-		-			-	
					8.364.474,94							
	NAVE DE DESECHOS											
	1.- VIAS Y PARQUEADEROS											
	CONSOLIDACION DE PLATAFORMAS											
15	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	m3	537,97	2,92	1570,87	-		-			-	-
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREODE MEJORAMIENTO	m3-km	9.683,46	0,28	2711,37	-		-			-	-
	2.- ESTABILIZACIÓN TALUDES											
	SISTEMA TIERRA ARMADA											
34	GEOTEXTIL TEJIDO- 2400 T PARA MURO DE CONTENCION TIERRA ARMADA	m2	320,00	3,06	979,20	272,80		272,80	834,77		834,770	85,25%
35	GEOMALLA BX-1100 TENSAR	m2	64,40	3,19	205,44	30,00		30,00	95,70		95,700	46,58%
	16. NAVE DE DESECHOS											
	REVESTIMIENTO DE TUMBADOS											
181	CIELO RASO FALSO TIPO GYPSUM PARA HUMEDAD-1/2"-SIN ESTUCAR	m2	115,00	20,04	2304,60	-		-			-	-
	PRELIMINARES											
206	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQUEADERO,Y PLATAFORMAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	347,75	1,46	507,72	-		-			-	-
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
211	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A MAQUINA)	m3	103,04	4,18	430,71	28,08		28,08	117,37		117,370	27,25%
213	SUB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COMPACTADO (MAQUINA), CAPAS 20CM	m3	103,04	17,33	1785,68	103,00		103,00	1.784,99		1.784,990	99,96%
214	RELLENO COMPACTADO A MAQUINA CON LASTRE TNM=8" (EN CAPAS DE 20 CM)	m3	140,54	13,72	1928,21	-		-			-	-

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
215	DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS	m3	133,95	2,82	377,74	-		-			-	-
	HORMIGONES											
216	HORMIGON PREMEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/CM2 INC. BOMBEO Y TRANSPORTE	m3	3,00	163,18	489,54	3,00		3,00	489,54		489,540	100,00%
217	HORMIGÓN PREMEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CIMENTACIÓNF'C = 280KG./CM2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	m3	12,00	225,97	2711,64	3,92		3,92	885,80		885,800	32,67%
218	HORMIGON PREMEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/CM2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	12,78	283,42	3622,11	12,78		12,78	3.622,11		3.622,110	100,00%
219	HORMIGON PREMEZCLADO COLUMNAS F'C=280 KG/CM2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	m3	4,55	289,16	1315,68	-		-			-	-
220	HORMIGÓN CICLÓPEO (50POR CIENTO H.S. F'C=180 KG/CM2-50POR CIENTOP)CIM	m3	17,04	169,85	2894,41	-		-			-	-
	ACERO ESTRUCTURAL											
221	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	Kg	4596,88	1,68	7722,76	4.596,88		4.596,88	7.722,76		7.722,760	100,00%
222	PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A (36, 572, 325,193,106) (PROY. MONTAJE GRUA)	Kg	18285	2,76	50466,60	18.285,00		18.285,00	50.466,60		50.466,600	100,00%
223	TRATAMIENTO PINTURA ESTRUCTURA ACERO A36 (FONDO+PINTURA ANTICORROSIVA), A COMPRESOR	Kg	18285	0,11	2011,35	18.285,00		18.285,00	2.011,35		2.011,350	100,00%
224	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6MM	m2	382,525	4,84	1851,42	344,25		344,25	1.666,17		1.666,170	89,99%
	CONTRAPISOS											
225	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3 (CONTRAPISO E=20CM, COMPAC. 100POR CIENTO P.E.M.)	m3	62,46	10,78	673,32	-		-			-	-
226	MATERIAL DE BASE CLASE 2 (CONTRAPISO E=15CM, COMPAC. 100POR CIENTO P.E.M.)	m3	46,85	24,55	1150,17	30,32		30,32	744,36		744,360	64,72%
227	CONTRAPISO HORM.S. PREMEZ. F'C=280KG/CM2 E= 4 PULG. (SIN BASE)	m2	347,75	21,5	7476,63	-		-			-	-
228	JUNTA ASERRADA DILATACION PISO (INC. CORDON, Y SELLO)	m	90,00	2,59	233,10	-		-			-	-
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS											
229	MASILLADO DE PISOS, ENDURECEDOR DE CUARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5MM)	m2	347,75	5,62	1954,36	344,25		344,25	1.934,69		1.934,690	98,99%
230	PINTURA EPOXICA PISO INDUSTRIAL 3MM (2 COMPONENTES)	m2	310,00	34,78	10781,80	310,00		310,00	10.781,80		10.781,800	100%
232	CERAMICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EMP	m2	94,00	26,06	2449,64	66,63		66,63	1.736,38		1.736,380	70,88%
	CUBIERTA											
235	CUBIERTA GALVALUMEN E=0.45MM, RECUBRIENTO PINTURA POLIESTER ASTM-553A (COLOR INSTITUCIONAL), INC, PER	m2	486,35	13,92	6769,99	446,90		446,90	6.220,85		6.220,850	91,89%
237	CUMBRERO GALVALUMEN E=0,40 MM A=0.50 M, INC. ACCES. INSTALACION	m	35,50	8,38	297,49	35,20		35,20	294,98		294,980	99,16%
238	CANAL TOL GALV E= 0.70MM, H=30CM, A=40CM DESARR. 122 CM, INC. GANCHOS	m	71,00	21,49	1525,79	70,40		70,40	1.512,90		1.512,900	99,16%
	BAJANTES AGUA LLUVIA											
239	BAJANTES DE AGUA LLUVIA (PVC DIAM. INT=160MM)	m	70,00	9,91	693,70	29,96		29,96	296,90		296,900	42,80%
240	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/CM²0.60 POR 0.60 CON TAPA E= 7CM + 1Ø10MM A 12CM	u	10,00	90,42	904,20	8,00		8,00	723,36		723,360	80,00%
242	SUMIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO DIAM. INT.= 200A 160MM PVC Y/O POLIETILENO	u	1,00	20,71	20,71	-		-			-	-
	MAMPOSTERÍA											
243	RIOSTRAS DE H.S. F'C=240KG/CM2 INC. ENCOFRADO	m3	8,48	258,83	2194,88	4,42		4,42	1.144,03		1.144,030	52,12%
244	MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO VIBRADO 4MPAE=10 CM	m2	20,00	17,71	354,20	17,58		17,58	311,34		311,340	87,90%
245	MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO VIBRADO 4MPAE=15 CM	m2	490,00	22,90	11221,00	411,38		411,38	9.420,60		9.420,600	83,96%
246	PICADO Y RESANADO DE MAMPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m	120,00	4,63	555,60	-	120,00	120,00		555,60	555,600	100%
247	MESON H.A. FC=180 KG/CM2 E=7 CM HIERRO (LAVAMANOS+MESON)	m	3,50	34,03	119,11	-	3,30	3,30		112,30	112,300	94,28%
248	REVESTIMIENTO MESON GRANITO	m	3,50	180,61	632,14	-	3,50	3,50		632,14	632,140	100%
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES											
249	ENLUCIDO CON IMPERMEABILIZANTE MORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	392,72	10,27	4033,23	251,76		251,76	2.585,58		2.585,580	64,11%
250	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO MORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2	450,00	8,78	3951,00	450,00		450,00	3.951,00		3.951,000	100%
251	ENLUCIDO CON MALLA+ IMPERMEABILIZANTE, MORTERO 1:3	m2	25,00	17,03	425,75	-		-			-	-
252	EMPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	392,72	5,26	2065,71	251,76		251,76	1.324,26		1.324,260	64,11%
253	EMPASTE VERTICAL (ACRILICO INTERIOR) INC. FILOS	m2	475,00	4,40	2090,00	475,00		475,00	2.090,00		2.090,000	100,00%
254	PINTURA DE CAUCHO SATINADO COLOR (2 MANOS) INTER. <GUIA IMAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	475,00	4,72	2242,00	475,00		475,00	2.242,00		2.242,000	100%
255	PINTURA DE CAUCHO SATINADA COLOR(2 MANOS) EXTERIOR (CANASTILLA) <GUÍA IMAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	392,72	5,72	2246,36	332,28		332,28	1.900,64		1.900,640	85%
	CARPINTERIA METALICA											
257	VENTANA FIJA TUBO RECT 40X80X2-MALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6MM, INC PINTURA ANTICORROSIVA, A COMPRESOR	m2	39,06	41,3	1613,18	39,06		39,06	1.613,18		1.613,180	100,00%
258	PORTON TIPO CORREDIZO RETRACTIL TUBO RECT 40X80X2MM-TOOL GALV. 0.6MM	m2	4,40	61,25	269,50	-		-			-	-
259	PUERTA METÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2MM , INC. CERRADURA, BISAGRAS Y PINTURA	m2	40,000	142,730	5709,20	-	36,00	36,00		5.138,28	5.138,280	90,00%
260	PUERTAS MODULARES, TAMBORADAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE E=1MM AISI 304, INCLUYE ESTRUCTURA Y HER	m2	1,00	172,30	172,30	-	1,00	1,00		172,30	172,300	100,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	REVESTIMIENTO DE TUMBADOS											
264	CIELO RASO FALSO - FIBRA MINERAL Y RECUB LÁMINA ALUMINIO 0.60X0.60 BLANCO, TIPO AMSTRONG O SIMILAR	m2	324,75	21,59	7011,35	-		-			-	-
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS											
268	INODORO CON FLUXOMETRO LATON CROMADA 1.0 GPF PRIMERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u	1,00	297,96	297,96	1,00		1,00	297,96		297,960	100%
270	LAVABO BLANCO, LLAVE SENSOR MOVIMIENTO (CON ACCESORIOS)	u	2,00	281,39	562,78	2,00		2,00	562,78		562,780	100%
271	DISPENSOR DE PAPEL HIGIENICO DIAM=275MM, ROLLO 70MM, ABATIBLE,ACERO INOX E=8MM, AISI 304, ACABADO S	u	1,00	110,71	110,71	-	1,00	1,00		110,71	110,710	100,00%
272	DISPENSOR DE PAPEL TOALLA 400-600 UNIDADES, 330X273X130MM, ACERO INOX E=8MM AISI 304, ACABADO SATINAD	u	1,00	113,00	113,00	-	1,00	1,00		113,00	113,000	100,00%
273	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOX AISI304, ACABADO SATINADO	u	1,00	91,28	91,28	-	1,00	1,00		91,28	91,280	100,00%
274	ESPEJO DE VIDRIO FLOTADO 4MM- MARCO DE ALUMINIO	m2	2,70	42,86	115,72	-	2,70	2,70		115,72	115,720	100,00%
276	BASURERO CILINDRICO A PEDAL D=250MM H=385 PARA BAÑO ACERO INOX. 304	u	1,00	66,60	66,60	-	1,00	1,00		66,60	66,600	100,00%
277	DUCHAS CON MEZCLADORA (CON ACCESORIOS)	u	1,00	135,94	135,94	-	1,00	1,00		135,94	135,940	100,00%
	10.- SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACIÓN											
	POZOS DE REVISION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS											
305	CAJA REVISION MEDIA TENSION 60X60X75,ACERA, T/HA	u	1,00	179,17	179,17	-		-			-	-
306	PUESTA A TIERRA SIMPLE EN POZO ELECTRICO CON SUELDA EXOTERMICA	u	1,0	164,5	164,46	-		-			-	-
	INSTALACION LUMINARIAS											
362	CAJETINES METALICOS OCTOGONALES MEDIANOS CON TAPA	u	30,00	5,44	163,20	30,00		30,00	163,20		163,200	100,00%
	INSTALACION LUMINARIAS											
427	TUBERIA EMT 1/2 PULGADA	m	70,00	3,34	233,80	70,00		70,00	233,80		233,800	100,00%
428	UNION EMT 1/2 PULGADA	u	40,00	1,18	47,20	37,00		37,00	43,66		43,660	92,50%
429	CONECTOR EMT 1/2 PULGADA	u	60,00	0,56	33,60	60,00		60,00	33,60		33,600	100,00%
430	FIJACION DE TUBOS EN LOZA CON GRAPA METALICA EMT 1/2 PULGADA	u	30,00	4,87	146,10	30,00		30,00	146,10		146,100	100,00%
431	CAJETINES METALICOS RECTANGULARES PROFUNDOS	u	10,00	1,57	15,70	5,00		5,00	7,85		7,850	50,00%
432	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AMARILLO (INC. TAYPE)	m	70,00	2,28	159,60	70,00		70,00	159,60		159,600	100,00%
433	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	70,00	1,43	100,10	70,00		70,00	100,10		100,100	100,00%
434	LUMINARIA LED3X18W/120 VOLTIOS	u	30,00	60,59	1817,70	17,00		17,00	1.030,03		1.030,030	56,67%
437	INTERRUPTOR SIMPLE CON TAPA	u	7,00	5,47	38,29	5,00		5,00	27,35		27,350	71,43%
	TOMACORRIENTES GENERALES											
438	TUBERIA EMT 1/2 PULGADA	m	50,00	3,34	167,00	41,91		41,91	139,98		139,980	83,82%
439	UNION EMT 1/2 PULGADA	u	15,00	1,18	17,70	15,00		15,00	17,70		17,700	100,00%
440	CONECTOR EMT 1/2 PULGADA	u	10,00	0,56	5,60	10,00		10,00	5,60		5,600	100,00%
441	FIJACION DE TUBOS EN LOZA CON GRAPA METALICA EMT 1/2 PULGADA	u	10,00	4,87	48,70	10,00		10,00	48,70		48,700	100,00%
442	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZUL (INC. TAYPE)	m	50,00	1,43	71,50	50,00		50,00	71,50		71,500	100,00%
443	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	50,00	1,43	71,50	50,00		50,00	71,50		71,500	100,00%
444	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	50,00	1,03	51,50	50,00		50,00	51,50		51,500	100,00%
445	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	13,00	7,45	96,85	4,00		4,00	29,80		29,800	30,77%
446	CAJETINES METALICOS RECTANGULARES PROFUNDOS	u	13,00	1,57	20,41	4,00		4,00	6,28		6,280	30,77%
	ALIMENTADORES Y SUBTABLEROS CT-1											
	ALIMENTADOR TPD-STE-ANGAR-A4											
509	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 CU TW (INC. TAYPE)	m	20,00	14,51	290,20	-		-			-	-
510	SUBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS ANGAR 4	u	1,00	173,41	173,41	1,00		1,00	173,41		173,410	100%
	11.- SISTEMA HIDRAULICO SANITARIO Y CONTRAINCENDIOS											
	SITEMA DE AGUA POTABLE A PRESIÓN CONSTANTE											
	TUBERIA PVC AGUA POTABLE											
533	TUBERIA PVC ROSCABLE D=1/2" EN EDIFICACION+PRUEBA	m	12,00	5,86	70,32	-		-			-	-
535	TUBERIA PVC ROSCABLE D=1" EN EDIFICACION+PRUEBA	m	45,00	9,78	440,10	-		-			-	-
	ACCESORIOS INST. TUB PVC ROSCABLE AGUA POTABLE											
541	ANCLAJES METALICOS PLATINA 2 POR 1/2" (ABRAZADERAS), EN LOSA Y PARED	u	10,00	14,11	141,10	-		-			-	-
542	S.I. PUNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGUA POR PUNTO	u	2,00	13,67	27,34	-		-			-	-

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	EXTINTORES											
565	EXTINTOR POS CAPACIDAD 10 LBS. CON CAJA METALICA	u	1,00	99,84	99,84	-		-			-	-
568	EXTINTOR CO2 CAPACIDAD 20 LBS. CON CAJA METALICA	u	1,00	313,27	313,27	-		-			-	-
	SISTEMA SANITARIO INTERNO											
	PRELIMINARES Y MOV. TIERRAS											
601	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	2,00	17,93	35,86	-		-			-	-
602	RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL (CAPAS 20 CM)	m3	3,00	6,32	18,96	-		-			-	-
	INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE											
603	PUNTO DE DESAGUE EN PVC 50 MM	u	3,00	28,80	86,40	-		-			-	-
604	PUNTO DE DESAGUE EN PVC 110 MM	u	1,00	34,43	34,43	-		-			-	-
605	TUBERÍA PVC 50 MM DE DIÁMETRO (MAT/TRASP/INST)	m	12,0	5,1	61,68	-		-			-	-
606	TUBERÍA PVC 110 MM DE DIÁMETRO (MAT/TRASP/INST)	m	5,00	8,02	40,10	-		-			-	-
607	TUBERÍA PVC 160 MM DE DIÁMETRO (MAT/TRASP/INST)	m	18,00	14,52	261,36	-		-			-	-
608	CAJA REV. H.S. FC=180KG/CM^0.60 POR 0.60 CON TAPA E= 7CM + 1Ø10MM A 12CM	u	1,00	90,42	90,42	-		-			-	-
	INSTALACION TUBERIA PVC DEVENTILACIÓN											
609	TUBERIA PVC D=75 MM VENTILACIÓN	m	6,00	4,27	25,62	-		-			-	-
610	PUNTO DE VENTILACIÓN PVC 75 MM POR PUNTO	u	1,00	15,61	15,61	-		-			-	-
	13.- SISTEMA ELECTRONICO, VOZ, DATOS, INCENDIOS)											
	CANALIZACION											
714	POZO DE REVISION 60X60X60CM	u	1,0	158,5	158,53	-		-			-	-
715	BANDEJA TIPO ESCALERILLA 10CMX8CM INCLUYE ACCESORIOS	m	25,0	46,6	1164,25	-		-			-	-
717	TUBERIA PVC REFORZADA 4"	m	15,00	20,27	304,05	-		-			-	-
719	TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4" DE DIÁMETRO INCLUIDO ACCESORIOS	m	40,00	16,51	660,40	-		-			-	-
	SISTEMA DE INCENDIO											
766	ESTACION MANUAL DE ALARMA DE EMERGENCIA	u	1,00	93,78	93,78	-		-			-	-
767	LUZ ESTROBOSCOPICA	u	1,00	133,78	133,78	-		-			-	-
768	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE	u	3,00	91,90	275,70	-		-			-	-
769	DETECTOR TERMICO DIRECCIONABLE	u	3,00	91,90	275,70	-		-			-	-
770	PUNTO DE ALARMAS DE INCENDIO	u	8,00	73,78	590,24	-		-			-	-
776	LAMPARAS DE AVISO DE SALIDA	u	1,00	45,78	45,78	-		-			-	-
778	SEÑALETICA INCENDIOS	u	1,00	26,35	26,35	-		-			-	-
	NAVE DE RESGUARDO											
	ACERO ESTRUCTURAL											
1	PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A (36, 572, 325,193,108) (PROY. MONTAJE GRUA)	Kg	94474,86	2,76	260750,61	94.474,86		94.474,86	260.750,61		260.750,610	100%
2	TRATAMIENTO PINTURA ESTRUCTURA ACERO A36 (FONDO+PINTURA ANTICORROSIVA), A COMPRESOR	Kg	94474,86	0,11	10392,23	94.474,86		94.474,86	10.392,23		10.392,230	100%
	CONTRAPISOS											
3	JUNTA ASERRADA DILATACION PISO (INC. CORDON, Y SELLO)	m	857,00	2,59	2219,63	581,30		581,30	1.505,57		1.505,570	67,83%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS											
4	MASILLADO DE PISOS, ENDURECEDOR DE CUARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5MM)	m2	1445,85	5,62	8125,68	1.442,94		1.442,94	8.109,32		8.109,320	99,80%
	CUBIERTA											
5	CUBIERTA GALVALUMEN E=0.45MM, RECUBRIENTO PINTURA POLIESTER ASTM-653A (COLOR INSTITUCIONAL), INC, PER	m2	1660,00	13,92	23107,20	1.660,00		1.660,00	23.107,20		23.107,200	100%
6	CUBIERTA POLICARBONATO E=0.80 MM, COLOR BRONCE O SIMILAR, INC. ACCESORIOS INSTALCION	m2	190,00	14,34	2724,60	94,85		94,85	1.360,15		1.360,150	49,92%
7	CUMBRERO GALVALUMEN E=0.40 MM A=0.50 M, INC. ACCES. INSTALACION	m	43,25	8,38	362,44	43,25		43,25	362,44		362,440	100%
8	CANAL TOL GALV E= 0.70MM, H=30CM, A=40CM DESARR. 122 CM, INC. GANCHOS	m	86,50	21,49	1858,89	86,50		86,50	1.858,89		1.858,890	100%
	MONTO TOTAL				8.852.838,93				7.658.909,10	116.319,65	7.775.228,75	87,83%

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	9-may.-19		
FIN PLAZO CONTRACTUAL	8-may.-20		
SUSPENSION DIAS	60	DIAS	
SUSPENSION DIAS	11	DIAS	
AMPLIACIÓN POR PANDEMIA	90	DIAS	
AMPLIACIÓN POR CLIMA-REDISEÑO-% POR COVID	126	DIAS	
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN	21-feb.-21		
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO MODIFICATORIO COMPLEMENTARIO	19-oct.-21		
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	5-jul.-21		
FECHA DE APROBACIÓN	13-jul.-21		

VALOR PLANILLADO AVANCE DE OBRA	7.658.909,10	116.319,65	7.775.228,75
AMPLAICIÓN DIA: 126 DIAS			
TOTAL PLANILLADO	7.658.909,10	116.319,65	7.775.228,75

DESCUENTOS Y RETENCIONES			
ANTICIPO : 40%	3.063.563,64	46.527,86	3.110.091,50
OTROS:			
TOTAL DE DESCUENTOS:	3.063.563,64	46.527,86	3.110.091,50
VALOR LIQUIDO ESTA PLANILLA :	4.595.345,46	69.791,79	4.665.137,25

Firmado electrónicamente por:
PEDRO ELICIO RAMOS IDROVO

ING. PEDRO RAMOS IDROVO
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA LEON BURGOS

ING. CAROLINA LEON BURGOS
FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS NUEVOS DEL CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO No. 1

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DIAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS											
RN-1	GROUTING DE NIVELACIÓN	M3	3,35	$ 1.634,03	$ 5.474,00	3,35		3,35	5.474,00		5.474,000	100%
RN-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE ASTM 193 B7	U	1416,00	$ 49,44	$ 70.007,04	1.416,00		1.416,00	70.007,04		70.007,040	100%
RN-3	BORDILLO DE H.S 180 KG/CM2 TIPO CUNETA	ML	2261,84	$ 23,58	$ 53.334,19	1.294,71		1.294,71	30.529,26		30.529,260	57,24%
RN-4	ACERAS DE H.S. F'C=180KG/CM2 E=7CM, ESCOBILLADA.	M2	3878,20	$ 18,85	$ 73.104,07	2.616,27	171,97	2.788,24	49.316,69	3.241,63	52.558,320	71,90%
RN-5	ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACIÓN	L	19492,62	$ 0,85	$ 16.568,73	-		-			-	-
RN-6	CAPA DE RODADURA HORMIGÓN ASFÁLTICO MEZCLADO EN PLANTA, E=3".	M2	12995,08	$ 12,53	$ 162.828,35	-		-			-	-
RN-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO DE 500KG EN PUERTA DE INGRESO DE CERRAMIENTO	U	4,00	$ 1.081,08	$ 4.324,32	-	4,00	4,00		4.324,32	4.324,320	100,00%
RN-8	PINTURA DE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN EN PARQUEADEROS Y PASOS PEATONALES	ML	669,42	$ 0,62	$ 415,04	-		-			-	-
RN-9	TOPES PARA ESTACIONAMIENTO H.S = 180 KG/CM2 . INCLUYE PINTURA REFLECTIVA	U	88,00	$ 12,91	$ 1.136,08	-	88,00	88,00		1.136,08	1.136,080	100,00%
RN-10	JARDINERAS DE H.S= 180KG/CM2	ML	26,00	$ 15,02	$ 390,52	-		-			-	-
RN-11	PLANTAS ORNAMENTALES	ML	26,00	$ 10,99	$ 285,74	-	26,00	26,00		285,74	285,740	100,00%
RN-12	PALMERAS BOTELLAS ENANAS	U	7,00	$ 34,74	$ 243,18	-	7,00	7,00		243,18	243,180	100,00%
RN-13	TAPAJUNTA DE ALUMINIO PISO-PISO A= 15CM	ML	35,00	$ 16,25	$ 568,75	-		-			-	-
RN-14	TAPAJUNTA DE ALUMINIO PISO-PARED A= 15CM EN INTERIORES	ML	65,00	$ 16,90	$ 1.098,50	-		-			-	-
RN-15	TAPAJUNTA EXTERIOR TOOL GALVANIZADO	ML	40,00	$ 14,53	$ 581,20	-		-			-	-
RN-16	TAPAJUNTA DE HORMIGÓN LOSA-LOSA	ML	56,00	$ 42,28	$ 2.367,68	39,55		39,55	1.672,17		1.672,170	70,62%
RN-17	DUCHA ELÉCTRICA 110 V	U	7,00	$ 29,03	$ 203,21	-	7,00	7,00		203,21	203,210	100,00%
RN-18	LLAVE DE DUCHA	U	7,00	$ 20,90	$ 146,30	-	7,00	7,00		146,30	146,300	100,00%
RN-19	REJILLAS DE PISO 50 MM	U	42,00	$ 4,84	$ 203,28	-	42,00	42,00		203,28	203,280	1,00
RN-20	SUMIDERO DE CUBIERTA DE 110MM INCLUYE REJILLA TIPO CÚPULA	U	20,00	$ 51,11	$ 1.022,20	17,00	3,00	20,00	868,87	153,33	1.022,200	100,00%
RN-21	BORDILLO PARA TINETA DE BAÑO REVESTIDA CON CERÁMICA (0,10MX0,15M)	ML	6,00	$ 16,50	$ 99,00	-	6,00	6,00		99,00	99,000	100,00%
RN-22	MUEBLES AÉREOS DE MDF PARA COCINA	ML	7,00	$ 180,68	$ 1.264,76	-		-			-	-
RN-23	MUEBLES BAJOS DE MDF PARA COCINA	ML	7,00	$ 180,68	$ 1.264,76	-		-			-	-
RN-24	HORMIGÓN PREMEZCLADO PARA LOSA DE PISO F'C=280 KG/CM2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	M3	1204,92	$ 209,28	$ 252.165,66	1.204,92		1.204,92	252.165,66		252.165,660	100%
RN-25	FILOS INTERIORES Y EXTERIORES	ML	830,00	$ 3,76	$ 3.120,80	830,00		830,00	3.120,80		3.120,800	100%
RN-26	ENLUCIDO MEDIAS CAÑAS	ML	960,00	$ 2,28	$ 2.188,80	893,92		893,92	2.038,14		2.038,140	93,12%
RN-27	CUADRADA DE BOQUETES PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	1150,00	$ 4,64	$ 5.336,00	1.024,34		1.024,34	4.752,94		4.752,940	89,07%
RN-28	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON POLIESTIRENO EXPANDIDO 50 MM	M2	530,00	$ 5,64	$ 2.989,20	-		-			-	-
RN-29	JUNTA DE DILATACIÓN TIPO LLAVE - LOSAS DE PISOS	ML	3200,00	$ 2,36	$ 7.552,00	2.873,65		2.873,65	6.781,81		6.781,810	89,80%
RN-30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS EXPANSIVOS 5/8 -6" PARA ANCLAJE DE PLACAS	U	30,00	$ 4,27	$ 128,10	-		-			-	-
RN-31	CHICOTE D=12MM PARA ARRIOSTRAMIENTO DE MAMPOSTERÍA	U	1750,00	$ 1,55	$ 2.712,50	828,00		828,00	1.283,40		1.283,400	47,31%
RN-32	CAJA DE PASO H.S. F'C=180KG/Cm² 0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	U	10,00	$ 52,94	$ 529,40	10,00		10,00	529,40		529,400	100,00%
	ELÉCTRICOS											
RN-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR DE MEDICIÓN - TRAFOMIX	U	1,00	$ 9.602,82	$ 9.602,82	1,00		1,00	9.602,82		9.602,820	100%
RN-34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO METÁLICO PARA DOS CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN	U	4,00	$ 487,88	$ 1.951,52	4,00		4,00	1.951,52		1.951,520	100%
RN-35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO METÁLICO PARA UN CIRCUITO DE ILUMINACIÓN	U	2,00	$ 396,56	$ 793,12	2,00		2,00	793,12		793,120	100%
RN-36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL TDP100KVA	U	1,00	$ 5.982,02	$ 5.982,02	1,00		1,00	5.982,02		5.982,020	100%
RN-37	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL TDP 50KVA	U	2,00	$ 2.431,38	$ 4.862,76	2,00		2,00	4.862,76		4.862,760	100%
RN-38	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE DE HA DE 12MTS 500KG	U	7,00	495,52	$ 3.468,64	7,00		7,00	3.468,64		3.468,640	1,00
RN-39	TENDIDO DE CONDUCTOR AL DESNUDO ACSR# 1/0 AWG	M	500,00	$ 2,69	$ 1.345,00	500,00		500,00	1.345,00		1.345,000	1,00
RN-40	TENDIDO DE CONDUCTOR AL DESNUDO ACSR# 2 AWG	M	160,00	$ 2,33	$ 372,80	160,00		160,00	372,80		372,800	1,00
RN-41	TENDIDO DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO AL AISLADO 2x1/0+1/0 AWG	M	150,00	$ 6,37	$ 955,50	150,00		150,00	955,50		955,500	1,00
RN-42	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SUJECCION PARA EL NEUTRO	U	8,00	$ 22,13	$ 177,04	8,00		8,00	177,04		177,040	1,00
RN-43	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3F CENTRADA PASANTE 13.8KV - 3CPT	U	3,00	$ 187,73	$ 563,19	3,00		3,00	563,19		563,190	1,00
RN-44	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3F CENTRADA DOBLE RETENCION 13.8KV - 3CDT	U	1,00	$ 431,15	$ 431,15	1,00		1,00	431,15		431,150	1,00
RN-45	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3F CENTRADA RETENCION O TERMINAL 13.8KV - 3CRT	U	4,00	$ 287,70	$ 1.150,80	4,00		4,00	1.150,80		1.150,800	1,00
RN-46	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	U	3,00	$ 31,54	$ 94,62	3,00		3,00	94,62		94,620	1,00
RN-47	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	U	4,00	$ 40,08	$ 160,32	4,00		4,00	160,32		160,320	1,00
RN-48	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR DOBLE A TIERRA - TTD	U	4,00	$ 116,68	$ 466,72	4,00		4,00	466,72		466,720	1,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE No. 23(100%) - RUBROS NUEVOS DEL CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO No. 1

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DIAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
RN-49	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION AEREO - SUBTERRANEO PARA BAJO VOLTAJE	U	2,00	$ 243,82	$ 487,64	2,00		2,00	487,64		487,640	1,00
RN-50	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED 200W, CON FOTOCELULA, EN POSTE CON RED PREENSABLADA	U	7,00	$ 637,26	$ 4.460,82	7,00		7,00	4.460,82		4.460,820	100%
RN-51	CAJA REVISIÓN MEDIA TENSIÓN 90X90X90 C/VIA, CON TAPA DE HIERRO NODULAR 125 KN	U	20,00	$ 318,78	$ 6.375,60	18,00		18,00	5.738,04		5.738,040	90,00%
RN-52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO DE CONDENSADORES AUTOMATICO DE 60KVAR, 3F, 230V	U	1,00	$ 10.209,14	$ 10.209,14	1,00		1,00	10.209,14		10.209,140	100%
RN-53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO DE CONDENSADORES AUTOMATICO DE 30KVAR, 3F, 230V	U	1,00	$ 7.969,49	$ 7.969,49	1,00		1,00	7.969,49		7.969,490	100%
	CLIMATIZACIÓN											
RN-54	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE PARED INVERTER CAPACIDAD DE 18.000 BTU/H , INCLUYE COMPRESOR.	U	2,00	$ 1.728,67	$ 3.457,34	2,00		2,00	3.457,34		3.457,340	100%
RN-55	EXTRACTOR DE OLORES EN BAÑOS 6"X6"	U	20,00	$ 42,70	$ 854,00	18,00		18,00	768,60		768,600	90,00%
	PAREDES INDUSTRIALES											
RN-56	PAREDES DE GALVALUMEN E=0.45mm, RECUBRIMIENTO PINTURA POLIESTER ASTm-653A (COLOR INSTITUCIONAL).	M2	1849,90	$ 16,19	$ 29.949,88	1.849,90		1.849,90	29.949,88		29.949,880	100,00%
RN-57	CERRAmIENTO TuBO H.G. 2 "-mALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6mm, INC. PINTuRA A COmPRESOR	M2	1054,50	$ 22,99	$ 24.242,96	898,96	143,51	1.042,47	20.667,09	3.299,29	23.966,380	98,86%
RN-58	CERRAmIENTO VERJA DE TuBO HG 2" Y TuBO RECT 80X40X2, INC. PINTuRA COmPRESOR	M2	400,00	$ 60,18	$ 24.072,00	223,20	92,88	316,08	13.432,18	5.589,52	19.021,700	79,02%
RN-59	RECuBRImIENTO ALumINIO COLOR CYAN O SImILAR, ALuCuBOND 4mm INC. ESTRuCT. E INST<GuÍA InAGEN CORPORATI	M2	1315,00	$ 67,32	$ 88.525,80	800,87	176,53	977,40	53.914,57	11.884,00	65.798,570	74,33%
	MONTO TOTAL				**769.795,29**				**611.972,99**	**30.808,88**	**642.781,87**	**83,50%**

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	9-may.-19	
FIN PLAZO CONTRACTUAL	8-may.-20	
SUSPENSION DIAS	60	DIAS
SUSPENSION DIAS	11	DIAS
AMPLIACIÓN POR PANDEMIA	90	DIAS
AMPLIACIÓN POR CLIMA-REDISEÑO-% POR COVID	128	DIAS
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN	21-feb.-21	
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO MODIFICATORIO COMPLEMENTARIO	19-oct.-21	
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	5-jul.-21	
FECHA DE APROBACIÓN	13-jul.-21	

VALOR PLANILLADO AVANCE DE OBRA	611.972,99	30.808,88	642.781,87
AMPLAICIÓN DIA: 128 DIAS			
TOTAL PLANILLADO	**611.972,99**	**30.808,88**	**642.781,87**

DESCUENTOS Y RETENCIONES			
ANTICIPO : 40%	244.789,20	12.323,55	257.112,75
OTROS:			
TOTAL DE DESCUENTOS:	**244.789,20**	**12.323,55**	**257.112,75**
VALOR LIQUIDO ESTA PLANILLA :	**367.183,79**	**18.485,33**	**385.669,12**

Firmado electrónicamente por:
PEDRO ELICIO RAMOS IDROVO

ING. PEDRO RAMOS IDROVO
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA LEON BURGOS

CAROLINA LEON BURGOS
FISCALIZACIÓN

FATIMA
CONSORCIO

PLANILLA Nº 23

Avance de obra

1-Junio-2021 al 30-Junio-2021

PLANILLA DE OBRA

EXCEDENTES

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	PRIMERA ETAPA											
	1.- VIAS Y PARQUEADEROS						VP					
	PRELIMINARES											
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE C. RODADuRA	km	1,08	494,59	534,15720	-			-		-	-
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)	m3	12.779,98	0,82	10.479,58360	23.155,53	1.870,68	25.026,21	18.987,53	1.533,96	20.521,49	195,82%
3	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRuCTuRAS mENORES	m3	86,00	4,69	403,34000	-			-		-	
4	TuBERÍA DE ACERO CORRuGADO D= 1,20 m ,E=2.5 mm, mP-100	m	18,00	239,45	4.310,10000	7,00		7	1.676,150		1.676,15	38,89%
5	muRO DE H.S. F'C=180KG./Cm2 TIPO B(CABEZALES)	m3	22,00	188,41	4.145,02000	-			-		-	
	MATERIAL PETREO					-						
6	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)	m3	51.821,91	2,92	151.319,97720	-			-		-	
7	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3	m3	2.589,98	10,78	27.919,98440	1.029,98	202,55	1232,532	11.103,180	2.183,51	13.286,69	47,59%
8	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS	m3	1.942,49	17,21	33.430,25290	702,36	292,01	994,37	12.087,620	5.025,49	17.113,11	51,19%
9	TRANSPORTE mATERIAL PETREODE mEJORAmIENTO	m3-km	937.976,72	0,28	262.633,48104	-			-		-	
10	TRANSPORTE DE mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3	m3-km	117.701,06	0,28	32.956,29680	18.901,70		18901,7	5.292,480		5.292,48	16,06%
11	TRANSPORTE DE mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS	m3-km	34.964,82	0,28	9.790,14960	12.907,03	5.285,37	18192,4	3.613,970	1.479,90	5.093,87	52,03%
	CAPA DE RODADURA					-						
	AMBIENTALES					-						
12	SEÑALES INFORmATIVAS (2.40X1.20)m	u	2,00	250,92	501,84000	-			-		-	-
13	SEÑALES REGLAmENTARIAS (0.75 X 0.75)m	u	2,00	115,45	230,90000	-			-		-	-
14	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)m	u	2,00	115,45	230,90000	-			-		-	-
	CONSOLIDACION DE PLATAFORMAS					-						
15	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)	m3	43.057,34	2,92	125.727,44448	-			-		-	
16	TRANSPORTE mATERIAL PETREODE mEJORAmIENTO	m3-km	779.043,38	0,28	218.132,14640	-			-		-	
17	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)	m3	69.683,19	0,82	57.140,21170	-			-		-	-
	2.- ESTABILIZACIÓN TALUDES					-						
	PRELIMINARES					-						
18	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	4.030,36	1,14	4.594,60470	-			-		-	
19	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	4.613,56	1,46	6.735,79030	-			-		-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
20	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA) ESTRuCTuRAS	m3	9.606,48	4,18	40.155,08640	-			-		-	
21	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	205,06	17,93	3.676,72580	-			-		-	
22	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3		13,72		-			-		-	
23	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	85.716,60	2,82	241.720,79875	20.402,64	1.870,68	22273,3247	57.535,460	5.275,32	62.810,78	25,98%
	SISTEMA DE DRENAJE PLATAFORMA					-						
24	RASANTEO mANuAL DE ZANJAS	m3		3,22		-			-		-	
25	SumINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL PARA SuBDREN (TIPO NT 2400 O SImILAR)	m2	1.498,63	3,06	4.585,80780	-			-		-	
26	SumINISTRO Y COLOCACIÓN DE mATERIAL FILTRANTE A mAQuINA (PIEDRA BOLA mAX =2")	m3	524,58	15,19	7.968,37020	-			-		-	
27	SumINISTRO Y COLOCACIÓN mANuAL DEmATERIAL FILTRANTEPARA DRENES 1 PuLG	m3	279,52	20,70	5.786,06400	-			-		-	
28	SumINISTRO Y COLOCACIÓN DE TuBERIAP.V.C.DIAm. INT.=160mm, PERFORADA	m		14,38		-			-		-	
29	Sum.Y COLOCACIÓN TuBERIA PVC. CORRuGADA DIAm INT.=160mm S5	m		9,80		-			-		-	
30	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT. 220 mm S5	m		14,68		-			-		-	
31	Sum.Y COLOCACIÓN TuBERIA PVC. CORRuGADA DIAm. INT.=315mm S5	m		20,16		-			-		-	
32	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 315A 160mm PVC Y/O POLIETILENO	u		24,07		-			-		-	
33	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 220A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u		21,28		-			-		-	
	SISTEMA TIERRA ARMADA					-						
34	GEOTEXTIL TEJIDO- 2400 T PARA muRO DE CONTENCION TIERRA ARmADA	m2	21.276,67	3,06	65.106,59490	12,07		12,07	36,92		36,92	0,06%
35	GEOmALLA BX-1100 TENSAR	m2	7.927,94	3,19	25.290,11265	50,24		50,24	160,28		160,28	0,63%
36	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	4.074,59	17,33	70.612,64470	-			-		-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DIAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
37	muRO DE GAVIONES TRIPLE TORSION	m3	3.632,00	60,08	218.210,56000	-			-		-	
	3.- REDES DE+E59:E141 ALCANTARILLADO SA+E59:E141NITARIO, PLUVIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					-						
	ALCANTARILLADO SANITARIO					-						
	PRELIMINARES					-						
38	REPLANTEO Y NIVELACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	m	490,58	1,81	887,94980	1.085,00		1085	1.963,850		1.963,85	221,17%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
39	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-			-		-	
40	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	3.460,00	4,18	14.462,80000	1.009,34		1009,34	4.219,040		4.219,04	29,17%
41	ENTIBADO DE ZANJA	m2	160,00	11,56	1.849,60000	-			-		-	
42	RAZANTEO DE ZANJA E= 0.20m	m2	240,00	3,22	772,80000	-			-		-	
43	ARENA DE KILO, TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	320,00	18,13	5.801,60000	815,92		815,92	14.792,630		14.792,63	254,98%
44	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	1.800,00	13,72	24.696,00000	385,73		385,73	5.292,220		5.292,22	21,43%
45	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	900,00	6,32	5.688,00000	836,71		836,71	5.288,010		5.288,01	92,97%
46	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	1.440,00	2,82	4.060,80000	1.599,00		1599,002466	4.509,190		4.509,19	111,04%
	TUBERIAS PVC ALCANTARILLADO					-						
47	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=160 mm S6	m	89,12	9,70	864,46400	184,00		184	1.784,800		1.784,80	206,46%
48	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT = 200 mm S6	m	450,00	15,28	6.876,00000	84,05		84,05	1.284,28		1.284,28	18,68%
49	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 300 mm S5	m	50,00	20,22	1.011,00000	-			-		-	
50	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=364 mm S6	m		23,27		-			-		-	
51	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 450 mm S5	m	20,00	44,36	887,20000	-			-		-	
52	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 220A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u	2,00	21,28	42,56000	-			-		-	
53	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 335A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u		24,14		-			-		-	
	POZOS Y CAJAS					-						
54	HORmIGON SImPLE EN POZOS F'C=180KG/Cm2-mEZCLA A mANO	m3	30,00	177,00	5.310,00000	23,11		23,11	4.315,26		4.315,26	81,27%
55	ENCOFRADO mETALICO PARA POZOS DE REVISION	m3	30,00	20,36	610,80000	23,11		23,11	496,38		496,38	81,27%
56	SumINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS Y CERCOS H.F-210LB	u	12,00	178,06	2.136,72000	7,00		7	1.246,420		1.246,42	58,33%
57	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	7,00	90,42	632,94000	-			-		-	
	ALCANTARILLADO PLUVIAL					-						
	PRELIMINARES					-						
58	REPLANTEO Y NIVELACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	m	1.378,44	1,81	2.494,97640	1.368,57		1368,57	2.477,11		2.477,11	99,28%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
59	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-			-		-	
60	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	9.280,92	4,18	38.794,26389	-			-		-	-
61	ENTIBADO DE ZANJA	m2	308,42	11,56	3.565,33520	-			-		-	-
62	RAZANTEO DE ZANJA E= 0.20m	m2	849,00	3,22	2.733,78000	-			-		-	
63	ARENA DE KILO, TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	245,00	18,13	4.441,85000	935,25		935,25	16.956,080		16.956,08	381,73%
64	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	5.196,31	13,72	71.293,38000	-			-		-	
65	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	2.130,00	6,32	13.461,60000	-			-		-	
66	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	2.144,69	2,82	6.048,01885	1.797,82		1797,82	5.069,85		5.069,85	83,83%
	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO PLUVIAL					-						
67	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 250 mm S5	m	608,56	16,51	10.047,32560	-			-		-	-
68	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 300 mm S5	m	140,00	20,22	2.830,80000	-			-		-	
69	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=364 mm S6	m	50,00	23,27	1.163,50000	550,00		550	12.798,500		12.798,50	1100,00%
70	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 450 mm S5	m	12,00	44,36	532,32000	-			-		-	
71	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 600 mm S5	m	878,35	107,84	94.721,26400	-			-		-	
	POZOS Y CAJAS					-						
72	HORmIGON SImPLE EN POZOS F'C=180KG/Cm2-mEZCLA A mANO	m3	56,00	177,00	9.912,00000	14,44		14,44	2.555,880		2.555,88	25,79%
73	ENCOFRADO mETALICO PARA POZOS DE REVISION	m3	56,00	20,36	1.140,16000	14,44		14,44	294,000		294,00	25,79%
74	SumINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS Y CERCOS H.F-210LB	u	24,00	178,06	4.273,44000	8,00		8	1.424,480		1.424,48	33,33%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
75	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	22,00	90,42	1.989,24000	-			-		-	
76	CAJA DE H.S. PARA REJILLA mETÁLICA 0.40 por 1.00 por 1.00 (F'C= 180 KG/Cm2)	u	40,00	95,58	3.823,20000	-			-		-	
77	SumINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA H.F. (1.00 por 0.40 por 0.05)110 KG	u	40,00	130,84	5.233,60000	-			-		-	
	FOSA SEPTICA, FILTRO ANAEROBICO Y SECADO DE LODOS					-						
	PRELIMINARES					-						
78	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1,14		-			-		-	
79	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	63,51	1,46	92,72460	154,17		154,17	225,09		225,09	242,75%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
80	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-			-		-	
81	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	211,71	4,18	884,93651	5,97		5,97	24,95		24,95	2,82%
82	ENTIBADO DE ZANJA	m2		11,56		-			-		-	
83	RAZANTEO DE ZANJA E= 0.20m	m2		3,22		-			-		-	
84	ARENA DE KILO, TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3		18,13		-			-		-	
85	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	118,67	13,72	1.628,15240	-			-		-	
86	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	20,00	6,32	126,40000	-			-		-	
	TUBERIAS PVC ALCANTARILLADO					-						
87	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT = 200 mm S6	m	26,50	15,28	404,92000	-			-		-	
	HORMIGONES					-						
88	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	3,41	163,18	556,68857	2,09		2,09	341,05		341,05	61,26%
89	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	31,11	249,88	7.773,10602	-			-		-	
90	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F´C=180 KG/Cm2-50por cientoP)Clm	m3		169,86		-			-		-	
	ACERO ESTRUCTURAL					-						
91	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	3.652,36	1,68	6.135,96542	-			-		-	
92	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	100,00	2,76	276,00000	-			-		-	
93	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	100,00	0,11	11,00000	-			-		-	
	CERRAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO					-						
94	CERRAmIENTO DE ALAmBRE DE PÚAS-6 HILOS	m	60,00	2,14	128,40000	-			-		-	
95	PuERTA DE mALLA + TuBO ISO II 2"	m2	4,00	59,32	237,28000	0,80		0,8	47,460		47,46	20,00%
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES					-						
96	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	298,58	10,27	3.066,41660	-			-		-	
97	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	30,00	4,72	141,60000	30,86		30,86	145,660		145,66	102,87%
	PIEZAS SANITARIAS					-						
98	ACCESORIOS PLANTA DE TRATAmIENTO (Global)	u	1,00	5.101,40	5.101,40000	-			-		-	
99	FILTRO DE GRAVA CALSIFICADA DE 2 1/2" A 1/2"	m3	9,00	28,28	254,52000	-			-		-	
100	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u	9,00	75,58	680,22000	-			-		-	
	4.- NAVE PRINCIPAL- TALLERES-ADMINISTRATIVO-BODEGA GENERAL					-						
	PRELIMINARES					-						
101	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	12.327,08	1,14	14.052,87120	-			-		-	-
102	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	7.949,46	1,46	11.606,21160	582,98		582,98	851,150		851,150	733%
103	ACOmETIDA E INST. DE AGuA POTABLE PROVISIONAL PVC 3/4"	m	90,00	8,44	759,60000	-			-		-	
104	ACOmETIDA E INST. ELÉCTRICA PROV. TuBERÍA CONDuIT 1" CABLENo.8	m	90,00	27,58	2.482,20000	95,00		95	2.620,100		2.620,100	106%
105	SONDEOS DE SuELOS (COmPROBACION IN SITu) NEC-15	m	68,00	55,43	3.769,24000	-			-		-	-
106	CERRAmIENTO PROVISIONAL LISTONES + PLANCHAS DE ZINC	m2	1.018,35	11,69	11.904,51150	-			-		-	-
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
107	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	7.030,26	4,18	29.386,48680	42,66		42,66	178,320		178,32	0,61%
108	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-			-		-	
109	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	4.011,39	17,33	69.517,38870	4,32		4,32	74,870		74,87	0,11%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
110	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	2.274,76	13,72	31.209,70720	0,21		0,21	2,880		2,88	0,01%
111	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	7.030,26	2,82	19.825,33320	-			-		-	
	HORMIGONES					-						
112	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	196,42	163,18	32.051,81560	12,51		12,5104	2.041,450		2.041,45	6,37%
113	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF´C = 280KG./Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	1.088,67	225,97	246.006,75990	32,99		32,99	7.454,750		7.454,75	3,03%
114	HORmIGON PREmEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	282,96	283,42	80.196,52320	5,94		5,9418	1.684,030		1.684,03	2,10%
115	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	337,45	289,16	97.577,04200	28,51		28,508	8.243,370		8.243,37	8,45
116	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F´C=180 KG/Cm2-50por cientoP)CIm	m3	650,01	169,86	110.410,69860	17,23		17,23	5.505,16		5.505,16	4,99%
117	HORmIGON PREmEZCLADO LOSA/ VIGAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	200,00	193,75	38.750,00000	39,02		39,021175	7.560,350		7.560,35	19,51%
	ACERO ESTRUCTURAL					-						
118	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	188.476,09	1,68	316.639,83120	9.430,94		9430,94	22.149,89		22.149,89	7,00%
119	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	517.607,93	2,76	1.428.597,87576	13.460,23		13460,23	113.448,10		113.448,10	7,94%
120	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	499.962,86	0,11	54.995,91416	-			3.040,86		3.040,86	5,53%
121	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2	14.243,58	4,84	68.938,91268	-			-		-	
122	DECK E=0.75mm PLACA COLABORANTE-mD2-GA-101m	m2	2.520,48	18,37	46.301,21760	43,80		43,799	804,590		804,59	1,74%
	CONTRAPISOS					-						
123	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3 (CONTRAPISO E=20Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	1.043,38	10,78	11.247,63640	19,38		19,38	208,920		208,92	1,86%
124	mATERIAL DE BASE CLASE 2 (CONTRAPISO E=15Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	1.301,40	24,55	31.949,37000	-			-		-	
125	CONTRAPISO HORm.S. PREmEZ. F´C=280KG/Cm2 E= 4 PuLG. (SIN BASE)	m2	1.710,63	21,50	36.778,54500	-			-		-	
126	JuNTA ASERRADA DILATACION PISO (INC. CORDON, Y SELLO)	m	4.784,70	2,59	12.392,37300	-			-		-	
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS					-						
127	mASILLADO DE PISOS, ENDuRECEDOR DE CuARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5mm)	m2	5.101,87	5,62	28.672,50940	-			-		-	
128	PINTuRA EPOXICA PISO INDuSTRIAL 3mm (2 COmPONENTES)	m2	5.101,87	34,78	177.443,03860	-			-		-	
129	PISO PORCELANATO RECTIF. COLOR (0.50X0.50- u OTROS) INSTAL. EmPO	m2	1.910,00	40,31	76.992,10000	280,29	18,41	298,7032	11.298,440	742,29	12.040,73	15,64%
130	PISO GRADAS PORCELANATO PIZARRA COLOR (0.32X0.32-O SImILAR) INSTAL. EmPO.	m2	90,00	32,72	2.944,80000	-			-		-	
131	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	761,35	26,06	19.840,78100	104,09		104,092	2.712,640		2.712,64	13,67%
132	BARREDERA PORCELANATO COLOR RECTIFICADA A=10Cm	m	997,67	7,70	7.682,05900	723,02		723,02	5.567,25		5.567,25	72,47%
133	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISOS Y FILOS DE GRADA	m	150,00	2,98	447,00000	-			-		-	
134	CENEFA ACANALADA ANTILESLIZANTE FILOS GRADA A=10Cm	m	120,00	38,56	4.627,20000	-			-		-	
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS					-						
135	mASILLADO E ImPERmEABILIZADO DE PISOS-LOSAS, mORTERO CEmENTO-ARENA 1:3 +(PEGANTE + ImPERm.) LOSAS EXT	m2	1.380,00	10,40	14.352,00000	14,82		14,8164	154,090		154,09	1,07%
136	ImPERmEABILIZACION LOSA DE CuBIERTA ImPRImANTE ASFALTICO SOLuBLE AL AGuA	m2	1.650,00	2,84	4.686,00000	-			-		-	
137	ImPERmEABILIZACIONLOSA DE CuBIERTA LAmINAS ASFALTICAS	m2	1.650,00	13,85	22.852,50000	-			-		-	
	CUBIERTA					-						
138	CuBIERTA GALVALumEN E=0.45mm, RECuBRIENTO PINTuRA POLIESTER ASTm-653A (COLOR INSTITuCIONAL), INC, PER	m2	4.875,00	13,92	67.860,00000	236,26		236,26	3.288,74		3.288,74	4,85%
139	CuBIERTA POLICARBONATO E=0.80 mm, COLOR BRONCE O SImILAR, INC. ACCESORIOS INSTALCION	m2	946,45	14,34	13.572,09300	-			-		-	
140	CumBRERO GALVALumEN E=0.40 mm A=0.50 m, INC. ACCES. INSTALACION	m	92,00	8,38	770,96000	-			-		-	
141	CANAL TOL GALV E= 0.70mm, H=30Cm, A=40Cm DESARR. 122 Cm, INC. GANCHOS	m	259,00	21,49	5.565,91000	369,34		369,34	7.937,12		7.937,12	142,60%
	BAJANTES AGUA LLUVIA					-						
142	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=160mm)	m	798,00	9,91	7.908,18000	-			-		-	
143	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	25,00	90,42	2.260,50000	39,00		39	3.526,380		3.526,38	156,00%
144	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m	233,91	20,59	4.816,20690	-			-		-	
145	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO DIAm. INT.= 200A 160mm PVC Y/O POLIETILENO	u	15,00	20,71	310,65000	-			-		-	
	MAMPOSTERÍA					-						
146	RIOSTRAS DE H.S. F´C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3	129,00	258,83	33.389,07000	-			-		-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
147	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=10 Cm	m2	236,00	17,71	4.179,56000	-			-		-	
148	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2	4.630,00	22,90	106.027,00000	-			-		-	
149	PICADO Y RESANADO DE mAmPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m	3.819,65	4,63	17.684,98050	-			-		-	
150	mESON H.A. F'C=180 KG/Cm2 E=7 Cm HIERRO (LAVAmANOS+mESON)	m	7,00	34,03	238,21000	13,40	43,25	56,65	456,000	1.471,80	1.927,80	809,29%
151	REVESTImIENTO mESON GRANITO	m	7,00	180,61	1.264,27000	27,40		27,4	4.948,720		4.948,72	391,43%
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES					-						
152	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	2.795,97	10,27	28.714,61190	334,60		334,595	3.436,30		3.436,30	11,97%
153	ENLuCIDO VERTICAL PALETEADO mORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2	9.060,97	8,78	79.555,31660	-			-		-	
154	ENLuCIDO CON mALLA+ ImPERmEABILIZANTE, mORTERO 1:3	m2	1.250,00	17,03	21.287,50000	-			-		-	
155	ENLuCIDO HORIZONTAL PALETEADO mORTERO 1:3	m2	100,00	12,30	1.230,00000	-			-		-	
156	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	2.795,97	5,26	14.706,80220	334,60		334,60	1.759,97		1.759,97	11,97%
157	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO INTERIOR) INC. FILOS	m2	9.060,97	4,40	39.868,26800	-			-		-	
158	EmPASTE HORIZONTAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	100,00	6,56	656,00000	-			-		-	
159	PINTuRA EPOXICA PARED INDuSTRIAL 3mm (2 COmPONENTES)	m2		34,78		-			-		-	
160	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	9.060,97	4,72	42.767,77840	-			-		-	
161	PINTuRA DE CAuCHO SATINADA COLOR(2 mANOS) EXTERIOR (CANASTILLA) <GuÍA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	2.795,97	5,72	15.992,94840	-			-		-	
162	RECuBRImIENTO ALumINIO COLOR CYAN O SImILAR, ALuCuBOND 5mm INC. ESTRuCT. E INST<GuÍA ImAGEN CORPORATI	m2	1.315,00	84,96	111.722,40000	-			-		-	
163	RECuBRImIENTO PLANCHA FIBROCEmENTO E=7mm	m2	50,00	20,56	1.028,00000	-			-		-	
	CARPINTERIA METALICA					-						
164	VENTANA FIJA TuBO RECT 40X80X2-mALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6mm, INC PINTuRA ANTICORROSIVA, A COmPRESOR	m2	540,00	41,30	22.302,00000	-			-		-	
165	PORTON TIPO CORREDIZO RETRACTIL TuBO RECT 40X80X2mm-TOOL GALV. 0.6mm	m2	990,50	61,25	60.668,12500	-			-		-	
166	PuERTA mETÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2mm (AREA RIEGO Y DRENAJE)	m2	40,30	142,73	5.752,01900	-			-		-	
167	PuERTAS mODuLARES, TAmBORADAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, INCLuYE ESTRuCTuRA Y HER	m2	30,50	172,30	5.255,15000	4,78		4,78	823,590		823,59	15,67%
168	DIVISIONES ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, TAmBORADAS INCLuYE ESTRuCTuRA, EmPOTRAmIENTO PISO PARED (	m2	81,00	161,18	13.055,58000	24,56		24,56	3.958,580		3.958,58	30,32%
	CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE					-						
169	PASAmANOS TuBERÍA ACERO INOXIDABLE + VIDRIO LAmINADO 8mm, EmPOTRADA PISO H=1.00m (GRADAINTERIORES)	m	86,21	173,45	14.953,12450	-			-		-	
170	PASAmANOS EN TuBERIADE ACERO INOXIDABLE EmPOTRADO EN PARED	m	26,59	45,00	1.196,55000	-			-		-	
	CARPINTERIA DE MADERA					-						
171	PuERTA TAmBORADA 70Cm, ESQuELETO CANELO, mDF 9mm -LACADA-DISEÑO CORPORATIVO	u	20,00	198,79	3.975,80000	-			-		-	
172	PuERTA TAmBORADA 90Cm, ESQuELETO CANELO, mDF 9mm -LACADA-DISEÑO CORPORATIVO	u	2,00	230,59	461,18000	-			-		-	
173	PuERTA TAmBORADA 100Cm, ESQuELETO CANELO, mDF 9mm -LACADA-DISEÑO CORPORATIVO	u	6,00	240,28	1.441,68000	4,00		4,00	961,120		961,12	66,67%
	VENTANERIA-PUERTAS ALUMINIO VIDRIO					-						
174	PuERTA INGRESO PRINCIPAL-SISTEmA APERTuRA AuTOmATICO 2.00X2.30m ALumINO Y VIDRIO TEmPLADO DE 10mm	u	1,00	6.646,43	6.646,43000	-			-		-	
175	PuERTA DE VIDRIO TEmPLADO 10mm, INC. CERRADuRA TIRADERA, PIVOTE DE SuJECCION (PREFEXTuRA Y AuDITORIO)	m2	9,50	600,48	5.704,56000	-			-		-	
176	PuERTA YmAmPARAALumINIOS200YVIDRIOLAmINADO E=8mm CON PIVOTE	m2	9,00	190,90	1.718,10000	-			-		-	
177	PuERTA BATIENTE ALumINIO Y VIDRIO FLOTADO CLARO 6mm (0.90X2.10)	u	3,00	295,00	885,00000	3,00		3	885,000		885,00	100,00%
178	PuERTA BATIENTE ALumINIO Y VIDRIO FLOTADO CLARO 6mm (1.00X2.10)	u	40,00	286,07	11.442,80000	-			-		-	
179	VENTANA CORREDIZA ALumINIO SERIE 200-INCL. VIDRIO LAmINADO 6mm	m2	220,00	183,67	40.407,40000	-	0,75	0,75	-	137,75	137,750	0,34
	REVESTIMIENTO DE TUMBADOS					-						
180	CIELO RASO FALSO - FIBRA mINERAL Y RECuB LÁmINA ALumINIO 0.60X0.60 BLANCO, TIPO AmSTRONG O SImILAR	m2	2.150,00	21,59	46.418,50000	131,57		131,5735	2.840,670		2.840,67	6,12%
181	CIELO RASO FALSO TIPO GYPSum PARA HumEDAD-1/2"-SIN ESTuCAR	m2	212,58	20,04	4.260,10320	-			-		-	
182	ESTuCADO DE CIELO RASO	m2	212,58	6,26	1.330,75080	-			-		-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
183	FRISO GALVALumEN PREPINTADO E= 0.40 INC. FLASHING	m2	50,00	19,63	981,50000	-			-		-	
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS					-						
184	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF DISCAPACITADOS PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u	2,00	297,96	595,92000	-			-		-	
185	PASAmANOS PARA DISCAPACITADOS TuBO DIAm 32mm E=1.5mm EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO SATINADO (Juego)	u	2,00	281,03	562,06000	-	1,00	1	-	281,03	281,030	50,00
186	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u	39,00	297,96	11.620,44000	6,00		6	1.787,760		1.787,76	15,38%
187	uRINARIO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF	u	6,00	261,01	1.566,06000	4,00		4	1.044,040		1.044,04	66,67%
188	LAVABO BLANCO, LLAVE SENSOR mOVImIENTO (CON ACCESORIOS)	u	35,00	281,39	9.848,65000	2,00		2	562,780		562,78	5,71%
189	DISPENSOR DE PAPEL HIGIENICO DIAm=275mm, ROLLO 70mm, ABATIBLE,ACERO INOX E=8mm, AISI 304. ACABADO S	u	20,00	110,71	2.214,20000	4,00		4	442,840		442,84	20,00%
190	DISPENSOR DE PAPEL TOALLA 400-600 uNIDADES, 330X273X130mm, ACERO INOX E=8mm AISI 304, ACABADO SATINAD	u	20,00	113,00	2.260,00000	4,00		4	452,000		452,00	20,00%
191	DISPENSADOR DE JABON LIQuIDO ACERO INOX AISI304, ACABADO SATINADO	u	20,00	91,28	1.825,60000	4,00		4	365,120		365,12	20,00%
192	ESPEJO DE VIDRIO FLOTADO 4mm- mARCO DE ALumINIO	m2	12,89	42,86	552,46540	-			-		-	
193	FREGADERO DE COCINA (uN POZO)	u	2,00	185,40	370,80000	-			-		-	
194	SECADOR DE mANOS ACCIONAmIENTO AuTOmATICO 260X302X150mm, ACERO INOX. 304, LAmINA1.5mm 110V-60HZ	u	20,00	238,44	4.768,80000	4,00		4	953,760		953,76	20,00%
195	BASuRERO CILINDRICO A PEDAL D=250mm H=385 PARA BAÑO ACERO INOX. 304	u	41,00	66,60	2.730,60000	5,00		5	333,000		333,00	12,20%
	PUENTE GRUA BIRRIEL CAP. 16 TON (1 UNIDADES)					-						
196	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	407,57	1,68	684,71760	-			-		-	
197	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	43.726,12	2,76	120.684,09120	1,70		1,70	5.632,22		5.632,22	4,67%
198	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	43.726,12	0,11	4.809,87320	1,70		1,70	224,48		224,48	4,667%
199	KIT POLIPASTO BIRRIEL A CABLE + TROLEY ELEC, CAP. 16T, ELEVACION 8m, (INC. CARROS TESTEROS+ SISTEm EL	u	1,00	50.538,00	50.538,00000	-			-		-	
200	SISTEmA ELECTRIFICACION ENCAPSuLADO Lm60	m	88,00	112,21	9.874,48000	-			-		-	
201	RIEL DE RODADuRA 50X30mm, (V. PuENTE 2X10+V CARRILERA2X88m)	m	212,00	77,83	16.499,96000	-			-		-	
202	mONTAJE ELECTROmECANICOPARA GRuA BIRRIEL 16 TON	u	1,00	17.664,00	17.664,00000	-			-		-	
203	SIST. CONTROL REmOTO/ TELEmANDO (CON DISPLAY)	u	1,00	1.955,65	1.955,65000	-			-		-	
	EQUIPO DE MOVILIZACIÓN VERTICAL					-						
204	ASERSOR DE DISCAPACITADOS L =5.0m, 1 PARADA, CAP. NOmINAL 250KG.	u	1,00	18.732,35	18.732,35000	-			-		-	
	5.- NAVE LAVADORA, Y TALLERES CHAPISTERIA-CARPINTERIA					-						
	PRELIMINARES					-						
205	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	4.407,56	1,14	5.024,61840	-			-		-	-
206	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	1.087,37	1,46	1.587,56020	-			-		-	-
207	ACOmETIDA E INST. DE AGuA POTABLE PROVISIONAL PVC 3/4"	m		8,44		-			-		-	
208	ACOmETIDA E INST. ELÈCTRICA PROV. TuBERÍA CONDuIT 1" CABLENo.8	m		27,58		-			-		-	
209	SONDEOS DE SuELOS (COmPROBACION IN SITu) NEC-15	m	61,00	55,43	3.381,23000	-			-		-	-
210	CERRAmIENTO PROVISIONAL LISTONES + PLANCHAS DE ZINC	m2		11,69		-			-		-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
211	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	311,80	4,18	1.303,32400	35,14		35,14	146,890		146,890	11,27%
212	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-			-		-	
213	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	261,80	17,33	4.536,99400	7,00		7	121,310		121,310	2,67%
214	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	424,00	13,72	5.817,28000	-			-		-	-
215	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	261,80	2,82	738,27600	85,14		85,14	240,090		240,090	32,52%
	HORMIGONES					-						
216	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	9,80	163,18	1.599,16400	3,00		3	489,540		489,540	30,61%
217	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF'C = 280KG./Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	69,20	225,97	15.637,12400	-			-		-	-
218	HORMIGON PREMEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	35,23	283,42	9.984,88660	12,80		12,8	3.627,780		3.627,780	36,33
219	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	22,17	289,16	6.410,67720	4,69		4,69	1.356,160		1.356,160	21,15

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
220	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F´C=180 KG/Cm2-50por cientoP)Clm	m3	46,97	169,86	7.978,32420	12,25		12,25	2.080,790		2.080,790	26,08
	ACERO ESTRUCTURAL					-						
221	ACERO DE REFuERZO F"Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	14.998,01	1,68	25.196,65680	189,84		189,84	318,930		318,930	1,27
222	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	59.540,80	2,76	164.332,60800	1.560,30	1.299,37	2859,67	4.306,430	3.586,26	7.892,69	4,80%
223	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	59.540,80	0,11	6.549,48800	-	772,95	772,9542256	-	85,02	85,020	1,30
224	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2	2.420,00	4,84	11.712,80000	-			-		-	
	CONTRAPISOS					-						
225	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3 (CONTRAPISO E=20Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	188,50	10,78	2.032,03000	-			-		-	-
226	mATERIAL DE BASE CLASE 2 (CONTRAPISO E=15Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	141,20	24,55	3.466,46000	-			-		-	
227	CONTRAPISO HORm.S. PREmEZ. F´C=280KG/Cm2 E= 4 PuLG. (SIN BASE)	m2	710,00	21,50	15.265,00000	-			-		-	
228	JuNTA ASERRADA DILATACION PISO (INC. CORDON, Y SELLO)	m	550,00	2,59	1.424,50000	-			-		-	
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS					-						
229	mASILLADO DE PISOS, ENDuRECEDOR DE CuARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5mm)	m2	1.100,00	5,62	6.182,00000	-			-		-	
230	PINTuRA EPOXICA PISO INDuSTRIAL 3mm (2 COmPONENTES)	m2	1.100,00	34,78	38.258,00000	-			-		-	
231	PISO PORCELANATO RECTIF. COLOR (0.50X0.50- u OTROS) INSTAL. EmPO	m2	35,00	40,31	1.410,85000	450,73		450,73	18.168,930		18.168,93	1287,80%
232	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	72,00	26,06	1.876,32000	46,77		46,77	1.218,830		1.218,83	64,96%
233	BARREDERA PORCELANATO COLOR RECTIFICADA A=10Cm	m	28,00	7,70	215,60000	115,39		115,39	888,500		888,50	412,11%
234	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISOS Y FILOS DE GRADA	m		2,98		-			-		-	
	CUBIERTA					-						
235	CuBIERTA GALVALumEN E=0.45mm, RECuBRIENTO PINTuRA POLIESTER ASTm-653A (COLOR INSTITuCIONAL), INC, PER	m2	1.390,00	13,92	19.348,80000	-			-		-	
236	CuBIERTA POLICARBONATO E=0.80 mm, COLOR BRONCE O SImILAR, INC. ACCESORIOS INSTALCION	m2	100,00	14,34	1.434,00000	-			-		-	
237	CumBRERO GALVALumEN E=0.40 mm A=0.50 m, INC. ACCES. INSTALACION	m	54,25	8,38	454,61500	-			-		-	
238	CANAL TOL GALV E= 0.70mm, H=30Cm, A=40Cm DESARR. 122 Cm, INC. GANCHOS	m	108,50	21,49	2.331,66500	-			-		-	
	BAJANTES AGUA LLUVIA					-						
239	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=160mm)	m	188,00	9,91	1.864,88000	-			-		-	-
240	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	18,00	90,42	1.627,56000	-			-		-	
241	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m	120,00	20,59	2.470,80000	-			-		-	
242	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO DIAm. INT.= 200A 160mm PVC Y/O POLIETILENO	u	6,00	20,71	124,26000	-			-		-	
	MAMPOSTERÍA					-						
243	RIOSTRAS DE H.S. F´C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3	6,50	258,83	1.682,39500	-			-		-	
244	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=10 Cm	m2	5,00	17,71	88,55000	-			-		-	
245	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2	716,00	22,90	16.396,40000	-			-		-	
246	PICADO Y RESANADO DE mAmPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m	168,00	4,63	777,84000	-			-		-	
247	mESON H.A. F'C=180 KG/Cm2 E=7 Cm HIERRO (LAVAmANOS+mESON)	m	3,50	34,03	119,10500	-			-		-	
248	REVESTImIENTO mESON GRANITO	m	3,50	180,61	632,13500	-	0,58	0,58	-	104,75	104,750	16,57
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES					-						
249	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	380,00	10,27	3.902,60000	-			-		-	
250	ENLuCIDO VERTICAL PALETEADO mORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2	1.075,00	8,78	9.438,50000	-			-		-	
251	ENLuCIDO CON mALLA+ ImPERmEABILIZANTE, mORTERO 1:3	m2	35,00	17,03	596,05000	-			-		-	
252	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	380,00	5,26	1.998,80000	-			-		-	
253	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO INTERIOR) INC. FILOS	m2	2.150,00	4,40	9.460,00000	-			-		-	
254	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	2.150,00	4,72	10.148,00000	-			-		-	
255	PINTuRA DE CAuCHO SATINADA COLOR(2 mANOS) EXTERIOR (CANASTILLA) <GuÍA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	380,00	5,72	2.173,60000	160,53		160,53	918,230		918,23	42,24%
256	RECuBRImIENTO PLANCHA FIBROCEmENTO E=7mm	m2	50,00	20,56	1.028,00000	-			-		-	
	CARPINTERIA METALICA					-						
257	VENTANA FIJA TuBO RECT 40X80X2-mALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6mm, INC PINTuRA ANTICORROSIVA, A COmPRESOR	m2	182,26	41,30	7.527,33800	-			-		-	
258	PORTON TIPO CORREDIZO RETRACTIL TuBO RECT 40X80X2mm-TOOL GALV. 0.6mm	m2	156,67	61,25	9.596,03750	-			-		-	
259	PuERTA mETÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2mm , INC. CERRADuRA, BISAGRAS Y PINTuRA	m2	20,00	142,73	2.854,60000	15,98		15,98	2.280,830		2.280,83	79,90%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
260	PUERTAS MODULARES, TAMBORADAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, INCLUYE ESTRUCTURA Y HER	m2	4,00	172,30	689,20000	-			-		-	
261	DIVISIONES ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, TAMBORADAS INCLUYE ESTRUCTURA, EMPOTRAMIENTO PISO PARED (	m2	13,70	161,18	2.208,16600	-			-		-	
	VENTANERIA-PUERTAS ALUMINIO VIDRIO					-						
262	PUERTA BATIENTE ALUMINIO Y VIDRIO FLOTADO CLARO 6mm (1.00X2.10)	u	3,00	286,07	858,21000	-			-		-	
263	VENTANA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 200-INCL. VIDRIO LAMINADO 6mm	m2	6,00	183,67	1.102,02000	-			-		-	
	REVESTIMIENTO DE TUMBADOS					-						
264	CIELO RASO FALSO - FIBRA MINERAL Y RECUB LÁMINA ALUMINIO 0.60X0.60 BLANCO, TIPO AMSTRONG O SIMILAR	m2	129,01	21,59	2.785,32590	-			-		-	
265	FRISO GALVALUMEN PREPINTADO E= 0.40 INC. FLASHING	m2		19,63		-			-		-	
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS					-						
266	INODORO CON FLUXOMETRO LATON CROMADA 1.0 GPF DISCAPACITADOS PRIMERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u		297,96		-			-		-	
267	PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS TUBO DIAM 32mm E=1.5mm EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO SATINADO (Juego)	u		281,03		-			-		-	
268	INODORO CON FLUXOMETRO LATON CROMADA 1.0 GPF PRIMERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u	4,00	297,96	1.191,84000	-			-		-	
269	URINARIO CON FLUXOMETRO LATON CROMADA 1.0 GPF	u	1,00	261,01	261,01000	-			-		-	
270	LAVABO BLANCO, LLAVE SENSOR MOVIMIENTO (CON ACCESORIOS)	u	3,00	281,39	844,17000	-			-		-	
271	DISPENSOR DE PAPEL HIGIENICO DIAm=275mm, ROLLO 70mm, ABATIBLE,ACERO INOX E=8mm, AISI 304. ACABADO S	u	3,00	110,71	332,13000	-			-		-	
272	DISPENSOR DE PAPEL TOALLA 400-600 UNIDADES, 330X273X130mm, ACERO INOX E=8mm AISI 304, ACABADO SATINAD	u	2,00	113,00	226,00000	-			-		-	
273	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOX AISI304, ACABADO SATINADO	u	2,00	91,28	182,56000	-			-		-	
274	ESPEJO DE VIDRIO FLOTADO 4mm- MARCO DE ALUMINIO	m2	2,70	42,86	115,72200	-			-		-	
275	SECADOR DE MANOS ACCIONAMIENTO AUTOMATICO 260X302X150mm, ACERO INOX. 304, LAMINA1.5mm 110V-60HZ	u	2,00	238,44	476,88000	-			-		-	
276	BASURERO CILINDRICO A PEDAL D=250mm H=385 PARA BAÑO ACERO INOX. 304	u	4,00	66,60	266,40000	-			-		-	
277	DUCHAS CON MEZCLADORA (CON ACCESORIOS)	u	1,00	135,94	135,94000	-			-		-	
	6.- NAVE RESGUARDO VEHICULAR PESADO					-						
	PRELIMINARES					-						
278	ARREGLO Y LIMPIEZA (INCLUYE DESALOJO)	m2	5.783,22	1,14	6.592,87080	-			-		-	-
279	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQUEADERO,Y PLATAFORMAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	1.445,85	1,46	2.110,94100	1.577,40		1577,4	2.303,000		2.303,000	109,10
280	ACOMETIDA E INST. DE AGUA POTABLE PROVISIONAL PVC 3/4"	m		8,44		-			-		-	
281	ACOMETIDA E INST. ELÉCTRICA PROV. TUBERÍA CONDUIT 1" CABLENo.8	m		27,58		-			-		-	
282	SONDEOS DE SUELOS (COMPROBACION IN SITU) NEC-15	m	66,00	55,43	3.658,38000	-			-		-	-
283	CERRAMIENTO PROVISIONAL LISTONES + PLANCHAS DE ZINC	m2		11,69		-			-		-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
284	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A MAQUINA)	m3	78,36	4,18	327,54480	74,88		74,88	313,000		313,000	95,56
285	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-			-		-	
286	SUB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COMPACTADO (MAQUINA), CAPAS 20Cm	m3	78,36	17,33	1.357,97880	87,60		87,6	1.518,110		1.518,110	111,79
287	RELLENO COMPACTADO A MAQUINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	635,58	13,72	8.720,15760	-			-		-	-
288	DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS	m3	78,36	2,82	220,97520	74,88		74,88	211,160		211,160	95,56
	HORMIGONES					-						
289	HORMIGON PREMEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOMBEO Y TRANSPORTE	m3	7,20	163,18	1.174,89600				-		-	-
290	HORMIGÓN PREMEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CIMENTACIÓNF´C = 280KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	m3	29,00	225,97	6.553,13000	-			-		-	-
291	HORMIGON PREMEZCLADO CADENAS F´C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. BOMBEO Y TRANSPORTE	m3	84,75	283,42	24.019,84500	-			-		-	-
292	HORMIGON PREMEZCLADO COLUMNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	m3	14,26	289,16	4.123,42160	-			-		-	-
293	HORMIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F´C=180 KG/Cm2-50por cientoP)CIm	m3	56,51	169,86	9.598,78860	0,33		0,33	56,050		56,050	58%
	ACERO ESTRUCTURAL					-						
294	ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	9.807,60	1,68	16.476,76800	994,83		994,83	1.671,310		1.671,310	1014%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
295	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2	3.325,46	4,84	16.095,20220	-			-		-	
	CONTRAPISOS					-						
296	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3 (CONTRAPISO E=20Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	282,00	10,78	3.039,96000	-			-		-	-
297	mATERIAL DE BASE CLASE 2 (CONTRAPISO E=15Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	211,86	24,55	5.201,16300	-			-		-	
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS					-						
	CUBIERTA					-						
	BAJANTES AGUA LLUVIA					-						
298	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	12,00	90,42	1.085,04000	-			-		-	
299	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m	161,40	20,59	3.323,22600	-			-		-	
300	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO DIAm. INT.= 200A 160mm PVC Y/O POLIETILENO	u		20,71		-			-		-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES					-						
301	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	40,00	10,27	410,80000	-			-		-	
302	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	40,00	5,26	210,40000	-			-		-	
303	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	40,00	4,72	188,80000	-			-		-	
	10.- SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACIÓN					-						
	POZOS DE REVISION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS					-						
304	CAJA REVISION mEDIA TENSION 90X90X90 C/VIA, T/HA	u		169,45		-			-		-	
305	CAJA REVISION mEDIA TENSION 60X60X75,ACERA, T/HA	u	41,00	179,17	7.345,97000	-			-		-	
306	PuESTA A TIERRA SImPLE EN POZO ELECTRICO CON SuELDA EXOTERmICA	u	4,00	164,46	657,84000	-			-		-	
	SISTEMA SOTERRADO DE MEDIA TENSION					-						
307	BAJADA DE DE mEDIA TENSION AEREA SOTERRADA	u	4,00	600,70	2.402,80000	-			-		-	
308	TENDIDO DE TuBO RIGIDO 1 1/2" DOBLE	m		16,92		-			-		-	
309	SISTEmA A TIERRA DE mEDIA TENSION	u	1,00	1.781,59	1.781,59000	-			-		-	
310	PARARRAYOS 10 KV, CON PERNOS SuJECCION	u	3,00	84,46	253,38000	-			-		-	
311	SECCIONAmIENTO TRIFASICO AEREO SuBTERRANEO S3A/S, INC. PARARRAYOS	u	3,00	1.290,60	3.871,80000	-			-		-	
312	TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNuDO NO. 2 AWG	m	500,00	5,92	2.960,00000	-			603,96		603,96	20,40%
313	TENDIDO Y REGuLADO DE CABLE DE COBRE XLPE NO2-15KV	u	1.600,00	14,75	23.600,00000	-			540,74		540,74	2,29%
314	TENDIDO CONDuCTOR: TTu 2/0	m		36,79		-			-		-	
315	TENDIDO CONDuCTOR: TTu 3/0	m		45,20		-			-		-	
316	mALLA DE PuESTA A TIERRA EN CENTRO DE TRANSFORmACION CON SuELDA EXOTERmICA	u	4,00	581,10	2.324,40000	-			-		-	
317	BANCO DE DuCTOS 1X2 DE 110mm 1X2B1-B2	m	1.800,00	32,94	59.292,00000	-			-		-	
318	mONTAJE DE TRANSFORmADOR PADmOuNTED TRIFASICO TIPO mALLA DE 50KVA-13.8KV-127/220V	u	1,00	7.092,79	7.092,79000	-			-		-	
319	mONTAJE DE TRANSFORmADOR PADmOuNTED TRIFASICO TIPO mALLA DE 100KVA-13.8KV-127/220V	u	1,00	12.135,60	12.135,60000	-			-		-	
320	PuNTA TERmINAL AT TIPO EXTERIOR CABLE N° 2 AWG	u		170,72		-			-		-	
321	PuNTA TERmINAL AT TIPO INTERIOR CABLE N° 2 AWG	u	3,00	170,72	512,16000	-			-		-	
322	ACOmETIDA PRINCIPAL ELECTRICA	m	15,00	6,22	93,30000	-			-		-	
	INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO					-						
323	POSTES ORNAmENTALES DE 8mTS Y BRAZOS	u	57,00	799,03	45.544,71000	-			-		-	
324	LumINARIA ORNAmENTAL LED120W	u	82,00	532,37	43.654,34000	-			-		-	
325	LumINARIA ORNAmENTAL LED 60W	u	33,00	387,65	12.792,45000	-			-		-	
326	TENDIDO DE CONDuCTOR 1No. NO. 4 TTu	m	4.647,00	8,10	37.640,70000	1.516,28	611,83	2128,11	12.281,870	4.955,82	17.237,69	45,80%
327	mONTAJE DE TRANSF. mONO. PADmOuNTED 10 KVA	u	1,00	5.210,22	5.210,22000	-			-		-	
	AREA ADMINISTRATIVA PLANTA BAJA					-						
	INSTALACION LUMINARIAS					-						
328	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	636,00	3,34	2.124,24000	112,07		112,07	374,310		374,31	17,62%
329	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	218,00	1,18	257,24000	-			-		-	
330	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	620,00	0,56	347,20000	-			-		-	
331	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	350,00	4,87	1.704,50000	-			-		-	
332	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	150,00	1,57	235,50000	-			-		-	
333	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AmARILLO (INC. TAYPE)	m	1.043,00	2,28	2.378,04000	-			-		-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
334	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	1.043,00	1,43	1.491,49000	-			-		-	
335	LumINARIA LED 3X18W/120 VOLTIOS	u	130,00	60,59	7.876,70000	25,00		25	1.514,750		1.514,75	19,23%
336	LumINARIA LED 24W/120 VOLTIOS	u	14,00	58,36	817,04000	10,00	2,00	12	583,600	116,72	700,32	85,71%
337	INTERRuPTOR SImPLE CON TAPA	u	38,00	5,47	207,86000	9,00		9	49,230		49,23	23,68%
338	INTERRuPTOR DOBLE CON TAPA	u	14,00	6,16	86,24000	-			-		-	
339	INTERRuPTOR CONmuTADOR DE 3 VIAS	u	17,00	7,30	124,10000	13,00		13	94,900		94,90	76,47%
	TOMACORRIENTES GENERALES					-						
340	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	780,00	3,34	2.605,20000	353,82	11,46	365,28	1.181,76	38,28	1.220,04	46,83%
341	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	260,00	1,18	306,80000	-			-		-	
342	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	570,00	0,56	319,20000	25,00	12,00	37	14,000	6,72	20,72	6,49%
343	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	390,00	4,87	1.899,30000	-			-		-	
344	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	892,00	1,43	1.275,56000	282,63	35,44	318,07	404,160	50,68	454,84	35,66%
345	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	892,00	1,43	1.275,56000	262,73	35,44	298,17	375,700	50,68	426,38	33,43%
346	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	892,00	1,03	918,76000	262,73	35,44	298,17	270,610	36,50	307,11	33,43%
347	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	130,00	1,57	204,10000	44,00		44,00	69,08		69,08	33,85%
348	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	130,00	7,45	968,50000	52,00		52	387,400		387,40	40,00%
	TOMACORRIENTES REGULADOS UPS					-						
349	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	195,00	3,34	651,30000	125,15		125,15	418,00		418,00	64,18%
350	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	65,00	1,18	76,70000	16,00		16	18,880		18,88	24,62%
351	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	106,00	0,56	59,36000	47,00		47	26,320		26,32	44,34%
352	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	100,00	4,87	487,00000	-			-		-	
353	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	24,00	1,57	37,68000	6,00		6	9,420		9,42	25,00%
354	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	267,00	1,43	381,81000	178,88		178,88	255,800		255,80	67,00%
355	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	267,00	1,43	381,81000	178,88		178,88	255,800		255,80	67,00%
356	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	267,00	1,03	275,01000	178,88		178,88	184,250		184,25	67,00%
357	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	24,00	7,45	178,80000	-			-		-	
	AREA ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA					-						
	INSTALACION LUMINARIAS					-						
358	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	584,00	3,34	1.950,56000	127,38		127,38	425,45		425,45	21,81%
359	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	194,00	1,18	228,92000	-			-		-	
360	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	570,00	0,56	319,20000	-			-		-	
361	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	500,00	4,87	2.435,00000	-			-		-	
362	CAJETINES mETALICOS OCTOGONALES mEDIANOS CON TAPA	u	900,00	5,44	4.896,00000	57,00	4,00	61	310,080	21,76	331,84	6,78%
363	CAJETINES mETALICOS CuADRADOS CON TAPA 10X10	u	5,00	4,99	24,95000	-			-		-	
364	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	60,00	1,57	94,20000	-			-		-	
365	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AmARILLO (INC. TAYPE)	m	1.200,00	2,28	2.736,00000	-			-		-	
366	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	1.200,00	1,43	1.716,00000	-			-		-	
367	LumINARIA LED 3X18W/120 VOLTIOS	u	180,00	60,59	10.906,20000	-			-		-	
368	LumINARIA LED 24W/120 VOLTIOS	u	33,00	58,36	1.925,88000	-			-		-	
369	INTERRuPTOR SImPLE CON TAPA	u	50,00	5,47	273,50000	13,00		13	71,110		71,11	26,00%
370	INTERRuPTOR DOBLE CON TAPA	u	15,00	6,16	92,40000	-			-		-	
371	INTERRuPTOR TRIPLE CON TAPA	u	4,00	7,30	29,20000	-			-		-	
372	INTERRuPTOR CONmuTADOR DE 3 VIAS	u		7,30		-			-		-	
	TOMACORRIENTES GENERALES					-						
373	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	895,00	3,34	2.989,30000	76,29	32,93	109,22	254,81	109,99	364,80	12,20%
374	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	300,00	1,18	354,00000	-			-		-	
375	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	670,00	0,56	375,20000	-			-		-	
376	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	400,00	4,87	1.948,00000	-			-		-	
377	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	4.000,00	1,43	5.720,00000	-			-		-	
378	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	1.080,00	1,43	1.544,40000	-			-		-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
379	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	1.080,00	1,03	1.112,40000	-			-		-	
380	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	155,00	1,57	243,35000	10,00	5,00	15,00	15,70	7,85	23,55	9,68%
381	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	170,00	7,45	1.266,50000	-			-		-	
	TOMACORRIENTES REGULADOS UPS					-						
382	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	368,00	3,34	1.229,12000	114,38		114,38	382,03		382,03	31,08%
383	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	125,00	1,18	147,50000	-			-		-	
384	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	220,00	0,56	123,20000	5,00		5	2,800		2,80	2,27%
385	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	190,00	4,87	925,30000	-			-		-	
386	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	48,00	1,57	75,36000	10,00		10,00	15,70		15,70	20,83%
387	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	489,00	1,43	699,27000	122,28		122,28	174,860		174,86	25,01%
388	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	489,00	1,43	699,27000	122,28		122,28	174,860		174,86	25,01%
389	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	489,00	1,03	503,67000	122,28		122,28	125,950		125,95	25,01%
390	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	48,00	7,45	357,60000	13,00		13	96,850		96,85	27,08%
	ALIMENTACION AIREACONDICIONADO PLANTA BAJA Y ALATA					-						
391	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	600,00	3,34	2.004,00000	-			-		-	
392	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	250,00	1,18	295,00000	-			-		-	
393	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	200,00	0,56	112,00000	-			-		-	
394	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	248,00	4,87	1.207,76000	-			-		-	
395	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	885,00	1,43	1.265,55000	172,82		172,82	247,130		247,13	19,53%
396	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	885,00	1,43	1.265,55000	172,82		172,82	247,130		247,13	19,53%
397	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	885,00	1,43	1.265,55000	172,82		172,82	247,130		247,13	19,53%
398	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	50,00	1,57	78,50000	-			-		-	
399	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 220 V	u	50,00	7,45	372,50000	-			-		-	
	AREA DE MECANICA PESADA Y LIVIANA					-						
	INSTALACION LUMINARIAS					-						
400	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	540,00	3,34	1.803,60000	131,30		131,3	438,540		438,54	24,31%
401	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	66,00	1,18	77,88000	51,00		51	60,180		60,18	77,27%
402	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	132,00	0,56	73,92000	161,00		161	90,160		90,16	121,97%
403	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	436,00	4,87	2.123,32000	-			-		-	
404	CAJETINES mETALICOS CuADRADOS CON TAPA 10X10	u	20,00	4,99	99,80000	-			-		-	
405	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	65,00	1,57	102,05000	-			-		-	
406	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AmARILLO (INC. TAYPE)	m	88,00	2,28	200,64000	163,73		163,73	373,300		373,30	186,05%
407	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	88,00	1,43	125,84000	93,56		93,56	133,790		133,79	106,32%
408	LumINARIA LED 3X18W/120 VOLTIOS	u	11,00	60,59	666,49000	-			-		-	
409	LumINARIA LED 24W/120 VOLTIOS	u		58,36		-			-		-	
410	INTERRuPTOR SImPLE CON TAPA	u		5,47		-			-		-	
411	INTERRuPTOR DOBLE CON TAPA	u	1,00	6,16	6,16000	-			-		-	
412	INTERRuPTOR TRIPLE CON TAPA	u	1,00	7,30	7,30000	-			-		-	
413	LumINARIA LED 150W/220 VOLTIOS	u	53,00	193,85	10.274,05000	-			-		-	
414	TENDIDO DE CABLE CONCENTRICO 2X12 AWG(INC. TAYPE)	m	710,00	3,43	2.435,30000	692,08	46,96	739,04	2.373,840	161,07	2.534,91	104,09%
	TOMACORRIENTES GENERALES					-						
415	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	300,00	3,34	1.002,00000	105,83		105,83	353,470		353,47	35,28%
416	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	100,00	1,18	118,00000	-			-		-	
417	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	150,00	0,56	84,00000	7,00		7	3,920		3,92	4,67%
418	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	200,00	4,87	974,00000	-			-		-	
419	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	350,00	1,43	500,50000	208,18		208,18	297,700		297,70	59,48%
420	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	350,00	1,43	500,50000	208,18		208,18	297,700		297,70	59,48%
421	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	350,00	1,03	360,50000	208,18		208,18	214,430		214,43	59,48%
422	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	30,00	1,57	47,10000	18,00		18	28,260		28,26	60,00%
423	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	30,00	7,45	223,50000	8,00		8	59,600		59,60	26,67%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
424	TuBERIA EmT 3/4 PuLGADA	m	250,00	3,47	867,50000	127,19		127,19	441,350		441,35	50,88%
425	TENDIDO DE CABLE CONCENTRICO NO.3X10 AWG (INC. TAYPE)	m	400,00	4,01	1.604,00000	236,52		236,52	948,450		948,45	59,13%
426	TOmA ESPECIAL 220 VOLTIOS	u	25,00	11,10	277,50000	-			-		-	
	AREA DE CHAPISTERIA, LAVADO, TORNO, VULCANIZADORA					-						
	INSTALACION LUMINARIAS					-						
427	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	195,00	3,34	651,30000	26,78		26,78	89,450		89,45	13,73%
428	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	65,00	1,18	76,70000	-			-		-	
429	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	98,00	0,56	54,88000	64,00		64	35,840		35,84	65,31%
430	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	328,00	4,87	1.597,36000	-			-		-	
431	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	26,00	1,57	40,82000	-			-		-	
432	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AmARILLO (INC. TAYPE)	m	220,00	2,28	501,60000	-			-		-	
433	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	220,00	1,43	314,60000	-			-		-	
434	LumINARIA LED3X18W/120 VOLTIOS	u	45,00	60,59	2.726,55000	-			-		-	
435	LumINARIA LED 150W/220 VOLTIOS	u	20,00	193,85	3.877,00000	-			-		-	
436	TENDIDO DE CABLE CONCENTRICO 2X12 AWG(INC. TAYPE)	m	150,00	3,43	514,50000	114,20		114,2	391,710		391,71	76,13%
437	INTERRuPTOR SImPLE CON TAPA	u	20,00	5,47	109,40000	-			-		-	
	TOMACORRIENTES GENERALES					-						
438	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	635,00	3,34	2.120,90000	-			-		-	
439	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	212,00	1,18	250,16000	-			-		-	
440	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	315,00	0,56	176,40000	-			-		-	
441	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	428,00	4,87	2.084,36000	-			-		-	
442	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	550,00	1,43	786,50000	-			-		-	
443	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	550,00	1,43	786,50000	-			-		-	
444	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	550,00	1,03	566,50000	-			-		-	
445	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	40,00	7,45	298,00000	-			-		-	
446	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	42,00	1,57	65,94000	-			-		-	
447	TuBERIA EmT 3/4 PuLGADA	m	127,00	3,47	440,69000	74,68		74,68	259,140		259,14	58,80%
448	uNION EmT 3/4 PuLGADA	u	43,00	1,28	55,04000	20,00		20	25,600		25,60	46,51%
449	CONECTOR EmT 3/4 PuLGADA	u	86,00	0,77	66,22000	75,00		75	57,750		57,75	87,21%
450	TOmA ESPECIAL 220 VOLTIOS	u	10,00	11,10	111,00000	6,00		6	66,600		66,60	60,00%
	AREA DE RESGUARDO DE VEHICULOS					-						
	INSTALACION LUMINARIAS					-						
451	LumINARIA LED 150W/220 VOLTIOS	u	20,00	193,85	3.877,00000	-			-		-	
452	TENDIDO DE CABLE CONCENTRICO 2X12 AWG(INC. TAYPE)	m	512,00	3,43	1.756,16000	-			-		-	
	TOMACORRIENTES GENERALES					-						
453	TOmA ESPECIAL 220 VOLTIOS	u	8,00	11,10	88,80000	-			-		-	
454	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	8,00	1,57	12,56000	-			-		-	
	GRUPO ELECTROGENO					-						
	ACOMETIDA CENTRO DE TRANSFORMACION, GENERACION Y MEDICION DE ENERGIA					-						
455	mEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA INDIRECTO TRIFASICO 400/5A CLASE 0.5	u	1,00	3.275,86	3.275,86000	-			-		-	
456	CAJA DE PROTECCION GENERAL TRIFASICA NH-3X350A	u	1,00	468,19	468,19000	-			-		-	
457	GENERADOR DE EmERGENCIA EN CABINA INSONORA 50KVA TRIFASICO 127/220V	u	1,00	23.030,45	23.030,45000	-			-		-	
458	TABLERO DE TRANSFERENCIA AuTOmATICO TRIFASICO 3P/300A	u	1,00	4.845,70	4.845,70000	-			-		-	
459	PRuEBAS DE ENERGIZACION Y TRAmITES EmPRESA ELECTRICA, PAGOS (Global)	u	1,00	3.278,88	3.278,88000	-			-		-	
460	SISTEmA uPS TRIFÁSICODE 30 KVA	u	1,00	24.986,66	24.986,66000	-			-		-	
461	TABLERO DE BYPASS TRIFASICO 100A CON BARRAS DE COBRE	u	1,00	2.669,86	2.669,86000	-			-		-	
462	SISTEmA DE PROTECCION ATmOSFERICA PARRAYOS	u	2,00	1.643,60	3.287,20000	-			-		-	
	ALIMENTADORES Y SUBTABLEROS CT-1					-						
	ALIMENTADOR TDP-STE PB1					-						
463	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO.3X8+8Cu TW (INC. TAYPE)	m	18,00	12,44	223,92000	79,64		79,64	1.091,73		1.091,73	487,55%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
464	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PB1	u	1,00	200,82	200,82000	-			-		-	
	ALIMENTADOR TDP-STE PB2					-						
465	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	31,00	14,51	449,81000	-			108,83		108,83	24,19%
466	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PB2	u	1,00	323,93	323,93000	-			-		-	
	ALIMENTADOR TDP-STE PB3					-						
467	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	41,00	14,51	594,91000	-			123,34		123,34	20,73%
468	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PB3	u	1,00	213,64	213,64000	1,00		1	213,640		213,64	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE PB4					-						
469	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	32,00	14,51	464,32000	-			142,20		142,20	30,63%
470	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PB4	u	1,00	226,90	226,90000	1,00		1	226,900		226,90	100,00%
	ALIMENTADOR TPD-STE PB5					-						
471	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	26,00	14,51	377,26000	-			129,14		129,14	34,23%
472	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PB5	u	1,00	226,90	226,90000	2,00		2	453,800		453,80	200,00%
	ALIMENTADOR TPD-STE-PB6					-						
473	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	132,00	14,51	1.915,32000	-			696,48		696,48	36,36%
474	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PB6	u	3,00	297,41	892,23000	-			-		-	
	ALIMENTADOR STD-STE-PA1					-						
475	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	41,00	14,51	594,91000	-			44,98		44,98	7,56%
476	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PA1	u	1,00	214,08	214,08000	-			-		-	
	ALIMENTADOR STD-STE-PA2					-						
477	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	111,00	14,51	1.610,61000	-			622,48		622,48	38,65%
478	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PA2	u	3,00	297,41	892,23000	-			-		-	
	ALIMENTADOR TPD-STE-PA3					-						
479	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	45,00	14,51	652,95000	-			146,55		146,55	22,44%
480	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PA3	u	1,00	230,78	230,78000	-			-		-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-PA4					-						
481	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	35,00	14,51	507,85000	46,20		46,2	832,87		832,87	164,00%
482	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PA4	u	1,00	304,26	304,26000	-			-		-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-PA5					-						
483	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	47,00	14,51	681,97000	-			748,72		748,72	109,79%
484	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PA5	u	2,00	217,52	435,04000	-			-		-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-PA6					-						
485	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	56,00	14,51	812,56000	-			171,22		171,22	21,07%
486	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PA6	u	1,00	310,67	310,67000	-			-		-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A1					-						
487	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	122,00	14,51	1.770,22000	-			-		-	
488	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6ESPACIOS A1	u	4,00	122,27	489,08000	-			-		-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A2					-						
489	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	130,00	14,51	1.886,30000	-			-		-	
490	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS A2	u	1,00	122,27	122,27000	-			-		-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR-A3					-						
491	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	57,00	14,51	827,07000	-			237,96		237,96	28,77%
492	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS A3	u	1,00	187,12	187,12000	-			-		-	
	ALIMENTADOR TPD-STE-ANGAR-A4					-						
493	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	92,00	14,51	1.334,92000	-			-		-	
494	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS A4	u	2,00	122,27	244,54000	-			-		-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A5					-						
495	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	95,00	14,51	1.378,45000	-			565,89		565,89	41,05%
496	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12ESPACIOS A5	u	1,00	200,82	200,82000	-			-		-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A6					-						

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
497	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	146,00	14,51	2.118,46000	-			-		-	
498	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS A6	u	2,00	122,27	244,54000	-			-		-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR-A7					-						
499	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	82,00	14,51	1.189,82000	-			557,18		557,18	46,83%
500	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS A7	u	1,00	228,23	228,23000	-			-		-	
	ALIMENTADOR TPD-STE-CONDENSADORES					-						
501	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	12,00	14,51	174,12000	20,00		20,00	290,200		290,200	167,00%
502	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS CONDENSADORES	u	1,00	738,12	738,12000	-			-		-	
	ALIMENTADORES Y SUBTABLEROS CT-2					-						
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A1					-						
503	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	41,00	14,51	594,91000	-	20,50	20,5	-	297,45	297,450	50,00
504	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12ESPACIOS ANGAR A1	u	1,00	187,12	187,12000	-			-		-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A2					-						
505	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	80,00	14,51	1.160,80000	-			-		-	
506	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS ANGAR 2	u	1,00	122,27	122,27000	-			-		-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR-A3					-						
507	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	55,00	14,51	798,05000	-			-		-	
508	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS ANGAR 3	u	1,00	122,27	122,27000	-			-		-	
	ALIMENTADOR TPD-STE-ANGAR-A4					-						
509	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	40,00	14,51	580,40000	-			-		-	
510	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS ANGAR 4	u	1,00	173,41	173,41000	-			-		-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A5					-				-		
511	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	47,00	14,51	681,97000	6,43		6,43	93,300		93,30	13,68%
512	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12ESPACIOS ANGAR 5	u	1,00	173,41	173,41000	-			-		-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A6					-						
513	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	168,00	14,51	2.437,68000	-			-		-	
514	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS ANGAR 6	u	3,00	200,82	602,46000	2,00		2	401,640		401,64	66,67%
	ACOMETIDA B.V PRINCIPAL					-						
515	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 2/0 THHN	m	144,00	4,18	601,92000	-			-		-	
516	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 1/0 THHN	m	36,00	4,18	150,48000	-	50,01	50,01	-	209,04	209,040	138,92
	ACOMETIDA DE GENERADOR - TTA					-						
517	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 2/0 THHN	m	120,00	4,18	501,60000	-			-		-	
518	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 1/0 THHN	m	40,00	4,18	167,20000	131,20		131,2	548,420		548,42	328,00%
	ACOMETIDA DE TTA - TDP-N					-						
519	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 1/0 THHN	m	60,00	4,18	250,80000	124,00		124	518,320		518,32	206,67%
520	TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNuDO NO. 2 AWG	m	25,00	5,92	148,00000	-			-		-	
	ACOMETIDA DE TTA - TP					-						
521	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 1/0 THHN	m	40,00	4,18	167,20000	2,60		2,6	10,870		10,87	6,50%
522	TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNuDO NO. 2 AWG	m	14,00	5,92	82,88000	32,00		32	189,440		189,44	228,57%
	CERCO ELECTRICO CERRAMIENTO					-						
523	INSTALACION DE CENTRAL ENERGIZADORA 5K	u		594,89		-			-		-	
524	COLOCACION DE TuBERIA PREPARADA	u		10,70		-			-		-	
525	COLOCACION DE AISLADORES DE PASO DE ESQuINA Y PASANTE	u		5,26		-			-		-	
526	TENDIDO DE ALAmBRE SOLIDO GALVANIZADO	m		0,92		-			-		-	
527	TENDIDO DE CONDuCTOR DE COBRE DE ALTA TENSION 1/0	m		18,77		-			-		-	
528	INSTALACIONDE BATERIA Y SIRENA	m		962,28		-			-		-	
529	SISTEmA DE PuESTA A TIERRA	u		60,25		-			-		-	
	11.- SISTEMA HIDRAULICO SANITARIO Y CONTRAINCENDIOS					-						
	SITEMA DE AGUA POTABLE A PRESIÓN CONSTANTE					-						
	ACOMETIDA DE AGUA POTABLE					-						

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
530	TuBERIA PVC D=63 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m	470,00	4,09	1.922,30000	-			-		-	
531	CONEXION DOmICILIARIA INC.mEDIDOR,EN TuBO D=63mm	u	2,00	100,91	201,82000	-			-		-	
532	HIDRANTES D=3" INCLuYE ACCESORIOS	u	2,00	702,84	1.405,68000	-			-		-	
	TUBERIA PVC AGUA POTABLE					-						
533	TuBERIA PVC ROSCABLE D=1/2" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	361,00	5,86	2.115,46000	-			-		-	
534	TuBERIA PVC ROSCABLE D=3/4" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	59,58	6,59	392,63220	-			-		-	
535	TuBERIA PVC ROSCABLE D=1" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	158,67	9,78	1.551,79260	8,15		8,15	79,71		79,71	5,14%
536	TuBERIA PVC ROSCABLE D=1 1/2" EN EDIFICACION+PRuEB	m	98,92	16,09	1.591,62280	-			-		-	
537	TuBERIA PVC ROSCABLE D=2" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	45,08	14,86	669,88880	7,18	30,80	37,98	106,69	457,69	564,38	84,25%
538	TuBERIA PVC ROSCABLE D=2 1/2"" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	20,04	16,38	328,25520	-			-		-	
539	TuBERIA PVC ROSCABLE D=3" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	335,60	17,90	6.007,24000	-			-		-	
540	TuBERIA PVC ROSCABLE D=4" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	32,81	18,83	617,81230	26,95		26,95	507,47		507,47	82,14%
	ACCESORIOS INST. TUB PVC ROSCABLE AGUA POTABLE					-						
541	ANCLAJES mETALICOS PLATINA 2 por 1/2" (ABRAZADERAS), EN LOSA Y PARED	u	250,00	14,11	3.527,50000	-			-		-	
542	S.I. PuNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGuA por punto	u	90,00	13,67	1.230,30000	-			-		-	
543	S. I. PuNTO AGuA FRIA PVC ROSCABLE D = 2" por punto	u	35,00	63,31	2.215,85000	-			-		-	
544	VALVuLA DE BRONCE RW 2" +ACCESORIOS	u	5,00	34,99	174,95000	-			-		-	
545	LLAVE DE PASODE 1/2 PuLG	u	15,00	10,15	152,25000	-			-		-	
	SISTEMA DE AGUA CALIENTE					-						
546	S.I. PuNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGuA CALIENTE por punto	u		16,04		-			-		-	
547	TuBERIA AGuA CALIENTE PVC ROSCABLE D=1/2" EN EDIFICACION+PRuEBA	m		6,77		-			-		-	
548	CALENTADOR ELECTRICO ELECTRICO 15W	u		539,04		-			-		-	
	SISTEMA DE PRESION (BOMBEO) S AGUA POTABLE					-						
549	S. I. SISTEmA HIDRONEumATICO(2BOmBA5HP-TANQuE 19.8GAL-CAJA CONTROL-CONT. NIVEL-VÁLVuLA CHEQuE), uSO	u	1,00	7.104,62	7.104,62000	-			-		-	
550	S. I. SISTEmA HIDRONEumATICO(3BOmBA5HP-TANQuE 29.5GAL-CAJA CONTROL-CONT. NIVEL-VÁLVuLA CHEQuE), uSO	u	1,00	10.425,92	10.425,92000	-			-		-	
	SISTEMA CONTRAINCENDIOS					-						
551	S. I. TuBERÍA HG ASTmD = 2 ½" + PRuEBA	m	80,00	15,24	1.219,20000	45,02		45,02	686,100		686,10	56,27%
552	S.C. TuBERIA HG ASTm D = 1 1/2 " + PRuEBA	m	40,00	11,54	461,60000	-			-		-	
553	S. I. TEE HG ASTmD = 2½"	u	2,00	8,72	17,44000	-			-		-	
554	S. I. CODO HG ASTm90º X D = 2 ½"	u	10,00	6,70	67,00000	-			-		-	
555	S.I. uNION uNIVERSAL HG ASTm D = 2 1/2"	u	5,00	12,00	60,00000	17,00		17	204,000		204,00	340,00%
556	S.I. VALVuLA CHECK BRONCE D = 2 1/2 "	u	1,00	79,42	79,42000	-			-		-	
557	S. I. REDuCTOR HG ASTmD = 2 1/2" X 1 1/2"	u	1,00	9,48	9,48000	1,00		1	9,480		9,48	100,00%
558	S. I. uNIÓN uNIVERSAL HG ASTmD = 1 1/2"	u	5,00	8,23	41,15000	-			-		-	
559	S. I. CODO HG ASTm D = 1 1/2"	u	6,00	8,93	53,58000	-			-		-	
560	ANCLAJES mETALICOS PLATINA 2 por 1/2" (ABRAZADERAS), EN LOSA Y PARED	u	80,00	14,11	1.128,80000	-			-		-	
561	PuNTO H.G. ROSCABLE 1 1/2" AGuA por punto	u	2,00	74,00	148,00000	-			-		-	
562	PuNTO H.G. ROSCABLE 2" AGuA por punto	u	1,00	81,83	81,83000	-			-		-	
563	GAB CONT INCEN INC GAB SN VID, RACK DE INC Y mANG 100FT X1½"LLAVE SPANNER1½"NACHA, NIPLE DE BRONC Y P	u	2,00	749,90	1.499,80000	-			-		-	
564	SIAmESA 4"X 2 1/2" X 2 1/2" DE BRONCE	u	1,00	295,97	295,97000	-			-		-	
	EXTINTORES					-						
565	EXTINTOR PQS CAPACIDAD 10 LBS. CON CAJA mETALICA	u	16,00	99,84	1.597,44000	-			-		-	
566	EXTINTOR PQS CAPACIDAD 20 LBS. CON CAJA mETALICA	u	2,00	106,69	213,38000	-			-		-	
567	EXTINTOR CO2 CAPACIDAD 10 LBS. CON CAJA mETALICA	u	4,00	97,66	390,64000	-			-		-	
568	EXTINTOR CO2 CAPACIDAD 20 LBS. CON CAJA mETALICA	u	2,00	313,27	626,54000	-			-		-	
569	EXTINTOR CO2 CAPACIDAD TIPO SATELITE DE 50 LBS	u	1,00	578,23	578,23000	-			-		-	
	SISTEMA DE PRESION (BOMBEO) S CONTRAINCENDIOS					-						
570	S. I. SISTEmA HIDRONEumATICO(BOmBA-mOTOR-CAJA DE CONTROL-CONTROL DE NIVEL-VÁLVuLA CHEQuE), uSOCON	u	1,00	7.949,92	7.949,92000	-			-		-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
571	BOmBA JOCKEY; 1 HP, Q=8.70 GPm, PRES=110m; INCLuYE TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS	u	1,00	2.762,08	2.762,08000	-			-		-	
	SISTEMA DE REUTILIZACION DE AGUAS LLUVIAS (RIEGO Y LAVADORA AUTO)					-						
572	REPLANTEO Y NIVELACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	m	250,00	1,81	452,50000	-			-		-	
573	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	200,00	17,93	3.586,00000	-			-		-	
574	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	200,00	6,32	1.264,00000	-			-		-	
575	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=160mm)	m	120,00	9,91	1.189,20000	61,08		61,08	605,300		605,30	50,90%
576	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	12,00	90,42	1.085,04000	-			-		-	
	TUBERIA PVC RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS					-						
577	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=160 mm S6	m	50,00	9,70	485,00000	463,56		463,56	4.496,53		4.496,53	927,12%
578	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT = 200 mm S6	m		15,28		-			-		-	
579	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 228 mm S6	m		15,88		-			-		-	
580	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 250 mm S6	m	90,00	16,51	1.485,90000	-			-		-	
581	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 300 mm S5	m	30,00	20,22	606,60000	-			-		-	
582	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=400 mm S5	m	428,11	38,33	16.409,45630	337,59		337,59	12.939,830		12.939,83	78,86%
583	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 450 mm S5	m	30,00	44,36	1.330,80000	-			-		-	
584	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 500 mm S5	m		74,42		-			-		-	
585	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 220A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u	3,00	21,28	63,84000	-			-		-	
586	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 335A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u	3,00	24,14	72,42000	27,00		27	651,780		651,78	900,00%
	TUBERIA PVC PRESIÓN RECOLECCION AGUAS LLUVIAS					-						
587	TuBERIA PVC D=3" 1.0 mPA + PRuBA	m	12,00	5,16	61,92000	-			-		-	
588	VALVuLA TIPO GLOBO (CONTROL NIVEL mECANICO)	u	2,00	17,82	35,64000	-			-		-	
589	ROCIADOR 3/4 Q=3.22 m3/H, RADIO COBERTuRA 15.8m, 5BAR	u		17,82		-			-		-	
590	TuBERIA PVC D=25 mm 1.0 mPA u/C + PRuEBA	m	80,00	2,98	238,40000	-			-		-	
591	TuBERIA PVC D=40 mm 1.0 mPA E/C + PRuEBA	m	20,00	3,38	67,60000	-			-		-	
592	TuBERIA PVC D=50 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m	20,00	3,50	70,00000	-			-		-	
593	TuBERIA PVC D=63 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m	47,00	4,09	192,23000	-			-		-	
594	TuBERIA PVC D=75 mm 1.0 mPA u/E + PRuBA	m	30,00	5,23	156,90000	-			-		-	
595	TuBERIA PVC D=90 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m	25,00	6,20	155,00000	-			-		-	
596	TuBERIA PVC D=110 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m		8,48		-			-		-	
597	TuBERIA PVC D=125 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m		11,54		-			-		-	
	SISTEMA DE PRESION (RIEGO Y LAVADORA AUTOS)					-						
598	GRuPO 2 BOmBAS15 HP (Q=12 L/S, TDH= 80mCA), (2BOmBA-mOTOR-CAJA DE CONTROL-CONTROL DE NIVEL-VÁLVuLA CH	u		6.465,34		-			-		-	
599	GRuPO 3 BOmBAS15 HP (Q=21 L/S, TDH= 80mCA), (3BOmBA-mOTOR-CAJA DE CONTROL-CONTROL DE NIVEL-VÁLVuLA CH	u	1,00	8.868,10	8.868,10000	-			-		-	
	SISTEMA SANITARIO INTERNO					-						
	PRELIMINARES Y MOV. TIERRAS					-						
600	REPLANTEO Y NIVELACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	m	390,00	1,81	705,90000	-			-		-	-
601	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	12,00	17,93	215,16000	-			-		-	
602	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3		6,32		-			-		-	
	INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE					-						
603	PuNTO DE DESAGuE EN PVC 50 mm	u	86,00	28,80	2.476,80000	-			-		-	-
604	PuNTO DE DESAGuE EN PVC 110 mm	u	45,00	34,43	1.549,35000	-			-		-	-
605	TuBERÍA PVC 50 mm DE DIÁmETRO (mAT/TRASP/INST)	m	125,60	5,14	645,58400	-			-		-	-
606	TuBERÍA PVC 110 mm DE DIÁmETRO (mAT/TRASP/INST)	m	420,00	8,02	3.368,40000	-		-	-		-	
607	TuBERÍA PVC 160 mm DE DIÁmETRO (mAT/TRASP/INST)	m	165,00	14,52	2.395,80000	-			-		-	-
608	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	6,00	90,42	542,52000	-			-		-	
	INSTALACION TUBERIA PVC DEVENTILACIÓN					-						
609	TuBERIA PVC D=75 mm VENTILACIÓN	m	78,00	4,27	333,06000	96,22		96,22	410,86		410,86	123,36%
610	PuNTO DE VENTILACIÓN PVC 75 mm por punto	u	25,00	15,61	390,25000	1,00		1	15,61		15,61	4,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	TANQUES DE RESERVA DE AGUA-CISTERNAS 49 M3					-						
	PRELIMINARES					-						
611	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	68,64	1,14	78,24960	-			-		-	
612	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	60,00	1,46	87,60000	-			-		-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
613	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-			-		-	
614	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	201,65	4,18	842,89700	-			-		-	
615	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	m2		11,56		-			-		-	
616	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	41,00	13,72	562,52000	1,00		1	13,72		13,72	2,44%
617	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	10,00	6,32	63,20000	-			-		-	
	HORMIGONES					-						
618	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	4,10	163,18	669,03800	-			-		-	
619	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	29,66	249,88	7.411,44080	-			-		-	
	ACERO ESTRUCTURAL					-						
620	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	2.459,03	1,68	4.131,17040	-			-		-	
621	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	50,00	2,76	138,00000	-			-		-	
622	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	50,00	0,11	5,50000	-			-		-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES					-						
623	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	144,00	10,27	1.478,88000	-			-		-	
624	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	113,00	26,06	2.944,78000	14,18		14,18	369,480		369,48	12,55%
625	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	15,00	4,72	70,80000	-			-		-	
626	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u	2,00	75,58	151,16000	-			-		-	
	TANQUES DE RESERVA DE AGUA-CISTERNAS 11 M3					-						
	PRELIMINARES					-						
627	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1,14		-			-		-	
628	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	36,80	1,46	53,72800	-			-		-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
629	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	5,00	17,93	89,65000	-			-		-	
630	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	97,58	4,18	407,88440	-			-		-	
631	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	m2	17,00	11,56	196,52000	-			-		-	
632	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	55,20	13,72	757,34400	-			-		-	
633	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	5,00	6,32	31,60000	-			-		-	
	HORMIGONES					-						
634	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	1,66	163,18	270,87880	-			-		-	
635	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	16,93	249,88	4.230,46840	-			-		-	
	ACERO ESTRUCTURAL					-						
636	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	1.490,00	1,68	2.503,20000	-			-		-	
637	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	40,00	2,76	110,40000	-			-		-	
638	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	40,00	0,11	4,40000	-			-		-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES					-						
639	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	69,83	10,27	717,15410	-			-		-	
640	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	69,83	26,06	1.819,76980	-			-		-	
641	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	15,00	4,72	70,80000	-			-		-	
642	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u	2,00	75,58	151,16000	-			-		-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	TANQUES DE RESERVA DE AGUA-CISTERNAS 36 M3(REUTILIZACION AGUA LLUVIA)					-						
	PRELIMINARES					-						
643	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1,14		-			-		-	
644	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2		1,46		-			-		-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
645	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-			-		-	
646	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3		4,18		-			-		-	
647	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	m2		11,56		-			-		-	
648	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3		13,72		-			-		-	
649	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3		6,32		-			-		-	
	HORMIGONES					-						
650	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3		163,18		-			-		-	
651	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRANSPORTE	m3		249,88		-			-		-	
	ACERO ESTRUCTURAL					-						
652	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg		1,68		-			-		-	
653	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg		2,76		-			-		-	
654	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg		0,11		-			-		-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES					-						
655	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2		10,27		-			-		-	
656	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2		26,06		-			-		-	
657	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2		4,72		-			-		-	
658	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u		75,58		-			-		-	
	TANQUES DE RESERVA DE AGUA-CISTERNAS 20 M3(REUTILIZACION AGUA LLUVIA)					-						
	PRELIMINARES					-						
659	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1,14		-			-		-	
660	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2		1,46		-			-		-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
661	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-			-		-	
662	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3		4,18		-			-		-	
663	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	m2		11,56		-			-		-	
664	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3		13,72		-			-		-	
665	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3		6,32		-			-		-	
	HORMIGONES					-						
666	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3		163,18		-			-		-	
667	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRANSPORTE	m3		249,88		-			-		-	
	ACERO ESTRUCTURAL					-						
668	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg		1,68		-			-		-	
669	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg		2,76		-			-		-	
670	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg		0,11		-			-		-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES					-						
671	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2		10,27		-			-		-	
672	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2		26,06		-			-		-	
673	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2		4,72		-			-		-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
674	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u		75,58		-			-		-	
	TRAMPA DE GRASAS					-						
675	TRAmPA DE GRASAS 0.60 por 1.40 por H=1.70 (F'C= 210 KG/Cm2), INC. ACCESORIOS	u		161,89		-			-		-	
676	SumINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA H.F. (1.00 por 0.40 por 0.05)110 KG	u		130,84		-			-		-	
677	CANAL. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 , E= 10Cm + 1Ø10mm A 12Cm	m		90,42		-			-		-	
	12.- SISTEMA DE ING. MECANICA (CLIMATIZACIÓN, AIRE PRESURIZADO, ELEVADORES HIDRAULICO, CABINA PINTURA					-						
	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN					-						
678	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 9,500 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CON	u		1.235,36		-			-		-	
679	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 12000 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CON	u		1.318,07		-			-		-	
680	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 18000 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CON	u		1.349,08		-			-		-	
681	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 24,000 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CO	u	2,00	1.504,15	3.008,30000	-			-		-	
682	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 30,000 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CO	u		1.561,01		-			-		-	
683	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 36,000 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CO	u	5,00	1.767,77	8.838,85000	-			-		-	
684	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 1/4 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉRmICO	m	60,00	11,74	704,40000	-			-		-	
685	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 1/2 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉRmICO	m	68,00	12,29	835,72000	-			-		-	
686	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 3/4 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉRmICO	m	8,00	18,29	146,32000	-			-		-	
687	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 5/8 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉRmICO	m	50,00	15,65	782,50000	19,81		19,81	310,03		310,03	39,62%
688	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 3/8 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTOTÉRmICO	m	50,00	11,96	598,00000	18,67		18,67	223,29		223,29	37,34%
689	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 1-1/8 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉRmICO	m	28,00	30,40	851,20000	-			-		-	
690	SOPORTE DE TuBERÍA DE COBRE	u	45,00	14,95	672,75000	10,00		10	149,50		149,50	22,22%
691	TuBERIA PVC DIAmETRO 50 mm	m	260,00	7,31	1.900,60000	-			-		-	
692	TuBERIA PVC DIAmETRO 75 mm	m	20,00	7,42	148,40000	-			-		-	
693	DuCTO DE TOL TOLGALVANIZADO	Kg		5,81		-			-		-	
694	REJILLA EXTRACCIÓN/SumINISTRO TIPO LOuVER CON ALETASFIJAS DE ACERO 12X12,INCLuYE CAJA mETALICA	u		83,69		-			-		-	
695	REJILLA SumINISTRO TIPO LOuVER CON ALETAS mÓVILES Y FIJAS DE ACERO 12X12,INCLuYE CAJA mETALICA	u		95,12		-			-		-	
696	DuCTO FLEXIBLE DIÁmETRO 6"	u		13,60		-			-		-	
697	DuCTO FLEXIBLE DIÁmETRO 4"	u		13,36		-			-		-	
698	VENTILADOR CENTRIFuGO EN LÍNEA PARA TumBADO 2500 CFm @ 0.35 PLG. H2O,1,5 HP	u		1.515,23		-			-		-	
699	VENTILADOR CENTRIFuGO EN LÍNEA PARA TumBADO 1700 CFm @ 0.32 PLG. H2O,1HP	u		1.401,52		-			-		-	
700	VENTILADOR CENTRIFuGO TIPO DOWNBLAST PARA TECHO 500 CFm @ 0.32 PLG. H2O,1,4HP	u		1.378,78		-			-		-	
701	uNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR TIPO VRV, DC INVERTER, 118,000 BTu/H	u	2,00	9.376,49	18.752,98000	-			-		-	
702	uNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR TIPO VRV, DC INVERTER, 140,000 BTu/H	u		10.286,22		-			-		-	
703	uNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR TIPO VRV, DC INVERTER, 158,000 BTu/H	u		12.426,17		-			-		-	
704	uNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR TIPO VRV, DC INVERTER, 188,000 BTu/H	u		11.754,19		-			-		-	
705	CONTROL CENTRALIZADO PARA LAS uNIDADES CONDENSADORAS	u	1,00	2.505,01	2.505,01000	-			-		-	
706	S. I. EXTRACTOR EÓLICO INDuSTRIAL,TuRBINA=112 Cm, DuCTO 61Cm; ALTuRA=85Cm,ASPAS ALumINIO BASE GALVA	u	50,00	326,58	16.329,00000	-			-		-	
	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO					-						
707	COmPRESOR DE AIRE DE PISTÓN 15 HP, CuATRO PISTONES, LuBRICACIÓN CON ACEITE,220 V, TRIFASICO, 60 HZ	m	2,00	5.513,68	11.027,36000	-			-		-	
708	TuBERIA DE COBRE DIAmETRO 1-1/2 PLG. TIPO L, SOLDADA	m	380,00	33,29	12.650,20000	-			-		-	
709	TuBERIA DE COBREDIAmETRO 1/2 PLG. TIPO L, SOLDADA	m	100,00	10,49	1.049,00000	-			-		-	
710	VÁLVuLAS DE BOLA DE 1/2 PLG DE BRONCE	m	26,00	10,80	280,80000	-			-		-	
711	SOPORTE DE TuBERÍA DE COBRE	u	70,00	14,95	1.046,50000	-			-		-	
	CABINA PARA PINTURA					-						

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
712	Sum E INST. CABINA PARA PINTuRA HORNO ANCHO=3.68, ALTO=3.275, LARGO=6.80; ESPESOR PARED 40mm, NOmINAL	u	1,00	38.677,92	38.677,92000	-			-		-	
	ELEVADOR HIDRAULICO					-						
713	ELEVADOR HIDRAuLICO mOVIL TIPO 4 COLumNAS, ST 1075, CAP=16500 LBS, ALT ELEVACION =73", 3 HP/4HP POR C	u	1,00	43.151,04	43.151,04000	-			-		-	
	13.- SISTEMA ELECTRONICO, VOZ, DATOS, INCENDIOS)					-						
	CANALIZACION					-						
714	POZO DE REVISION 60X60X60Cm	u	23,00	158,53	3.646,19000	-			-		-	
715	BANDEJA TIPO ESCALERILLA 10CmX8Cm INCLuYE ACCESORIOS	m	172,00	46,57	8.010,04000	-			-		-	-
716	BANDEJA TIPO ESCALERILLA 25CmX10Cm INCLuYE ACCESORIOS	m	324,00	100,74	32.639,76000	-			-		-	-
717	TuBERIA PVC REFORZADA 4"	m	780,00	20,27	15.810,60000	-			-		-	-
718	TuBERÍA CONDuIT EmT 1/2" DE DIÁmETRO INCLuIDO ACCESORIOS	m	50,00	7,21	360,50000	-			-		-	
719	TuBERÍA CONDuIT EmT 3/4" DE DIÁmETRO INCLuIDO ACCESORIOS	m	50,00	16,51	825,50000	-			-		-	
720	TuBERÍA CONDuIT EmT 1" DE DIÁmETRO INCLuIDO ACCESORIOS	m	120,00	19,19	2.302,80000	440,69		440,69	8.456,85		8.456,85	367,24%
721	POSTE mETALICO	u		923,51		-			-		-	
	SISTEMA DE VOZ Y DATOS					-						
722	PuNTO DE RED DE DATOS CON CABLE FTP 6A	u	197,00	151,66	29.877,02000	20,00		20	3.033,200		3.033,20	10,15%
723	RACK DE SALA DE EQuIPOS TIPO ARmARIO 42 uR	u	1,00	1.817,12	1.817,12000	-			-		-	
724	RACK DE SALA DE COmuNICACIONES TIPO ARmARIO 42 uR	u	1,00	1.617,13	1.617,13000	-			-		-	
725	RACK DE SALA DE COmuNICACIONES TIPO ARmARIO 12 uR	u	3,00	742,45	2.227,35000	-			-		-	
726	PATCH PANEL 24 PuERTOS RJ45 CATEGORIA 6A BLINDADO mODuLAR	u	12,00	213,78	2.565,36000	-			-		-	
727	PATCH COORD CATEGORIA 6A FTP 1 m	u	197,00	20,17	3.973,49000	25,00		25	504,250		504,25	12,69%
728	PATCH COORD CATEGORIA 6A FTP 10 PIES	u	197,00	21,78	4.290,66000	-			-		-	
729	VERIFICACION Y PRuEBAS DE CATEGORIA	u	197,00	18,92	3.727,24000	20,00		20	378,400		378,40	10,15%
730	SWITCH 24 PuERTOS RJ45, CAPA 2, POE, mODuLAR SFP+	u	8,00	1.753,78	14.030,24000	-			-		-	
731	SWITCH 24 PuERTOS RJ45, CAPA 2, mODuLAR SFP+	u	4,00	1.042,64	4.170,56000	-			-		-	
732	SWITCH 24 PuERTOS RJ45, CAPA 3, POE, mODuLAR SFP+	u	1,00	1.410,88	1.410,88000	-			-		-	
733	mODuLO PARA SWITCH CON 2 PuERTOS DE 10 GBPS PARA STACK	u	2,00	2.555,02	5.110,04000	-			-		-	
734	CABLE FLEXIBLE PARA STACK CON 2 CONECTORES DE 10 GBPS	u	8,00	454,27	3.634,16000	-			-		-	
735	mODuLO PARA SWITCH CON 2 PORTICOS DE 10GBPS (SFP+)	u	2,00	2.557,78	5.115,56000	-			-		-	
736	TRANSCEIVER DE 10 GBPS (SFP+)	u	8,00	3.317,76	26.542,08000	-			-		-	
737	PATCH COORD DE FIBRA OPTICA 3mT	u	10,00	62,35	623,50000	-			-		-	
738	ACCES POINT	u	9,00	643,76	5.793,84000	-			-		-	
739	CONTROLADOR DE RED INALAmBRICA	u	2,00	4.213,78	8.427,56000	-			-		-	
740	FIBRA OPTICA muLTImODO 6 HILOS	u	500,00	15,04	7.520,00000	100,00		100	1.504,000		1.504,00	20,00%
741	BANDEJA DE FIBRA OPTICA 12 PuERTOS CON CONECTORES LC	u	1,00	411,79	411,79000	-			-		-	
742	BANDEJA DE FIBRA OPTICA 6 PuERTOS	u	4,00	263,96	1.055,84000	-			-		-	
743	FuSIONADO DE FIBRA OPTICA INCLuYE PIGTAIL Y CERTIFICACION	u	10,00	98,34	983,40000	6,00		6	590,040		590,04	60,00%
744	PuERTA ANTI FuEGO	u	2,00	2.765,74	5.531,48000	-			-		-	
745	uPS 15 KVA	u	1,00	6.207,31	6.207,31000	-			-		-	
746	TABLERO BYPASS PARA DATA CENTER	u	1,00	2.070,65	2.070,65000	-			-		-	
747	TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL PARA DATA CENTER	u	1,00	2.236,86	2.236,86000	-			-		-	
748	BORNERA DE INSTALACION A TIERRA PARA RACK	u	5,00	22,92	114,60000	-			-		-	
749	BARRA PARA CONEXIÓN A TIERRA 8mmX12mm	u	5,00	48,71	243,55000	-			-		-	
750	CABLE THHN No. 6 AWG 19H	u	100,00	17,95	1.795,00000	-	31,50	31,5	-	565,43	565,430	31,50
751	PuNTO DE VIDEO VGA	u	7,00	127,50	892,50000	-			-		-	
752	EQuIPO uTm PARA 100 uSuARIOS INCLuYE SISTEmA DE TELEFONÍA	u	1,00	27.174,40	27.174,40000	-			-		-	
753	TELEFONO IP NORmAL	u	41,00	110,92	4.547,72000	-			-		-	
754	TELEFONO IP GERENCIAL	u	4,00	213,78	855,12000	-			-		-	
755	PROGRAmACION Y PuESTA EN mARCHA DEL SISTEmA	u	1,00	1.266,70	1.266,70000	-			-		-	
	SISTEMA DE SONORIZACION					-						

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
756	CENTRAL DE SONIDO	u	1,00	11.071,93	11.071,93000	-			-		-	
757	PARLANTE DECORATIVO PARA CIELO FALSO CON TRANSFORmADOR DE LINEA	u	24,00	41,20	988,80000	-			-		-	
758	ALTAVOZ EXTERIOR30W (BOCINA)	u	8,00	174,70	1.397,60000	-			-		-	
759	PuNTO DE SONIDO	u	32,00	41,17	1.317,44000	-			-		-	
760	PuNTO DE mICROFONO	u	3,00	52,26	156,78000	-			-		-	
761	CONTROL DE VOLumEN	u	3,00	145,81	437,43000	-			-		-	
762	ALTAVOCES PARA AuDITORIO CON AmPLIFICADOR INCLuIDO 400W	u	4,00	625,13	2.500,52000	-			-		-	
763	PuNTO DE SONIDO PARA AuDITORIO	u	4,00	77,68	310,72000	-			-		-	
764	CENTRAL DE SONIDO PARA AuDITORIO	u	1,00	2.236,64	2.236,64000	-			-		-	
765	PROGRAmACION Y PuESTA EN mARCHA DEL SISTEmA DE SONORIZACION	u	1,00	749,33	749,33000	-			-		-	
	SISTEMA DE INCENDIO					-						
766	ESTACION mANuAL DE ALARmA DE EmERGENCIA	u	24,00	93,78	2.250,72000	-			-		-	
767	LuZ ESTROBOSCOPICA	u	24,00	133,78	3.210,72000	-			-		-	
768	DETECTOR DE HumO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE	u	93,00	91,90	8.546,70000	10,00	1,00	11	919,000	91,90	1.010,90	11,83
769	DETECTOR TERmICO DIRECCIONABLE	u	8,00	91,90	735,20000	-			-		-	
770	PuNTO DE ALARmAS DE INCENDIO	u	153,00	73,78	11.288,34000	-	1,00	1	-	73,78	73,780	0,65%
771	CENTRAL DE INCENDIO DIRECCIONABLE	u	1,00	3.176,64	3.176,64000	-			-		-	
772	mODuLOS DE AISLADORES DE CORTO CIRCuITO	u	5,00	81,40	407,00000	-			-		-	
773	mODuLOS DE mONITOREO DE ZONAS	u	4,00	78,54	314,16000	-			-		-	
774	ANuNCIADOR REmOTO	u	1,00	438,28	438,28000	-			-		-	
775	LAmPARAS DE EmERGENCIA	u	54,00	52,63	2.842,02000	-			-		-	
776	LAmPARAS DE AVISO DE SALIDA	u	16,00	45,78	732,48000	-			-		-	
777	FuENTE REmOTA DE ALARmAS DE INCENDIO	u	1,00	797,28	797,28000	-			-		-	
778	SEÑALETICA INCENDIOS	u	34,00	26,35	895,90000	-			-		-	
779	PROGRAmACION Y PuESTA EN mARCHA EL SISTEmA DE INCENDIO	u	1,00	1.045,26	1.045,26000	-			-		-	
	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS					-						
780	CERRADuRA ELECTROmAGNETICA 600LB	u	20,00	139,78	2.795,60000	-	2,00	2	-	279,56	279,560	10,00
781	PuLSANTE DE SALIDA PARA CONTROL DE ACCESOS	u	11,00	29,53	324,83000	-			-		-	
782	LECTOR DE PROXImIDAD CON TECLADO	u	17,00	252,04	4.284,68000	-			-		-	
783	CONTACTO mAGNETICO	u		15,29		-			-		-	
784	CONTROLADOR DE ACCESOS - CONTROL DE COmuNICACIONES	u	5,00	649,13	3.245,65000	-			-		-	
785	TARJETAS PARA CONTROL DE ACCESOS	u	36,00	18,06	650,16000	-			-		-	
786	PuNTO PARA ELEmENTOS DE CONTROL DE ACCESOS	u	48,00	47,14	2.262,72000	-			-		-	
787	CABLE EKKX 10 PARES	u	500,00	17,21	8.605,00000	-			-		-	
788	DETECTORES INFRARROJOS	u	35,00	23,94	837,90000	-			-		-	
789	SIRENAS Y ALARmAS DE SEGuRIDAD	u	3,00	52,87	158,61000	-			-		-	
790	PANEL CONTROLADOR DE ALARmAS	u	2,00	187,58	375,16000	-			-		-	
791	PuNTOS DEL SISTEmA DE SEGuRIDAD	u	38,00	75,29	2.861,02000	-			-		-	
792	SEÑALETICA DE ACCESOS	u	4,00	26,35	105,40000	-			-		-	
793	BARRERAS	u		1.929,64		-			-		-	
794	LOOPS	u		134,81		-			-		-	
795	LECTOR BIOmETRICO	u	3,00	207,83	623,49000	-			-		-	
796	PROGRAmACION Y PuESTA EN mARCHA EL SISTEmA DE CONTROL DE ACCESOS	u	1,00	690,14	690,14000	-			-		-	
	SISTEMA DE CCTV					-						
797	VIDEOGRABADOR DIGITAL NVR	u	1,00	2.926,25	2.926,25000	-			-		-	
798	mONITOR A COLOR LED FHD 32"	u	1,00	1.601,28	1.601,28000	-			-		-	
799	CAmARA IP DE CCTV FIJA EN DOmO	u	21,00	218,46	4.587,65000	-			-		-	
800	CAmARA IP DE CCTV TIPO BALA	u	2,00	206,92	413,84000	-			-		-	
801	CAmARA IP DE CCTV PTZ EN DOmO	u	9,00	728,00	6.552,00000	-			-		-	
802	CAmARAIP 360 (FISHERE)	u	10,00	1.039,01	10.390,10000	-			-		-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
803	CONTROLADOR PARA CAmARA mOVIL CON TECLADO Y JOYSTICK	u	1,00	752,94	752,94000	-			-		-	
804	PROGRAMACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS, TASA DE GRABACION, IDENTIFICACION DE AREAS	u	1,00	948,85	948,85000	-			-		-	
	SISTEMA DE PANTALLAS INFORMATIVAS					-						
805	SERVIDOR DEL SISTEmA DE INFORmACION Y TV IP	u	1,00	10.774,19	10.774,19000	-			-		-	
806	CONVERTIDOR NAVEGADOR INTERNET TV	u	1,00	2.084,90	2.084,90000	5,00		5	10.424,500		10.424,50	500,00%
807	TELEVISOR LCD 32"	u	7,00	1.601,28	11.208,96000	-			-		-	
808	PROGRAmACION Y PuESTA EN mARCHA EL SISTEmA DE PANTALLAS INFORmATIVAS	u	1,00	867,70	867,70000	-			-		-	
	14.- CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA Y GARITA					-						
	BATERIA SANITARIA GENERAL JUNTO A ZONA RECREACIONAL					-						
	PRELIMINARES					-						
809	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1,14		-			-		-	
810	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2		1,46		-			-		-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
811	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3		4,18		-			-		-	
812	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-			-		-	
813	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3		17,33		-			-		-	
814	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3		13,72		-			-		-	
815	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3		2,82		-			-		-	
	HORMIGONES					-						
816	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3		163,18		-			-		-	
817	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF´C = 280KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3		225,97		-			-		-	
818	HORmIGON PREmEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3		283,42		-			-		-	
819	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3		289,16		-			-		-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
820	HORmIGON PREmEZCLADO LOSA/ VIGAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3		193,75		-			-		-	
821	BLOQuE ALIVIANADO EN LOSA.E=15X20X40 Cm	u		0,61		-			-		-	
	ACERO ESTRUCTURAL					-						
822	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg		1,68		-			-		-	
823	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2		4,84		-			-		-	
	CONTRAPISOS					-						
824	CONTRAPISO HORm.S. PREmEZ. F´C=280KG/Cm2 E= 4 PuLG. (SIN BASE)	m2		21,50		-			-		-	
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS					-						
825	mASILLADO DE PISOS, ENDuRECEDOR DE CuARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5mm)	m2		5,62		-			-		-	
826	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2		26,06		-			-		-	
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS					-						
827	mASILLADO E ImPERmEABILIZADO DE PISOS-LOSAS, mORTERO CEmENTO-ARENA 1:3 +(PEGANTE + ImPERm.) LOSAS EXT	m2		10,40		-			-		-	
828	ImPERmEABILIZACION LOSA DE CuBIERTA ImPRImANTE ASFALTICO SOLuBLE AL AGuA	m2		2,84		-			-		-	
829	ImPERmEABILIZACIONLOSA DE CuBIERTA LAmINAS ASFALTICAS	m2		13,85		-			-		-	
	BAJANTES AGUA LLUVIA					-						
830	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=110mm)	m		8,14		-			-		-	
831	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u		90,42		-			-		-	
832	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m		20,59		-			-		-	
	MAMPOSTERÍA					-						
833	RIOSTRAS DE H.S. F´C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3		258,83		-			-		-	
834	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=10 Cm	m2		17,71		-			-		-	
835	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2		22,90		-			-		-	
836	PICADO Y RESANADO DE mAmPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m		4,63		-			-		-	
837	mESON H.A. F'C=180 KG/Cm2 E=7 Cm HIERRO (LAVAmANOS+mESON)	m		34,03		-			-		-	
838	REVESTImIENTO mESON GRANITO	m		180,61		-			-		-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES					-						
839	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2		10,27		-			-		-	
840	ENLuCIDO VERTICAL PALETEADO mORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2		8,78		-			-		-	
841	ENLuCIDO HORIZONTAL PALETEADO mORTERO 1:3	m2		12,30		-			-		-	
842	EmPASTE VERTICAL Y HORIZONTAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2		6,04		-			-		-	
843	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2		4,72		-			-		-	
	CARPINTERIA METALICA					-						
844	PuERTA mETÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2mm , INC. CERRADuRA, BISAGRAS Y PINTuRA	m2		142,73		-			-		-	
845	PuERTAS mODuLARES, TAmBORADAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, INCLuYE ESTRuCTuRA Y HER	m2		172,30		-			-		-	
846	DIVISIONES ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, TAmBORADAS INCLuYE ESTRuCTuRA, EmPOTRAmIENTO PISO PARED (	m2		161,18		-			-		-	
	VENTANERIA-PUERTAS ALUMINIO VIDRIO					-						
847	VENTANA CORREDIZA ALumINIO SERIE 200-INCL. VIDRIO LAmINADO 6mm	m2		183,67		-			-		-	
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS					-						
848	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF DISCAPACITADOS PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u		297,96		-			-		-	
849	PASAmANOS PARA DISCAPACITADOS TuBO DIAm 32mm E=1.5mm EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO SATINADO (Juego)	u		281,03		-			-		-	
850	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u		297,96		-			-		-	
851	uRINARIO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF	u		261,01		-			-		-	
852	LAVABO BLANCO, LLAVE SENSOR mOVImIENTO (CON ACCESORIOS)	u		281,39		-			-		-	
853	DISPENSOR DE PAPEL HIGIENICO DIAm=275mm, ROLLO 70mm, ABATIBLE,ACERO INOX E=8mm, AISI 304. ACABADO S	u		110,71		-			-		-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
854	DISPENSOR DE PAPEL TOALLA 400-600 uNIDADES, 330X273X130mm, ACERO INOX E=8mm AISI 304, ACABADO SATINAD	u		113,00		-			-		-	
855	DISPENSADOR DE JABON LIQuIDO ACERO INOX AISI304, ACABADO SATINADO	u		91,28		-			-		-	
856	ESPEJO DE VIDRIO FLOTADO 4mm- mARCO DE ALumINIO	m2		42,86		-			-		-	
857	SECADOR DE mANOS ACCIONAmIENTO AuTOmATICO 260X302X150mm, ACERO INOX. 304, LAmINA1.5mm 110V-60HZ	u		238,44		-			-		-	
858	BASuRERO CILINDRICO A PEDAL D=250mm H=385 PARA BAÑO ACERO INOX. 304	u		66,60		-			-		-	
859	DuCHAS CON mEZCLADORA (CON ACCESORIOS)	u		135,94		-			-		-	
	GARITAS DE CONTROL					-						
	PRELIMINARES					-						
860	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1,14		-			-		-	
861	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	34,81	1,46	50,82260	2,07		2,07	3,020		3,020	5,94%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
862	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	37,47	4,18	156,62460	-			-		-	
863	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-			-		-	
864	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	9,26	17,33	160,47580	-			-		-	
865	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	23,08	13,72	316,65760	-			-		-	
866	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	37,47	2,82	105,66540	-			-		-	
	HORMIGONES					-						
867	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	1,00	163,18	163,18000	-			-		-	
868	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF´C = 280KG./Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	2,00	225,97	451,94000	0,40		0,4	90,390		90,390	20,00%
869	HORmIGON PREmEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	1,13	283,42	320,26460	-			-		-	
870	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	0,30	289,16	86,74800	-			-		-	
871	HORmIGON PREmEZCLADO LOSA/ VIGAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	5,55	193,75	1.074,62000	-			-		-	
872	BLOQuE ALIVIANADO EN LOSA.E=15X20X40 Cm	u		0,61		-			-		-	
	ACERO ESTRUCTURAL					-						
873	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	836,00	1,68	1.404,48000	-			-		-	
874	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2	77,00	4,84	372,68000	-			-		-	
	CONTRAPISOS					-						
875	CONTRAPISO HORm.S. PREmEZ. F´C=280KG/Cm2 E= 4 PuLG. (SIN BASE)	m2	33,50	21,50	720,25000	-			-		-	
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS					-						
876	mASILLADO DE PISOS, ENDuRECEDOR DE CuARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5mm)	m2		5,62		-			-		-	
877	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	38,00	26,06	990,28000	-			-		-	
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS					-						
878	mASILLADO E ImPERmEABILIZADO DE PISOS-LOSAS, mORTERO CEmENTO-ARENA 1:3 +(PEGANTE + ImPERm.) LOSAS EXT	m2	41,10	10,40	427,44000	-			-		-	
879	ImPERmEABILIZACION LOSA DE CuBIERTA ImPRImANTE ASFALTICO SOLuBLE AL AGuA	m2	41,10	2,84	116,72400	2,43		2,43	6,900		6,90	5,91%
880	ImPERmEABILIZACIONLOSA DE CuBIERTA LAmINAS ASFALTICAS	m2	41,10	13,85	569,23500	2,43		2,43	33,660		33,66	5,91%
	BAJANTES AGUA LLUVIA					-						
881	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=110mm)	m	10,00	8,14	81,40000	228,95		228,95	1.863,65		1.863,65	2289,50%
882	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	3,00	90,42	271,26000	-			-		-	
883	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m	30,00	20,59	617,70000	-			-		-	
	MAMPOSTERÍA					-						
884	RIOSTRAS DE H.S. F'C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3	0,61	258,83	157,88630	-			-		-	
885	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=10 Cm	m2		17,71		-			-		-	
886	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2	72,50	22,90	1.660,25000	-			-		-	
887	PICADO Y RESANADO DE mAmPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m	52,36	4,63	242,42680	-			-		-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES					-						
888	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	135,50	10,27	1.391,58500	-			-		-	
889	ENLuCIDO VERTICAL PALETEADO mORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2	73,00	8,78	640,94000	-			-		-	
890	ENLuCIDO HORIZONTAL PALETEADO mORTERO 1:3	m2		12,30		-			-		-	
891	EmPASTE VERTICAL Y HORIZONTAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	208,50	6,04	1.259,34000	-			-		-	
892	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	399,10	4,72	1.883,75200	-			-		-	
	CARPINTERIA METALICA					-						
893	PuERTA mETÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2mm , INC. CERRADuRA, BISAGRAS Y PINTuRA	m2	14,20	142,73	2.026,76600	-			-		-	
894	PuERTA TAmBORADA 70Cm, ESQuELETO CANELO, mDF 9mm -LACADA-DISEÑO CORPORATIVO	u	4,41	198,79	876,66390	-			-		-	
	VENTANERIA-PUERTAS ALUMINIO VIDRIO					-						
895	VENTANA CORREDIZA ALumINIO SERIE 200-INCL. VIDRIO LAmINADO 6mm	m2	14,50	183,67	2.663,21500	-			-		-	
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS					-						
896	INODORO BLANCO (CON ACCESORIOS)	u	3,00	114,30	342,90000	-			-		-	
897	LAVABO BLANCO (CON ACCESORIOS)	u	3,00	115,74	347,22000	-			-		-	
898	DuCHAS (CON ACCESORIOS)	u		50,24		-			-		-	
	15.- CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y PORTONES					-						
	PRELIMINARES					-						
899	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	1.765,78	1,14	2.012,98920	-	2.245,54	2245,54	-	2.559,91	2.559,910	127,17
900	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	882,89	1,46	1.289,01940	-			-		-	-
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
901	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	671,86	4,18	2.808,37480	-			-		-	
902	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	30,00	17,93	537,90000	-			-		-	
903	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	404,00	13,72	5.542,88000	-	111,79	111,79	-	1.533,76	1.533,760	27,67
904	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	671,86	2,82	1.894,64520	-			-		-	
	HORMIGONES					-						
905	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	9,34	163,18	1.524,10120	-			-		-	
906	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF´C = 280KG./Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	15,35	225,97	3.468,63950	0,41		0,41	92,650		92,650	2,67
907	HORmIGON PREmEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	30,84	283,42	8.740,67280	-			-		-	-
908	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	89,64	289,16	25.920,30240	-			-		-	-
909	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F´C=180 KG/Cm2-50por cientoP)Clm	m3	43,60	169,86	7.405,89600	46,81	6,24	53,05	7.951,150	1.059,93	9.011,080	121,67
	ACERO ESTRUCTURAL					-						
910	ACERO DE REFuERZO FY= 4200 Kg/Cm2	Kg	5.740,62	1,68	9.644,24160	-			-		-	-
911	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	4.678,00	2,76	12.911,28000	-			-		-	
912	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	4.678,00	0,11	514,58000	-			-		-	
	MAMPOSTERÍA					-						
913	RIOSTRAS DE H.S. F´C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3	12,50	258,83	3.235,37500	-			-		-	
914	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2	680,00	22,90	15.572,00000	228,88		228,88	5.241,350		5.241,350	33,66
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES					-						
915	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	2.110,10	10,27	21.670,72700	-			-		-	-
916	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	2.110,10	5,26	11.099,12600	-			-		-	
917	TEXTuRADO GRAFIATO GRuESO DE PAREDES, COLOR INSTITuCIONAL GADPPZ	m2	1.112,60	6,04	6.720,10400	-			-		-	
918	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	1.995,00	4,72	9.416,40000	53,27		53,2712	251,440		251,44	2,67%
	CARPINTERIA METALICA					-						
919	CERRAmIENTO TuBO ISO2 H.G. 2"-mALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6mm, INC. PINTuRA A COmPRESOR	m2	1.054,50	36,37	38.352,16500	-			-		-	
920	CERRAMIENTO VERJA DE TUBO AGUA ISO2 HG 2" Y TUBO RECT 80X40X2, INC. PINTURA COMPRESOR	m2	400,00	70,48	28.192,00000	-			-		-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
921	PORTON CORREDIZO TuBOISO 2 2", mARCO TuBO RECT 50X150X2mm, INC. PINTuRA COmPRESOR	m2	138,40	68,64	9.499,77600	-			-		-	
					8.364.474,94	-						
	NAVE DE DESECHOS					-						
	1.- VIAS Y PARQUEADEROS					-						
	CONSOLIDACION DE PLATAFORMAS					-						
15	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	m3	537,97	2,92	1570,87	-			-		-	-
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREODE MEJORAMIENTO	m3-km	9.683,46	0,28	2711,37	-			-		-	-
	2.- ESTABILIZACIÓN TALUDES					-						
	SISTEMA TIERRA ARMADA					-						
34	GEOTEXTIL TEJIDO- 2400 T PARA MURO DE CONTENCION TIERRA ARMADA	m2	320,00	3,06	979,20	-			-		-	-
35	GEOMALLA BX-1100 TENSAR	m2	64,40	3,19	205,44	-			-		-	-
	16. NAVE DE DESECHOS					-						
	REVESTIMIENTO DE TUMBADOS					-						
181	CIELO RASO FALSO TIPO GYPSUM PARA HUMEDAD-1/2"-SIN ESTUCAR	m2	115,00	20,04	2304,60	-			-		-	-
	PRELIMINARES					-						
206	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQUEADERO,Y PLATAFORMAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	347,75	1,46	507,72	-			-		-	-
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
211	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A MAQUINA)	m3	103,04	4,18	430,71	-			-		-	-
213	SUB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COMPACTADO (MAQUINA), CAPAS 20CM	m3	103,04	17,33	1785,68	-			-		-	-
214	RELLENO COMPACTADO A MAQUINA CON LASTRE TNM=8" (EN CAPAS DE 20 CM)	m3	140,54	13,72	1928,21	-			-		-	-
215	DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS	m3	133,95	2,82	377,74	-			-		-	-
	HORMIGONES					-						
216	HORMIGON PREMEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/CM2 INC. BOMBEO Y TRANSPORTE	m3	3,00	163,18	489,54	2,84		2,84	463,430		463,43	94,67%
217	HORMIGÓN PREMEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CIMENTACIONF'C = 280KG./CM2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	m3	12,00	225,97	2711,64	-			-		-	-
218	HORMIGON PREMEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/CM2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	12,78	283,42	3622,11	0,40		0,4	113,370		113,37	3,13%
219	HORMIGON PREMEZCLADO COLUMNAS F'C=280 KG/CM2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	m3	4,55	289,16	1315,68	-			-		-	-
220	HORMIGÓN CICLÓPEO (50POR CIENTO H.S. F'C=180 KG/CM2-50POR CIENTOP)CIM	m3	17,04	169,86	2894,41	-			-		-	-
	ACERO ESTRUCTURAL					-						
221	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	Kg	4596,88	1,68	7722,76	216,31		216,31	363,400		363,40	4,71%
222	PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A (36, 572, 325,193,108) (PROY. MONTAJE GRUA)	Kg	18285	2,76	50466,60	2.193,06		2193,06	6.052,850		6.052,85	11,99%
223	TRATAMIENTO PINTURA ESTRUCTURA ACERO A36 (FONDO+PINTURA ANTICORROSIVA), A COMPRESOR	Kg	18285	0,11	2011,35	2.193,06		2193,06	241,240		241,24	11,99%
224	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6MM	m2	382,525	4,84	1851,42	-			-		-	-
	CONTRAPISOS					-						
225	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3 (CONTRAPISO E=20CM, COMPAC. 100POR CIENTO P.E.M.)	m3	62,46	10,78	673,32	-			-		-	-
226	MATERIAL DE BASE CLASE 2 (CONTRAPISO E=15CM, COMPAC. 100POR CIENTO P.E.M.)	m3	46,85	24,55	1150,17	-			-		-	-
227	CONTRAPISO HORM.S. PREMEZ. F'C=280KG/CM2 E= 4 PULG. (SIN BASE)	m2	347,75	21,5	7476,63	-			-		-	-
228	JUNTA ASERRADA DILATACION PISO (INC. CORDON, Y SELLO)	m	90,00	2,59	233,10	-			-		-	-
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS					-						
229	MASILLADO DE PISOS, ENDURECEDOR DE CUARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5MM)	m2	347,75	5,62	1954,36	-			-		-	-
230	PINTURA EPOXICA PISO INDUSTRIAL 3MM (2 COMPONENTES)	m2	310,00	34,78	10781,80	-			-		-	-
232	CERAMICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL Y EMP	m2	94,00	26,06	2449,64	-			-		-	-
	CUBIERTA					-						
235	CUBIERTA GALVALUMEN E=0.45MM, RECUBRIENTO PINTURA POLIESTER ASTM-653A (COLOR INSTITUCIONAL), INC, PER	m2	486,35	13,92	6769,99	-			-		-	-
237	CUMBRERO GALVALUMEN E=0.40 MM A=0.50 M, INC. ACCES. INSTALACION	m	35,50	8,38	297,49	-			-		-	-
238	CANAL TOL GALV E= 0.70MM, H=30CM, A=40CM DESARR. 122 CM, INC. GANCHOS	m	71,00	21,49	1525,79	-			-		-	-
	BAJANTES AGUA LLUVIA					-						
239	BAJANTES DE AGUA LLUVIA (PVC DIAM. INT=160MM)	m	70,00	9,91	693,70	-			-		-	-
240	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/CM*0.60 POR 0.60 CON TAPA E= 7CM + 1Ø10MM A 12CM	u	10,00	90,42	904,20	-			-		-	-
242	SUMIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO DIAM. INT.= 200A 160MM PVC Y/O POLIETILENO	u	1,00	20,71	20,71	-			-		-	-
	MAMPOSTERÍA					-						

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
243	RIOSTRAS DE H.S. F'C=240KG/CM2 INC. ENCOFRADO	m3	8,48	258,83	2194,88	-			-		-	-
244	MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO VIBRADO 4MPAE=10 CM	m2	20,00	17,71	354,20	-			-		-	-
245	MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO VIBRADO 4MPAE=15 CM	m2	490,00	22,90	11221,00	-			-		-	-
246	PICADO Y RESANADO DE MAMPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m	120,00	4,63	555,60	-			-		-	-
247	MESON H.A. F'C=180 KG/CM2 E=7 CM HIERRO (LAVAMANOS+MESON)	m	3,50	34,03	119,11	-			-		-	-
248	REVESTIMIENTO MESON GRANITO	m	3,50	180,61	632,14	-	1,45	1,45	-	261,88	261,880	0,41
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES					-						
249	ENLUCIDO CON IMPERMEABILIZANTE MORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	392,72	10,27	4033,23	-			-		-	-
250	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO MORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2	450,00	8,78	3951,00	188,03		188,03	1.650,90		1.650,90	41,78%
251	ENLUCIDO CON MALLA+ IMPERMEABILIZANTE, MORTERO 1:3	m2	25,00	17,03	425,75	-			-		-	-
252	EMPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	392,72	5,26	2065,71	-			-		-	-
253	EMPASTE VERTICAL (ACRILICO INTERIOR) INC. FILOS	m2	475,00	4,40	2090,00	175,31		175,31	771,360		771,36	36,91%
254	PINTURA DE CAUCHO SATINADO COLOR (2 MANOS) INTER. <GUIA IMAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	475,00	4,72	2242,00	227,93		227,93	1.075,830		1.075,83	47,99%
255	PINTURA DE CAUCHO SATINADA COLOR(2 MANOS) EXTERIOR (CANASTILLA) <GUIA IMAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	392,72	5,72	2246,36	-			-		-	-
	CARPINTERIA METALICA					-						
257	VENTANA FIJA TUBO RECT 40X80X2-MALLA ELECTROSOLDADA 10X10X5MM, INC PINTURA ANTICORROSIVA, A COMPRESOR	m2	39,06	41,3	1613,18	-			-		-	-
258	PORTON TIPO CORREDIZO RETRACTIL TUBO RECT 40X80X2MM-TOOL GALV. 0.6MM	m2	4,40	61,25	269,50	-			-		-	-
259	PUERTA METÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2MM , INC. CERRADURA, BISAGRAS Y PINTURA	m2	40,000	142,730	5709,20	-			-		-	-
260	PUERTAS MODULARES, TAMBORADAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE E=1MM AISI 304, INCLUYE ESTRUCTURA Y HER	m2	1,00	172,30	172,30	-			-		-	-
	REVESTIMIENTO DE TUMBADOS					-						
264	CIELO RASO FALSO - FIBRA MINERAL Y RECUB LÁMINA ALUMINIO 0.60X0.60 BLANCO, TIPO AMSTRONG O SIMILAR	m2	324,75	21,59	7011,35	-			-		-	-
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS					-						
268	INODORO CON FLUXOMETRO LATON CROMADA 1.0 GPF PRIMERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u	1,00	297,96	297,96	-			-		-	-
270	LAVABO BLANCO, LLAVE SENSOR MOVIMIENTO (CON ACCESORIOS)	u	2,00	281,39	562,78	-			-		-	-
271	DISPENSOR DE PAPEL HIGIENICO DIAM=275MM, ROLLO 70MM, ABATIBLE,ACERO INOX E=8MM, AISI 304. ACABADO S	u	1,00	110,71	110,71	-			-		-	-
272	DISPENSOR DE PAPEL TOALLA 400-600 UNIDADES, 330X273X130MM, ACERO INOX E=8MM AISI 304, ACABADO SATINAD	u	1,00	113,00	113,00	-			-		-	-
273	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOX AISI304, ACABADO SATINADO	u	1,00	91,28	91,28	-			-		-	-
274	ESPEJO DE VIDRIO FLOTADO 4MM- MARCO DE ALUMINIO	m2	2,70	42,86	115,72	-			-		-	-
276	BASURERO CILINDRICO A PEDAL D=250MM H=385 PARA BAÑO ACERO INOX. 304	u	1,00	66,60	66,60	-			-		-	-
277	DUCHAS CON MEZCLADORA (CON ACCESORIOS)	u	1,00	135,94	135,94	-			-		-	-
	10.- SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACIÓN					-						
	POZOS DE REVISION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS					-						
305	CAJA REVISION MEDIA TENSION 60X60X75,ACERA, T/HA	u	1,00	179,17	179,17	-			-		-	-
306	PUESTA A TIERRA SIMPLE EN POZO ELECTRICO CON SUELDA EXOTERMICA	u	1,0	164,5	164,46	-			-		-	-
	INSTALACION LUMINARIAS					-						
362	CAJETINES METALICOS OCTOGONALES MEDIANOS CON TAPA	u	30,00	5,44	163,20	41,00		41	223,040		223,04	136,67%
	INSTALACION LUMINARIAS					-						
427	TUBERIA EMT 1/2 PULGADA	m	70,00	3,34	233,80	68,97		68,97	230,360		230,36	98,53%
428	UNION EMT 1/2 PULGADA	u	40,00	1,18	47,20	-			-		-	-
429	CONECTOR EMT 1/2 PULGADA	u	60,00	0,56	33,60	32,00		32	17,920		17,92	53,33%
430	FIJACION DE TUBOS EN LOZA CON GRAPA METALICA EMT 1/2 PULGADA	u	30,00	4,87	146,10	31,00		31	150,970		150,97	103,33%
431	CAJETINES METALICOS RECTANGULARES PROFUNDOS	u	10,00	1,57	15,70	-			-		-	-
432	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AMARILLO (INC. TAYPE)	m	70,00	2,28	159,60	52,51		52,51	119,720		119,72	75,01%
433	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	70,00	1,43	100,10	38,32		38,32	54,800		54,80	54,75%
434	LUMINARIA LED3X18W/120 VOLTIOS	u	30,00	60,59	1817,70	-			-		-	-
437	INTERRUPTOR SIMPLE CON TAPA	u	7,00	5,47	38,29	-						
	TOMACORRIENTES GENERALES					-						
438	TUBERIA EMT 1/2 PULGADA	m	50,00	3,34	167,00	-			-		-	-

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
439	UNION EMT 1/2 PULGADA	u	15,00	1,18	17,70	2,00		2	2,360		2,36	13,33%
440	CONECTOR EMT 1/2 PULGADA	u	10,00	0,56	5,60	11,00		11	6,160		6,16	110,00%
441	FIJACION DE TUBOS EN LOZA CON GRAPA METALICA EMT 1/2 PULGADA	u	10,00	4,87	48,70	15,00		15	73,050		73,05	150,00%
442	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZUL (INC. TAYPE)	m	50,00	1,43	71,50	6,03		6,03	8,620		8,62	12,06%
443	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	50,00	1,43	71,50	6,03		6,03	8,620		8,62	12,06%
444	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	50,00	1,03	51,50	6,03		6,03	6,210		6,21	12,06%
445	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	13,00	7,45	96,85	-			-		-	-
446	CAJETINES METALICOS RECTANGULARES PROFUNDOS	u	13,00	1,57	20,41	-			-		-	-
	ALIMENTADORES Y SUBTABLEROS CT-1					-						
	ALIMENTADOR TPD-STE-ANGAR-A4					-						
509	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 CU TW (INC. TAYPE)	m	20,00	14,51	290,20	-			-		-	-
510	SUBTABLERO STE GOL 12F-2F-12 ESPACIOS ANGAR 4	u	1,00	173,41	173,41	-			-		-	-
	11.- SISTEMA HIDRAULICO SANITARIO Y CONTRAINCENDIOS					-						
	SITEMA DE AGUA POTABLE A PRESIÓN CONSTANTE					-						
	TUBERIA PVC AGUA POTABLE					-						
533	TUBERIA PVC ROSCABLE D=1/2" EN EDIFICACION+PRUEBA	m	12,00	5,86	70,32	-			-		-	-
535	TUBERIA PVC ROSCABLE D=1" EN EDIFICACION+PRUEBA	m	45,00	9,78	440,10	-			-		-	-
	ACCESORIOS INST. TUB PVC ROSCABLE AGUA POTABLE					-						
541	ANCLAJES METALICOS PLATINA 2 POR 1/2" (ABRAZADERAS), EN LOSA Y PARED	u	10,00	14,11	141,10	-			-		-	-
542	S.I. PUNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGUA POR PUNTO	u	2,00	13,67	27,34	-			-		-	-
	EXTINTORES					-						
565	EXTINTOR POS CAPACIDAD 10 LBS. CON CAJA METALICA	u	1,00	99,84	99,84	-			-		-	-
568	EXTINTOR CO2 CAPACIDAD 20 LBS. CON CAJA METALICA	u	1,00	313,27	313,27	-			-		-	-
	SISTEMA SANITARIO INTERNO					-						
	PRELIMINARES Y MOV. TIERRAS					-						
601	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	2,00	17,93	35,86	-			-		-	-
602	RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL (CAPAS 20 CM)	m3	3,00	6,32	18,96	-			-		-	-
	INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE					-						
603	PUNTO DE DESAGUE EN PVC 50 MM	u	3,00	28,80	86,40	-			-		-	-
604	PUNTO DE DESAGUE EN PVC 110 MM	u	1,00	34,43	34,43	-			-		-	-
605	TUBERÍA PVC 50 MM DE DIÁMETRO (MAT/TRASP/INST)	m	12,0	5,1	61,68	-			-		-	-
606	TUBERÍA PVC 110 MM DE DIÁMETRO (MAT/TRASP/INST)	m	5,00	8,02	40,10	-			-		-	-
607	TUBERÍA PVC 160 MM DE DIÁMETRO (MAT/TRASP/INST)	m	18,00	14,52	261,36	-			-		-	-
608	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/CM²0.60 POR 0.60 CON TAPA E= 7CM + 1Ø10MM A 12CM	u	1,00	90,42	90,42	-			-		-	-
	INSTALACION TUBERIA PVC DEVENTILACIÓN					-						
609	TUBERIA PVC D=75 MM VENTILACIÓN	m	6,00	4,27	25,62	-			-		-	-
610	PUNTO DE VENTILACIÓN PVC 75 MM POR PUNTO	u	1,00	15,61	15,61	-			-		-	-
	13.- SISTEMA ELECTRONICO, VOZ, DATOS, INCENDIOS)					-						
	CANALIZACION					-						
714	POZO DE REVISION 60X60X60CM	u	1,0	158,5	158,53	-			-		-	-
715	BANDEJA TIPO ESCALERILLA 10CMX8CM INCLUYE ACCESORIOS	m	25,0	46,6	1164,25	-			-		-	-
717	TUBERIA PVC REFORZADA 4"	m	15,00	20,27	304,05	-			-		-	-
719	TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4" DE DIÁMETRO INCLUIDO ACCESORIOS	m	40,00	16,51	660,40	-			-		-	-
	SISTEMA DE INCENDIO					-						
766	ESTACION MANUAL DE ALARMA DE EMERGENCIA	u	1,00	93,78	93,78	-			-		-	-
767	LUZ ESTROBOSCOPICA	u	1,00	133,78	133,78	-			-		-	-
768	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE	u	3,00	91,90	275,70	-			-		-	-
769	DETECTOR TERMICO DIRECCIONABLE	u	3,00	91,90	275,70	-			-		-	-
770	PUNTO DE ALARMAS DE INCENDIO	u	8,00	73,78	590,24	-			-		-	-
776	LAMPARAS DE AVISO DE SALIDA	u	1,00	45,78	45,78	-			-		-	-
778	SEÑALETICA INCENDIOS	u	1,00	26,35	26,35	-			-		-	-
	NAVE DE RESGUARDO					-						
	ACERO ESTRUCTURAL					-						
1	PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A (35, 572, 325,193,108) (PROY. MONTAJE GRUA)	Kg	94474,86	2,76	260750,61	-			-		-	-
2	TRATAMIENTO PINTURA ESTRUCTURA ACERO A36 (FONDO+PINTURA ANTICORROSIVA), A COMPRESOR	Kg	94474,86	0,11	10392,23	-			-		-	-
	CONTRAPISOS					-						
3	JUNTA ASERRADA DILATACION PISO (INC. CORDON, Y SELLO)	m	857,00	2,59	2219,63	-			-		-	-
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS					-						
4	MASILLADO DE PISOS, ENDURECEDOR DE CUARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5MM)	m2	1445,85	5,62	8125,68	-			-		-	-
	CUBIERTA					-						
5	CUBIERTA GALVALUMEN E=0.45MM, RECUBRIENTO PINTURA POLIESTER ASTM-653A (COLOR INSTITUCIONAL), INC, PER	m2	1660,00	13,92	23107,20	21,75		21,75	302,76		302,76	1,31%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
6	CUBIERTA POLICARBONATO E=0.80 MM, COLOR BRONCE O SIMILAR, INC. ACCESORIOS INSTALCION	m2	190,00	14,34	2724,60	-			-		-	-
7	CUMBRERO GALVALUMEN E=0.40 MM A=0.50 M, INC. ACCES. INSTALACION	m	43,25	8,38	362,44	0,25		0,25	2,10		2,10	0,58%
8	CANAL TOL GALV E= 0.70MM, H=30CM, A=40CM DESARR. 122 CM, INC. GANCHOS	m	86,50	21,49	1858,89	0,50		0,5	10,75		10,75	0,58%
	CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS					-						
RN-1	GROUTING DE NIVELACIÓN	M3	3,35	$ 1.634,03	$ 5.474,00	0,50		0,5	817,02		817,02	14,93%
RN-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE ASTM 193 B7	U	1416,00	$ 49,44	$ 70.007,04	388,00		388	19.182,72		19.182,72	27,40%
RN-3	BORDILLO DE H.S 180 KG/CM2 TIPO CUNETA	ML	2261,84	$ 23,58	$ 53.334,19	-			-		-	-
RN-4	ACERAS DE H.S. F'C=180KG/CM2 E=7CM. ESCOBILLADA.	M2	3878,20	$ 18,85	$ 73.104,07	-			-		-	-
RN-5	ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACIÓN	L	19492,62	$ 0,85	$ 16.568,73	-			-		-	-
RN-6	CAPA DE RODADURA HORMIGÓN ASFÁLTICO MEZCLADO EN PLANTA, E=3".	M2	12995,08	$ 12,53	$ 162.828,35	-			-		-	-
RN-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO DE 500KG EN PUERTA DE INGRESO DE CERRAMIENTO	U	4,00	$ 1.081,08	$ 4.324,32	-			-		-	-
RN-8	PINTURA DE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN EN PAROUEADEROS Y PASOS PEATONALES	ML	669,42	$ 0,62	$ 415,04	-			-		-	-
RN-9	TOPES PARA ESTACIONAMIENTO H.S = 180 KG/CM2 . INCLUYE PINTURA REFLECTIVA	U	88,00	$ 12,91	$ 1.136,08	-			-		-	-
RN-10	JARDINERAS DE H.S= 180KG/CM2	ML	26,00	$ 15,02	$ 390,52	-			-		-	-
RN-11	PLANTAS ORNAMENTALES	ML	25,00	$ 10,99	$ 285,74	-	508,20	508,2	-	5.585,12	5.585,120	19,55
RN-12	PALMERAS BOTELLAS ENANAS	U	7,00	$ 34,74	$ 243,18	-			-		-	-
RN-13	TAPAJUNTA DE ALUMINIO PISO-PISO A= 15CM	ML	35,00	$ 16,25	$ 568,75	-			-		-	-
RN-14	TAPAJUNTA DE ALUMINIO PISO-PARED A= 15CM EN INTERIORES	ML	65,00	$ 16,90	$ 1.098,50	-			-		-	-
RN-15	TAPAJUNTA EXTERIOR TOOL GALVANIZADO	ML	40,00	$ 14,53	$ 581,20	-			-		-	-
RN-16	TAPAJUNTA DE HORMIGÓN LOSA-LOSA	ML	56,00	$ 42,28	$ 2.367,68	-			-		-	-
RN-17	DUCHA ELÉCTRICA 110 V	U	7,00	$ 29,03	$ 203,21	-			-		-	-
RN-18	LLAVE DE DUCHA	U	7,00	$ 20,90	$ 146,30	-			-		-	-
RN-19	REJILLAS DE PISO 50 MM	U	42,00	$ 4,84	$ 203,28	-	33,00	33	-	159,72	159,720	0,79
RN-20	SUMIDERO DE CUBIERTA DE 110MM INCLUYE REJILLA TIPO CÚPULA	U	20,00	$ 51,11	$ 1.022,20	-	1,00	1	-	51,11	51,110	0,05
RN-21	BORDILLO PARA TINETA DE BAÑO REVESTIDA CON CERÁMICA (0,10MX0,15M)	ML	6,00	$ 16,50	$ 99,00	-	0,80	0,8	-	13,20	13,200	0,13
RN-22	MUEBLES AÉREOS DE MDF PARA COCINA	ML	7,00	$ 180,68	$ 1.264,76	-			-		-	-
RN-23	MUEBLES BAJOS DE MDF PARA COCINA	ML	7,00	$ 180,68	$ 1.264,76	-			-		-	-
RN-24	HORMIGÓN PREMEZCLADO PARA Llosa DE PISO F'C=280 KG/CM2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	M3	1204,92	$ 209,28	$ 252.165,66	226,10		226,1	47.318,21		47.318,21	18,76%
RN-25	FILOS INTERIORES Y EXTERIORES	ML	830,00	$ 3,76	$ 3.120,80	1,15		1,15	4,32		4,32	0,14%
RN-26	ENLUCIDO MEDIAS CAÑAS	ML	960,00	$ 2,28	$ 2.188,80	-			-		-	-
RN-27	CUADRADA DE BOQUETES PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	1150,00	$ 4,64	$ 5.336,00	-			-		-	-
RN-28	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON POLIESTIRENO EXPANDIDO 50 MM	M2	530,00	$ 5,64	$ 2.989,20	-			-		-	-
RN-29	JUNTA DE DILATACIÓN TIPO LLAVE - LOSAS DE PISOS	ML	3200,00	$ 2,36	$ 7.552,00	-			-		-	-
RN-30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS EXPANSIVOS 5/8 -6" PARA ANCLAJE DE PLACAS	U	30,00	$ 4,27	$ 128,10	-			-		-	-
RN-31	CHICOTE D=12MM PARA ARRIOSTRAMIENTO DE MAMPOSTERÍA	U	1750,00	$ 1,55	$ 2.712,50	-			-		-	-
RN-32	CAJA DE PASO H.S. F'C=180KG/Cm² 0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	U	10,00	$ 52,94	$ 529,40	-			-		-	-
	ELÉCTRICOS					-						
RN-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR DE MEDICIÓN - TRAFOMIX	U	1,00	$ 9.602,82	$ 9.602,82	-			-		-	-
RN-34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO METÁLICO PARA DOS CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN	U	4,00	$ 487,88	$ 1.951,52	-			-		-	-
RN-35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO METÁLICO PARA UN CIRCUITO DE ILUMINACIÓN	U	2,00	$ 396,56	$ 793,12	1,00		1	396,56		396,56	50,00%
RN-36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL TDP100KVA	U	1,00	$ 5.982,02	$ 5.982,02	-			-		-	-
RN-37	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL TDP 50KVA	U	2,00	$ 2.431,38	$ 4.862,76	-			-		-	-
RN-38	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE DE HA DE 12MTS 500KG	U	7,00	495,52	$ 3.468,64	-			-		-	-
RN-39	TENDIDO DE CONDUCTOR AL DESNUDO ACSR# 1/0 AWG	M	500,00	$ 2,69	$ 1.345,00	22,30		22,3	59,990		59,99	4,46%
RN-40	TENDIDO DE CONDUCTOR AL DESNUDO ACSR# 2 AWG	M	160,00	$ 2,33	$ 372,80	14,10		14,1	32,850		32,85	8,81%
RN-41	TENDIDO DE CONDUCTOR PREEMSAMBLADO AL AISLADO 2x1/0+1/0 AWG	M	150,00	$ 6,37	$ 955,50	4,60		4,6	29,300		29,30	3,07%
RN-42	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SUJECCION PARA EL NEUTRO	U	8,00	$ 22,13	$ 177,04	-			-		-	-
RN-43	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3F CENTRADA PASANTE 13.8KV - 3CPT	U	3,00	$ 187,73	$ 563,19	-			-		-	-
RN-44	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3F CENTRADA DOBLE RETENCION 13.8KV - 3CDT	U	1,00	$ 431,15	$ 431,15	-			-		-	-
RN-45	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3F CENTRADA RETENCION O TERMINAL 13.8KV - 3CRT	U	4,00	$ 287,70	$ 1.150,80	-			-		-	-
RN-46	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	U	3,00	$ 31,54	$ 94,62	-			-		-	-
RN-47	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	U	4,00	$ 40,08	$ 160,32	-			-		-	-
RN-48	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR DOBLE A TIERRA - TTD	U	4,00	$ 116,68	$ 466,72	-			-		-	-
RN-49	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION AEREO - SUBTERRANEO PARA BAJO VOLTAJE	U	2,00	$ 243,82	$ 487,64	1,00		1	243,820		243,82	50,00%
RN-50	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED 200W, CON FOTOCELULA, EN POSTE CON RED PREENSABLADA	U	7,00	$ 637,26	$ 4.460,82	-			-		-	-
RN-51	CAJA REVISIÓN MEDIA TENSIÓN 90X90X90 C/VIA, CON TAPA DE HIERRO NODULAR 125 KN	U	20,00	$ 318,78	$ 6.375,60	-			-		-	-
RN-52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO DE CONDENSADORES AUTOMATICO DE 60KVAR, 3F, 230V	U	1,00	$ 10.209,14	$ 10.209,14	-			-		-	-
RN-53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO DE CONDENSADORES AUTOMATICO DE 30KVAR, 3F, 230V	U	1,00	$ 7.969,49	$ 7.969,49	-			-		-	-

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 23

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	CLIMATIZACIÓN					-						
RN-54	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE PARED INVERTER CAPACIDAD DE 18.000 BTU/H , INCLUYE COMPRESOR.	U	2,00	$ 1.728,67	$ 3.457,34	-			-		-	-
RN-55	EXTRACTOR DE OLORES EN BAÑOS 6"X6"	U	20,00	$ 42,70	$ 854,00	-			-		-	-
	PAREDES INDUSTRIALES					-						
RN-56	PAREDES DE GALVALUMEN E=0.45mm, RECUBRIMIENTO PINTURA POLIESTER ASTm-653A (COLOR INSTITUCIONAL).	M2	1849,90	$ 16,19	$ 29.949,88	1.241,94	194,10	1436,04	20.107,010	3.142,48	23.249,49	77,63%
RN-57	CERRAmIENTO TuBO H.G. 2 "-mALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6mm, INC. PINTuRA A COmPRESOR	M2	1054,50	$ 22,99	$ 24.242,96			-	-		-	
RN-58	CERRAmIENTO VERJA DE TuBO HG 2" Y TuBO RECT 80X40X2, INC. PINTuRA COmPRESOR	M2	400,00	$ 60,18	$ 24.072,00			-	-		-	
RN-59	RECuBRImIENTO ALumINIO COLOR CYAN O SImILAR, ALuCuBOND 4mm INC. ESTRuCT. E INST<GuIA ImAGEN CORPORATI	M2	1315,00	$ 67,32	$ 88.525,80			-	-		-	
	MONTO TOTAL				9.622.634,22			153.875,95	684.681,51	43.805,13	728.486,64	7,57%

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	9-may.-19		
FIN PLAZO CONTRACTUAL	8-may.-20		
SUSPENSION DIAS	60	DIAS	
SUSPENSION DIAS	11	DIAS	
AMPLIACIÓN POR PANDEMIA	90	DIAS	
AMPLIACIÓN POR CLIMA-REDISEÑO-% POR COVID	128	DIAS	
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN	21-feb.-21		
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO MODIFICATORIO COMPLEMENTARIO	19-oct.-21		
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	5-jul.-21		
FECHA DE APROBACIÓN	13-jul.-21		

VALOR PLANILLADO AVANCE DE OBRA	684.681,51	43.805,13	728.486,64
AMPLAICIÓN DIA: 128 DIAS			
TOTAL PLANILLADO	684.681,51	43.805,13	728.486,64

DESCUENTOS Y RETENCIONES			
ANTICIPO : 40%	273.872,60	17.522,05	291.394,65
OTROS:			
TOTAL DE DESCUENTOS:	273.872,60	17.522,05	291.394,65
VALOR LIQUIDO ESTA PLANILLA :	410.808,91	26.283,08	437.091,99

Firmado electrónicamente por:
PEDRO ELICIO RAMOS IDROVO

ING. PEDRO RAMOS IDROVO
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA LEON BURGOS

CAROLINA LEON BURGOS
FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES No. 23 - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	PRIMERA ETAPA											
	1.- VIAS Y PARQUEADEROS						VP					
	PRELIMINARES											
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE C. RODADuRA	km	1,08	494,59	534,15720	-					-	-
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)	m3	12.779,98	0,82	10.479,58360	23.155,53	1.870,68	25026,21	18.987,53	1.533,96	20.521,49	195,82%
3	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRuCTuRAS mENORES	m3	86,00	4,69	403,34000	-					-	
4	TuBERÍA DE ACERO CORRuGADO D= 1,20 m ,E=2.5 mm, mP-100	m	18,00	239,45	4.310,10000	7,00		7,00	1.676,15		1.676,15	38,89%
5	muRO DE H.S. F'C=180KG./Cm2 TIPO B(CABEZALES)	m3	22,00	188,41	4.145,02000	-					-	
	MATERIAL PETREO					-						
6	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)	m3	51.821,91	2,92	151.319,97720	-					-	
7	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3	m3	2.589,98	10,78	27.919,98440	1.029,98	202,55	1232,53	11.103,18	2.183,51	13.286,69	47,59%
8	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS	m3	1.942,49	17,21	33.430,25290	702,36	292,01	994,37	12.087,62	5.025,49	17.113,11	51,19%
9	TRANSPORTE mATERIAL PETREODE mEJORAmIENTO	m3-km	937.976,72	0,28	262.633,48104	-					-	
10	TRANSPORTE DE mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3	m3-km	117.701,06	0,28	32.956,29680	18.901,70		18901,70	5.292,48		5.292,48	16,06%
11	TRANSPORTE DE mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS	m3-km	34.964,82	0,28	9.790,14960	12.907,03	5.285,37	18192,40	3.613,97	1.479,90	5.093,87	52,03%
	CAPA DE RODADURA					-						
	AMBIENTALES					-						
12	SEÑALES INFORmATIVAS (2.40X1.20)m	u	2,00	250,92	501,84000	-					-	-
13	SEÑALES REGLAmENTARIAS (0.75 X 0.75)m	u	2,00	115,45	230,90000	-					-	-
14	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)m	u	2,00	115,45	230,90000	-					-	-
	CONSOLIDACION DE PLATAFORMAS					-						
15	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)	m3	43.057,34	2,92	125.727,44448	-					-	
16	TRANSPORTE mATERIAL PETREODE mEJORAmIENTO	m3-km	779.043,38	0,28	218.132,14640	-					-	
17	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)	m3	69.683,19	0,82	57.140,21170	-					-	-
	2.- ESTABILIZACIÓN TALUDES					-						
	PRELIMINARES					-						
18	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	4.030,36	1,14	4.594,60470	-					-	
19	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	4.613,56	1,46	6.735,79030	-					-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
20	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA) ESTRuCTuRAS	m3	9.606,48	4,18	40.155,08640	-					-	
21	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	205,06	17,93	3.676,72580	-					-	
22	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3		13,72		-					-	
23	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	85.716,60	2,82	241.720,79875	20.402,64	1.870,68	22273,32	57.535,46	5.275,32	62.810,78	25,98%
	SISTEMA DE DRENAJE PLATAFORMA					-						
24	RASANTEO mANuAL DE ZANJAS	m3		3,22		-					-	
25	SumINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL PARA SuBDREN (TIPO NT 2400 O SimILAR)	m2	1.498,63	3,06	4.585,80780	-					-	
26	SumINISTRO Y COLOCACIÓN DE mATERIAL FILTRANTE A mAQuINA (PIEDRA BOLA mAX =2")	m3	524,58	15,19	7.968,37020	-					-	
27	SumINISTRO Y COLOCACIÓN mANuAL DEmATERIAL FILTRANTEPARA DRENES 1 PuLG	m3	279,52	20,70	5.786,06400	-					-	
28	SumINISTRO Y COLOCACIÓN DE TuBERIAP.V.C.DIAm. INT.=160mm, PERFORADA	m		14,38		-					-	
29	Sum.Y COLOCACIÓN TuBERIA PVC, CORRuGADA DIAm INT.=160mm S5	m		9,80		-					-	
30	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT. 220 mm S5	m		14,68		-					-	
31	Sum.Y COLOCACIÓN TuBERIA PVC. CORRuGADA DIAm. INT.=315mm S5	m		20,16		-					-	
32	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 315A 160mm PVC Y/O POLIETILENO	u		24,07		-					-	
33	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 220A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u		21,28		-					-	
	SISTEMA TIERRA ARMADA					-						
34	GEOTEXTIL TEJIDO- 2400 T PARA muRO DE CONTENCION TIERRA ARmADA	m2	21.276,67	3,06	65.106,59490	12,06		12,06	36,92		36,92	0,06%
35	GEOmALLA BX-1100 TENSAR	m2	7.927,94	3,19	25.290,11265	50,25		50,25	160,28		160,28	0,63%
36	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	4.074,59	17,33	70.612,64470	-					-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES No. 23 - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
37	muRO DE GAVIONES TRIPLE TORSION	m3	3.632,00	60,08	218.210,56000	-					-	
	3.- REDES DE+E59:E141 ALCANTARILLADO SA+E59:E141NITARIO, PLUVIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					-						
	ALCANTARILLADO SANITARIO					-						
	PRELIMINARES					-						
38	REPLANTEO Y NIVELACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	m	490,58	1,81	887,94980	1.085,00		1085,00	1.963,85		1.963,85	221,17%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
39	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-					-	
40	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	3.460,00	4,18	14.462,80000	1.009,34		1009,34	4.219,04		4.219,04	29,17%
41	ENTIBADO DE ZANJA	m2	160,00	11,56	1.849,60000	-					-	
42	RAZANTEO DE ZANJA E= 0.20m	m2	240,00	3,22	772,80000	-					-	
43	ARENA DE KILO, TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	320,00	18,13	5.801,60000	815,92		815,92	14.792,63		14.792,63	254,98%
44	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	1.800,00	13,72	24.696,00000	385,73		385,73	5.292,22		5.292,22	21,43%
45	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	900,00	6,32	5.688,00000	836,71		836,71	5.288,01		5.288,01	92,97%
46	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	1.440,00	2,82	4.060,80000	1.599,00		1599,00	4.509,19		4.509,19	111,04%
	TUBERIAS PVC ALCANTARILLADO					-						
47	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=160 mm S6	m	89,12	9,70	864,46400	184,00		184,00	1.784,80		1.784,80	206,46%
48	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT = 200 mm S6	m	450,00	15,28	6.876,00000	84,05		84,05	1.284,28		1.284,28	18,68%
49	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 300 mm S5	m	50,00	20,22	1.011,00000	-					-	
50	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=364 mm S6	m		23,27		-					-	
51	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 450 mm S5	m	20,00	44,36	887,20000	-					-	
52	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 220A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u	2,00	21,28	42,56000	-					-	
53	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 335A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u		24,14		-					-	
	POZOS Y CAJAS					-						
54	HORmIGON SImPLE EN POZOS F'C=180KG/Cm2-mEZCLA A mANO	m3	30,00	177,00	5.310,00000	24,38		24,38	4.315,26		4.315,26	81,27%
55	ENCOFRADO mETALICO PARA POZOS DE REVISION	m3	30,00	20,36	610,80000	24,38		24,38	496,38		496,38	81,27%
56	SumINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS Y CERCOS H.F-210LB	u	12,00	178,06	2.136,72000	7,00		7,00	1.246,42		1.246,42	58,33%
57	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	7,00	90,42	632,94000	-					-	
	ALCANTARILLADO PLUVIAL					-						
	PRELIMINARES					-						
58	REPLANTEO Y NIVELACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	m	1.378,44	1,81	2.494,97640	1.368,57		1368,57	2.477,11		2.477,11	99,28%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
59	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-					-	
60	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	9.280,92	4,18	38.794,26389	-					-	-
61	ENTIBADO DE ZANJA	m2	308,42	11,56	3.565,33520	-					-	-
62	RAZANTEO DE ZANJA E= 0.20m	m2	849,00	3,22	2.733,78000	-					-	
63	ARENA DE KILO, TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	245,00	18,13	4.441,85000	935,25		935,25	16.956,08		16.956,08	381,73%
64	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	5.196,31	13,72	71.293,38000	-					-	
65	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	2.130,00	6,32	13.461,60000	-					-	
66	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	2.144,69	2,82	6.048,01885	1.797,82		1797,82	5.069,85		5.069,85	83,83%
	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO PLUVIAL					-						
67	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 250 mm S5	m	608,56	16,51	10.047,32560	-					-	-
68	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 300 mm S5	m	140,00	20,22	2.830,80000	-					-	
69	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=364 mm S6	m	50,00	23,27	1.163,50000	550,00		550,00	12.798,50		12.798,50	1100,00%
70	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 450 mm S5	m	12,00	44,36	532,32000	-					-	
71	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 600 mm S5	m	878,35	107,84	94.721,26400	-					-	
	POZOS Y CAJAS					-						
72	HORmIGON SImPLE EN POZOS F'C=180KG/Cm2-mEZCLA A mANO	m3	56,00	177,00	9.912,00000	14,44		14,44	2.555,88		2.555,88	25,79%
73	ENCOFRADO mETALICO PARA POZOS DE REVISION	m3	56,00	20,36	1.140,16000	14,44		14,44	294,00		294,00	25,79%
74	SumINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS Y CERCOS H.F-210LB	u	24,00	178,06	4.273,44000	8,00		8,00	1.424,48		1.424,48	33,33%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES No. 23 - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
75	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	22,00	90,42	1.989,24000	-					-	
76	CAJA DE H.S. PARA REJILLA mETÁLICA 0.40 por 1.00 por 1.00 (F'C= 180 KG/Cm2)	u	40,00	95,58	3.823,20000	-					-	
77	SumINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA H.F. (1.00 por 0.40 por 0.05)110 KG	u	40,00	130,84	5.233,60000	-					-	
	FOSA SEPTICA, FILTRO ANAEROBICO Y SECADO DE LODOS					-						
	PRELIMINARES					-						
78	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1,14		-					-	
79	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	63,51	1,46	92,72460	154,17		154,17	225,09		225,09	242,75%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
80	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-					-	
81	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	211,71	4,18	884,93651	5,97		5,97	24,95		24,95	2,82%
82	ENTIBADO DE ZANJA	m2		11,56		-					-	
83	RAZANTEO DE ZANJA E= 0.20m	m2		3,22		-					-	
84	ARENA DE KILO, TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3		18,13		-					-	
85	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	118,67	13,72	1.628,15240	-					-	
86	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	20,00	6,32	126,40000	-					-	
	TUBERIAS PVC ALCANTARILLADO					-						
87	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT = 200 mm S6	m	26,50	15,28	404,92000	-					-	
	HORMIGONES					-						
88	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	3,41	163,18	556,68857	2,09		2,09	341,05		341,05	61,26%
89	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	31,11	249,88	7.773,10602	-					-	
90	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F´C=180 KG/Cm2-50por cientoP)CIm	m3		169,86		-					-	
	ACERO ESTRUCTURAL					-						
91	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	3.652,36	1,68	6.135,96542	-					-	
92	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	100,00	2,76	276,00000	-					-	
93	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	100,00	0,11	11,00000	-					-	
	CERRAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO					-						
94	CERRAmIENTO DE ALAmBRE DE PÚAS-6 HILOS	m	60,00	2,14	128,40000	-					-	
95	PuERTA DE mALLA + TuBO ISO II 2"	m2	4,00	59,32	237,28000	0,80		0,8	47,46		47,46	20,00%
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES					-						
96	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	298,56	10,27	3.066,41660	-					-	
97	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	30,00	4,72	141,60000	30,86		30,86	145,66		145,66	102,87%
	PIEZAS SANITARIAS					-						
98	ACCESORIOS PLANTA DE TRATAmIENTO (Global)	u	1,00	5.101,40	5.101,40000	-					-	
99	FILTRO DE GRAVA CALSIFICADA DE 2 1/2" A 1/2"	m3	9,00	28,28	254,52000	-					-	
100	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u	9,00	75,58	680,22000	-					-	
	4.- NAVE PRINCIPAL- TALLERES-ADMINISTRATIVO-BODEGA GENERAL					-						
	PRELIMINARES					-						
101	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	12.327,08	1,14	14.052,87120	-					-	-
102	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	7.949,46	1,46	11.606,21160	582,98		582,98	851,15		851,150	7,33
103	ACOmETIDA E INST. DE AGuA POTABLE PROVISIONAL PVC 3/4"	m	90,00	8,44	759,60000	-					-	-
104	ACOmETIDA E INST. ELÉCTRICA PROV. TuBERÍA CONDuIT 1" CABLENo.8	m	90,00	27,58	2.482,20000	95,00		95,00	2.620,10		2.620,100	105,56
105	SONDEOS DE SuELOS (COmPROBACION IN SITu) NEC-15	m	68,00	55,43	3.769,24000	-					-	-
106	CERRAmIENTO PROVISIONAL LISTONES + PLANCHAS DE ZINC	m2	1.018,35	11,69	11.904,51150	-					-	-
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
107	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	7.030,26	4,18	29.386,48680	42,66		42,66	178,32		178,32	0,61%
108	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-					-	
109	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	4.011,39	17,33	69.517,38870	4,32		4,32	74,87		74,87	0,11%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES No. 23 - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
110	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	2.274,76	13,72	31.209,70720	0,21		0,21	2,88		2,88	0,01%
111	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	7.030,26	2,82	19.825,33320	-					-	
	HORMIGONES					-						
112	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	196,42	163,18	32.051,81560	12,51		12,51	2.041,45		2.041,45	6,37%
113	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF´C = 280KG./Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	1.088,67	225,97	246.006,75990	32,99		32,99	7.454,75		7.454,75	3,03%
114	HORmIGON PREmEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	282,96	283,42	80.196,52320	5,94		5,94	1.684,03		1.684,03	2,10%
115	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	337,45	289,16	97.577,04200	28,51		28,508	8.243,37		8.243,37	8,45%
116	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F´C=180 KG/Cm2-50por cientoP)CIm	m3	650,01	169,86	110.410,69860	32,41		32,41	5.505,16		5.505,16	4,99%
117	HORmIGON PREmEZCLADO LOSA/ VIGAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	200,00	193,75	38.750,00000	39,02		39,02	7.560,35		7.560,35	19,51%
	ACERO ESTRUCTURAL					-						
118	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	188.476,09	1,68	316.639,83120	13.184,46		13184,46	22.149,89		22.149,89	7,00%
119	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	517.607,93	2,76	1.428.597,87576	41.104,38		41104,38	113.448,10		113.448,10	7,94%
120	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	499.962,86	0,11	54.995,91416	27.644,15		27644,15	3.040,86		3.040,86	5,53%
121	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2	14.243,58	4,84	68.938,91268	-					-	
122	DECK E=0.75mm PLACA COLABORANTE-mD2-GA-101m	m2	2.520,48	18,37	46.301,21760	43,80		43,799	804,59		804,59	1,74%
	CONTRAPISOS					-						
123	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3 (CONTRAPISO E=20Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	1.043,38	10,78	11.247,63640	19,38		19,38	208,92		208,92	1,86%
124	mATERIAL DE BASE CLASE 2 (CONTRAPISO E=15Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	1.301,40	24,55	31.949,37000	-					-	
125	CONTRAPISO HORm.S. PREmEZ. F´C=280KG/Cm2 E= 4 PuLG. (SIN BASE)	m2	1.710,63	21,50	36.778,54500	-					-	
126	JuNTA ASERRADA DILATACION PISO (INC. CORDON, Y SELLO)	m	4.784,70	2,59	12.392,37300	-					-	
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS					-						
127	mASILLADO DE PISOS, ENDuRECEDOR DE CuARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5mm)	m2	5.101,87	5,62	28.672,50940	-					-	
128	PINTuRA EPOXICA PISO INDuSTRIAL 3mm (2 COmPONENTES)	m2	5.101,87	34,78	177.443,03860	-					-	
129	PISO PORCELANATO RECTIF. COLOR (0.50X0.50- u OTROS) INSTAL. EmPO	m2	1.910,00	40,31	76.992,10000	280,29	18,41	298,7032	11.298,44	742,29	12.040,73	15,64%
130	PISO GRADAS PORCELANATO PIZARRA COLOR (0.32X0.32-O SImILAR) INSTAL. EmPO.	m2	90,00	32,72	2.944,80000	-					-	
131	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	761,35	26,06	19.840,78100	104,09		104,09	2.712,64		2.712,64	13,67%
132	BARREDERA PORCELANATO COLOR RECTIFICADA A=10Cm	m	997,67	7,70	7.682,05900	723,02		723,02	5.567,25		5.567,25	72,47%
133	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISOS Y FILOS DE GRADA	m	150,00	2,98	447,00000	-					-	
134	CENEFA ACANALADA ANTILESLIZANTE FILOS GRADA A=10Cm	m	120,00	38,56	4.627,20000	-					-	
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS					-						
135	mASILLADO E ImPERmEABILIZADO DE PISOS-LOSAS, mORTERO CEmENTO-ARENA 1:3 +(PEGANTE + ImPERm.) LOSAS EXT	m2	1.380,00	10,40	14.352,00000	14,82		14,8164	154,09		154,09	1,07%
136	ImPERmEABILIZACION LOSA DE CuBIERTA ImPRImANTE ASFALTICO SOLuBLE AL AGuA	m2	1.650,00	2,84	4.686,00000	-					-	
137	ImPERmEABILIZACIONLOSA DE CuBIERTA LAmINAS ASFALTICAS	m2	1.650,00	13,85	22.852,50000	-					-	
	CUBIERTA					-						
138	CuBIERTA GALVALumEN E=0.45mm, RECuBRIENTO PINTuRA POLIESTER ASTm-653A (COLOR INSTITuCIONAL), INC, PER	m2	4.875,00	13,92	67.860,00000	236,26		236,26	3.288,74		3.288,74	4,85%
139	CuBIERTA POLICARBONATO E=0.80 mm, COLOR BRONCE O SImILAR, INC. ACCESORIOS INSTALCION	m2	946,45	14,34	13.572,09300	-					-	
140	CumBRERO GALVALumEN E=0.40 mm A=0.50 m, INC. ACCES. INSTALACION	m	92,00	8,38	770,96000	-					-	
141	CANAL TOL GALV E= 0.70mm, H=30Cm, A=40Cm DESARR. 122 Cm, INC. GANCHOS	m	259,00	21,49	5.565,91000	369,34		369,34	7.937,12		7.937,12	142,60%
	BAJANTES AGUA LLUVIA					-						
142	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=160mm)	m	798,00	9,91	7.908,18000	-					-	
143	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	25,00	90,42	2.260,50000	39,00		39	3.526,38		3.526,38	156,00%
144	SumI. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m	233,91	20,59	4.816,20690	-					-	
145	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO DIAm. INT.= 200A 160mm PVC Y/O POLIETILENO	u	15,00	20,71	310,65000	-					-	
	MAMPOSTERÍA					-						
146	RIOSTRAS DE H.S. F´C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3	129,00	258,83	33.389,07000	-					-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES No. 23 - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
147	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=10 Cm	m2	236,00	17,71	4.179,56000	-					-	
148	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2	4.630,00	22,90	106.027,00000	-					-	
149	PICADO Y RESANADO DE mAmPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m	3.819,65	4,63	17.684,98050	-					-	
150	mESON H.A. F'C=180 KG/Cm2 E=7 Cm HIERRO (LAVAmANOS+mESON)	m	7,00	34,03	238,21000	13,40	43,25	56,65	456,00	1.471,80	1.927,80	809,29%
151	REVESTImIENTO mESON GRANITO	m	7,00	180,61	1.264,27000	27,40		27,4	4.948,72		4.948,72	391,43%
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES					-						
152	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	2.795,97	10,27	28.714,61190	334,60		334,60	3.436,30		3.436,30	11,97%
153	ENLuCIDO VERTICAL PALETEADO mORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2	9.060,97	8,78	79.555,31660	-					-	
154	ENLuCIDO CON mALLA+ ImPERmEABILIZANTE, mORTERO 1:3	m2	1.250,00	17,03	21.287,50000	-					-	
155	ENLuCIDO HORIZONTAL PALETEADO mORTERO 1:3	m2	100,00	12,30	1.230,00000	-					-	
156	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	2.795,97	5,26	14.706,80220	334,60		334,60	1.759,97		1.759,97	11,97%
157	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO INTERIOR) INC. FILOS	m2	9.060,97	4,40	39.868,26800	-					-	
158	EmPASTE HORIZONTAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	100,00	6,56	656,00000	-					-	
159	PINTuRA EPOXICA PARED INDuSTRIAL 3mm (2 COmPONENTES)	m2		34,78		-					-	
160	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuÍA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	9.060,97	4,72	42.767,77840	-					-	
161	PINTuRA DE CAuCHO SATINADA COLOR(2 mANOS) EXTERIOR (CANASTILLA) <GuÍA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	2.795,97	5,72	15.992,94840	-					-	
162	RECuBRImIENTO ALumINIO COLOR CYAN O SImILAR, ALuCuBOND 5mm INC. ESTRuCT. E INST<GuÍA ImAGEN CORPORATI	m2	1.315,00	84,96	111.722,40000	-					-	
163	RECuBRImIENTO PLANCHA FIBROCEmENTO E=7mm	m2	50,00	20,56	1.028,00000	-					-	
	CARPINTERIA METALICA					-						
164	VENTANA FIJA TuBO RECT 40X80X2-mALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6mm, INC PINTuRA ANTICORROSIVA, A COmPRESOR	m2	540,00	41,30	22.302,00000	-					-	
165	PORTON TIPO CORREDIZO RETRACTIL TuBO RECT 40X80X2mm-TOOL GALV. 0.6mm	m2	990,50	61,25	60.668,12500	-					-	
166	PuERTA mETÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2mm (AREA RIEGO Y DRENAJE)	m2	40,30	142,73	5.752,01900	-					-	
167	PuERTAS mODuLARES, TAmBORADAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, INCLuYE ESTRuCTuRA Y HER	m2	30,50	172,30	5.255,15000	4,78		4,78	823,59		823,59	15,67%
168	DIVISIONES ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, TAmBORADAS INCLuYE ESTRuCTuRA, EmPOTRAmIENTO PISO PARED (	m2	81,00	161,18	13.055,58000	24,56		24,56	3.958,58		3.958,58	30,32%
	CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE					-						
169	PASAmANOS TuBERÍA ACERO INOXIDABLE + VIDRIO LAmINADO 8mm, EmPOTRADA PISO H=1.00m (GRADAINTERIORES)	m	86,21	173,45	14.953,12450	-					-	
170	PASAmANOS EN TuBERIADE ACERO INOXIDABLE EmPOTRADO EN PARED	m	26,59	45,00	1.196,55000	-					-	
	CARPINTERIA DE MADERA					-						
171	PuERTA TAmBORADA 70Cm, ESQuELETO CANELO, mDF 9mm -LACADA-DISEÑO CORPORATIVO	u	20,00	198,79	3.975,80000	-					-	
172	PuERTA TAmBORADA 90Cm, ESQuELETO CANELO, mDF 9mm -LACADA-DISEÑO CORPORATIVO	u	2,00	230,59	461,18000	-					-	
173	PuERTA TAmBORADA 100Cm, ESQuELETO CANELO, mDF 9mm -LACADA-DISEÑO CORPORATIVO	u	6,00	240,28	1.441,68000	4,00		4	961,12		961,12	66,67%
	VENTANERIA-PUERTAS ALUMINIO VIDRIO					-						
174	PuERTA INGRESO PRINCIPAL-SISTEmA APERTuRA AuTOmATICO 2.00X2.30m ALumINO Y VIDRIO TEmPLADO DE 10mm	u	1,00	6.646,43	6.646,43000	-					-	
175	PuERTA DE VIDRIO TEmPLADO 10mm, INC. CERRADuRA TIRADERA, PIVOTE DE SuJECCION (PREFEXTuRA Y AuDITORIO)	m2	9,50	600,48	5.704,56000	-					-	
176	PuERTA YmAmPARAALumINIOS200YVIDRIOLAmINADO E=8mm CON PIVOTE	m2	9,00	190,90	1.718,10000	-					-	
177	PuERTA BATIENTE ALumINIO Y VIDRIO FLOTADO CLARO 6mm (0.90X2.10)	u	3,00	295,00	885,00000	3,00		3,00	885,00		885,00	100,00%
178	PuERTA BATIENTE ALumINIO Y VIDRIO FLOTADO CLARO 6mm (1.00X2.10)	u	40,00	286,07	11.442,80000	-					-	
179	VENTANA CORREDIZA ALumINIO SERIE 200-INCL. VIDRIO LAmINADO 6mm	m2	220,00	183,67	40.407,40000	-	0,75	0,75		137,75	137,750	34,0%
	REVESTIMIENTO DE TUMBADOS					-						
180	CIELO RASO FALSO - FIBRA mINERAL Y RECuB LÁmINA ALumINIO 0.60X0.60 BLANCO, TIPO AmSTRONG O SImILAR	m2	2.150,00	21,59	46.418,50000	131,57		131,5735	2.840,67		2.840,67	6,12%
181	CIELO RASO FALSO TIPO GYPSum PARA HumEDAD-1/2"-SIN ESTuCAR	m2	212,58	20,04	4.260,10320	-					-	
182	ESTuCADO DE CIELO RASO	m2	212,58	6,26	1.330,75080	-					-	
183	FRISO GALVALumEN PREPINTADO E= 0.40 INC. FLASHING	m2	50,00	19,63	981,50000	-					-	
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS					-						

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES No. 23 - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
184	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF DISCAPACITADOS PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u	2,00	297,96	595,92000	-					-	
185	PASAmANOS PARA DISCAPACITADOS TuBO DIAm 32mm E=1.5mm EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO SATINADO (Juego)	u	2,00	281,03	562,06000	-	1,00	1		281,03	281,030	50,00
186	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u	39,00	297,96	11.620,44000	6,00		6,00	1.787,76		1.787,76	15,38%
187	uRINARIO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF	u	6,00	261,01	1.566,06000	4,00		4,00	1.044,04		1.044,04	66,67%
188	LAVABO BLANCO, LLAVE SENSOR mOVImIENTO (CON ACCESORIOS)	u	35,00	281,39	9.848,65000	2,00		2,00	562,78		562,78	5,71%
189	DISPENSOR DE PAPEL HIGIENICO DIAm=275mm, ROLLO 70mm, ABATIBLE,ACERO INOX E=8mm, AISI 304, ACABADO S	u	20,00	110,71	2.214,20000	4,00		4	442,84		442,84	20,00%
190	DISPENSOR DE PAPEL TOALLA 400-600 uNIDADES, 330X273X130mm, ACERO INOX E=8mm AISI 304, ACABADO SATINAD	u	20,00	113,00	2.260,00000	4,00		4	452,00		452,00	20,00%
191	DISPENSADOR DE JABON LIQuIDO ACERO INOX AISI304, ACABADO SATINADO	u	20,00	91,28	1.825,60000	4,00		4	365,12		365,12	20,00%
192	ESPEJO DE VIDRIO FLOTADO 4mm- mARCO DE ALumINIO	m2	12,89	42,86	552,46540	-					-	
193	FREGADERO DE COCINA (uN POZO)	u	2,00	185,40	370,80000	-					-	
194	SECADOR DE mANOS ACCIONAmIENTO AuTOmATICO 260X302X150mm, ACERO INOX. 304, LAmINA1.5mm 110V-60HZ	u	20,00	238,44	4.768,80000	4,00		4	953,76		953,76	20,00%
195	BASuRERO CILINDRICO A PEDAL D=250mm H=385 PARA BAÑO ACERO INOX. 304	u	41,00	66,60	2.730,60000	5,00		5	333,00		333,00	12,20%
	PUENTE GRUA BIRRIEL CAP. 16 TON (1 UNIDADES)					-						
196	ACERO DE REFuERZO FY= 4200 Kg/Cm2	Kg	407,57	1,68	684,71760	-					-	
197	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	43.726,12	2,76	120.684,09120	2.040,66		2040,66	5.632,22		5.632,22	4,67%
198	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	43.726,12	0,11	4.809,87320	2.040,66		2040,66	224,48		224,48	4,67%
199	KIT POLIPASTO BIRRIEL A CABLE + TROLEY ELEC, CAP. 16T, ELEVACION 8m, (INC. CARROS TESTEROS+ SISTEm EL	u	1,00	50.538,00	50.538,00000	-					-	
200	SISTEmA ELECTRIFICACION ENCAPSuLADO Lm60	m	88,00	112,21	9.874,48000	-					-	
201	RIEL DE RODADuRA 50X30mm, (V. PuENTE 2X10+V CARRILERA2X88m)	m	212,00	77,83	16.499,96000	-					-	
202	mONTAJE ELECTROmECANICOPARA GRuA BIRRIEL 16 TON	u	1,00	17.664,00	17.664,00000	-					-	
203	SIST. CONTROL REmOTO/ TELEmANDO (CON DISPLAY)	u	1,00	1.955,65	1.955,65000	-					-	
	EQUIPO DE MOVILIZACIÓN VERTICAL					-						
204	ASERSOR DE DISCAPACITADOS L =5.0m, 1 PARADA, CAP. NOmINAL 250KG.	u	1,00	18.732,35	18.732,35000	-					-	
	5.- NAVE LAVADORA, Y TALLERES CHAPISTERIA-CARPINTERIA					-						
	PRELIMINARES					-						
205	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	4.407,56	1,14	5.024,61840	-					-	-
206	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	1.087,37	1,46	1.587,56020	-					-	-
207	ACOmETIDA E INST. DE AGuA POTABLE PROVISIONAL PVC 3/4"	m		8,44		-					-	
208	ACOmETIDA E INST. ELÉCTRICA PROV. TuBERÍA CONDuIT 1" CABLENo.8	m		27,58		-					-	
209	SONDEOS DE SuELOS (COmPROBACION IN SITu) NEC-15	m	61,00	55,43	3.381,23000	-					-	-
210	CERRAmIENTO PROVISIONAL LISTONES + PLANCHAS DE ZINC	m2		11,69		-					-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
211	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	311,80	4,18	1.303,32400	35,14		35,14	146,89		146,890	11,27
212	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-					-	
213	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	261,80	17,33	4.536,99400	7,00		7,00	121,31		121,310	2,67
214	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	424,00	13,72	5.817,28000	-					-	-
215	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	261,80	2,82	738,27600	85,14		85,14	240,09		240,090	32,52
	HORMIGONES					-						
216	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	9,80	163,18	1.599,16400	3,00		3,00	489,54		489,540	30,61
217	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF´C = 280KG./Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	69,20	225,97	15.637,12400	-					-	-
218	HORMIGON PREMEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. BOMBEO Y TRANSPORTE	m3	35,23	283,42	9.984,88660	12,80		12,80	3.627,78		3.627,780	36,33
219	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	22,17	289,16	6.410,67720	4,69		4,69	1.356,16		1.356,160	21,15
220	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F´C=180 KG/Cm2-50por cientoP)Clm	m3	46,97	169,86	7.978,32420	12,25		12,25	2.080,79		2.080,790	26,08
	ACERO ESTRUCTURAL					-						

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES No. 23 - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
221	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	14.998,01	1,68	25.196,65680	189,84		189,84	318,93		318,930	1,27
222	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	59.540,80	2,76	164.332,60800	1.560,30	1.299,37	2859,67	4.306,43	3.586,26	7.892,69	4,80%
223	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	59.540,80	0,11	6.549,48800	-	772,95	772,9542256		85,02	85,020	1,30
224	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2	2.420,00	4,84	11.712,80000	-					-	
	CONTRAPISOS					-						
225	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3 (CONTRAPISO E=20Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	168,50	10,78	2.032,03000	-					-	-
226	mATERIAL DE BASE CLASE 2 (CONTRAPISO E=15Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	141,20	24,55	3.466,46000	-					-	
227	CONTRAPISO HORm.S. PREmEZ. F´C=280KG/Cm2 E= 4 PuLG. (SIN BASE)	m2	710,00	21,50	15.265,00000	-					-	
228	JuNTA ASERRADA DILATACION PISO (INC. CORDON, Y SELLO)	m	550,00	2,59	1.424,50000	-					-	
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS					-						
229	mASILLADO DE PISOS, ENDuRECEDOR DE CuARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5mm)	m2	1.100,00	5,62	6.182,00000	-					-	
230	PINTuRA EPOXICA PISO INDuSTRIAL 3mm (2 COmPONENTES)	m2	1.100,00	34,78	38.258,00000	-					-	
231	PISO PORCELANATO RECTIF. COLOR (0.50X0.50- u OTROS) INSTAL. EmPO	m2	35,00	40,31	1.410,85000	450,73		450,73	18.168,93		18.168,93	1287,80%
232	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	72,00	26,06	1.876,32000	46,77		46,77	1.218,83		1.218,83	64,96%
233	BARREDERA PORCELANATO COLOR RECTIFICADA A=10Cm	m	28,00	7,70	215,60000	115,39		115,39	888,50		888,50	412,11%
234	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISOS Y FILOS DE GRADA	m		2,98		-					-	
	CUBIERTA					-						
235	CuBIERTA GALVALumEN E=0.45mm, RECuBRIENTO PINTuRA POLIESTER ASTm-653A (COLOR INSTITuCIONAL), INC, PER	m2	1.390,00	13,92	19.348,80000	-					-	
236	CuBIERTA POLICARBONATO E=0.80 mm, COLOR BRONCE O SImILAR, INC. ACCESORIOS INSTALCION	m2	100,00	14,34	1.434,00000	-					-	
237	CumBRERO GALVALumEN E=0.40 mm A=0.50 m, INC. ACCES. INSTALACION	m	54,25	8,38	454,61500	-					-	
238	CANAL TOL GALV E= 0.70mm, H=30Cm, A=40Cm DESARR. 122 Cm, INC. GANCHOS	m	108,50	21,49	2.331,66500	-					-	
	BAJANTES AGUA LLUVIA					-						
239	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=160mm)	m	168,00	9,91	1.664,88000	-					-	-
240	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	18,00	90,42	1.627,56000	-					-	
241	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m	120,00	20,59	2.470,80000	-					-	
242	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO DIAm. INT.= 200A 160mm PVC Y/O POLIETILENO	u	6,00	20,71	124,26000	-					-	
	MAMPOSTERÍA					-						
243	RIOSTRAS DE H.S. F´C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3	6,50	258,83	1.682,39500	-					-	
244	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=10 Cm	m2	5,00	17,71	88,55000	-					-	
245	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2	716,00	22,90	16.396,40000	-					-	
246	PICADO Y RESANADO DE mAmPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m	168,00	4,63	777,84000	-					-	
247	mESON H.A. F'C=180 KG/Cm2 E=7 Cm HIERRO (LAVAmANOS+mESON)	m	3,50	34,03	119,10500	-					-	
248	REVESTImIENTO mESON GRANITO	m	3,50	180,61	632,13500	-	0,58	0,58		104,75	104,750	16,57
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES					-						
249	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	380,00	10,27	3.902,60000	-					-	
250	ENLuCIDO VERTICAL PALETEADO mORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2	1.075,00	8,78	9.438,50000	-					-	
251	ENLuCIDO CON mALLA+ ImPERmEABILIZANTE, mORTERO 1:3	m2	35,00	17,03	596,05000	-					-	
252	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	380,00	5,26	1.998,80000	-					-	
253	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO INTERIOR) INC. FILOS	m2	2.150,00	4,40	9.460,00000	-					-	
254	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	2.150,00	4,72	10.148,00000	-					-	
255	PINTuRA DE CAuCHO SATINADA COLOR(2 mANOS) EXTERIOR (CANASTILLA) <GuÍA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	380,00	5,72	2.173,60000	160,53		160,53	918,23		918,23	42,24%
256	RECuBRImIENTO PLANCHA FIBROCEmENTO E=7mm	m2	50,00	20,56	1.028,00000	-					-	
	CARPINTERIA METALICA					-						
257	VENTANA FIJA TuBO RECT 40X80X2-mALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6mm, INC PINTuRA ANTICORROSIVA, A COmPRESOR	m2	182,26	41,30	7.527,33800	-					-	
258	PORTON TIPO CORREDIZO RETRACTIL TuBO RECT 40X80X2mm-TOOL GALV. 0.6mm	m2	156,67	61,25	9.596,03750	-					-	
259	PuERTA mETÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2mm , INC. CERRADuRA, BISAGRAS Y PINTuRA	m2	20,00	142,73	2.854,60000	15,98		15,98	2.280,83		2.280,83	79,90%
260	PuERTAS mODuLARES, TAmBORADAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, INCLuYE ESTRuCTuRA Y HER	m2	4,00	172,30	689,20000	-					-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES No. 23 - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
261	DIVISIONES ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, TAmBORADAS INCLuYE ESTRuCTuRA, EmPOTRAmIENTO PISO PARED (	m2	13,70	161,18	2.208,16600	-					-	
	VENTANERIA-PUERTAS ALUMINIO VIDRIO					-						
262	PuERTA BATIENTE ALumINIO Y VIDRIO FLOTADO CLARO 6mm (1.00X2.10)	u	3,00	286,07	858,21000	-					-	
263	VENTANA CORREDIZA ALumINIO SERIE 200-INCL. VIDRIO LAmINADO 6mm	m2	6,00	183,67	1.102,02000	-					-	
	REVESTIMIENTO DE TUMBADOS					-						
264	CIELO RASO FALSO - FIBRA mINERAL Y RECuB LÁmINA ALumINIO 0.60X0.60 BLANCO, TIPO AmSTRONG O SImILAR	m2	129,01	21,59	2.785,32590	-					-	
265	FRISO GALVALumEN PREPINTADO E= 0.40 INC. FLASHING	m2		19,63		-					-	
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS					-						
266	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF DISCAPACITADOS PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u		297,96		-					-	
267	PASAmANOS PARA DISCAPACITADOS TuBO DIAm 32mm E=1.5mm EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO SATINADO (Juego)	u		281,03		-					-	
268	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u	4,00	297,96	1.191,84000	-					-	
269	uRINARIO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF	u	1,00	261,01	261,01000	-					-	
270	LAVABO BLANCO, LLAVE SENSOR mOVImIENTO (CON ACCESORIOS)	u	3,00	281,39	844,17000	-					-	
271	DISPENSOR DE PAPEL HIGIENICO DIAm=275mm, ROLLO 70mm, ABATIBLE,ACERO INOX E=8mm, AISI 304, ACABADO S	u	3,00	110,71	332,13000	-					-	
272	DISPENSOR DE PAPEL TOALLA 400-600 uNIDADES, 330X273X130mm, ACERO INOX E=8mm AISI 304, ACABADO SATINAD	u	2,00	113,00	226,00000	-					-	
273	DISPENSADOR DE JABON LIQuIDO ACERO INOX AISI304, ACABADO SATINADO	u	2,00	91,28	182,56000	-					-	
274	ESPEJO DE VIDRIO FLOTADO 4mm- mARCO DE ALumINIO	m2	2,70	42,86	115,72200	-					-	
275	SECADOR DE mANOS ACCIONAmIENTO AuTOmATICO 260X302X150mm, ACERO INOX. 304, LAmINA1.5mm 110V-60HZ	u	2,00	238,44	476,88000	-					-	
276	BASuRERO CILINDRICO A PEDAL D=250mm H=385 PARA BAÑO ACERO INOX. 304	u	4,00	66,60	266,40000	-					-	
277	DuCHAS CON mEZCLADORA (CON ACCESORIOS)	u	1,00	135,94	135,94000	-					-	
	6.- NAVE RESGUARDO VEHICULAR PESADO					-						
	PRELIMINARES					-						
278	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	5.783,22	1,14	6.592,87080	-					-	-
279	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	1.445,85	1,46	2.110,94100	1.577,40		1577,40	2.303,00		2.303,000	109,10
280	ACOmETIDA E INST. DE AGuA POTABLE PROVISIONAL PVC 3/4"	m		8,44		-					-	
281	ACOmETIDA E INST. ELÉCTRICA PROV. TuBERÍA CONDuIT 1" CABLENo.8	m		27,58		-					-	
282	SONDEOS DE SuELOS (COmPROBACION IN SITu) NEC-15	m	66,00	55,43	3.658,38000	-					-	-
283	CERRAmIENTO PROVISIONAL LISTONES + PLANCHAS DE ZINC	m2		11,69		-					-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
284	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	78,36	4,18	327,54480	74,88		74,88	313,00		313,000	95,56
285	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-					-	
286	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	78,36	17,33	1.357,97880	87,60		87,60	1.518,11		1.518,110	111,79
287	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	635,58	13,72	8.720,15760	-					-	-
288	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	78,36	2,82	220,97520	74,88		74,88	211,16		211,160	95,56
	HORMIGONES					-						
289	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	7,20	163,18	1.174,89600						-	-
290	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF'C = 280KG./Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	29,00	225,97	6.553,13000	-					-	-
291	HORMIGON PREMEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	84,75	283,42	24.019,84500	-					-	-
292	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	14,26	289,16	4.123,42160	-					-	-
293	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F'C=180 KG/Cm2-50por cientoP)CIm	m3	56,51	169,86	9.598,78860	0,33		0,33	56,05		56,050	0,58
	ACERO ESTRUCTURAL					-						
294	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	9.807,60	1,68	16.476,76800	994,83		994,83	1.671,31		1.671,310	10,14
295	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2	3.325,46	4,84	16.095,20220	-					-	
	CONTRAPISOS					-						

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES No. 23 - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
296	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3 (CONTRAPISO E=20Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	282,00	10,78	3.039,96000	-					-	-
297	mATERIAL DE BASE CLASE 2 (CONTRAPISO E=15Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	211,86	24,55	5.201,16300	-					-	
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS					-						
	CUBIERTA					-						
	BAJANTES AGUA LLUVIA					-						
298	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	12,00	90,42	1.085,04000	-					-	
299	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m	161,40	20,59	3.323,22600	-					-	
300	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO DIAm. INT.= 200A 160mm PVC Y/O POLIETILENO	u		20,71		-					-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES					-						
301	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	40,00	10,27	410,80000	-					-	
302	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	40,00	5,26	210,40000	-					-	
303	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	40,00	4,72	188,80000	-					-	
	10.- SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACIÓN					-						
	POZOS DE REVISION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS					-						
304	CAJA REVISION mEDIA TENSION 90X90X90 C/VIA, T/HA	u		169,45		-					-	
305	CAJA REVISION mEDIA TENSION 60X60X75,ACERA, T/HA	u	41,00	179,17	7.345,97000	-					-	
306	PuESTA A TIERRA SImPLE EN POZO ELECTRICO CON SuELDA EXOTERmICA	u	4,00	164,46	657,84000	-					-	
	SISTEMA SOTERRADO DE MEDIA TENSION					-						
307	BAJADA DE DE mEDIA TENSION AEREA SOTERRADA	u	4,00	600,70	2.402,80000	-					-	
308	TENDIDO DE TuBO RIGIDO 1 1/2" DOBLE	m		16,92		-					-	
309	SISTEmA A TIERRA DE mEDIA TENSION	u	1,00	1.781,59	1.781,59000	-					-	
310	PARARRAYOS 10 KV, CON PERNOS SuJECCION	u	3,00	84,46	253,38000	-					-	
311	SECCIONAmIENTO TRIFASICO AEREO SuBTERRANEO S3A/S, INC. PARARRAYOS	u	3,00	1.290,60	3.871,80000	-					-	
312	TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNuDO NO. 2 AWG	m	500,00	5,92	2.960,00000	102,02		102,02	603,96		603,96	20,40%
313	TENDIDO Y REGuLADO DE CABLE DE COBRE XLPE NO2-15KV	u	1.600,00	14,75	23.600,00000	36,66		36,66	540,74		540,74	2,29%
314	TENDIDO CONDuCTOR: TTu 2/0	m		36,79		-					-	
315	TENDIDO CONDuCTOR: TTu 3/0	m		45,20		-					-	
316	mALLA DE PuESTA A TIERRA EN CENTRO DE TRANSFORmACION CON SuELDA EXOTERmICA	u	4,00	581,10	2.324,40000	-					-	
317	BANCO DE DuCTOS 1X2 DE 110mm 1X2B1-B2	m	1.800,00	32,94	59.292,00000	-					-	
318	mONTAJE DE TRANSFORmADOR PADmOuNTED TRIFASICO TIPO mALLA DE 50KVA-13.8KV-127/220V	u	1,00	7.092,79	7.092,79000	-					-	
319	mONTAJE DE TRANSFORmADOR PADmOuNTED TRIFASICO TIPO mALLA DE 100KVA-13.8KV-127/220V	u	1,00	12.135,60	12.135,60000	-					-	
320	PuNTA TERmINAL AT TIPO EXTERIOR CABLE N° 2 AWG	u		170,72		-					-	
321	PuNTA TERmINAL AT TIPO INTERIOR CABLE N° 2 AWG	u	3,00	170,72	512,16000	-					-	
322	ACOmETIDA PRINCIPAL ELECTRICA	m	15,00	6,22	93,30000	-					-	
	INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO					-						
323	POSTES ORNAmENTALES DE 8mTS Y BRAZOS	u	57,00	799,03	45.544,71000	-					-	
324	LumINARIA ORNAmENTAL LED120W	u	82,00	532,37	43.654,34000	-					-	
325	LumINARIA ORNAmENTAL LED 60W	u	33,00	387,65	12.792,45000	-					-	
326	TENDIDO DE CONDuCTOR 1No. NO. 4 TTu	m	4.647,00	8,10	37.640,70000	1.516,28	611,83	2128,11	12.281,87	4.955,82	17.237,69	45,80%
327	mONTAJE DE TRANSF, mONO. PADmOuNTED 10 KVA	u	1,00	5.210,22	5.210,22000	-					-	
	AREA ADMINISTRATIVA PLANTA BAJA					-						
	INSTALACION LUMINARIAS					-						
328	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	636,00	3,34	2.124,24000	112,07		112,07	374,31		374,31	17,62%
329	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	218,00	1,18	257,24000	-					-	
330	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	620,00	0,56	347,20000	-					-	
331	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	350,00	4,87	1.704,50000	-					-	
332	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	150,00	1,57	235,50000	-					-	
333	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AmARILLO (INC. TAYPE)	m	1.043,00	2,28	2.378,04000	-					-	
334	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	1.043,00	1,43	1.491,49000	-					-	
335	LumINARIA LED 3X18W/120 VOLTIOS	u	130,00	60,59	7.876,70000	25,00		25,00	1.514,75		1.514,75	19,23%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES No. 23 - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
336	LumINARIA LED 24W/120 VOLTIOS	u	14,00	58,36	817,04000	10,00	2,00	12,00	583,60	116,72	700,32	85,71%
337	INTERRuPTOR SImPLE CON TAPA	u	38,00	5,47	207,86000	9,00		9,00	49,23		49,23	23,68%
338	INTERRuPTOR DOBLE CON TAPA	u	14,00	6,16	86,24000	-					-	
339	INTERRuPTOR CONmuTADOR DE 3 VIAS	u	17,00	7,30	124,10000	13,00		13,00	94,90		94,90	76,47%
	TOMACORRIENTES GENERALES					-						
340	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	780,00	3,34	2.605,20000	353,82	11,46	365,28	1.181,76	38,28	1.220,04	46,83%
341	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	260,00	1,18	306,80000	-					-	
342	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	570,00	0,56	319,20000	25,00	12,00	37,00	14,00	6,72	20,72	6,49%
343	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	390,00	4,87	1.899,30000	-					-	
344	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	892,00	1,43	1.275,56000	282,63	35,44	318,07	404,16	50,68	454,84	35,66%
345	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	892,00	1,43	1.275,56000	262,73	35,44	298,17	375,70	50,68	426,38	33,43%
346	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	892,00	1,03	918,76000	262,73	35,44	298,17	270,61	36,50	307,11	33,43%
347	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	130,00	1,57	204,10000	44,00		44,00	69,08		69,08	33,85%
348	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	130,00	7,45	968,50000	52,00		52,00	387,40		387,40	40,00%
	TOMACORRIENTES REGULADOS UPS					-						
349	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	195,00	3,34	651,30000	125,15		125,15	418,00		418,00	64,18%
350	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	65,00	1,18	76,70000	16,00		16	18,88		18,88	24,62%
351	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	106,00	0,56	59,36000	47,00		47,00	26,32		26,32	44,34%
352	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	100,00	4,87	487,00000	-					-	
353	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	24,00	1,57	37,68000	6,00		6,00	9,42		9,42	25,00%
354	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	267,00	1,43	381,81000	178,88		178,88	255,80		255,80	67,00%
355	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	267,00	1,43	381,81000	178,88		178,88	255,80		255,80	67,00%
356	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	267,00	1,03	275,01000	178,88		178,88	184,25		184,25	67,00%
357	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	24,00	7,45	178,80000	-					-	
	AREA ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA					-						
	INSTALACION LUMINARIAS					-						
358	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	584,00	3,34	1.950,56000	127,38		127,38	425,45		425,45	21,81%
359	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	194,00	1,18	228,92000	-					-	
360	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	570,00	0,56	319,20000	-					-	
361	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	500,00	4,87	2.435,00000	-					-	
362	CAJETINES mETALICOS OCTOGONALES mEDIANOS CON TAPA	u	900,00	5,44	4.896,00000	57,00	4,00	61,00	310,08	21,76	331,84	6,78%
363	CAJETINES mETALICOS CuADRADOS CON TAPA 10X10	u	5,00	4,99	24,95000	-					-	
364	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	60,00	1,57	94,20000	-					-	
365	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AmARILLO (INC. TAYPE)	m	1.200,00	2,28	2.736,00000	-					-	
366	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	1.200,00	1,43	1.716,00000	-					-	
367	LumINARIA LED 3X18W/120 VOLTIOS	u	180,00	60,59	10.906,20000	-					-	
368	LumINARIA LED 24W/120 VOLTIOS	u	33,00	58,36	1.925,88000	-					-	
369	INTERRuPTOR SImPLE CON TAPA	u	50,00	5,47	273,50000	13,00		13,00	71,11		71,11	26,00%
370	INTERRuPTOR DOBLE CON TAPA	u	15,00	6,16	92,40000	-					-	
371	INTERRuPTOR TRIPLE CON TAPA	u	4,00	7,30	29,20000	-					-	
372	INTERRuPTOR CONmuTADOR DE 3 VIAS	u		7,30		-					-	
	TOMACORRIENTES GENERALES					-						
373	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	895,00	3,34	2.989,30000	76,29	32,93	109,22	254,81	109,99	364,80	12,20%
374	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	300,00	1,18	354,00000	-					-	
375	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	670,00	0,56	375,20000	-					-	
376	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	400,00	4,87	1.948,00000	-					-	
377	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	4.000,00	1,43	5.720,00000	-					-	
378	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	1.080,00	1,43	1.544,40000	-					-	
379	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	1.080,00	1,03	1.112,40000	-					-	
380	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	155,00	1,57	243,35000	10,00	5,00	15,00	15,70	7,85	23,55	9,68%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES No. 23 - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
381	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	170,00	7,45	1.266,50000	-					-	
	TOMACORRIENTES REGULADOS UPS					-						
382	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	368,00	3,34	1.229,12000	114,38		114,38	382,03		382,03	31,08%
383	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	125,00	1,18	147,50000	-					-	
384	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	220,00	0,56	123,20000	5,00		5	2,80		2,80	2,27%
385	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	190,00	4,87	925,30000	-					-	
386	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	48,00	1,57	75,36000	10,00		10,00	15,70		15,70	20,83%
387	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	489,00	1,43	699,27000	122,28		122,28	174,86		174,86	25,01%
388	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	489,00	1,43	699,27000	122,28		122,28	174,86		174,86	25,01%
389	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	489,00	1,03	503,67000	122,28		122,28	125,95		125,95	25,01%
390	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	48,00	7,45	357,60000	13,00		13,00	96,85		96,85	27,08%
	ALIMENTACION AIREACONDICIONADO PLANTA BAJA Y ALATA					-						
391	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	600,00	3,34	2.004,00000	-					-	
392	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	250,00	1,18	295,00000	-					-	
393	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	200,00	0,56	112,00000	-					-	
394	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	248,00	4,87	1.207,76000	-					-	
395	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	885,00	1,43	1.265,55000	172,82		172,82	247,13		247,13	19,53%
396	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	885,00	1,43	1.265,55000	172,82		172,82	247,13		247,13	19,53%
397	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	885,00	1,43	1.265,55000	172,82		172,82	247,13		247,13	19,53%
398	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	50,00	1,57	78,50000	-					-	
399	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 220 V	u	50,00	7,45	372,50000	-					-	
	AREA DE MECANICA PESADA Y LIVIANA					-						
	INSTALACION LUMINARIAS					-						
400	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	540,00	3,34	1.803,60000	131,30		131,30	438,54		438,54	24,31%
401	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	66,00	1,18	77,88000	51,00		51,00	60,18		60,18	77,27%
402	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	132,00	0,56	73,92000	161,00		161,00	90,16		90,16	121,97%
403	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	436,00	4,87	2.123,32000	-					-	
404	CAJETINES mETALICOS CuADRADOS CON TAPA 10X10	u	20,00	4,99	99,80000	-					-	
405	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	65,00	1,57	102,05000	-					-	
406	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AmARILLO (INC. TAYPE)	m	88,00	2,28	200,64000	163,73		163,73	373,30		373,30	186,05%
407	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	88,00	1,43	125,84000	93,56		93,56	133,79		133,79	106,32%
408	LumINARIA LED 3X18W/120 VOLTIOS	u	11,00	60,59	666,49000	-					-	
409	LumINARIA LED 24W/120 VOLTIOS	u		58,36		-					-	
410	INTERRuPTOR SImPLE CON TAPA	u		5,47		-					-	
411	INTERRuPTOR DOBLE CON TAPA	u	1,00	6,16	6,16000	-					-	
412	INTERRuPTOR TRIPLE CON TAPA	u	1,00	7,30	7,30000	-					-	
413	LumINARIA LED 150W/220 VOLTIOS	u	53,00	193,85	10.274,05000	-					-	
414	TENDIDO DE CABLE CONCENTRICO 2X12 AWG(INC. TAYPE)	m	710,00	3,43	2.435,30000	692,08	46,96	739,04	2.373,84	161,07	2.534,91	104,09%
	TOMACORRIENTES GENERALES					-						
415	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	300,00	3,34	1.002,00000	105,83		105,83	353,47		353,47	35,28%
416	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	100,00	1,18	118,00000	-					-	
417	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	150,00	0,56	84,00000	7,00		7	3,92		3,92	4,67%
418	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	200,00	4,87	974,00000	-					-	
419	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	350,00	1,43	500,50000	208,18		208,18	297,70		297,70	59,48%
420	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	350,00	1,43	500,50000	208,18		208,18	297,70		297,70	59,48%
421	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	350,00	1,03	360,50000	208,18		208,18	214,43		214,43	59,48%
422	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	30,00	1,57	47,10000	18,00		18,00	28,26		28,26	60,00%
423	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	30,00	7,45	223,50000	8,00		8	59,60		59,60	26,67%
424	TuBERIA EmT 3/4 PuLGADA	m	250,00	3,47	867,50000	127,19		127,19	441,35		441,35	50,88%
425	TENDIDO DE CABLE CONCENTRICO NO.3X10 AWG (INC. TAYPE)	m	400,00	4,01	1.604,00000	236,52		236,52	948,45		948,45	59,13%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES No. 23 - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
426	TOmA ESPECIAL 220 VOLTIOS	u	25,00	11,10	277,50000	-					-	
	AREA DE CHAPISTERIA, LAVADO, TORNO, VULCANIZADORA					-						
	INSTALACION LUMINARIAS					-						
427	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	195,00	3,34	651,30000	26,78		26,78	89,45		89,45	13,73%
428	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	65,00	1,18	76,70000	-					-	
429	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	98,00	0,56	54,88000	64,00		64,00	35,84		35,84	65,31%
430	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	328,00	4,87	1.597,36000	-					-	
431	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	26,00	1,57	40,82000	-					-	
432	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AmARILLO (INC. TAYPE)	m	220,00	2,28	501,60000	-					-	
433	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	220,00	1,43	314,60000	-					-	
434	LumINARIA LED3X18W/120 VOLTIOS	u	45,00	60,59	2.726,55000	-					-	
435	LumINARIA LED 150W/220 VOLTIOS	u	20,00	193,85	3.877,00000	-					-	
436	TENDIDO DE CABLE CONCENTRICO 2X12 AWG(INC. TAYPE)	m	150,00	3,43	514,50000	114,20		114,20	391,71		391,71	76,13%
437	INTERRuPTOR SImPLE CON TAPA	u	20,00	5,47	109,40000	-					-	
	TOMACORRIENTES GENERALES					-						
438	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	635,00	3,34	2.120,90000	-					-	
439	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	212,00	1,18	250,16000	-					-	
440	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	315,00	0,56	176,40000	-					-	
441	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	428,00	4,87	2.084,36000	-					-	
442	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	550,00	1,43	786,50000	-					-	
443	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	550,00	1,43	786,50000	-					-	
444	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	550,00	1,03	566,50000	-					-	
445	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	40,00	7,45	298,00000	-					-	
446	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	42,00	1,57	65,94000	-					-	
447	TuBERIA EmT 3/4 PuLGADA	m	127,00	3,47	440,69000	74,68		74,68	259,14		259,14	58,80%
448	uNION EmT 3/4 PuLGADA	u	43,00	1,28	55,04000	20,00		20,00	25,60		25,60	46,51%
449	CONECTOR EmT 3/4 PuLGADA	u	86,00	0,77	66,22000	75,00		75,00	57,75		57,75	87,21%
450	TOmA ESPECIAL 220 VOLTIOS	u	10,00	11,10	111,00000	6,00		6,00	66,60		66,60	60,00%
	AREA DE RESGUARDO DE VEHICULOS					-						
	INSTALACION LUMINARIAS					-						
451	LumINARIA LED 150W/220 VOLTIOS	u	20,00	193,85	3.877,00000	-					-	
452	TENDIDO DE CABLE CONCENTRICO 2X12 AWG(INC. TAYPE)	m	512,00	3,43	1.756,16000	-					-	
	TOMACORRIENTES GENERALES					-						
453	TOmA ESPECIAL 220 VOLTIOS	u	8,00	11,10	88,80000	-					-	
454	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	8,00	1,57	12,56000	-					-	
	GRUPO ELECTROGENO					-						
	ACOMETIDA CENTRO DE TRANSFORMACION, GENERACION Y MEDICION DE ENERGIA					-						
455	mEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA INDIRECTO TRIFASICO 400/5A CLASE 0.5	u	1,00	3.275,86	3.275,86000	-					-	
456	CAJA DE PROTECCION GENERAL TRIFASICA NH-3X350A	u	1,00	468,19	468,19000	-					-	
457	GENERADOR DE EmERGENCIA EN CABINA INSONORA 50KVA TRIFASICO 127/220V	u	1,00	23.030,45	23.030,45000	-					-	
458	TABLERO DE TRANSFERENCIA AuTOmATICO TRIFASICO 3P/300A	u	1,00	4.845,70	4.845,70000	-					-	
459	PRuEBAS DE ENERGIZACION Y TRAmITES EmPRESA ELECTRICA, PAGOS (Global)	u	1,00	3.278,88	3.278,88000	-					-	
460	SISTEmA uPS TRIFÁSICODE 30 KVA	u	1,00	24.986,66	24.986,66000	-					-	
461	TABLERO DE BYPASS TRIFASICO 100A CON BARRAS DE COBRE	u	1,00	2.669,86	2.669,86000	-					-	
462	SISTEmA DE PROTECCION ATmOSFERICA PARRAYOS	u	2,00	1.643,60	3.287,20000	-					-	
	ALIMENTADORES Y SUBTABLEROS CT-1					-						
	ALIMENTADOR TDP-STE PB1					-						
463	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO.3X8+8Cu TW (INC. TAYPE)	m	18,00	12,44	223,92000	87,76		87,76	1.091,73		1.091,73	487,55%
464	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PB1	u	1,00	200,82	200,82000	-					-	
	ALIMENTADOR TDP-STE PB2					-						

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES No. 23 - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
465	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	31,00	14,51	449,81000	7,50		7,50	108,83		108,83	24,19%
466	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PB2	u	1,00	323,93	323,93000	-					-	
	ALIMENTADOR TDP-STE PB3					-						
467	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	41,00	14,51	594,91000	8,50		8,50	123,34		123,34	20,73%
468	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PB3	u	1,00	213,64	213,64000	1,00		1,00	213,64		213,64	100,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE PB4					-						
469	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	32,00	14,51	464,32000	9,80		9,80	142,20		142,20	30,63%
470	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PB4	u	1,00	226,90	226,90000	1,00		1,00	226,90		226,90	100,00%
	ALIMENTADOR TPD-STE PB5					-						
471	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	26,00	14,51	377,26000	8,90		8,90	129,14		129,14	34,23%
472	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PB5	u	1,00	226,90	226,90000	2,00		2,00	453,80		453,80	200,00%
	ALIMENTADOR TPD-STE-PB6					-						
473	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	132,00	14,51	1.915,32000	48,00		48,00	696,48		696,48	36,36%
474	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PB6	u	3,00	297,41	892,23000	-					-	
	ALIMENTADOR STD-STE-PA1					-						
475	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	41,00	14,51	594,91000	3,10		3,10	44,98		44,98	7,56%
476	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PA1	u	1,00	214,08	214,08000	-					-	
	ALIMENTADOR STD-STE-PA2					-						
477	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	111,00	14,51	1.610,61000	42,90		42,90	622,48		622,48	38,65%
478	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PA2	u	3,00	297,41	892,23000	-					-	
	ALIMENTADOR TPD-STE-PA3					-						
479	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	45,00	14,51	652,95000	10,10		10,10	146,55		146,55	22,44%
480	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PA3	u	1,00	230,78	230,78000	-					-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-PA4					-						
481	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	35,00	14,51	507,85000	57,40		57,40	832,87		832,87	164,00%
482	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PA4	u	1,00	304,26	304,26000	-					-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-PA5					-						
483	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	47,00	14,51	681,97000	51,60		51,60	748,72		748,72	109,79%
484	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PA5	u	2,00	217,52	435,04000	-					-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-PA6					-						
485	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	56,00	14,51	812,56000	11,80		11,80	171,22		171,22	21,07%
486	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PA6	u	1,00	310,67	310,67000	-					-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A1					-						
487	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	122,00	14,51	1.770,22000	-					-	
488	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6ESPACIOS A1	u	4,00	122,27	489,08000	-					-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A2					-						
489	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	130,00	14,51	1.886,30000	-					-	
490	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS A2	u	1,00	122,27	122,27000	-					-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR-A3					-						
491	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	57,00	14,51	827,07000	16,40		16,40	237,96		237,96	28,77%
492	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS A3	u	1,00	187,12	187,12000	-					-	
	ALIMENTADOR TPD-STE-ANGAR-A4					-						
493	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	92,00	14,51	1.334,92000	-					-	
494	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS A4	u	2,00	122,27	244,54000	-					-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A5					-						
495	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	95,00	14,51	1.378,45000	39,00		39,00	565,89		565,89	41,05%
496	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12ESPACIOS A5	u	1,00	200,82	200,82000	-					-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A6					-						
497	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	146,00	14,51	2.118,46000	-					-	
498	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS A6	u	2,00	122,27	244,54000	-					-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES No. 23 - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR-A7					-						
499	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	82,00	14,51	1.189,82000	38,40		38,40	557,18		557,18	46,83%
500	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS A7	u	1,00	228,23	228,23000	-					-	
	ALIMENTADOR TPD-STE-CONDENSADORES					-						
501	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	12,00	14,51	174,12000	20,00		20,00	290,20		290,200	167,00%
502	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS CONDENSADORES	u	1,00	738,12	738,12000	-					-	
	ALIMENTADORES Y SUBTABLEROS CT-2					-						
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A1					-						
503	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	41,00	14,51	594,91000	-	20,50	20,5		297,45	297,450	50,00
504	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12ESPACIOS ANGAR A1	u	1,00	187,12	187,12000	-					-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A2					-						
505	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	80,00	14,51	1.160,80000	-					-	
506	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS ANGAR 2	u	1,00	122,27	122,27000	-					-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR-A3					-						
507	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	55,00	14,51	798,05000	-					-	
508	SuBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS ANGAR 3	u	1,00	122,27	122,27000	-					-	
	ALIMENTADOR TPD-STE-ANGAR-A4					-						
509	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	40,00	14,51	580,40000	-					-	
510	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS ANGAR 4	u	1,00	173,41	173,41000	-					-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A5					-						
511	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	47,00	14,51	681,97000	6,43		6,43	93,30		93,30	13,68%
512	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12ESPACIOS ANGAR 5	u	1,00	173,41	173,41000	-					-	
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A6					-						
513	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	168,00	14,51	2.437,68000	-					-	
514	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS ANGAR 6	u	3,00	200,82	602,46000	2,00		2	401,64		401,64	66,67%
	ACOMETIDA B.V PRINCIPAL					-						
515	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 2/0 THHN	m	144,00	4,18	601,92000	-					-	
516	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 1/0 THHN	m	36,00	4,18	150,48000	-	50,01	50,01		209,04	209,040	138,92
	ACOMETIDA DE GENERADOR - TTA					-						
517	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 2/0 THHN	m	120,00	4,18	501,60000	-					-	
518	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 1/0 THHN	m	40,00	4,18	167,20000	131,20		131,20	548,42		548,42	328,00%
	ACOMETIDA DE TTA - TDP-N					-						
519	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 1/0 THHN	m	60,00	4,18	250,80000	124,00		124,00	518,32		518,32	206,67%
520	TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNuDO NO. 2 AWG	m	25,00	5,92	148,00000	-					-	
	ACOMETIDA DE TTA - TP					-						
521	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 1/0 THHN	m	40,00	4,18	167,20000	2,60		2,60	10,87		10,87	6,50%
522	TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNuDO NO. 2 AWG	m	14,00	5,92	82,88000	32,00		32,00	189,44		189,44	228,57%
	CERCO ELECTRICO CERRAMIENTO					-						
523	INSTALACION DE CENTRAL ENERGIZADORA 5K	u		594,89		-					-	
524	COLOCACION DE TuBERIA PREPARADA	u		10,70		-					-	
525	COLOCACION DE AISLADORES DE PASO DE ESQuINA Y PASANTE	u		5,26		-					-	
526	TENDIDO DE ALAmBRE SOLIDO GALVANIZADO	m		0,92		-					-	
527	TENDIDO DE CONDuCTOR DE COBRE DE ALTA TENSION 1/0	m		18,77		-					-	
528	INSTALACIONDE BATERIA Y SIRENA	m		962,28		-					-	
529	SISTEmA DE PuESTA A TIERRA	u		60,25		-					-	
	11.- SISTEMA HIDRAULICO SANITARIO Y CONTRAINCENDIOS					-						
	SITEMA DE AGUA POTABLE A PRESIÓN CONSTANTE					-						
	ACOMETIDA DE AGUA POTABLE					-						
530	TuBERIA PVC D=63 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m	470,00	4,09	1.922,30000	-					-	
531	CONEXION DOmICILIARIA INC.mEDIDOR,EN TuBO D=63mm	u	2,00	100,91	201,82000	-					-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES No. 23 - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
532	HIDRANTES D=3" INCLuYE ACCESORIOS	u	2,00	702,84	1.405,68000	-					-	
	TUBERIA PVC AGUA POTABLE					-						
533	TuBERIA PVC ROSCABLE D=1/2" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	361,00	5,86	2.115,46000	-					-	
534	TuBERIA PVC ROSCABLE D=3/4" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	59,58	6,59	392,63220	-					-	
535	TuBERIA PVC ROSCABLE D=1" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	158,67	9,78	1.551,79260	8,15		8,15	79,71		79,71	5,14%
536	TuBERIA PVC ROSCABLE D=1 1/2" EN EDIFICACION+PRuEB	m	98,92	16,09	1.591,62280	-					-	
537	TuBERIA PVC ROSCABLE D=2" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	45,08	14,86	669,88880	7,18	30,80	37,98	106,69	457,69	564,38	84,25%
538	TuBERIA PVC ROSCABLE D=2 1/2"" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	20,04	16,38	328,25520	-					-	
539	TuBERIA PVC ROSCABLE D=3" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	335,60	17,90	6.007,24000	-					-	
540	TuBERIA PVC ROSCABLE D=4" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	32,81	18,83	617,81230	26,95		26,95	507,47		507,47	82,14%
	ACCESORIOS INST. TUB PVC ROSCABLE AGUA POTABLE					-						
541	ANCLAJES mETALICOS PLATINA 2 por 1/2" (ABRAZADERAS), EN LOSA Y PARED	u	250,00	14,11	3.527,50000	-					-	
542	S.I. PuNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGuA por punto	u	90,00	13,67	1.230,30000	-					-	
543	S. I. PuNTO AGuA FRIA PVC ROSCABLE D = 2" por punto	u	35,00	63,31	2.215,85000	-					-	
544	VALVuLA DE BRONCE RW 2" +ACCESORIOS	u	5,00	34,99	174,95000	-					-	
545	LLAVE DE PASODE 1/2 PuLG	u	15,00	10,15	152,25000	-					-	
	SISTEMA DE AGUA CALIENTE					-						
546	S.I. PuNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGuA CALIENTE por punto	u		16,04		-					-	
547	TuBERIA AGuA CALIENTE PVC ROSCABLE D=1/2" EN EDIFICACION+PRuEBA	m		6,77		-					-	
548	CALENTADOR ELECTRICO ELECTRICO 15W	u		539,04		-					-	
	SISTEMA DE PRESION (BOMBEO) S AGUA POTABLE					-						
549	S. I. SISTEmA HIDRONEumATICO(2BOmBA5HP-TANQuE 19.8GAL-CAJA CONTROL-CONT. NIVEL-VÁLVuLA CHEQuE), uSO	u	1,00	7.104,62	7.104,62000	-					-	
550	S. I. SISTEmA HIDRONEumATICO(3BOmBA5HP-TANQuE 29.5GAL-CAJA CONTROL-CONT. NIVEL-VÁLVuLA CHEQuE), uSO	u	1,00	10.425,92	10.425,92000	-					-	
	SISTEMA CONTRAINCENDIOS					-						
551	S. I. TuBERÍA HG ASTmD = 2 ½" + PRuEBA	m	80,00	15,24	1.219,20000	45,02		45,02	686,10		686,10	56,27%
552	S.C. TuBERIA HG ASTm D = 1 1/2 " + PRuEBA	m	40,00	11,54	461,60000	-					-	
553	S. I. TEE HG ASTmD = 2½"	u	2,00	8,72	17,44000	-					-	
554	S. I. CODO HG ASTm90° X D = 2 ½"	u	10,00	6,70	67,00000	-					-	
555	S.I. uNION uNIVERSAL HG ASTm D = 2 1/2"	u	5,00	12,00	60,00000	17,00		17,00	204,00		204,00	340,00%
556	S.I. VALVuLA CHECK BRONCE D = 2 1/2 "	u	1,00	79,42	79,42000	-					-	
557	S. I. REDuCTOR HG ASTmD = 2 1/2" X 1 1/2"	u	1,00	9,48	9,48000	1,00		1,00	9,48		9,48	100,00%
558	S. I. uNIÓN uNIVERSAL HG ASTmD = 1 1/2"	u	5,00	8,23	41,15000	-					-	
559	S. I. CODO HG ASTm D = 1 1/2"	u	6,00	8,93	53,58000	-					-	
560	ANCLAJES mETALICOS PLATINA 2 por 1/2" (ABRAZADERAS), EN LOSA Y PARED	u	80,00	14,11	1.128,80000	-					-	
561	PuNTO H.G. ROSCABLE 1 1/2" AGuA por punto	u	2,00	74,00	148,00000	-					-	
562	PuNTO H.G. ROSCABLE 2" AGuA por punto	u	1,00	81,83	81,83000	-					-	
563	GAB CONT INCEN INC GAB SN VID, RACK DE INC Y mANG 100FT X1½"LLAVE SPANNER1½"NACHA, NIPLE DE BRONC Y P	u	2,00	749,90	1.499,80000	-					-	
564	SIAmESA 4"X 2 1/2" X 2 1/2" DE BRONCE	u	1,00	295,97	295,97000	-					-	
	EXTINTORES					-						
565	EXTINTOR PQS CAPACIDAD 10 LBS. CON CAJA mETALICA	u	16,00	99,84	1.597,44000	-					-	
566	EXTINTOR PQS CAPACIDAD 20 LBS. CON CAJA mETALICA	u	2,00	106,69	213,38000	-					-	
567	EXTINTOR CO2 CAPACIDAD 10 LBS. CON CAJA mETALICA	u	4,00	97,66	390,64000	-					-	
568	EXTINTOR CO2 CAPACIDAD 20 LBS. CON CAJA mETALICA	u	2,00	313,27	626,54000	-					-	
569	EXTINTOR CO2 CAPACIDAD TIPO SATELITE DE 50 LBS	u	1,00	578,23	578,23000	-					-	
	SISTEMA DE PRESION (BOMBEO) S CONTRAINCENDIOS					-						
570	S. I. SISTEmA HIDRONEumATICO(BOmBA-mOTOR-CAJA DE CONTROL-CONTROL DE NIVEL-VÁLVuLA CHEQuE), uSOCON	u	1,00	7.949,92	7.949,92000	-					-	
571	BOmBA JOCKEY; 1 HP, Q=8.70 GPm, PRES=110m; INCLuYE TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS	u	1,00	2.762,08	2.762,08000	-					-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES No. 23 - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	SISTEMA DE REUTILIZACION DE AGUAS LLUVIAS (RIEGO Y LAVADORA AUTO)					-						
572	REPLANTEO Y NIVELACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	m	250,00	1,81	452,50000	-					-	
573	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	200,00	17,93	3.586,00000	-					-	
574	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	200,00	6,32	1.264,00000	-					-	
575	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=160mm)	m	120,00	9,91	1.189,20000	61,08		61,08	605,30		605,30	50,90%
576	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	12,00	90,42	1.085,04000	-					-	
	TUBERIA PVC RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS					-						
577	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=160 mm S6	m	50,00	9,70	485,00000	463,56		463,56	4.496,53		4.496,53	927,12%
578	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT = 200 mm S6	m		15,28		-					-	
579	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 228 mm S6	m		15,88		-					-	
580	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 250 mm S6	m	90,00	16,51	1.485,90000	-					-	
581	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 300 mm S5	m	30,00	20,22	606,60000	-					-	
582	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=400 mm S5	m	428,11	38,33	16.409,45630	337,59		337,59	12.939,83		12.939,83	78,86%
583	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 450 mm S5	m	30,00	44,36	1.330,80000	-					-	
584	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 500 mm S5	m		74,42		-					-	
585	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 220A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u	3,00	21,28	63,84000	-					-	
586	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 335A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u	3,00	24,14	72,42000	27,00		27,00	651,78		651,78	900,00%
	TUBERIA PVC PRESIÓN RECOLECCION AGUAS LLUVIAS					-						
587	TuBERIA PVC D=3" 1.0 mPA + PRuBA	m	12,00	5,16	61,92000	-					-	
588	VALVuLA TIPO GLOBO (CONTROL NIVEL mECANICO)	u	2,00	17,82	35,64000	-					-	
589	ROCIADOR 3/4 Q=3.22 m3/H, RADIO COBERTuRA 15.8m, 5BAR	u		17,82		-					-	
590	TuBERIA PVC D=25 mm 1.0 mPA u/C + PRuEBA	m	80,00	2,98	238,40000	-					-	
591	TuBERIA PVC D=40 mm 1.0 mPA E/C + PRuEBA	m	20,00	3,38	67,60000	-					-	
592	TuBERIA PVC D=50 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m	20,00	3,50	70,00000	-					-	
593	TuBERIA PVC D=63 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m	47,00	4,09	192,23000	-					-	
594	TuBERIA PVC D=75 mm 1.0 mPA u/E + PRuBA	m	30,00	5,23	156,90000	-					-	
595	TuBERIA PVC D=90 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m	25,00	6,20	155,00000	-					-	
596	TuBERIA PVC D=110 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m		8,48		-					-	
597	TuBERIA PVC D=125 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m		11,54		-					-	
	SISTEMA DE PRESION (RIEGO Y LAVADORA AUTOS)					-						
598	GRuPO 2 BOmBAS15 HP (Q=12 L/S, TDH= 80mCA), (2BOmBA-mOTOR-CAJA DE CONTROL-CONTROL DE NIVEL-VÁLVuLA CH	u		6.465,34		-					-	
599	GRuPO 3 BOmBAS15 HP (Q=21 L/S, TDH= 80mCA), (3BOmBA-mOTOR-CAJA DE CONTROL-CONTROL DE NIVEL-VÁLVuLA CH	u	1,00	8.868,10	8.868,10000	-					-	
	SISTEMA SANITARIO INTERNO					-						
	PRELIMINARES Y MOV. TIERRAS					-						
600	REPLANTEO Y NIVELACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	m	390,00	1,81	705,90000	-					-	-
601	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	12,00	17,93	215,16000	-					-	
602	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3		6,32		-					-	
	INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE					-						
603	PuNTO DE DESAGuE EN PVC 50 mm	u	86,00	28,80	2.476,80000	-					-	-
604	PuNTO DE DESAGuE EN PVC 110 mm	u	45,00	34,43	1.549,35000	-					-	-
605	TuBERÍA PVC 50 mm DE DIÁmETRO (mAT/TRASP/INST)	m	125,60	5,14	645,58400	-					-	-
606	TuBERÍA PVC 110 mm DE DIÁmETRO (mAT/TRASP/INST)	m	420,00	8,02	3.368,40000	-		-			-	
607	TuBERÍA PVC 160 mm DE DIÁmETRO (mAT/TRASP/INST)	m	165,00	14,52	2.395,80000	-					-	-
608	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	6,00	90,42	542,52000	-					-	
	INSTALACION TUBERIA PVC DEVENTILACIÓN					-						
609	TuBERIA PVC D=75 mm VENTILACIÓN	m	78,00	4,27	333,06000	96,22		96,22	410,86		410,86	123,36%
610	PuNTO DE VENTILACIÓN PVC 75 mm por punto	u	25,00	15,61	390,25000	1,00		1,00	15,61		15,61	4,00%
	TANQUES DE RESERVA DE AGUA-CISTERNAS 49 M3					-						

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES No. 23 - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	PRELIMINARES					-						
611	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	68,64	1,14	78,24960	-					-	
612	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	60,00	1,46	87,60000	-					-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
613	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-					-	
614	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	201,65	4,18	842,89700	-					-	
615	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	m2		11,56		-					-	
616	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	41,00	13,72	562,52000	1,00		1,00	13,72		13,72	2,44%
617	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	10,00	6,32	63,20000	-					-	
	HORMIGONES					-						
618	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	4,10	163,18	669,03800	-					-	
619	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	29,66	249,88	7.411,44080	-					-	
	ACERO ESTRUCTURAL					-						
620	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	2.459,03	1,68	4.131,17040	-					-	
621	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	50,00	2,76	138,00000	-					-	
622	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	50,00	0,11	5,50000	-					-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES					-						
623	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	144,00	10,27	1.478,88000	-					-	
624	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	113,00	26,06	2.944,78000	14,18		14,18	369,48		369,48	12,55%
625	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	15,00	4,72	70,80000	-					-	
626	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u	2,00	75,58	151,16000	-					-	
	TANQUES DE RESERVA DE AGUA-CISTERNAS 11 M3					-						
	PRELIMINARES					-						
627	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1,14		-					-	
628	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	36,80	1,46	53,72800	-					-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
629	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	5,00	17,93	89,65000	-					-	
630	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	97,58	4,18	407,88440	-					-	
631	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	m2	17,00	11,56	196,52000	-					-	
632	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	55,20	13,72	757,34400	-					-	
633	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	5,00	6,32	31,60000	-					-	
	HORMIGONES					-						
634	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	1,66	163,18	270,87880	-					-	
635	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	16,93	249,88	4.230,46840	-					-	
	ACERO ESTRUCTURAL					-						
636	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	1.490,00	1,68	2.503,20000	-					-	
637	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	40,00	2,76	110,40000	-					-	
638	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	40,00	0,11	4,40000	-					-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES					-						
639	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	69,83	10,27	717,15410	-					-	
640	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	69,83	26,06	1.819,76980	-					-	
641	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	15,00	4,72	70,80000	-					-	
642	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u	2,00	75,58	151,16000	-					-	
	TANQUES DE RESERVA DE AGUA-CISTERNAS 36 M3(REUTILIZACION AGUA LLUVIA)					-						

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES No. 23 - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	PRELIMINARES					-						
643	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1,14		-					-	
644	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2		1,46		-					-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
645	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-					-	
646	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3		4,18		-					-	
647	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	m2		11,56		-					-	
648	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3		13,72		-					-	
649	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3		6,32		-					-	
	HORMIGONES					-						
650	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3		163,18		-					-	
651	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRANSPORTE	m3		249,88		-					-	
	ACERO ESTRUCTURAL					-						
652	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg		1,68		-					-	
653	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg		2,76		-					-	
654	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg		0,11		-					-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES					-						
655	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2		10,27		-					-	
656	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2		26,06		-					-	
657	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2		4,72		-					-	
658	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u		75,58		-					-	
	TANQUES DE RESERVA DE AGUA-CISTERNAS 20 M3(REUTILIZACION AGUA LLUVIA)					-						
	PRELIMINARES					-						
659	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1,14		-					-	
660	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2		1,46		-					-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
661	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-					-	
662	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3		4,18		-					-	
663	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	m2		11,56		-					-	
664	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3		13,72		-					-	
665	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3		6,32		-					-	
	HORMIGONES					-						
666	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3		163,18		-					-	
667	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRANSPORTE	m3		249,88		-					-	
	ACERO ESTRUCTURAL					-						
668	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg		1,68		-					-	
669	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg		2,76		-					-	
670	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg		0,11		-					-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES					-						
671	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2		10,27		-					-	
672	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2		26,06		-					-	
673	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2		4,72		-					-	
674	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u		75,58		-					-	
	TRAMPA DE GRASAS					-						

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES No. 23 - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
675	TRAmPA DE GRASAS 0.60 por 1.40 por H=1.70 (F'C= 210 KG/Cm2), INC. ACCESORIOS	u		161,89		-					-	
676	SumINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA H.F. (1.00 por 0.40 por 0.05)110 KG	u		130,84		-					-	
677	CANAL. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 , E= 10Cm + 1Ø10mm A 12Cm	m		90,42		-					-	
	12.- SISTEMA DE ING. MECANICA (CLIMATIZACIÓN, AIRE PRESURIZADO, ELEVADORES HIDRAULICO, CABINA PINTURA					-						
	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN					-						
678	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 9,500 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CON	u		1.235,36		-					-	
679	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 12000 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CON	u		1.318,07		-					-	
680	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 18000 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CON	u		1.349,08		-					-	
681	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 24,000 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CO	u	2,00	1.504,15	3.008,30000	-					-	
682	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 30,000 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CO	u		1.561,01		-					-	
683	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 36,000 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CO	u	5,00	1.767,77	8.838,85000	-					-	
684	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 1/4 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉRmICO	m	60,00	11,74	704,40000	-					-	
685	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 1/2 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉRmICO	m	68,00	12,29	835,72000	-					-	
686	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 3/4 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉRmICO	m	8,00	18,29	146,32000	-					-	
687	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 5/8 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉRmICO	m	50,00	15,65	782,50000	19,81		19,81	310,03		310,03	39,62%
688	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 3/8 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTOTÉRmICO	m	50,00	11,96	598,00000	18,67		18,67	223,29		223,29	37,34%
689	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 1-1/8 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉRmICO	m	28,00	30,40	851,20000	-					-	
690	SOPORTE DE TuBERÍA DE COBRE	u	45,00	14,95	672,75000	10,00		10,00	149,50		149,50	22,22%
691	TuBERIA PVC DIAmETRO 50 mm	m	260,00	7,31	1.900,60000	-					-	
692	TuBERIA PVC DIAmETRO 75 mm	m	20,00	7,42	148,40000	-					-	
693	DuCTO DE TOL TOLGALVANIZADO	Kg		5,81		-					-	
694	REJILLA EXTRACCIÓN/SumINISTRO TIPO LOuVER CON ALETASFIJAS DE ACERO 12X12,INCLuYE CAJA mETALICA	u		83,69		-					-	
695	REJILLA SumINISTRO TIPO LOuVER CON ALETAS mÓVILES Y FIJAS DE ACERO 12X12,INCLuYE CAJA mETALICA	u		95,12		-					-	
696	DuCTO FLEXIBLE DIÁmETRO 6"	u		13,60		-					-	
697	DuCTO FLEXIBLE DIÁmETRO 4"	u		13,36		-					-	
698	VENTILADOR CENTRIFuGO EN LÍNEA PARA TumBADO 2500 CFm @ 0.35 PLG. H2O,1,5 HP	u		1.515,23		-					-	
699	VENTILADOR CENTRIFuGO EN LÍNEA PARA TumBADO 1700 CFm @ 0.32 PLG. H2O,1HP	u		1.401,52		-					-	
700	VENTILADOR CENTRIFuGO TIPO DOWNBLAST PARA TECHO 500 CFm @ 0.32 PLG. H2O,1,4HP	u		1.378,78		-					-	
701	uNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR TIPO VRV, DC INVERTER, 118,000 BTu/H	u	2,00	9.376,49	18.752,98000	-					-	
702	uNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR TIPO VRV, DC INVERTER, 140,000 BTu/H	u		10.286,22		-					-	
703	uNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR TIPO VRV, DC INVERTER, 158,000 BTu/H	u		12.426,17		-					-	
704	uNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR TIPO VRV, DC INVERTER, 188,000 BTu/H	u		11.754,19		-					-	
705	CONTROL CENTRALIZADO PARA LAS uNIDADES CONDENSADORAS	u	1,00	2.505,01	2.505,01000	-					-	
706	S. I. EXTRACTOR EÓLICO INDuSTRIAL,TuRBINA=112 Cm, DuCTO 61Cm; ALTuRA=85Cm,ASPAS ALumINIO BASE GALVA	u	50,00	326,58	16.329,00000	-					-	
	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO					-						
707	COmPRESOR DE AIRE DE PISTÓN 15 HP, CuATRO PISTONES, LuBRICACIÓN CON ACEITE,220 V, TRIFASICO, 60 HZ	m	2,00	5.513,68	11.027,36000	-					-	
708	TuBERIA DE COBRE DIAmETRO 1-1/2 PLG. TIPO L, SOLDADA	m	380,00	33,29	12.650,20000	-					-	
709	TuBERIA DE COBREDIAmETRO 1/2 PLG. TIPO L, SOLDADA	m	100,00	10,49	1.049,00000	-					-	
710	VÁLVuLAS DE BOLA DE 1/2 PLG DE BRONCE	m	26,00	10,80	280,80000	-					-	
711	SOPORTE DE TuBERÍA DE COBRE	u	70,00	14,95	1.046,50000	-					-	
	CABINA PARA PINTURA					-						
712	Sum E INST. CABINA PARA PINTuRA HORNO ANCHO=3.68, ALTO=3.275, LARGO=6.80; ESPESOR PARED 40mm, NOmINAL	u	1,00	38.677,92	38.677,92000	-					-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES No. 23 - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	ELEVADOR HIDRAULICO					-						
713	ELEVADOR HIDRAuLICO mOVIL TIPO 4 COLumNAS, ST 1075, CAP=16500 LBS, ALT ELEVACION =73", 3 HP/4HP POR C	u	1,00	43.151,04	43.151,04000	-					-	
	13.- SISTEMA ELECTRONICO, VOZ, DATOS, INCENDIOS)					-						
	CANALIZACION					-						
714	POZO DE REVISION 60X60X60Cm	u	23,00	158,53	3.646,19000	-					-	
715	BANDEJA TIPO ESCALERILLA 10CmX8Cm INCLuYE ACCESORIOS	m	172,00	46,57	8.010,04000	-					-	-
716	BANDEJA TIPO ESCALERILLA 25CmX10Cm INCLuYE ACCESORIOS	m	324,00	100,74	32.639,76000	-					-	-
717	TuBERIA PVC REFORZADA 4"	m	780,00	20,27	15.810,60000	-					-	-
718	TuBERÍA CONDuIT EmT 1/2" DE DIÁmETRO INCLuIDO ACCESORIOS	m	50,00	7,21	360,50000	-					-	
719	TuBERÍA CONDuIT EmT 3/4" DE DIÁmETRO INCLuIDO ACCESORIOS	m	50,00	16,51	825,50000	-					-	
720	TuBERÍA CONDuIT EmT 1" DE DIÁmETRO INCLuIDO ACCESORIOS	m	120,00	19,19	2.302,80000	440,69		440,69	8.456,85		8.456,85	367,24%
721	POSTE mETALICO	u		923,51		-					-	
	SISTEMA DE VOZ Y DATOS					-						
722	PuNTO DE RED DE DATOS CON CABLE FTP 6A	u	197,00	151,66	29.877,02000	20,00		20,00	3.033,20		3.033,20	10,15%
723	RACK DE SALA DE EQuIPOS TIPO ARmARIO 42 uR	u	1,00	1.817,12	1.817,12000	-					-	
724	RACK DE SALA DE COmuNICACIONES TIPO ARmARIO 42 uR	u	1,00	1.617,13	1.617,13000	-					-	
725	RACK DE SALA DE COmuNICACIONES TIPO ARmARIO 12 uR	u	3,00	742,45	2.227,35000	-					-	
726	PATCH PANEL 24 PuERTOS RJ45 CATEGORIA 6A BLINDADO mODuLAR	u	12,00	213,78	2.565,36000	-					-	
727	PATCH COORD CATEGORIA 6A FTP 1 m	u	197,00	20,17	3.973,49000	25,00		25	504,25		504,25	12,69%
728	PATCH COORD CATEGORIA 6A FTP 10 PIES	u	197,00	21,78	4.290,66000	-					-	
729	VERIFICACION Y PRuEBAS DE CATEGORIA	u	197,00	18,92	3.727,24000	20,00		20	378,40		378,40	10,15%
730	SWITCH 24 PuERTOS RJ45, CAPA 2, POE, mODuLAR SFP+	u	8,00	1.753,78	14.030,24000	-					-	
731	SWITCH 24 PuERTOS RJ45, CAPA 2, mODuLAR SFP+	u	4,00	1.042,64	4.170,56000	-					-	
732	SWITCH 24 PuERTOS RJ45, CAPA 3, POE, mODuLAR SFP+	u	1,00	1.410,88	1.410,88000	-					-	
733	mODuLO PARA SWITCH CON 2 PuERTOS DE 10 GBPS PARA STACK	u	2,00	2.555,02	5.110,04000	-					-	
734	CABLE FLEXIBLE PARA STACK CON 2 CONECTORES DE 10 GBPS	u	8,00	454,27	3.634,16000	-					-	
735	mODuLO PARA SWITCH CON 2 PORTICOS DE 10GBPS (SFP+)	u	2,00	2.557,78	5.115,56000	-					-	
736	TRANSCEIVER DE 10 GBPS (SFP+)	u	8,00	3.317,76	26.542,08000	-					-	
737	PATCH COORD DE FIBRA OPTICA 3mT	u	10,00	62,35	623,50000	-					-	
738	ACCES POINT	u	9,00	643,76	5.793,84000	-					-	
739	CONTROLADOR DE RED INALAmBRICA	u	2,00	4.213,78	8.427,56000	-					-	
740	FIBRA OPTICA muLTImODO 6 HILOS	u	500,00	15,04	7.520,00000	100,00		100	1.504,00		1.504,00	20,00%
741	BANDEJA DE FIBRA OPTICA 12 PuERTOS CON CONECTORES LC	u	1,00	411,79	411,79000	-					-	
742	BANDEJA DE FIBRA OPTICA 6 PuERTOS	u	4,00	263,96	1.055,84000	-					-	
743	FuSIONADO DE FIBRA OPTICA INCLuYE PIGTAIL Y CERTIFICACION	u	10,00	98,34	983,40000	6,00		6	590,04		590,04	60,00%
744	PuERTA ANTI FuEGO	u	2,00	2.765,74	5.531,48000	-					-	
745	uPS 15 KVA	u	1,00	6.207,31	6.207,31000	-					-	
746	TABLERO BYPASS PARA DATA CENTER	u	1,00	2.070,65	2.070,65000	-					-	
747	TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL PARA DATA CENTER	u	1,00	2.236,86	2.236,86000	-					-	
748	BORNERA DE INSTALACION A TIERRA PARA RACK	u	5,00	22,92	114,60000	-					-	
749	BARRA PARA CONEXIÓN A TIERRA 8mmX12mm	u	5,00	48,71	243,55000	-					-	
750	CABLE THHN No. 6 AWG 19H	u	100,00	17,95	1.795,00000	-	31,50	31,5		565,43	565,430	31,50
751	PuNTO DE VIDEO VGA	u	7,00	127,50	892,50000	-					-	
752	EQuIPO uTm PARA 100 uSuARIOS INCLuYE SISTEmA DE TELEFONÍA	u	1,00	27.174,40	27.174,40000	-					-	
753	TELEFONO IP NORmAL	u	41,00	110,92	4.547,72000	-					-	
754	TELEFONO IP GERENCIAL	u	4,00	213,78	855,12000	-					-	
755	PROGRAmACION Y PuESTA EN mARCHA DEL SISTEmA	u	1,00	1.266,70	1.266,70000	-					-	
	SISTEMA DE SONORIZACION					-						
756	CENTRAL DE SONIDO	u	1,00	11.071,93	11.071,93000	-					-	
757	PARLANTE DECORATIVO PARA CIELO FALSO CON TRANSFORmADOR DE LINEA	u	24,00	41,20	988,80000	-					-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES No. 23 - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
758	ALTAVOZ EXTERIOR30W (BOCINA)	u	8,00	174,70	1.397,60000	-					-	
759	PuNTO DE SONIDO	u	32,00	41,17	1.317,44000	-					-	
760	PuNTO DE mICROFONO	u	3,00	52,26	156,78000	-					-	
761	CONTROL DE VOLumEN	u	3,00	145,81	437,43000	-					-	
762	ALTAVOCES PARA AuDITORIO CON AmPLIFICADOR INCLuIDO 400W	u	4,00	625,13	2.500,52000	-					-	
763	PuNTO DE SONIDO PARA AuDITORIO	u	4,00	77,68	310,72000	-					-	
764	CENTRAL DE SONIDO PARA AuDITORIO	u	1,00	2.236,64	2.236,64000	-					-	
765	PROGRAmACION Y PuESTA EN mARCHA DEL SISTEmA DE SONORIZACION	u	1,00	749,33	749,33000	-					-	
	SISTEMA DE INCENDIO					-						
766	ESTACION mANuAL DE ALARmA DE EmERGENCIA	u	24,00	93,78	2.250,72000	-					-	
767	LuZ ESTROBOSCOPICA	u	24,00	133,78	3.210,72000	-					-	
768	DETECTOR DE HumO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE	u	93,00	91,90	8.546,70000	10,00	1,00	11	919,00	91,90	1.010,90	11,83%
769	DETECTOR TERmICO DIRECCIONABLE	u	8,00	91,90	735,20000	-					-	
770	PuNTO DE ALARmAS DE INCENDIO	u	153,00	73,78	11.288,34000	-	1,00	1,00		73,78	73,780	0,65%
771	CENTRAL DE INCENDIO DIRECCIONABLE	u	1,00	3.176,64	3.176,64000	-					-	
772	mODuLOS DE AISLADORES DE CORTO CIRCuITO	u	5,00	81,40	407,00000	-					-	
773	mODuLOS DE mONITOREO DE ZONAS	u	4,00	78,54	314,16000	-					-	
774	ANuNCIADOR REmOTO	u	1,00	438,28	438,28000	-					-	
775	LAmPARAS DE EmERGENCIA	u	54,00	52,63	2.842,02000	-					-	
776	LAmPARAS DE AVISO DE SALIDA	u	16,00	45,78	732,48000	-					-	
777	FuENTE REmOTA DE ALARmAS DE INCENDIO	u	1,00	797,28	797,28000	-					-	
778	SEÑALETICA INCENDIOS	u	34,00	26,35	895,90000	-					-	
779	PROGRAmACION Y PuESTA EN mARCHA EL SISTEmA DE INCENDIO	u	1,00	1.045,26	1.045,26000	-					-	
	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS					-						
780	CERRADuRA ELECTROmAGNETICA 600LB	u	20,00	139,78	2.795,60000	-	2,00	2		279,56	279,560	10,00
781	PuLSANTE DE SALIDA PARA CONTROL DE ACCESOS	u	11,00	29,53	324,83000	-					-	
782	LECTOR DE PROXImIDAD CON TECLADO	u	17,00	252,04	4.284,68000	-					-	
783	CONTACTO mAGNETICO	u		15,29		-					-	
784	CONTROLADOR DE ACCESOS - CONTROL DE COmuNICACIONES	u	5,00	649,13	3.245,65000	-					-	
785	TARJETAS PARA CONTROL DE ACCESOS	u	36,00	18,06	650,16000	-					-	
786	PuNTO PARA ELEmENTOS DE CONTROL DE ACCESOS	u	48,00	47,14	2.262,72000	-					-	
787	CABLE EKKX 10 PARES	u	500,00	17,21	8.605,00000	-					-	
788	DETECTORES INFRARROJOS	u	35,00	23,94	837,90000	-					-	
789	SIRENAS Y ALARmAS DE SEGuRIDAD	u	3,00	52,87	158,61000	-					-	
790	PANEL CONTROLADOR DE ALARmAS	u	2,00	187,58	375,16000	-					-	
791	PuNTOS DEL SISTEmA DE SEGuRIDAD	u	38,00	75,29	2.861,02000	-					-	
792	SEÑALETICA DE ACCESOS	u	4,00	26,35	105,40000	-					-	
793	BARRERAS	u		1.929,64		-					-	
794	LOOPS	u		134,81		-					-	
795	LECTOR BIOmETRICO	u	3,00	207,83	623,49000	-					-	
796	PROGRAmACION Y PuESTA EN mARCHA EL SISTEmA DE CONTROL DE ACCESOS	u	1,00	690,14	690,14000	-					-	
	SISTEMA DE CCTV					-						
797	VIDEOGRABADOR DIGITAL NVR	u	1,00	2.926,25	2.926,25000	-					-	
798	mONITOR A COLOR LED FHD 32"	u	1,00	1.601,28	1.601,28000	-					-	
799	CAmARA IP DE CCTV FIJA EN DOmO	u	21,00	218,46	4.587,66000	-					-	
800	CAmARA IP DE CCTV TIPO BALA	u	2,00	206,92	413,84000	-					-	
801	CAmARA IP DE CCTV PTZ EN DOmO	u	9,00	728,00	6.552,00000	-					-	
802	CAmARAIP 360 (FISHERE)	u	10,00	1.039,01	10.390,10000	-					-	
803	CONTROLADOR PARA CAmARA mOVIL CON TECLADO Y JOYSTICK	u	1,00	752,94	752,94000	-					-	
804	PROGRAMACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS, TASA DE GRABACION, IDENTIFICACION DE AREAS	u	1,00	948,85	948,85000	-					-	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES No. 23 - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	SISTEMA DE PANTALLAS INFORMATIVAS					-						
805	SERVIDOR DEL SISTEmA DE INFORmACION Y TV IP	u	1,00	10.774,19	10.774,19000	-					-	
806	CONVERTIDOR NAVEGADOR INTERNET TV	u	1,00	2.084,90	2.084,90000	5,00		5	10.424,50		10.424,50	500,00%
807	TELEVISOR LCD 32"	u	7,00	1.601,28	11.208,96000	-					-	
808	PROGRAmACION Y PuESTA EN mARCHA EL SISTEmA DE PANTALLAS INFORmATIVAS	u	1,00	867,70	867,70000	-					-	
	14.- CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA Y GARITA					-						
	BATERIA SANITARIA GENERAL JUNTO A ZONA RECREACIONAL					-						
	PRELIMINARES					-						
809	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1,14		-					-	
810	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2		1,46		-					-	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
811	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3		4,18		-					-	
812	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-					-	
813	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3		17,33		-					-	
814	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3		13,72		-					-	
815	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3		2,82		-					-	
	HORMIGONES					-						
816	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3		163,18		-					-	
817	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF´C = 280KG./Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3		225,97		-					-	
818	HORmIGON PREmEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3		283,42		-					-	
819	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3		289,16		-					-	
820	HORmIGON PREmEZCLADO LOSA/ VIGAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3		193,75		-					-	
821	BLOQuE ALIVIANADO EN LOSA.E=15X20X40 Cm	u		0,61		-					-	
	ACERO ESTRUCTURAL					-						
822	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg		1,68		-					-	
823	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2		4,84		-					-	
	CONTRAPISOS					-						
824	CONTRAPISO HORm.S. PREmEZ. F´C=280KG/Cm2 E= 4 PuLG. (SIN BASE)	m2		21,50		-					-	
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS					-						

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES No. 23 - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
825	mASILLADO DE PISOS, ENDuRECEDOR DE CuARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5mm)	m2		5,62		-					-	
826	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2		26,06		-					-	
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS					-						
827	mASILLADO E ImPERmEABILIZADO DE PISOS-LOSAS, mORTERO CEmENTO-ARENA 1:3 +(PEGANTE + ImPERm.) LOSAS EXT	m2		10,40		-					-	
828	ImPERmEABILIZACION LOSA DE CuBIERTA ImPRImANTE ASFALTICO SOLuBLE AL AGuA	m2		2,84		-					-	
829	ImPERmEABILIZACIONLOSA DE CuBIERTA LAmINAS ASFALTICAS	m2		13,85		-					-	
	BAJANTES AGUA LLUVIA					-						
830	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=110mm)	m		8,14		-					-	
831	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u		90,42		-					-	
832	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m		20,59		-					-	
	MAMPOSTERÍA					-						
833	RIOSTRAS DE H.S. F´C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3		258,83		-					-	
834	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=10 Cm	m2		17,71		-					-	
835	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2		22,90		-					-	
836	PICADO Y RESANADO DE mAmPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m		4,63		-					-	
837	mESON H.A. F'Ç=180 KG/Cm2 E=7 Cm HIERRO (LAVAmANOS+mESON)	m		34,03		-					-	
838	REVESTImIENTO mESON GRANITO	m		180,61		-					-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES					-						
839	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2		10,27		-					-	
840	ENLuCIDO VERTICAL PALETEADO mORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2		8,78		-					-	
841	ENLuCIDO HORIZONTAL PALETEADO mORTERO 1:3	m2		12,30		-					-	
842	EmPASTE VERTICAL Y HORIZONTAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2		6,04		-					-	
843	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2		4,72		-					-	
	CARPINTERIA METALICA					-						
844	PuERTA mETÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2mm , INC. CERRADuRA, BISAGRAS Y PINTuRA	m2		142,73		-					-	
845	PuERTAS mODuLARES, TAmBORADAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, INCLuYE ESTRuCTuRA Y HER	m2		172,30		-					-	
846	DIVISIONES ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, TAmBORADAS INCLuYE ESTRuCTuRA, EmPOTRAmIENTO PISO PARED (	m2		161,18		-					-	
	VENTANERIA-PUERTAS ALUMINIO VIDRIO					-						
847	VENTANA CORREDIZA ALumINIO SERIE 200-INCL. VIDRIO LAmINADO 6mm	m2		183,67		-					-	
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS					-						
848	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF DISCAPACITADOS PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u		297,96		-					-	
849	PASAmANOS PARA DISCAPACITADOS TuBO DIAm 32mm E=1.5mm EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO SATINADO (Juego)	u		281,03		-					-	
850	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u		297,96		-					-	
851	uRINARIO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF	u		261,01		-					-	
852	LAVABO BLANCO, LLAVE SENSOR mOVImIENTO (CON ACCESORIOS)	u		281,39		-					-	
853	DISPENSOR DE PAPEL HIGIENICO DIAm=275mm, ROLLO 70mm, ABATIBLE,ACERO INOX E=8mm, AISI 304. ACABADO S	u		110,71		-					-	
854	DISPENSOR DE PAPEL TOALLA 400-600 uNIDADES, 330X273X130mm, ACERO INOX E=8mm AISI 304, ACABADO SATINAD	u		113,00		-					-	
855	DISPENSADOR DE JABON LIQuIDO ACERO INOX AISI304, ACABADO SATINADO	u		91,28		-					-	
856	ESPEJO DE VIDRIO FLOTADO 4mm- mARCO DE ALumINIO	m2		42,86		-					-	
857	SECADOR DE mANOS ACCIONAmIENTO AuTOmATICO 260X302X150mm, ACERO INOX. 304, LAmINA1.5mm 110V-60HZ	u		238,44		-					-	
858	BASuRERO CILINDRICO A PEDAL D=250mm H=385 PARA BAÑO ACERO INOX. 304	u		66,60		-					-	
859	DuCHAS CON mEZCLADORA (CON ACCESORIOS)	u		135,94		-					-	
	GARITAS DE CONTROL					-						

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES No. 23 - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	PRELIMINARES					-						
860	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2		1,14		-					-	
861	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	34,81	1,46	50,82260	2,07		2,07	3,02		3,020	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
862	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	37,47	4,18	156,62460	-					-	
863	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3		17,93		-					-	
864	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	9,26	17,33	160,47580	-					-	
865	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	23,08	13,72	316,65760	-					-	
866	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	37,47	2,82	105,66540	-					-	
	HORMIGONES					-						
867	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	1,00	163,18	163,18000	-					-	
868	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF'C = 280KG./Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	2,00	225,97	451,94000	0,40		0,40	90,39		90,390	20,00%
869	HORmIGON PREmEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	1,13	283,42	320,26460	-					-	
870	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	0,30	289,16	86,74800	-					-	
871	HORmIGON PREmEZCLADO LOSA/ VIGAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	5,55	193,75	1.074,62000	-					-	
872	BLOQuE ALIVIANADO EN LOSA.E=15X20X40 Cm	u		0,61		-					-	
	ACERO ESTRUCTURAL					-						
873	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	836,00	1,68	1.404,48000	-					-	
874	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2	77,00	4,84	372,68000	-					-	
	CONTRAPISOS					-						
875	CONTRAPISO HORm.S. PREmEZ. F'C=280KG/Cm2 E= 4 PuLG. (SIN BASE)	m2	33,50	21,50	720,25000	-					-	
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS					-						
876	mASILLADO DE PISOS, ENDuRECEDOR DE CuARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5mm)	m2		5,62		-					-	
877	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	38,00	26,06	990,28000	-					-	
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS					-						
878	mASILLADO E ImPERmEABILIZADO DE PISOS-LOSAS, mORTERO CEmENTO-ARENA 1:3 +(PEGANTE + ImPERm.) LOSAS EXT	m2	41,10	10,40	427,44000	-					-	
879	ImPERmEABILIZACION LOSA DE CuBIERTA ImPRImANTE ASFALTICO SOLuBLE AL AGuA	m2	41,10	2,84	116,72400	2,43		2,43	6,90		6,90	5,91%
880	ImPERmEABILIZACIONLOSA DE CuBIERTA LAmINAS ASFALTICAS	m2	41,10	13,85	569,23500	2,43		2,43	33,66		33,66	5,91%
	BAJANTES AGUA LLUVIA					-						
881	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=110mm)	m	10,00	8,14	81,40000	228,95		228,95	1.863,65		1.863,65	2289,50%
882	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	3,00	90,42	271,26000	-					-	
883	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m	30,00	20,59	617,70000	-					-	
	MAMPOSTERÍA					-						
884	RIOSTRAS DE H.S. F'C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3	0,61	258,83	157,88630	-					-	
885	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=10 Cm	m2		17,71		-					-	
886	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2	72,50	22,90	1.660,25000	-					-	
887	PICADO Y RESANADO DE mAmPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m	52,36	4,63	242,42680	-					-	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES					-						
888	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	135,50	10,27	1.391,58500	-					-	
889	ENLuCIDO VERTICAL PALETEADO mORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2	73,00	8,78	640,94000	-					-	
890	ENLuCIDO HORIZONTAL PALETEADO mORTERO 1:3	m2		12,30		-					-	
891	EmPASTE VERTICAL Y HORIZONTAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	208,50	6,04	1.259,34000	-					-	
892	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	399,10	4,72	1.883,75200	-					-	
	CARPINTERIA METALICA					-						

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES No. 23 - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
893	PuERTA mETÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2mm , INC. CERRADuRA, BISAGRAS Y PINTuRA	m2	14,20	142,73	2.026,76600	-					-	
894	PuERTA TAmBORADA 70Cm, ESQuELETO CANELO, mDF 9mm -LACADA-DISEÑO CORPORATIVO	u	4,41	198,79	876,66390	-					-	
	VENTANERIA-PUERTAS ALUMINIO VIDRIO					-						
895	VENTANA CORREDIZA ALumINIO SERIE 200-INCL. VIDRIO LAmINADO 6mm	m2	14,50	183,67	2.663,21500	-					-	
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS					-						
896	INODORO BLANCO (CON ACCESORIOS)	u	3,00	114,30	342,90000	-					-	
897	LAVABO BLANCO (CON ACCESORIOS)	u	3,00	115,74	347,22000	-					-	
898	DuCHAS (CON ACCESORIOS)	u		50,24		-					-	
	15.- CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y PORTONES					-						
	PRELIMINARES					-						
899	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	1.765,78	1,14	2.012,98920	-	2.245,54	2245,54		2.559,91	2.559,910	127,17
900	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	882,89	1,46	1.289,01940	-					-	-
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
901	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	671,86	4,18	2.808,37480	-					-	
902	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	30,00	17,93	537,90000	-					-	
903	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	404,00	13,72	5.542,88000	-	111,79	111,79		1.533,76	1.533,760	27,67
904	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	671,86	2,82	1.894,64520	-					-	
	HORMIGONES					-						
905	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F´C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	9,34	163,18	1.524,10120	-					-	
906	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF´C = 280KG./Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	15,35	225,97	3.468,63950	0,41		0,41	92,65		92,650	2,67
907	HORmIGON PREmEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	30,84	283,42	8.740,67280	-					-	-
908	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	89,64	289,16	25.920,30240	-					-	-
909	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F´C=180 KG/Cm2-50por cientoP)Clm	m3	43,60	169,86	7.405,89600	46,81	6,24	53,05	7.951,15	1.059,93	9.011,080	121,67
	ACERO ESTRUCTURAL					-						
910	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	5.740,62	1,68	9.644,24160	-					-	-
911	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	4.678,00	2,76	12.911,28000	-					-	
912	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	4.678,00	0,11	514,58000	-					-	
	MAMPOSTERÍA					-						
913	RIOSTRAS DE H.S. F´C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3	12,50	258,83	3.235,37500	-					-	
914	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2	680,00	22,90	15.572,00000	228,88		228,88	5.241,35		5.241,350	33,66
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES					-						
915	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	2.110,10	10,27	21.670,72700	-					-	-
916	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	2.110,10	5,26	11.099,12600	-					-	
917	TEXTuRADO GRAFIATO GRuESO DE PAREDES, COLOR INSTITuCIONAL GADPPZ	m2	1.112,60	6,04	6.720,10400	-					-	
918	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	1.995,00	4,72	9.416,40000	53,27		53,27	251,44		251,44	2,67%
	CARPINTERIA METALICA					-						
919	CERRAmIENTO TuBO ISO2 H.G. 2 "-mALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6mm, INC. PINTuRA A COmPRESOR	m2	1.054,50	36,37	38.352,16500	-					-	
920	CERRAmIENTO VERJA DE TuBO AGuA ISO2 HG 2" Y TuBO RECT 80X40X2, INC. PINTuRA COmPRESOR	m2	400,00	70,48	28.192,00000	-					-	
921	PORTON CORREDIZO TuBOISO 2 2", mARCO TuBO RECT 50X150X2mm, INC. PINTuRA COmPRESOR	m2	138,40	68,64	9.499,77600	-					-	
					8.364.474,94	-						
	NAVE DE DESECHOS					-						
	1.- VIAS Y PARQUEADEROS					-						
	CONSOLIDACION DE PLATAFORMAS					-						
15	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	m3	537,97	2,92	1570,87	-					-	-

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES No. 23 - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREODE MEJORAMIENTO	m3-km	9.683,46	0,28	2711,37	-					-	-
	2.- ESTABILIZACIÓN TALUDES					-						
	SISTEMA TIERRA ARMADA					-						
34	GEOTEXTIL TEJIDO- 2400 T PARA MURO DE CONTENCION TIERRA ARMADA	m2	320,00	3,06	979,20	-					-	-
35	GEOMALLA BX-1100 TENSAR	m2	64,40	3,19	205,44	-					-	-
	16. NAVE DE DESECHOS					-						
	REVESTIMIENTO DE TUMBADOS					-						
181	CIELO RASO FALSO TIPO GYPSUM PARA HUMEDAD-1/2"-SIN ESTUCAR	m2	115,00	20,04	2304,60	-					-	-
	PRELIMINARES					-						
208	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQUEADERO,Y PLATAFORMAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	347,75	1,46	507,72	-					-	-
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-						
211	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A MAQUINA)	m3	103,04	4,18	430,71	-					-	-
213	SUB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COMPACTADO (MAQUINA), CAPAS 20CM	m3	103,04	17,33	1785,68	-					-	-
214	RELLENO COMPACTADO A MAQUINA CON LASTRE TNM=8" (EN CAPAS DE 20 CM)	m3	140,54	13,72	1928,21	-					-	-
215	DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS	m3	133,95	2,82	377,74	-					-	-
	HORMIGONES					-						
216	HORMIGON PREMEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/CM2 INC. BOMBEO Y TRANSPORTE	m3	3,00	163,18	489,54	2,84		2,84	463,43		463,43	94,67%
217	HORMIGÓN PREMEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CIMENTACIÓNF'C = 280KG./CM2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	m3	12,00	225,97	2711,64	-					-	-
218	HORMIGON PREMEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/CM2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	12,78	283,42	3622,11	0,40		0,40	113,37		113,37	3,13%
219	HORMIGON PREMEZCLADO COLUMNAS F'C=280 KG/CM2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	m3	4,55	289,16	1315,68	-					-	-
220	HORMIGÓN CICLÓPEO (50POR CIENTO H.S. F'C=180 KG/CM2-50POR CIENTOP)CIM	m3	17,04	169,86	2894,41	-					-	-
	ACERO ESTRUCTURAL					-						
221	ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2	Kg	4596,88	1,68	7722,76	216,31		216,31	363,40		363,40	4,71%
222	PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A (36, 572, 325,193,108) (PROY. MONTAJE GRUA)	Kg	18285	2,76	50466,60	2.193,06		2193,06	6.052,85		6.052,85	11,99%
223	TRATAMIENTO PINTURA ESTRUCTURA ACERO A36 (FONDO+PINTURA ANTICORROSIVA), A COMPRESOR	Kg	18285	0,11	2011,35	2.193,06		2193,06	241,24		241,24	11,99%
224	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6MM	m2	382,525	4,84	1851,42	-					-	-
	CONTRAPISOS					-						
225	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3 (CONTRAPISO E=20CM, COMPAC. 100POR CIENTO P.E.M.)	m3	62,46	10,78	673,32	-					-	-
226	MATERIAL DE BASE CLASE 2 (CONTRAPISO E=15CM, COMPAC. 100POR CIENTO P.E.M.)	m3	46,85	24,55	1150,17	-					-	-
227	CONTRAPISO HORM.S. PREMEZ. F'C=280KG/CM2 E= 4 PULG. (SIN BASE)	m2	347,75	21,5	7476,63	-					-	-
228	JUNTA ASERRADA DILATACION PISO (INC. CORDON, Y SELLO)	m	90,00	2,59	233,10	-					-	-
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS					-						
229	MASILLADO DE PISOS, ENDURECEDOR DE CUARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5MM)	m2	347,75	5,62	1954,36	-					-	-
230	PINTURA EPOXICA PISO INDUSTRIAL 3MM (2 COMPONENTES)	m2	310,00	34,78	10781,80	-					-	-
232	CERAMICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EMP	m2	94,00	26,06	2449,64	-					-	-
	CUBIERTA					-						
235	CUBIERTA GALVALUMEN E=0.45MM, RECUBRIENTO PINTURA POLIESTER ASTM-653A (COLOR INSTITUCIONAL), INC, PER	m2	486,35	13,92	6768,99	-					-	-
237	CUMBRERO GALVALUMEN E=0.40 MM A=0.50 M, INC. ACCES. INSTALACION	m	35,50	8,38	297,49	-					-	-
238	CANAL TOL GALV E= 0.70MM, H=30CM, A=40CM DESARR. 122 CM, INC. GANCHOS	m	71,00	21,49	1525,79	-					-	-
	BAJANTES AGUA LLUVIA					-						
239	BAJANTES DE AGUA LLUVIA (PVC DIAM. INT=160MM)	m	70,00	9,91	693,70	-					-	-
240	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/CM²0.60 POR 0.60 CON TAPA E= 7CM + 1210MM A 12CM	u	10,00	90,42	904,20	-					-	-
242	SUMIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO DIAM. INT.= 200A 160MM PVC Y/O POLIETILENO	u	1,00	20,71	20,71	-					-	-
	MAMPOSTERÍA					-						
243	RIOSTRAS DE H.S. F'C=240KG/CM2 INC. ENCOFRADO	m3	8,48	258,83	2194,88	-					-	-
244	MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO VIBRADO 4MPAE=10 CM	m2	20,00	17,71	354,20	-					-	-
245	MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO VIBRADO 4MPAE=15 CM	m2	490,00	22,90	11221,00	-					-	-
246	PICADO Y RESANADO DE MAMPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m	120,00	4,63	555,60	-					-	-
247	MESON H.A. F'C=180 KG/CM2 E=7 CM HIERRO (LAVAMANOS+MESON)	m	3,50	34,03	119,11	-					-	-
248	REVESTIMIENTO MESON GRANITO	m	3,50	180,61	632,14	-	1,45	1,45		261,88	261,880	41,43%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES No. 23 - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES					-						
249	ENLUCIDO CON IMPERMEABILIZANTE MORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	392,72	10,27	4033,23	-					-	-
250	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO MORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2	450,00	8,78	3951,00	188,03		188,03	1.650,90		1.650,90	41,78%
251	ENLUCIDO CON MALLA+ IMPERMEABILIZANTE, MORTERO 1:3	m2	25,00	17,03	425,75	-					-	-
252	EMPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	392,72	5,26	2065,71	-					-	-
253	EMPASTE VERTICAL (ACRILICO INTERIOR) INC. FILOS	m2	475,00	4,40	2090,00	175,31		175,31	771,36		771,36	36,91%
254	PINTURA DE CAUCHO SATINADO COLOR (2 MANOS) INTER. <GUIA IMAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	475,00	4,72	2242,00	227,93		227,93	1.075,83		1.075,83	47,99%
255	PINTURA DE CAUCHO SATINADA COLOR(2 MANOS) EXTERIOR (CANASTILLA) <GUIA IMAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	392,72	5,72	2246,36	-					-	-
	CARPINTERIA METALICA					-						
257	VENTANA FIJA TUBO RECT 40X80X2-MALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6MM, INC PINTURA ANTICORROSIVA, A COMPRESOR	m2	39,06	41,3	1613,18	-					-	-
258	PORTON TIPO CORREDIZO RETRACTIL TUBO RECT 40X80X2MM-TOOL GALV. 0.6MM	m2	4,40	61,25	269,50	-					-	-
259	PUERTA METÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2MM , INC. CERRADURA, BISAGRAS Y PINTURA	m2	40,000	142,730	5709,20	-					-	-
260	PUERTAS MODULARES, TAMBORADAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE E=1MM AISI 304, INCLUYE ESTRUCTURA Y HER	m2	1,00	172,30	172,30	-					-	-
	REVESTIMIENTO DE TUMBADOS					-						
264	CIELO RASO FALSO - FIBRA MINERAL Y RECUB LÁMINA ALUMINIO 0.60X0.60 BLANCO, TIPO AMSTRONG O SIMILAR	m2	324,75	21,59	7011,35	-					-	-
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS					-						
268	INODORO CON FLUXOMETRO LATON CROMADA 1.0 GPF PRIMERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u	1,00	297,96	297,96	-					-	-
270	LAVABO BLANCO, LLAVE SENSOR MOVIMIENTO (CON ACCESORIOS)	u	2,00	281,39	562,78	-					-	-
271	DISPENSOR DE PAPEL HIGIENICO DIAM=275MM, ROLLO 70MM, ABATIBLE,ACERO INOX E=8MM, AISI 304. ACABADO S	u	1,00	110,71	110,71	-					-	-
272	DISPENSOR DE PAPEL TOALLA 400-600 UNIDADES, 330X273X130MM, ACERO INOX E=8MM AISI 304, ACABADO SATINAD	u	1,00	113,00	113,00	-					-	-
273	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOX AISI304, ACABADO SATINADO	u	1,00	91,28	91,28	-					-	-
274	ESPEJO DE VIDRIO FLOTADO 4MM- MARCO DE ALUMINIO	m2	2,70	42,86	115,72	-					-	-
276	BASURERO CILINDRICO A PEDAL D=250MM H=385 PARA BAÑO ACERO INOX. 304	u	1,00	66,60	66,60	-					-	-
277	DUCHAS CON MEZCLADORA (CON ACCESORIOS)	u	1,00	135,94	135,94	-					-	-
	10.- SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACIÓN					-						
	POZOS DE REVISION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS					-						
305	CAJA REVISION MEDIA TENSION 60X60X75,ACERA, T/HA	u	1,00	179,17	179,17	-					-	-
306	PUESTA A TIERRA SIMPLE EN POZO ELECTRICO CON SUELDA EXOTERMICA	u	1,0	164,5	164,46	-					-	-
	INSTALACION LUMINARIAS					-						
362	CAJETINES METALICOS OCTOGONALES MEDIANOS CON TAPA	u	30,00	5,44	163,20	41,00		41,00	223,04		223,04	136,67%
	INSTALACION LUMINARIAS					-						
427	TUBERIA EMT 1/2 PULGADA	m	70,00	3,34	233,80	68,97		68,97	230,36		230,36	98,53%
428	UNION EMT 1/2 PULGADA	u	40,00	1,18	47,20	-					-	-
429	CONECTOR EMT 1/2 PULGADA	u	60,00	0,56	33,60	32,00		32,00	17,92		17,92	53,33%
430	FIJACION DE TUBOS EN LOZA CON GRAPA METALICA EMT 1/2 PULGADA	u	30,00	4,87	146,10	31,00		31,00	150,97		150,97	103,33%
431	CAJETINES METALICOS RECTANGULARES PROFUNDOS	u	10,00	1,57	15,70	-					-	-
432	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AMARILLO (INC. TAYPE)	m	70,00	2,28	159,60	52,51		52,51	119,72		119,72	75,01%
433	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	70,00	1,43	100,10	38,32		38,32	54,80		54,80	54,75%
434	LUMINARIA LED3X18W/120 VOLTIOS	u	30,00	60,59	1817,70	-					-	-
437	INTERRUPTOR SIMPLE CON TAPA	u	7,00	5,47	38,29	-						
	TOMACORRIENTES GENERALES					-						
438	TUBERIA EMT 1/2 PULGADA	m	50,00	3,34	167,00	-					-	-
439	UNION EMT 1/2 PULGADA	u	15,00	1,18	17,70	2,00		2,00	2,36		2,36	13,33%
440	CONECTOR EMT 1/2 PULGADA	u	10,00	0,56	5,60	11,00		11,00	6,16		6,16	110,00%
441	FIJACION DE TUBOS EN LOZA CON GRAPA METALICA EMT 1/2 PULGADA	u	10,00	4,87	48,70	15,00		15,00	73,05		73,05	150,00%
442	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZUL (INC. TAYPE)	m	50,00	1,43	71,50	6,03		6,03	8,62		8,62	12,06%
443	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	50,00	1,43	71,50	6,03		6,03	8,62		8,62	12,06%
444	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	50,00	1,03	51,50	6,03		6,03	6,21		6,21	12,06%
445	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	13,00	7,45	96,85	-					-	-
446	CAJETINES METALICOS RECTANGULARES PROFUNDOS	u	13,00	1,57	20,41	-					-	-
	ALIMENTADORES Y SUBTABLEROS CT-1					-						
	ALIMENTADOR TPD-STE-ANGAR-A4					-						
509	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 CU TW (INC. TAYPE)	m	20,00	14,51	290,20	-					-	-
510	SUBTABLERO STE GOL 12F-2F-12 ESPACIOS ANGAR 4	u	1,00	173,41	173,41	-					-	-
	11.- SISTEMA HIDRAULICO SANITARIO Y CONTRAINCENDIOS					-						
	SITEMA DE AGUA POTABLE A PRESIÓN CONSTANTE					-						

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES No. 23 - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	TUBERIA PVC AGUA POTABLE					-						
533	TUBERIA PVC ROSCABLE D=1/2" EN EDIFICACION+PRUEBA	m	12,00	5,86	70,32	-					-	-
535	TUBERIA PVC ROSCABLE D=1" EN EDIFICACION+PRUEBA	m	45,00	9,78	440,10	-					-	-
	ACCESORIOS INST. TUB PVC ROSCABLE AGUA POTABLE					-						
541	ANCLAJES METALICOS PLATINA 2 POR 1/2" (ABRAZADERAS), EN LOSA Y PARED	u	10,00	14,11	141,10	-					-	-
542	S.I. PUNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGUA POR PUNTO	u	2,00	13,67	27,34	-					-	-
	EXTINTORES					-						
565	EXTINTOR POS CAPACIDAD 10 LBS. CON CAJA METALICA	u	1,00	99,84	99,84	-					-	-
568	EXTINTOR CO2 CAPACIDAD 20 LBS. CON CAJA METALICA	u	1,00	313,27	313,27	-					-	-
	SISTEMA SANITARIO INTERNO					-						
	PRELIMINARES Y MOV. TIERRAS					-						
601	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	2,00	17,93	35,86	-					-	-
602	RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL (CAPAS 20 CM)	m3	3,00	6,32	18,96	-					-	-
	INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE					-						
603	PUNTO DE DESAGUE EN PVC 50 MM	u	3,00	28,80	86,40	-					-	-
604	PUNTO DE DESAGUE EN PVC 110 MM	u	1,00	34,43	34,43	-					-	-
605	TUBERÍA PVC 50 MM DE DIÁMETRO (MAT/TRASP/INST)	m	12,0	5,1	61,68	-					-	-
606	TUBERÍA PVC 110 MM DE DIÁMETRO (MAT/TRASP/INST)	m	5,00	8,02	40,10	-					-	-
607	TUBERÍA PVC 160 MM DE DIÁMETRO (MAT/TRASP/INST)	m	18,00	14,52	261,36	-					-	-
608	CAJA REV. H.S. FC=180KG/CM²0.60 POR 0.60 CON TAPA E= 7CM + 1Ø10MM A 12CM	u	1,00	90,42	90,42	-					-	-
	INSTALACION TUBERIA PVC DEVENTILACIÓN					-						
609	TUBERIA PVC D=75 MM VENTILACIÓN	m	6,00	4,27	25,62	-					-	-
610	PUNTO DE VENTILACIÓN PVC 75 MM POR PUNTO	u	1,00	15,61	15,61	-					-	-
	13.- SISTEMA ELECTRONICO, VOZ, DATOS, INCENDIOS)					-						
	CANALIZACION					-						
714	POZO DE REVISION 60X60X60CM	u	1,0	158,5	158,53	-					-	-
715	BANDEJA TIPO ESCALERILLA 10CMX8CM INCLUYE ACCESORIOS	m	25,0	46,6	1164,25	-					-	-
717	TUBERIA PVC REFORZADA 4"	m	15,00	20,27	304,05	-					-	-
719	TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4" DE DIÁMETRO INCLUIDO ACCESORIOS	m	40,00	16,51	660,40	-					-	-
	SISTEMA DE INCENDIO					-						
766	ESTACION MANUAL DE ALARMA DE EMERGENCIA	u	1,00	93,78	93,78	-					-	-
767	LUZ ESTROBOSCOPICA	u	1,00	133,78	133,78	-					-	-
768	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE	u	3,00	91,90	275,70	-					-	-
769	DETECTOR TERMICO DIRECCIONABLE	u	3,00	91,90	275,70	-					-	-
770	PUNTO DE ALARMAS DE INCENDIO	u	8,00	73,78	590,24	-					-	-
776	LAMPARAS DE AVISO DE SALIDA	u	1,00	45,78	45,78	-					-	-
778	SEÑALETICA INCENDIOS	u	1,00	26,35	26,35	-					-	-
	NAVE DE RESGUARDO					-						
	ACERO ESTRUCTURAL					-						
1	PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A (36, 572, 325,193,108) (PROY. MONTAJE GRUA)	Kg	94474,86	2,76	260750,61	-					-	-
2	TRATAMIENTO PINTURA ESTRUCTURA ACERO A36 (FONDO+PINTURA ANTICORROSIVA), A COMPRESOR	Kg	94474,86	0,11	10392,23	-					-	-
	CONTRAPISOS					-						
3	JUNTA ASERRADA DILATACION PISO (INC. CORDON, Y SELLO)	m	857,00	2,59	2219,63	-					-	-
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS					-						
4	MASILLADO DE PISOS, ENDURECEDOR DE CUARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5MM)	m2	1445,85	5,62	8125,68	-					-	-

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES No. 23 - RUBROS CONTRACTUALES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	CUBIERTA					-						
5	CUBIERTA GALVALUMEN E=0.45MM, RECUBRIENTO PINTURA POLIESTER ASTM-653A (COLOR INSTITUCIONAL), INC, PER	m2	1660,00	13,92	23107,20	21,75		21,75	302,76		302,76	1,31%
6	CUBIERTA POLICARBONATO E=0.80 MM, COLOR BRONCE O SIMILAR, INC. ACCESORIOS INSTALCION	m2	190,00	14,34	2724,60	-					-	-
7	CUMBRERO GALVALUMEN E=0.40 MM A=0.50 M, INC. ACCES. INSTALACION	m	43,25	8,38	362,44	0,25		0,25	2,10		2,10	0,58%
8	CANAL TOL GALV E= 0.70MM, H=30CM, A=40CM DESARR. 122 CM, INC. GANCHOS	m	86,50	21,49	1858,89	0,50		0,50	10,75		10,75	0,58%
	MONTO TOTAL				**8.852.838,93**				**596.489,71**	**34.853,48**	**631.343,19**	**7,13%**

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	9-may.-19	
FIN PLAZO CONTRACTUAL	8-may.-20	
SUSPENSION DIAS	60	DIAS
SUSPENSION DIAS	11	DIAS
AMPLIACIÓN POR PANDEMIA	90	DIAS
AMPLIACIÓN POR CLIMA-REDISEÑO-% POR COVID	128	DIAS
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN	21-feb.-21	
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO MODIFICATORIO COMPLEMENTARIO	19-oct.-21	
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	5-jul.-21	
FECHA DE APROBACIÓN	13-jul.-21	

VALOR PLANILLADO AVANCE DE OBRA	596.489,71	34.853,48	631.343,19
AMPLAICIÓN DIAS 128 DIAS			
TOTAL PLANILLADO	**596.489,71**	**34.853,48**	**631.343,19**

DESCUENTOS Y RETENCIONES			
ANTICIPO : 40%	238.595,88	13.941,39	252.537,27
OTROS:			
TOTAL DE DESCUENTOS:	**238.595,88**	**13.941,39**	**252.537,27**
VALOR LIQUIDO ESTA PLANILLA :	**357.893,83**	**20.912,09**	**378.805,92**

Firmado electrónicamente por:
PEDRO ELICIO RAMOS IDROVO

ING. PEDRO RAMOS IDROVO
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA LEON BURGOS

LINA LEON BURGOS
FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE No. 23 - RUBROS NUEVOS DEL CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO No. 1

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
	CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS											
RN-1	GROUTING DE NIVELACIÓN	M3	3,35	$ 1.634,03	$ 5.474,00	0,50		0,5	817,02		817,02	14,93%
RN-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE ASTM 193 B7	U	1416,00	$ 49,44	$ 70.007,04	388,00		388	19.182,72		19.182,72	27,40%
RN-3	BORDILLO DE H.S 180 KG/CM2 TIPO CUNETA	ML	2261,84	$ 23,58	$ 53.334,19	-					-	-
RN-4	ACERAS DE H.S. FC=180KG/CM2 E=7CM, ESCOBILLADA.	M2	3878,20	$ 18,85	$ 73.104,07	-					-	-
RN-5	ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACIÓN	L	19492,62	$ 0,85	$ 16.568,73	-					-	-
RN-6	CAPA DE RODADURA HORMIGÓN ASFÁLTICO MEZCLADO EN PLANTA, E=3".	M2	12965,08	$ 12,53	$ 162.828,35	-					-	-
RN-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO DE 500KG EN PUERTA DE INGRESO DE CERRAMIENTO	U	4,00	$ 1.081,08	$ 4.324,32	-					-	-
RN-8	PINTURA DE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN EN PARQUEADEROS Y PASOS PEATONALES	ML	669,42	$ 0,62	$ 415,04	-					-	-
RN-9	TOPES PARA ESTACIONAMIENTO H.S = 180 KG/CM2 . INCLUYE PINTURA REFLECTIVA	U	88,00	$ 12,91	$ 1.136,08	-					-	-
RN-10	JARDINERAS DE H.S= 180KG/CM2	ML	26,00	$ 15,02	$ 390,52	-					-	-
RN-11	PLANTAS ORNAMENTALES	ML	26,00	$ 10,99	$ 285,74	-	508,20	508,2		5.585,12	5.585,120	1954,62%
RN-12	PALMERAS BOTELLAS ENANAS	U	7,00	$ 34,74	$ 243,18	-					-	-
RN-13	TAPAJUNTA DE ALUMINIO PISO-PISO A= 15CM	ML	35,00	$ 16,25	$ 568,75	-					-	-
RN-14	TAPAJUNTA DE ALUMINIO PISO-PARED A= 15CM EN INTERIORES	ML	65,00	$ 16,90	$ 1.098,50	-					-	-
RN-15	TAPAJUNTA EXTERIOR TOOL GALVANIZADO	ML	40,00	$ 14,53	$ 581,20	-					-	-
RN-16	TAPAJUNTA DE HORMIGÓN LOSA-LOSA	ML	56,00	$ 42,28	$ 2.367,68	-					-	-
RN-17	DUCHA ELÉCTRICA 110 V	U	7,00	$ 29,03	$ 203,21	-					-	-
RN-18	LLAVE DE DUCHA	U	7,00	$ 20,90	$ 146,30	-					-	-
RN-19	REJILLAS DE PISO 50 MM	U	42,00	$ 4,84	$ 203,28	-	33,00	33		159,72	159,720	78,57%
RN-20	SUMIDERO DE CUBIERTA DE 110MM INCLUYE REJILLA TIPO CÚPULA	U	20,00	$ 51,11	$ 1.022,20	-	1,00	1		51,11	51,110	5,00%
RN-21	BORDILLO PARA TINETA DE BAÑO REVESTIDA CON CERÁMICA (0,10MX0,15M)	ML	6,00	$ 16,50	$ 99,00	-	0,80	0,8		13,20	13,200	13,33%
RN-22	MUEBLES AÉREOS DE MDF PARA COCINA	ML	7,00	$ 180,68	$ 1.264,76	-					-	-
RN-23	MUEBLES BAJOS DE MDF PARA COCINA	ML	7,00	$ 180,68	$ 1.264,76	-					-	-
RN-24	HORMIGÓN PREMEZCLADO PARA LOSA DE PISO FC=280 KG/CM2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	M3	1204,82	$ 209,28	$ 252.165,68	226,10		226,1	47.318,21		47.318,21	18,76%
RN-25	FILOS INTERIORES Y EXTERIORES	ML	830,00	$ 3,76	$ 3.120,80	1,15		1,15	4,32		4,32	0,14%
RN-26	ENLUCIDO MEDIAS CAÑAS	ML	960,00	$ 2,28	$ 2.188,80	-					-	-
RN-27	CUADRADA DE BOQUETES PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	1150,00	$ 4,64	$ 5.336,00	-					-	-
RN-28	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON POLIESTIRENO EXPANDIDO 50 MM	M2	530,00	$ 5,64	$ 2.989,20	-					-	-
RN-29	JUNTA DE DILATACIÓN TIPO LLAVE - LOSAS DE PISOS	ML	3200,00	$ 2,36	$ 7.552,00	-					-	-
RN-30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS EXPANSIVOS 5/8 -6" PARA ANCLAJE DE PLACAS	U	30,00	$ 4,27	$ 128,10	-					-	-
RN-31	CHICOTE D=12MM PARA ARRIOSTRAMIENTO DE MAMPOSTERÍA	U	1750,00	$ 1,55	$ 2.712,50	-					-	-
RN-32	CAJA DE PASO H.S. FC=180KG/Cm² 0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	U	10,00	$ 52,94	$ 529,40	-					-	-
	ELÉCTRICOS					-						
RN-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR DE MEDICIÓN - TRAFOMIX	U	1,00	$ 9.602,82	$ 9.602,82	-					-	-
RN-34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO METÁLICO PARA DOS CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN	U	4,00	$ 487,88	$ 1.951,52	-					-	-
RN-35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO METÁLICO PARA UN CIRCUITO DE ILUMINACIÓN	U	2,00	$ 396,56	$ 793,12	1,00		1	396,56		396,56	50,00%
RN-36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL TDP100KVA	U	1,00	$ 5.982,02	$ 5.982,02	-					-	-
RN-37	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL TDP 50KVA	U	2,00	$ 2.431,38	$ 4.862,76	-					-	-
RN-38	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE DE HA DE 12MTS 500KG	U	7,00	495,52	$ 3.468,64	-					-	-
RN-39	TENDIDO DE CONDUCTOR AL DESNUDO ACSR# 1/0 AWG	M	500,00	$ 2,69	$ 1.345,00	22,30		22,3	59,99		59,99	4,46%
RN-40	TENDIDO DE CONDUCTOR AL DESNUDO ACSR# 2 AWG	M	160,00	$ 2,33	$ 372,80	14,10		14,1	32,85		32,85	8,81%
RN-41	TENDIDO DE CONDUCTOR PREEMSAMBLADO AL AISLADO 2x1/0+1/0 AWG	M	150,00	$ 6,37	$ 955,50	4,60		4,6	29,30		29,30	3,07%
RN-42	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SUJECCION PARA EL NEUTRO	U	8,00	$ 22,13	$ 177,04	-					-	-
RN-43	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3F CENTRADA PASANTE 13.8KV - 3CPT	U	3,00	$ 187,73	$ 563,19	-					-	-
RN-44	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3F CENTRADA DOBLE RETENCION 13.8KV - 3CDT	U	1,00	$ 431,15	$ 431,15	-					-	-
RN-45	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3F CENTRADA RETENCION O TERMINAL 13.8KV - 3CRT	U	4,00	$ 287,70	$ 1.150,80	-					-	-
RN-46	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	U	3,00	$ 31,54	$ 94,62	-					-	-
RN-47	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	U	4,00	$ 40,08	$ 160,32	-					-	-
RN-48	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR DOBLE A TIERRA - TTD	U	4,00	$ 116,68	$ 466,72	-					-	-

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE No. 23 - RUBROS NUEVOS DEL CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO No. 1

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
RN-49	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION AEREO - SUBTERRANEO PARA BAJO VOLTAJE	U	2,00	$ 243,82	$ 487,64	1,00		1	243,82		243,82	50,00%
RN-50	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED 200W, CON FOTOCELULA, EN POSTE CON RED PREENSABLADA	U	7,00	$ 637,26	$ 4.460,82	-					-	-
RN-51	CAJA REVISIÓN MEDIA TENSIÓN 90X90X90 CVIA, CON TAPA DE HIERRO NODULAR 125 KN	U	20,00	$ 318,78	$ 6.375,60	-					-	-
RN-52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO DE CONDENSADORES AUTOMATICO DE 60KVAR, 3F, 230V	U	1,00	$ 10.209,14	$ 10.209,14	-					-	-
RN-53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO DE CONDENSADORES AUTOMATICO DE 30KVAR, 3F, 230V	U	1,00	$ 7.969,49	$ 7.969,49	-					-	-
	CLIMATIZACIÓN					-						
RN-54	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE PARED INVERTER CAPACIDAD DE 18.000 BTU/H , INCLUYE COMPRESOR.	U	2,00	$ 1.728,67	$ 3.457,34	-					-	-
RN-55	EXTRACTOR DE OLORES EN BAÑOS 6"X6"	U	20,00	$ 42,70	$ 854,00	-					-	-
	PAREDES INDUSTRIALES					-						
RN-56	PAREDES DE GALVALUMEN E=0.45mm, RECUBRIMIENTO PINTURA POLIESTER ASTm-653A (COLOR INSTITUCIONAL).	M2	1849,90	$ 16,19	$ 29.949,88	1.241,94	194,10	1436,04	20.107,01	3.142,48	23.249,49	77,63%
RN-57	CERRAMIENTO TUBO H.G. 2"-MALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6mm, INC. PINTURA A COMPRESOR	M2	1054,50	$ 22,99	$ 24.242,96							
RN-58	CERRAMIENTO VERJA DE TUBO HG 2" Y TUBO RECT 80X40X2, INC. PINTURA COMPRESOR	M2	400,00	$ 60,18	$ 24.072,00							
RN-59	RECUBRIMIENTO ALUMINIO COLOR CYAN O SIMILAR, ALUCUBOND 4mm INC. ESTRUCT. E INST<GUIA IMAGEN CORPORATI	M2	1315,00	$ 67,32	$ 88.525,80							
	MONTO TOTAL				**769.795,29**				**88.191,80**	**8.951,63**	**97.143,43**	**12,62%**

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	9-may.-19	
FIN PLAZO CONTRACTUAL	8-may.-20	
SUSPENSION DIAS	60	DIAS
SUSPENSION DIAS	11	DIAS
AMPLIACIÓN POR PANDEMIA	90	DIAS
AMPLIACIÓN POR CLIMA-REDISEÑO-% POR COVID	128	DIAS
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN	21-feb.-21	
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO MODIFICATORIO COMPLEMENTARIO	19-oct.-21	
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	5-jul.-21	
FECHA DE APROBACIÓN	13-jul.-21	

VALOR PLANILLADO AVANCE DE OBRA	88.191,80	8.951,63	97.143,43
AMPLAICIÓN DIA: 128 DIAS			
TOTAL PLANILLADO	**88.191,80**	**8.951,63**	**97.143,43**

DESCUENTOS Y RETENCIONES			
ANTICIPO : 40%	35.276,72	3.580,65	38.857,37
OTROS:			
TOTAL DE DESCUENTOS:	**35.276,72**	**3.580,65**	**38.857,37**
VALOR LIQUIDO ESTA PLANILLA :	**52.915,08**	**5.370,98**	**58.286,06**

Firmado electrónicamente por:
PEDRO ELICIO RAMOS IDROVO

ING. PEDRO RAMOS IDROVO
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA LEON BURGOS

ROLINA LEON BURGOS
FISCALIZACIÓN

FATIMA
CONSORCIO

PLANILLA Nº 23

Avance de obra

1-Junio-2021 al 30-Junio-2021

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22008		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
	PRIMERA ETAPA													
	1.- VIAS Y PARQUEADEROS													
	PRELIMINARES													
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE C. RODADuRA	km	1,08	494,59	534,15720	1,08	534,16	0,01%	0,00	0,00	0,00%	1,08	534,16	0,01%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS						-		0,00					0,00%
2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)	m3	12.779,98	0,82	10.479,58360	37.806,19	31.001,09	0,32%	25025,21	20521,49	0,21%	12779,98	10479,58	0,11%
3	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRuCTuRAS mENORES	m3	86,00	4,69	403,34000				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4	TuBERIA DE ACERO CORRuGADO D= 1,20 m, E=2,5 mm, mP-100	m	18,00	239,45	4.310,10000	25,00	5.986,25	0,06%	7,00	1676,15	0,02%	18,00	4310,10	0,04%
5	muRO DE H.S. FC=180KG./Cm2 TIPO B(CABEZALES)	m3	22,00	188,41	4.145,02000	22,00	4.145,02	0,04%	0,00	0,00	0,00%	22,00	4145,02	0,04%
	MATERIAL PETREO						-		0,00					0,00%
6	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)	m3	51.821,91	2,92	151.319,97720	45.509,53	132.887,83	1,38%	0,00	0,00	0,00%	45509,53	132887,82	1,38%
7	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3	m3	2.589,98	10,78	27.919,96440	3.822,51	41.206,68	0,43%	1232,53	13286,69	0,14%	2589,98	27919,98	0,29%
8	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS	m3	1.942,49	17,21	33.430,25290	2.936,86	50.543,36	0,53%	994,37	17113,11	0,18%	1942,49	33430,25	0,35%
9	TRANSPORTE mATERIAL PETREODE mEJORAmIENTO	m3-km	937.976,72	0,28	262.633,48104	775.977,67	217.273,76	2,26%	0,00	0,00	0,00%	775977,67	217273,75	2,26%
10	TRANSPORTE DE mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3	m3-km	117.701,06	0,28	32.956,29680	71.710,89	20.079,04	0,21%	18901,70	5292,48	0,06%	52809,19	14786,57	0,15%
11	TRANSPORTE DE mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS	m3-km	34.964,82	0,28	9.790,14960	53.157,22	14.884,02	0,15%	18192,40	5093,87	0,05%	34964,82	9790,15	0,10%
	CAPA DE RODADURA						-		0,00					0,00%
	AMBIENTALES						-		0,00					0,00%
12	SEÑALES INFORmATIVAS (2.40X1.20)m	u	2,00	250,92	501,84000	2,00	501,84	0,01%	0,00	0,00	0,00%	2,00	501,84	0,01%
13	SEÑALES REGLAmENTARIAS (0.75 X 0.75)m	u	2,00	115,45	230,90000	2,00	230,90	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	230,90	0,00%
14	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)m	u	2,00	115,45	230,90000	2,00	230,90	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	230,90	0,00%
	CONSOLIDACION DE PLATAFORMAS						-		0,00					0,00%
15	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)	m3	43.057,34	2,92	125.727,44448	43.057,34	125.727,45	1,31%	0,00	0,00	0,00%	43057,34	125727,44	1,31%
16	TRANSPORTE mATERIAL PETREODE mEJORAmIENTO	m3-km	779.043,38	0,28	218.132,14640	779.043,38	218.132,17	2,27%	0,00	0,00	0,00%	779043,38	218132,15	2,27%
17	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)	m3	69.683,19	0,82	57.140,21170	69.683,18	57.140,21	0,59%	0,00	0,00	0,00%	69683,18	57140,21	0,59%
	2.- ESTABILIZACIÓN TALUDES						-		0,00					0,00%
	PRELIMINARES						-		0,00					0,00%
18	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	4.030,36	1,14	4.594,60470	4.030,36	4.594,61	0,05%	0,00	0,00	0,00%	4030,36	4594,61	0,05%
19	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	4.613,56	1,46	6.735,79030	3.401,53	4.966,23	0,05%	0,00	0,00	0,00%	3401,53	4966,23	0,05%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS						-		0,00					0,00%
20	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA) ESTRuCTuRAS	m3	9.606,48	4,18	40.155,08640	5.766,32	24.103,22	0,25%	0,00	0,00	0,00%	5766,32	24103,22	0,25%
21	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	205,06	17,93	3.676,72580	54,89	984,18	0,01%	0,00	0,00	0,00%	54,89	984,18	0,01%
22	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=6" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	0,00	13,72	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
23	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	85.716,60	2,82	241.720,79875	107.989,92	304.531,57	3,16%	22273,32	62810,78	0,65%	85716,60	241720,80	2,51%
	SISTEMA DE DRENAJE PLATAFORMA						-		0,00					0,00%
24	RASANTEO mANuAL DE ZANJAS	m3	0,00	3,22	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
25	SumINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL PARA SuBDREN (TIPO NT 2400 O SImILAR)	m2	1.498,63	3,06	4.585,80780	1.469,00	4.495,14	0,05%	0,00	0,00	0,00%	1469,00	4495,14	0,05%
26	SumINISTRO Y COLOCACIÓN DE mATERIAL FILTRANTE A mAQuINA (PIEDRA BOLA mAX =2")	m3	524,58	15,19	7.968,37020	457,77	6.953,53	0,07%	0,00	0,00	0,00%	457,77	6953,53	0,07%
27	SumINISTRO Y COLOCACIÓN mANuAL DEmATERIAL FILTRANTEPARA DRENES 1 PuLG	m3	279,52	20,70	5.786,06400	212,86	4.406,21	0,05%	0,00	0,00	0,00%	212,86	4406,21	0,05%
28	SumINISTRO Y COLOCACIÓN DE TuBERIAP.V.C.DIAm. INT.=160mm, PERFORADA	m	0,00	14,38	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
29	Sum.Y COLOCACIÓN TuBERIA PVC. CORRuGADA DIAm INT.=160mm S5	m	0,00	9,80	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
30	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT. 220 mm S5	m	0,00	14,68	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
31	Sum.Y COLOCACIÓN TuBERIA PVC. CORRuGADA DIAm. INT.=315mm S5	m	0,00	20,16	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
32	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 315A 160mm PVC Y/O POLIETILENO	u	0,00	24,07	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
33	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 220A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u	0,00	21,28	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	SISTEMA TIERRA ARMADA						-		0,00					0,00%
34	GEOTEXTIL TEJIDO- 2400 T PARA muRO DE CONTENCION TIERRA ARmADA	m2	21.276,67	3,06	65.106,59490	21.288,73	65.143,52	0,68%	12,07	36,92	0,00%	21276,67	65106,59	0,68%
35	GEOmALLA BX-1100 TENSAR	m2	7.927,94	3,19	25.290,11265	7.978,18	25.450,40	0,26%	50,24	160,28	0,00%	7927,94	25290,12	0,26%
36	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	4.074,59	17,33	70.612,64470	3.860,48	66.902,12	0,70%	0,00	0,00	0,00%	3860,48	66902,12	0,70%
37	muRO DE GAVIONES TRIPLE TORSION	m3	3.632,00	60,08	218.210,56000	2.866,00	172.189,28	1,79%	0,00	0,00	0,00%	2866,00	172189,28	1,79%
	3.- REDES DE+E59:E141 ALCANTARILLADO SA+E59:E141NITARIO, PLUVIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS						-		0,00					0,00%
	ALCANTARILLADO SANITARIO						-		0,00					0,00%
	PRELIMINARES						-		0,00					0,00%
38	REPLANTEO Y NIVELACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	m	490,58	1,81	887,94980	1.575,58	2.851,80	0,03%	1085,00	1963,85	0,02%	490,58	887,95	0,01%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS						-		0,00					0,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22008		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DIAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
39	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	0,00	17,93	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
40	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	3.460,00	4,18	14.462,80000	4.640,34	19.396,62	0,20%	1009,34	4219,04	0,04%	3631,00	15177,58	0,16%
41	ENTIBADO DE ZANJA	m2	160,00	11,56	1.849,60000	160,00	1.849,60	0,02%	0,00	0,00	0,00%	160,00	1849,60	0,02%
42	RAZANTEO DE ZANJA E= 0.20m	m2	240,00	3,22	772,80000	240,00	772,80	0,01%	0,00	0,00	0,00%	240,00	772,80	0,01%
43	ARENA DE KILO, TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	320,00	18,13	5.801,60000	1.135,92	20.594,23	0,21%	815,92	14792,63	0,15%	320,00	5801,60	0,06%
44	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	1.800,00	13,72	24.696,00000	2.185,73	29.988,22	0,31%	385,73	5292,22	0,05%	1800,00	24696,00	0,26%
45	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	900,00	6,32	5.688,00000	1.736,71	10.976,01	0,11%	836,71	5288,01	0,05%	900,00	5688,00	0,06%
46	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	1.440,00	2,82	4.060,80000	3.039,00	8.569,99	0,09%	1599,00	4509,19	0,05%	1440,00	4060,80	0,04%
	TUBERIAS PVC ALCANTARILLADO						-		0,00	-				0,00%
47	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=160 mm S6	m	89,12	9,70	864,46400	273,12	2.649,26	0,03%	184,00	1784,80	0,02%	89,12	864,46	0,01%
48	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT = 200 mm S6	m	450,00	15,28	6.876,00000	534,05	8.160,28	0,08%	84,05	1284,28	0,01%	450,00	6876,00	0,07%
49	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 300 mm S5	m	50,00	20,22	1.011,00000	50,00	1.011,00	0,01%	0,00	0,00	0,00%	50,00	1011,00	0,01%
50	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=364 mm S6	m	0,00	23,27	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
51	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 450 mm S5	m	20,00	44,36	887,20000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
52	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 220A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u	2,00	21,28	42,56000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
53	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 335A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u	0,00	24,14	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	POZOS Y CAJAS						-		0,00					0,00%
54	HORmIGON SImPLE EN POZOS F'C=180KG/Cm2-mEZCLA A mANO	m3	30,00	177,00	5.310,00000	54,38	9.625,26	0,10%	23,11	4315,26	0,04%	30,00	5310,00	0,06%
55	ENCOFRADO mETALICO PARA POZOS DE REVISION	m3	30,00	20,36	610,80000	54,38	1.107,18	0,01%	23,11	496,38	0,01%	30,00	610,80	0,01%
56	SumINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS Y CERCOS H.F-210LB	u	12,00	178,06	2.136,72000	19,00	3.383,14	0,04%	7,00	1246,42	0,01%	12,00	2136,72	0,02%
57	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	7,00	90,42	632,94000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	ALCANTARILLADO PLUVIAL						-		0,00					0,00%
	PRELIMINARES						-		0,00					0,00%
58	REPLANTEO Y NIVELACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	m	1.378,44	1,81	2.494,97640	2.747,01	4.972,09	0,05%	1368,57	2477,11	0,03%	1378,44	2494,98	0,03%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS						-		0,00					0,00%
59	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	0,00	17,93	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
60	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	9.280,92	4,18	38.794,26389	5.308,06	22.187,68	0,23%	0,00	0,00	0,00%	5308,06	22187,69	0,23%
61	ENTIBADO DE ZANJA	m2	308,42	11,56	3.565,33520	308,42	3.565,34	0,04%	0,00	0,00	0,00%	308,42	3565,34	0,04%
62	RAZANTEO DE ZANJA E= 0.20m	m2	849,00	3,22	2.733,78000	849,00	2.733,78	0,03%	0,00	0,00	0,00%	849,00	2733,78	0,03%
63	ARENA DE KILO, TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	245,00	18,13	4.441,85000	1.180,25	21.397,93	0,22%	935,25	16956,08	0,18%	245,00	4441,85	0,05%
64	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	5.196,31	13,72	71.293,38000	2.777,42	38.106,20	0,40%	0,00	0,00	0,00%	2777,42	38105,20	0,40%
65	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	2.130,00	6,32	13.461,60000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
66	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	2.144,69	2,82	6.048,01885	3.942,51	11.117,86	0,12%	1797,82	5069,85	0,05%	2144,69	6048,02	0,06%
	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO PLUVIAL						-		0,00					0,00%
67	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 250 mm S5	m	608,56	16,51	10.047,32560	425,52	7.025,34	0,07%	0,00	0,00	0,00%	425,52	7025,34	0,07%
68	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 300 mm S5	m	140,00	20,22	2.830,80000	134,29	2.715,34	0,03%	0,00	0,00	0,00%	134,29	2715,34	0,03%
69	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=364 mm S6	m	50,00	23,27	1.163,50000	600,00	13.962,00	0,15%	550,00	12798,50	0,13%	50,00	1163,50	0,01%
70	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 450 mm S5	m	12,00	44,36	532,32000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
71	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 600 mm S5	m	878,35	107,84	94.721,26400	605,84	65.333,78	0,68%	0,00	0,00	0,00%	605,84	65333,79	0,68%
	POZOS Y CAJAS						-		0,00					0,00%
72	HORmIGON SImPLE EN POZOS F'C=180KG/Cm2-mEZCLA A mANO	m3	56,00	177,00	9.912,00000	70,44	12.467,88	0,13%	14,44	2555,88	0,03%	56,00	9912,00	0,10%
73	ENCOFRADO mETALICO PARA POZOS DE REVISION	m3	56,00	20,36	1.140,16000	70,44	1.434,16	0,01%	14,44	294,00	0,00%	56,00	1140,16	0,01%
74	SumINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS Y CERCOS H.F-210LB	u	24,00	178,06	4.273,44000	32,00	5.697,92	0,06%	8,00	1424,48	0,01%	24,00	4273,44	0,04%
75	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	22,00	90,42	1.989,24000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
76	CAJA DE H.S. PARA REJILLA mETÁLICA 0.40 por 1.00 por 1.00 (F'C= 180 KG/Cm2)	u	40,00	95,58	3.823,20000	24,00	2.293,92	0,02%	0,00	0,00	0,00%	24,00	2293,92	0,02%
77	SumINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA H.F. (1.00 por 0.40 por 0.05)110 KG	u	40,00	130,84	5.233,60000	27,00	3.532,68	0,04%	0,00	0,00	0,00%	27,00	3532,68	0,04%
	FOSA SEPTICA, FILTRO ANAEROBICO Y SECADO DE LODOS						-		0,00					0,00%
	PRELIMINARES						-		0,00					0,00%
78	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	0,00	1,14	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
79	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	63,51	1,46	92,72460	217,68	317,81	0,00%	154,17	225,09	0,00%	63,51	92,72	0,00%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS						-		0,00					0,00%
80	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	0,00	17,93	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
81	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	211,71	4,18	884,93651	217,68	909,89	0,01%	5,97	24,95	0,00%	211,71	884,94	0,01%
82	ENTIBADO DE ZANJA	m2	0,00	11,56	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22008			
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21		
PLAZO:	365	DÍAS		
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%		

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
83	RAZANTEO DE ZANJA E= 0.20m	m2	0,00	3,22	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
84	ARENA DE KILO, TENDIDO Y COMPACTADO (MAQUINA), CAPAS 20Cm	m3	0,00	18,13	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85	RELLENO COMPACTADO A MAQUINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	118,67	13,72	1.628,15240	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
86	RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL (CAPAS 20 Cm)	m3	20,00	6,32	126,40000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	TUBERIAS PVC ALCANTARILLADO						-		0,00					0,00%
87	Suml. E INSTAL. DE TUBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT = 200 mm S6	m	26,50	15,28	404,92000	26,50	404,92	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26,50	404,92	0,00%
	HORMIGONES						-		0,00					0,00%
88	HORMIGON PREMEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOMBEO Y TRANSPORTE	m3	3,41	163,18	556,68857	5,50	897,74	0,01%	2,09	341,05	0,00%	3,41	556,69	0,01%
89	HORMIGON PREMEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOMBEO Y TRANSPORTE	m3	31,11	249,88	7.773,10602	30,66	7.661,32	0,08%	0,00	0,00	0,00%	30,66	7661,32	0,08%
90	HORMIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F'C=180 KG/Cm2-50por cientoP)Clm	m3	0,00	169,86	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	ACERO ESTRUCTURAL						-		0,00					0,00%
91	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 Kg/Cm2	Kg	3.652,36	1,68	6.135,96542	3.652,36	6.135,96	0,06%	0,00	0,00	0,00%	3652,36	6135,96	0,06%
92	PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTm A36 (PROV. MONTAJE GRUA)	Kg	100,00	2,76	276,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
93	TRATAMIENTO PINTURA ESTRUCTURA ACERO A36 (FONDO+PINTURA ANTICORROSIVA), A COMPRESOR	Kg	100,00	0,11	11,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	CERRAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO						-		0,00					0,00%
94	CERRAMIENTO DE ALAMBRE DE PUAS-6 HILOS	m	60,00	2,14	128,40000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
95	PUERTA DE MALLA + TUBO ISO II 2"	m2	4,00	59,32	237,28000	4,80	284,74	0,00%	0,80	47,46	0,00%	4,00	237,28	0,00%
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES						-		0,00					0,00%
96	ENLUCIDO CON IMPERMEABILIZANTE MORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	298,58	10,27	3.066,41660	135,74	1.394,05	0,01%	0,00	0,00	0,00%	135,74	1394,05	0,01%
97	PINTURA DE CAUCHO SATINADO COLOR (2 MANOS) INTER. <GUIA IMAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	30,00	4,72	141,60000	60,86	287,26	0,00%	30,86	145,66	0,00%	30,00	141,60	0,00%
	PIEZAS SANITARIAS						-		0,00					0,00%
98	ACCESORIOS PLANTA DE TRATAMIENTO (Global)	u	1,00	5.101,40	5.101,40000	1,00	5.101,40	0,05%	0,00	0,00	0,00%	1,00	5101,40	0,05%
99	FILTRO DE GRAVA CALSIFICADA DE 2 1/2" A 1/2"	m3	9,00	28,28	254,52000	2,64	74,66	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,64	74,66	0,00%
100	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm MARCO ANG. 25 por 3 mm	u	9,00	75,58	680,22000	7,00	529,06	0,01%	0,00	0,00	0,00%	7,00	529,06	0,01%
	4.- NAVE PRINCIPAL- TALLERES-ADMINISTRATIVO-BODEGA GENERAL						-		0,00					0,00%
	PRELIMINARES						-		0,00					0,00%
101	ARREGLO Y LIMPIEZA (INCLUYE DESALOJO)	m2	12.327,08	1,14	14.052,87120	12.327,08	14.052,87	0,15%	0,00	0,00	0,00%	12327,08	14052,87	0,15%
102	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQUEADERO Y PLATAFORMAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	7.949,46	1,46	11.606,21160	8.532,44	12.457,36	0,13%	582,98	851,15	0,01%	7949,46	11606,21	0,12%
103	ACOMETIDA E INST. DE AGUA POTABLE PROVISIONAL PVC 3/4"	m	90,00	8,44	759,60000	90,00	759,60	0,01%	0,00	0,00	0,00%	90,00	759,60	0,01%
104	ACOMETIDA E INST. ELÉCTRICA PROV. TUBERÍA CONDUIT 1" CABLENo.8	m	90,00	27,58	2.482,20000	185,00	5.102,30	0,05%	95,00	2620,10	0,03%	90,00	2482,20	0,03%
105	SONDEOS DE SUELOS (COMPROBACION IN SITU) NEC-15	m	68,00	55,43	3.769,24000	68,00	3.769,24	0,04%	0,00	0,00	0,00%	68,00	3769,24	0,04%
106	CERRAMIENTO PROVISIONAL LISTONES + PLANCHAS DE ZINC	m2	1.018,35	11,69	11.904,51150	1.018,35	11.904,51	0,12%	0,00	0,00	0,00%	1018,35	11904,51	0,12%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS						-		0,00					0,00%
107	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A MAQUINA)	m3	7.030,26	4,18	29.386,48680	7.072,92	29.564,81	0,31%	42,66	178,32	0,00%	7030,26	29386,49	0,31%
108	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	0,00	17,93	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
109	SUB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COMPACTADO (MAQUINA), CAPAS 20Cm	m3	4.011,39	17,33	69.517,38870	4.015,71	69.592,25	0,72%	4,32	74,87	0,00%	4011,39	69517,39	0,72%
110	RELLENO COMPACTADO A MAQUINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	2.274,76	13,72	31.209,70720	2.274,97	31.212,59	0,32%	0,21	2,88	0,00%	2274,76	31209,71	0,32%
111	DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS	m3	7.030,26	2,82	19.825,33320	7.030,26	19.825,33	0,21%	0,00	0,00	0,00%	7030,26	19825,33	0,21%
	HORMIGONES						-		0,00					0,00%
112	HORMIGON PREMEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOMBEO Y TRANSPORTE	m3	196,42	163,18	32.051,81560	208,93	34.093,27	0,35%	12,51	2041,45	0,02%	196,42	32051,82	0,33%
113	HORMIGÓN PREMEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CIMENTACIÓNF'C = 280KG./Cm2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	m3	1.088,67	225,97	246.006,75990	1.121,66	253.461,51	2,63%	32,99	7454,75	0,08%	1088,67	246006,76	2,56%
114	HORMIGON PREMEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	282,96	283,42	80.196,52320	288,90	81.880,56	0,85%	5,94	1684,03	0,02%	282,96	80196,52	0,83%
115	HORMIGON PREMEZCLADO COLUMNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	m3	337,45	289,16	97.577,04200	365,96	105.820,40	1,10%	28,51	8243,37	0,09%	337,45	97577,04	1,01%
116	HORMIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F'C=180 KG/Cm2-50por cientoP)Clm	m3	650,01	169,86	110.410,69860	682,42	115.915,87	1,20%	17,23	5505,16	0,06%	650,01	110410,70	1,15%
117	HORMIGON PREMEZCLADO LOSA/ VIGAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	m3	200,00	193,75	38.750,00000	239,02	46.310,36	0,48%	39,02	7560,35	0,08%	200,00	38750,00	0,40%
	ACERO ESTRUCTURAL						-		0,00					0,00%
118	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 Kg/Cm2	Kg	188.476,09	1,68	316.639,83120	201.660,55	338.789,71	3,52%	9430,94	22149,89	0,23%	188476,09	316639,83	3,29%
119	PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTm A36 (PROV. MONTAJE GRUA)	Kg	517.607,93	2,76	1.428.597,87576	558.712,31	1.542.045,98	16,03%	13460,23	113448,10	1,18%	517607,93	1428597,89	14,85%
120	TRATAMIENTO PINTURA ESTRUCTURA ACERO A36 (FONDO+PINTURA ANTICORROSIVA), A COMPRESOR	Kg	499.962,86	0,11	54.995,91416	499.962,86	54.995,92	0,57%	0,00	3040,86	0,03%	472318,71	51955,06	0,54%
121	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2	14.243,58	4,84	68.938,91268	13.570,46	65.681,04	0,68%	0,00	0,00	0,00%	13570,46	65681,04	0,68%
122	DECK E=0.75mm PLACA COLABORANTE-mD2-GA-101m	m2	2.520,48	18,37	46.301,21760	2.564,28	47.105,81	0,49%	43,80	804,59	0,01%	2520,48	46301,22	0,48%
	CONTRAPISOS						-		0,00					0,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22008
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DIAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
123	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3 (CONTRAPISO E=20Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	1.043,38	10,78	11.247,63640	1.062,76	11.456,56	0,12%	19,38	208,92	0,00%	1043,38	11247,64	0,12%
124	mATERIAL DE BASE CLASE 2 (CONTRAPISO E=15Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	1.301,40	24,55	31.949,37000	778,38	19.109,23	0,20%	0,00	0,00	0,00%	778,38	19109,23	0,20%
125	CONTRAPISO HORmS. PREmEZ. F´C=280KG/Cm2 E= 4 PuLG. (SIN BASE)	m2	1.710,63	21,50	36.778,54500	1.344,11	28.898,26	0,30%	0,00	0,00	0,00%	1344,11	28898,26	0,30%
126	JuNTA ASERRADA DILATACION PISO (INC. CORDON, Y SELLO)	m	4.784,70	2,59	12.392,37300	2.292,35	5.937,19	0,06%	0,00	0,00	0,00%	2292,35	5937,19	0,06%
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS						-		0,00					0,00%
127	mASILLADO DE PISOS, ENDuRECEDOR DE CuARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5mm)	m2	5.101,87	5,62	28.672,50940	4.479,16	25.172,88	0,26%	0,00	0,00	0,00%	4479,16	25172,88	0,26%
128	PINTuRA EPOXICA PISO INDuSTRIAL 3mm (2 COmPONENTES)	m2	5.101,87	34,78	177.443,03860	2.289,58	79.631,59	0,83%	0,00	0,00	0,00%	2289,58	79631,59	0,83%
129	PISO PORCELANATO RECTIF. COLOR (0.50X0.50- u OTROS) INSTAL. EmPO	m2	1.910,00	40,31	76.992,10000	2.208,70	89.032,82	0,93%	298,70	12040,73	0,13%	1910,00	76992,09	0,80%
130	PISO GRADAS PORCELANATO PIZARRA COLOR (0.32X0.32-O SImILAR) INSTAL. EmPO.	m2	90,00	32,72	2.944,80000	20,31	664,54	0,01%	0,00	0,00	0,00%	20,31	664,54	0,01%
131	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	761,35	26,06	19.840,78100	865,44	22.553,42	0,23%	104,09	2712,64	0,03%	761,35	18840,78	0,21%
132	BARREDERA PORCELANATO COLOR RECTIFICADA A=10Cm	m	997,67	7,70	7.682,05900	1.720,69	13.249,31	0,14%	723,02	5567,25	0,06%	997,67	7682,06	0,08%
133	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISOS Y FILOS DE GRADA	m	150,00	2,96	447,00000	32,53	96,94	0,00%	0,00	0,00	0,00%	32,53	96,94	0,00%
134	CENEFA ACANALADA ANTILESLIZANTE FILOS GRADA A=10Cm	m	120,00	38,56	4.627,20000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS						-		0,00					0,00%
135	mASILLADO E ImPERmEABILIZADO DE PISOS-LOSAS, mORTERO CEmENTO-ARENA 1:3 +(PEGANTE + ImPERm) LOSAS EXT	m2	1.380,00	10,40	14.352,00000	1.394,82	14.506,09	0,15%	14,82	154,09	0,00%	1380,00	14352,00	0,15%
136	ImPERmEABILIZACION LOSA DE CuBIERTA ImPRImANTE ASFALTICO SOLuBLE AL AGuA	m2	1.650,00	2,84	4.686,00000	1.606,65	4.562,90	0,05%	0,00	0,00	0,00%	1606,65	4562,90	0,05%
137	ImPERmEABILIZACIONLOSA DE CuBIERTA LAmINAS ASFALTICAS	m2	1.650,00	13,85	22.852,50000	1.606,65	22.252,14	0,23%	0,00	0,00	0,00%	1606,65	22252,14	0,23%
	CUBIERTA						-		0,00					0,00%
138	CuBIERTA GALVALumEN E=0.45mm, RECuBRIENTO PINTuRA POLIESTER ASTm-653A (COLOR INSTITuCIONAL), INC. PER	m2	4.875,00	13,92	67.860,00000	5.111,26	71.148,74	0,74%	236,26	3288,74	0,03%	4875,00	67860,00	0,71%
139	CuBIERTA POLICARBONATO E=0.80 mm, COLOR BRONCE O SImILAR, INC. ACCESORIOS INSTALCION	m2	946,45	14,34	13.572,09300	410,43	5.885,57	0,06%	0,00	0,00	0,00%	410,43	5885,57	0,06%
140	CumBRERO GALVALumEN E=0.40 mm A=0.50 m, INC. ACCES. INSTALACION	m	92,00	8,38	770,96000	91,30	765,09	0,01%	0,00	0,00	0,00%	91,30	765,09	0,01%
141	CANAL TOL GALV E= 0.70mm, H=30Cm, A=40Cm DESARR. 122 Cm, INC. GANCHOS	m	259,00	21,49	5.565,91000	628,34	13.503,03	0,14%	369,34	7937,12	0,08%	259,00	5565,91	0,06%
	BAJANTES AGUA LLUVIA						-		0,00					0,00%
142	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=160mm)	m	798,00	9,91	7.908,18000	740,33	7.336,67	0,08%	0,00	0,00	0,00%	740,33	7336,67	0,08%
143	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	25,00	90,42	2.260,50000	64,00	5.786,88	0,06%	39,00	3526,38	0,04%	25,00	2260,50	0,02%
144	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m	233,91	20,59	4.816,20690	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
145	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO DIAm. INT.= 200A 160mm PVC Y/O POLIETILENO	u	15,00	20,71	310,65000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	MAMPOSTERÍA		0,00				-		0,00					0,00%
146	RIOSTRAS DE H.S. F'C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3	129,00	258,83	33.389,07000	122,97	31.827,81	0,33%	0,00	0,00	0,00%	122,97	31827,81	0,33%
147	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=10 Cm	m2	236,00	17,71	4.179,56000	26,61	471,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26,61	471,26	0,00%
148	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2	4.630,00	22,90	106.027,00000	4.093,32	93.737,07	0,97%	0,00	0,00	0,00%	4093,32	93737,07	0,97%
149	PICADO Y RESANADO DE mAmPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m	3.819,65	4,63	17.684,98050	3.819,65	17.684,98	0,18%	0,00	0,00	0,00%	3819,65	17684,98	0,18%
150	mESON H.A. F'C=180 KG/Cm2 E=7 Cm HIERRO (LAVAmANOS+mESON)	m	7,00	34,03	238,21000	63,65	2.166,01	0,02%	56,65	1927,80	0,02%	7,00	238,21	0,00%
151	REVESTImIENTO mESON GRANITO	m	7,00	180,61	1.264,27000	34,40	6.212,99	0,06%	27,40	4948,72	0,05%	7,00	1264,27	0,01%
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES						-		0,00					0,00%
152	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	2.795,97	10,27	28.714,61190	3.130,57	32.150,91	0,33%	334,60	3436,30	0,04%	2795,97	28714,61	0,30%
153	ENLuCIDO VERTICAL PALETEADO mORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2	9.060,97	8,78	79.555,31660	7.957,22	69.864,41	0,73%	0,00	0,00	0,00%	7957,22	69864,41	0,73%
154	ENLuCIDO CON mALLA+ ImPERmEABILIZANTE, mORTERO 1:3	m2	1.250,00	17,03	21.287,50000	760,79	12.956,21	0,13%	0,00	0,00	0,00%	760,79	12956,21	0,13%
155	ENLuCIDO HORIZONTAL PALETEADO mORTERO 1:3	m2	100,00	12,30	1.230,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
156	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	2.795,97	5,26	14.706,80220	3.130,57	16.466,78	0,17%	334,60	1759,97	0,02%	2795,97	14706,81	0,15%
157	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO INTERIOR) INC. FILOS	m2	9.060,97	4,40	39.868,26800	7.755,59	34.124,60	0,35%	0,00	0,00	0,00%	7755,59	34124,60	0,35%
158	EmPASTE HORIZONTAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	100,00	6,56	656,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
159	PINTuRA EPOXICA PARED INDuSTRIAL 3mm (2 COmPONENTES)	m2	0,00	34,78	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
160	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	9.060,97	4,72	42.767,77840	7.755,59	36.606,39	0,38%	0,00	0,00	0,00%	7755,59	36606,39	0,38%
161	PINTuRA DE CAuCHO SATINADA COLOR(2 mANOS) EXTERIOR (CANASTILLA) <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	2.795,97	5,72	15.992,94840	2.464,29	14.095,74	0,15%	0,00	0,00	0,00%	2464,29	14095,74	0,15%
162	RECuBRImIENTO ALumINIO COLOR CYAN O SImILAR, ALuCuBOND 5mm INC. ESTRuCT. E INST<GuIA ImAGEN CORPORATI	m2	1.315,00	84,96	111.722,40000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
163	RECuBRImIENTO PLANCHA FIBROCEmENTO E=7mm	m2	50,00	20,56	1.028,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	CARPINTERIA METALICA						-		0,00					0,00%
164	VENTANA FIJA TuBO RECT 40X80X2-mALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6mm, INC PINTuRA ANTICORROSIVA, A COmPRESOR	m2	540,00	41,30	22.302,00000	397,17	16.403,12	0,17%	0,00	0,00	0,00%	397,17	16403,12	0,17%
165	PORTON TIPO CORREDIZO RETRACTIL TuBO RECT 40X80X2mm-TOOL GALV. 0.6mm	m2	990,50	61,25	60.668,12500	594,12	36.389,85	0,38%	0,00	0,00	0,00%	594,12	36389,85	0,38%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22008
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DIAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
166	PUERTA METÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2mm (AREA RIEGO Y DRENAJE)	m2	40,30	142,73	5.752,01900	40,20	5.737,75	0,06%	0,00	0,00	0,00%	40,20	5737,75	0,06%
167	PUERTAS MODULARES, TAMBORADAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, INCLUYE ESTRUCTURA Y HER	m2	30,50	172,30	5.255,15000	35,28	6.078,74	0,06%	4,78	823,59	0,01%	30,50	5255,15	0,05%
168	DIVISIONES ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, TAMBORADAS INCLUYE ESTRUCTURA, EMPOTRAMIENTO PISO PARED (	m2	81,00	161,18	13.055,58000	105,56	17.014,16	0,18%	24,56	3958,58	0,04%	81,00	13055,58	0,14%
	CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE						-		0,00					0,00%
169	PASAMANOS TUBERÍA ACERO INOXIDABLE + VIDRIO LAMINADO 8mm, EMPOTRADA PISO H=1.00m (GRADAINTERIORES)	m	86,21	173,45	14.953,12450	13,97	2.423,10	0,03%	0,00	0,00	0,00%	13,97	2423,10	0,03%
170	PASAMANOS EN TUBERIADE ACERO INOXIDABLE EMPOTRADO EN PARED	m	26,59	45,00	1.196,55000	23,15	1.041,75	0,01%	0,00	0,00	0,00%	23,15	1041,75	0,01%
	CARPINTERIA DE MADERA						-		0,00					0,00%
171	PUERTA TAMBORADA 70Cm, ESQUELETO CANELO, mDF 9mm -LACADA-DISEÑO CORPORATIVO	u	20,00	198,79	3.975,80000	18,00	3.578,22	0,04%	0,00	0,00	0,00%	18,00	3578,22	0,04%
172	PUERTA TAMBORADA 80Cm, ESQUELETO CANELO, mDF 9mm -LACADA-DISEÑO CORPORATIVO	u	2,00	230,59	461,18000	2,00	461,18	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	461,18	0,00%
173	PUERTA TAMBORADA 100Cm, ESQUELETO CANELO, mDF 9mm -LACADA-DISEÑO CORPORATIVO	u	6,00	240,28	1.441,68000	10,00	2.402,80	0,02%	4,00	961,12	0,01%	6,00	1441,68	0,01%
	VENTANERIA-PUERTAS ALUMINIO VIDRIO						-		0,00					0,00%
174	PUERTA INGRESO PRINCIPAL-SISTEMA APERTURA AUTOMATICO 2.00X2.30m ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10mm	u	1,00	6.646,43	6.646,43000	1,00	6.646,43	0,07%	0,00	0,00	0,00%	1,00	6646,43	0,07%
175	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO 10mm, INC. CERRADURA TIRADERA, PIVOTE DE SUJECCION (PREFEXTURA Y AUDITORIO)	m2	9,50	600,48	5.704,56000	9,29	5.578,46	0,06%	0,00	0,00	0,00%	9,29	5578,46	0,06%
176	PUERTA YMAMPARAALUMINIOS200YVIDRIOLAMINADO E=8mm CON PIVOTE	m2	9,00	190,90	1.718,10000	20,48	3.909,63	0,04%	0,00	0,00	0,00%	20,48	3909,63	0,04%
177	PUERTA BATIENTE ALUMINIO Y VIDRIO FLOTADO CLARO 6mm (0.90X2.10)	u	3,00	295,00	885,00000	6,00	1.770,00	0,02%	3,00	885,00	0,01%	3,00	885,00	0,01%
178	PUERTA BATIENTE ALUMINIO Y VIDRIO FLOTADO CLARO 6mm (1.00X2.10)	u	40,00	286,07	11.442,80000	40,00	11.442,80	0,12%	0,00	0,00	0,00%	40,00	11442,80	0,12%
179	VENTANA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 200-INCL. VIDRIO LAMINADO 6mm	m2	220,00	183,67	40.407,40000	220,75	40.545,15	0,42%	0,75	137,75	0,00%	220,00	40407,40	0,42%
	REVESTIMIENTO DE TUMBADOS						-		0,00					0,00%
180	CIELO RASO FALSO - FIBRA MINERAL Y RECUB LÁMINA ALUMINIO 0.60X0.60 BLANCO, TIPO ARMSTRONG O SIMILAR	m2	2.150,00	21,59	46.418,50000	2.281,57	49.259,18	0,51%	131,57	2840,67	0,03%	2150,00	46418,51	0,48%
181	CIELO RASO FALSO TIPO GYPSUM PARA HUMEDAD-1/2"-SIN ESTUCAR	m2	212,58	20,04	4.260,10320	17,18	344,29	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17,18	344,29	0,00%
182	ESTUCADO DE CIELO RASO	m2	212,58	6,26	1.330,75080	17,18	107,55	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17,18	107,55	0,00%
183	FRISO GALVALUMEN PREPINTADO E= 0.40 INC. FLASHING	m2	50,00	19,63	981,50000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS						-		0,00					0,00%
184	INODORO CON FLUXOMETRO LATON CROMADA 1.0 GPF DISCAPACITADOS PRIMERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u	2,00	297,96	595,92000	2,00	595,92	0,01%	0,00	0,00	0,00%	2,00	595,92	0,01%
185	PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS TUBO DIAM 32mm E=1.5mm EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO SATINADO (Juego)	u	2,00	281,03	562,06000	3,00	843,09	0,01%	1,00	281,03	0,00%	2,00	562,06	0,01%
186	INODORO CON FLUXOMETRO LATON CROMADA 1.0 GPF PRIMERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u	39,00	297,96	11.620,44000	45,00	13.408,20	0,14%	6,00	1787,76	0,02%	39,00	11620,44	0,12%
187	URINARIO CON FLUXOMETRO LATON CROMADA 1.0 GPF	u	6,00	261,01	1.566,06000	10,00	2.610,10	0,03%	4,00	1044,04	0,01%	6,00	1566,06	0,02%
188	LAVABO BLANCO, LLAVE SENSOR MOVIMIENTO (CON ACCESORIOS)	u	35,00	281,39	9.848,65000	37,00	10.411,43	0,11%	2,00	562,78	0,01%	35,00	9848,65	0,10%
189	DISPENSOR DE PAPEL HIGIENICO DIAm=275mm, ROLLO 70mm, ABATIBLE,ACERO INOX E=8mm, AISI 304. ACABADO S	u	20,00	110,71	2.214,20000	24,00	2.657,04	0,03%	4,00	442,84	0,00%	20,00	2214,20	0,02%
190	DISPENSOR DE PAPEL TOALLA 400-600 UNIDADES, 330X273X130mm, ACERO INOX E=8mm AISI 304, ACABADO SATINAD	u	20,00	113,00	2.260,00000	24,00	2.712,00	0,03%	4,00	452,00	0,00%	20,00	2260,00	0,02%
191	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOX AISI304, ACABADO SATINADO	u	20,00	91,28	1.825,60000	24,00	2.190,72	0,02%	4,00	365,12	0,00%	20,00	1825,60	0,02%
192	ESPEJO DE VIDRIO FLOTADO 4mm- MARCO DE ALUMINIO	m2	12,89	42,86	552,46540	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
193	FREGADERO DE COCINA (uN POZO)	u	2,00	185,40	370,80000	1,00	185,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	185,40	0,00%
194	SECADOR DE MANOS ACCIONAMIENTO AUTOMATICO 260X302X150mm, ACERO INOX. 304, LAMINA1.5mm 110V-60HZ	u	20,00	238,44	4.768,80000	24,00	5.722,56	0,06%	4,00	953,76	0,01%	20,00	4768,80	0,05%
195	BASURERO CILINDRICO A PEDAL D=250mm H=385 PARA BAÑO ACERO INOX. 304	u	41,00	66,60	2.730,60000	46,00	3.063,60	0,03%	5,00	333,00	0,00%	41,00	2730,60	0,03%
	PUENTE GRUA BIRRIEL CAP. 16 TON (1 UNIDADES)						-		0,00					0,00%
196	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 Kg/Cm2	Kg	407,57	1,68	684,71760	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
197	PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A36 (PROV. MONTAJE GRUA)	Kg	43.726,12	2,76	120.684,09120	45.766,78	126.316,31	1,31%	1,70	5632,22	0,06%	43726,12	120684,09	1,25%
198	TRATAMIENTO PINTURA ESTRUCTURA ACERO A36 (FONDO+PINTURA ANTICORROSIVA), A COMPRESOR	Kg	43.726,12	0,11	4.809,87320	45.766,78	5.034,35	0,05%	1,70	224,48	0,00%	43726,12	4809,87	0,05%
199	KIT POLIPASTO BIRRIEL A CABLE + TROLEY ELEC, CAP. 16T, ELEVACION 8m, (INC. CARROS TESTEROS+ SISTEMA EL	u	1,00	50.538,00	50.538,00000	1,00	50.538,00	0,53%	0,00	0,00	0,00%	1,00	50538,00	0,53%
200	SISTEMA ELECTRIFICACION ENCAPSULADO Lm60	m	88,00	112,21	9.874,48000	64,00	7.181,44	0,07%	0,00	0,00	0,00%	64,00	7181,44	0,07%
201	RIEL DE RODADURA 50X30mm, (V. PUENTE 2X10+V CARRILERA2X88m)	m	212,00	77,83	16.499,96000	145,60	11.332,05	0,12%	0,00	0,00	0,00%	145,60	11332,05	0,12%
202	MONTAJE ELECTROMECANICOPARA GRUA BIRRIEL 16 TON	u	1,00	17.664,00	17.664,00000	1,00	17.664,00	0,18%	0,00	0,00	0,00%	1,00	17664,00	0,18%
203	SIST. CONTROL REMOTO/ TELEMANDO (CON DISPLAY)	u	1,00	1.955,65	1.955,65000	1,00	1.955,65	0,02%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1955,65	0,02%
	EQUIPO DE MOVILIZACIÓN VERTICAL						-		0,00					0,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22008		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DIAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
204	ASERSOR DE DISCAPACITADOS L =5.0m, 1 PARADA, CAP. NOmINAL 250KG.	u	1,00	18.732,35	18.732,35000	1,00	18.732,35	0,19%	0,00	0,00	0,00%	1,00	18732,35	0,19%
	5.- NAVE LAVADORA, Y TALLERES CHAPISTERIA-CARPINTERIA						-		0,00					0,00%
	PRELIMINARES						-		0,00					0,00%
205	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	4.407,56	1,14	5.024,61840	4.407,56	5.024,62	0,05%	0,00	0,00	0,00%	4407,56	5024,62	0,05%
206	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	1.087,37	1,46	1.587,56020	1.036,79	1.513,71	0,02%	0,00	0,00	0,00%	1036,79	1513,71	0,02%
207	ACOmETIDA E INST. DE AGuA POTABLE PROVISIONAL PVC 3/4"	m	0,00	8,44	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
208	ACOmETIDA E INST. ELÉCTRICA PROV. TuBERÍA CONDuIT 1" CABLENo.8	m	0,00	27,58	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
209	SONDEOS DE SuELOS (COmPROBACION IN SITu) NEC-15	m	61,00	55,43	3.381,23000	61,00	3.381,23	0,04%	0,00	0,00	0,00%	61,00	3381,23	0,04%
210	CERRAmIENTO PROVISIONAL LISTONES + PLANCHAS DE ZINC	m2	0,00	11,69	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS						-		0,00					0,00%
211	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	311,80	4,18	1.303,32400	346,94	1.450,21	0,02%	35,14	146,89	0,00%	311,80	1303,32	0,01%
212	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	0,00	17,93	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
213	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	261,80	17,33	4.536,99400	268,80	4.658,30	0,05%	7,00	121,31	0,00%	261,80	4536,99	0,05%
214	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	424,00	13,72	5.817,28000	409,01	5.611,62	0,06%	0,00	0,00	0,00%	409,01	5611,62	0,06%
215	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	261,80	2,82	738,27600	346,94	978,37	0,01%	85,14	240,09	0,00%	261,80	738,28	0,01%
	HORMIGONES						-		0,00					0,00%
216	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	9,80	163,18	1.599,16400	12,80	2.088,70	0,02%	3,00	489,54	0,01%	9,80	1599,16	0,02%
217	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF'C = 280KG./Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	69,20	225,97	15.637,12400	69,20	15.637,12	0,16%	0,00	0,00	0,00%	69,20	15637,12	0,16%
218	HORmIGON PREmEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	35,23	283,42	9.984,88660	48,03	13.612,67	0,14%	12,80	3627,78	0,04%	35,23	9984,89	0,10%
219	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	22,17	289,16	6.410,67720	26,86	7.766,85	0,08%	4,69	1356,16	0,01%	22,17	6410,68	0,07%
220	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F'C=180 KG/Cm2-50por cientoP)Clm	m3	46,97	169,86	7.978,32420	59,22	10.059,11	0,10%	12,25	2080,79	0,02%	46,97	7978,32	0,08%
	ACERO ESTRUCTURAL						-		0,00					0,00%
221	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	14.998,01	1,68	25.196,65680	15.187,85	25.515,59	0,27%	189,84	318,93	0,00%	14998,01	25196,66	0,26%
222	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	59.540,80	2,76	164.332,60800	62.400,47	172.225,31	1,79%	2859,67	7892,69	0,08%	59540,80	164332,61	1,71%
223	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	59.540,80	0,11	6.549,48800	60.313,75	6.634,51	0,07%	772,95	85,02	0,00%	59540,80	6549,49	0,07%
224	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2	2.420,00	4,84	11.712,80000	2.239,26	10.838,01	0,11%	0,00	0,00	0,00%	2239,26	10838,01	0,11%
	CONTRAPISOS						-		0,00					0,00%
225	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3 (CONTRAPISO E=20Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	188,50	10,78	2.032,03000	181,79	1.959,70	0,02%	0,00	0,00	0,00%	181,79	1959,70	0,02%
226	mATERIAL DE BASE CLASE 2 (CONTRAPISO E=15Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	141,20	24,55	3.466,46000	136,34	3.347,15	0,03%	0,00	0,00	0,00%	136,34	3347,15	0,03%
227	CONTRAPISO HORm.S. PREmEZ. F'C=280KG/Cm2 E= 4 PuLG. (SIN BASE)	m2	710,00	21,50	15.265,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
228	JuNTA ASERRADA DILATACION PISO (INC. CORDON, Y SELLO)	m	550,00	2,59	1.424,50000	401,85	1.040,79	0,01%	0,00	0,00	0,00%	401,85	1040,79	0,01%
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS						-		0,00					0,00%
229	mASILLADO DE PISOS, ENDuRECEDOR DE CuARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5mm)	m2	1.100,00	5,62	6.182,00000	1.071,05	6.019,30	0,06%	0,00	0,00	0,00%	1071,05	6019,30	0,06%
230	PINTuRA EPOXICA PISO INDuSTRIAL 3mm (2 COmPONENTES)	m2	1.100,00	34,78	38.258,00000	521,38	18.133,60	0,19%	0,00	0,00	0,00%	521,38	18133,60	0,19%
231	PISO PORCELANATO RECTIF. COLOR (0.50X0.50- u OTROS) INSTAL. EmPO	m2	35,00	40,31	1.410,85000	485,73	19.579,78	0,20%	450,73	18168,93	0,19%	35,00	1410,85	0,01%
232	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	72,00	26,06	1.876,32000	118,77	3.095,15	0,03%	46,77	1218,83	0,01%	72,00	1876,32	0,02%
233	BARREDERA PORCELANATO COLOR RECTIFICADA A=10Cm	m	28,00	7,70	215,60000	143,39	1.104,10	0,01%	115,39	888,50	0,01%	28,00	215,60	0,00%
234	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISOS Y FILOS DE GRADA	m	0,00	2,98	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	CUBIERTA						-		0,00					0,00%
235	CuBIERTA GALVALumEN E=0.45mm, RECuBRIENTO PINTuRA POLIESTER ASTm-653A (COLOR INSTITuCIONAL), INC. PER	m2	1.390,00	13,92	19.348,80000	1.193,68	16.616,03	0,17%	0,00	0,00	0,00%	1193,68	16616,03	0,17%
236	CuBIERTA POLICARBONATO E=0.80 mm, COLOR BRONCE O SImILAR, INC. ACCESORIOS INSTALCION	m2	100,00	14,34	1.434,00000	59,90	858,97	0,01%	0,00	0,00	0,00%	59,90	858,97	0,01%
237	CumBRERO GALVALumEN E=0.40 mm A=0.50 m, INC. ACCES. INSTALACION	m	54,25	8,38	454,61500	52,80	442,46	0,00%	0,00	0,00	0,00%	52,80	442,46	0,00%
238	CANAL TOL GALV E= 0.70mm, H=30Cm, A=40Cm DESARR. 122 Cm, INC. GANCHOS	m	108,50	21,49	2.331,66500	105,60	2.269,34	0,02%	0,00	0,00	0,00%	105,60	2269,34	0,02%
	BAJANTES AGUA LLUVIA						-		0,00					0,00%
239	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=160mm)	m	168,00	9,91	1.664,88000	153,72	1.523,37	0,02%	0,00	0,00	0,00%	153,72	1523,37	0,02%
240	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	18,00	90,42	1.627,56000	12,00	1.085,04	0,01%	0,00	0,00	0,00%	12,00	1085,04	0,01%
241	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m	120,00	20,59	2.470,80000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
242	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO DIAm. INT.= 200A 160mm PVC Y/O POLIETILENO	u	6,00	20,71	124,26000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22008		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DIAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
	MAMPOSTERÍA						-		0,00					0,00%
243	RIOSTRAS DE H.S. F'C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3	6,50	258,83	1.682,39500	6,14	1.589,22	0,02%	0,00	0,00	0,00%	6,14	1589,22	0,02%
244	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=10 Cm	m2	5,00	17,71	88,55000	5,00	88,55	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	88,55	0,00%
245	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2	716,00	22,90	16.396,40000	704,69	16.137,40	0,17%	0,00	0,00	0,00%	704,69	16137,40	0,17%
246	PICADO Y RESANADO DE mAmPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m	168,00	4,63	777,84000	168,00	777,84	0,01%	0,00	0,00	0,00%	168,00	777,84	0,01%
247	mESON H.A. F'C=180 KG/Cm2 E=7 Cm HIERRO (LAVAmANOS+mESON)	m	3,50	34,03	119,10500	3,20	108,90	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,20	108,90	0,00%
248	REVESTImIENTO mESON GRANITO	m	3,50	180,61	632,13500	4,08	736,89	0,01%	0,58	104,75	0,00%	3,50	632,14	0,01%
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES						-		0,00					0,00%
249	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	380,00	10,27	3.902,60000	380,00	3.902,60	0,04%	0,00	0,00	0,00%	380,00	3902,60	0,04%
250	ENLuCIDO VERTICAL PALETEADO mORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2	1.075,00	8,78	9.438,50000	1.001,92	8.796,86	0,09%	0,00	0,00	0,00%	1001,92	8796,86	0,09%
251	ENLuCIDO CON mALLA+ ImPERmEABILIZANTE, mORTERO 1:3	m2	35,00	17,03	596,05000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
252	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	380,00	5,26	1.998,80000	380,00	1.998,80	0,02%	0,00	0,00	0,00%	380,00	1998,80	0,02%
253	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO INTERIOR) INC. FILOS	m2	2.150,00	4,40	9.460,00000	1.000,72	4.403,17	0,05%	0,00	0,00	0,00%	1000,72	4403,17	0,05%
254	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	2.150,00	4,72	10.148,00000	1.372,80	6.479,63	0,07%	0,00	0,00	0,00%	1372,80	6479,63	0,07%
255	PINTuRA DE CAuCHO SATINADA COLOR(2 mANOS) EXTERIOR (CANASTILLA) <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	380,00	5,72	2.173,60000	540,53	3.091,83	0,03%	160,53	918,23	0,01%	380,00	2173,60	0,02%
256	RECuBRImIENTO PLANCHA FIBROCEmENTO E=7mm	m2	50,00	20,56	1.028,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	CARPINTERIA METALICA						-		0,00					0,00%
257	VENTANA FIJA TuBO RECT 40X80X2-mALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6mm, INC PINTuRA ANTICORROSIVA, A COmPRESOR	m2	182,26	41,30	7.527,33800	92,74	3.830,16	0,04%	0,00	0,00	0,00%	92,74	3830,16	0,04%
258	PORTON TIPO CORREDIZO RETRACTIL TuBO RECT 40X80X2mm-TOOL GALV. 0,6mm	m2	156,67	61,25	9.596,03750	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
259	PuERTA mETÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2mm , INC. CERRADuRA, BISAGRAS Y PINTuRA	m2	20,00	142,73	2.854,60000	35,98	5.135,43	0,05%	15,98	2280,83	0,02%	20,00	2854,60	0,03%
260	PuERTAS mODuLARES, TAmBORADAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, INCLuYE ESTRuCTuRA Y HER	m2	4,00	172,30	689,20000	4,00	689,20	0,01%	0,00	0,00	0,00%	4,00	689,20	0,01%
261	DIVISIONES ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, TAmBORADAS INCLuYE ESTRuCTuRA, EmPOTRAmIENTO PISO PARED (	m2	13,70	161,18	2.208,16600	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	VENTANERIA-PUERTAS ALUMINIO VIDRIO						-		0,00					0,00%
262	PuERTA BATIENTE ALumINIO Y VIDRIO FLOTADO CLARO 6mm (1.00X2.10)	u	3,00	286,07	858,21000	3,00	858,21	0,01%	0,00	0,00	0,00%	3,00	858,21	0,01%
263	VENTANA CORREDIZA ALumINIO SERIE 200-INCL. VIDRIO LAmINADO 6mm	m2	6,00	183,67	1.102,02000	3,54	650,19	0,01%	0,00	0,00	0,00%	3,54	650,19	0,01%
	REVESTIMIENTO DE TUMBADOS						-		0,00					0,00%
264	CIELO RASO FALSO - FIBRA mINERAL Y RECuB LÁmINA ALumINIO 0.60X0.60 BLANCO, TIPO AmSTRONG O SImILAR	m2	129,01	21,59	2.785,32590	95,54	2.062,71	0,02%	0,00	0,00	0,00%	95,54	2062,71	0,02%
265	FRISO GALVALumEN PREPINTADO E= 0.40 INC. FLASHING	m2	0,00	19,63	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS						-		0,00					0,00%
266	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF DISCAPACITADOS PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u	0,00	297,96	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
267	PASAmANOS PARA DISCAPACITADOS TuBO DIAm 32mm E=1.5mm EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO SATINADO (Juego)	u	0,00	281,03	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
268	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u	4,00	297,96	1.191,84000	4,00	1.191,84	0,01%	0,00	0,00	0,00%	4,00	1191,84	0,01%
269	uRINARIO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF	u	1,00	261,01	261,01000	1,00	261,01	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	261,01	0,00%
270	LAVABO BLANCO, LLAVE SENSOR mOVImIENTO (CON ACCESORIOS)	u	3,00	281,39	844,17000	3,00	844,17	0,01%	0,00	0,00	0,00%	3,00	844,17	0,01%
271	DISPENSOR DE PAPEL HIGIENICO DIAm=275mm, ROLLO 70mm, ABATIBLE ACERO INOX E=8mm, AISI 304, ACABADO S	u	3,00	110,71	332,13000	3,00	332,13	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	332,13	0,00%
272	DISPENSOR DE PAPEL TOALLA 400-600 uNIDADES, 330X273X130mm, ACERO INOX E=8mm AISI 304, ACABADO SATINAD	u	2,00	113,00	226,00000	2,00	226,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	226,00	0,00%
273	DISPENSADOR DE JABON LIQuIDO ACERO INOX AISI304, ACABADO SATINADO	u	2,00	91,28	182,56000	2,00	182,56	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	182,56	0,00%
274	ESPEJO DE VIDRIO FLOTADO 4mm- mARCO DE ALumINIO	m2	2,70	42,86	115,72200	2,70	115,89	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,70	115,89	0,00%
275	SECADOR DE mANOS ACCIONAmIENTO AuTOmATICO 260X302X150mm, ACERO INOX. 304, LAmINA1.5mm 110V-60HZ	u	2,00	238,44	476,88000	2,00	476,88	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	476,88	0,00%
276	BASuRERO CILINDRICO A PEDAL D=250mm H=385 PARA BAÑO ACERO INOX. 304	u	4,00	66,60	266,40000	4,00	266,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	266,40	0,00%
277	DuCHAS CON mEZCLADORA (CON ACCESORIOS)	u	1,00	135,94	135,94000	1,00	135,94	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	135,94	0,00%
	5.- NAVE RESGUARDO VEHICULAR PESADO						-		0,00					0,00%
	PRELIMINARES						-		0,00					0,00%
278	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	5.783,22	1,14	6.592,87080	5.783,22	6.592,87	0,07%	0,00	0,00	0,00%	5783,22	6592,87	0,07%
279	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	1.445,85	1,46	2.110,94100	3.023,25	4.413,95	0,05%	1577,40	2303,00	0,02%	1445,85	2110,94	0,02%
280	ACOmETIDA E INST. DE AGuA POTABLE PROVISIONAL PVC 3/4"	m	0,00	8,44	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
281	ACOmETIDA E INST. ELÉCTRICA PROV. TuBERÍA CONDuIT 1" CABLENo.8	m	0,00	27,58	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
282	SONDEOS DE SuELOS (COmPROBACION IN SITu) NEC-15	m	66,00	55,43	3.658,38000	66,00	3.658,38	0,04%	0,00	0,00	0,00%	66,00	3658,38	0,04%
283	CERRAmIENTO PROVISIONAL LISTONES + PLANCHAS DE ZINC	m2	0,00	11,69	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS						-		0,00					0,00%
284	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	78,36	4,18	327,54480	153,24	640,54	0,01%	74,88	313,00	0,00%	78,36	327,54	0,00%
285	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	0,00	17,93	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22008	
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21
PLAZO:	365	DIAS
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
286	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	78,36	17,33	1.357,97880	165,96	2.876,09	0,03%	87,60	1518,11	0,02%	78,36	1357,98	0,01%
287	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	635,58	13,72	8.720,15760	592,20	8.124,98	0,08%	0,00	0,00	0,00%	592,20	8124,98	0,08%
288	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	78,36	2,82	220,97520	153,24	432,14	0,00%	74,88	211,16	0,00%	78,36	220,98	0,00%
	HORMIGONES						-		0,00					0,00%
289	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	7,20	163,18	1.174,89600	7,20	1.174,90	0,01%		0,00	0,00%	7,20	1174,90	0,01%
290	HORmIGÓN PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIÓNF'C = 280KG./Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	29,00	225,97	6.553,13000	25,34	5.726,08	0,06%	0,00	0,00	0,00%	25,34	5726,08	0,06%
291	HORmIGON PREmEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	84,75	283,42	24.019,84500	84,00	23.807,28	0,25%	0,00	0,00	0,00%	84,00	23807,28	0,25%
292	HORmIGÓN PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	14,26	289,16	4.123,42160	9,12	2.637,14	0,03%	0,00	0,00	0,00%	9,12	2637,14	0,03%
293	HORmIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F'C=180 KG/Cm2-50por cientoP)CIm	m3	56,51	169,86	9.598,78860	56,84	9.654,84	0,10%	0,33	56,05	0,00%	56,51	9596,79	0,10%
	ACERO ESTRUCTURAL						-		0,00					0,00%
294	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	9.807,60	1,68	16.476,76800	10.802,43	18.148,08	0,19%	994,83	1671,31	0,02%	9807,60	16476,77	0,17%
295	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2	3.325,46	4,84	16.095,20220	2.885,88	13.967,66	0,15%	0,00	0,00	0,00%	2885,88	13967,66	0,15%
	CONTRAPISOS						-		0,00					0,00%
296	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3 (CONTRAPISO E=20Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	282,00	10,78	3.039,96000	263,21	2.837,40	0,03%	0,00	0,00	0,00%	263,21	2837,40	0,03%
297	mATERIAL DE BASE CLASE 2 (CONTRAPISO E=15Cm, COmPAC. 100por ciento P.E.m.)	m3	211,86	24,55	5.201,16300	197,41	4.846,42	0,05%	0,00	0,00	0,00%	197,41	4846,42	0,05%
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS								0,00					
	CUBIERTA								0,00					0,00%
	BAJANTES AGUA LLUVIA								0,00					0,00%
298	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	12,00	90,42	1.085,04000	12,00	1.085,04	0,01%	0,00	0,00	0,00%	12,00	1085,04	0,01%
299	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m	161,40	20,59	3.323,22600	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
300	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO DIAm. INT.= 200A 160mm PVC Y/O POLIETILENO	u	0,00	20,71	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES						-		0,00					
301	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	40,00	10,27	410,80000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
302	EmPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	40,00	5,26	210,40000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
303	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	40,00	4,72	188,80000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	10.- SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACIÓN						-		0,00					
	POZOS DE REVISION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS						-		0,00					0,00%
304	CAJA REVISION mEDIA TENSION 90X90X90 C/VIA. T/HA	u	0,00	169,45	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
305	CAJA REVISION mEDIA TENSION 60X60X75 ACERA. T/HA	u	41,00	179,17	7.345,97000	41,00	7.345,97	0,08%	0,00	0,00	0,00%	41,00	7345,97	0,08%
306	PuESTA A TIERRA SImPLE EN POZO ELECTRICO CON SuELDA EXOTERmICA	u	4,00	164,46	657,84000	4,00	657,84	0,01%	0,00	0,00	0,00%	4,00	657,84	0,01%
	SISTEMA SOTERRADO DE MEDIA TENSION		0,00				-		0,00					0,00%
307	BAJADA DE DE mEDIA TENSION AEREA SOTERRADA	u	4,00	600,70	2.402,80000	1,00	600,70	0,01%	0,00	0,00	0,00%	1,00	600,70	0,01%
308	TENDIDO DE TuBO RIGIDO 1 1/2" DOBLE	m	0,00	16,92	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
309	SISTEmA TIERRA DE mEDIA TENSION	u	1,00	1.781,59	1.781,59000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
310	PARARRAYOS 10 KV, CON PERNOS SIuIECCION	u	3,00	84,46	253,38000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
311	SECCIONAmIENTO TRIFASICO AEREO SuBTERRANEO S3A/S, INC. PARARRAYOS	u	3,00	1.290,60	3.871,80000	3,00	3.871,80	0,04%	0,00	0,00	0,00%	3,00	3871,80	0,04%
312	TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNuDO NO. 2 AWG	m	500,00	5,92	2.960,00000	602,02	3.563,96	0,04%	0,00	603,96	0,01%	500,00	2960,00	0,03%
313	TENDIDO Y REGuLADO DE CABLE DE COBRE XLPE NO2-15KV	u	1.600,00	14,75	23.600,00000	1.636,66	24.140,74	0,25%	0,00	540,74	0,01%	1600,00	23600,00	0,25%
314	TENDIDO CONDuCTOR: TTu 2/0	m	0,00	36,79	0,00000	369,42	13.590,96	0,14%	0,00	0,00	0,00%	369,42	13590,96	0,14%
315	TENDIDO CONDuCTOR: TTu 3/0	m	0,00	45,20	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
316	mALLA DE PuESTA A TIERRA EN CENTRO DE TRANSFORmACION CON SuELDA EXOTERmICA	u	4,00	581,10	2.324,40000	3,00	1.743,30	0,02%	0,00	0,00	0,00%	3,00	1743,30	0,02%
317	BANCO DE DuCTOS 1X2 DE 110mm 1X2B1-B2	m	1.800,00	32,94	59.292,00000	1.181,87	38.930,80	0,40%	0,00	0,00	0,00%	1181,87	38930,80	0,40%
318	mONTAJE DE TRANSFORmADOR PADmOuNTED TRIFASICO TIPO mALLA DE 50KVA-13.8KV-127/220V	u	1,00	7.092,79	7.092,79000	1,00	7.092,79	0,07%	0,00	0,00	0,00%	1,00	7092,79	0,07%
319	mONTAJE DE TRANSFORmADOR PADmOuNTED TRIFASICO TIPO mALLA DE 100KVA-13.8KV-127/220V	u	1,00	12.135,60	12.135,60000	1,00	12.135,60	0,13%	0,00	0,00	0,00%	1,00	12135,60	0,13%
320	PuNTA TERmINAL AT TIPO EXTERIOR CABLE N° 2 AWG	u	0,00	170,72	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
321	PuNTA TERmINAL AT TIPO INTERIOR CABLE N° 2 AWG	u	3,00	170,72	512,16000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
322	ACOmETIDA PRINCIPAL ELECTRICA	m	15,00	6,22	93,30000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO						-		0,00					0,00%
323	POSTES ORNAmENTALES DE 8mTS Y BRAZOS	u	57,00	799,03	45.544,71000	56,00	44.745,68	0,47%	0,00	0,00	0,00%	56,00	44745,68	0,47%
324	LumINARIA ORNAmENTAL LED120W	u	82,00	532,37	43.654,34000	68,00	36.201,16	0,38%	0,00	0,00	0,00%	68,00	36201,16	0,38%
325	LumINARIA ORNAmENTAL LED 60W	u	33,00	387,65	12.792,45000	31,00	12.017,15	0,12%	0,00	0,00	0,00%	31,00	12017,15	0,12%
326	TENDIDO DE CONDuCTOR 1No. NO. 4 TTu	m	4.647,00	8,10	37.640,70000	6.775,11	54.878,39	0,57%	2128,11	17237,69	0,18%	4647,00	37640,70	0,39%
327	mONTAJE DE TRANSF. mONO. PADmOuNTED 10 KVA	u	1,00	5.210,22	5.210,22000	1,00	5.210,22	0,05%	0,00	0,00	0,00%	1,00	5210,22	0,05%
	AREA ADMINISTRATIVA PLANTA BAJA						-		0,00					0,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22008		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DIAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
	INSTALACION LUMINARIAS						-		0,00					0,00%
328	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	636,00	3,34	2.124,24000	748,07	2.498,55	0,03%	112,07	374,31	0,00%	636,00	2124,24	0,02%
329	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	218,00	1,18	257,24000	217,00	256,06	0,00%	0,00	0,00	0,00%	217,00	256,06	0,00%
330	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	620,00	0,56	347,20000	505,00	282,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%	505,00	282,80	0,00%
331	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	350,00	4,87	1.704,50000	322,00	1.568,14	0,02%	0,00	0,00	0,00%	322,00	1568,14	0,02%
332	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	150,00	1,57	235,50000	63,00	98,91	0,00%	0,00	0,00	0,00%	63,00	98,91	0,00%
333	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AmARILLO (INC. TAYPE)	m	1.043,00	2,28	2.378,04000	730,10	1.664,63	0,02%	0,00	0,00	0,00%	730,10	1664,63	0,02%
334	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	1.043,00	1,43	1.491,49000	730,10	1.044,04	0,01%	0,00	0,00	0,00%	730,10	1044,04	0,01%
335	LumINARIA LED 3X18W/120 VOLTIOS	u	130,00	60,59	7.876,70000	155,00	9.391,45	0,10%	25,00	1514,75	0,02%	130,00	7876,70	0,08%
336	LumINARIA LED 24W/120 VOLTIOS	u	14,00	58,36	817,04000	26,00	1.517,36	0,02%	12,00	700,32	0,01%	14,00	817,04	0,01%
337	INTERRuPTOR SImPLE CON TAPA	u	38,00	5,47	207,86000	47,00	257,09	0,00%	9,00	49,23	0,00%	38,00	207,86	0,00%
338	INTERRuPTOR DOBLE CON TAPA	u	14,00	6,16	86,24000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
339	INTERRuPTOR CONmuTADOR DE 3 VIAS	u	17,00	7,30	124,10000	30,00	219,00	0,00%	13,00	94,90	0,00%	17,00	124,10	0,00%
	TOMACORRIENTES GENERALES						-		0,00					0,00%
340	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	780,00	3,34	2.605,20000	1.145,28	3.825,24	0,04%	365,28	1220,04	0,01%	780,00	2605,20	0,03%
341	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	260,00	1,18	306,80000	255,00	300,90	0,00%	0,00	0,00	0,00%	255,00	300,90	0,00%
342	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	570,00	0,56	319,20000	607,00	339,92	0,00%	37,00	20,72	0,00%	570,00	319,20	0,00%
343	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	390,00	4,87	1.899,30000	242,00	1.178,54	0,01%	0,00	0,00	0,00%	242,00	1178,54	0,01%
344	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	892,00	1,43	1.275,56000	1.210,07	1.730,40	0,02%	318,07	454,84	0,00%	892,00	1275,56	0,01%
345	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	892,00	1,43	1.275,56000	1.190,17	1.701,94	0,02%	298,17	426,38	0,00%	892,00	1275,56	0,01%
346	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	892,00	1,03	918,76000	1.190,17	1.225,87	0,01%	298,17	307,11	0,00%	892,00	918,76	0,01%
347	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	130,00	1,57	204,10000	174,00	273,18	0,00%	44,00	69,08	0,00%	130,00	204,10	0,00%
348	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	130,00	7,45	968,50000	182,00	1.355,90	0,01%	52,00	387,40	0,00%	130,00	968,50	0,01%
	TOMACORRIENTES REGULADOS UPS						-		0,00					0,00%
349	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	195,00	3,34	651,30000	320,15	1.069,30	0,01%	125,15	418,00	0,00%	195,00	651,30	0,01%
350	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	65,00	1,18	76,70000	65,00	76,70	0,00%	16,00	18,88	0,00%	49,00	57,82	0,00%
351	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	106,00	0,56	59,36000	153,00	85,68	0,00%	47,00	26,32	0,00%	106,00	59,36	0,00%
352	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	100,00	4,87	487,00000	100,00	487,00	0,01%	0,00	0,00	0,00%	100,00	487,00	0,01%
353	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	24,00	1,57	37,68000	30,00	47,10	0,00%	6,00	9,42	0,00%	24,00	37,68	0,00%
354	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	267,00	1,43	381,81000	445,88	637,51	0,01%	178,88	255,80	0,00%	267,00	381,81	0,00%
355	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	267,00	1,43	381,81000	445,88	637,51	0,01%	178,88	255,80	0,00%	267,00	381,81	0,00%
356	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	267,00	1,03	275,01000	445,88	459,26	0,00%	178,88	184,25	0,00%	267,00	275,01	0,00%
357	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	24,00	7,45	178,80000	22,00	163,90	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22,00	163,90	0,00%
	AREA ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA						-		0,00					0,00%
	INSTALACION LUMINARIAS						-		0,00					0,00%
358	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	584,00	3,34	1.950,56000	711,38	2.376,01	0,02%	127,38	425,45	0,00%	584,00	1950,56	0,02%
359	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	194,00	1,18	228,92000	172,00	202,96	0,00%	0,00	0,00	0,00%	172,00	202,96	0,00%
360	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	570,00	0,56	319,20000	466,00	260,96	0,00%	0,00	0,00	0,00%	466,00	260,96	0,00%
361	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	500,00	4,87	2.435,00000	279,00	1.358,73	0,01%	0,00	0,00	0,00%	279,00	1358,73	0,01%
362	CAJETINES mETALICOS OCTOGONALES mEDIANOS CON TAPA	u	900,00	5,44	4.896,00000	961,00	5.227,84	0,05%	61,00	331,84	0,00%	900,00	4896,00	0,05%
363	CAJETINES mETALICOS CuADRADOS CON TAPA 10X10	u	5,00	4,99	24,95000	5,00	24,95	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	24,95	0,00%
364	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	60,00	1,57	94,20000	50,00	78,50	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	78,50	0,00%
365	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AmARILLO (INC. TAYPE)	m	1.200,00	2,28	2.736,00000	870,00	1.983,60	0,02%	0,00	0,00	0,00%	870,00	1983,60	0,02%
366	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	1.200,00	1,43	1.716,00000	875,00	1.251,25	0,01%	0,00	0,00	0,00%	875,00	1251,25	0,01%
367	LumINARIA LED 3X18W/120 VOLTIOS	u	180,00	60,59	10.906,20000	180,00	10.906,20	0,11%	0,00	0,00	0,00%	180,00	10906,20	0,11%
368	LumINARIA LED 24W/120 VOLTIOS	u	33,00	58,36	1.925,88000	33,00	1.925,88	0,02%	0,00	0,00	0,00%	33,00	1925,88	0,02%
369	INTERRuPTOR SImPLE CON TAPA	u	50,00	5,47	273,50000	63,00	344,61	0,00%	13,00	71,11	0,00%	50,00	273,50	0,00%
370	INTERRuPTOR DOBLE CON TAPA	u	15,00	6,16	92,40000	7,00	43,12	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7,00	43,12	0,00%
371	INTERRuPTOR TRIPLE CON TAPA	u	4,00	7,30	29,20000	2,00	14,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	14,60	0,00%
372	INTERRuPTOR CONmuTADOR DE 3 VIAS	u	0,00	7,30	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	TOMACORRIENTES GENERALES						-		0,00					0,00%
373	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	895,00	3,34	2.989,30000	1.004,22	3.354,10	0,03%	109,22	364,80	0,00%	895,00	2989,30	0,03%
374	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	300,00	1,18	354,00000	274,00	323,32	0,00%	0,00	0,00	0,00%	274,00	323,32	0,00%
375	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	670,00	0,56	375,20000	527,00	295,12	0,00%	0,00	0,00	0,00%	527,00	295,12	0,00%
376	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	400,00	4,87	1.948,00000	244,00	1.188,28	0,01%	0,00	0,00	0,00%	244,00	1188,28	0,01%
377	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	4.000,00	1,43	5.720,00000	2.800,00	4.004,00	0,04%	0,00	0,00	0,00%	2800,00	4004,00	0,04%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22008		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DIAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
378	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	1.080,00	1,43	1.544,40000	756,00	1.081,08	0,01%	0,00	0,00	0,00%	756,00	1081,08	0,01%
379	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	1.080,00	1,03	1.112,40000	756,00	778,68	0,01%	0,00	0,00	0,00%	756,00	778,68	0,01%
380	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	155,00	1,57	243,35000	170,00	266,90	0,00%	15,00	23,55	0,00%	155,00	243,35	0,00%
381	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	170,00	7,45	1.266,50000	163,00	1.214,35	0,01%	0,00	0,00	0,00%	163,00	1214,35	0,01%
	TOMACORRIENTES REGULADOS UPS						-		0,00					0,00%
382	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	368,00	3,34	1.229,12000	482,38	1.611,15	0,02%	114,38	382,03	0,00%	368,00	1229,12	0,01%
383	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	125,00	1,18	147,50000	121,00	142,78	0,00%	0,00	0,00	0,00%	121,00	142,78	0,00%
384	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	220,00	0,56	123,20000	225,00	126,00	0,00%	5,00	2,80	0,00%	220,00	123,20	0,00%
385	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	190,00	4,87	925,30000	129,00	628,23	0,01%	0,00	0,00	0,00%	129,00	628,23	0,01%
386	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	48,00	1,57	75,36000	58,00	91,06	0,00%	10,00	15,70	0,00%	48,00	75,36	0,00%
387	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	489,00	1,43	699,27000	611,28	874,13	0,01%	122,28	174,86	0,00%	489,00	699,27	0,01%
388	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	489,00	1,43	699,27000	611,28	874,13	0,01%	122,28	174,86	0,00%	489,00	699,27	0,01%
389	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	489,00	1,03	503,67000	611,28	629,62	0,01%	122,28	125,95	0,00%	489,00	503,67	0,01%
390	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	48,00	7,45	357,60000	61,00	454,45	0,00%	13,00	96,85	0,00%	48,00	357,60	0,00%
	ALIMENTACION AIREACONDICIONADO PLANTA BAJA Y ALATA						-		0,00					0,00%
391	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	600,00	3,34	2.004,00000	283,81	947,93	0,01%	0,00	0,00	0,00%	283,81	947,93	0,01%
392	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	250,00	1,18	295,00000	64,00	75,52	0,00%	0,00	0,00	0,00%	64,00	75,52	0,00%
393	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	200,00	0,56	112,00000	134,00	75,04	0,00%	0,00	0,00	0,00%	134,00	75,04	0,00%
394	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	246,00	4,87	1.207,76000	162,00	788,94	0,01%	0,00	0,00	0,00%	162,00	788,94	0,01%
395	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	885,00	1,43	1.265,55000	1.057,82	1.512,69	0,02%	172,82	247,13	0,00%	885,00	1265,56	0,01%
396	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	885,00	1,43	1.265,55000	1.057,82	1.512,69	0,02%	172,82	247,13	0,00%	885,00	1265,56	0,01%
397	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	885,00	1,43	1.265,55000	1.057,82	1.512,69	0,02%	172,82	247,13	0,00%	885,00	1265,56	0,01%
398	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	50,00	1,57	78,50000	30,00	47,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,00	47,10	0,00%
399	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 220 V	u	50,00	7,45	372,50000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	AREA DE MECANICA PESADA Y LIVIANA						-		0,00					0,00%
	INSTALACION LUMINARIAS						-		0,00					0,00%
400	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	540,00	3,34	1.803,60000	671,30	2.242,14	0,02%	131,30	438,54	0,00%	540,00	1803,60	0,02%
401	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	66,00	1,18	77,88000	117,00	138,06	0,00%	51,00	60,18	0,00%	66,00	77,88	0,00%
402	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	132,00	0,56	73,92000	293,00	164,08	0,00%	161,00	90,16	0,00%	132,00	73,92	0,00%
403	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	436,00	4,87	2.123,32000	286,00	1.392,82	0,01%	0,00	0,00	0,00%	286,00	1392,82	0,01%
404	CAJETINES mETALICOS CuADRADOS CON TAPA 10X10	u	20,00	4,99	99,80000	10,00	49,90	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00	49,90	0,00%
405	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	65,00	1,57	102,05000	30,00	47,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,00	47,10	0,00%
406	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AmARILLO (INC. TAYPE)	m	88,00	2,28	200,64000	251,73	573,95	0,01%	163,73	373,30	0,00%	88,00	200,64	0,00%
407	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	88,00	1,43	125,84000	181,56	259,63	0,00%	93,56	133,79	0,00%	88,00	125,84	0,00%
408	LumINARIA LED 3X18W/120 VOLTIOS	u	11,00	60,59	666,49000	41,00	2.484,19	0,03%	0,00	0,00	0,00%	41,00	2484,19	0,03%
409	LumINARIA LED 24W/120 VOLTIOS	u	0,00	58,36	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
410	INTERRuPTOR SImPLE CON TAPA	u	0,00	5,47	0,00000	2,00	10,94	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	10,94	0,00%
411	INTERRuPTOR DOBLE CON TAPA	u	1,00	6,16	6,16000	1,00	6,16	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	6,16	0,00%
412	INTERRuPTOR TRIPLE CON TAPA	u	1,00	7,30	7,30000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
413	LumINARIA LED 150W/220 VOLTIOS	u	53,00	193,85	10.274,05000	53,00	10.274,05	0,11%	0,00	0,00	0,00%	53,00	10274,05	0,11%
414	TENDIDO DE CABLE CONCENTRICO 2X12 AWG(INC. TAYPE)	m	710,00	3,43	2.435,30000	1.449,04	4.970,21	0,05%	739,04	2534,91	0,03%	710,00	2435,30	0,03%
	TOMACORRIENTES GENERALES						-		0,00					0,00%
415	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	300,00	3,34	1.002,00000	405,83	1.355,47	0,01%	105,83	353,47	0,00%	300,00	1002,00	0,01%
416	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	100,00	1,18	118,00000	87,00	102,66	0,00%	0,00	0,00	0,00%	87,00	102,66	0,00%
417	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	150,00	0,56	84,00000	157,00	87,92	0,00%	7,00	3,92	0,00%	150,00	84,00	0,00%
418	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	200,00	4,87	974,00000	101,00	491,87	0,01%	0,00	0,00	0,00%	101,00	491,87	0,01%
419	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	350,00	1,43	500,50000	559,08	799,48	0,01%	208,18	297,70	0,00%	350,90	501,79	0,01%
420	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	350,00	1,43	500,50000	559,08	799,48	0,01%	208,18	297,70	0,00%	350,90	501,79	0,01%
421	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	350,00	1,03	360,50000	559,08	575,86	0,01%	208,18	214,43	0,00%	350,90	361,43	0,00%
422	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	30,00	1,57	47,10000	48,00	75,36	0,00%	18,00	28,26	0,00%	30,00	47,10	0,00%
423	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	30,00	7,45	223,50000	38,00	283,10	0,00%	8,00	59,60	0,00%	30,00	223,50	0,00%
424	TuBERIA EmT 3/4 PuLGADA	m	250,00	3,47	867,50000	377,19	1.308,85	0,01%	127,19	441,35	0,00%	250,00	867,50	0,01%
425	TENDIDO DE CABLE CONCENTRICO NO.3X10 AWG (INC. TAYPE)	m	400,00	4,01	1.604,00000	636,52	2.552,45	0,03%	236,52	948,45	0,01%	400,00	1604,00	0,02%
426	TOmA ESPECIAL 220 VOLTIOS	u	25,00	11,10	277,50000	20,00	222,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	222,00	0,00%
	AREA DE CHAPISTERIA, LAVADO, TORNO, VULCANIZADORA						-		0,00					0,00%
	INSTALACION LUMINARIAS						-		0,00					0,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22008
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DIAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
427	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	195,00	3,34	651,30000	221,78	740,75	0,01%	26,78	89,45	0,00%	195,00	651,30	0,01%
428	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	65,00	1,18	76,70000	44,00	51,92	0,00%	0,00	0,00	0,00%	44,00	51,92	0,00%
429	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	98,00	0,56	54,88000	162,00	90,72	0,00%	64,00	35,84	0,00%	98,00	54,88	0,00%
430	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	328,00	4,87	1.597,36000	184,00	896,08	0,01%	0,00	0,00	0,00%	184,00	896,08	0,01%
431	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	26,00	1,57	40,82000	20,00	31,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	31,40	0,00%
432	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AmARILLO (INC. TAYPE)	m	220,00	2,28	501,60000	136,93	312,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%	136,93	312,20	0,00%
433	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	220,00	1,43	314,60000	136,93	195,81	0,00%	0,00	0,00	0,00%	136,93	195,81	0,00%
434	LumINARIA LED3X18W/120 VOLTIOS	u	45,00	60,59	2.726,55000	39,00	2.363,01	0,02%	0,00	0,00	0,00%	39,00	2363,01	0,02%
435	LumINARIA LED 150W/220 VOLTIOS	u	20,00	193,85	3.877,00000	16,00	3.101,60	0,03%	0,00	0,00	0,00%	16,00	3101,60	0,03%
436	TENDIDO DE CABLE CONCENTRICO 2X12 AWG(INC. TAYPE)	m	150,00	3,43	514,50000	264,20	906,21	0,01%	114,20	391,71	0,00%	150,00	514,50	0,01%
437	INTERRuPTOR SImPLE CON TAPA	u	20,00	5,47	109,40000	16,00	87,52	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16,00	87,52	0,00%
	TOMACORRIENTES GENERALES						-		0,00					0,00%
438	TuBERIA EmT 1/2 PuLGADA	m	635,00	3,34	2.120,90000	138,90	463,92	0,00%	0,00	0,00	0,00%	138,90	463,92	0,00%
439	uNION EmT 1/2 PuLGADA	u	212,00	1,18	250,16000	122,00	143,96	0,00%	0,00	0,00	0,00%	122,00	143,96	0,00%
440	CONECTOR EmT 1/2 PuLGADA	u	315,00	0,56	176,40000	289,00	161,84	0,00%	0,00	0,00	0,00%	289,00	161,84	0,00%
441	FIJACION DE TuBOS EN LOZA CON GRAPA mETALICA EmT 1/2 PuLGADA	u	428,00	4,87	2.084,36000	139,00	676,93	0,01%	0,00	0,00	0,00%	139,00	676,93	0,01%
442	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZuL (INC. TAYPE)	m	550,00	1,43	786,50000	275,00	393,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%	275,00	393,25	0,00%
443	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	550,00	1,43	786,50000	275,00	393,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%	275,00	393,25	0,00%
444	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	550,00	1,03	566,50000	275,00	283,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%	275,00	283,25	0,00%
445	TOmACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	40,00	7,45	298,00000	37,00	275,65	0,00%	0,00	0,00	0,00%	37,00	275,65	0,00%
446	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	42,00	1,57	65,94000	37,00	58,09	0,00%	0,00	0,00	0,00%	37,00	58,09	0,00%
447	TuBERIA EmT 3/4 PuLGADA	m	127,00	3,47	440,69000	201,68	699,83	0,01%	74,68	259,14	0,00%	127,00	440,69	0,00%
448	uNION EmT 3/4 PuLGADA	u	43,00	1,28	55,04000	63,00	80,64	0,00%	20,00	25,60	0,00%	43,00	55,04	0,00%
449	CONECTOR EmT 3/4 PuLGADA	u	86,00	0,77	66,22000	161,00	123,97	0,00%	75,00	57,75	0,00%	86,00	66,22	0,00%
450	TOmA ESPECIAL 220 VOLTIOS	u	10,00	11,10	111,00000	16,00	177,60	0,00%	6,00	66,60	0,00%	10,00	111,00	0,00%
	AREA DE RESGUARDO DE VEHICULOS						-		0,00					0,00%
	INSTALACION LUMINARIAS						-		0,00					0,00%
451	LumINARIA LED 150W/220 VOLTIOS	u	20,00	193,85	3.877,00000	15,00	2.907,75	0,03%	0,00	0,00	0,00%	15,00	2907,75	0,03%
452	TENDIDO DE CABLE CONCENTRICO 2X12 AWG(INC. TAYPE)	m	512,00	3,43	1.756,16000	512,00	1.756,16	0,02%	0,00	0,00	0,00%	512,00	1756,16	0,02%
	TOMACORRIENTES GENERALES						-		0,00					0,00%
453	TOmA ESPECIAL 220 VOLTIOS	u	8,00	11,10	88,80000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
454	CAJETINES mETALICOS RECTANGuLARES PROFuNDOS	u	8,00	1,57	12,56000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	GRUPO ELECTROGENO						-		0,00					0,00%
	ACOMETIDA CENTRO DE TRANSFORMACION, GENERACION Y MEDICION DE ENERGIA						-		0,00					0,00%
455	mEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA INDIRECTO TRIFASICO 400/5A CLASE 0,5	u	1,00	3.275,86	3.275,86000	1,00	3.275,86	0,03%	0,00	0,00	0,00%	1,00	3275,86	0,03%
456	CAJA DE PROTECCION GENERAL TRIFASICA NH-3X350A	u	1,00	468,19	468,19000	1,00	468,19	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	468,19	0,00%
457	GENERADOR DE EmERGENCIA EN CABINA INSONORA 50KVA TRIFASICO 127/220V	u	1,00	23.030,45	23.030,45000	1,00	23.030,45	0,24%	0,00	0,00	0,00%	1,00	23030,45	0,24%
458	TABLERO DE TRANSFERENCIA AuTOmATICO TRIFASICO 3P/300A	u	1,00	4.845,70	4.845,70000	1,00	4.845,70	0,05%	0,00	0,00	0,00%	1,00	4845,70	0,05%
459	PRuEBAS DE ENERGIZACION Y TRAmITES EmPRESA ELECTRICA, PAGOS (Global)	u	1,00	3.278,88	3.278,88000	1,00	3.278,88	0,03%	0,00	0,00	0,00%	1,00	3278,88	0,03%
460	SISTEmA uPS TRIFASICODE 30 KVA	u	1,00	24.986,66	24.986,66000	1,00	24.986,66	0,26%	0,00	0,00	0,00%	1,00	24986,66	0,26%
461	TABLERO DE BYPASS TRIFASICO 100A CON BARRAS DE COBRE	u	1,00	2.669,86	2.669,86000	1,00	2.669,86	0,03%	0,00	0,00	0,00%	1,00	2669,86	0,03%
462	SISTEmA DE PROTECCION ATmOSFERICA PARRAYOS	u	2,00	1.643,60	3.287,20000	2,00	3.287,20	0,03%	0,00	0,00	0,00%	2,00	3287,20	0,03%
	ALMENTADORES Y SUBTABLEROS CT-1						-		0,00					0,00%
	ALMENTADOR TDP-STE PB1						-		0,00					0,00%
463	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO.3X8+8Cu TW (INC. TAYPE)	m	18,00	12,44	223,92000	105,76	1.315,65	0,01%	79,64	1091,73	0,01%	18,00	223,92	0,00%
464	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PB1	u	1,00	200,82	200,82000	1,00	200,82	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	200,82	0,00%
	ALMENTADOR TDP-STE PB2						-		0,00					0,00%
465	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	31,00	14,51	449,81000	38,50	558,64	0,01%	0,00	108,83	0,00%	31,00	449,81	0,00%
466	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PB2	u	1,00	323,93	323,93000	1,00	323,93	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	323,93	0,00%
	ALMENTADOR TDP-STE PB3						-		0,00					0,00%
467	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	41,00	14,51	594,91000	49,50	718,25	0,01%	0,00	123,34	0,00%	41,00	594,91	0,01%
468	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PB3	u	1,00	213,64	213,64000	2,00	427,28	0,00%	1,00	213,64	0,00%	1,00	213,64	0,00%
	ALMENTADOR TDP-STE PB4						-		0,00					0,00%
469	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	32,00	14,51	464,32000	41,80	606,52	0,01%	0,00	142,20	0,00%	32,00	464,32	0,00%
470	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PB4	u	1,00	226,90	226,90000	2,00	453,80	0,00%	1,00	226,90	0,00%	1,00	226,90	0,00%
	ALMENTADOR TPD-STE PB5						-		0,00					0,00%
471	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	26,00	14,51	377,26000	34,90	506,40	0,01%	0,00	129,14	0,00%	26,00	377,26	0,00%
472	SuBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PB5	u	1,00	226,90	226,90000	3,00	680,70	0,01%	2,00	453,80	0,00%	1,00	226,90	0,00%
	ALMENTADOR TPD-STE-PB6						-		0,00					0,00%
473	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	132,00	14,51	1.915,32000	180,00	2.611,80	0,03%	0,00	696,48	0,01%	132,00	1915,32	0,02%
474	SuBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PB6	u	3,00	297,41	892,23000	3,00	892,23	0,01%	0,00	0,00	0,00%	3,00	892,23	0,01%
	ALMENTADOR STD-STE-PA1						-		0,00					0,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22008		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DIAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
475	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	41,00	14,51	594,91000	44,10	639,89	0,01%	0,00	44,98	0,00%	41,00	594,91	0,01%
476	SUBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PA1	u	1,00	214,08	214,08000	1,00	214,08	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	214,08	0,00%
	ALIMENTADOR STD-STE-PA2						-		0,00					0,00%
477	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	111,00	14,51	1.610,61000	153,90	2.233,09	0,02%	0,00	622,48	0,01%	111,00	1610,61	0,02%
478	SUBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PA2	u	3,00	297,41	892,23000	3,00	892,23	0,01%	0,00	0,00	0,00%	3,00	892,23	0,01%
	ALIMENTADOR TPD-STE-PA3						-		0,00					0,00%
479	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	45,00	14,51	652,95000	55,10	799,50	0,01%	0,00	146,55	0,00%	45,00	652,95	0,01%
480	SUBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PA3	u	1,00	230,78	230,78000	1,00	230,78	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	230,78	0,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-PA4						-		0,00					0,00%
481	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	35,00	14,51	507,85000	92,40	1.340,72	0,01%	46,20	832,87	0,01%	35,00	507,85	0,01%
482	SUBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PA4	u	1,00	304,26	304,26000	1,00	304,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	304,26	0,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-PA5		0,00		-		-		0,00					0,00%
483	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	47,00	14,51	681,97000	98,60	1.430,69	0,01%	0,00	748,72	0,01%	47,00	681,97	0,01%
484	SUBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS PA5	u	2,00	217,52	435,04000	2,00	435,04	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	435,04	0,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-PA6						-		0,00					0,00%
485	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	56,00	14,51	812,56000	67,80	983,78	0,01%	0,00	171,22	0,00%	56,00	812,56	0,01%
486	SUBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS PA6	u	1,00	310,67	310,67000	1,00	310,67	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	310,67	0,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A1						-		0,00					0,00%
487	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	122,00	14,51	1.770,22000	106,20	1.540,96	0,02%	0,00	0,00	0,00%	106,20	1540,96	0,02%
488	SUBTABLERO STE QOL 6F-2F-6ESPACIOS A1	u	4,00	122,27	489,08000	3,00	366,81	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	366,81	0,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A2						-		0,00					0,00%
489	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	130,00	14,51	1.886,30000	65,00	943,15	0,01%	0,00	0,00	0,00%	65,00	943,15	0,01%
490	SUBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS A2	u	1,00	122,27	122,27000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR-A3						-		0,00					0,00%
491	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	57,00	14,51	827,07000	73,40	1.065,04	0,01%	0,00	237,96	0,00%	57,00	827,08	0,01%
492	SUBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS A3	u	1,00	187,12	187,12000	1,00	187,12	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	187,12	0,00%
	ALIMENTADOR TPD-STE-ANGAR-A4						-		0,00					0,00%
493	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	92,00	14,51	1.334,92000	43,10	625,38	0,01%	0,00	0,00	0,00%	43,10	625,38	0,01%
494	SUBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS A4	u	2,00	122,27	244,54000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A5						-		0,00					0,00%
495	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	95,00	14,51	1.378,45000	134,00	1.944,35	0,02%	0,00	565,89	0,01%	95,00	1378,46	0,01%
496	SUBTABLERO STE QOL 12F-2F-12ESPACIOS A5	u	1,00	200,82	200,82000	1,00	200,82	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	200,82	0,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A6						-		0,00					0,00%
497	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	146,00	14,51	2.118,46000	62,50	906,87	0,01%	0,00	0,00	0,00%	62,50	906,87	0,01%
498	SUBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS A6	u	2,00	122,27	244,54000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR-A7						-		0,00					0,00%
499	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	82,00	14,51	1.189,82000	120,40	1.747,00	0,02%	0,00	557,18	0,01%	82,00	1189,82	0,01%
500	SUBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS A7	u	1,00	228,23	228,23000	1,00	228,23	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	228,23	0,00%
	ALIMENTADOR TPD-STE-CONDENSADORES						-		0,00					0,00%
501	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	12,00	14,51	174,12000	32,00	464,32	0,00%	20,00	290,20	0,00%	12,00	174,12	0,00%
502	SUBTABLERO STE QOL 20F-2F-20 ESPACIOS CONDENSADORES	u	1,00	738,12	738,12000	1,00	738,12	0,01%	0,00	0,00	0,00%	1,00	738,12	0,01%
	ALIMENTADORES Y SUBTABLEROS CT-2						-		0,00					0,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A1						-		0,00					0,00%
503	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	41,00	14,51	594,91000	62,50	906,88	0,01%	20,50	297,45	0,00%	42,00	609,43	0,01%
504	SUBTABLERO STE QOL 12F-2F-12ESPACIOS ANGAR A1	u	1,00	187,12	187,12000	1,00	187,12	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	187,12	0,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A2						-		0,00					0,00%
505	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	80,00	14,51	1.160,80000	40,00	580,40	0,01%	0,00	0,00	0,00%	40,00	580,40	0,01%
506	SUBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS ANGAR 2	u	1,00	122,27	122,27000	1,00	122,27	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	122,27	0,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR-A3						-		0,00					0,00%
507	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	55,00	14,51	796,05000	27,50	399,03	0,00%	0,00	0,00	0,00%	27,50	399,03	0,00%
508	SUBTABLERO STE QOL 6F-2F-6 ESPACIOS ANGAR 3	u	1,00	122,27	122,27000	1,00	122,27	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	122,27	0,00%
	ALIMENTADOR TPD-STE-ANGAR-A4						-		0,00					0,00%
509	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	40,00	14,51	580,40000	20,00	290,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,00	290,20	0,00%
510	SUBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS ANGAR 4	u	1,00	173,41	173,41000	1,00	173,41	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	173,41	0,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A5						-		0,00					0,00%
511	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	47,00	14,51	681,97000	53,43	775,27	0,01%	6,43	93,30	0,00%	47,00	681,98	0,01%
512	SUBTABLERO STE QOL 12F-2F-12ESPACIOS ANGAR 5	u	1,00	173,41	173,41000	1,00	173,41	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	173,41	0,00%
	ALIMENTADOR TDP-STE-ANGAR -A6						-		0,00					0,00%
513	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 Cu TW (INC. TAYPE)	m	168,00	14,51	2.437,68000	147,86	2.145,45	0,02%	0,00	0,00	0,00%	147,86	2145,45	0,02%
514	SUBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS ANGAR 6	u	3,00	200,82	602,46000	5,00	1.004,10	0,01%	2,00	401,64	0,00%	3,00	602,46	0,01%
	ACOMETIDA B.V PRINCIPAL						-		0,00					0,00%
515	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 2/0 THHN	m	144,00	4,18	601,92000	142,00	593,56	0,01%	0,00	0,00	0,00%	142,00	593,56	0,01%
516	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 1/0 THHN	m	36,00	4,18	150,48000	86,01	359,52	0,00%	50,01	209,04	0,00%	36,00	150,48	0,00%
	ACOMETIDA DE GENERADOR - TTA						-		0,00					0,00%
517	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 2/0 THHN	m	120,00	4,18	501,60000	119,60	499,93	0,01%	0,00	0,00	0,00%	119,60	499,93	0,01%
518	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 1/0 THHN	m	40,00	4,18	167,20000	171,20	715,62	0,01%	131,20	548,42	0,01%	40,00	167,20	0,00%
	ACOMETIDA DE TTA - TDP-N						-		0,00					0,00%
519	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 1/0 THHN	m	60,00	4,18	250,80000	184,00	769,12	0,01%	124,00	518,32	0,01%	60,00	250,80	0,00%
520	TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNuDO NO. 2 AWG	m	25,00	5,92	148,00000	21,40	126,69	0,00%	0,00	0,00	0,00%	21,40	126,69	0,00%
	ACOMETIDA DE TTA - TP						-		0,00					0,00%
521	TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 1/0 THHN	m	40,00	4,18	167,20000	42,60	178,07	0,00%	2,60	10,87	0,00%	40,00	167,20	0,00%
522	TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNuDO NO. 2 AWG	m	14,00	5,92	82,88000	46,00	272,32	0,00%	32,00	189,44	0,00%	14,00	82,88	0,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22008
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DIAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
	CERCO ELECTRICO CERRAMIENTO						-		0,00					0,00%
523	INSTALACION DE CENTRAL ENERGIZADORA 5K	u	0,00	594,89	0,00000	1,00	594,89	0,01%	0,00	0,00	0,00%	1,00	594,89	0,01%
524	COLOCACION DE TuBERIA PREPARADA	u	0,00	10,70	0,00000	201,00	2.150,70	0,02%	0,00	0,00	0,00%	201,00	2150,70	0,02%
525	COLOCACION DE AISLADORES DE PASO DE ESQUINA Y PASANTE	u	0,00	5,26	0,00000	1.205,00	6.338,30	0,07%	0,00	0,00	0,00%	1205,00	6338,30	0,07%
526	TENDIDO DE ALAmBRE SOLIDO GALVANIZADO	m	0,00	0,92	0,00000	4.784,40	4.401,65	0,05%	0,00	0,00	0,00%	4784,40	4401,65	0,05%
527	TENDIDO DE CONDuCTOR DE COBRE DE ALTA TENSION 1/0	m	0,00	18,77	0,00000	11,60	217,73	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11,60	217,73	0,00%
528	INSTALACIONDE BATERIA Y SIRENA	m	0,00	962,28	0,00000	1,00	962,28	0,01%	0,00	0,00	0,00%	1,00	962,28	0,01%
529	SISTEmA DE PUESTA A TIERRA	u	0,00	60,25	0,00000	1,00	60,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	60,25	0,00%
	11.- SISTEMA HIDRAULICO SANITARIO Y CONTRAINCENDIOS						-		0,00					0,00%
	SITEMA DE AGUA POTABLE A PRESIÓN CONSTANTE						-		0,00					0,00%
	ACOMETIDA DE AGUA POTABLE						-		0,00					0,00%
530	TuBERIA PVC D=63 mm 1.0 mPA uE + PRuEBA	m	470,00	4,09	1.922,30000	43,00	175,87	0,00%	0,00	0,00	0,00%	43,00	175,87	0,00%
531	CONEXION DOmICILIARIA INC mEDIDOR EN TuBO D=63mm	u	2,00	100,91	201,82000	2,00	201,82	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	201,82	0,00%
532	HIDRANTES D=3" INCLuYE ACCESORIOS	u	2,00	702,84	1.405,68000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	TUBERIA PVC AGUA POTABLE						-		0,00					0,00%
533	TuBERIA PVC ROSCABLE D=1/2" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	361,00	5,86	2.115,46000	88,42	518,12	0,01%	0,00	0,00	0,00%	88,42	518,12	0,01%
534	TuBERIA PVC ROSCABLE D=3/4" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	59,58	6,59	392,63220	31,93	210,42	0,00%	0,00	0,00	0,00%	31,93	210,42	0,00%
535	TuBERIA PVC ROSCABLE D=1" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	158,67	9,78	1.551,79260	166,82	1.631,50	0,02%	8,15	79,71	0,00%	158,67	1551,79	0,02%
536	TuBERIA PVC ROSCABLE D=1 1/2" EN EDIFICACION+PRuEB	m	98,92	16,09	1.591,62280	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
537	TuBERIA PVC ROSCABLE D=2" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	45,08	14,86	669,88880	83,06	1.234,27	0,01%	37,98	564,38	0,01%	45,08	669,89	0,01%
538	TuBERIA PVC ROSCABLE D=2 1/2"" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	20,04	16,38	328,25520	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
539	TuBERIA PVC ROSCABLE D=3" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	335,60	17,90	6.007,24000	15,04	269,22	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15,04	269,22	0,00%
540	TuBERIA PVC ROSCABLE D=4" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	32,81	18,83	617,81230	26,95	507,47	0,01%	26,95	507,47	0,01%	0,00	0,00	0,00%
	ACCESORIOS INST. TUB PVC ROSCABLE AGUA POTABLE						-		0,00					0,00%
541	ANCLAJES mETALICOS PLATINA 2 por 1/2" (ABRAZADERAS), EN LOSA Y PARED	u	250,00	14,11	3.527,50000	148,00	2.088,28	0,02%	0,00	0,00	0,00%	148,00	2088,28	0,02%
542	S.I. PuNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGuA por punto	u	90,00	13,67	1.230,30000	47,00	642,49	0,01%	0,00	0,00	0,00%	47,00	642,49	0,01%
543	S. I. PuNTO AGuA FRIA PVC ROSCABLE D = 2" por punto	u	35,00	63,31	2.215,85000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
544	VALVuLA DE BRONCE RW 2" +ACCESORIOS	u	5,00	34,99	174,95000	5,00	174,95	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	174,95	0,00%
545	LLAVE DE PASODE 1/2 PuLG	u	15,00	10,15	152,25000	15,00	152,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15,00	152,25	0,00%
	SISTEMA DE AGUA CALIENTE						-		0,00					0,00%
546	S.I. PuNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGuA CALIENTE por punto	u	0,00	16,04	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
547	TuBERIA AGuA CALIENTE PVC ROSCABLE D=1/2" EN EDIFICACION+PRuEBA	m	0,00	6,77	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
548	CALENTADOR ELECTRICO ELECTRICO 15W	u	0,00	539,04	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	SISTEMA DE PRESION (BOMBEO) S AGUA POTABLE		0,00				-		0,00					0,00%
549	S. I. SISTEmA HIDRONEumATICO(2BOmBA5HP-TANQuE 19.8GAL-CAJA CONTROL-CONT. NIVEL-VÁLVuLA CHEQuE). uSO	u	1,00	7.104,62	7.104,62000	1,00	7.104,62	0,07%	0,00	0,00	0,00%	1,00	7104,62	0,07%
550	S. I. SISTEmA HIDRONEumATICO(3BOmBA5HP-TANQuE 29.5GAL-CAJA CONTROL-CONT. NIVEL-VÁLVuLA CHEQuE). uSO	u	1,00	10.425,92	10.425,92000	1,00	10.425,92	0,11%	0,00	0,00	0,00%	1,00	10425,92	0,11%
	SISTEMA CONTRAINCENDIOS		0,00				-		0,00					0,00%
551	S. I. TuBERIA HG ASTmD = 2 ½" + PRuEBA	m	80,00	15,24	1.219,20000	125,02	1.905,30	0,02%	45,02	686,10	0,01%	80,00	1219,20	0,01%
552	S.C. TuBERIA HG ASTm D = 1 1/2 " + PRuEBA	m	40,00	11,54	461,60000	12,10	139,63	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,10	139,63	0,00%
553	S. I. TEE HG ASTmD = 2½"	u	2,00	8,72	17,44000	2,00	17,44	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	17,44	0,00%
554	S. I. CODO HG ASTm90° X D = 2 ½"	u	10,00	6,70	67,00000	8,00	53,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8,00	53,60	0,00%
555	S.I. uNION uNIVERSAL HG ASTm D = 2 1/2"	u	5,00	12,00	60,00000	22,00	264,00	0,00%	17,00	204,00	0,00%	5,00	60,00	0,00%
556	S.I. VALVuLA CHECK BRONCE D = 2 1/2 "	u	1,00	79,42	79,42000	1,00	79,42	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	79,42	0,00%
557	S. I. REDuCTOR HG ASTmD = 2 1/2" X 1 1/2"	u	1,00	9,48	9,48000	2,00	18,96	0,00%	1,00	9,48	0,00%	1,00	9,48	0,00%
558	S. I. uNIÓN uNIVERSAL HG ASTmD = 1 1/2"	u	5,00	8,23	41,15000	2,00	16,45	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	16,45	0,00%
559	S. I. CODO HG ASTm D = 1 1/2"	u	6,00	8,93	53,58000	5,00	44,65	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	44,65	0,00%
560	ANCLAJES mETALICOS PLATINA 2 por 1/2" (ABRAZADERAS), EN LOSA Y PARED	u	80,00	14,11	1.128,80000	67,00	945,37	0,01%	0,00	0,00	0,00%	67,00	945,37	0,01%
561	PuNTO H.G. ROSCABLE 1 1/2" AGuA por punto	u	2,00	74,00	148,00000	2,00	148,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	148,00	0,00%
562	PuNTO H.G. ROSCABLE 2" AGuA por punto	u	1,00	81,83	81,83000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
563	GAB CONT INCEN INC GAB SN VID, RACK DE INC Y mANG 100FT X1½"LLAVE SPANNER1½"NACHA, NIPLE DE BRONC Y P	u	2,00	749,90	1.499,80000	2,00	1.499,80	0,02%	0,00	0,00	0,00%	2,00	1499,80	0,02%
564	SIAmESA 4"X 2 1/2" X 2 1/2" DE BRONCE	u	1,00	295,97	295,97000	1,00	295,97	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	295,97	0,00%
	EXTINTORES						-		0,00					0,00%
565	EXTINTOR POS CAPACIDAD 10 LBS. CON CAJA mETALICA	u	16,00	99,84	1.597,44000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
566	EXTINTOR POS CAPACIDAD 20 LBS. CON CAJA mETALICA	u	2,00	106,69	213,38000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
567	EXTINTOR CO2 CAPACIDAD 10 LBS. CON CAJA mETALICA	u	4,00	97,66	390,64000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
568	EXTINTOR CO2 CAPACIDAD 20 LBS. CON CAJA mETALICA	u	2,00	313,27	626,54000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
569	EXTINTOR CO2 CAPACIDAD TIPO SATELITE DE 50 LBS	u	1,00	578,23	578,23000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	SISTEMA DE PRESION (BOMBEO) S CONTRAINCENDIOS						-		0,00					0,00%
570	S. I. SISTEmA HIDRONEumATICO(BOmBA-mOTOR-CAJA DE CONTROL-CONTROL DE NIVEL-VÁLVuLA CHEQuE). uSOCON	u	1,00	7.949,92	7.949,92000	1,00	7.949,92	0,08%	0,00	0,00	0,00%	1,00	7949,92	0,08%
571	BOmBA JOCKEY; 1 HP, Q=8.70 GPm, PRES=110m; INCLuYE TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS	u	1,00	2.762,08	2.762,08000	1,00	2.762,08	0,03%	0,00	0,00	0,00%	1,00	2762,08	0,03%
	SISTEMA DE REUTILIZACION DE AGUAS LLUVIAS (RIEGO Y LAVADORA AUTO)						-		0,00					0,00%
572	REPLANTEO Y NIVELACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	m	250,00	1,81	452,50000	66,97	121,22	0,00%	0,00	0,00	0,00%	66,97	121,22	0,00%
573	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	200,00	17,93	3.586,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
574	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	200,00	6,32	1.264,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22008
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DIAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
575	BAJANTES DE AGUA LLUVIA (PVC DIAm. INT=160mm)	m	120,00	9,91	1.189,20000	181,08	1.794,50	0,02%	61,08	605,30	0,01%	120,00	1189,20	0,01%
576	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	12,00	90,42	1.085,04000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	TUBERIA PVC RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS						-		0,00					0,00%
577	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=160 mm S6	m	50,00	9,70	485,00000	513,56	4.981,53	0,05%	463,56	4496,53	0,05%	50,00	485,00	0,01%
578	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT = 200 mm S6	m	0,00	15,28	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
579	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 228 mm S6	m	0,00	15,88	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
580	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 250 mm S6	m	90,00	16,51	1.485,90000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
581	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 300 mm S5	m	30,00	20,22	606,60000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
582	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT=400 mm S5	m	428,11	38,33	16.409,45630	765,70	29.349,29	0,31%	337,59	12939,83	0,13%	428,11	16409,46	0,17%
583	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 450 mm S5	m	30,00	44,36	1.330,80000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
584	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm INT= 500 mm S5	m	0,00	74,42	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
585	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 220A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u	3,00	21,28	63,84000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
586	SumIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO 335A 175mm PVC Y/O POLIETILENO	u	3,00	24,14	72,42000	30,00	724,20	0,01%	27,00	651,78	0,01%	3,00	72,42	0,00%
	TUBERIA PVC PRESIÓN RECOLECCION AGUAS LLUVIAS						-		0,00					0,00%
587	TuBERIA PVC D=3" 1.0 mPA + PRuBA	m	12,00	5,16	61,92000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
588	VALVuLA TIPO GLOBO (CONTROL NIVEL mECANICO)	u	2,00	17,82	35,64000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
589	ROCIADOR 3/4 Q=3.22 m3/H. RADIO COBERTuRA 15.8m. 5BAR	u	0,00	17,82	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
590	TuBERIA PVC D=25 mm 1.0 mPA u/C + PRuEBA	m	80,00	2,98	238,40000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
591	TuBERIA PVC D=40 mm 1.0 mPA E/C + PRuEBA	m	20,00	3,38	67,60000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
592	TuBERIA PVC D=50 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m	20,00	3,50	70,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
593	TuBERIA PVC D=63 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m	47,00	4,09	192,23000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
594	TuBERIA PVC D=75 mm 1.0 mPA u/E + PRuBA	m	30,00	5,23	156,90000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
595	TuBERIA PVC D=90 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m	25,00	6,20	155,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
596	TuBERIA PVC D=110 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m	0,00	8,48	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
597	TuBERIA PVC D=125 mm 1.0 mPA u/E + PRuEBA	m	0,00	11,54	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	SISTEMA DE PRESION (RIEGO Y LAVADORA AUTOS)						-		0,00					0,00%
598	GRuPO 2 BOmBAS15 HP (Q=12 L/S, TDH= 80mCA), (2BOmBA-mOTOR-CAJA DE CONTROL-CONTROL DE NIVEL-VÁLVuLA CH	u	0,00	6.465,34	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
599	GRuPO 3 BOmBAS15 HP (Q=21 L/S, TDH= 80mCA), (3BOmBA-mOTOR-CAJA DE CONTROL-CONTROL DE NIVEL-VÁLVuLA CH	u	1,00	8.868,10	8.868,10000	1,00	8.868,10	0,09%	0,00	0,00	0,00%	1,00	8868,10	0,09%
	SISTEMA SANITARIO INTERNO						-		0,00					0,00%
	PRELIMINARES Y MOV. TIERRAS						-		0,00					0,00%
600	REPLANTEO Y NIVELACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO	m	390,00	1,81	705,90000	15,91	28,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15,91	28,80	0,00%
601	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	12,00	17,93	215,16000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
602	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	0,00	6,32	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE						-		0,00					0,00%
603	PuNTO DE DESAGuE EN PVC 50 mm	u	86,00	28,80	2.476,80000	86,00	2.476,80	0,03%	0,00	0,00	0,00%	86,00	2476,80	0,03%
604	PuNTO DE DESAGuE EN PVC 110 mm	u	45,00	34,43	1.549,35000	41,00	1.411,63	0,01%	0,00	0,00	0,00%	41,00	1411,63	0,01%
605	TuBERIA PVC 50 mm DE DIAmETRO (mAT/TRASP/INST)	m	125,60	5,14	645,58400	70,47	362,23	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,47	362,23	0,00%
606	TuBERIA PVC 110 mm DE DIAmETRO (mAT/TRASP/INST)	m	420,00	8,02	3.368,40000	420,00	3.368,40	0,04%	0,00	0,00	0,00%	420,00	3368,40	0,04%
607	TuBERIA PVC 160 mm DE DIAmETRO (mAT/TRASP/INST)	m	165,00	14,52	2.395,80000	72,64	1.054,73	0,01%	0,00	0,00	0,00%	72,64	1054,73	0,01%
608	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	6,00	90,42	542,52000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	INSTALACION TUBERIA PVC DEVENTILACIÓN						-		0,00					0,00%
609	TuBERIA PVC D=75 mm VENTILACION	m	78,00	4,27	333,06000	174,22	743,92	0,01%	96,22	410,86	0,00%	78,00	333,06	0,00%
610	PuNTO DE VENTILACIÓN PVC 75 mm por punto	u	25,00	15,61	390,25000	26,00	405,86	0,00%	1,00	15,61	0,00%	25,00	390,25	0,00%
	TANQUES DE RESERVA DE AGUA-CISTERNAS 49 M3						-		0,00					0,00%
	PRELIMINARES						-		0,00					0,00%
611	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	68,64	1,14	78,24960	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
612	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	60,00	1,46	87,60000	60,00	87,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60,00	87,60	0,00%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS						-		0,00					0,00%
613	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	0,00	17,93	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
614	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	201,65	4,18	842,89700	201,60	842,69	0,01%	0,00	0,00	0,00%	201,60	842,69	0,01%
615	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	m2	0,00	11,56	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
616	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=6" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	41,00	13,72	562,52000	42,00	576,24	0,01%	1,00	13,72	0,00%	41,00	562,52	0,01%
617	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	10,00	6,32	63,20000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	HORMIGONES						-		0,00					0,00%
618	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	4,10	163,18	669,03800	4,10	668,91	0,01%	0,00	0,00	0,00%	4,10	668,91	0,01%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22008		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DIAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
619	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	29,66	249,88	7.411,44080	26,85	6.709,28	0,07%	0,00	0,00	0,00%	26,85	6709,28	0,07%
	ACERO ESTRUCTURAL						-		0,00					0,00%
620	ACERO DE REFuERZO FY= 4200 Kg/Cm2	Kg	2.459,09	1,68	4.131,17040	2.459,09	4.131,27	0,04%	0,00	0,00	0,00%	2459,09	4131,27	0,04%
621	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	50,00	2,76	138,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
622	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	50,00	0,11	5,50000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES						-		0,00					0,00%
623	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	144,00	10,27	1.478,88000	29,66	304,61	0,00%	0,00	0,00	0,00%	29,66	304,61	0,00%
624	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	113,00	26,06	2.944,78000	127,18	3.314,26	0,03%	14,18	369,48	0,00%	113,00	2944,78	0,03%
625	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	15,00	4,72	70,80000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
626	TAPA DE TOL GALV. 2,8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u	2,00	75,58	151,16000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	TANQUES DE RESERVA DE AGUA-CISTERNAS 11 M3						-		0,00					0,00%
	PRELIMINARES						-		0,00					0,00%
627	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	0,00	1,14	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
628	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	36,80	1,46	53,72800	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS						-		0,00					0,00%
629	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	5,00	17,93	89,65000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
630	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	97,58	4,18	407,88440	79,81	333,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	79,81	333,60	0,00%
631	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	m2	17,00	11,56	196,52000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
632	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	55,20	13,72	757,34400	51,31	703,97	0,01%	0,00	0,00	0,00%	51,31	703,97	0,01%
633	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	5,00	6,32	31,60000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	HORMIGONES						-		0,00					0,00%
634	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	1,66	163,18	270,87880	1,66	270,88	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,66	270,88	0,00%
635	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	16,93	249,88	4.230,46840	16,93	4.229,21	0,04%	0,00	0,00	0,00%	16,93	4229,21	0,04%
	ACERO ESTRUCTURAL						-		0,00					0,00%
636	ACERO DE REFuERZO FY= 4200 Kg/Cm2	Kg	1.490,00	1,68	2.503,20000	1.490,00	2.503,20	0,03%	0,00	0,00	0,00%	1490,00	2503,20	0,03%
637	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	40,00	2,76	110,40000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
638	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	40,00	0,11	4,40000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES						-		0,00					0,00%
639	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	69,83	10,27	717,15410	52,53	539,43	0,01%	0,00	0,00	0,00%	52,53	539,43	0,01%
640	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	69,83	26,06	1.819,76980	52,53	1.368,80	0,01%	0,00	0,00	0,00%	52,53	1368,80	0,01%
641	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	15,00	4,72	70,80000	12,42	58,62	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,42	58,62	0,00%
642	TAPA DE TOL GALV. 2,8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u	2,00	75,58	151,16000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	TANQUES DE RESERVA DE AGUA-CISTERNAS 36 M3(REUTILIZACION AGUA LLUVIA)						-		0,00					0,00%
	PRELIMINARES						-		0,00					0,00%
643	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	0,00	1,14	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
644	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	0,00	1,46	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS						-		0,00					0,00%
645	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	0,00	17,93	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
646	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	0,00	4,18	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
647	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	m2	0,00	11,56	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
648	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	0,00	13,72	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
649	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	0,00	6,32	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	HORMIGONES						-		0,00					0,00%
650	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	0,00	163,18	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
651	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	0,00	249,88	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	ACERO ESTRUCTURAL						-		0,00					0,00%
652	ACERO DE REFuERZO FY= 4200 Kg/Cm2	Kg	0,00	1,68	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
653	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	0,00	2,76	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
654	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	0,00	0,11	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES						-		0,00					0,00%
655	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	0,00	10,27	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
656	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	0,00	26,06	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
657	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	0,00	4,72	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22008
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DIAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
658	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u	0,00	75,58	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	TANQUES DE RESERVA DE AGUA-CISTERNAS 20 M3(REUTILIZACIÓN AGUA LLUVIA)						-		0,00					0,00%
	PRELIMINARES						-		0,00					0,00%
659	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	0,00	1,14	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
660	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	0,00	1,46	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS						-		0,00					0,00%
661	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	0,00	17,93	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
662	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	0,00	4,18	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
663	ENTIBADO DE EXCAVACIÓN	m2	0,00	11,56	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
664	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	0,00	13,72	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
665	RELLENO COmPACTADO CON SuELO NATuRAL (CAPAS 20 Cm)	m3	0,00	6,32	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	HORMIGONES						-		0,00					0,00%
666	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	0,00	163,18	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
667	HORmIGON PREmEZCLADOF'C=210 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO + BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	0,00	249,88	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	ACERO ESTRUCTURAL						-		0,00					0,00%
668	ACERO DE REFuERZO F'Y= 4200 Kg/Cm2	Kg	0,00	1,68	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
669	PERFIL ESTRuCTuRAL ACERO ASTm A36 (PROV. mONTAJE GRuA)	Kg	0,00	2,76	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
670	TRATAmIENTO PINTuRA ESTRuCTuRA ACERO A36 (FONDO+PINTuRA ANTICORROSIVA), A COmPRESOR	Kg	0,00	0,11	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES						-		0,00					0,00%
671	ENLuCIDO CON ImPERmEABILIZANTE mORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	0,00	10,27	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
672	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	0,00	26,06	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
673	PINTuRA DE CAuCHO SATINADO COLOR (2 mANOS) INTER. <GuIA ImAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	0,00	4,72	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
674	TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm mARCO ANG. 25 por 3 mm	u	0,00	75,58	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	TRAMPA DE GRASAS						-		0,00					0,00%
675	TRAmPA DE GRASAS 0.60 por 1.40 por H=1.70 (F'C= 210 KG/Cm2), INC. ACCESORIOS	u	0,00	161,89	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
676	SumINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA H.F. (1.00 por 0.40 por 0.05)110 KG	u	0,00	130,84	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
677	CANAL. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 , E= 10Cm + 1Ø10mm A 12Cm	m	0,00	90,42	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	12.- SISTEMA DE ING. MECANICA (CLIMATIZACIÓN, AIRE PRESURIZADO, ELEVADORES HIDRAULICO, CABINA PINTURA						-		0,00					0,00%
	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN						-		0,00					0,00%
678	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 9,500 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CON	u	0,00	1.235,36	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
679	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 12000 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CON	u	0,00	1.318,07	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
680	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 18000 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CON	u	0,00	1.349,08	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
681	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 24,000 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CO	u	2,00	1.504,15	3.008,30000	2,00	3.008,30	0,03%	0,00	0,00	0,00%	2,00	3008,30	0,03%
682	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 30,000 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CO	u	0,00	1.561,01	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
683	uNIDAD EVAPORADORA INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS, 36,000 BTu/H, CON TERmOSTATO CABLEADO Y BOmBA DE CO	u	5,00	1.767,77	8.838,85000	5,00	8.838,85	0,09%	0,00	0,00	0,00%	5,00	8838,85	0,09%
684	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 1/4 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉRmICO	m	60,00	11,74	704,40000	49,45	580,54	0,01%	0,00	0,00	0,00%	49,45	580,54	0,01%
685	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 1/2 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉRmICO	m	68,00	12,29	835,72000	49,45	607,74	0,01%	0,00	0,00	0,00%	49,45	607,74	0,01%
686	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 3/4 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉRmICO	m	8,00	18,29	146,32000	6,33	115,78	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,33	115,78	0,00%
687	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 5/8 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉRmICO	m	50,00	15,65	782,50000	69,81	1.092,53	0,01%	19,81	310,03	0,00%	50,00	782,50	0,01%
688	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 3/8 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTOTÉRmICO	m	50,00	11,96	598,00000	68,67	821,29	0,01%	18,67	223,29	0,00%	50,00	598,00	0,01%
689	TuBERIA DE COBRE RIGIDADIAmETRO 1-1/8 PLG. TIPO ACR, CON AISLAmIENTO TÉRmICO	m	28,00	30,40	851,20000	22,43	681,87	0,01%	0,00	0,00	0,00%	22,43	681,87	0,01%
690	SOPORTE DE TuBERÍA DE COBRE	u	45,00	14,95	672,75000	55,00	822,25	0,01%	10,00	149,50	0,00%	45,00	672,75	0,01%
691	TuBERIA PVC DIAmETRO 50 mm	m	260,00	7,31	1.900,60000	49,34	360,64	0,00%	0,00	0,00	0,00%	49,34	360,64	0,00%
692	TuBERIA PVC DIAmETRO 75 mm	m	20,00	7,42	148,40000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
693	DuCTO DE TOL TOLGALVANIZADO	Kg	0,00	5,81	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
694	REJILLA EXTRACCION/SumINISTRO TIPO LOuVER CON ALETASFIJAS DE ACERO 12X12,INCLuYE CAJA mETALICA	u	0,00	83,69	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22008	
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21
PLAZO:	365	DIAS
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
695	REJILLA SumINISTRO TIPO LOuVER CON ALETAS mÓVILES Y FIJAS DE ACERO 12X12,INCLuYE CAJA mETALICA	u	0,00	95,12	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
696	DuCTO FLEXIBLE DIAmETRO 6"	u	0,00	13,60	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
697	DuCTO FLEXIBLE DIAmETRO 4"	u	0,00	13,36	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
698	VENTILADOR CENTRIFuGO EN LÍNEA PARA TumBADO 2500 CFm @ 0.35 PLG. H2O,1.5 HP	u	0,00	1.515,23	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
699	VENTILADOR CENTRIFuGO EN LÍNEA PARA TumBADO 1700 CFm @ 0.32 PLG. H2O,1HP	u	0,00	1.401,52	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700	VENTILADOR CENTRIFuGO TIPO DOWNBLAST PARA TECHO 500 CFm @ 0.32 PLG. H2O,1/4HP	u	0,00	1.378,78	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
701	uNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR TIPO VRV, DC INVERTER, 118,000 BTu/H	u	2,00	9.376,49	18.752,98000	2,00	18.752,98	0,19%	0,00	0,00	0,00%	2,00	18752,98	0,19%
702	uNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR TIPO VRV, DC INVERTER, 140,000 BTu/H	u	0,00	10.286,22	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
703	uNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR TIPO VRV, DC INVERTER, 158,000 BTu/H	u	0,00	12.426,17	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
704	uNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR TIPO VRV, DC INVERTER, 188,000 BTu/H	u	0,00	11.754,19	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
705	CONTROL CENTRALIZADO PARA LAS uNIDADES CONDENSADORAS	u	1,00	2.505,01	2.505,01000	1,00	2.505,01	0,03%	0,00	0,00	0,00%	1,00	2505,01	0,03%
706	S. I. EXTRACTOR EÓLICO INDuSTRIAL,TuRBINA=112 Cm, DuCTO 61Cm; ALTuRA=85Cm,ASPAS ALumINIO BASE GALVA	u	50,00	326,58	16.329,00000	10,00	3.265,80	0,03%	0,00	0,00	0,00%	10,00	3265,80	0,03%
	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO						-		0,00					0,00%
707	COmPRESOR DE AIRE DE PISTÓN 15 HP, CuATRO PISTONES, LuBRICACIÓN CON ACEITE,220 V, TRIFASICO, 60 HZ	m	2,00	5.513,68	11.027,36000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
708	TuBERIA DE COBRE DIAmETRO 1-1/2 PLG. TIPO L, SOLDADA	m	380,00	33,29	12.650,20000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
709	TuBERIA DE COBREDIAmETRO 1/2 PLG. TIPO L, SOLDADA	m	100,00	10,49	1.049,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710	VÁLVuLAS DE BOLA DE 1/2 PLG DE BRONCE	m	26,00	10,80	280,80000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
711	SOPORTE DE TuBERÍA DE COBRE	u	70,00	14,95	1.046,50000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	CABINA PARA PINTURA						-		0,00					0,00%
712	Sum E INST. CABINA PARA PINTuRA HORNO ANCHO=3.68, ALTO=3.275, LARGO=6.80; ESPESOR PARED 40mm, NOmINAL	u	1,00	38.677,92	38.677,92000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	ELEVADOR HIDRAULICO						-		0,00					0,00%
713	ELEVADOR HIDRAuLICO mOVIL TIPO 4 COLumNAS, ST 1075, CAP=16500 LBS, ALT ELEVACION =73", 3 HP/4HP POR C	u	1,00	43.151,04	43.151,04000	1,00	43.151,04	0,45%	0,00	0,00	0,00%	1,00	43151,04	0,45%
	13.- **SISTEMA ELECTRONICO, VOZ, DATOS, INCENDIOS)**						-		0,00					0,00%
	CANALIZACION						-		0,00					0,00%
714	POZO DE REVISION 60X60X60Cm	u	23,00	158,53	3.646,19000	23,00	3.646,19	0,04%	0,00	0,00	0,00%	23,00	3646,19	0,04%
715	BANDEJA TIPO ESCALERILLA 10CmX8Cm INCLuYE ACCESORIOS	m	172,00	45,57	8.010,04000	166,45	7.751,58	0,08%	0,00	0,00	0,00%	166,45	7751,58	0,08%
716	BANDEJA TIPO ESCALERILLA 25CmX10Cm INCLuYE ACCESORIOS	m	324,00	100,74	32.639,76000	252,24	25.410,67	0,26%	0,00	0,00	0,00%	252,24	25410,67	0,26%
717	TuBERIA PVC REFORZADA 4"	m	780,00	20,27	15.810,60000	366,00	7.418,82	0,08%	0,00	0,00	0,00%	366,00	7418,82	0,08%
718	TuBERÍA CONDuIT EmT 1/2" DE DIAmETRO INCLuIDO ACCESORIOS	m	50,00	7,21	360,50000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
719	TuBERÍA CONDuIT EmT 3/4" DE DIAmETRO INCLuIDO ACCESORIOS	m	50,00	16,51	825,50000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
720	TuBERÍA CONDuIT EmT 1" DE DIAmETRO INCLuIDO ACCESORIOS	m	120,00	19,19	2.302,80000	560,69	10.759,65	0,11%	440,69	8456,85	0,09%	120,00	2302,80	0,02%
721	POSTE mETALICO	u	0,00	923,51	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	SISTEMA DE VOZ Y DATOS						-		0,00					0,00%
722	PuNTO DE RED DE DATOS CON CABLE FTP 6A	u	197,00	151,66	29.877,02000	217,00	32.910,22	0,34%	20,00	3033,20	0,03%	197,00	29877,02	0,31%
723	RACK DE SALA DE EQuIPOS TIPO ARmARIO 42 uR	u	1,00	1.817,12	1.817,12000	1,00	1.817,12	0,02%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1817,12	0,02%
724	RACK DE SALA DE COmuNICACIONES TIPO ARmARIO 42 uR	u	1,00	1.617,13	1.617,13000	1,00	1.617,13	0,02%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1617,13	0,02%
725	RACK DE SALA DE COmuNICACIONES TIPO ARmARIO 12 uR	u	3,00	742,45	2.227,35000	3,00	2.227,35	0,02%	0,00	0,00	0,00%	3,00	2227,35	0,02%
726	PATCH PANEL 24 PuERTOS RJ45 CATEGORIA 6A BLINDADO mODuLAR	u	12,00	213,78	2.565,36000	12,00	2.565,36	0,03%	0,00	0,00	0,00%	12,00	2565,36	0,03%
727	PATCH COORD CATEGORIA 6A FTP 1 m	u	197,00	20,17	3.973,49000	222,00	4.477,74	0,05%	25,00	504,25	0,01%	197,00	3973,49	0,04%
728	PATCH COORD CATEGORIA 6A FTP 10 PIES	u	197,00	21,78	4.290,66000	197,00	4.290,66	0,04%	0,00	0,00	0,00%	197,00	4290,66	0,04%
729	VERIFICACION Y PRuEBAS DE CATEGORIA	u	197,00	18,92	3.727,24000	217,00	4.105,64	0,04%	20,00	378,40	0,00%	197,00	3727,24	0,04%
730	SWITCH 24 PuERTOS RJ45, CAPA 2, POE, mODuLAR SFP+	u	8,00	1.753,78	14.030,24000	8,00	14.030,24	0,15%	0,00	0,00	0,00%	8,00	14030,24	0,15%
731	SWITCH 24 PuERTOS RJ45, CAPA 2, mODuLAR SFP+	u	4,00	1.042,64	4.170,56000	4,00	4.170,56	0,04%	0,00	0,00	0,00%	4,00	4170,56	0,04%
732	SWITCH 24 PuERTOS RJ45, CAPA 3, POE, mODuLAR SFP+	u	1,00	1.410,88	1.410,88000	1,00	1.410,88	0,01%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1410,88	0,01%
733	mODuLO PARA SWITCH CON 2 PuERTOS DE 10 GBPS PARA STACK	u	2,00	2.555,02	5.110,04000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
734	CABLE FLEXIBLE PARA STACK CON 2 CONECTORES DE 10 GBPS	u	8,00	454,27	3.634,16000	8,00	3.634,16	0,04%	0,00	0,00	0,00%	8,00	3634,16	0,04%
735	mODuLO PARA SWITCH CON 2 PORTICOS DE 10GBPS (SFP+)	u	2,00	2.557,78	5.115,56000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
736	TRANSCEIVER DE 10 GBPS (SFP+)	u	8,00	3.317,76	26.542,08000	8,00	26.542,08	0,28%	0,00	0,00	0,00%	8,00	26542,08	0,28%
737	PATCH COORD DE FIBRA OPTICA 3mT	u	10,00	62,35	623,50000	10,00	623,50	0,01%	0,00	0,00	0,00%	10,00	623,50	0,01%
738	ACCES POINT	u	9,00	643,76	5.793,84000	9,00	5.793,84	0,06%	0,00	0,00	0,00%	9,00	5793,84	0,06%
739	CONTROLADOR DE RED INALAmBRICA	u	2,00	4.213,78	8.427,56000	2,00	8.427,56	0,09%	0,00	0,00	0,00%	2,00	8427,56	0,09%
740	FIBRA OPTICA mulTImODO 6 HILOS	u	500,00	15,04	7.520,00000	600,00	9.024,00	0,09%	100,00	1504,00	0,02%	500,00	7520,00	0,08%
741	BANDEJA DE FIBRA OPTICA 12 PuERTOS CON CONECTORES LC	u	1,00	411,79	411,79000	1,00	411,79	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	411,79	0,00%
742	BANDEJA DE FIBRA OPTICA 6 PuERTOS	u	4,00	263,96	1.055,84000	4,00	1.055,84	0,01%	0,00	0,00	0,00%	4,00	1055,84	0,01%
743	FuSIONADO DE FIBRA OPTICA INCLuYE PIGTAIL Y CERTIFICACION	u	10,00	98,34	983,40000	16,00	1.573,44	0,02%	6,00	590,04	0,01%	10,00	983,40	0,01%
744	PuERTA ANTI FuEGO	u	2,00	2.765,74	5.531,48000	2,00	5.531,48	0,06%	0,00	0,00	0,00%	2,00	5531,48	0,06%
745	uPS 15 KVA	u	1,00	6.207,31	6.207,31000	1,00	6.207,31	0,06%	0,00	0,00	0,00%	1,00	6207,31	0,06%
746	TABLERO BYPASS PARA DATA CENTER	u	1,00	2.070,65	2.070,65000	1,00	2.070,65	0,02%	0,00	0,00	0,00%	1,00	2070,65	0,02%
747	TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL PARA DATA CENTER	u	1,00	2.236,86	2.236,86000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
748	BORNERA DE INSTALACION A TIERRA PARA RACK	u	5,00	22,92	114,60000	5,00	114,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	114,60	0,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22008		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
749	BARRA PARA CONEXIÓN A TIERRA 8mmX12mm	u	5,00	48,71	243,55000	1,00	48,71	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	48,71	0,00%
750	CABLE THHN No. 6 AWG 19H	u	100,00	17,95	1.795,00000	131,50	2.360,43	0,02%	31,50	565,43	0,01%	100,00	1795,00	0,02%
751	PUNTO DE VIDEO VGA	u	7,00	127,50	892,50000	7,00	892,50	0,01%	0,00	0,00	0,00%	7,00	892,50	0,01%
752	EQUIPO UTM PARA 100 USUARIOS INCLUYE SISTEMA DE TELEFONÍA	u	1,00	27.174,40	27.174,40000	1,00	27.174,40	0,28%	0,00	0,00	0,00%	1,00	27174,40	0,28%
753	TELEFONO IP NORMAL	u	41,00	110,92	4.547,72000	41,00	4.547,72	0,05%	0,00	0,00	0,00%	41,00	4547,72	0,05%
754	TELEFONO IP GERENCIAL	u	4,00	213,78	855,12000	4,00	855,12	0,01%	0,00	0,00	0,00%	4,00	855,12	0,01%
755	PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA	u	1,00	1.266,70	1.266,70000	1,00	1.266,70	0,01%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1266,70	0,01%
	SISTEMA DE SONORIZACION						-		0,00					0,00%
756	CENTRAL DE SONIDO	u	1,00	11.071,93	11.071,93000	1,00	11.071,93	0,12%	0,00	0,00	0,00%	1,00	11071,93	0,12%
757	PARLANTE DECORATIVO PARA CIELO FALSO CON TRANSFORMADOR DE LINEA	u	24,00	41,20	988,80000	24,00	988,80	0,01%	0,00	0,00	0,00%	24,00	988,80	0,01%
758	ALTAVOZ EXTERIOR30W (BOCINA)	u	8,00	174,70	1.397,60000	8,00	1.397,60	0,01%	0,00	0,00	0,00%	8,00	1397,60	0,01%
759	PUNTO DE SONIDO	u	32,00	41,17	1.317,44000	32,00	1.317,44	0,01%	0,00	0,00	0,00%	32,00	1317,44	0,01%
760	PUNTO DE MICROFONO	u	3,00	52,26	156,78000	3,00	156,78	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	156,78	0,00%
761	CONTROL DE VOLUMEN	u	3,00	145,81	437,43000	3,00	437,43	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	437,43	0,00%
762	ALTAVOCES PARA AUDITORIO CON AMPLIFICADOR INCLUIDO 400W	u	4,00	625,13	2.500,52000	4,00	2.500,52	0,03%	0,00	0,00	0,00%	4,00	2500,52	0,03%
763	PUNTO DE SONIDO PARA AUDITORIO	u	4,00	77,68	310,72000	4,00	310,72	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	310,72	0,00%
764	CENTRAL DE SONIDO PARA AUDITORIO	u	1,00	2.236,64	2.236,64000	1,00	2.236,64	0,02%	0,00	0,00	0,00%	1,00	2236,64	0,02%
765	PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE SONORIZACION	u	1,00	749,33	749,33000	1,00	749,33	0,01%	0,00	0,00	0,00%	1,00	749,33	0,01%
	SISTEMA DE INCENDIO						-		0,00					0,00%
766	ESTACION MANUAL DE ALARMA DE EMERGENCIA	u	24,00	93,78	2.250,72000	16,00	1.500,48	0,02%	0,00	0,00	0,00%	16,00	1500,48	0,02%
767	LUZ ESTROBOSCOPICA	u	24,00	133,78	3.210,72000	16,00	2.140,48	0,02%	0,00	0,00	0,00%	16,00	2140,48	0,02%
768	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE	u	93,00	91,90	8.546,70000	104,00	9.557,60	0,10%	11,00	1010,90	0,01%	93,00	8546,70	0,09%
769	DETECTOR TERMICO DIRECCIONABLE	u	8,00	91,90	735,20000	8,00	735,20	0,01%	0,00	0,00	0,00%	8,00	735,20	0,01%
770	PUNTO DE ALARMAS DE INCENDIO	u	153,00	73,78	11.288,34000	154,00	11.362,12	0,12%	1,00	73,78	0,00%	153,00	11288,34	0,12%
771	CENTRAL DE INCENDIO DIRECCIONABLE	u	1,00	3.176,64	3.176,64000	1,00	3.176,64	0,03%	0,00	0,00	0,00%	1,00	3176,64	0,03%
772	MODULOS DE AISLADORES DE CORTO CIRCUITO	u	5,00	81,40	407,00000	5,00	407,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	407,00	0,00%
773	MODULOS DE MONITOREO DE ZONAS	u	4,00	78,54	314,16000	4,00	314,16	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	314,16	0,00%
774	ANUNCIADOR REMOTO	u	1,00	438,28	438,28000	1,00	438,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	438,28	0,00%
775	LAMPARAS DE EMERGENCIA	u	54,00	52,63	2.842,02000	54,00	2.842,02	0,03%	0,00	0,00	0,00%	54,00	2842,02	0,03%
776	LAMPARAS DE AVISO DE SALIDA	u	16,00	45,78	732,48000	16,00	732,48	0,01%	0,00	0,00	0,00%	16,00	732,48	0,01%
777	FUENTE REMOTA DE ALARMAS DE INCENDIO	u	1,00	797,28	797,28000	1,00	797,28	0,01%	0,00	0,00	0,00%	1,00	797,28	0,01%
778	SEÑALETICA INCENDIOS	u	34,00	26,35	895,90000	17,00	447,95	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17,00	447,95	0,00%
779	PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA EL SISTEMA DE INCENDIO	u	1,00	1.045,26	1.045,26000	1,00	1.045,26	0,01%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1045,26	0,01%
	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS						-		0,00					0,00%
780	CERRADURA ELECTROMAGNETICA 600LB	u	20,00	139,78	2.795,60000	22,00	3.075,16	0,03%	2,00	279,56	0,00%	20,00	2795,60	0,03%
781	PULSANTE DE SALIDA PARA CONTROL DE ACCESOS	u	11,00	29,53	324,83000	14,00	413,42	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14,00	413,42	0,00%
782	LECTOR DE PROXIMIDAD CON TECLADO	u	17,00	252,04	4.284,68000	17,00	4.284,68	0,04%	0,00	0,00	0,00%	17,00	4284,68	0,04%
783	CONTACTO MAGNETICO	u	0,00	15,29	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
784	CONTROLADOR DE ACCESOS - CONTROL DE COMUNICACIONES	u	5,00	649,13	3.245,65000	5,00	3.245,65	0,03%	0,00	0,00	0,00%	5,00	3245,65	0,03%
785	TARJETAS PARA CONTROL DE ACCESOS	u	36,00	18,06	650,16000	36,00	650,16	0,01%	0,00	0,00	0,00%	36,00	650,16	0,01%
786	PUNTO PARA ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESOS	u	43,00	47,14	2.262,72000	43,00	2.027,02	0,02%	0,00	0,00	0,00%	43,00	2027,02	0,02%
787	CABLE EKKX 10 PARES	u	500,00	17,21	8.605,00000	469,10	8.073,21	0,08%	0,00	0,00	0,00%	469,10	8073,21	0,08%
788	DETECTORES INFRARROJOS	u	35,00	23,94	837,90000	35,00	837,90	0,01%	0,00	0,00	0,00%	35,00	837,90	0,01%
789	SIRENAS Y ALARMAS DE SEGURIDAD	u	3,00	52,87	158,61000	3,00	158,61	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	158,61	0,00%
790	PANEL CONTROLADOR DE ALARMAS	u	2,00	187,58	375,16000	2,00	375,16	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	375,16	0,00%
791	PUNTOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	u	38,00	75,29	2.861,02000	38,00	2.861,02	0,03%	0,00	0,00	0,00%	38,00	2861,02	0,03%
792	SEÑALETICA DE ACCESOS	u	4,00	26,35	105,40000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
793	BARRERAS	u	0,00	1.929,64	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
794	LOOPS	u	0,00	134,81	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
795	LECTOR BIOMETRICO	u	3,00	207,83	623,49000	3,00	623,49	0,01%	0,00	0,00	0,00%	3,00	623,49	0,01%
796	PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS	u	1,00	690,14	690,14000	1,00	690,14	0,01%	0,00	0,00	0,00%	1,00	690,14	0,01%
	SISTEMA DE CCTV								0,00					0,00%
797	VIDEOGRABADOR DIGITAL NVR	u	1,00	2.926,25	2.926,25000	1,00	2.926,25	0,03%	0,00	0,00	0,00%	1,00	2926,25	0,03%
798	MONITOR A COLOR LED FHD 32"	u	1,00	1.601,28	1.601,28000	1,00	1.601,28	0,02%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1601,28	0,02%
799	CAMARA IP DE CCTV FIJA EN DOMO	u	21,00	218,46	4.587,66000	21,00	4.587,66	0,05%	0,00	0,00	0,00%	21,00	4587,66	0,05%
800	CAMARA IP DE CCTV TIPO BALA	u	2,00	206,92	413,84000	2,00	413,84	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	413,84	0,00%
801	CAMARA IP DE CCTV PTZ EN DOMO	u	9,00	728,00	6.552,00000	9,00	6.552,00	0,07%	0,00	0,00	0,00%	9,00	6552,00	0,07%
802	CAMARAIP 360 (FISHERE)	u	10,00	1.039,01	10.390,10000	8,00	8.312,08	0,09%	0,00	0,00	0,00%	8,00	8312,08	0,09%
803	CONTROLADOR PARA CAMARA MOVIL CON TECLADO Y JOYSTICK	u	1,00	752,94	752,94000	1,00	752,94	0,01%	0,00	0,00	0,00%	1,00	752,94	0,01%
804	PROGRAMACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS, TASA DE GRABACION, IDENTIFICACION DE AREAS	u	1,00	948,85	948,85000	1,00	948,85	0,01%	0,00	0,00	0,00%	1,00	948,85	0,01%
	SISTEMA DE PANTALLAS INFORMATIVAS								0,00					0,00%
805	SERVIDOR DEL SISTEMA DE INFORMACION Y TV IP	u	1,00	10.774,19	10.774,19000	1,00	10.774,19	0,11%	0,00	0,00	0,00%	1,00	10774,19	0,11%
806	CONVERTIDOR NAVEGADOR INTERNET TV	u	1,00	2.084,90	2.084,90000	6,00	12.509,40	0,13%	5,00	10424,50	0,11%	1,00	2084,90	0,02%
807	TELEVISOR LCD 32"	u	7,00	1.601,28	11.208,96000	6,00	9.607,68	0,10%	0,00	0,00	0,00%	6,00	9607,68	0,10%
808	PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA EL SISTEMA DE PANTALLAS INFORMATIVAS	u	1,00	867,70	867,70000	1,00	867,70	0,01%	0,00	0,00	0,00%	1,00	867,70	0,01%
	14.- CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA Y GARITA								0,00					0,00%
	BATERIA SANITARIA GENERAL JUNTO A ZONA RECREACIONAL								0,00					0,00%
	PRELIMINARES								0,00					0,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22008
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DIAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
809	ARREGLO Y LIMPIEZA (INCLUYE DESALOJO)	m2	0,00	1,14	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
810	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQUEADERO Y PLATAFORMAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	0,00	1,46	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS								0,00					0,00%
811	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A MAQUINA)	m3	0,00	4,18	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
812	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	0,00	17,93	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
813	SUB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COMPACTADO (MAQUINA), CAPAS 20Cm	m3	0,00	17,33	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
814	RELLENO COMPACTADO A MAQUINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	0,00	13,72	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
815	DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS	m3	0,00	2,82	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	HORMIGONES						-		0,00					0,00%
816	HORMIGON PREMEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOMBEO Y TRANSPORTE	m3	0,00	163,18	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
817	HORMIGON PREMEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CIMENTACIÓN F'C = 280KG /Cm2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	m3	0,00	225,97	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
818	HORMIGON PREMEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	0,00	283,42	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
819	HORMIGON PREMEZCLADO COLUMNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	m3	0,00	289,16	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
820	HORMIGON PREMEZCLADO LOSA/ VIGAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	m3	0,00	193,75	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
821	BLOQUE ALIVIANADO EN LOSA E=15X20X40 Cm	u	0,00	0,61	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	ACERO ESTRUCTURAL						-		0,00					0,00%
822	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 Kg/Cm2	Kg	0,00	1,68	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
823	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2	0,00	4,84	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	CONTRAPISOS						-		0,00					0,00%
824	CONTRAPISO HORM.S. PREMEZ. F'C=280KG/Cm2 E= 4 PULG. (SIN BASE)	m2	0,00	21,50	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS						-		0,00					0,00%
825	MASILLADO DE PISOS, ENDURECEDOR DE CUARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5mm)	m2	0,00	5,62	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
826	CERAMICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EMP	m2	0,00	26,06	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS						-		0,00					0,00%
827	MASILLADO E IMPERMEABILIZADO DE PISOS-LOSAS, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 +(PEGANTE + IMPERM.) LOSAS EXT	m2	0,00	10,40	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
828	IMPERMEABILIZACION LOSA DE CUBIERTA IMPRIMANTE ASFALTICO SOLUBLE AL AGUA	m2	0,00	2,84	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
829	IMPERMEABILIZACIONLOSA DE CUBIERTA LAMINAS ASFALTICAS	m2	0,00	13,85	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	BAJANTES AGUA LLUVIA						-		0,00					0,00%
830	BAJANTES DE AGUA LLUVIA (PVC DIAm. INT=110mm)	m	0,00	8,14	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
831	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	0,00	90,42	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
832	Suml. E INSTAL. DE TUBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m	0,00	20,59	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	MAMPOSTERÍA						-		0,00					0,00%
833	RIOSTRAS DE H.S. F'C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3	0,00	256,83	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
834	MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO VIBRADO 4mPAE=10 Cm	m2	0,00	17,71	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
835	MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2	0,00	22,90	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
836	PICADO Y RESANADO DE MAMPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m	0,00	4,63	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
837	MESON H.A. F'C=180 KG/Cm2 E=7 Cm HIERRO (LAVAMANOS+MESON)	m	0,00	34,03	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
838	REVESTIMIENTO MESON GRANITO	m	0,00	180,61	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES						-		0,00					0,00%
839	ENLUCIDO CON IMPERMEABILIZANTE MORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	0,00	10,27	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
840	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO MORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2	0,00	8,78	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
841	ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO MORTERO 1:3	m2	0,00	12,30	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
842	EMPASTE VERTICAL Y HORIZONTAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	0,00	5,04	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
843	PINTURA DE CAUCHO SATINADO COLOR (2 AÑOS) INTER. <GUIA IMAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	0,00	4,72	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	CARPINTERIA METALICA						-		0,00					0,00%
844	PUERTA METÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2mm , INC. CERRADURA, BISAGRAS Y PINTURA	m2	0,00	142,73	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
845	PUERTAS MODULARES, TAMBORADAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, INCLUYE ESTRUCTURA Y HER	m2	0,00	172,30	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
846	DIVISIONES ACERO INOXIDABLE E=1mm AISI 304, TAMBORADAS INCLUYE ESTRUCTURA, EMPOTRAMIENTO PISO PARED (	m2	0,00	161,18	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	VENTANERIA-PUERTAS ALUMINIO VIDRIO						-		0,00					0,00%
847	VENTANA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 200-INCL. VIDRIO LAMINADO 6mm	m2	0,00	183,67	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS						-		0,00					0,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22008		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DIAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
848	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF DISCAPACITADOS PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u	0,00	297,96	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
849	PASAmANOS PARA DISCAPACITADOS TuBO DIAm 32mm E=1.5mm EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO SATINADO (Juego)	u	0,00	281,03	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
850	INODORO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF PRImERA CALIDAD (PROVISIÓN Y INSTALACIÓN)	u	0,00	297,96	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851	uRINARIO CON FLuXOmETRO LATON CROmADA 1.0 GPF	u	0,00	261,01	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852	LAVABO BLANCO, LLAVE SENSOR mOVImIENTO (CON ACCESORIOS)	u	0,00	281,39	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
853	DISPENSOR DE PAPEL HIGIENICO DIAm=275mm, ROLLO 70mm, ABATIBLE ACERO INOX E=8mm, AISI 304, ACABADO S	u	0,00	110,71	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854	DISPENSOR DE PAPEL TOALLA 400-600 uNIDADES, 330X273X130mm, ACERO INOX E=8mm AISI 304, ACABADO SATINAD	u	0,00	113,00	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855	DISPENSADOR DE JABON LIQuIDO ACERO INOX AISI304, ACABADO SATINADO	u	0,00	91,28	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
856	ESPEJO DE VIDRIO FLOTADO 4mm- mARCO DE ALumINIO	m2	0,00	42,86	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
857	SECADOR DE mANOS ACCIONAmIENTO AuTOmATICO 260X302X150mm, ACERO INOX. 304, LAmINA1.5mm 110V-60HZ	u	0,00	238,44	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
858	BASuRERO CILINDRICO A PEDAL D=250mm H=385 PARA BAÑO ACERO INOX. 304	u	0,00	66,60	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
859	DuCHAS CON mEZCLADORA (CON ACCESORIOS)	u	0,00	135,94	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	GARITAS DE CONTROL						-		0,00					0,00%
	PRELIMINARES						-		0,00					0,00%
860	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	m2	0,00	1,14	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
861	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQUEADERO Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	34,81	1,46	50,82260	36,88	53,84	0,00%	2,07	3,02	0,00%	34,81	50,82	0,00%
	MOVImIENTO DE TIERRAS						-		0,00					0,00%
862	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA)	m3	37,47	4,18	156,62460	6,75	28,22	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,75	28,22	0,00%
863	EXCAVACION mANuAL SIN CLASIFICAR	m3	0,00	17,93	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
864	SuB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COmPACTADO (mAQuINA), CAPAS 20Cm	m3	9,26	17,33	160,47580	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
865	RELLENO COmPACTADO A mAQuINA CON LASTRE TNm=6" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	23,08	13,72	316,65760	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
866	DESALOJO mECANICO VOLQuETA TIERRA/ESCOmBROS	m3	37,47	2,82	105,66540	6,75	19,04	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,75	19,04	0,00%
	HORMIGONES						-		0,00					0,00%
867	HORmIGON PREmEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOmBEO Y TRANSPORTE	m3	1,00	163,18	163,18000	1,00	163,18	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	163,18	0,00%
868	HORmIGON PREmEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CImENTACIONF'C = 280KG /Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	2,00	225,97	451,94000	2,40	542,33	0,01%	0,40	90,39	0,00%	2,00	451,94	0,00%
869	HORmIGON PREmEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	1,13	283,42	320,26460	1,11	314,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,11	314,60	0,00%
870	HORmIGON PREmEZCLADO COLumNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	0,30	289,16	86,74800	0,18	52,05	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,18	52,05	0,00%
871	HORmIGON PREmEZCLADO LOSA/ VIGAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOmBA Y TRANSPORTE	m3	5,55	193,75	1.074,62000	4,03	781,15	0,01%	0,00	0,00	0,00%	4,03	781,15	0,01%
872	BLOQuE ALIVIANADO EN LOSA E=15X20X40 Cm	u	0,00	0,61	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	ACERO ESTRUCTURAL						-		0,00					0,00%
873	ACERO DE REFuERZO FY= 4200 Kg/Cm2	Kg	836,00	1,68	1.404,48000	836,00	1.404,48	0,01%	0,00	0,00	0,00%	836,00	1404,48	0,01%
874	mALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6mm	m2	77,00	4,84	372,68000	69,31	335,46	0,00%	0,00	0,00	0,00%	69,31	335,46	0,00%
	CONTRAPISOS						-		0,00					0,00%
875	CONTRAPISO HORmS. PREmEZ. F'C=280KG/Cm2 E= 4 PuLG. (SIN BASE)	m2	33,50	21,50	720,25000	25,40	546,10	0,01%	0,00	0,00	0,00%	25,40	546,10	0,01%
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS						-		0,00					0,00%
876	mASILLADO DE PISOS, ENDuRECEDOR DE CuARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5mm)	m2	0,00	5,62	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
877	CERAmICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EmP	m2	38,00	26,06	990,28000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS						-		0,00					0,00%
878	mASILLADO E ImPERmEABILIZADO DE PISOS-LOSAS, mORTERO CEmENTO-ARENA 1:3 +(PEGANTE + ImPERm.) LOSAS EXT	m2	41,10	10,40	427,44000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
879	ImPERmEABILIZACION LOSA DE CuBIERTA ImPRImANTE ASFALTICO SOLuBLE AL AGuA	m2	41,10	2,84	116,72400	43,53	123,63	0,00%	2,43	6,90	0,00%	41,10	116,72	0,00%
880	ImPERmEABILIZACIONLOSA DE CuBIERTA LAmINAS ASFALTICAS	m2	41,10	13,85	569,23500	43,53	602,89	0,01%	2,43	33,66	0,00%	41,10	569,24	0,01%
	BAJANTES AGUA LLUVIA						-		0,00				-	0,00%
881	BAJANTES DE AGuA LLuVIA (PVC DIAm. INT=110mm)	m	10,00	8,14	81,40000	237,09	1.929,91	0,02%	228,95	1863,65	0,02%	8,14	66,26	0,00%
882	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/Cm²0.60 por 0.60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	u	3,00	90,42	271,26000	2,00	180,84	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	180,84	0,00%
883	Suml. E INSTAL. DE TuBERIA PVC Y/O POLIETILENO DIAm. INT= 200 mm S5	m	30,00	20,59	617,70000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	MAMPOSTERÍA						-		0,00					0,00%
884	RIOSTRAS DE H.S. F'C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3	0,61	258,83	157,88630	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
885	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=10 Cm	m2	0,00	17,71	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
886	mAmPOSTERIA BLOQuE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2	72,50	22,90	1.660,25000	56,42	1.292,02	0,01%	0,00	0,00	0,00%	56,42	1292,02	0,01%
887	PICADO Y RESANADO DE mAmPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m	52,36	4,63	242,42680	52,36	242,43	0,00%	0,00	0,00	0,00%	52,36	242,43	0,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22008	
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21
PLAZO:	365	DIAS
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES						-		0,00					0,00%
888	ENLUCIDO CON IMPERMEABILIZANTE MORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	135,50	10,27	1.391,58500	55,04	565,22	0,01%	0,00	0,00	0,00%	55,04	565,22	0,01%
889	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO MORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2	73,00	8,78	640,94000	57,96	508,92	0,01%	0,00	0,00	0,00%	57,96	508,92	0,01%
890	ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO MORTERO 1:3	m2	0,00	12,30	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
891	EMPASTE VERTICAL Y HORIZONTAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	208,50	6,04	1.259,34000	55,04	332,42	0,00%	0,00	0,00	0,00%	55,04	332,42	0,00%
892	PINTURA DE CAUCHO SATINADO COLOR (2 MANOS) INTER. <GUIA IMAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	399,10	4,72	1.883,75200	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	CARPINTERIA METALICA						-		0,00					0,00%
893	PUERTA METÁLICA PANELADA TOOL GALV. 2mm , INC. CERRADURA, BISAGRAS Y PINTURA	m2	14,20	142,73	2.026,76600	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
894	PUERTA TAMBORADA 70Cm, ESQUELETO CANELO, MDF 9mm -LACADA-DISEÑO CORPORATIVO	u	4,41	198,79	876,66390	4,41	876,66	0,01%	0,00	0,00	0,00%	4,41	876,66	0,01%
	VENTANERIA-PUERTAS ALUMINIO VIDRIO						-		0,00					0,00%
895	VENTANA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 200-INCL. VIDRIO LAMINADO 6mm	m2	14,50	183,67	2.663,21500	11,25	2.065,92	0,02%	0,00	0,00	0,00%	11,25	2065,92	0,02%
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS						-		0,00					0,00%
896	INODORO BLANCO (CON ACCESORIOS)	u	3,00	114,30	342,90000	2,00	228,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	228,60	0,00%
897	LAVABO BLANCO (CON ACCESORIOS)	u	3,00	115,74	347,22000	2,00	231,48	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	231,48	0,00%
898	DUCHAS (CON ACCESORIOS)	u	0,00	50,24	0,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	15.- CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y PORTONES						-		0,00					0,00%
	PRELIMINARES						-		0,00					0,00%
899	ARREGLO Y LIMPIEZA (INCLUYE DESALOJO)	m2	1.765,78	1,14	2.012,98920	4.011,32	4.572,90	0,05%	2245,54	2559,91	0,03%	1765,78	2012,99	0,02%
900	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQUEADERO Y PLATAFORMAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	882,89	1,46	1.289,01940	878,84	1.283,11	0,01%	0,00	0,00	0,00%	878,84	1283,11	0,01%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS						-		0,00					0,00%
901	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A MAQUINA)	m3	671,86	4,18	2.808,37480	460,51	1.924,93	0,02%	0,00	0,00	0,00%	460,51	1924,93	0,02%
902	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	30,00	17,93	537,90000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
903	RELLENO COMPACTADO A MAQUINA CON LASTRE TNm=8" (EN CAPAS DE 20 Cm)	m3	404,00	13,72	5.542,88000	515,79	7.076,64	0,07%	111,79	1533,76	0,02%	404,00	5542,88	0,06%
904	DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS	m3	671,86	2,82	1.894,64520	460,51	1.298,64	0,01%	0,00	0,00	0,00%	460,51	1298,64	0,01%
	HORMIGONES						-		0,00					0,00%
905	HORMIGON PREMEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/Cm2 INC. BOMBEO Y TRANSPORTE	m3	9,34	163,18	1.524,10120	8,74	1.426,20	0,01%	0,00	0,00	0,00%	8,74	1426,19	0,01%
906	HORMIGÓN PREMEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CIMENTACIÓNF'C = 280KG./Cm2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	m3	15,35	225,97	3.468,63950	15,76	3.561,28	0,04%	0,41	92,65	0,00%	15,35	3468,64	0,04%
907	HORMIGON PREMEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	30,84	283,42	8.740,67280	25,59	7.252,71	0,08%	0,00	0,00	0,00%	25,59	7252,72	0,08%
908	HORMIGON PREMEZCLADO COLUMNAS F'C=280 KG/Cm2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	m3	89,64	289,16	25.920,30240	25,53	7.382,25	0,08%	0,00	0,00	0,00%	25,53	7382,25	0,08%
909	HORMIGÓN CICLÓPEO (50por ciento H.S. F'C=180 KG/Cm2-50por cientoP/Clm	m3	43,60	169,86	7.405,89600	96,65	16.416,97	0,17%	53,05	9011,08	0,09%	43,60	7405,90	0,08%
	ACERO ESTRUCTURAL						-		0,00					0,00%
910	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 Kg/Cm2	Kg	5.740,62	1,68	9.644,24160	5.203,14	8.741,27	0,09%	0,00	0,00	0,00%	5203,14	8741,28	0,09%
911	PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A36 (PROV. MONTAJE GRUA)	Kg	4.678,00	2,76	12.911,28000	2.443,13	6.743,04	0,07%	0,00	0,00	0,00%	2443,13	6743,04	0,07%
912	TRATAMIENTO PINTURA ESTRUCTURA ACERO A36 (FONDO+PINTURA ANTICORROSIVA), A COMPRESOR	Kg	4.678,00	0,11	514,58000	2.443,13	268,75	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2443,13	268,75	0,00%
	MAMPOSTERÍA						-		0,00					0,00%
913	RIOSTRAS DE H.S. F'C=240KG/Cm2 INC. ENCOFRADO	m3	12,50	258,83	3.235,37500	7,57	1.959,34	0,02%	0,00	0,00	0,00%	7,57	1959,34	0,02%
914	MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO VIBRADO 4mPAE=15 Cm	m2	680,00	22,90	15.572,00000	908,88	20.813,35	0,22%	228,88	5241,35	0,05%	680,00	15572,00	0,16%
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES						-		0,00					0,00%
915	ENLUCIDO CON IMPERMEABILIZANTE MORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	2.110,10	10,27	21.670,72700	1.996,16	20.500,56	0,21%	0,00	0,00	0,00%	1996,16	20500,56	0,21%
916	EMPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	2.110,10	5,26	11.099,12600	1.996,16	10.499,80	0,11%	0,00	0,00	0,00%	1996,16	10499,80	0,11%
917	TEXTURADO GRAFIATO GRUESO DE PAREDES, COLOR INSTITUCIONAL GADPPZ	m2	1.112,60	6,04	6.720,10400	559,54	3.379,62	0,04%	0,00	0,00	0,00%	559,54	3379,62	0,04%
918	PINTURA DE CAUCHO SATINADO COLOR (2 MANOS) INTER. <GUIA IMAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	1.995,00	4,72	9.416,40000	2.048,27	9.667,84	0,10%	53,27	251,44	0,00%	1995,00	9416,40	0,10%
							-		0,00					0,00%
	CARPINTERIA METALICA						-		0,00					0,00%
919	CERRAMIENTO TUBO ISO2 H.G. 2 "-MALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6mm, INC. PINTURA A COMPRESOR	m2	1.054,50	36,37	38.352,16500	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
920	CERRAMIENTO VERJA DE TUBO AGUA ISO2 HG 2" Y TUBO RECT 80X40X2, INC. PINTURA COMPRESOR	m2	400,00	70,48	28.192,00000	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921	PORTON CORREDIZO TUBOISO 2 2", MARCO TUBO RECT 50X150X2mm, INC. PINTURA COMPRESOR	m2	138,40	68,64	9.499,77600	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
					8.364.474,94		-		0,00		0,00%			
							-		0,00		0,00%			0,00%
	NAVE DE DESECHOS						-		0,00		0,00%			0,00%
	1.- VIAS Y PARQUEADERDS						-		0,00		0,00%			0,00%
	CONSOLIDACION DE PLATAFORMAS													
15	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y REGADA)	m3	537,97	2,92	1570,87	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREODE MEJORAMIENTO	m3-km	9.683,46	0,28	2711,37	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2.- ESTABILIZACIÓN TALUDES						-		0,00		0,00%			0,00%
	SISTEMA TIERRA ARMADA						-		0,00		0,00%			0,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22008		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DIAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
34	GEOTEXTIL TEJIDO- 2400 T PARA MURO DE CONTENCION TIERRA ARMADA	m2	320,00	3,06	979,20	272,80	834,77	0,01%	0,00	0,00	0,00%	272,80	834,77	0,01%
35	GEOMALLA BX-1100 TENSAR	m2	64,40	3,19	205,44	30,00	95,70	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30,00	95,70	0,00%
	16. NAVE DE DESECHOS						-		0,00		0,00%			0,00%
	REVESTIMIENTO DE TUMBADOS						-		0,00		0,00%			0,00%
181	CIELO RASO FALSO TIPO GYPSUM PARA HUMEDAD-1/2"-SIN ESTUCAR	m2	115,00	20,04	2304,60	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	PRELIMINARES						-		0,00		0,00%			0,00%
206	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQUEADERO,Y PLATAFORMAS (EQ. TOPOGRAFICO)	m2	347,75	1,46	507,72	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS						-		0,00		0,00%			0,00%
211	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A MAQUINA)	m3	103,04	4,18	430,71	28,08	117,37	0,00%	0,00	0,00	0,00%	28,08	117,37	0,00%
213	SUB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COMPACTADO (MAQUINA), CAPAS 20CM	m3	103,04	17,33	1785,58	103,00	1.784,99	0,02%	0,00	0,00	0,00%	103,00	1784,99	0,02%
214	RELLENO COMPACTADO A MAQUINA CON LASTRE TNM=8" (EN CAPAS DE 20 CM)	m3	140,54	13,72	1928,21	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
215	DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS	m3	133,95	2,82	377,74	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	HORMIGONES						-		0,00		0,00%			0,00%
216	HORMIGON PREMEZCLADO REPLANTILLO F'C=180 KG/CM2 INC. BOMBEO Y TRANSPORTE	m3	3,00	163,18	489,54	5,84	952,97	0,01%	2,84	463,43	0,00%	3,00	489,54	0,01%
217	HORMIGÓN PREMEZCLADO PLINTOS Y VIGAS CIMENTACION F'C = 280KG./CM2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	m3	12,00	225,97	2711,64	3,92	885,80	0,01%	0,00	0,00	0,00%	3,92	885,80	0,01%
218	HORMIGON PREMEZCLADO CADENAS F'C=280 KG/CM2 INC. ENCOFRADO INC. CONBEO Y TRANSPORTE	m3	12,78	283,42	3622,11	13,18	3.735,48	0,04%	0,40	113,37	0,00%	12,78	3622,11	0,04%
219	HORMIGON PREMEZCLADO COLUMNAS F'C=280 KG/CM2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	m3	4,55	289,16	1315,68	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
220	HORMIGÓN CICLÓPEO (50POR CIENTO H.S. F'C=180 KG/CM2-50POR CIENTO)CIM	m3	17,04	169,86	2894,41	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	ACERO ESTRUCTURAL						-		0,00		0,00%			0,00%
221	ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2	Kg	4596,88	1,68	7722,76	4.813,19	8.086,16	0,08%	216,31	363,40	0,00%	4596,88	7722,76	0,08%
222	PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A (36, 572, 325,193,108) (PROY. MONTAJE GRUA)	Kg	18285	2,76	50466,60	20.478,06	56.519,45	0,59%	2193,06	6052,85	0,06%	18285,00	50466,60	0,52%
223	TRATAMIENTO PINTURA ESTRUCTURA ACERO A36 (FONDO+PINTURA ANTICORROSIVA) A COMPRESOR	Kg	18285	0,11	2011,35	20.478,06	2.252,59	0,02%	2193,06	241,24	0,00%	18285,00	2011,35	0,02%
224	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6MM	m2	382,525	4,84	1851,42	344,25	1.666,17	0,02%	0,00	0,00	0,00%	344,25	1666,17	0,02%
	CONTRAPISOS						-		0,00		0,00%			0,00%
225	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3 (CONTRAPISO E=20CM, COMPAC. 100POR CIENTO P.E.M.)	m3	62,46	10,78	673,32	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
226	MATERIAL DE BASE CLASE 2 (CONTRAPISO E=15CM, COMPAC. 100POR CIENTO P.E.M.)	m3	46,85	24,55	1150,17	30,32	744,36	0,01%	0,00	0,00	0,00%	30,32	744,36	0,01%
227	CONTRAPISO HORM.S. PREMEZ. F'C=280KG/CM2 E= 4 PULG. (SIN BASE)	m2	347,75	21,5	7476,63	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
228	JUNTA ASERRADA DILATACION PISO (INC. CORDON, Y SELLO)	m	90,00	2,59	233,10	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS						-		0,00		0,00%			0,00%
229	MASILLADO DE PISOS, ENDURECEDOR DE CUARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5MM)	m2	347,75	5,62	1954,36	344,25	1.934,69	0,02%	0,00	0,00	0,00%	344,25	1934,69	0,02%
230	PINTURA EPOXICA PISO INDUSTRIAL 3MM (2 COMPONENTES)	m2	310,00	34,78	10781,80	310,00	10.781,80	0,11%	0,00	0,00	0,00%	310,00	10781,80	0,11%
232	CERAMICA COLOR PISO Y PARED ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30-INSTAL. Y EMP	m2	94,00	26,06	2449,64	66,63	1.736,38	0,02%	0,00	0,00	0,00%	66,63	1736,38	0,02%
	CUBIERTA						-		0,00		0,00%			0,00%
235	CUBIERTA GALVALUMEN E=0.45MM, RECUBRIENTO PINTURA POLIESTER ASTM-653A (COLOR INSTITUCIONAL), INC. PER	m2	486,35	13,92	6769,99	446,90	6.220,85	0,06%	0,00	0,00	0,00%	446,90	6220,85	0,06%
237	CUMBRERO GALVALUMEN E=0.40 MM A=0.50 M. INC. ACCES. INSTALACION	m	35,50	8,38	297,49	35,20	294,98	0,00%	0,00	0,00	0,00%	35,20	294,98	0,00%
238	CANAL TOL GALV E= 0.70MM, H=30CM, A=40CM DESARR. 122 CM, INC. GANCHOS	m	71,00	21,49	1525,79	70,40	1.512,90	0,02%	0,00	0,00	0,00%	70,40	1512,90	0,02%
	BAJANTES AGUA LLUVIA						-		0,00		0,00%			0,00%
239	BAJANTES DE AGUA LLUVIA (PVC DIAM. INT=160MM)	m	70,00	9,91	693,70	29,96	296,90	0,00%	0,00	0,00	0,00%	29,96	296,90	0,00%
240	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/CM^0.60 POR 0.60 CON TAPA E= 7CM + 1Ø10MM A 12CM	u	10,00	90,42	904,20	8,00	723,36	0,01%	0,00	0,00	0,00%	8,00	723,36	0,01%
242	SUMIN. E INST. SILLA T/Y GALAPAGO DIAM. INT.= 200A 160MM PVC Y/O POLIETILENO	u	1,00	20,71	20,71	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	MAMPOSTERÍA						-		0,00		0,00%			0,00%
243	RIOSTRAS DE H.S. F'C=240KG/CM2 INC. ENCOFRADO	m3	8,48	258,83	2194,88	4,42	1.144,03	0,01%	0,00	0,00	0,00%	4,42	1144,03	0,01%
244	MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO VIBRADO 4MPAE=10 CM	m2	20,00	17,71	354,20	17,58	311,34	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17,58	311,34	0,00%
245	MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO VIBRADO 4MPAE=15 CM	m2	490,00	22,90	11221,00	411,38	9.420,60	0,10%	0,00	0,00	0,00%	411,38	9420,60	0,10%
246	PICADO Y RESANADO DE MAMPOSTERIA PARA INSTALACIONES	m	120,00	4,63	555,60	120,00	555,60	0,01%	0,00	0,00	0,00%	120,00	555,60	0,01%
247	MESON H.A. F'C=180 KG/CM2 E=7 CM HIERRO (LAVAMANOS+MESON)	m	3,50	34,03	119,11	3,30	112,30	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,30	112,30	0,00%
248	REVESTIMIENTO MESON GRANITO	m	3,50	180,61	632,14	4,95	894,02	0,01%	1,45	261,88	0,00%	3,50	632,14	0,01%
	ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES						-		0,00		0,00%			0,00%
249	ENLUCIDO CON IMPERMEABILIZANTE MORTERO 1:3 (EXTERIOR)	m2	392,72	10,27	4033,23	251,76	2.585,58	0,03%	0,00	0,00	0,00%	251,76	2585,58	0,03%
250	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO MORTERO 1:3 (INTERIOR)	m2	450,00	8,78	3951,00	638,03	5.601,90	0,06%	188,03	1650,90	0,02%	450,00	3951,00	0,04%
251	ENLUCIDO CON MALLA+ IMPERMEABILIZANTE. MORTERO 1:3	m2	25,00	17,03	425,75	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
252	EMPASTE VERTICAL (ACRILICO EXTERIOR) INC. FILOS	m2	392,72	5,26	2065,71	251,76	1.324,26	0,01%	0,00	0,00	0,00%	251,76	1324,26	0,01%
253	EMPASTE VERTICAL (ACRILICO INTERIOR) INC. FILOS	m2	475,00	4,40	2090,00	650,31	2.861,36	0,03%	175,31	771,36	0,01%	475,00	2090,00	0,02%
254	PINTURA DE CAUCHO SATINADO COLOR (2 MANOS) INTER. <GUIA IMAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	475,00	4,72	2242,00	702,93	3.317,83	0,03%	227,93	1075,83	0,01%	475,00	2242,00	0,02%
255	PINTURA DE CAUCHO SATINADA COLOR(2 MANOS) EXTERIOR (CANASTILLA) <GUIA IMAGEN CORPORATIVA GADPPZ>	m2	392,72	5,72	2246,36	332,28	1.900,64	0,02%	0,00	0,00	0,00%	332,28	1900,64	0,02%
	CARPINTERIA METALICA						-		0,00		0,00%			0,00%
257	VENTANA FIJA TUBO RECT 40X80X2-MALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6MM, INC PINTURA ANTICORROSIVA, A COMPRESOR	m2	39,06	41,3	1613,18	39,06	1.613,18	0,02%	0,00	0,00	0,00%	39,06	1613,18	0,02%
258	PORTON TIPO CORREDIZO RETRACTIL TUBO RECT 40X80X2MM-TOOL GALV. 0.6MM	m2	4,40	61,25	269,50	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
259	PUERTA METALICA PANELADA TOOL GALV. 2MM , INC. CERRADURA, BISAGRAS Y PINTURA	m2	40,000	142,730	5709,20	36,00	5.138,28	0,05%	0,00	0,00	0,00%	36,00	5138,28	0,05%
260	PUERTAS MODULARES, TAMBORADAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE E=1MM AISI 304, INCLUYE ESTRUCTURA Y HER	m2	1,00	172,30	172,30	1,00	172,30	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	172,30	0,00%
	REVESTIMIENTO DE TUMBADOS						-		0,00		0,00%			0,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22008		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
264	CIELO RASO FALSO - FIBRA MINERAL Y RECUB LAMINA ALUMINIO 0.60X0.60 BLANCO, TIPO AMSTRONG O SIMILAR	m2	324,75	21,59	7011,35	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
							-		0,00		0,00%			0,00%
	PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS													
268	INODORO CON FLUXOMETRO LATON CROMADA 1,0 GPF PRIMERA CALIDAD (PROVISION Y INSTALACIÓN)	u	1,00	297,96	297,96	1,00	297,96	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	297,96	0,00%
270	LAVABO BLANCO, LLAVE SENSOR MOVIMIENTO (CON ACCESORIOS)	u	2,00	281,39	562,78	2,00	562,78	0,01%	0,00	0,00	0,00%	2,00	562,78	0,01%
271	DISPENSOR DE PAPEL HIGIENICO DIAM=275MM, ROLLO 70MM, ABATIBLE,ACERO INOX E=0MM, AISI 304, ACABADO S	u	1,00	110,71	110,71	1,00	110,71	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	110,71	0,00%
272	DISPENSOR DE PAPEL TOALLA 400-600 UNIDADES, 330X273X130MM, ACERO INOX E=0MM AISI 304, ACABADO SATINAD	u	1,00	113,00	113,00	1,00	113,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	113,00	0,00%
273	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOX AISI304, ACABADO SATINADO	u	1,00	91,28	91,28	1,00	91,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	91,28	0,00%
274	ESPEJO DE VIDRIO FLOTADO 4MM+ MARCO DE ALUMINIO	m2	2,70	42,86	115,72	2,70	115,72	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,70	115,72	0,00%
276	BASURERO CILINDRICO A PEDAL D=250MM H=385 PARA BAÑO ACERO INOX. 304	u	1,00	66,60	66,60	1,00	66,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	66,60	0,00%
277	DUCHAS CON MEZCLADORA (CON ACCESORIOS)	u	1,00	135,94	135,94	1,00	135,94	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	135,94	0,00%
							-		0,00		0,00%			0,00%
	10.- SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACIÓN						-		0,00		0,00%			0,00%
	POZOS DE REVISION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS													
305	CAJA REVISION MEDIA TENSION 60X60X75,ACERA, T/HA	u	1,00	179,17	179,17	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
306	PUESTA A TIERRA SIMPLE EN POZO ELECTRICO CON SUELDA EXOTERMICA	u	1,0	164,5	164,46	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
							-		0,00		0,00%			0,00%
	INSTALACION LUMINARIAS													
362	CAJETINES METALICOS OCTOGONALES MEDIANOS CON TAPA	u	30,00	5,44	163,20	71,00	386,24	0,00%	41,00	223,04	0,00%	30,00	163,20	0,00%
							-		0,00		0,00%			0,00%
	INSTALACION LUMINARIAS								68,97	230,36	0,00%	70,00	233,80	0,00%
427	TUBERIA EMT 1/2 PULGADA	m	70,00	3,34	233,80	138,97	464,16	0,00%	0,00	0,00	0,00%	37,00	43,66	0,00%
428	UNION EMT 1/2 PULGADA	u	40,00	1,18	47,20	37,00	43,66	0,00%	32,00	17,92	0,00%	60,00	33,60	0,00%
429	CONECTOR EMT 1/2 PULGADA	u	60,00	0,56	33,60	92,00	51,52	0,00%	31,00	150,97	0,00%	30,00	146,10	0,00%
430	FIJACION DE TUBOS EN LOZA CON GRAPA METALICA EMT 1/2 PULGADA	u	30,00	4,87	146,10	61,00	297,07	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	7,85	0,00%
431	CAJETINES METALICOS RECTANGULARES PROFUNDOS	u	10,00	1,57	15,70	5,00	7,85	0,00%	52,51	119,72	0,00%	70,00	159,60	0,00%
432	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR AMARILLO (INC. TAYPE)	m	70,00	2,28	159,60	122,51	279,32	0,00%	38,32	54,80	0,00%	70,00	100,10	0,00%
433	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.12 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	70,00	1,43	100,10	108,32	154,90	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17,00	1030,03	0,01%
434	LUMINARIA LED3X18W/120 VOLTIOS	u	30,00	60,59	1817,70	17,00	1,030,03	0,01%	0,00		0,00%	5,00	27,35	0,00%
437	INTERRUPTOR SIMPLE CON TAPA	u	7,00	5,47	38,29	5,00	27,35	0,00%	0,00		0,00%			0,00%
							-		0,00		0,00%			0,00%
	TOMACORRIENTES GENERALES								0,00	0,00	0,00%	41,91	139,98	0,00%
438	TUBERIA EMT 1/2 PULGADA	m	50,00	3,34	167,00	41,91	139,98	0,00%	2,00	2,36	0,00%	15,00	17,70	0,00%
439	UNION EMT 1/2 PULGADA	u	15,00	1,18	17,70	17,00	20,06	0,00%	11,00	6,16	0,00%	10,00	5,60	0,00%
440	CONECTOR EMT 1/2 PULGADA	u	10,00	0,56	5,60	21,00	11,76	0,00%	15,00	73,05	0,00%	10,00	48,70	0,00%
441	FIJACION DE TUBOS EN LOZA CON GRAPA METALICA EMT 1/2 PULGADA	u	10,00	4,87	48,70	25,00	121,75	0,00%	6,03	8,62	0,00%	50,00	71,50	0,00%
442	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR AZUL (INC. TAYPE)	m	50,00	1,43	71,50	56,03	80,12	0,00%	6,03	8,62	0,00%	50,00	71,50	0,00%
443	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.10 AWG COLOR BLANCO (INC. TAYPE)	m	50,00	1,43	71,50	56,03	80,12	0,00%	6,03	6,21	0,00%	50,00	51,50	0,00%
444	TENDIDO DE CABLE FLEXIBLE DE COBRE NO.14 AWG COLOR VERDE (INC. TAYPE)	m	50,00	1,03	51,50	56,03	57,71	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	29,80	0,00%
445	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON TAPA	u	13,00	7,45	96,85	4,00	29,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	6,28	0,00%
446	CAJETINES METALICOS RECTANGULARES PROFUNDOS	u	13,00	1,57	20,41	4,00	6,28	0,00%	0,00		0,00%			0,00%
	ALIMENTADORES Y SUBTABLEROS CT-1						-		0,00		0,00%			0,00%
	ALIMENTADOR TPD-STE-ANGAR-A4						-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
509	TENDIDO DE CABLE NO. 3X6+6 CU TW (INC. TAYPE)	m	20,00	14,51	290,20	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	1,00	173,41	0,00%
510	SUBTABLERO STE QOL 12F-2F-12 ESPACIOS ANGAR 4	u	1,00	173,41	173,41	1,00	173,41	0,00%	0,00		0,00%			0,00%
	11.- SISTEMA HIDRAULICO SANITARIO Y CONTRAINCENDIOS						-		0,00		0,00%			0,00%
	SITEMA DE AGUA POTABLE A PRESIÓN CONSTANTE						-		0,00		0,00%			0,00%
	TUBERIA PVC AGUA POTABLE								0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
533	TUBERIA PVC ROSCABLE D=1/2" EN EDIFICACION+PRUEBA	m	12,00	5,86	70,32	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
535	TUBERIA PVC ROSCABLE D=1" EN EDIFICACION+PRUEBA	m	45,00	9,78	440,10	0,00	-		0,00		0,00%			0,00%
	ACCESORIOS INST. TUB PVC ROSCABLE AGUA POTABLE						-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
541	ANCLAJES METALICOS PLATINA 2 POR 1/2" (ABRAZADERAS), EN LOSA Y PARED	u	10,00	14,11	141,10	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
542	S.I. PUNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGUA POR PUNTO	u	2,00	13,67	27,34	0,00	-		0,00		0,00%			0,00%
	EXTINTORES						-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
565	EXTINTOR PQS CAPACIDAD 10 LBS. CON CAJA METALICA	u	1,00	99,84	99,84	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
568	EXTINTOR CO2 CAPACIDAD 20 LBS. CON CAJA METALICA	u	1,00	313,27	313,27	0,00	-		0,00		0,00%			0,00%
	SISTEMA SANITARIO INTERNO						-		0,00		0,00%			0,00%
	PRELIMINARES Y MOV. TIERRAS								0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
601	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	m3	2,00	17,93	35,86	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
602	RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL (CAPAS 20 CM)	m3	3,00	6,32	18,96	0,00	-		0,00		0,00%			0,00%
	INSTALACION TUBERIA PVC DESAGUE						-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
603	PUNTO DE DESAGUE EN PVC 50 MM	u	3,00	28,80	86,40	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
604	PUNTO DE DESAGUE EN PVC 110 MM	u	1,00	34,43	34,43	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
605	TUBERÍA PVC 50 MM DE DIÁMETRO (MAT/TRASP/INST)	m	12,0	5,1	61,68	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
606	TUBERÍA PVC 110 MM DE DIÁMETRO (MAT/TRASP/INST)	m	5,00	8,02	40,10	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
607	TUBERÍA PVC 160 MM DE DIÁMETRO (MAT/TRASP/INST)	m	18,00	14,52	261,36	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
608	CAJA REV. H.S. F'C=180KG/CM²0.60 POR 0.60 CON TAPA E= 7CM + 10'10MM A 12CM	u	1,00	90,42	90,42	0,00	-		0,00		0,00%			0,00%
							-		0,00		0,00%			0,00%
	INSTALACION TUBERIA PVC DEVENTILACIÓN								0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
609	TUBERIA PVC D=75 MM VENTILACIÓN	m	6,00	4,27	25,62	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
610	PUNTO DE VENTILACIÓN PVC 75 MM POR PUNTO	u	1,00	15,61	15,61	0,00	-		0,00		0,00%			0,00%
	13.- SISTEMA ELECTRONICO, VOZ, DATOS, INCENDIOS)						-		0,00		0,00%			0,00%
	CANALIZACION								0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
714	POZO DE REVISION 60X60X60CM	u	1,0	158,5	158,53	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
715	BANDEJA TIPO ESCALERILLA 10CMX8CM INCLUYE ACCESORIOS	m	25,0	46,6	1164,25	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
717	TUBERIA PVC REFORZADA 4"	m	15,00	20,27	304,05	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
719	TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4" DE DIÁMETRO INCLUIDO ACCESORIOS	m	40,00	16,51	660,40	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22008		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DIAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
	SISTEMA DE INCENDIO						-		0,00		0,00%			0,00%
766	ESTACION MANUAL DE ALARMA DE EMERGENCIA	u	1,00	93,78	93,78	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
767	LUZ ESTROBOSCOPICA	u	1,00	133,78	133,78	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
768	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE	u	3,00	91,90	275,70	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
769	DETECTOR TERMICO DIRECCIONABLE	u	3,00	91,90	275,70	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
770	PUNTO DE ALARMAS DE INCENDIO	u	8,00	73,78	590,24	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
776	LAMPARAS DE AVISO DE SALIDA	u	1,00	45,78	45,78	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
778	SEÑALETICA INCENDIOS	u	1,00	26,35	26,35	0,00	-		0,00		0,00%			0,00%
	NAVE DE RESGUARDO						-		0,00		0,00%			0,00%
	ACERO ESTRUCTURAL						-		0,00		0,00%			0,00%
1	PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A (36, 572, 325,193,108) (PROY. MONTAJE GRUA)	Kg	94474,86	2,76	260750,61	94.474,86	260.750,61	2,71%	0,00	0,00	0,00%	94474,86	260750,61	2,71%
2	TRATAMIENTO PINTURA ESTRUCTURA ACERO A36 (FONDO+PINTURA ANTICORROSIVA) A COMPRESOR	Kg	94474,86	0,11	10392,23	94.474,86	10.392,23	0,11%	0,00	0,00	0,00%	94474,86	10392,23	0,11%
	CONTRAPISOS						-		0,00		0,00%			0,00%
3	JUNTA ASERRADA DILATACION PISO (INC. CORDON, Y SELLO)	m	857,00	2,59	2219,63	581,30	1.505,57	0,02%	0,00	0,00	0,00%	581,30	1505,57	0,02%
	MASILLADOS Y REVESTIMIENTO DE PISOS						-		0,00		0,00%			0,00%
4	MASILLADO DE PISOS, ENDURECEDOR DE CUARZO+ ADITIVO ADHERENTE (ESPESOR 5MM)	m2	1445,85	5,62	8125,68	1.442,94	8.109,32	0,08%	0,00	0,00	0,00%	1442,94	8109,32	0,08%
	CUBIERTA						-		0,00		0,00%			0,00%
5	CUBIERTA GALVALUMEN E=0,45MM, RECUBRIENTO PINTURA POLIESTER ASTM-653A (COLOR INSTITUCIONALL INC. PER	m2	1660,00	13,92	23107,20	1.681,75	23.409,96	0,24%	21,75	302,76	0,00%	1660,00	23107,20	0,24%
6	CUBIERTA POLICARBONATO E=0,80 MM, COLOR BRONCE O SIMILAR; INC. ACCESORIOS INSTALACION	m2	190,00	14,34	2724,60	94,85	1.360,15	0,01%	0,00	0,00	0,00%	94,85	1360,15	0,01%
7	CUMBRERO GALVALUMEN E=0,40 MM A=0,50 M, INC. ACCES. INSTALACION	m	43,25	8,36	362,44	43,50	364,54	0,00%	0,25	2,10	0,00%	43,25	362,44	0,00%
8	CANAL TOL GALV E= 0,70MM, H=30CM, A=40CM DESARR. 122 CM, INC. GANCHOS	m	86,50	21,49	1858,89	87,00	1.869,64	0,02%	0,50	10,75	0,00%	86,50	1858,89	0,02%
	CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS						-		0,00		0,00%			0,00%
RN-1	GROUTING DE NIVELACIÓN	M3	3,35	$ 1.634,03	$ 5.474,00	3,85	6.291,02	0,07%	0,50	817,02	0,01%	3,35	5474,00	0,06%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO: 9.622.634,22008
PERIODO: 1-jun.-21 30-jun.-21
PLAZO: 365 DIAS
ANTICIPO RECIBIDO: 3.849.053,69 40%

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
RN-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE ASTM 193 B7	U	1416,00	$ 49,44	$ 70.007,04	1.804,00	89.189,76	0,93%	388,00	19182,72	0,20%	1416,00	70007,04	0,73%
RN-3	BORDILLO DE H.S 180 KG/CM2 TIPO CUNETA	ML	2261,84	$ 23,58	$ 53.334,19	1.294,71	30.529,26	0,32%	0,00	0,00	0,00%	1294,71	30529,26	0,32%
RN-4	ACERAS DE H.S. F'C=180KG/CM2 E=7CM. ESCOBILLADA.	M2	3878,20	$ 18,85	$ 73.104,07	2.788,24	52.558,32	0,55%	0,00	0,00	0,00%	2788,24	52558,32	0,55%
RN-5	ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACIÓN	L	19492,52	$ 0,85	$ 16.568,73	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
RN-6	CAPA DE RODADURA HORMIGÓN ASFÁLTICO MEZCLADO EN PLANTA, E=3".	M2	12995,08	$ 12,53	$ 162.828,35	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
RN-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR ELECTRICO DE 500KG EN PUERTA DE INGRESO DE CERRAMIENTO	U	4,00	$ 1.081,08	$ 4.324,32	4,00	4.324,32	0,04%	0,00	0,00	0,00%	4,00	4324,32	0,04%
RN-8	PINTURA DE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN EN PARQUEADEROS Y PASOS PEATONALES	ML	669,42	$ 0,62	$ 415,04	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
RN-9	TOPES PARA ESTACIONAMIENTO H.S = 180 KG/CM2 , INCLUYE PINTURA REFLECTIVA	U	88,00	$ 12,91	$ 1.136,08	88,00	1.136,08	0,01%	0,00	0,00	0,00%	88,00	1136,08	0,01%
RN-10	JARDINERAS DE H.S= 180KG/CM2	ML	26,00	$ 15,02	$ 390,52	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
RN-11	PLANTAS ORNAMENTALES	ML	26,00	$ 10,99	$ 285,74	534,20	5.870,86	0,06%	508,20	5585,12	0,06%	26,00	285,74	0,00%
RN-12	PALMERAS BOTELLAS ENANAS	U	7,00	$ 34,74	$ 243,18	7,00	243,18	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7,00	243,18	0,00%
RN-13	TAPAJUNTA DE ALUMINIO PISO-PISO A= 15CM	ML	35,00	$ 16,25	$ 568,75	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
RN-14	TAPAJUNTA DE ALUMINIO PISO-PARED A= 15CM EN INTERIORES	ML	65,00	$ 16,90	$ 1.098,50	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
RN-15	TAPAJUNTA EXTERIOR TOOL GALVANIZADO	ML	40,00	$ 14,53	$ 581,20	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
RN-16	TAPAJUNTA DE HORMIGÓN LOSA-LOSA	ML	56,00	$ 42,26	$ 2.367,68	39,55	1.672,17	0,02%	0,00	0,00	0,00%	39,55	1672,17	0,02%
RN-17	DUCHA ELÉCTRICA 110 V	U	7,00	$ 29,03	$ 203,21	7,00	203,21	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7,00	203,21	0,00%
RN-18	LLAVE DE DUCHA	U	7,00	$ 20,90	$ 146,30	7,00	146,30	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7,00	146,30	0,00%
RN-19	REJILLAS DE PISO 50 MM	U	42,00	$ 4,84	$ 203,28	75,00	363,00	0,00%	33,00	159,72	0,00%	42,00	203,28	0,00%
RN-20	SUMIDERO DE CUBIERTA DE 110MM INCLUYE REJILLA TIPO CÚPULA	U	20,00	$ 51,11	$ 1.022,20	21,00	1.073,31	0,01%	1,00	51,11	0,00%	20,00	1022,20	0,01%
RN-21	BORDILLO PARA TINETA DE BAÑO REVESTIDA CON CERÁMICA (0.10MX0.15M)	ML	6,00	$ 16,50	$ 99,00	6,80	112,20	0,00%	0,80	13,20	0,00%	6,00	99,00	0,00%
RN-22	MUEBLES AÉREOS DE MDF PARA COCINA	ML	7,00	$ 180,68	$ 1.264,76	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
RN-23	MUEBLES BAJOS DE MDF PARA COCINA	ML	7,00	$ 180,68	$ 1.264,76	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
RN-24	HORMIGÓN PREMEZCLADO PARA LOSA DE PISO F'C=280 KG/CM2 INC. ENCOFRADO, BOMBA Y TRANSPORTE	M3	1204,92	$ 209,28	$ 252.165,66	1.431,02	299.483,87	3,11%	226,10	47318,21	0,49%	1204,92	252165,66	2,62%
RN-25	FILOS INTERIORES Y EXTERIORES	ML	830,00	$ 3,76	$ 3.120,80	831,15	3.125,12	0,03%	1,15	4,32	0,00%	830,00	3120,80	0,03%
RN-26	ENLUCIDO MEDIAS CAÑAS	ML	960,00	$ 2,28	$ 2.188,80	893,92	2.038,14	0,02%	0,00	0,00	0,00%	893,92	2038,14	0,02%
RN-27	CUADRADA DE BOQUETES PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	1150,00	$ 4,64	$ 5.336,00	1.024,34	4.752,94	0,05%	0,00	0,00	0,00%	1024,34	4752,94	0,05%
RN-28	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON POLIESTIRENO EXPANDIDO 50 MM	M2	530,00	$ 5,64	$ 2.989,20	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
RN-29	JUNTA DE DILATACIÓN TIPO LLAVE - LOSAS DE PISOS	ML	3200,00	$ 2,36	$ 7.552,00	2.873,65	6.781,81	0,07%	0,00	0,00	0,00%	2873,65	6781,81	0,07%
RN-30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNOS EXPANSIVOS 5/8 -6" PARA ANCLAJE DE PLACAS	U	30,00	$ 4,27	$ 128,10	0,00	-		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
RN-31	CHICOTE D=12MM. PARA ARRIOSTRAMIENTO DE MAMPOSTERÍA	U	1750,00	$ 1,55	$ 2.712,50	826,00	1.283,40	0,01%	0,00	0,00	0,00%	826,00	1283,40	0,01%
RN-32	CAJA DE PASO H.S. F'C=180KG/Cm² 0,60 por 0,60 CON TAPA E= 7Cm + 1Ø10mm A 12Cm	U	10,00	$ 52,94	$ 529,40	10,00	529,40	0,01%	0,00	0,00	0,00%	10,00	529,40	0,01%
	ELÉCTRICOS						-		0,00		0,00%			0,00%
RN-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR DE MEDICIÓN - TRAFOMIX	U	1,00	$ 9.602,82	$ 9.602,82	1,00	9.602,82	0,10%	0,00	0,00	0,00%	1,00	9602,82	0,10%
RN-34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO METÁLICO PARA DOS CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN	U	4,00	$ 487,88	$ 1.951,52	4,00	1.951,52	0,02%	0,00	0,00	0,00%	4,00	1951,52	0,02%
RN-35	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO METÁLICO PARA UN CIRCUITO DE ILUMINACIÓN	U	2,00	$ 396,56	$ 793,12	3,00	1.189,68	0,01%	1,00	396,56	0,00%	2,00	793,12	0,01%
RN-36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL TDP100KVA	U	1,00	$ 5.982,02	$ 5.982,02	1,00	5.982,02	0,06%	0,00	0,00	0,00%	1,00	5982,02	0,06%
RN-37	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL TDP 50KVA	U	2,00	$ 2.431,38	$ 4.862,76	2,00	4.862,76	0,05%	0,00	0,00	0,00%	2,00	4862,76	0,05%
RN-38	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE DE HA DE 12MTS 500KG	U	7,00	495,52	$ 3.468,64	7,00	3.468,64	0,04%	0,00	0,00	0,00%	7,00	3468,64	0,04%
RN-39	TENDIDO DE CONDUCTOR AL DESNUDO ACSR# 1/0 AWG	M	500,00	$ 2,69	$ 1.345,00	522,30	1.404,99	0,01%	22,30	59,99	0,00%	500,00	1345,00	0,01%
RN-40	TENDIDO DE CONDUCTOR AL DESNUDO ACSR# 2 AWG	M	160,00	$ 2,33	$ 372,80	174,10	405,65	0,00%	14,10	32,85	0,00%	160,00	372,80	0,00%
RN-41	TENDIDO DE CONDUCTOR PREEMSAMBLADO AL AISLADO 2x1/0+1/0 AWG	M	150,00	$ 6,37	$ 955,50	154,60	984,80	0,01%	4,60	29,30	0,00%	150,00	955,50	0,01%
RN-42	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SUJECCION PARA EL NEUTRO	U	8,00	$ 22,13	$ 177,04	8,00	177,04	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8,00	177,04	0,00%
RN-43	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3F CENTRADA PASANTE 13.8KV - 3CPT	U	3,00	$ 187,73	$ 563,19	3,00	563,19	0,01%	0,00	0,00	0,00%	3,00	563,19	0,01%
RN-44	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3F CENTRADA DOBLE RETENCION 13.8KV - 3CDT	U	1,00	$ 431,15	$ 431,15	1,00	431,15	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	431,15	0,00%
RN-45	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3F CENTRADA RETENCION O TERMINAL 13.8KV - 3CRT	U	4,00	$ 287,70	$ 1.150,80	4,00	1.150,80	0,01%	0,00	0,00	0,00%	4,00	1150,80	0,01%
RN-46	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA PASANTE PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	U	3,00	$ 31,54	$ 94,62	3,00	94,62	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	94,62	0,00%
RN-47	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES	U	4,00	$ 40,08	$ 160,32	4,00	160,32	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	160,32	0,00%
RN-48	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR DOBLE A TIERRA - TTD	U	4,00	$ 116,68	$ 466,72	4,00	466,72	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	466,72	0,00%
RN-49	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION AEREO - SUBTERRANEO PARA BAJO VOLTAJE	U	2,00	$ 243,82	$ 487,64	3,00	731,46	0,01%	1,00	243,82	0,00%	2,00	487,64	0,01%
RN-50	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED 200W, CON FOTOCELULA, EN POSTE CON RED PREENSABLADA	U	7,00	$ 637,26	$ 4.460,82	7,00	4.460,82	0,05%	0,00	0,00	0,00%	7,00	4460,82	0,05%
RN-51	CAJA REVISIÓN MEDIA TENSIÓN 80X90X90 C/VIA, CON TAPA DE HIERRO NODULAR 125 KN	U	20,00	$ 318,78	$ 6.375,60	18,00	5.738,04	0,06%	0,00	0,00	0,00%	18,00	5738,04	0,06%
RN-52	SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE CONDENSADORES AUTOMATICO DE 60KVAR, 3F, 230V	U	1,00	$ 10.209,14	$ 10.209,14	1,00	10.209,14	0,11%	0,00	0,00	0,00%	1,00	10209,14	0,11%
RN-53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO DE CONDENSADORES AUTOMATICO DE 30KVAR, 3F, 230V	U	1,00	$ 7.969,49	$ 7.969,49	1,00	7.969,49	0,08%	0,00	0,00	0,00%	1,00	7969,49	0,08%
	CLIMATIZACIÓN						-		0,00		0,00%			0,00%
RN-54	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE PARED INVERTER CAPACIDAD DE 18.000 BTU/H , INCLUYE COMPRESOR	U	2,00	$ 1.728,67	$ 3.457,34	2,00	3.457,34	0,04%	0,00	0,00	0,00%	2,00	3457,34	0,04%
RN-55	EXTRACTOR DE OLORES EN BAÑOS 6"X6"	U	20,00	$ 42,70	$ 854,00	18,00	768,60	0,01%	0,00	0,00	0,00%	18,00	768,60	0,01%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: LICO-GADPPz-001-2018
CONTRATISTA: CONSORCIO FATIMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz)-I ETAPA, PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA."

MONTO DEL CONTRATO:	9.622.634,22008		
PERIODO:	1-jun.-21	30-jun.-21	
PLAZO:	365	DIAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	3.849.053,69	40%	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
	PAREDES INDUSTRIALES						-		0,00		0,00%			0,00%
RN-56	PAREDES DE GALVALUMEN E=0.45mm, RECUBRIMIENTO PINTURA POLIESTER ASTm-653A (COLOR INSTITUCIONAL).	M2	1849,90	$ 16,19	$ 29.949,88	3.285,94	53.199,37	0,55%	1436,04	23249,49	0,24%	1849,90	29949,88	0,31%
RN-57	CERRAMIENTO TUBO H.G. 2 "-MALLA ELECTROSOLDADA 10X10X8mm, INC. PINTURA A COMPRESOR	M2	1054,50	$ 22,99	$ 24.242,96	1.042,47	23.966,38	0,25%	0,00	0,00	0,00%	1042,47	23966,38	0,25%
RN-58	CERRAMIENTO VERJA DE TUBO HG 2" Y TUBO RECT 80X40X2, INC. PINTURA COMPRESOR	M2	400,00	$ 60,18	$ 24.072,00	316,08	19.021,70	0,20%	0,00	0,00	0,00%	316,08	19021,70	0,20%
RN-59	RECUBRIMIENTO ALUMINIO COLOR CYAN O SIMILAR, ALUCUBOND 4mm INC. ESTRUCT. E INSTALACIÓN IMAGEN CORPORATI	M2	1315,00	$ 67,32	$ 88.525,80	977,40	65.798,57	0,68%	0,00	0,00	0,00%	977,40	65798,57	0,68%
				TOTALES :	9.622.634,22008		9.146.497,27	95,05%		-728.486,64	-7,57%		-8.418.010,63	-87,48%

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	9-may.-19	
FIN PLAZO CONTRACTUAL	8-may.-20	
SUSPENSION DIAS	60	DIAS
SUSPENSION DIAS	11	DIAS
AMPLIACIÓN POR PANDEMIA	90	DIAS
AMPLIACIÓN POR CLIMA-REDISEÑO-% POR COVID	128	DIAS
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN	21-feb.-21	
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	5-jul.-21	
FECHA DE APROBACIÓN	13-jul.-21	

MONTO PLANILLADO AVANCE DE OBRA	9.146.497,27	95,05%
MONTO DE INCREMENTOS	-728.486,64	-7,57%
MONTO DECREMENTOS	-8.418.010,63	-87,48%
TOTAL PLANILLADO	9.146.497,27	95,05%

Firmado electrónicamente por:
PEDRO ELICIO RAMOS IDROVO

ING. PEDRO RAMOS IDROVO
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA LEON BURGOS

CAROLINA LEON B.
FISCALIZACIÓN EXTERNA

FATIMA
CONSORCIO

PLANILLA Nº 23

Avance de obra

1-Junio-2021 al 30-Junio-2021

ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO " CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

RUBRO N° 2 ANEXO 1
DESCRIPCIÓN: EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)
UNIDAD: m3
PERIODO: 01-jun 30-jun

EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)

VOLUMEN DE EXCAVACION

EXCAVACION DEL PARQUEADERO 2

ABCSISAS	AREA PARCIAL	AREA MEDIA	DISTANCIA	VOLUMEN PARCIAL	VOLUMEN ACUMULADO
0+000	21,05				
		20,25	9,97	202,52	202,52
0+010	19,45				
		17,47	10,00	174,68	377,20
0+020	15,48				
		13,60	10,00	136,01	513,21
0+030	11,72				
		10,53	10,00	105,27	618,48
0+040	9,34				
		9,10	10,00	91,00	709,48
0+050	8,86				
		10,56	10,00	105,63	815,11
0+060	12,26				
		11,92	10,00	88,88	903,99
0+070	11,58				
		9,85	10,00	50,88	954,87
0+080	8,12				
		6,60	10,00	66,02	1.020,89
0+090	5,08				
		5,75	7,18	41,30	1.062,19
0+097	6,42				
		9,17	1,27	20,31	1.082,50
0+098	11,91				
		8,76	1,26	19,13	1.101,63
0+100	5,60				
		3,87	1,90	10,55	1.112,18
0+102	2,13				
		1,24	4,16	5,60	1.117,78
0+106	0,35				

VOLUMEN DE EXCAVACION

EXCAVACION DE LA VIA DE LA PARADA DE BUS 1

ABCSISAS	AREA PARCIAL	AREA MEDIA	DISTANCIA	VOLUMEN PARCIAL	VOLUMEN ACUMULADO
0+000	8,33				
		8,26	10,00	0,00	0,00
0+010	8,19				
		8,19	10,00	81,62	81,62
0+020	8,19				
		8,19	10,00	81,89	163,51
0+030	8,19				
		9,33	6,76	81,89	245,40
0+037	10,47				
		5,24	-36,76	63,03	308,43

EXCAVACION DE LA ACERA DE LA PARADA DE BUS 1

ABCSISAS	AREA PARCIAL	AREA MEDIA	DISTANCIA	VOLUMEN PARCIAL	VOLUMEN ACUMULADO
0+000	2,60				
		2,53	10,00	0,00	0,00
0+010	2,46				
		2,46	10,00	25,30	25,30
0+020	2,46				
		2,57	10,00	24,60	49,90
0+030	2,67				
		2,88	1,03	25,65	75,55
0+031	3,08				
		1,54	-31,03	2,96	78,51

RESUMEN	
EXCAVACION DEL PARQUEADERO 2	1.117,78
EXCAVACION DE LA VIA DE LA PARADA DE BUS 1	308,43
EXCAVACION DE LA ACERA DE LA PARADA DE BUS 1	78,51
EXCAVACION DE LA VIA DE LA PARADA DE BUS 2	152,57
EXCAVACION DE LA ACERA DE LA PARADA DE BUS 2	213,39
TOTAL	**1.870,68**

RESUMEN DE PLANILLA DE INCREMENTOS

DESCRIPCION	CONTRATADO	ANTERIOR	ACTUAL	INCR. ANT.	INCR. ACT.	UNIDAD
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)	12.779,98	35.935,51			1.870,68	m3

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO " CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

RUBRO N° 2 ANEXO 2

DESCRIPCIÓN: EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)

UNIDAD: m3

PERIODO: 01-jun 30-jun

EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)

VOLUMEN DE EXCAVACION

EXCAVACION DE LA VIA DE LA PARADA DE BUS 2

ABCSISAS	AREA PARCIAL	AREA MEDIA	DISTANCIA	VOLUMEN PARCIAL	VOLUMEN ACUMULADO	ABCSISAS	AREA PARCIAL	AREA MEDIA	DISTANCIA	VOLUMEN PARCIAL	VOLUMEN ACUMULADO
0+000						0+000	2,72				
		0,00	0,00	0,00	0,00			2,91	0,00	2,47	30,84
0+000	0,00					0+000	3,09				
		0,10	0,00	0,10	0,10			3,13	0,00	2,91	33,75
0+000	0,20					0+000	3,16				
		0,30	0,00	0,30	0,40			3,23	0,00	3,12	36,87
0+000	0,39					0+000	3,30				
		0,49	0,00	0,49	0,89			3,42	0,00	3,23	40,10
0+000	0,58					0+000	3,54				
		0,67	0,00	0,67	1,56			3,65	0,00	3,42	43,52
0+000	0,76					0+000	3,75				
		0,86	0,00	0,86	2,42			3,82	0,00	3,64	47,16
0+000	0,96					0+000	3,89				
		1,07	0,00	1,07	3,49			3,93	0,00	3,82	50,98
0+000	1,18					0+000	3,96				
		1,17	0,00	1,17	4,66			3,96	0,00	3,93	54,91
0+000	1,16					0+000	3,95				
		1,14	0,00	1,13	5,79			3,91	0,00	3,97	58,88
0+000	1,11					0+000	3,86				
		1,08	0,00	1,08	6,87			3,84	0,00	3,96	62,84
0+000	1,04					0+000	3,82				
		1,00	0,00	1,00	7,87			3,97	0,00	3,90	66,74
0+000	0,96					0+000	4,11				
		1,03	0,00	1,03	8,90			4,37	0,00	3,84	70,58
0+000	1,10					0+000	4,63				
		1,20	0,00	1,20	10,10			4,67	0,00	3,97	74,55
0+000	1,30					0+000	4,71				
		1,41	0,00	1,41	11,51			4,65	0,34	4,37	78,92
0+000	1,51					0+000	4,59				
		1,59	0,00	1,58	13,09			2,30	-0,38	4,67	83,59
0+000	1,66					0+000	1,66				
		1,67	0,00	1,67	14,76			1,67	0,01	4,65	88,24
0+000	1,68					0+000	1,68				
		1,69	0,14	0,27	15,03			1,69	0,01	4,53	92,77
0+000	1,70					0+000	1,70				
		1,71	-0,13	0,44	15,47			1,71	0,01	4,39	97,16
0+000	1,71					0+000	1,71				
		1,73	0,00	0,11	15,58			1,73	0,01	4,22	101,38
0+000	1,75					0+000	1,75				
		1,79	0,00	0,35	15,93			1,79	0,01	4,01	105,39
0+000	1,82					0+000	1,82				
		0,91	-0,02	0,86	16,79			0,91	-0,44	3,76	109,15
0+000	1,93					0+000	1,93				
		1,96	0,00	1,88	18,67			1,96	0,01	1,05	110,20
0+000	1,98					0+000	1,98				
		1,97	0,00	1,95	20,62			1,97	0,00	1,88	112,08
0+000	1,96					0+000	1,96				
		1,92	0,00	1,97	22,59			1,92	0,01	2,00	114,08
0+000	1,87					0+000	1,87				
		1,85	0,00	1,91	24,50			1,85	0,00	0,50	114,58
0+000	1,82					0+000	1,82				
		2,02	0,00	1,85	26,35			2,02	0,01	2,28	116,86
0+000	2,21					0+000	2,21				
		1,11	-0,02	2,02	28,37			1,11	-0,48	0,65	117,51

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO " CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA,
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

RUBRO N° 2 ANEXO 3
DESCRIPCIÓN: EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)
UNIDAD: m3
PERIODO: 01-jun 30-jun

EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)

VOLUMEN DE EXCAVACION

ABCSISAS	AREA PARCIAL	AREA MEDIA	DISTANCIA	VOLUMEN PARCIAL	VOLUMEN ACUMULADO
0+000					
		0,00	0,00	2,18	119,69
0+000	0,00				
		0,10	0,00	3,55	123,24
0+000	0,20				
		0,30	0,00	3,96	127,20
0+000	0,39				
		0,49	0,00	3,84	131,04
0+000	0,58				
		0,67	0,00	3,53	134,57
0+000	0,76				
		0,86	0,00	3,37	137,94
0+000	0,96				
		1,07	0,00	3,17	141,11
0+000	1,18				
		1,17	0,00	2,96	144,07
0+000	1,16				
		1,14	0,00	2,71	146,78
0+000	1,11				
		1,08	0,00	2,27	149,05
0+000	1,04				
		1,00	0,00	1,64	150,69
0+000	0,96				
		1,03	0,00	1,02	151,71
0+000	1,10				
		1,20	0,00	0,57	152,28
0+000	1,30				
		1,30	0,00	0,26	152,54
0+000	1,30				
		0,65	-0,06	0,03	**152,57**

EXCAVACION DE LA ACERA DE LA PARADA DE BUS 2


ABCSISAS	AREA PARCIAL	AREA MEDIA	DISTANCIA	VOLUMEN PARCIAL	VOLUMEN ACUMULADO
0+000	21,05				
		20,25	10,00	0,00	0,00
0+010	19,45				
		17,47	10,00	25,74	25,74
0+020	15,48				
		13,60	10,00	59,29	85,03
0+030	11,72				
		10,53	10,00	68,94	153,97
0+040	9,34				
		9,10	5,05	51,26	205,23
0+045	8,86				
		4,43	-45,05	8,16	**213,39**

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE L
PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	2 **ANEXO: 1**
DESCRIPCION	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

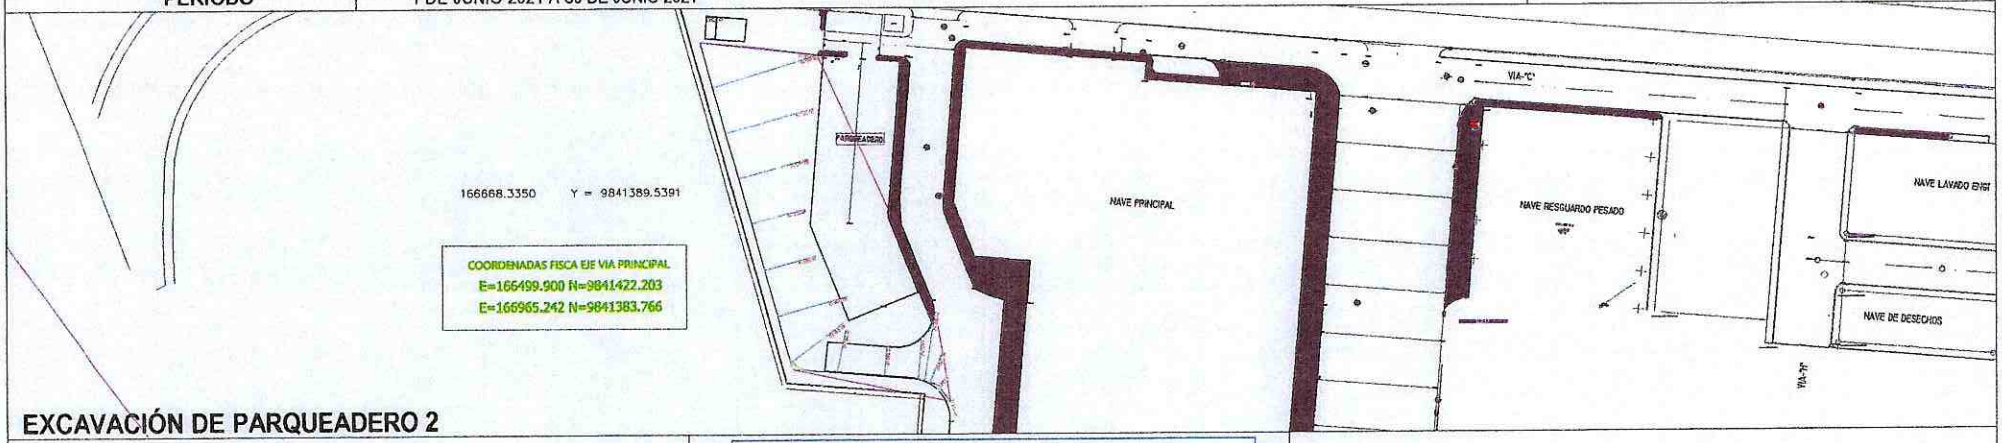

EXCAVACIÓN DE PARQUEADERO 2

Material Table

Station	Area	Volume	Cumulative Volume
0+000.00	21.05	0.00	0.00
0+010.00	19.45	202.52	202.52
0+020.00	15.48	174.68	377.19
0+030.00	11.72	136.01	513.21
0+040.00	9.34	105.27	618.48
0+050.00	8.86	91.00	709.48
0+060.00	12.26	105.63	815.11
0+070.00	11.58	88.88	903.99
0+080.00	8.12	50.88	954.87
0+090.00	5.08	66.02	1020.88
0+097.18	6.42	41.30	1062.18
0+098.45	11.91	20.31	1082.49
0+099.71	5.60	19.13	1101.63
0+101.61	2.13	10.55	1112.18
0+105.77	0.35	5.60	1117.78


CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	2 **ANEXO: 2**
DESCRIPCION	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

PERFIL LONGITUDINAL PARQUEADERO

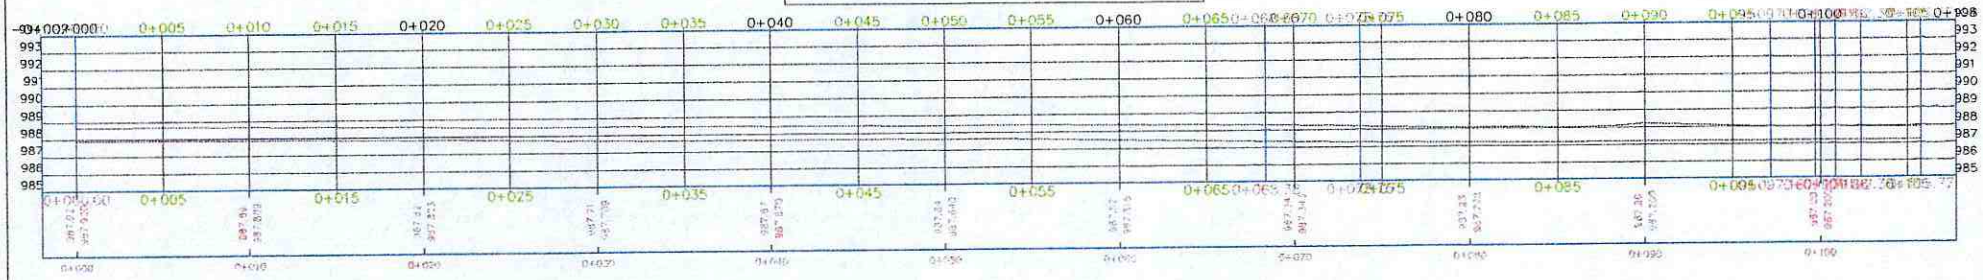

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	2 — **ANEXO: 3**
DESCRIPCION	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

0+000.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	21.05
Area	0.00
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	0.00

0+010.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	19.45
Area	0.00
Volumen en Corte	202.52
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	202.52
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	202.52

0+020.00

SECCCIONES DE CORTE




ABSCISA	
Area en Corte	15.48
Area	0.00
Volumen en Corte	174.68
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	377.19
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	377.19

0+030.00

SECCCIONES DE

0+040.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	9.34
Area	0.00
Volumen en Corte	105.27
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	618.48
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	618.48

0+050.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	8.86
Area	0.00
Volumen en Corte	91.00
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	709.48
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	709.48

0+060.00

SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	12.26
Area	0.00
Volumen en Corte	105.63
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	815.11
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	815.11

0+070.00

SECCCIONES DE

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	2
DESCRIPCION	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

ANEXO: 4

0+030.00

SECCCIONES DE CORTE




ABSCISA	
Area en Corte	11.72
Area	0.00
Volumen en Corte	136.01
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	513.21
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	513.21

Volumen Neto	377.19

0+070.00

SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	11.58
Area	0.00
Volumen en Corte	88.88
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	903.99
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	903.99

Volumen Neto	815.11

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	2
DESCRIPCION	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

ANEXO: 5

0+080.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	8.12
Area	0.00
Volumen en Corte	50.88
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	954.87
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	954.87

0+090.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	5.08
Area	0.00
Volumen en Corte	66.02
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	1020.88
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	1020.88

0+097.18

SECCCIONES DE CORTE




ABSCISA	
Area en Corte	6.42
Area	0.00
Volumen en Corte	41.30
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	1062.18
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	1062.18

0+098.45

SECCCIONES DE

0+099.71


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	5.60
Area	0.00
Volumen en Corte	19.13
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	1101.63
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	1101.63

0+101.61


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	2.13
Area	0.00
Volumen en Corte	10.55
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	1112.18
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	1112.18

0+105.77

SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.35
Area	0.00
Volumen en Corte	5.60
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	1117.78
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	1117.78

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	2 **ANEXO: 6**
DESCRIPCION	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

Volumen Neto	1062.18

0+098.45

SECCCIONES DE CORTE




ABSCISA	
Area en Corte	11.91
Area	0.00
Volumen en Corte	20.31
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	1082.49
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	1082.49

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	2 **ANEXO: 7**
DESCRIPCION	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

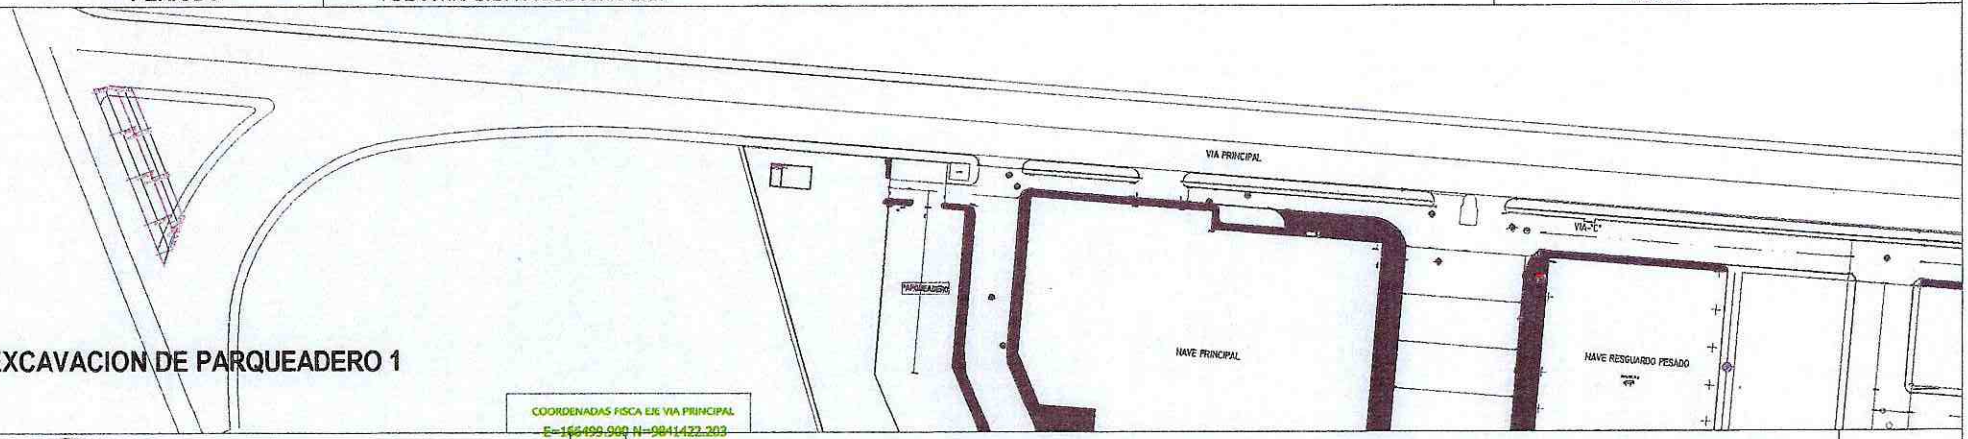

EXCAVACION DE PARQUEADERO 1

COORDENADAS FISCA EJE VIA PRINCIPAL
E=166499.900 N=9841422.203

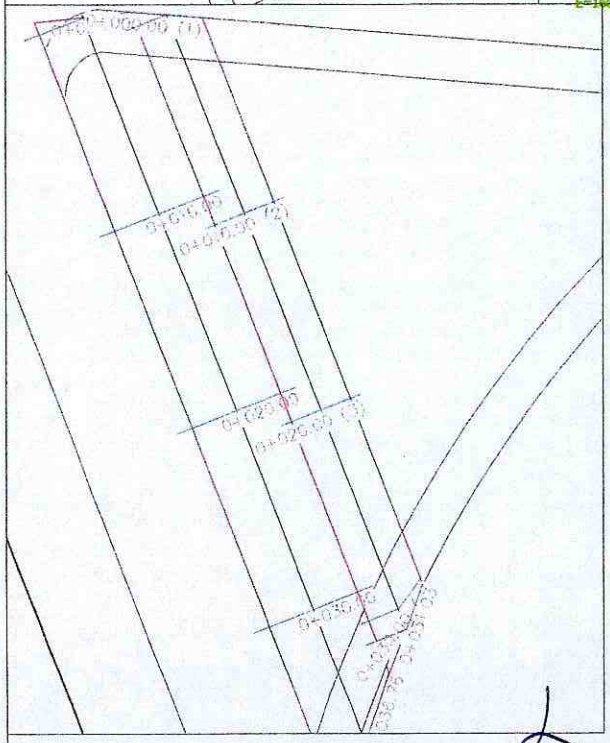

Total Volume Table

Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+000.12	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
0+010.00	0.00	8.19	0.00	81.62	0.00	81.62
0+020.00	0.00	8.19	0.00	81.89	0.00	163.51
0+030.00	0.00	8.19	0.00	81.89	0.00	245.40
0+036.76	0.00	10.47	0.00	63.03	0.00	308.44

Total Volume Table

Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+000.01	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
0+010.00	0.00	2.46	0.00	25.30	0.00	25.30
0+020.00	0.00	2.46	0.00	24.60	0.00	49.90
0+030.00	0.00	2.67	0.00	25.65	0.00	75.55
0+031.03	0.00	3.08	0.00	2.96	0.00	78.50


CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	2 **ANEXO: 8**
DESCRIPCION	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021


PERFIL LONGITUDINAL PARADA DE BUSS



	0+002.00	0+000.00	0+010.00	0+020.00	0+030.00	0+038.70
ABSCISA						
TERRENO NATURAL			988.18	988.24	988.26	
EXCAVACION			986.36	986.42	986.44	
RASANTE			1.82	1.82	1.82	

CONTRATISTA

PERFIL LONGITUDINAL PARADA DE BUSS



	0+002.00	0+000.00	0+010.00	0+020.00	0+030.00	0+033.03
ABSCISA						
TERRENO NATURAL		988.12	988.19	988.24	988.26	
EXCAVACION		987.30	987.37	987.42	987.44	
RASANTE		0.82	0.82	0.82	0.82	


FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "	
RUBRO	2	ANEXO: 9
DESCRIPCION	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)	
UNIDAD	m3	
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021	

0+000.12


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	8.33
Area	0.00
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	0.00

0+030.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	8.19
Area	0.00
Volumen en Corte	81.89
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	245.40
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	245.40

0+010.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	8.19
Area	0.00
Volumen en Corte	81.62
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	81.62
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	81.62

0+036.76


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	10.47
Area	0.00
Volumen en Corte	63.03
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	308.44
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	308.44

0+020.00

SECCCIONES DE CORTE




ABSCISA	
Area en Corte	8.19
Area	0.00
Volumen en Corte	81.89
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	163.51
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	163.51

CONTRATISTA


0+000.12

SECCCIONES DE CORTE

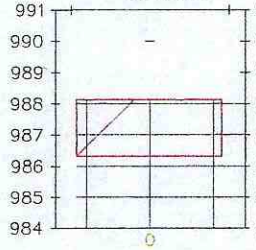


0+030.00

SECCCIONES DE CORTE

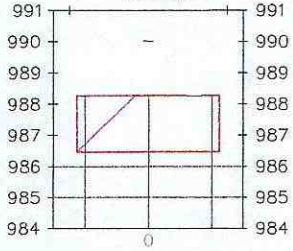


0+010.00

SECCCIONES DE CORTE

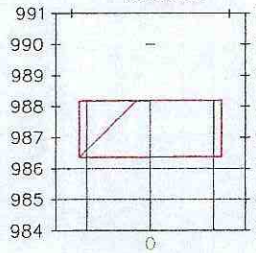


0+036.76

SECCCIONES DE CORTE

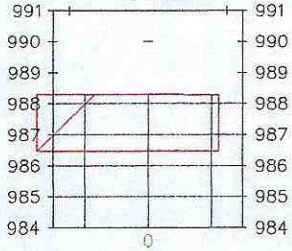

0+020.00


SECCCIONES DE CORTE

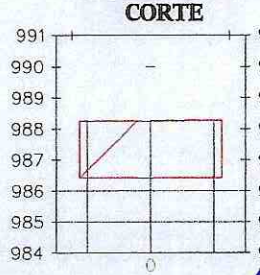

FISCALIZACIÓN


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	2 **ANEXO: 10**
DESCRIPCION	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

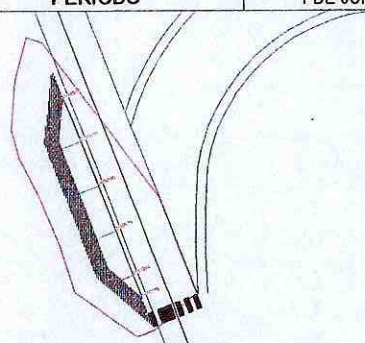

EXCAVACION DE PARADA #2

COORDENADAS FISCA EJE VIA PRINCIPAL
E=166499.900 N=9841422.203
E=166965.242 N=9841383.766

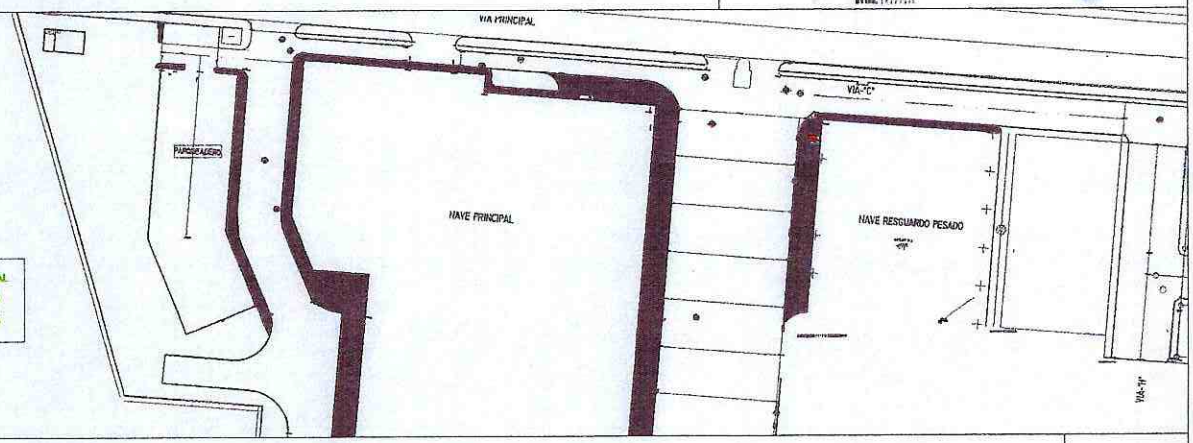

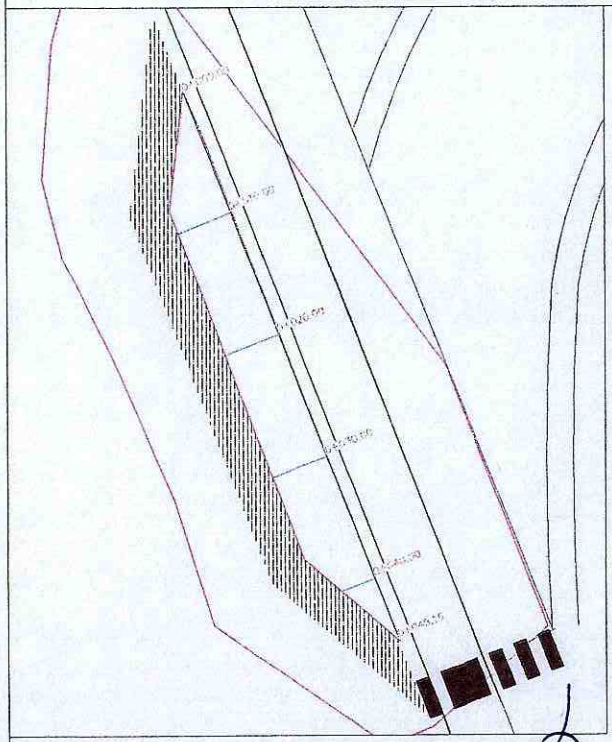


TABLA DE VOLUMENES EXCAVCION VIA

Station	Area	Volume	Cumulative Volume
0+000.21	0.11	0.00	0.00
0+010.00	5.15	25.74	25.74
0+020.00	6.71	59.29	85.03
0+030.00	7.08	68.94	153.97
0+040.00	3.17	51.26	205.22
0+045.05	0.06	8.16	213.39

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	2 — **ANEXO: 11**
DESCRIPCION	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

0+000.21


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.11
Area	0.00
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	0.00

0+010.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	5.15
Area	0.00
Volumen en Corte	25.74
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	25.74
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	25.74

0+020.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	6.71
Area	0.00
Volumen en Corte	59.29
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	85.03
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	85.03

0+030.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	7.08
Area	0.00
Volumen en Corte	68.94
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	153.97
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	153.97

0+040.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	3.17
Area	0.00
Volumen en Corte	51.26
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	205.22
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	205.22

0+045.05

SECCCIONES DE CORTE




ABSCISA	
Area en Corte	0.06
Area	0.00
Volumen en Corte	8.16
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	213.39
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	213.39

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	2 **ANEXO: 12**
DESCRIPCION	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

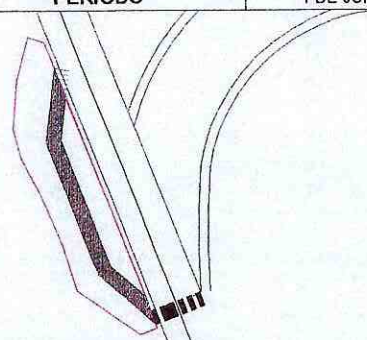

EXCAVACION DE PARADA #2

COORDENADAS FISCA EJE VIA PRINCIPAL
E=166499.900 N=9841422.203
E=166965.242 N=9841383.766

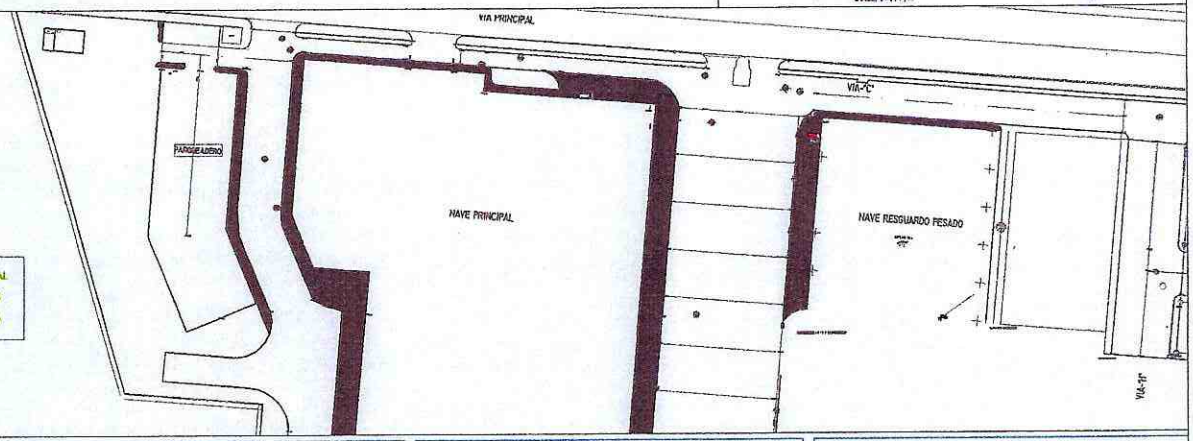

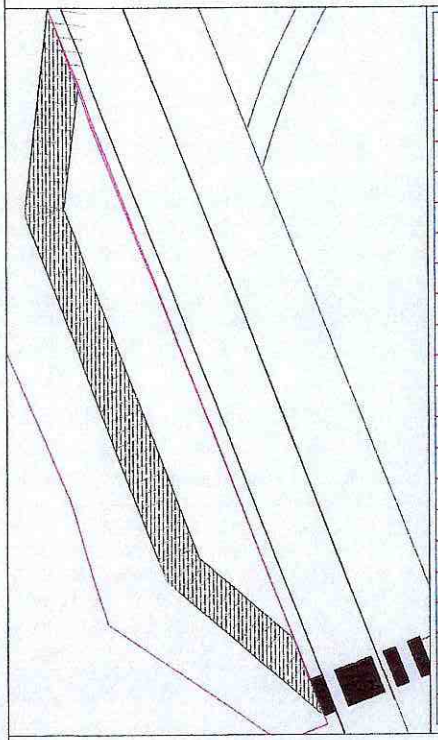


TABLA DE VOLUMENES EXCAVACION ACERA

Station	Area	Volume	Cumulative Volume
0+000.00	0.00	0.00	0.00
0+001.00	0.20	0.10	0.10
0+002.00	0.39	0.30	0.40
0+003.00	0.58	0.49	0.88
0+004.00	0.76	0.67	1.55
0+005.00	0.96	0.86	2.41
0+006.00	1.18	1.07	3.48
0+007.00	1.16	1.17	4.65
0+008.00	1.11	1.13	5.78
0+009.00	1.04	1.08	6.86
0+010.00	0.96	1.00	7.86
0+011.00	1.10	1.03	8.89
0+012.00	1.30	1.20	10.09
0+013.00	1.51	1.41	11.50
0+014.00	1.66	1.58	13.09
0+015.00	1.68	1.67	14.76
0+015.16	1.68	0.27	15.02
0+015.84	1.70	0.44	15.46
0+016.00	1.71	0.11	15.57
0+016.52	1.75	0.35	15.92

TABLA DE VOLUMENES EXCAVACION ACERA

Station	Area	Volume	Cumulative Volume
0+017.00	1.82	0.86	16.78
0+018.00	1.93	1.88	18.65
0+019.00	1.98	1.95	20.61
0+020.00	1.96	1.97	22.57
0+021.00	1.87	1.91	24.49
0+022.00	1.82	1.85	26.33
0+023.00	2.21	2.02	28.35
0+024.00	2.72	2.47	30.82
0+025.00	3.09	2.91	33.72
0+026.00	3.16	3.12	36.85
0+027.00	3.30	3.23	40.07
0+028.00	3.54	3.42	43.49
0+029.00	3.75	3.64	47.13
0+030.00	3.89	3.82	50.95
0+031.00	3.98	3.93	54.88
0+032.00	3.98	3.97	58.85
0+033.00	3.95	3.96	62.82
0+034.00	3.86	3.90	66.72
0+035.00	3.82	3.84	70.56
0+036.00	4.11	3.97	74.53

TABLA DE VOLUMENES EXCAVACION ACERA

Station	Area	Volume	Cumulative Volume
0+037.00	4.63	4.37	78.90
0+038.00	4.71	4.67	83.57
0+039.00	4.59	4.65	88.23
0+040.00	4.47	4.53	92.76
0+041.00	4.31	4.39	97.14
0+042.00	4.12	4.22	101.36
0+043.00	3.89	4.01	105.37
0+044.00	3.63	3.76	109.13
0+044.29	3.54	1.05	110.18
0+045.00	3.39	1.88	112.06
0+045.79	3.16	2.00	114.06
0+046.00	3.11	0.50	114.55
0+047.00	2.81	2.28	116.83
0+047.30	2.90	0.65	117.48
0+048.00	3.29	2.18	119.66
0+049.00	3.82	3.55	123.21
0+050.00	4.10	3.96	127.17
0+051.00	3.59	3.84	131.01
0+052.00	3.48	3.53	134.54
0+053.00	[illegible]	3.37	137.91

TABLA DE VOLUMENES EXCAVACION ACERA

Station	Area	Volume	Cumulative Volume
0+054.00	3.07	3.17	141.08
0+055.00	2.86	2.96	144.05
0+056.00	2.57	2.71	146.76
0+057.00	1.97	2.27	149.03
0+058.00	1.32	1.64	150.67
0+059.00	0.73	1.02	151.70
0+060.00	0.40	0.57	152.28
0+061.00	0.11	0.26	152.52
0+061.40	0.01	0.03	152.54

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	2
DESCRIPCION	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

ANEXO: 13

0+000.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	0.00
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	0.00

0+009.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	1.04
Area	0.00
Volumen en Corte	1.08
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	6.86
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	6.86

0+016.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	1.71
Area	0.00
Volumen en Corte	0.11
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	15.57
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	15.57

0+016.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	1.71
Area	0.00
Volumen en Corte	0.11
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	15.57
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	15.57

0+001.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.20
Area	0.00
Volumen en Corte	0.10
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	0.10
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	0.10

0+010.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.96
Area	0.00
Volumen en Corte	1.00
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	7.86
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	7.86

0+016.52


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	1.75
Area	0.00
Volumen en Corte	0.35
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	15.92
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	15.92

0+016.52


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	1.75
Area	0.00
Volumen en Corte	0.35
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	15.92
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	15.92

0+002.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.39
Area	0.00
Volumen en Corte	0.30
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	0.40
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	0.40

0+011.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	1.10
Area	0.00
Volumen en Corte	1.03
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	8.89
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	8.89

0+017.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	1.82
Area	0.00
Volumen en Corte	0.86
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	16.78
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	16.78

0+017.00

SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	1.82
Area	0.00
Volumen en Corte	0.86
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	16.78
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	16.78

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	2
DESCRIPCION	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021


ANEXO: 14

0+003.00
SECCCIONES DE CORTE




ABSCISA	
Area en Corte	0.58
Area	0.00
Volumen en Corte	0.49
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	0.88
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	0.88

0+004.00
SECCCIONES DE CORTE




ABSCISA	
Area en Corte	0.76
Area	0.00
Volumen en Corte	0.67
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	1.55
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	1.55

0+005.00
SECCCIONES DE CORTE




ABSCISA	
Area en Corte	0.96
Area	0.00
Volumen en Corte	0.86
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	2.41
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	2.41

0+012.00
SECCCIONES DE CORTE




ABSCISA	
Area en Corte	1.30
Area	0.00
Volumen en Corte	1.20
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	10.09
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	10.09

0+013.00
SECCCIONES DE CORTE




ABSCISA	
Area en Corte	1.51
Area	0.00
Volumen en Corte	1.41
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	11.50
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	11.50

0+014.00
SECCCIONES DE CORTE




ABSCISA	
Area en Corte	1.66
Area	0.00
Volumen en Corte	1.58
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	13.09
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	13.09

0+018.00
SECCCIONES DE CORTE




ABSCISA	
Area en Corte	1.93
Area	0.00
Volumen en Corte	1.88
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	18.65
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	18.65

0+019.00
SECCCIONES DE CORTE




ABSCISA	
Area en Corte	1.98
Area	0.00
Volumen en Corte	1.95
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	20.61
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	20.61

0+020.00
SECCCIONES DE CORTE




ABSCISA	
Area en Corte	1.96
Area	0.00
Volumen en Corte	1.97
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	22.57
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	22.57

0+018.00
SECCCIONES DE CORTE




ABSCISA	
Area en Corte	1.93
Area	0.00
Volumen en Corte	1.88
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	18.65
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	18.65

0+019.00
SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	1.98
Area	0.00
Volumen en Corte	1.95
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	20.61
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	20.61

0+020.00
SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	1.96
Area	0.00
Volumen en Corte	1.97
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	22.57
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	22.57

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	2
DESCRIPCION	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

ANEXO: 15

0+006.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	1.18
Area	0.00
Volumen en Corte	1.07
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	3.48
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	3.48

0+007.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	1.16
Area	0.00
Volumen en Corte	1.17
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	4.65
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	4.65

0+008.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	1.11
Area	0.00
Volumen en Corte	1.13
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	5.78
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	5.78

0+015.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	1.68
Area	0.00
Volumen en Corte	1.67
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	14.76
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	14.76

0+015.16


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	1.68
Area	0.00
Volumen en Corte	0.27
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	15.02
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	15.02

0+015.84


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	1.70
Area	0.00
Volumen en Corte	0.44
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	15.46
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	15.46

0+021.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	1.87
Area	0.00
Volumen en Corte	1.91
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	24.49
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	24.49

0+022.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	1.82
Area	0.00
Volumen en Corte	1.85
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	26.33
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	26.33

0+023.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	2.21
Area	0.00
Volumen en Corte	2.02
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	28.35
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	28.35

0+021.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	1.87
Area	0.00
Volumen en Corte	1.91
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	24.49
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	24.49

0+022.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	1.82
Area	0.00
Volumen en Corte	1.85
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	26.33
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	26.33

0+023.00

SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	2.21
Area	0.00
Volumen en Corte	2.02
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	28.35
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	28.35

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	2 — **ANEXO: 16**
DESCRIPCION	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

0+024.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	2.72
Area	0.00
Volumen en Corte	2.47
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	30.82
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	30.82

0+025.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	3.09
Area	0.00
Volumen en Corte	2.91
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	33.72
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	33.72

0+026.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	3.16
Area	0.00
Volumen en Corte	3.12
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	36.85
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	36.85

0+033.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	3.95
Area	0.00
Volumen en Corte	3.96
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	62.8
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	62.8

0+034.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	3.86
Area	0.00
Volumen en Corte	3.90
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	66.7
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	66.7

0+035.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	3.82
Area	0.00
Volumen en Corte	3.84
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	70.56
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	70.56

0+042.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	4.12
Area	0.00
Volumen en Corte	4.22
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	101.36
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	101.36

0+043.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	3.89
Area	0.00
Volumen en Corte	4.01
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	105.37
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	105.37

0+044.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	3.63
Area	0.00
Volumen en Corte	3.76
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	109.13
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	109.13

0+048.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	3.29
Area	0.00
Volumen en Corte	2.18
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	119.66
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	119.66

0+049.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	3.82
Area	0.00
Volumen en Corte	3.55
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	123.21
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	123.21

0+050.00

SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	4.10
Area	0.00
Volumen en Corte	3.96
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	127.17
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	127.17

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	2
DESCRIPCION	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

ANEXO: 17

0+027.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	3.30
Area	0.00
Volumen en Corte	3.23
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	40.0
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	40.0

0+028.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	3.54
Area	0.00
Volumen en Corte	3.42
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	43.4
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	43.4

0+029.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	3.75
Area	0.00
Volumen en Corte	3.64
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	47.1
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	47.1

0+036.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	4.11
Area	0.00
Volumen en Corte	3.97
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	74.53
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	74.53

0+037.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	4.63
Area	0.00
Volumen en Corte	4.37
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	78.90
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	78.90

0+038.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	4.71
Area	0.00
Volumen en Corte	4.67
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	83.57
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	83.57

0+045.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	3.39
Area	0.00
Volumen en Corte	1.88
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	112.06
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	112.06

0+045.79


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	3.16
Area	0.00
Volumen en Corte	2.00
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	114.06
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	114.06

0+046.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	3.11
Area	0.00
Volumen en Corte	0.50
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	114.55
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	114.55

0+051.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	3.59
Area	0.00
Volumen en Corte	3.84
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	131.01
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	131.01

0+052.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	3.48
Area	0.00
Volumen en Corte	3.53
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	134.54
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	134.54

0+053.00

SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	3.27
Area	0.00
Volumen en Corte	3.37
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	137.91
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	137.91

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	2 — **ANEXO: 18**
DESCRIPCION	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

0+030.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	3.89
Area	0.00
Volumen en Corte	3.82
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	50.95
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	50.95

0+031.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	3.96
Area	0.00
Volumen en Corte	3.93
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	54.88
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	54.88

0+032.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	3.98
Area	0.00
Volumen en Corte	3.97
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	58.85
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	58.85

0+039.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	4.59
Area	0.00
Volumen en Corte	4.65
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	88.23
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	88.23

0+040.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	4.47
Area	0.00
Volumen en Corte	4.53
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	92.76
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	92.76

0+041.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	4.31
Area	0.00
Volumen en Corte	4.39
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	97.14
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	97.14

0+046.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	3.11
Area	0.00
Volumen en Corte	0.50
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	114.55
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	114.55

0+047.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	2.81
Area	0.00
Volumen en Corte	2.28
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	116.83
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	116.83

0+047.30


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	2.90
Area	0.00
Volumen en Corte	0.65
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	117.48
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	117.48

0+054.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	3.07
Area	0.00
Volumen en Corte	3.17
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	141.08
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	141.08

0+055.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	2.66
Area	0.00
Volumen en Corte	2.96
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	144.05
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	144.05

0+056.00

SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	2.57
Area	0.00
Volumen en Corte	2.71
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	146.76
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	146.76

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	2
DESCRIPCION	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

ANEXO: 19

0+057.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	1.97
Area	0.00
Volumen en Corte	2.27
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	149.03
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	149.03

0+058.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	1.32
Area	0.00
Volumen en Corte	1.64
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	150.67
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	150.67

0+059.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.73
Area	0.00
Volumen en Corte	1.02
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	151.70
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	151.70

0+060.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.40
Area	0.00
Volumen en Corte	0.57
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	152.26
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	152.26

0+061.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.11
Area	0.00
Volumen en Corte	0.26
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	152.52
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	152.52

0+061.40

SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.01
Area	0.00
Volumen en Corte	0.03
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	152.54
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	152.54

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO **" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "**

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

RUBRO N° 6 ANEXO 1
DESCRIPCIÓN: mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)
UNIDAD: m3
PERIODO: 01-jun 30-jun

mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)

VOLUMEN DE RELLENO

RELLENO M. MEJORAMIENTO DEL PARQUEADERO 2

ABCSISAS	AREA PARCIAL	AREA MEDIA	DISTANCIA	VOLUMEN PARCIAL	VOLUMEN ACUMULADO	ABCSISAS	AREA PARCIAL	AREA MEDIA	DISTANCIA	VOLUMEN PARCIAL	VOLUMEN ACUMULADO
0+000	21,05					0+069	8,33				
		20,25	10,00	111,76	111,76			8,26	1,03	17,46	509,17
0+010	19,45					0+070	8,19				
		17,47	10,00	94,67	206,43			8,19	3,19	4,73	513,90
0+020	15,48					0+073	8,19				
		13,60	9,84	75,80	282,23			8,19	6,81	12,93	526,83
0+030	11,72					0+080	8,19				
		10,53	0,16	1,12	283,35			9,33	10,00	21,81	548,64
0+030	9,34					0+090	10,47				
		9,10	0,05	0,36	283,71			10,47	1,51	48,38	597,02
0+030	8,86					0+092	10,47				
		10,56	0,22	1,47	285,18			5,24	-91,51	11,12	**608,14**
0+030	12,26										
		11,92	5,85	36,47	321,65						
0+036	11,58										
		9,85	3,88	21,60	343,25						
0+040	8,12										
		6,60	0,01	0,05	343,30						
0+040	5,08										
		5,75	3,89	21,00	364,30						
0+044	6,42										
		9,17	6,10	34,05	398,35						
0+050	11,91										
		8,76	0,02	0,11	398,46						
0+050	5,60										
		3,87	9,98	60,52	458,98						
0+060	2,13										
		1,24	4,97	32,73	491,71						
0+065	0,35										

RESUMEN	
RELLENO M. MEJORAMIENTO DEL PARQUEADERO 2	608,14
RELLENO DE LA VIA Y ACERA DE LA PARADA DE BUS 1	169,53
RELLENO DE LA VIA DE LA PARADA DE BUS 2	87,66
RELLENO DE LA ACERA DE LA PARADA DE BUS 2	30,58
RELLENO DE ACERA INTERNAS	697,06
SUBTOTAL	**1.592,97**
%COMPACTACION (20%) m3	1,20
TOTAL	1.911,56

RESUMEN DE PLANILLA AL 100%					
DESCRIPCION	CONTRATADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	UNIDAD
mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)	51.821,91	43.597,97	1.911,56	45.509,53	m3

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO **" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "**

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

RUBRO N° 6 ANEXO 2
DESCRIPCIÓN: mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)
UNIDAD: m3
PERIODO: 01-jun 30-jun

mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)

VOLUMEN DE RELLENO

RELLENO DE LA VIA Y ACERA DE LA PARADA DE BUS 1

ABCSISAS	AREA PARCIAL	AREA MEDIA	DISTANCIA	VOLUMEN PARCIAL	VOLUMEN ACUMULADO
0+000					
		0,00	9,99	0,00	0,00
0+010	0,00				
		0,10	10,00	44,93	44,93
0+020	0,20				
		0,30	10,00	45,00	89,93
0+030	0,39				
		0,49	6,76	45,00	134,93
0+037	0,58				
		0,29	-36,76	34,60	**169,53**

VOLUMEN DE RELLENO

RELLENO DE LA VIA DE LA PARADA DE BUS 2

ABCSISAS	AREA PARCIAL	AREA MEDIA	DISTANCIA	VOLUMEN PARCIAL	VOLUMEN ACUMULADO
0+000	2,72				
		2,91	9,98	0,00	0,00
0+010	3,09				
		3,13	10,00	20,49	20,49
0+020	3,16				
		3,23	10,00	26,82	47,31
0+030	3,30				
		3,42	6,68	26,87	74,18
0+037	3,54				
		1,77	-36,68	13,48	**87,66**

VOLUMEN DE RELLENO

RELLENO DE LA ACERA DE LA PARADA DE BUS 2

ABCSISAS	AREA PARCIAL	AREA MEDIA	DISTANCIA	VOLUMEN PARCIAL	VOLUMEN ACUMULADO
0+000	2,72				
		2,91	10,00	4,54	4,54
0+010	3,09				
		3,13	1,63	0,98	5,52
0+012	3,16				
		3,23	0,88	0,54	6,06
0+013	3,30				
		3,42	0,88	0,54	6,60
0+013	3,54				
		3,32	6,61	3,97	10,57
0+020	3,09				
		3,13	10,00	6,00	16,57
0+030	3,16				
		3,23	10,00	6,00	22,57
0+040	3,30				
		3,42	0,10	0,06	22,63
0+040	3,54				
		3,35	1,61	0,99	23,62
0+042	3,16				
		3,23	1,60	0,99	24,61
0+043	3,30				
		3,42	6,69	4,02	28,63
0+050	3,54				
		3,32	4,32	1,95	**30,58**
0+054	3,09				

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO " CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

RUBRO N° 6 ANEXO 3

DESCRIPCIÓN: mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)

UNIDAD: m3

PERIODO: 01-jun 30-jun

ACERA EN EL PROYECTO

RELLENO DE ACERA INTERNAS


DESCRIPCION	LARGO (X)	AREA (M2)	ANCHO (Y)	No.		TOTAL
ACERAS INTERNAS		796,24		1		796,24
ACERA EXTERNAS		2145,39		1		2145,39
DESCUENTO ISLA		-253,27		1		-253,27
DESCUENTO TAPAS	0,6		0,6	-162		-58,32
DESCUENTO TAPAS	0,9		0,9	-17		-13,77
SEGUNDA PARTE						
ACERAS INTERNAS		173,84		1		173,84
DESCUENTO TAPAS	0,48		0,3	-13		-1,87
SUBTOTAL						2788,24
ESPESOR DE RELLENO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN ACERAS INTERNAS Y EXTERNAS						0,25
TOTAL						697,06

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	6 **ANEXO: 1**
DESCRIPCION	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

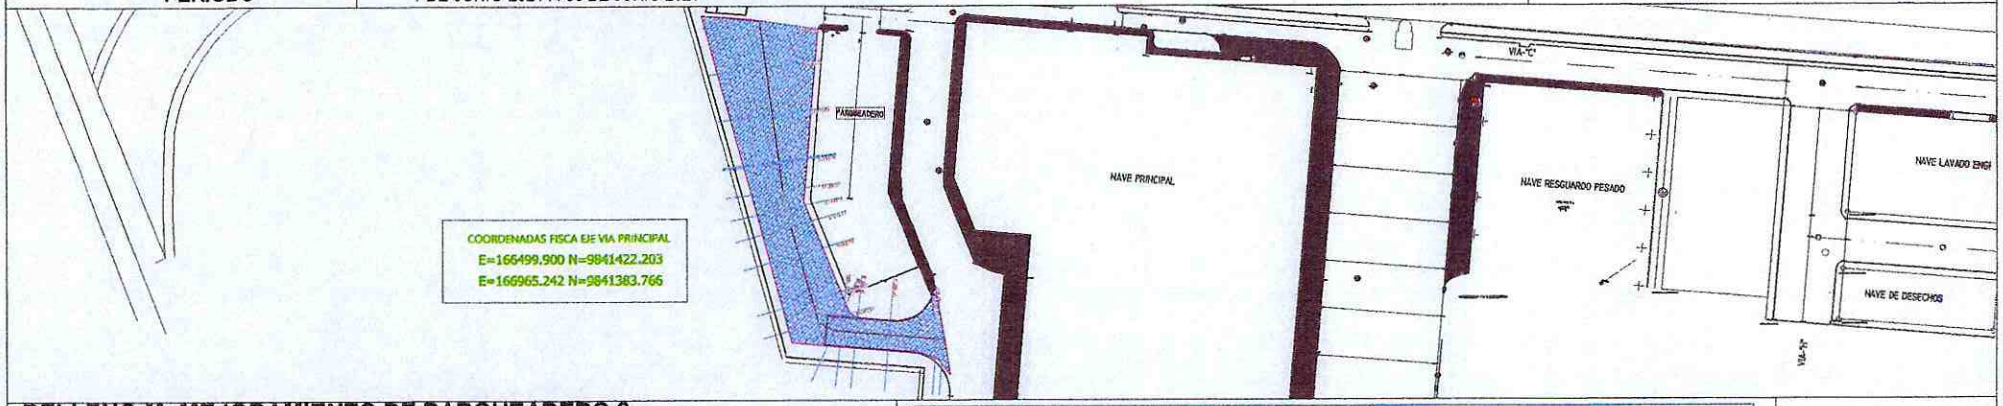

RELLENO M. MEJORAMIENTO DE PARQUEADERO 2

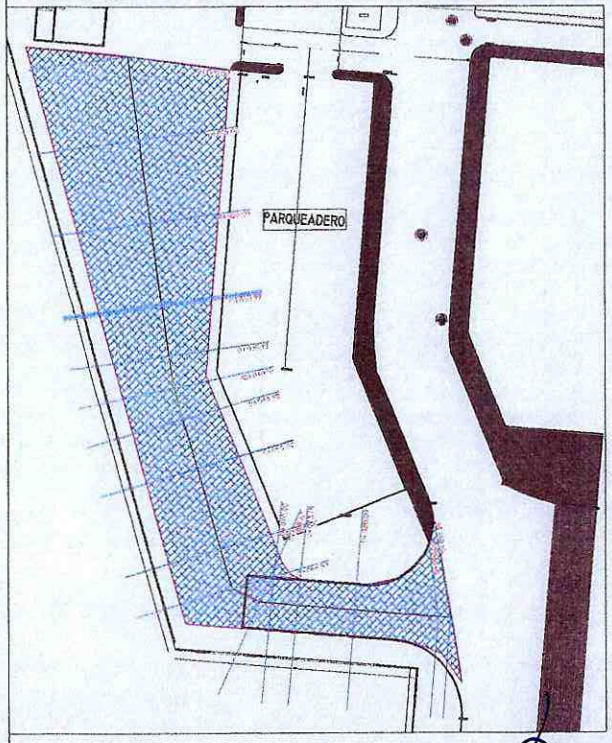

Total Volume Table

Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+000.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+010.00	10.35	0.00	111.76	0.00	111.76	0.00
0+020.00	8.58	0.00	94.67	0.00	206.43	0.00
0+029.84	6.83	0.00	75.80	0.00	282.23	0.00
0+030.00	6.81	0.00	1.12	0.00	283.35	0.00
0+030.05	6.80	0.00	0.36	0.00	283.71	0.00
0+030.27	6.76	0.00	1.47	0.00	285.17	0.00
0+036.12	5.71	0.00	36.47	0.00	321.64	0.00
0+040.00	5.20	0.00	21.60	0.00	343.24	0.00
0+040.01	5.20	0.00	0.05	0.00	343.30	0.00
0+043.90	5.40	0.00	21.00	0.00	364.29	0.00
0+050.00	5.76	0.00	34.05	0.00	398.34	0.00
0+050.02	5.77	0.00	0.11	0.00	398.45	0.00
0+060.00	6.36	0.00	60.52	0.00	458.97	0.00
0+064.97	6.82	0.00	32.73	0.00	491.70	0.00
0+068.57	4.74	0.00	17.46	0.00	509.16	0.00
0+070.00	4.88	0.00	4.73	0.00	513.89	0.00
0+073.19	3.22	0.00	12.93	0.00	526.82	0.00
0+080.00	3.18	0.00	21.81	0.00	548.63	0.00
0+090.00	6.49	0.00	48.38	0.00	597.01	0.00
0+091.51	8.25	0.00	11.12	0.00	608.13	0.00


CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE L
PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	6 **ANEXO: 2**
DESCRIPCION	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

PERFIL LONGITUDINAL VIA PRINCIPAL

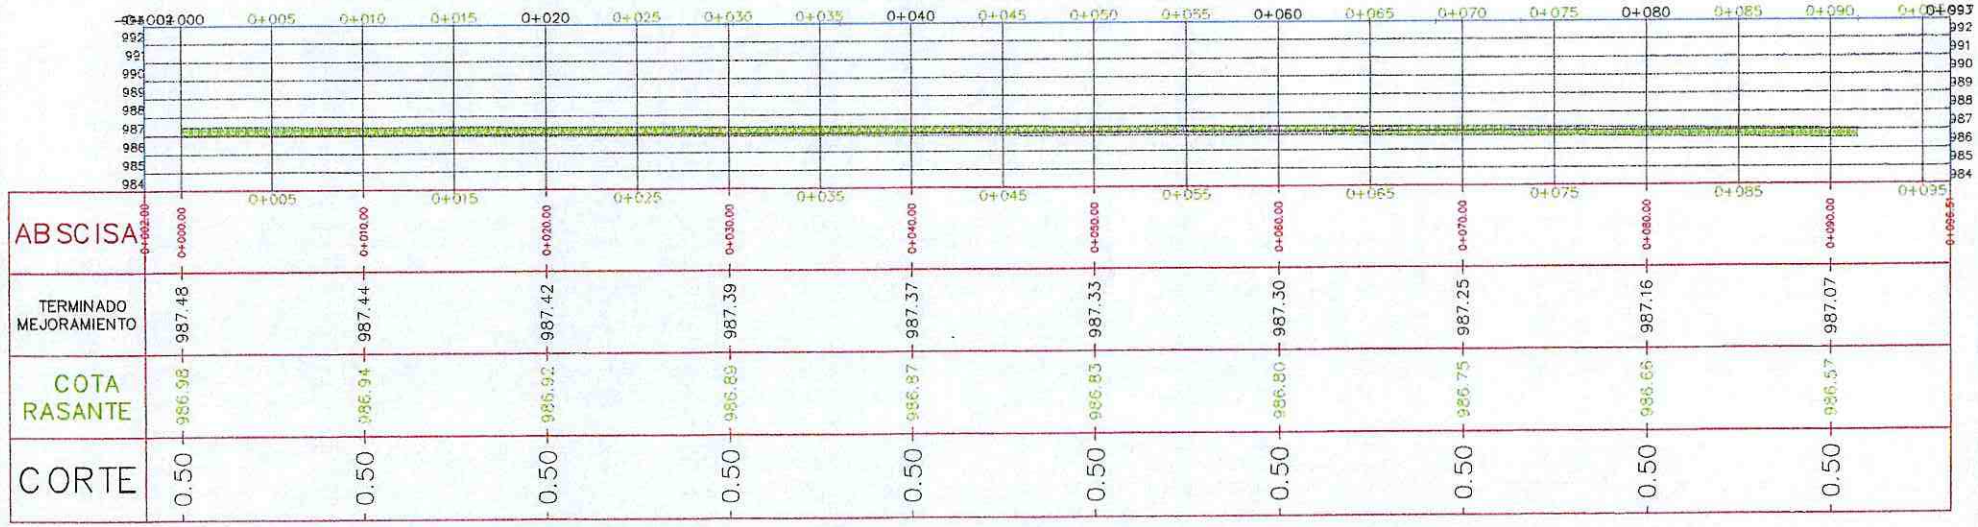

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	6 ANEXO: 3
DESCRIPCION	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

0+000.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	12.00
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	0.00

0+010.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	10.35
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	111.76
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	111.76
Volumen Neto	-111.76

0+020.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	8.58
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	94.67
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	206.43
Volumen Neto	-206.43

0+029.84

SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	6.83
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	75.80
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	282.23
Volumen Neto	-282.23

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	6 ANEXO: 4
DESCRIPCION	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

0+030.00

SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	6.81
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	1.12
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	283.35
Volumen Neto	-283.35

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	6 — **ANEXO: 5**
DESCRIPCION	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

0+030.05


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	6.80
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	0.36
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	283.71
Volumen Neto	-283.71

0+030.27


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	6.76
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	1.47
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	285.17
Volumen Neto	-285.17

0+036.12


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	5.71
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	36.47
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	321.64
Volumen Neto	-321.64

0+040.00

SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	5.20
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	21.60
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	343.24
Volumen Neto	-343.24

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	6 **ANEXO: 6**
DESCRIPCION	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

0+040.01

SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	5.20
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	0.05
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	343.30
Volumen Neto	-343.30

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	6 **ANEXO: 7**
DESCRIPCION	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

0+043.90


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	5.40
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	21.00
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	364.29
Volumen Neto	-364.29

0+050.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	5.76
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	34.05
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	398.34
Volumen Neto	-398.34

0+050.02


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	5.77
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	0.11
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	398.45
Volumen Neto	-398.45

0+060.00

SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	6.36
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	60.52
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	458.97
Volumen Neto	-458.97

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	6 **ANEXO: 8**
DESCRIPCION	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

0+040.01

SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	5.20
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	0.05
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	343.30
Volumen Neto	-343.30

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	6 **ANEXO: 9**
DESCRIPCION	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

0+068.57


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	4.74
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	17.46
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	509.16
Volumen Neto	-509.16

0+070.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	4.88
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	4.73
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	513.89
Volumen Neto	-513.89

0+073.19


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	3.22
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	12.93
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	526.82
Volumen Neto	-526.82

0+080.00

SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	3.18
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	21.81
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	548.63
Volumen Neto	-548.63

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCION DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	6 **ANEXO: 10**
DESCRIPCION	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

0+064.97

SECCCIONES DE CORTE




ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	6.82
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	32.73
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	491.70
Volumen Neto	-491.70

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	6 **ANEXO: 11**
DESCRIPCION	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

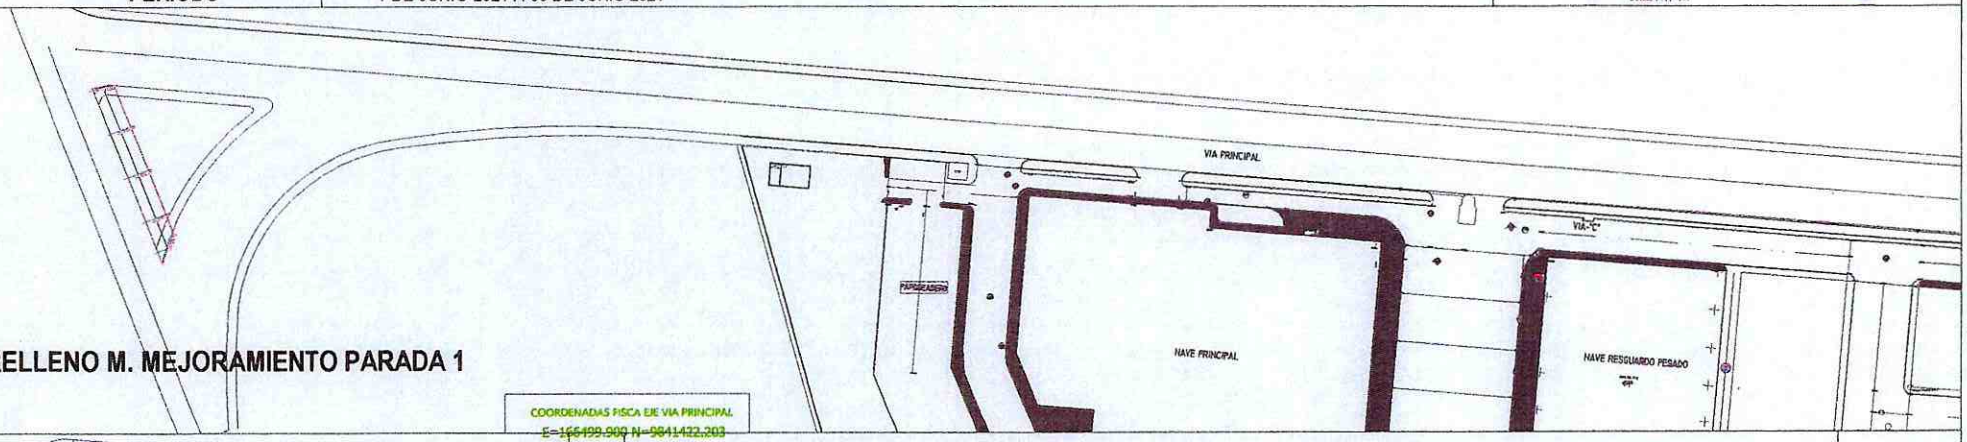

RELLENO M. MEJORAMIENTO PARADA 1

COORDENADAS FISCA EJE VIA PRINCIPAL
E=166499.900 N=9841422.203

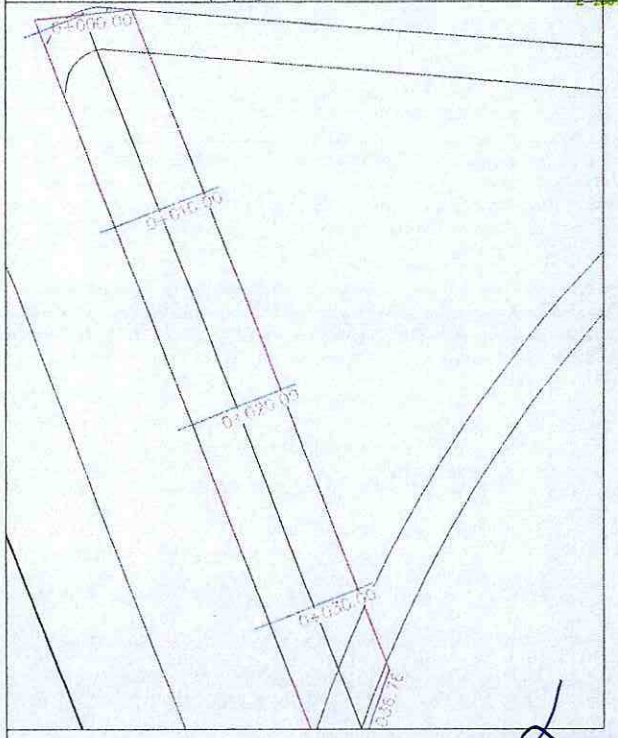

Total Volume Table

Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+000.10	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
0+010.00	0.00	4.50	0.00	44.93	0.00	44.93
0+020.00	0.00	4.50	0.00	45.00	0.00	89.93
0+030.00	0.00	4.50	0.00	45.00	0.00	134.93
0+036.76	0.00	5.75	0.00	34.60	0.00	169.53


CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE L[illegible]
PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	6 **ANEXO: 12**
DESCRIPCION	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

PERFIL LONGITUDINAL PARADA DE BUSS

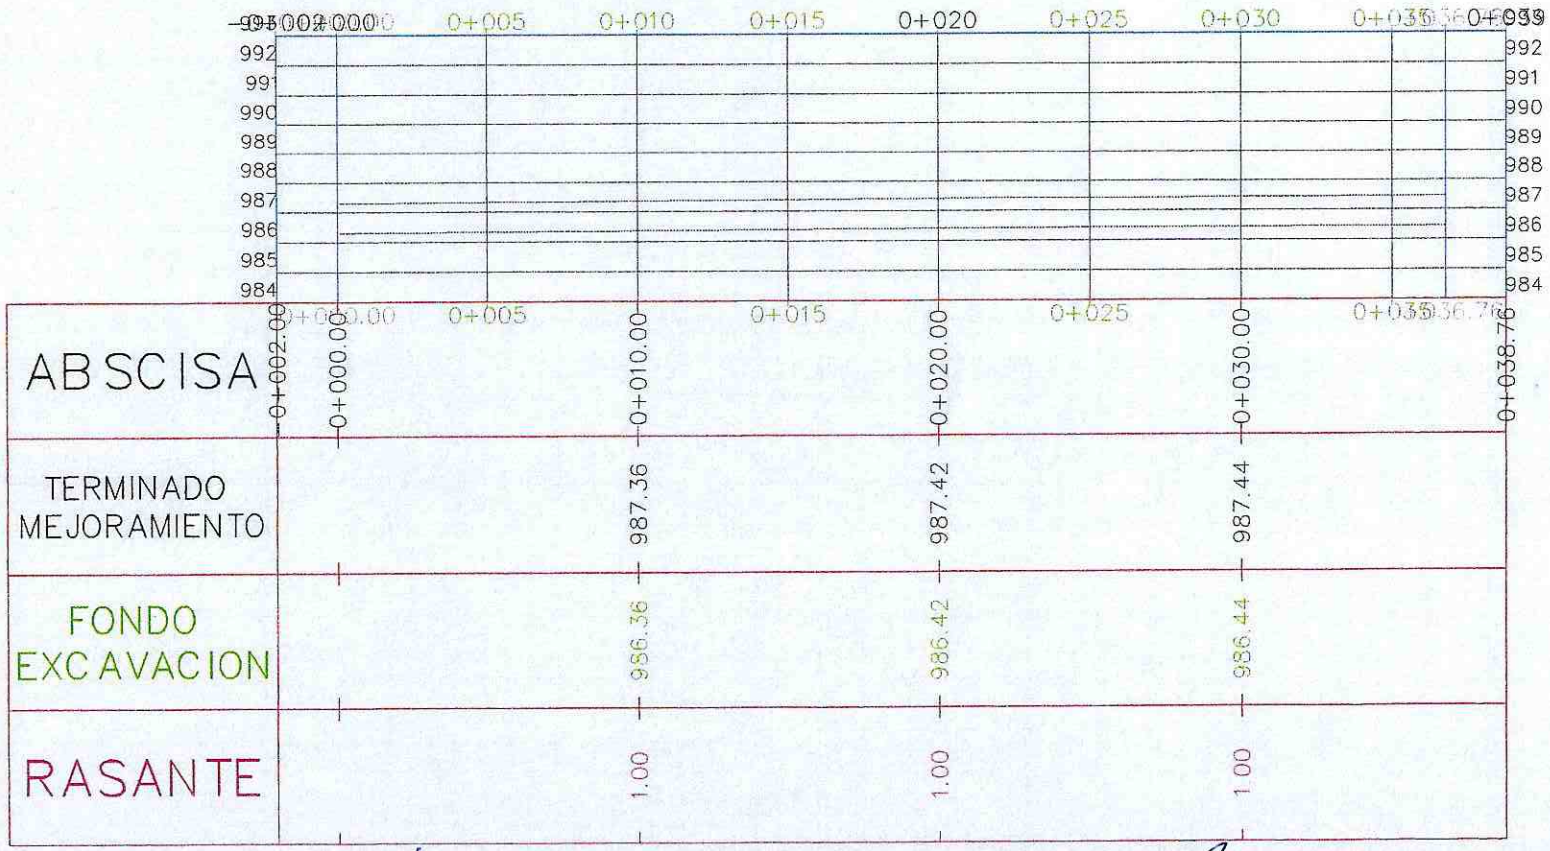


CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PROVINCIA DEL PASTAZA


PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	6 ANEXO: 13
DESCRIPCION	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

0+000.10
SECCCIONES DE MEJORAMIENTO




ABSCISA	
Area en Corte	4.58
Area	0.00
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	0.00

0+010.00
SECCCIONES DE MEJORAMIENTO




ABSCISA	
Area en Corte	4.50
Area	0.00
Volumen en Corte	44.93
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	44.93
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	44.93

0+020.00
SECCCIONES DE MEJORAMIENTO




ABSCISA	
Area en Corte	4.50
Area	0.00
Volumen en Corte	45.00
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	89.93
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	89.93

0+030.00
SECCCIONES DE MEJORAMIENTO



ABSCISA	
Area en Corte	4.50
Area	0.00
Volumen en Corte	45.00
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	134.93
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	134.93

0+036.76
SECCCIONES DE MEJORAMIENTO




ABSCISA	
Area en Corte	5.75
Area	0.00
Volumen en Corte	34.60
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	169.53
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	169.53

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	6 **ANEXO: 14**
DESCRIPCION	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

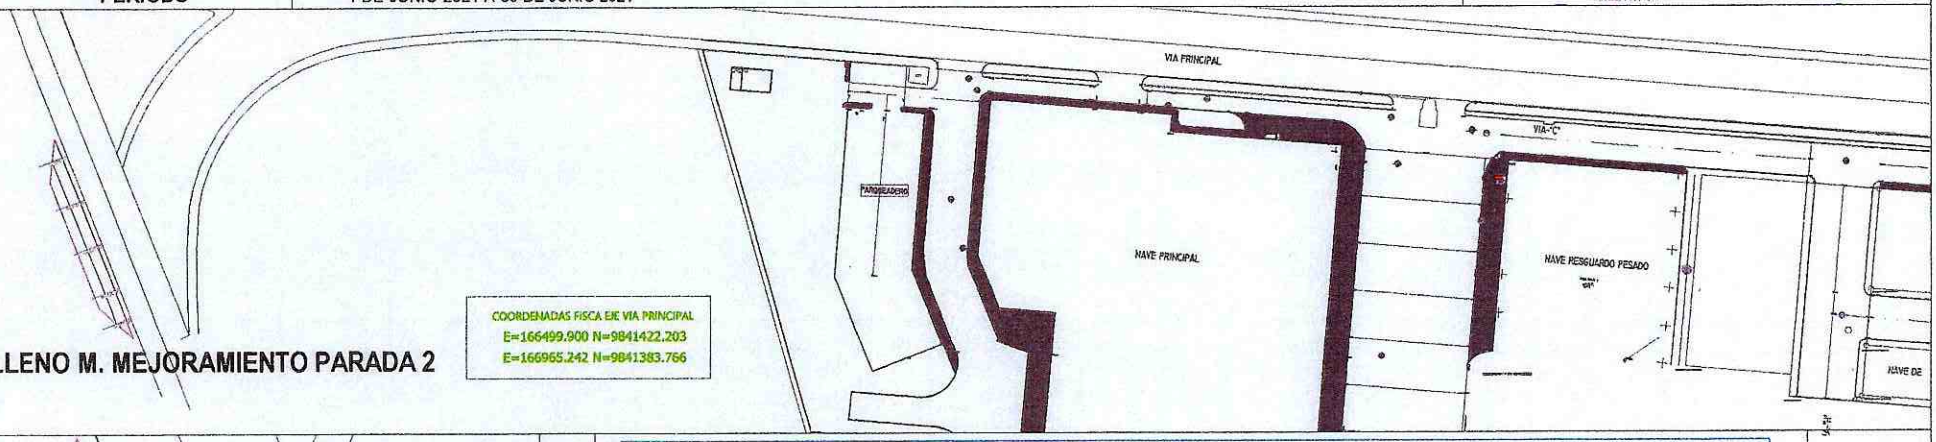

RELLENO M. MEJORAMIENTO PARADA 2

COORDENADAS FISCA EJE VIA PRINCIPAL
E=166499.900 N=9841422.203
E=165965.242 N=9841383.766

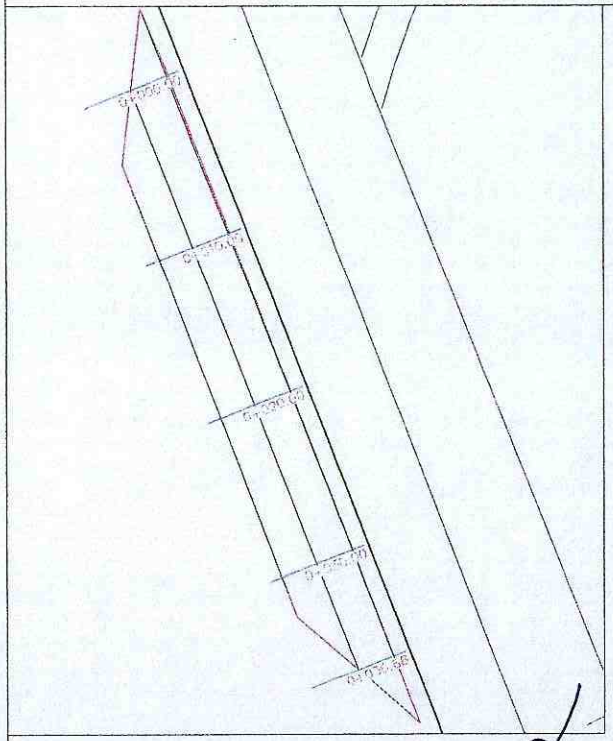

Total Volume Table

Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+000.00	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
0+010.00	0.00	2.68	0.00	20.49	0.00	20.49
0+020.00	0.00	2.68	0.00	26.82	0.00	47.30
0+030.00	0.00	2.69	0.00	26.87	0.00	74.18
0+036.68	0.00	1.35	0.00	13.48	0.00	87.65


CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	6 **ANEXO: 15**
DESCRIPCION	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

PERFIL LONGITUDINAL VIA PRINCIPAL

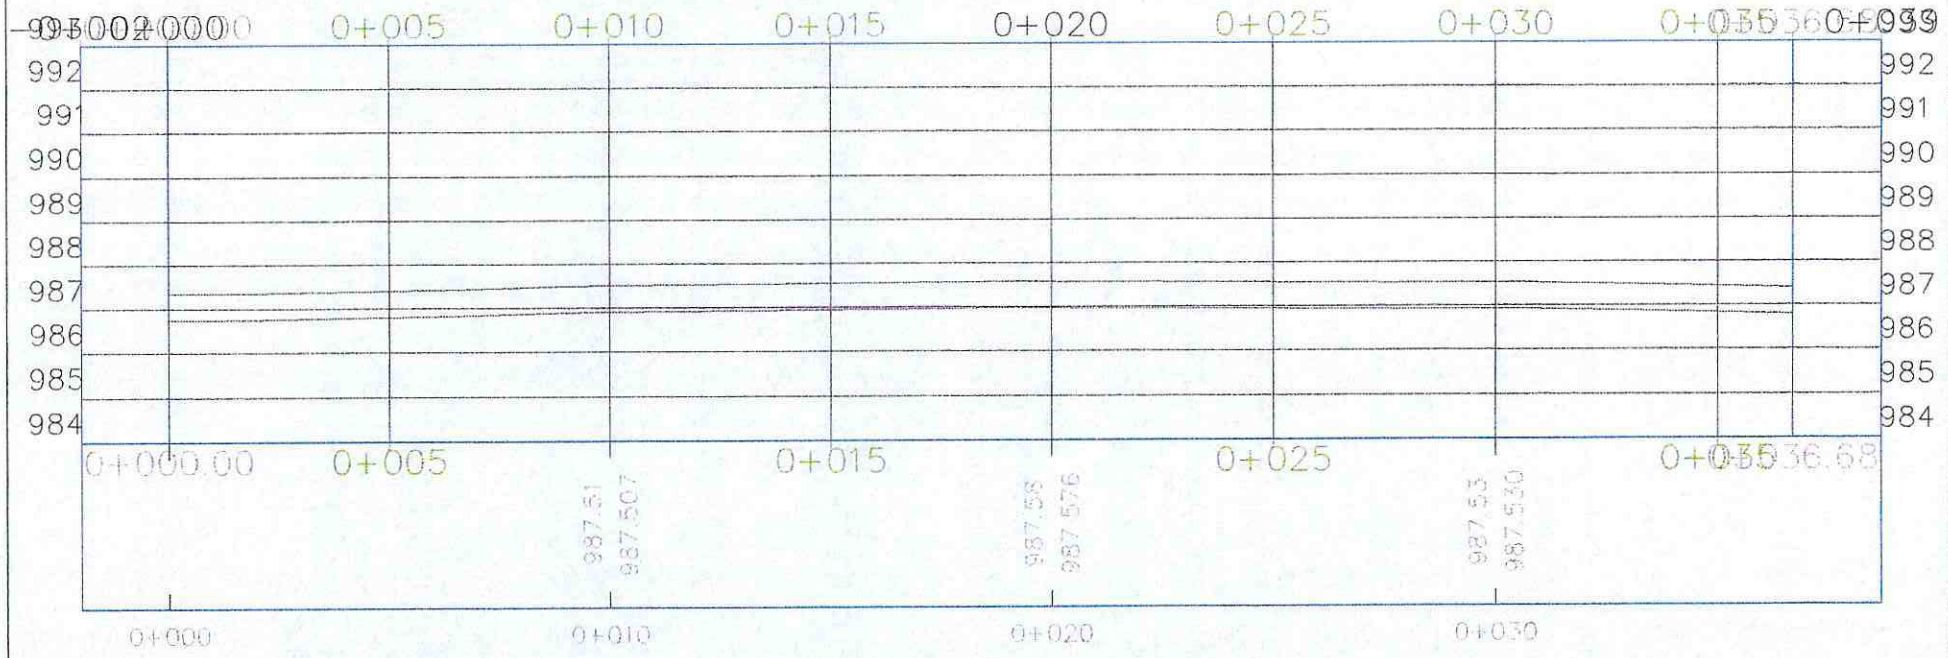

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	6 — **ANEXO: 16**
DESCRIPCION	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

0+000.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	1.42
Area	0.00
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	0.00

0+010.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	2.68
Area	0.00
Volumen en Corte	20.49
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	20.49
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	20.49

0+020.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	2.68
Area	0.00
Volumen en Corte	26.82
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	47.30
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	47.30

0+030.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	2.69
Area	0.00
Volumen en Corte	26.87
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	74.18
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	74.18

0+036.68

SECCCIONES DE CORTE




ABSCISA	
Area en Corte	1.35
Area	0.00
Volumen en Corte	13.48
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	87.65
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	87.65

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	6 **ANEXO: 17**
DESCRIPCION	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

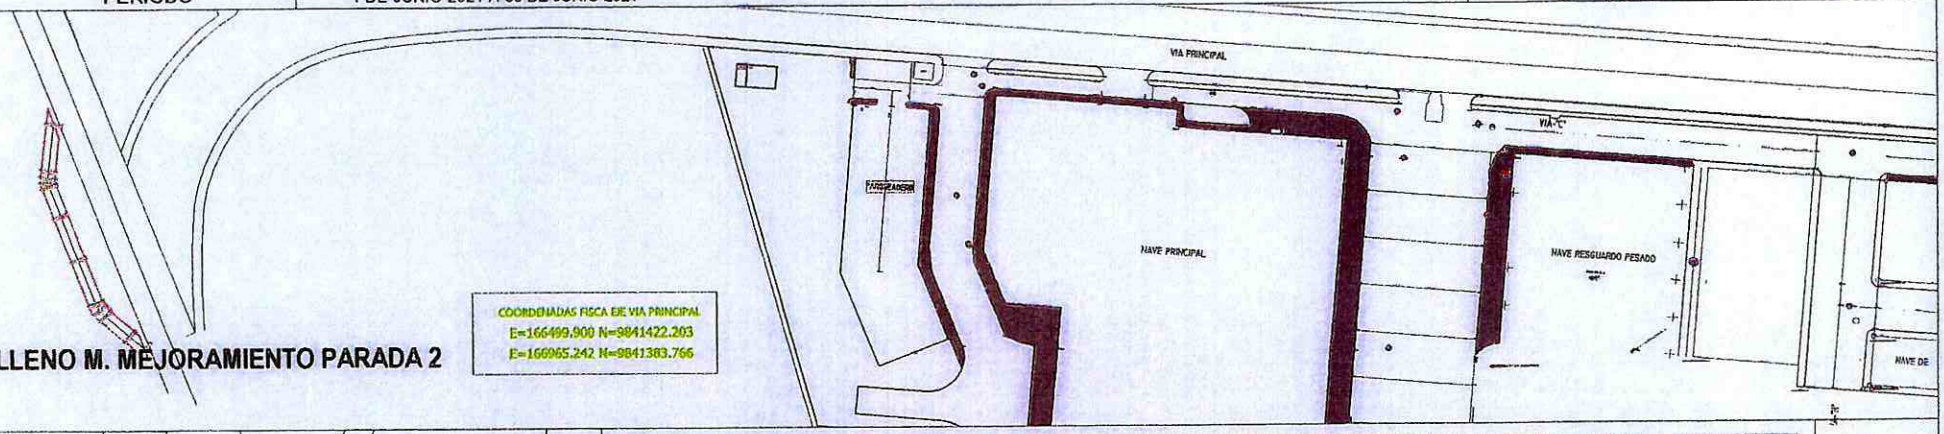

RELLENO M. MEJORAMIENTO PARADA 2

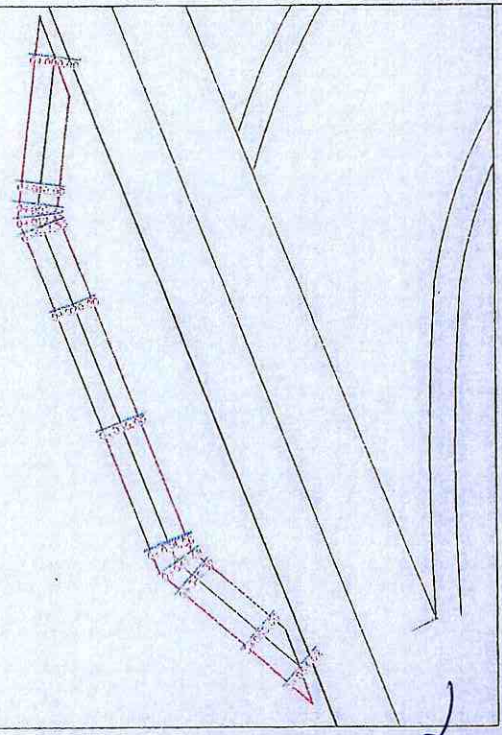

Total Volume Table

Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+000.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
0+010.00	0.00	0.60	0.00	4.54	0.00	4.54
0+011.63	0.00	0.60	0.00	0.98	0.00	5.51
0+012.51	0.00	0.62	0.00	0.54	0.00	6.06
0+013.39	0.00	0.60	0.00	0.54	0.00	6.60
0+020.00	0.00	0.60	0.00	3.97	0.00	10.57
0+030.00	0.00	0.60	0.00	6.00	0.00	16.57
0+040.00	0.00	0.60	0.00	6.00	0.00	22.57
0+040.10	0.00	0.60	0.00	0.06	0.00	22.63
0+041.71	0.00	0.62	0.00	0.99	0.00	23.62
0+043.31	0.00	0.60	0.00	0.99	0.00	24.62
0+050.00	0.00	0.60	0.00	4.02	0.00	28.64
0+054.32	0.00	0.30	0.00	1.95	0.00	30.59

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	6
DESCRIPCION	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

ANEXO: 18

PERFIL LONGITUDINAL VIA PRINCIPAL

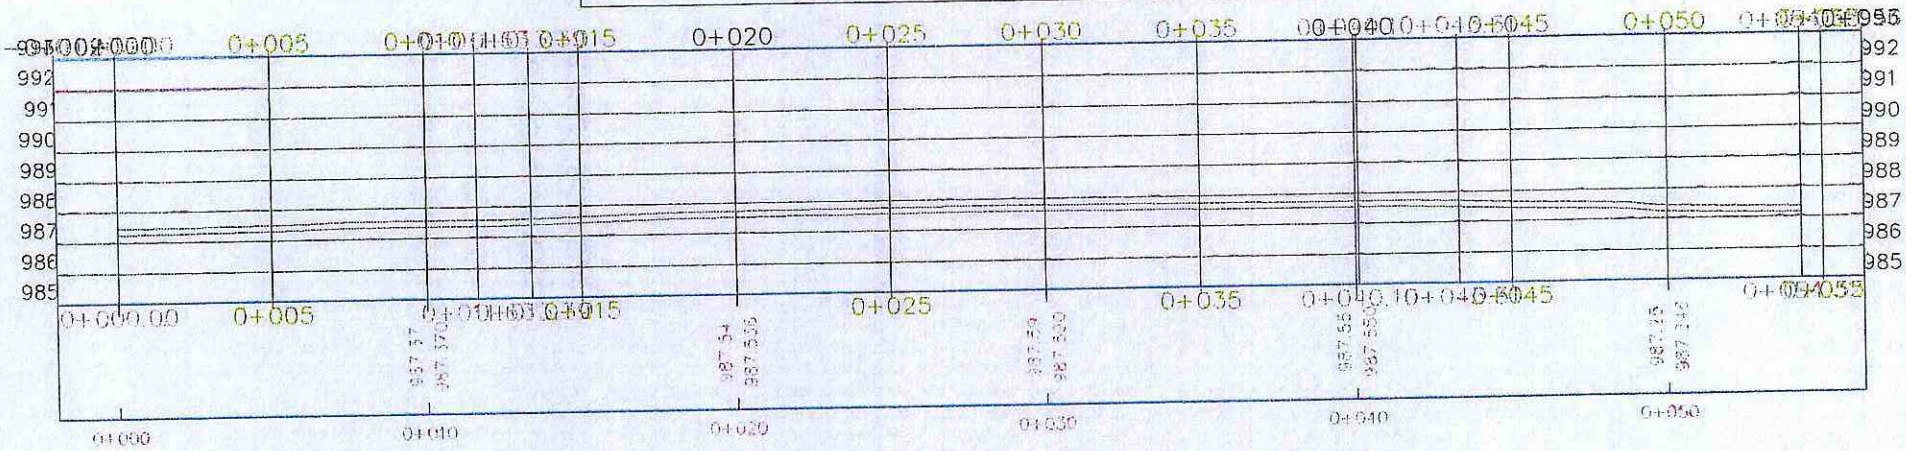

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO D[illegible]A
PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	6 — **ANEXO: 19**
DESCRIPCION	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

0+000.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.31
Area	0.00
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	0.00

0+013.39


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.60
Area	0.00
Volumen en Corte	0.54
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	6.60
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	6.60

0+040.10


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.60
Area	0.00
Volumen en Corte	0.06
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	22.63
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	22.63

0+054.32


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.30
Area	0.00
Volumen en Corte	1.95
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	30.59
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	30.59

0+010.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.60
Area	0.00
Volumen en Corte	4.54
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	4.54
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	4.54

0+020.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.60
Area	0.00
Volumen en Corte	3.97
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	10.57
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	10.57

0+041.71


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.62
Area	0.00
Volumen en Corte	0.99
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	23.62
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	23.62

0+011.63


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.60
Area	0.00
Volumen en Corte	0.98
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	5.51
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	5.51

0+030.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.60
Area	0.00
Volumen en Corte	6.00
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	16.57
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	16.57

0+043.31

SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.60
Area	0.00
Volumen en Corte	0.99
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	24.62
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	24.62

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	6 **ANEXO: 20**
DESCRIPCION	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

0+012.51


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.62
Area	0.00
Volumen en Corte	0.54
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	6.06
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	6.06

0+040.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.60
Area	0.00
Volumen en Corte	6.00
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	22.57
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	22.57

0+050.00

SECCCIONES DE CORTE




ABSCISA	
Area en Corte	0.60
Area	0.00
Volumen en Corte	4.02
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	28.64
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	28.64

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	6 **ANEXO: 21**
DESCRIPCION	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

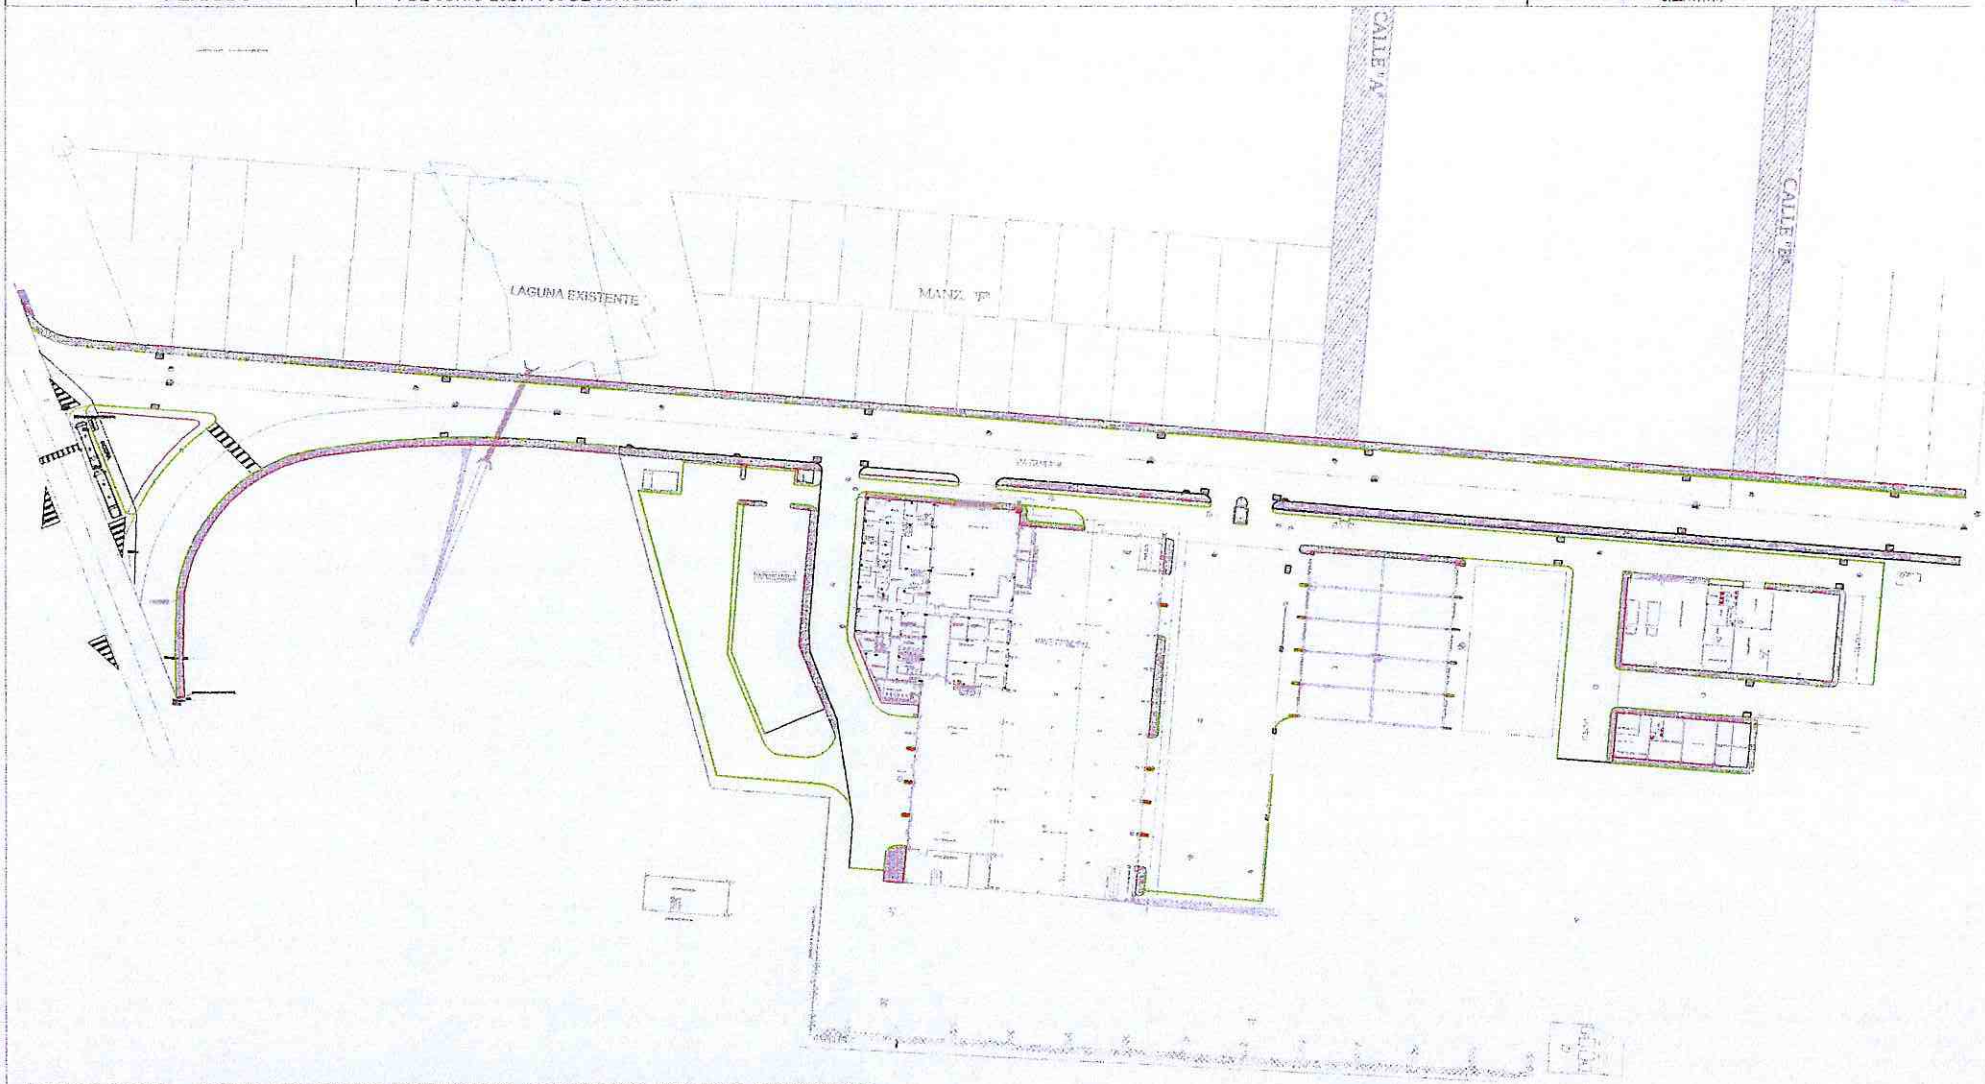


UBICACION - ACERAS EN VIA PRINCIPALY ACERAS EN VIAS INTERNAS

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	6 **ANEXO: 22**
DESCRIPCION	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

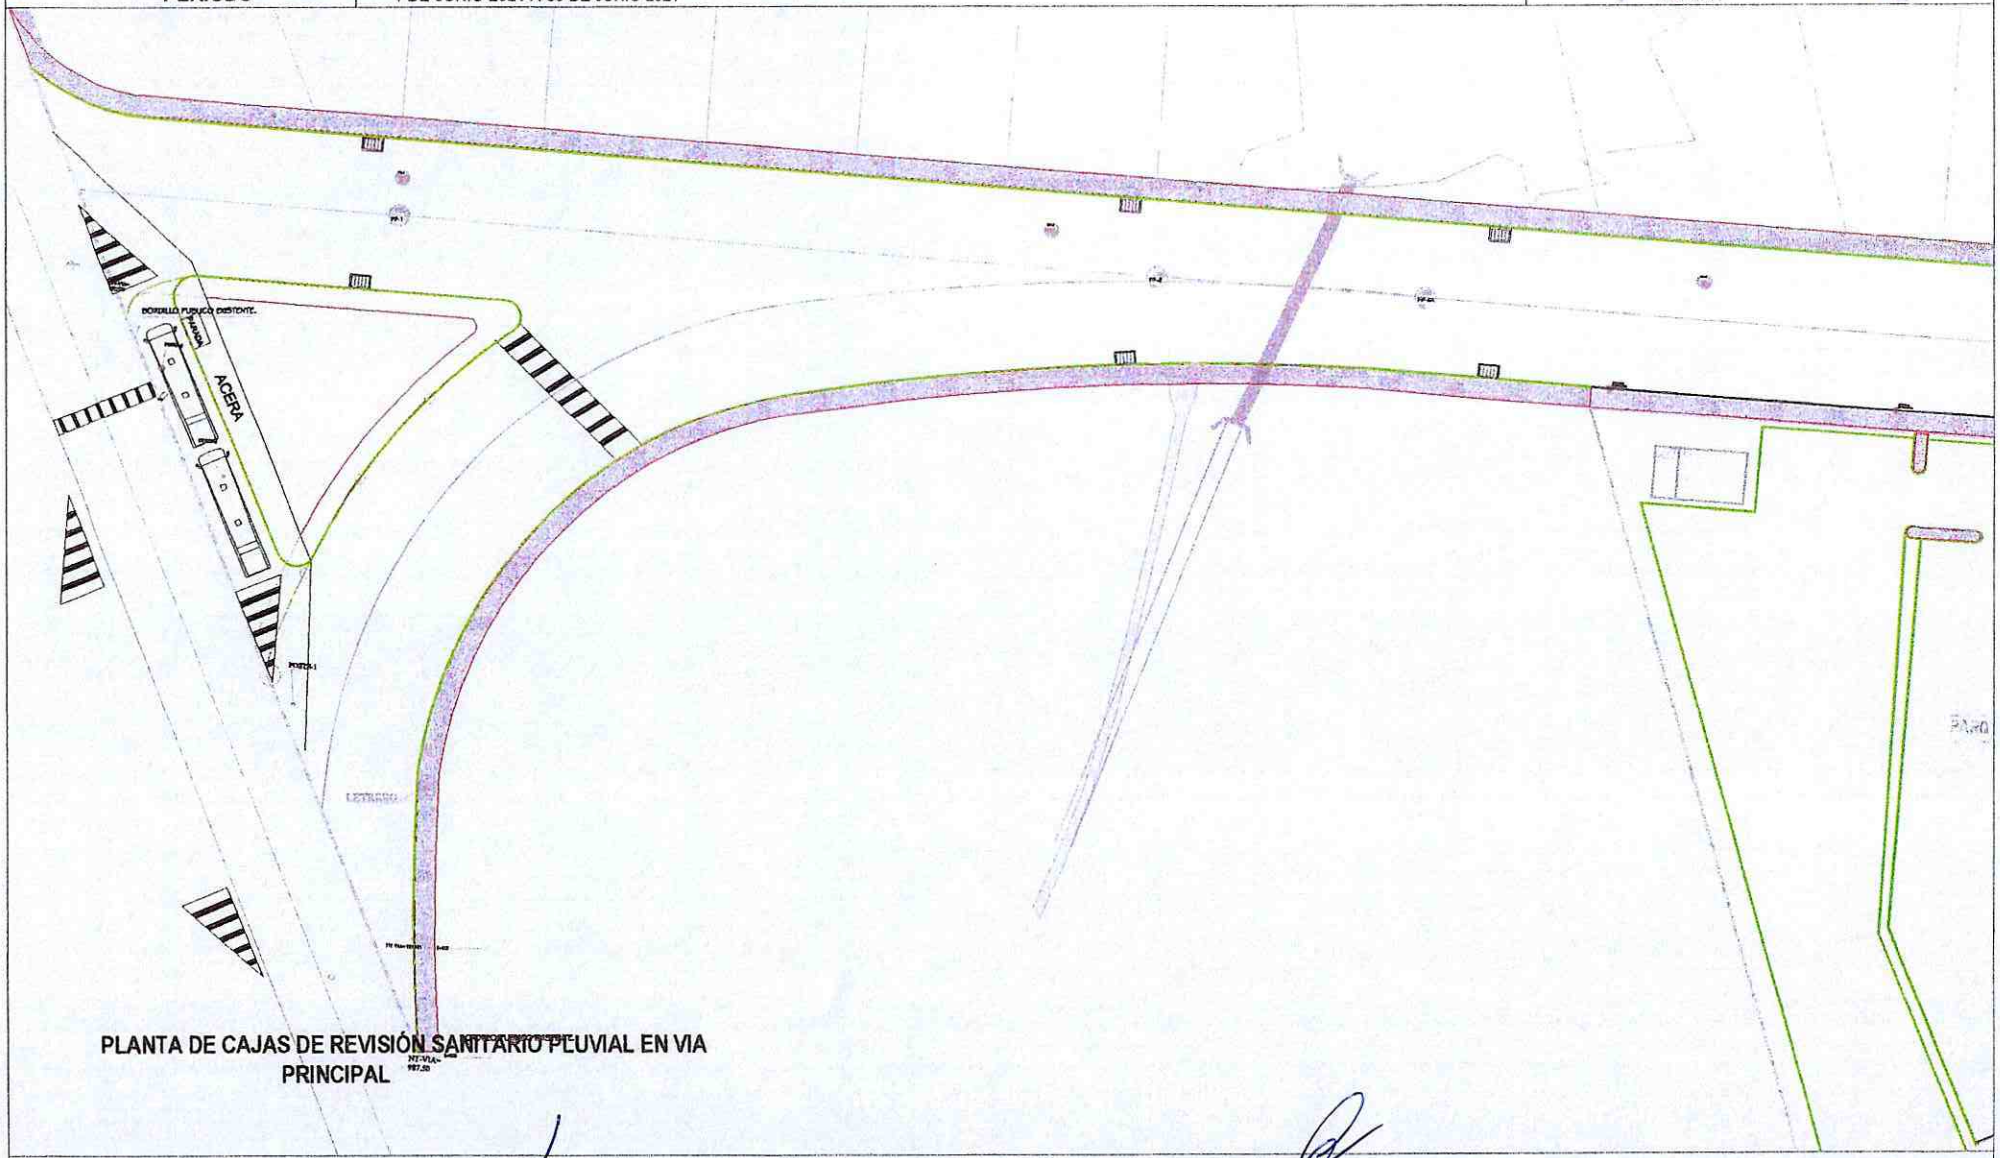


PLANTA DE CAJAS DE REVISIÓN SANITARIO PLUVIAL EN VIA PRINCIPAL

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	6 **ANEXO: 23**
DESCRIPCION	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

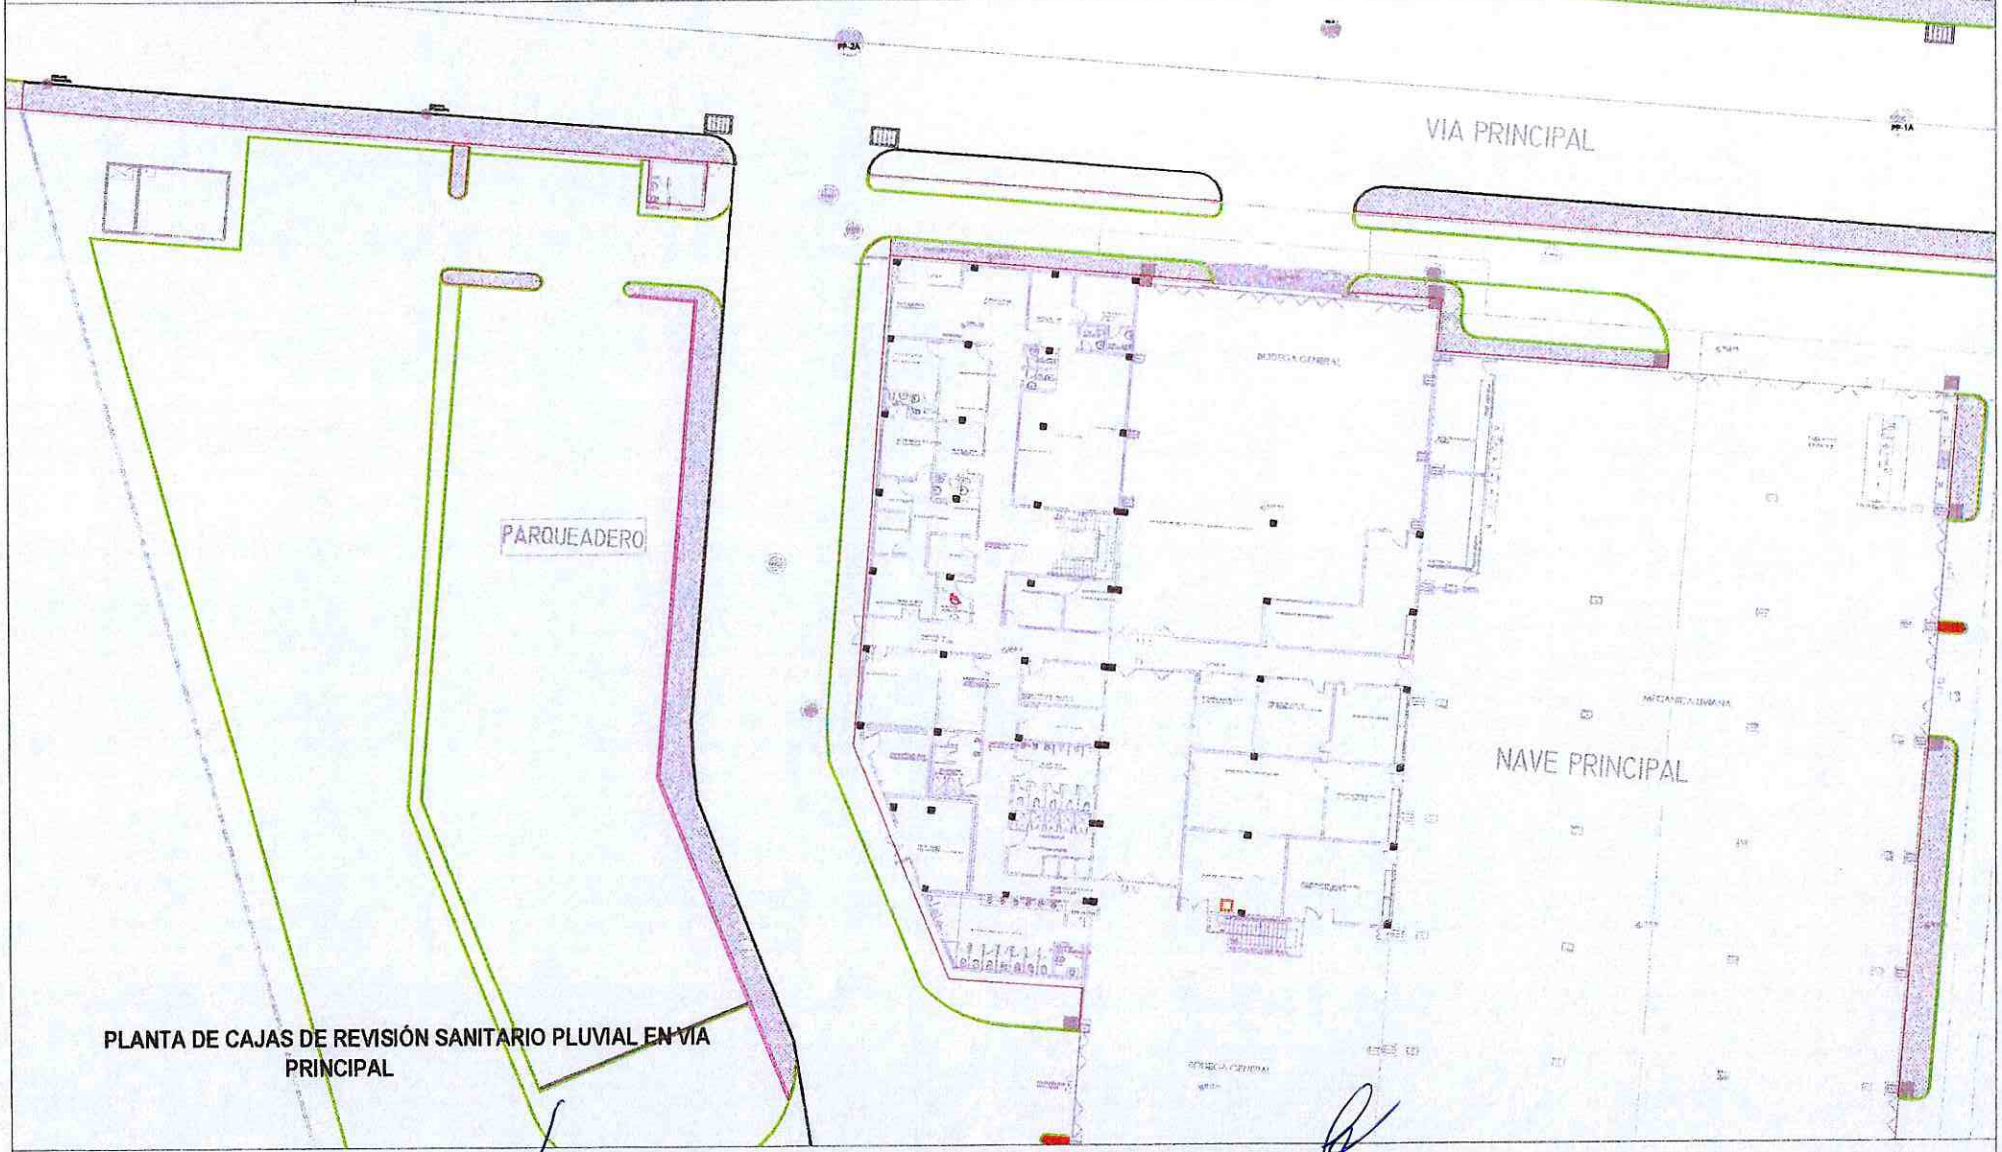


PLANTA DE CAJAS DE REVISIÓN SANITARIO PLUVIAL EN VIA PRINCIPAL

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
	ANEXO: 24
RUBRO	6
DESCRIPCION	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

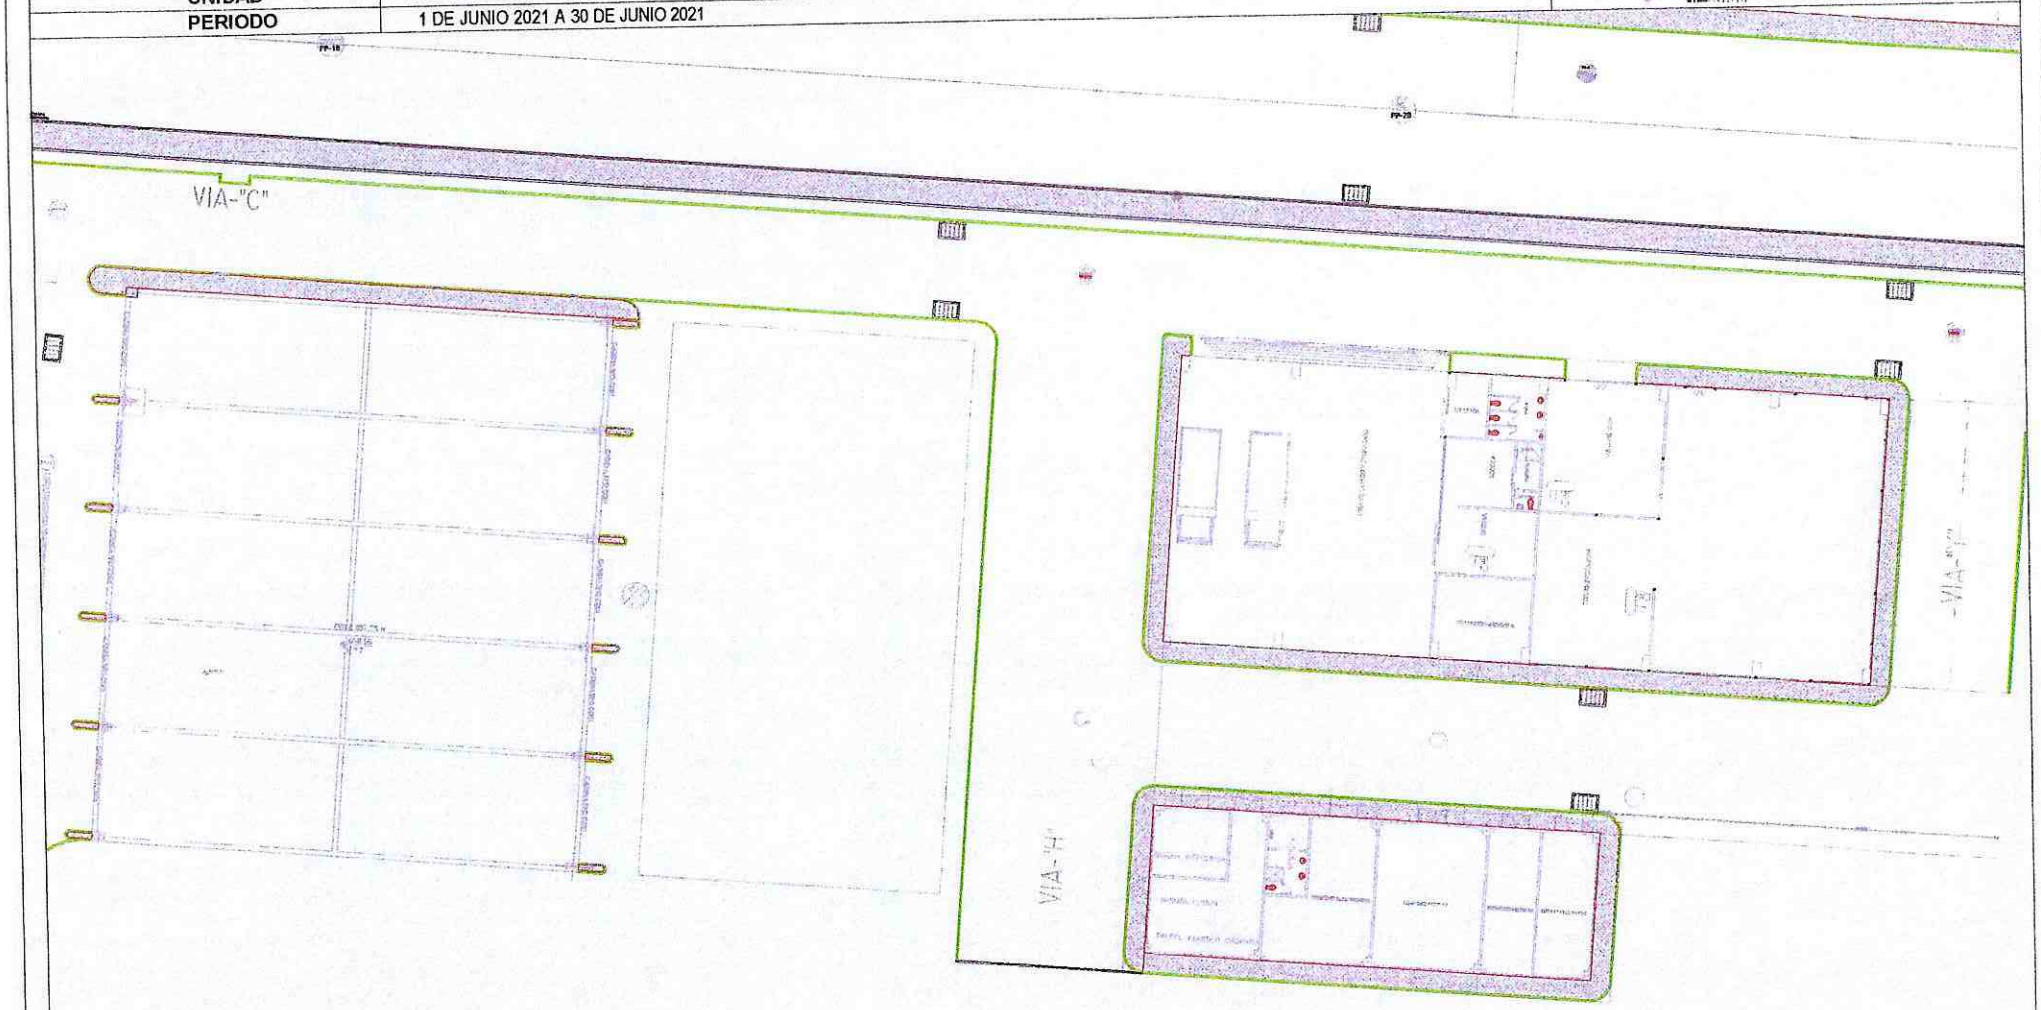


PLANTA DE CAJAS DE REVISIÓN SANITARIO PLUVIAL EN VIA PRINCIPAL

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	6 **ANEXO: 25**
DESCRIPCION	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

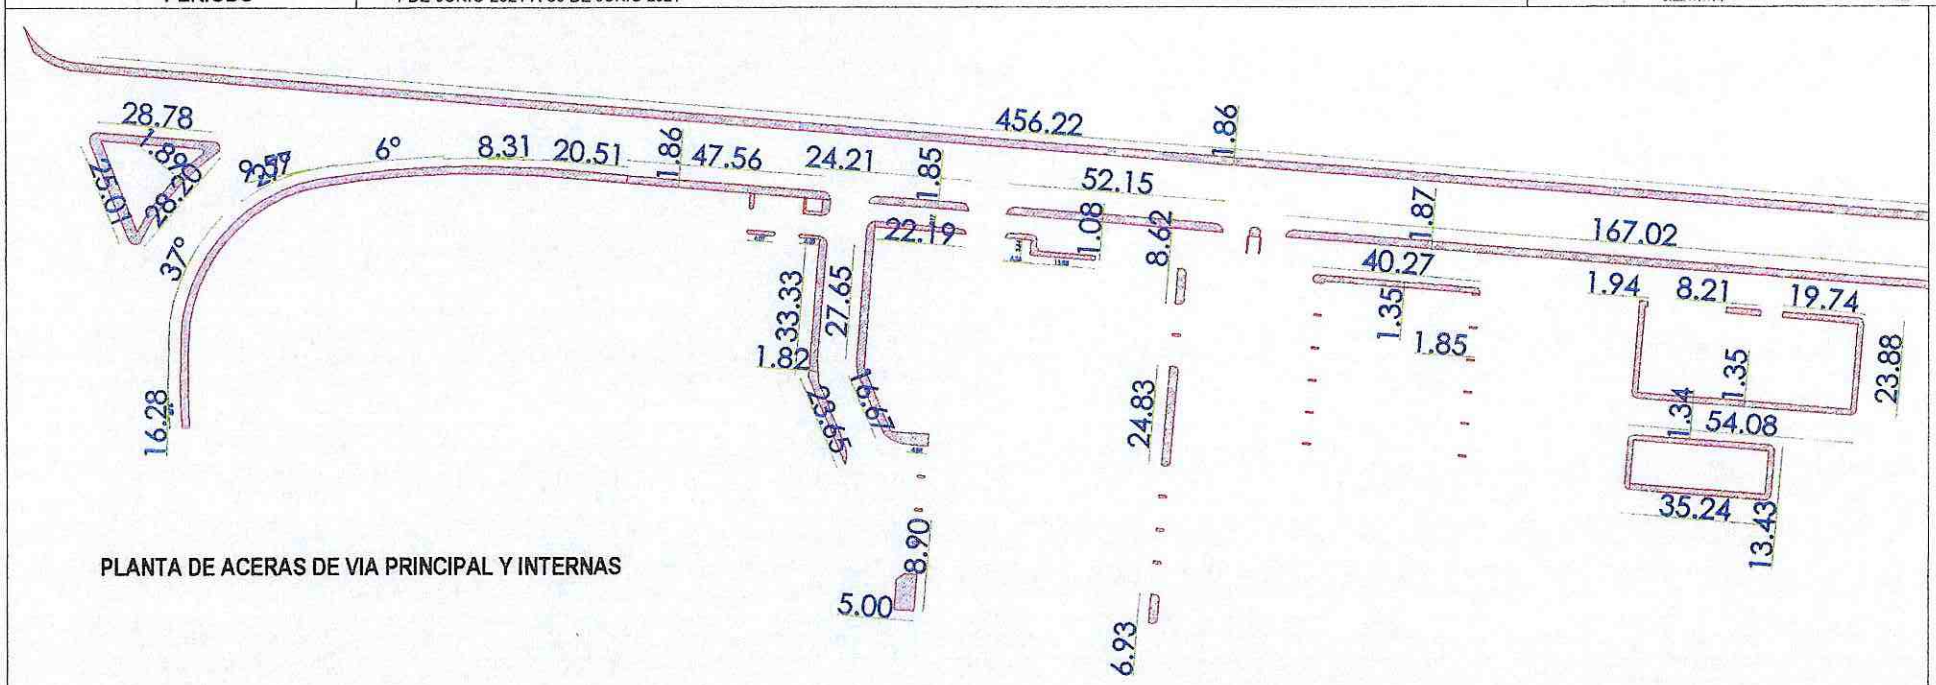


PLANTA DE ACERAS DE VIA PRINCIPAL Y INTERNAS

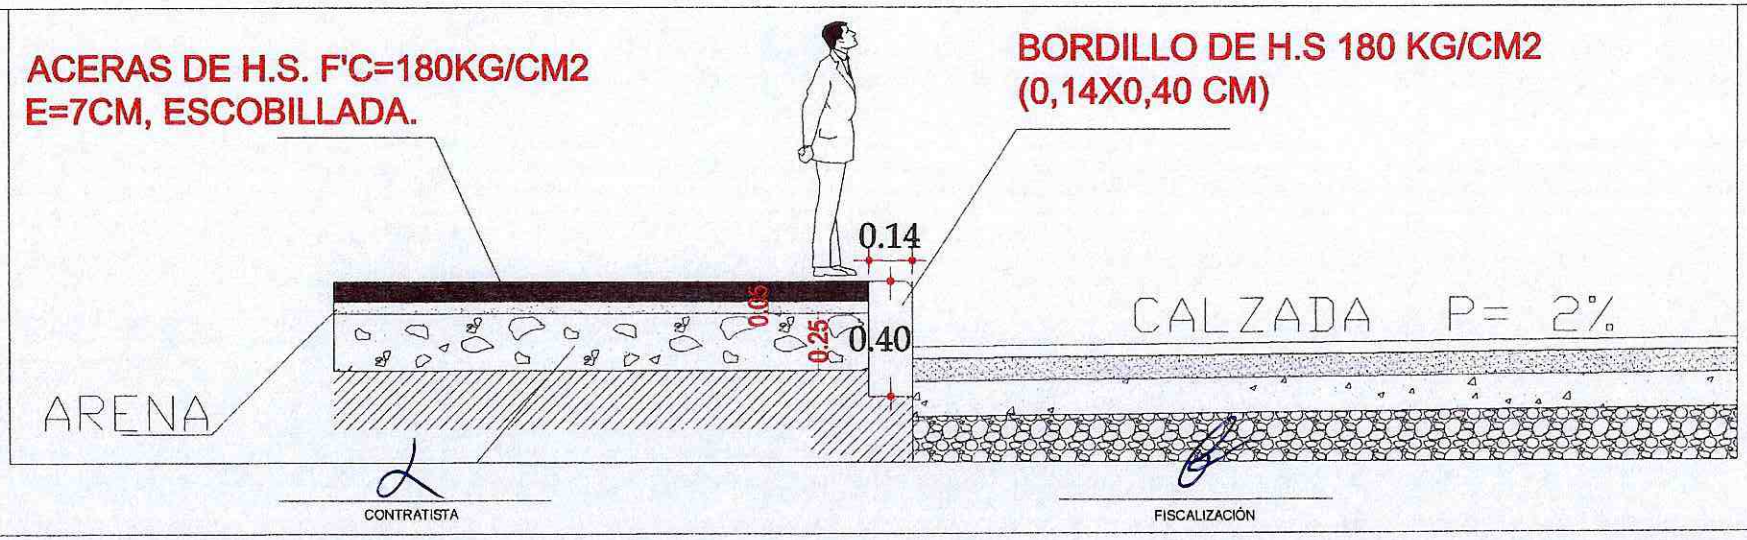

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	6 **ANEXO: 26**
DESCRIPCION	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

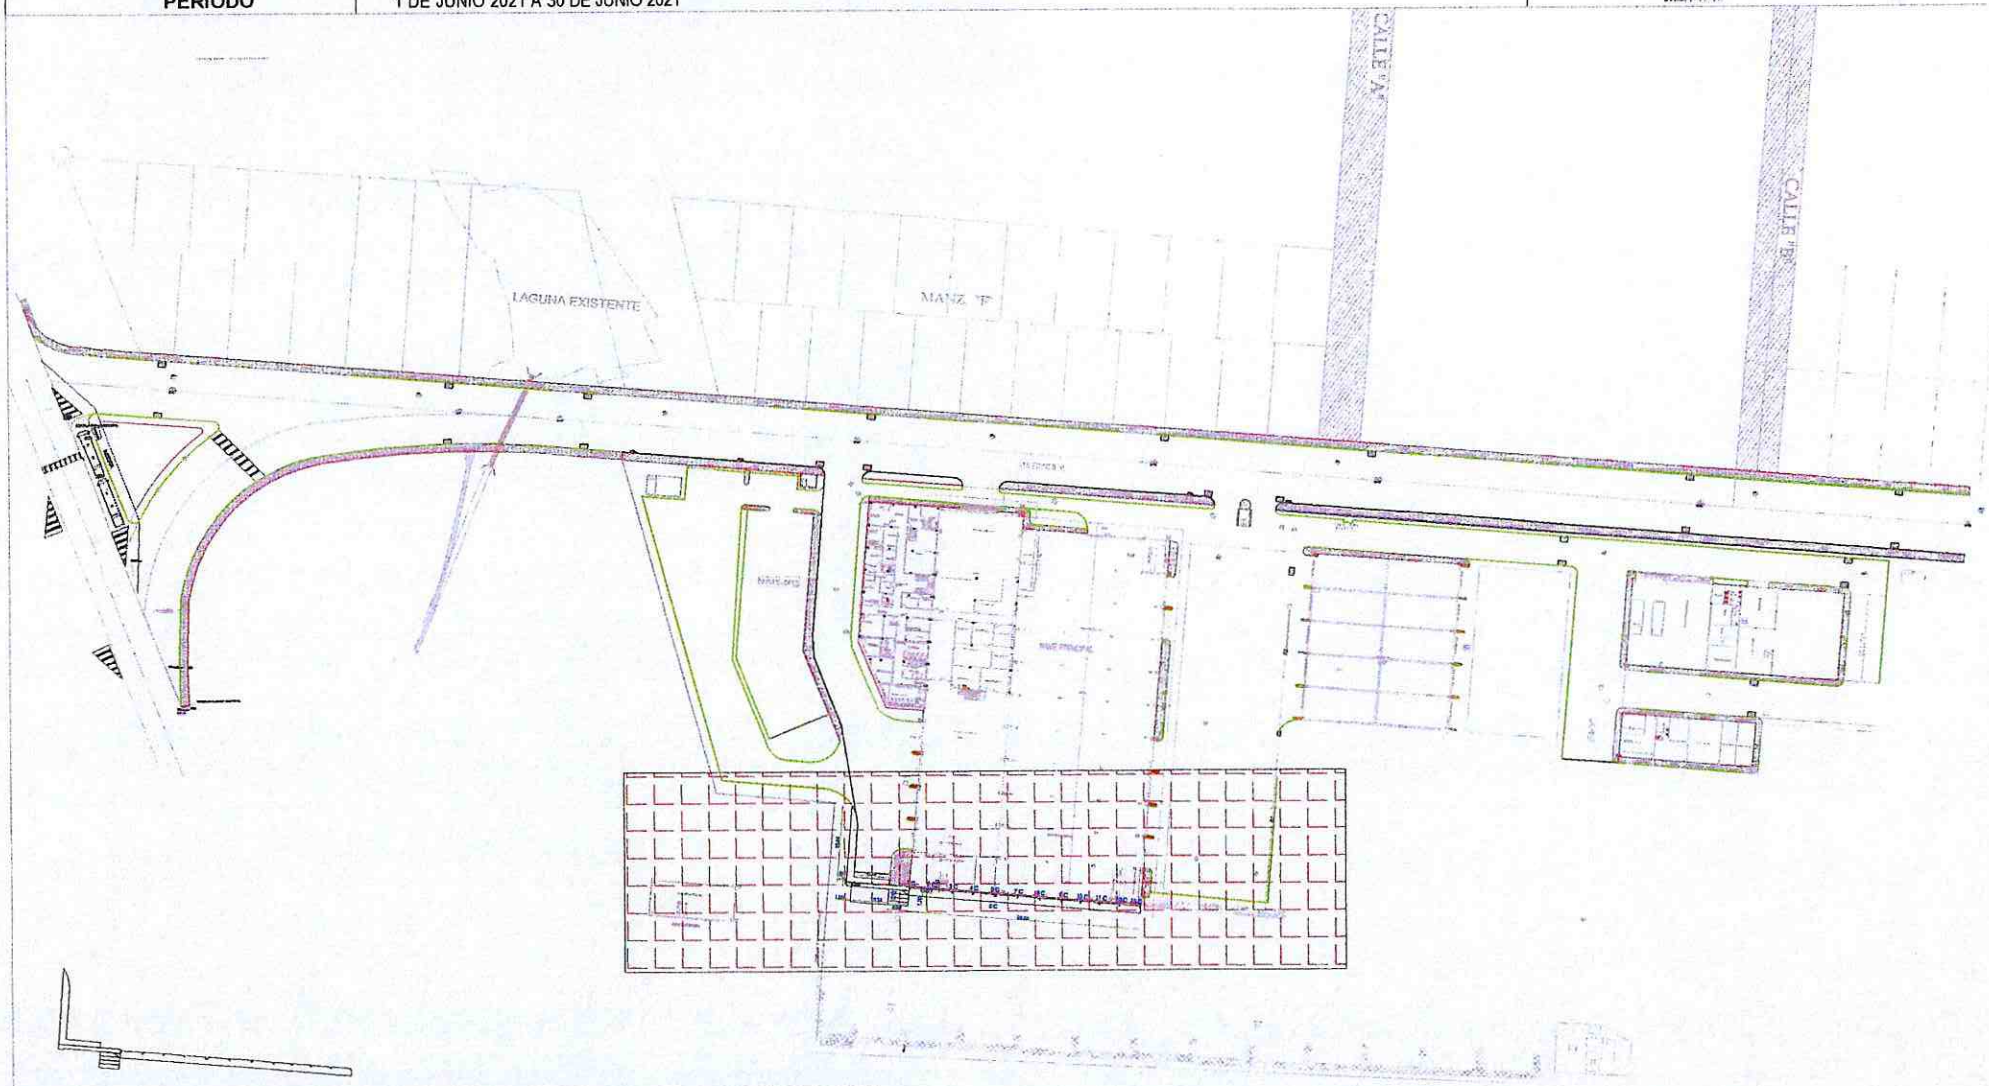


UBICACION - ACERAS EN VIA PRINCIPALY ACERAS EN VIAS INTERNAS

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	6 **ANEXO: 27**
DESCRIPCION	mATERIAL PETREO DE mEJORAmIENTO(mINADA , CARGADA Y .REGADA)
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

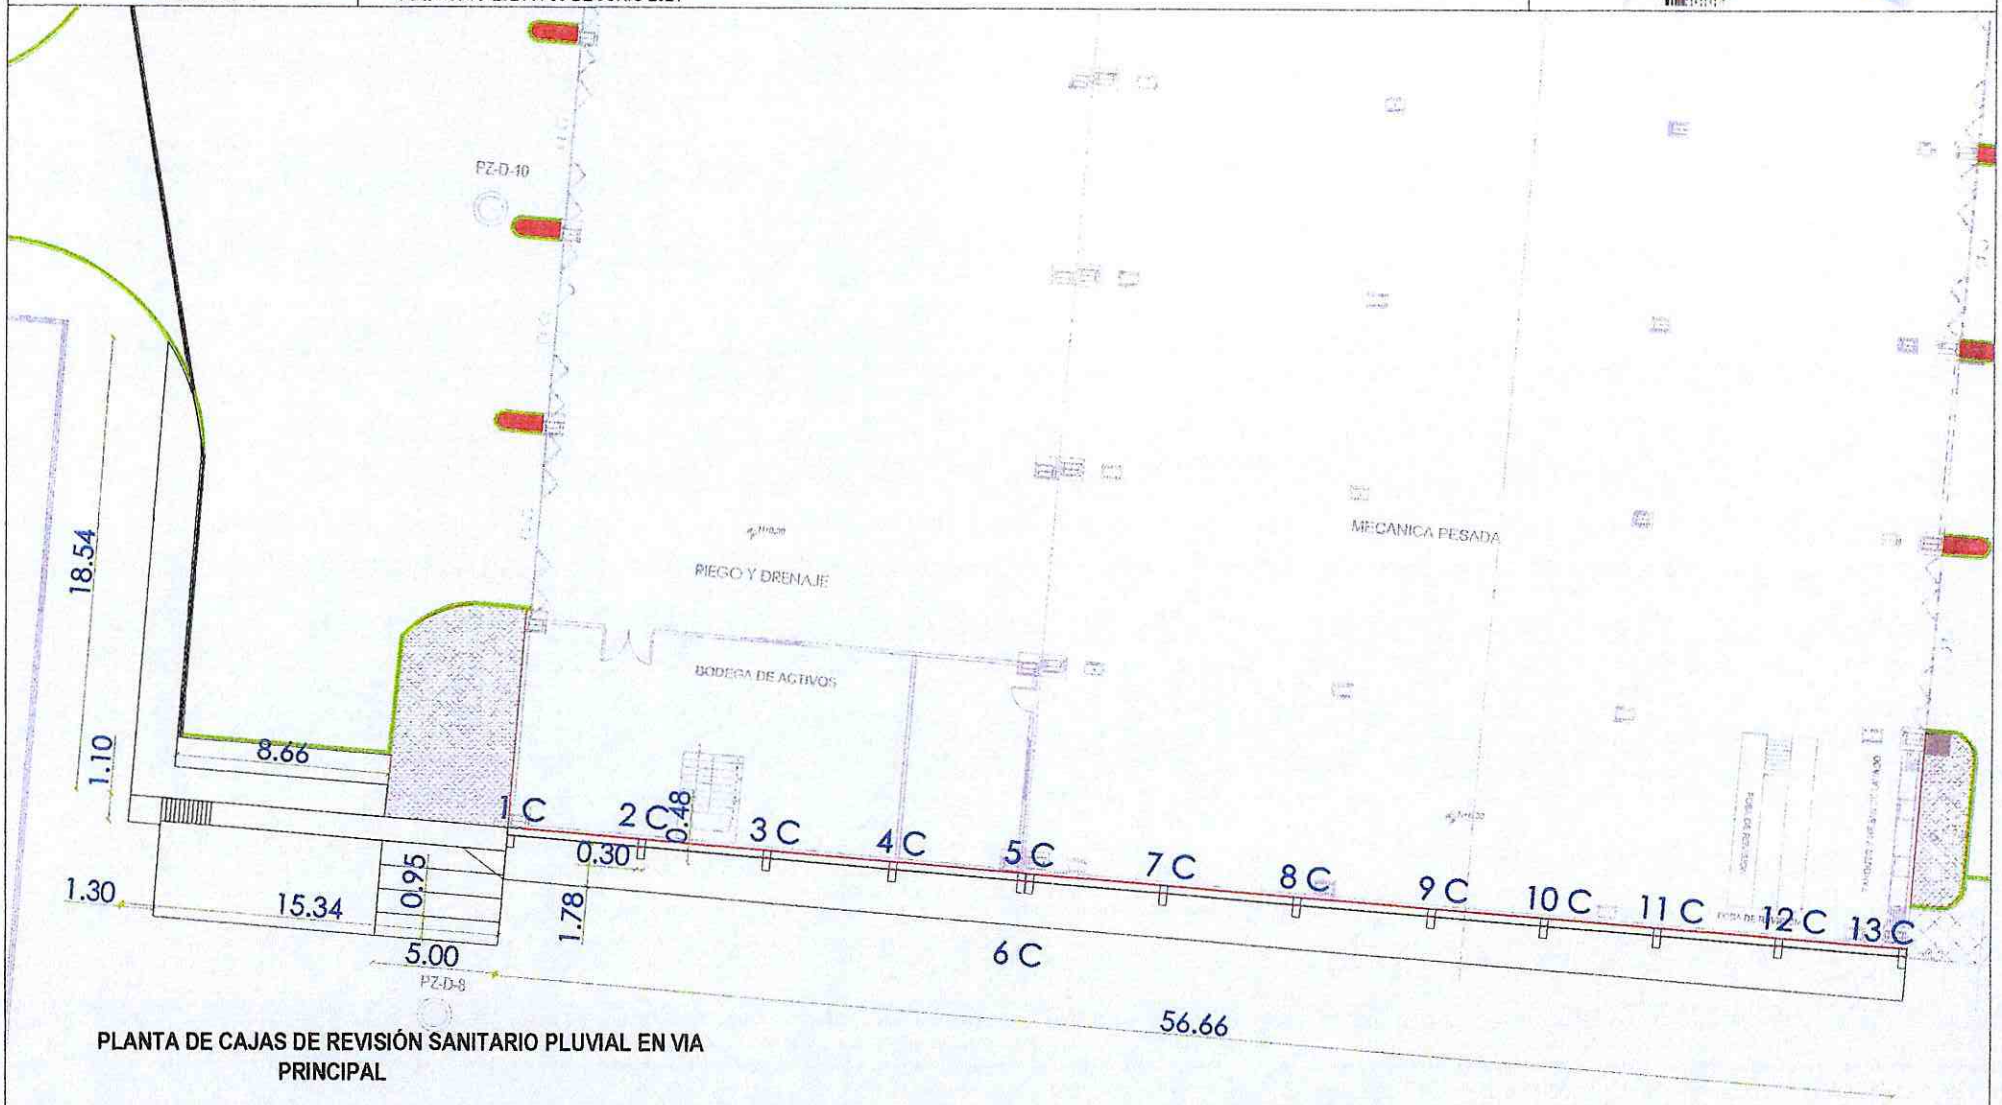

PLANTA DE CAJAS DE REVISIÓN SANITARIO PLUVIAL EN VIA PRINCIPAL

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO " CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

RUBRO N° 7 ANEXO 1
DESCRIPCIÓN: mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3
UNIDAD: m3
PERIODO: 01-jun 30-jun

mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3

VOLUMEN DE RELLENO

RELLENO BASE 3 DE LA VIA Y ACERA DE LA PARADA DE BUS 1

ABCSISAS	AREA PARCIAL	AREA MEDIA	DISTANCIA	VOLUMEN PARCIAL	VOLUMEN ACUMULADO
0+000	8,33				
		8,26	10,00	0,00	0,00
0+010	8,19				
		8,19	10,00	8,99	8,99
0+020	8,19				
		8,19	10,00	9,00	17,99
0+030	8,19				
		9,33	6,75	9,00	26,99
0+037	10,47				
		5,24	-36,75	6,93	**33,92**

VOLUMEN DE RELLENO

RELLENO DE BASE 3 DE LA VIA DE LA PARADA DE BUS 2

ABCSISAS	AREA PARCIAL	AREA MEDIA	DISTANCIA	VOLUMEN PARCIAL	VOLUMEN ACUMULADO
0+000	2,72				
		2,91	9,98	0,00	0,00
0+010	3,09				
		3,13	10,00	6,83	6,83
0+020	3,16				
		3,23	10,00	8,94	15,77
0+030	3,30				
		3,42	6,68	8,96	24,73
0+037	3,54				
		1,77	-36,68	4,49	**29,22**

RESUMEN

RELLENO BASE 3 DE LA VIA Y ACERA DE LA PARADA DE BUS 1	33,92
RELLENO DE BASE 3 DE LA VIA DE LA PARADA DE BUS 2	29,22
RELLENO DE ACERA INTERNAS	139,41
TOTAL	202,55

RESUMEN DE PLANILLA DE INCREMENTOS

DESCRIPCION	CONTRATADO	ANTERIOR	ACTUAL	INCR. ANT.	INCR. ACT.	UNIDAD
mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3	2.589,98	3.619,96			202,55	m3

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO " CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

RUBRO N° 7 ANEXO 2

DESCRIPCIÓN: mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3

UNIDAD: m3

PERIODO: 01-jun 30-jun


ACERA EN EL PROYECTO						
RELLENO DE ACERA INTERNAS						
DESCRIPCION	LARGO (X)	AREA (M2)	ANCHO (Y)	No.		TOTAL
ACERAS INTERNAS		796,24		1		796,24
ACERA EXTERNAS		2145,39		1		2145,39
DESCUENTO ISLA		-253,27		1		-253,27
DESCUENTO TAPAS	0,6		0,6	-162		-58,32
DESCUENTO TAPAS	0,9		0,9	-17		-13,77
SEGUNDA PARTE						
ACERAS INTERNAS		173,84		1		173,84
DESCUENTO TAPAS	0,48		0,3	-13		-1,87
SUBTOTAL						2788,24
ESPESOR DE RELLENO DE MATERIAL DE BASE 3 EN ACERAS INTERNAS Y EXTERNAS						0,05
TOTAL						139,41

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO D[redacted]A
PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	7 **ANEXO: 1**
DESCRIPCION	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

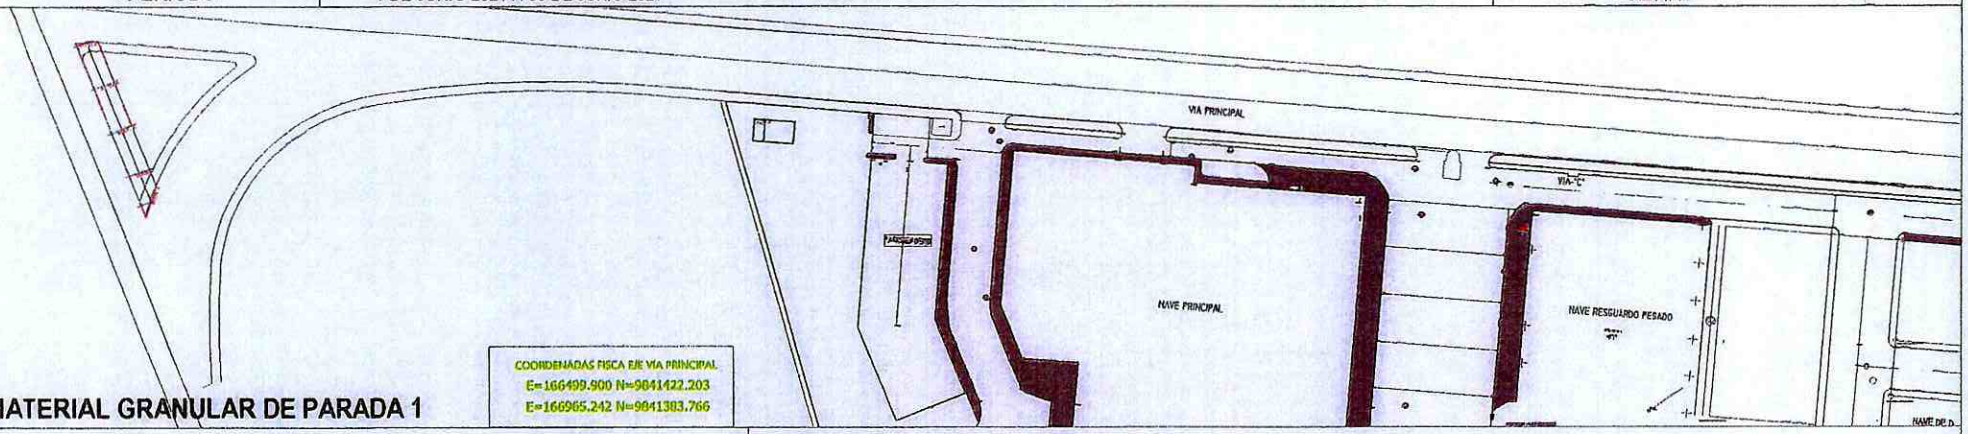

MATERIAL GRANULAR DE PARADA 1

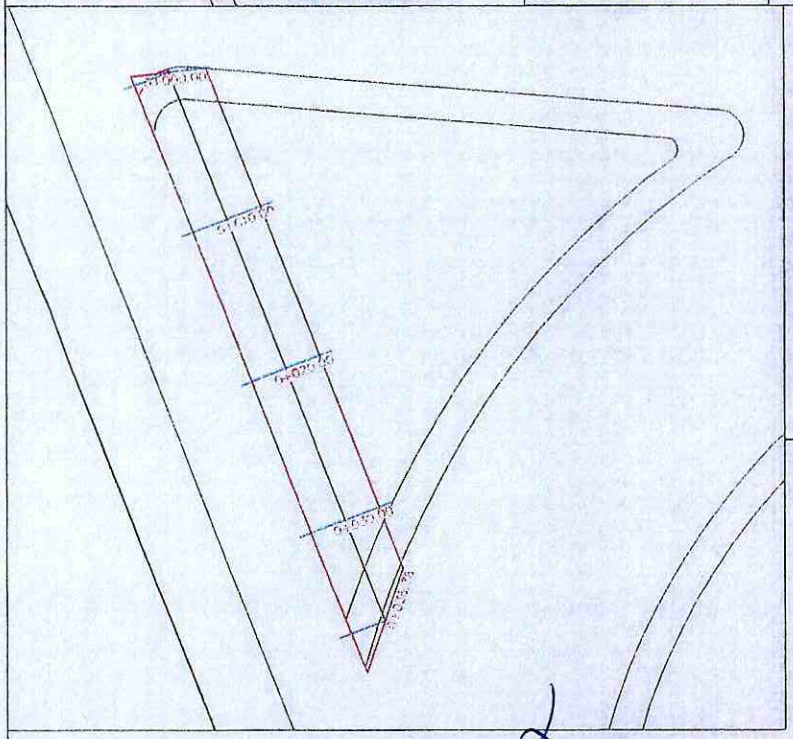

Total Volume Table

Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+000.10	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
0+010.00	0.00	0.90	0.00	8.99	0.00	8.99
0+020.00	0.00	0.90	0.00	9.00	0.00	17.99
0+030.00	0.00	0.90	0.00	9.00	0.00	26.99
0+036.75	0.00	1.15	0.00	6.93	0.00	33.91


CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO D[redacted]A
PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	8 **ANEXO: 2**
DESCRIPCION	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30.DE JUNIO 2021

PERFIL LONGITUDINAL VIA PRINCIPAL

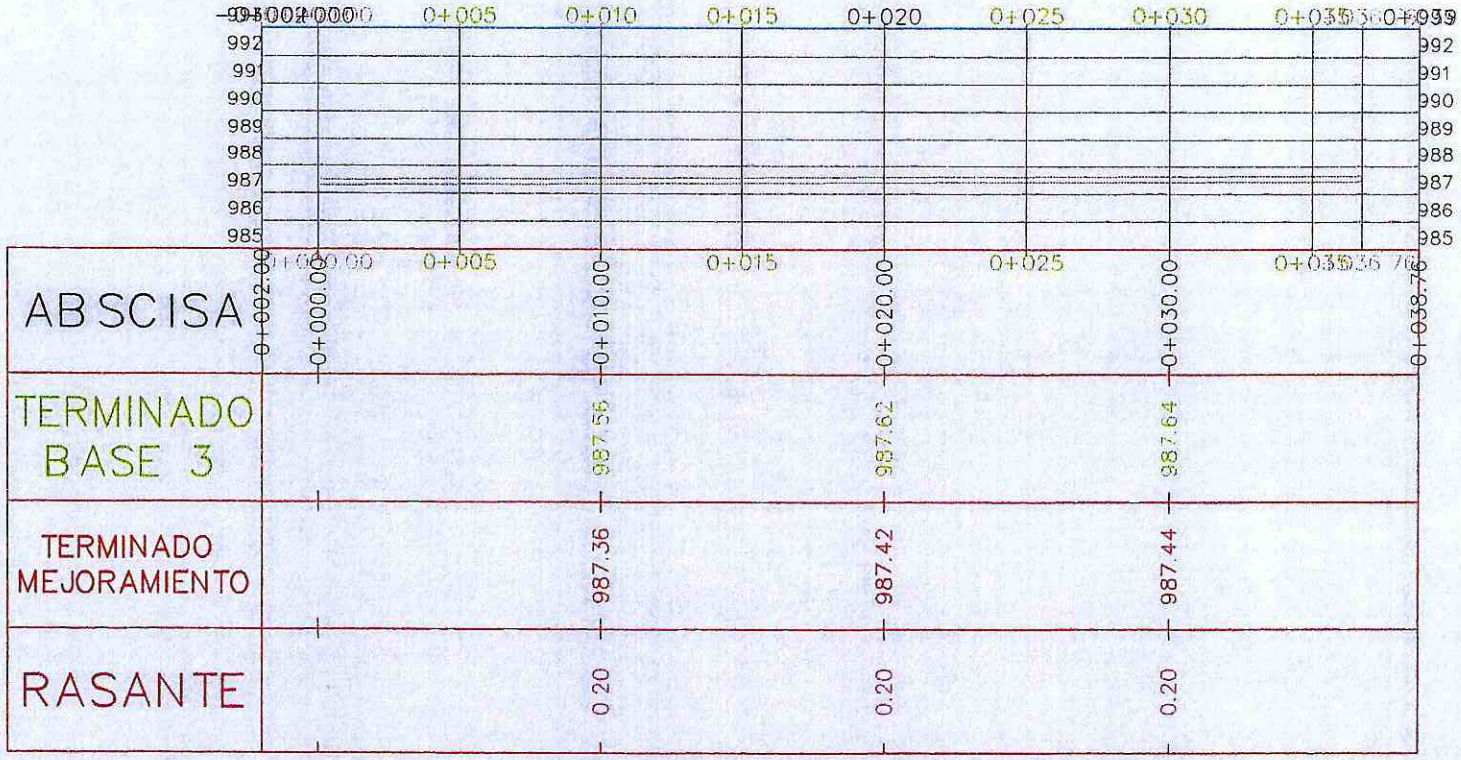

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO D[redacted]A
PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	8
DESCRIPCION	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

ANEXO: 3

0+000.10


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.92
Area	0.00
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	0.00

0+010.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.90
Area	0.00
Volumen en Corte	8.99
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	8.99
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	8.99

0+020.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.90
Area	0.00
Volumen en Corte	9.00
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	17.99
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	17.99

0+030.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.90
Area	0.00
Volumen en Corte	9.00
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	26.99
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	26.99

0+036.75

SECCCIONES DE CORTE




ABSCISA	
Area en Corte	1.15
Area	0.00
Volumen en Corte	6.93
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	33.91
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	33.91


CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	7 **ANEXO: 4**
DESCRIPCION	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

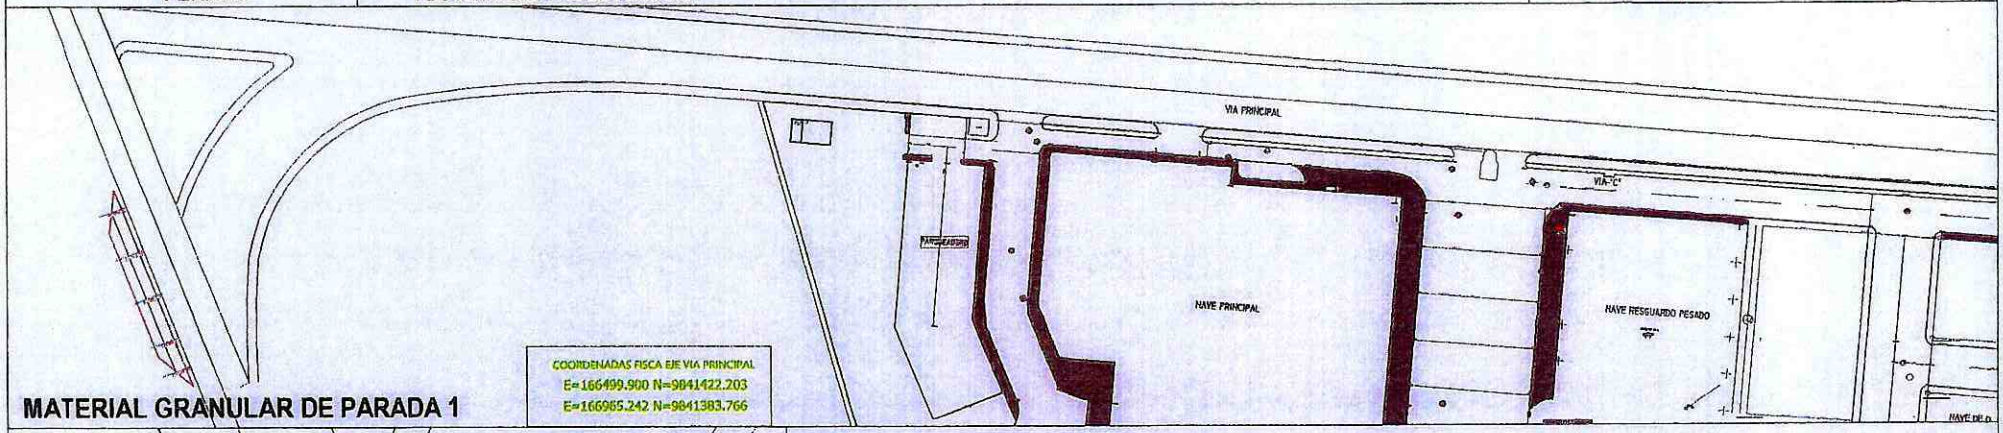

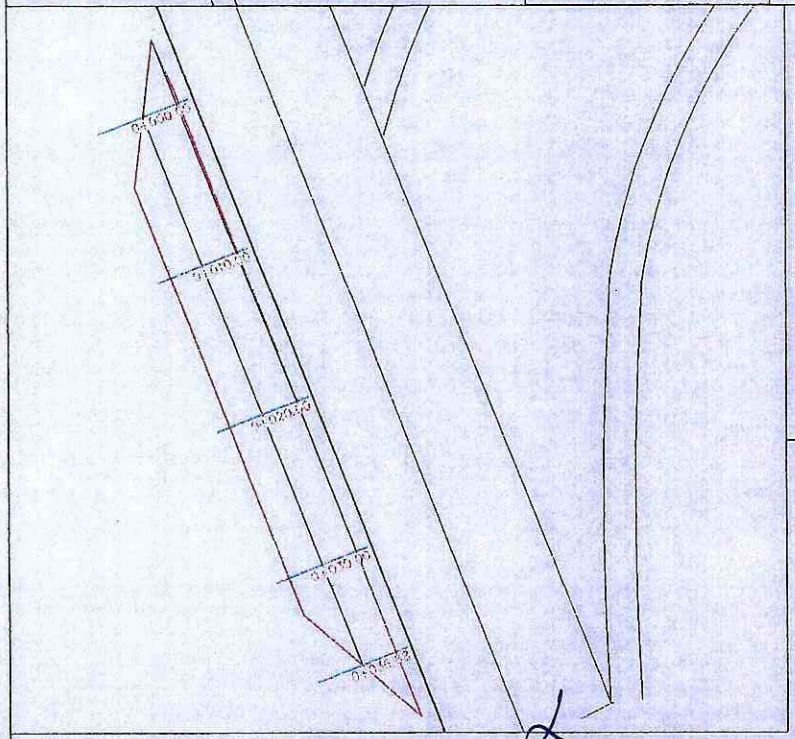

Total Volume Table

Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+000.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
0+010.00	0.00	0.89	0.00	6.83	0.00	6.83
0+020.00	0.00	0.89	0.00	8.94	0.00	15.77
0+030.00	0.00	0.90	0.00	8.96	0.00	24.73
0+036.68	0.00	0.45	0.00	4.49	0.00	29.22


CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE
PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	8 **ANEXO:** 5
DESCRIPCION	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

PERFIL LONGITUDINAL VIA PRINCIPAL

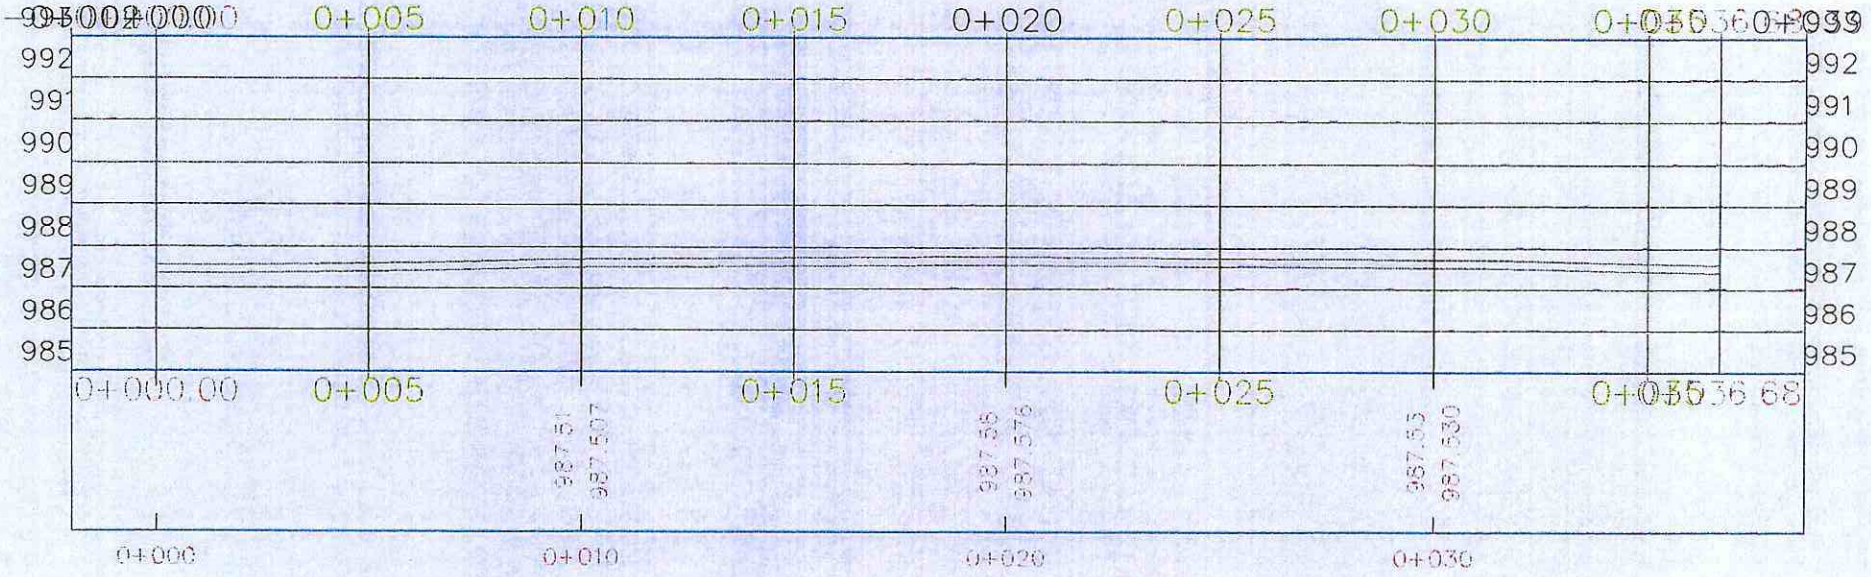


CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO D[redacted]A
PROVINCIA DEL PASTAZA


PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	8 **ANEXO: 6**
DESCRIPCION	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

0+000.00
SECCCIONES DE CORTE




ABSCISA	
Area en Corte	0.47
Area	0.00
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	0.00

0+030.00
SECCCIONES DE CORTE




ABSCISA	
Area en Corte	0.90
Area	0.00
Volumen en Corte	8.96
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	24.73
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	24.73

0+010.00
SECCCIONES DE CORTE




ABSCISA	
Area en Corte	0.89
Area	0.00
Volumen en Corte	6.83
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	6.83
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	6.83

0+036.68
SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.45
Area	0.00
Volumen en Corte	4.49
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	29.22
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	29.22

0+020.00
SECCCIONES DE CORTE




ABSCISA	
Area en Corte	0.89
Area	0.00
Volumen en Corte	8.94
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	15.77
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	15.77

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	7 **ANEXO: 7**
DESCRIPCION	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

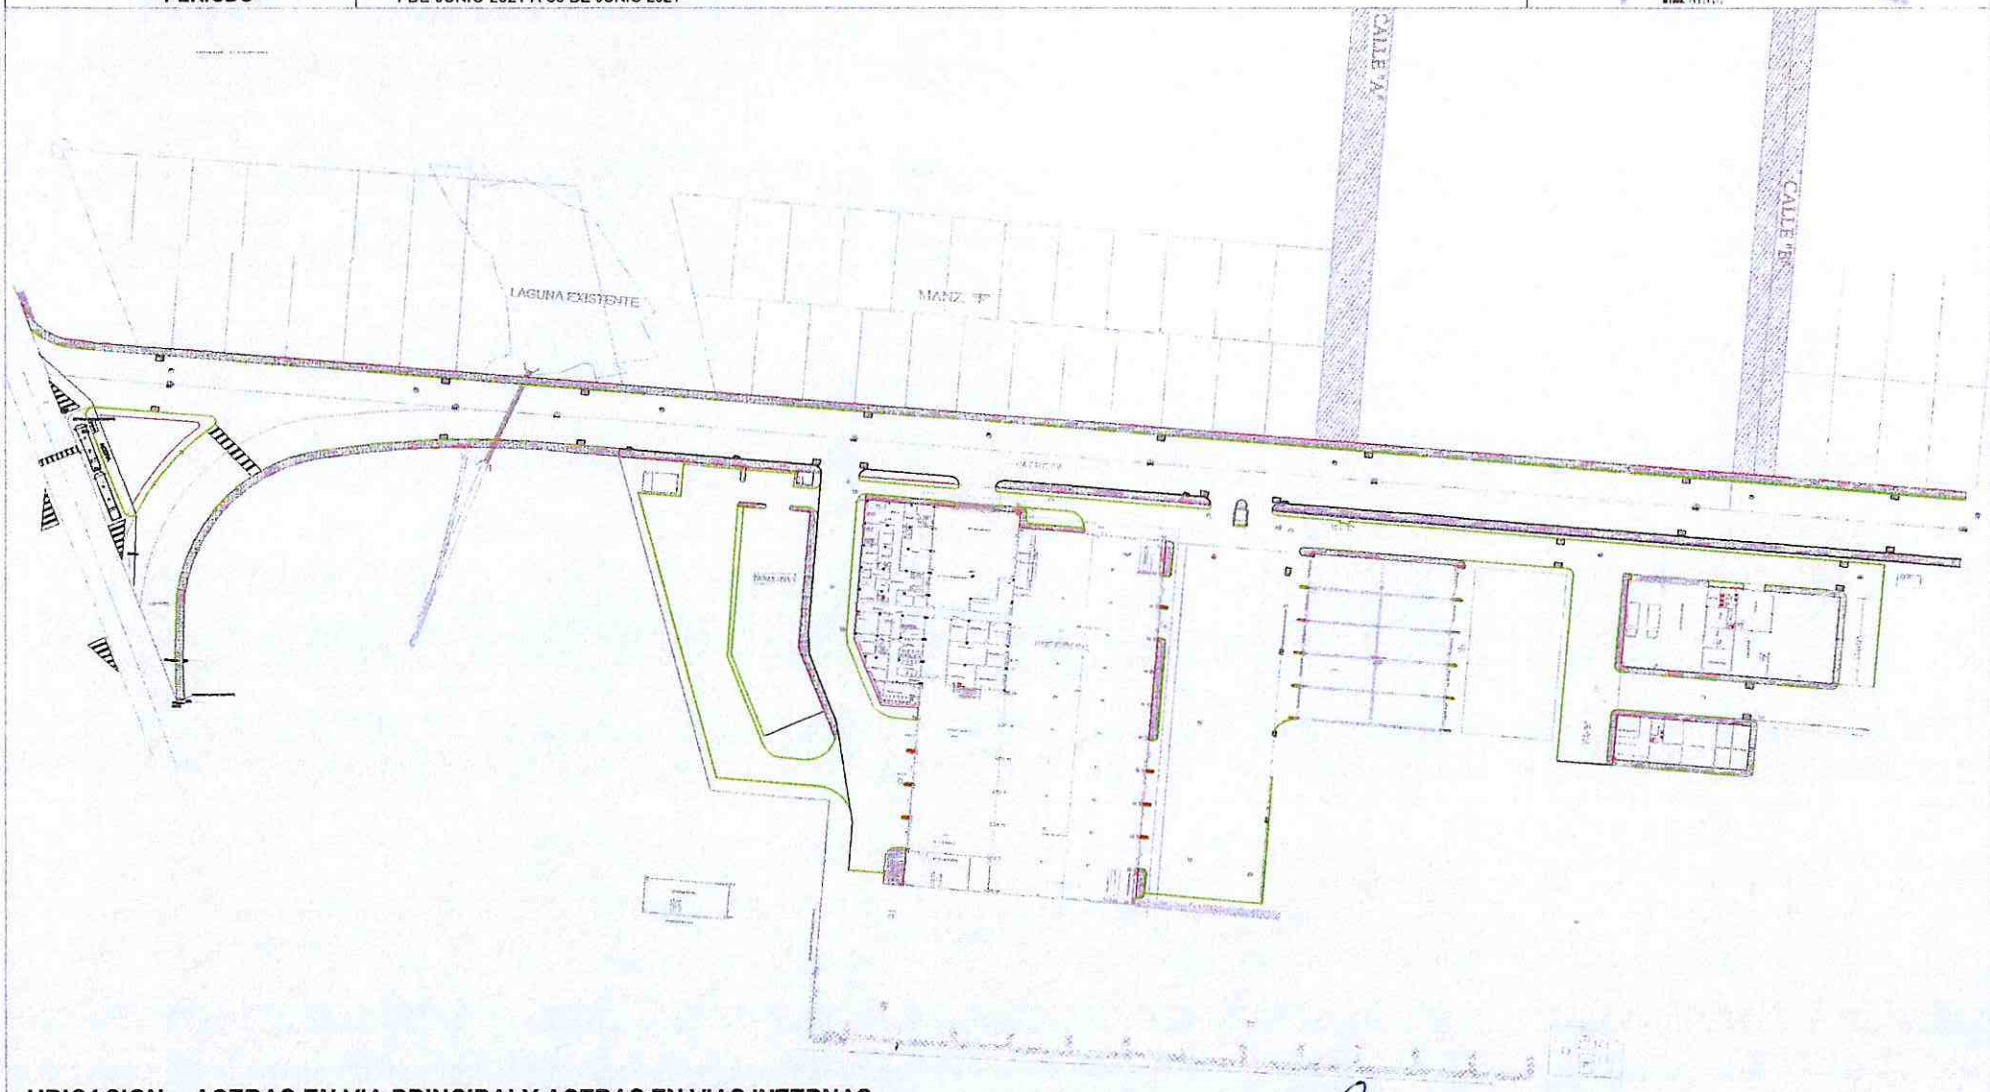

UBICACION - ACERAS EN VIA PRINCIPALY ACERAS EN VIAS INTERNAS

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	7
DESCRIPCION	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

ANEXO: 8



PLANTA DE CAJAS DE REVISIÓN SANITARIO PLUVIAL EN VIA PRINCIPAL


CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	7
DESCRIPCION	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

ANEXO: 9

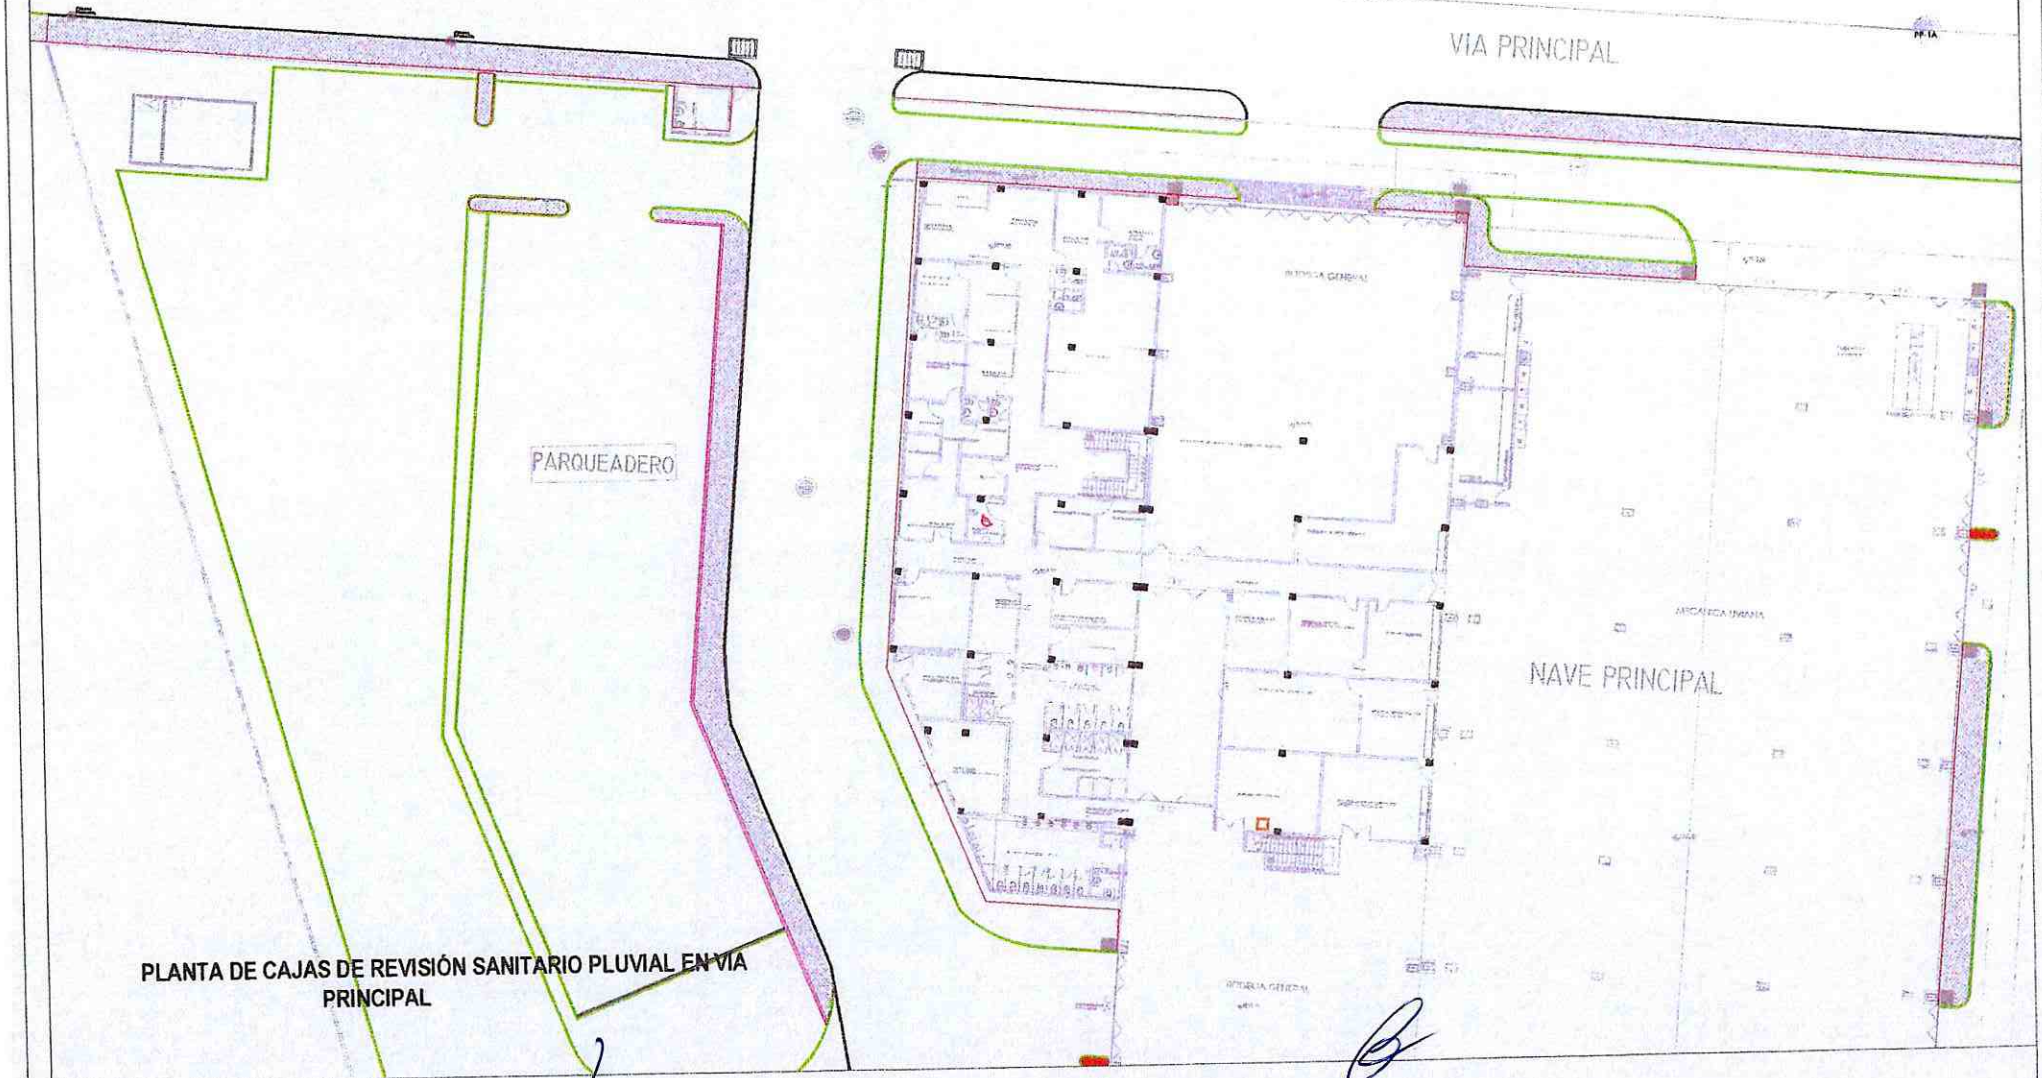


PLANTA DE CAJAS DE REVISIÓN SANITARIO PLUVIAL EN VIA PRINCIPAL

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	7 **ANEXO: 10**
DESCRIPCION	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

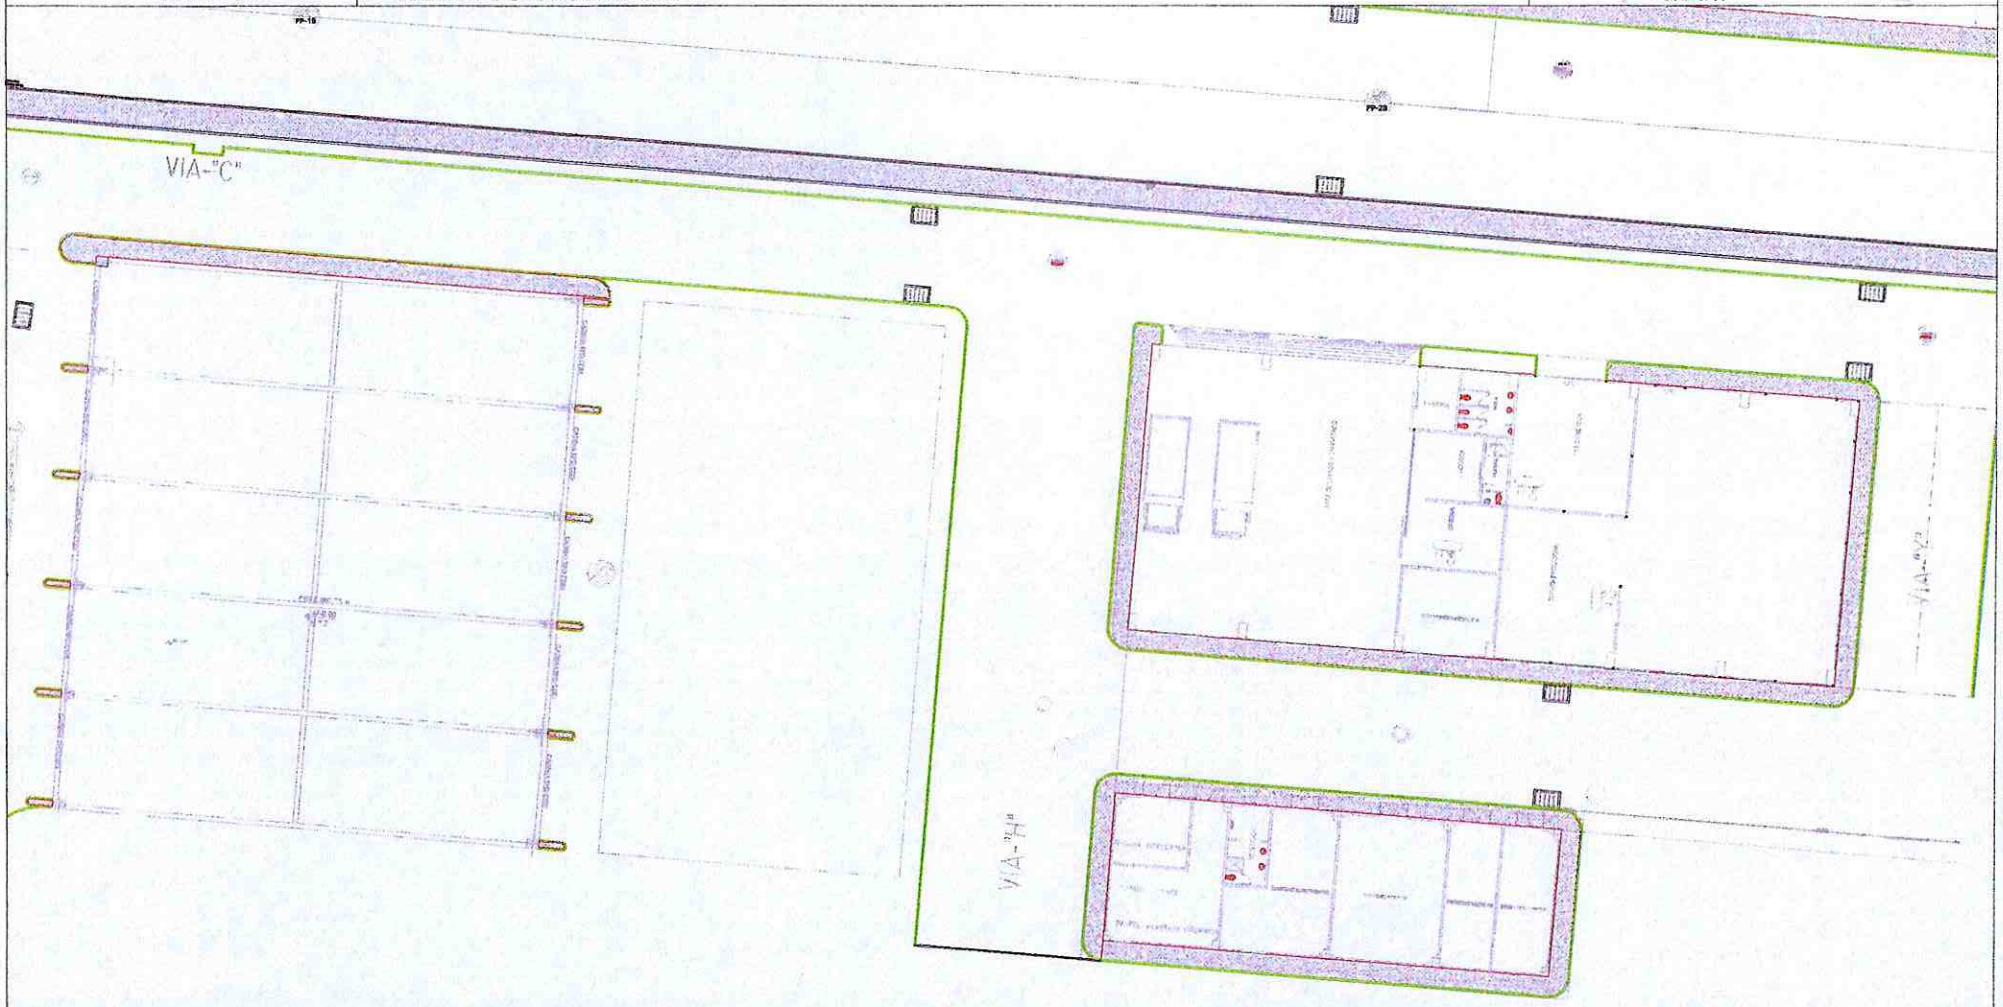


PLANTA DE CAJAS DE REVISIÓN SANITARIO PLUVIAL EN VIA PRINCIPAL

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	**ANEXO: 11**
DESCRIPCION	
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

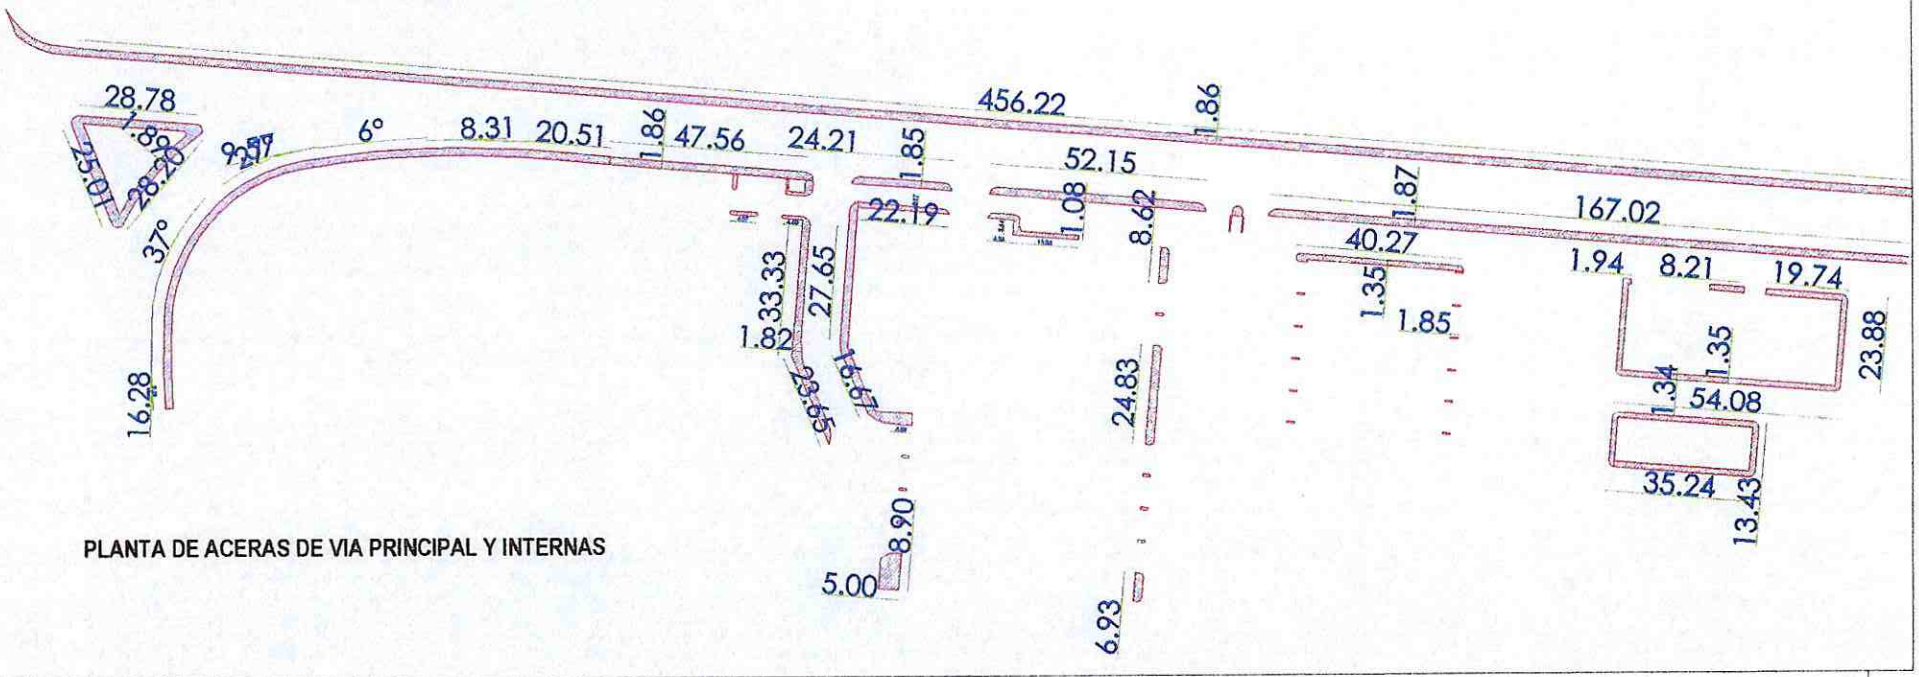


PLANTA DE ACERAS DE VIA PRINCIPAL Y INTERNAS

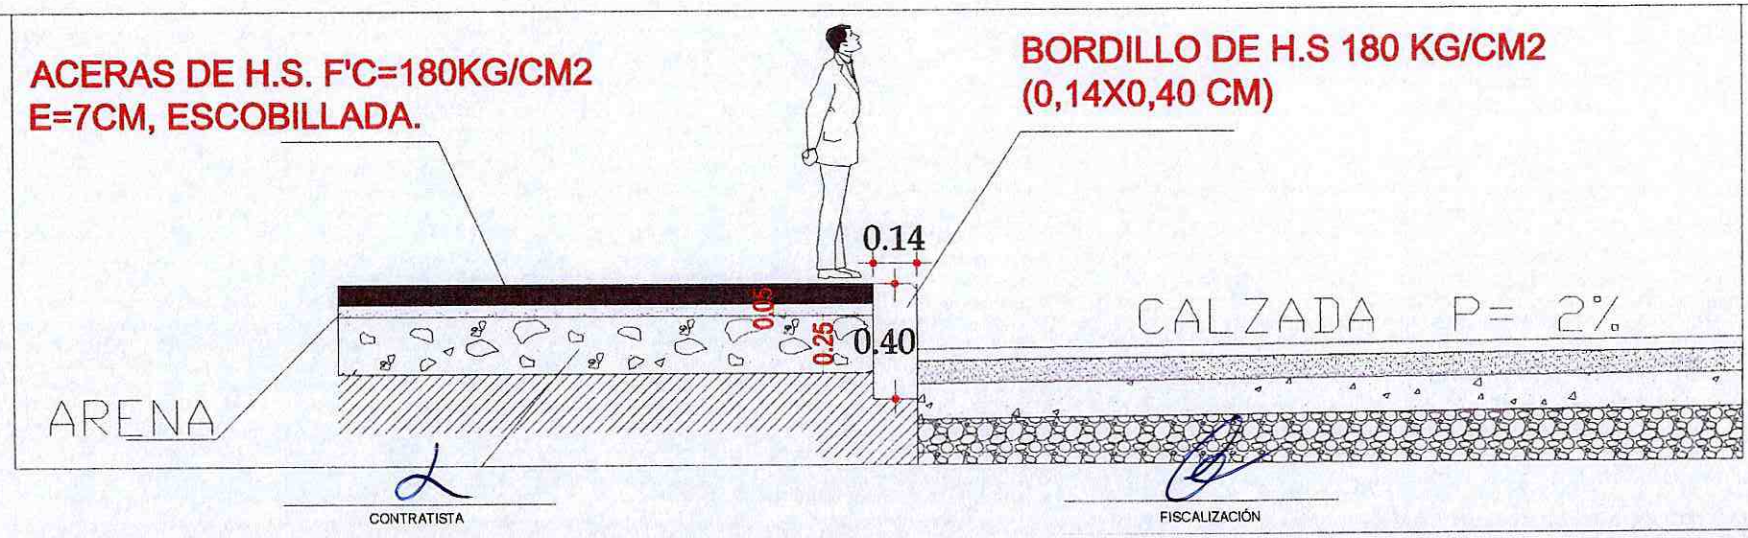

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	7 **ANEXO: 12**
DESCRIPCION	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

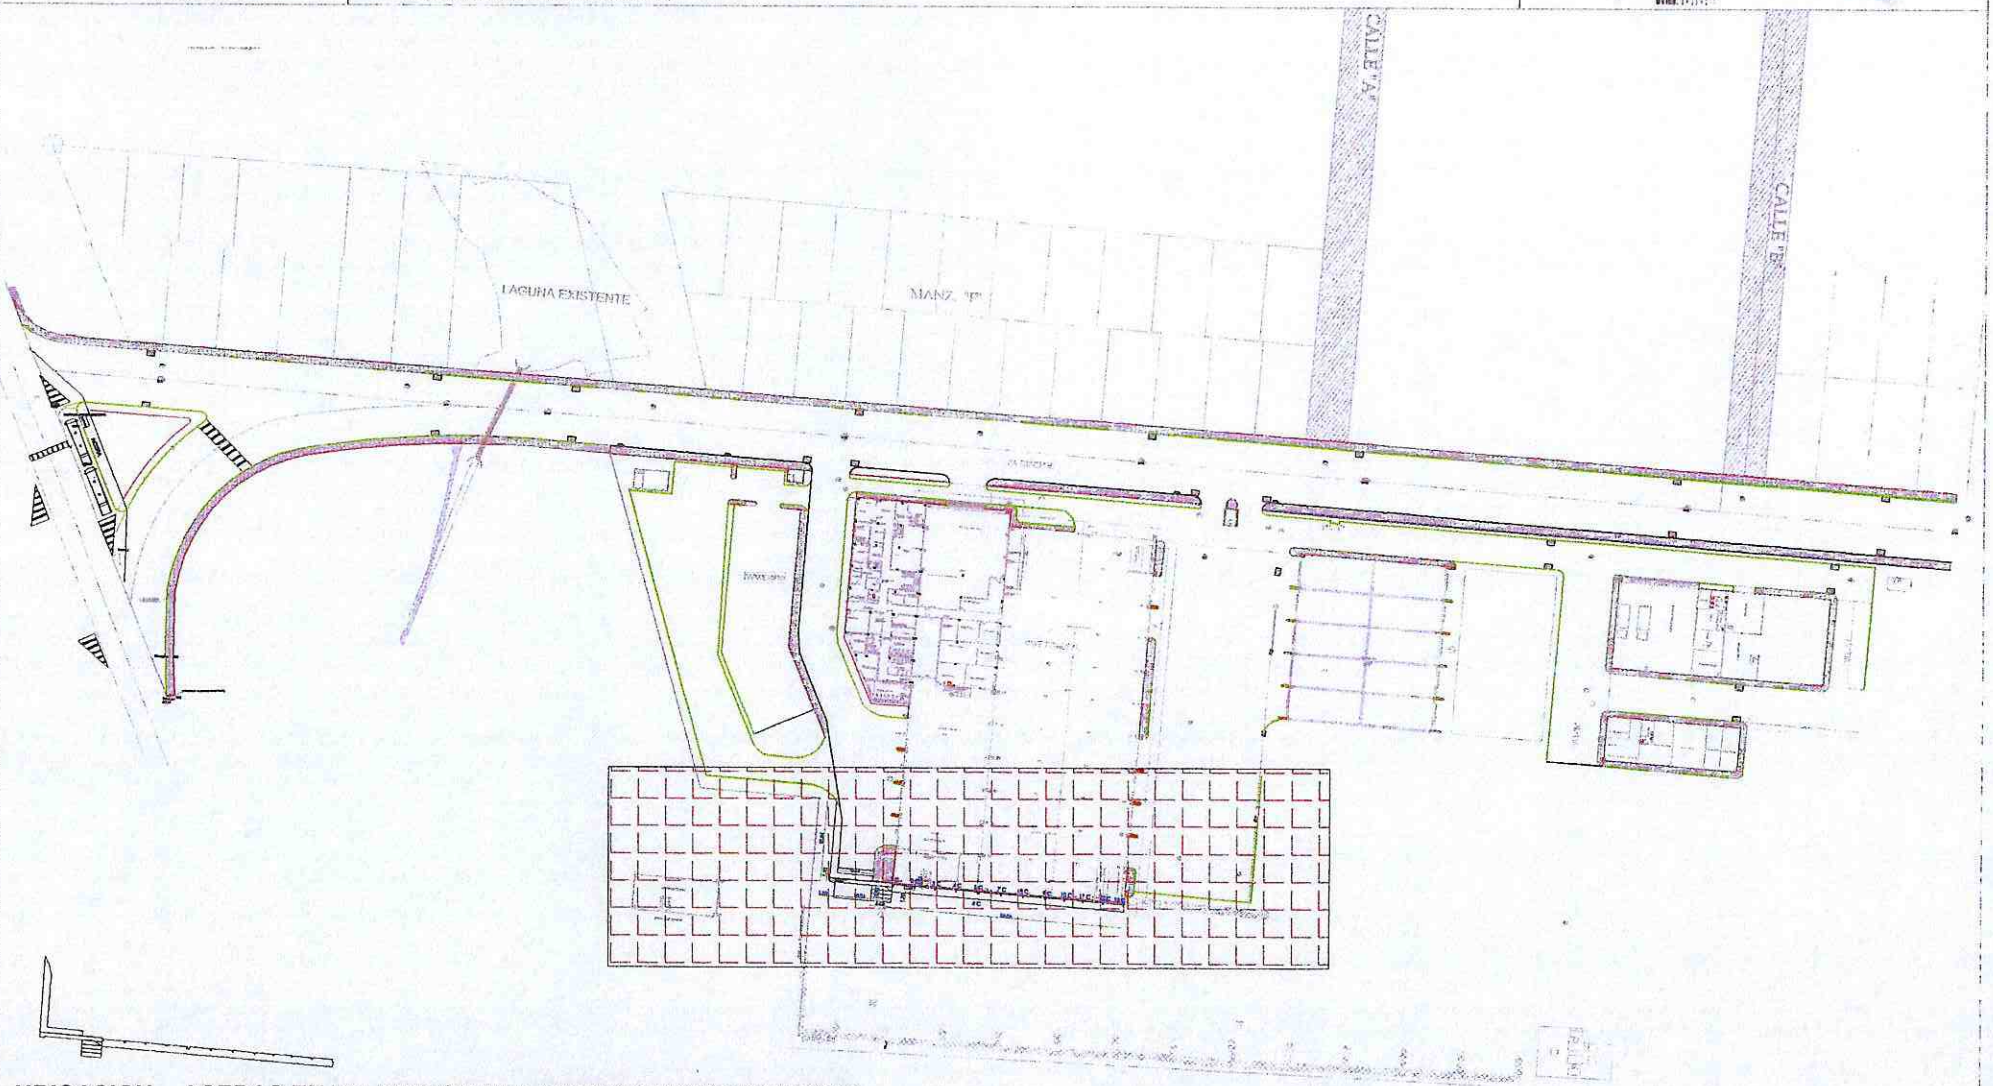


UBICACION - ACERAS EN VIA PRINCIPALY ACERAS EN VIAS INTERNAS

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	7 **ANEXO: 13**
DESCRIPCION	mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

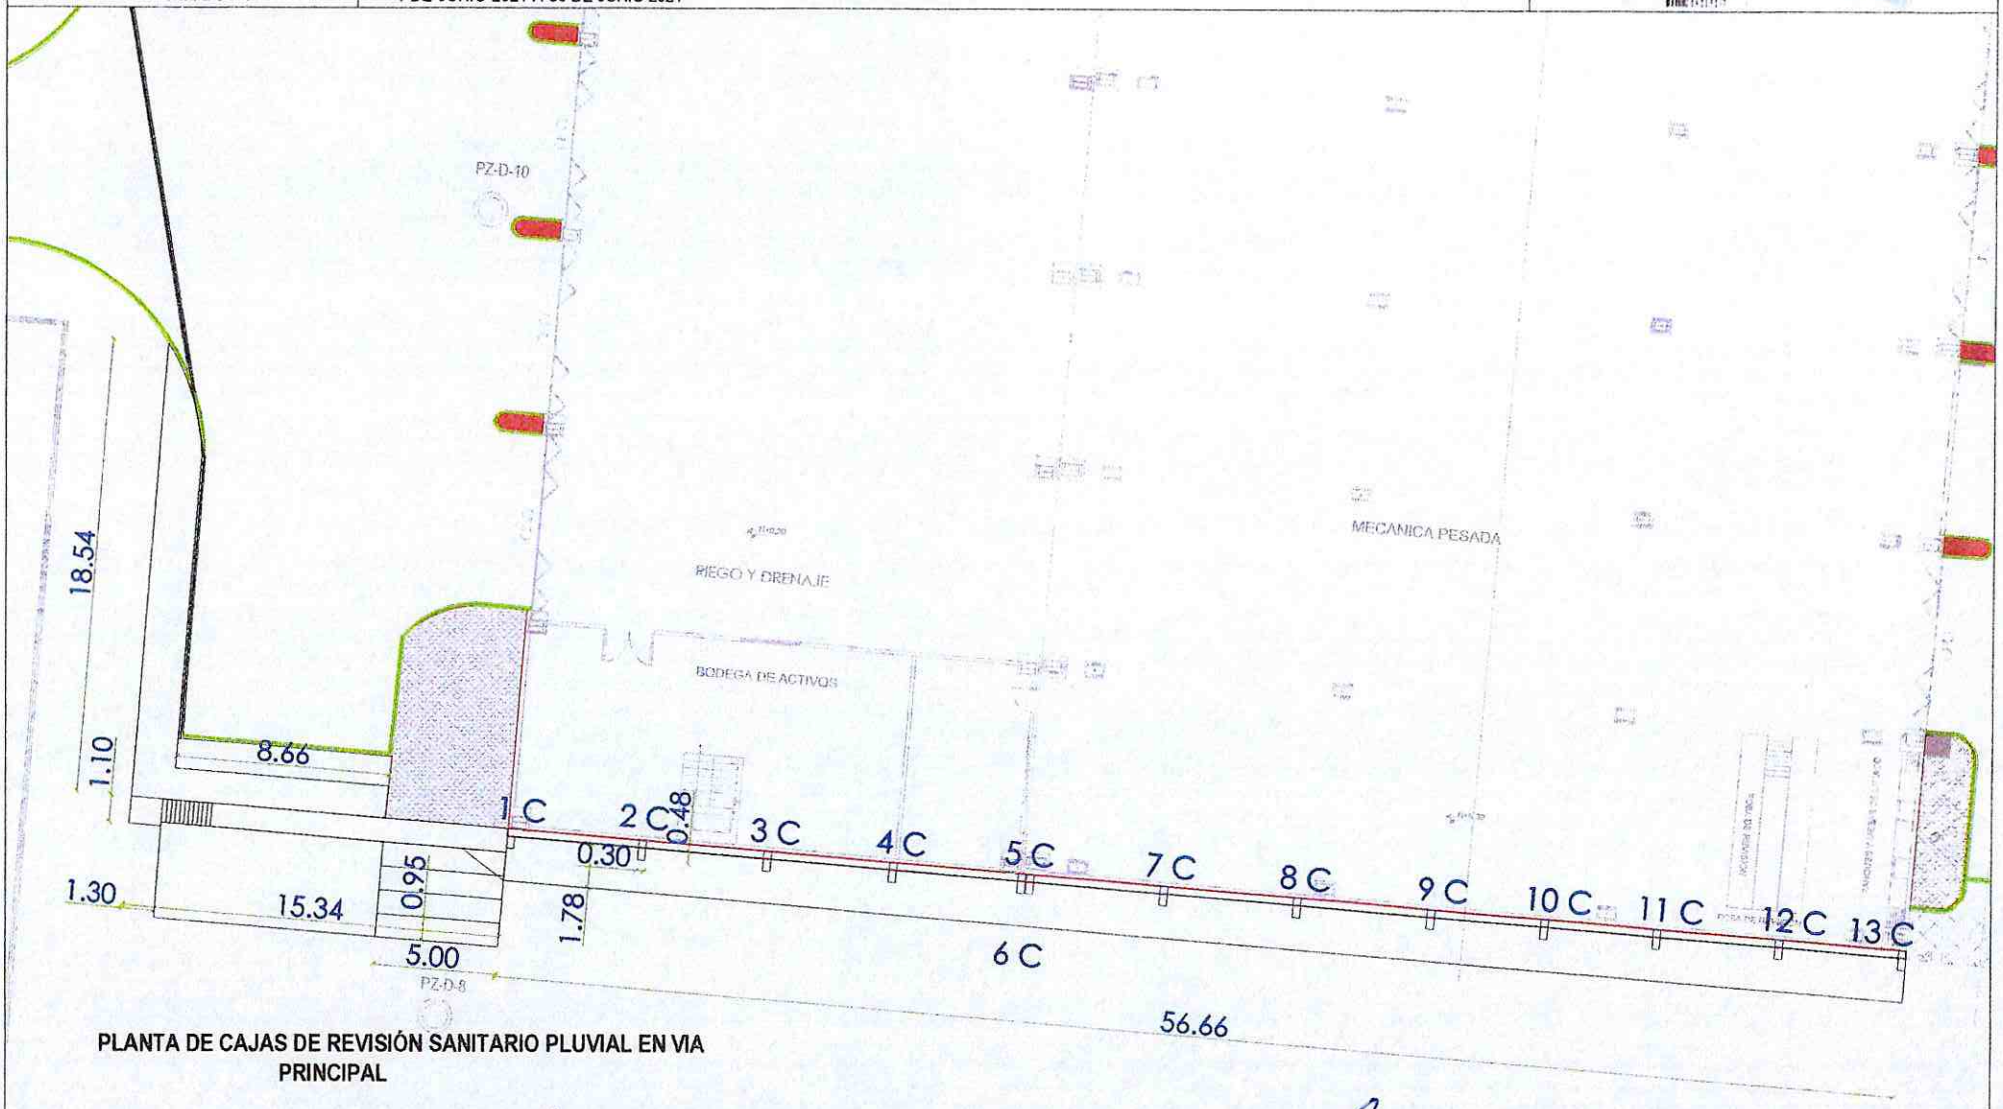

PLANTA DE CAJAS DE REVISIÓN SANITARIO PLUVIAL EN VIA PRINCIPAL

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA"

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

RUBRO N° 8 ANEXO 1

DESCRIPCIÓN: mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS

UNIDAD: m3

PERIODO: 01-jun 30-jun

mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS

VOLUMEN DE RELLENO

RELLENO M. DE BASE 2 DEL PARQUEADERO 2

ABCSISAS	AREA PARCIAL	AREA MEDIA	DISTANCIA	VOLUMEN PARCIAL	VOLUMEN ACUMULADO	ABCSISAS	AREA PARCIAL	AREA MEDIA	DISTANCIA	VOLUMEN PARCIAL	VOLUMEN ACUMULADO
0+000	21,05										
		20,25	10,00	0,00	0,00						
0+010	19,45										
		17,47	0,00		0,00						
0+010	15,48										
		13,60	10,00	32,95	32,95						
0+020	11,72										
		10,53	20,00	19,94	52,89						
0+040	9,34										
		9,10	20,00	60,62	113,51						
0+060	8,86										
		10,56	3,50	46,34	159,85						
0+064	12,26										
		11,92	6,50	9,05	168,90						
0+070	11,58										
		9,85	10,00	12,98	181,88						
0+080	8,12										
		6,60	10,00	15,81	197,69						
0+090	5,08										
		5,75	1,45	21,12	218,81						
0+091	6,42										
		3,21	-91,45	2,93	221,74						

RESUMEN	
RELLENO M. DE BASE 2 DEL PARQUEADERO 2	221,74
RELLENO BASE 2 DE LA VIA Y ACERA DE LA PARADA DE BUS 1	25,42
RELLENO DE BASE 2 DE LA VIA DE LA PARADA DE BUS 2	21,91
RELLENO DE BASE 2 DE LA ACERA DE LA PARADA DE BUS 2	22,94
TOTAL	**292,01**

RESUMEN DE PLANILLA DE INCREMENTOS


DESCRIPCION	CONTRATADO	ANTERIOR	ACTUAL	INCR. ANT.	INCR. ACT.	UNIDAD
mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS	1.942,49	2.644,85			292,01	m3

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE
PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	8 **ANEXO: 1**
DESCRIPCION	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

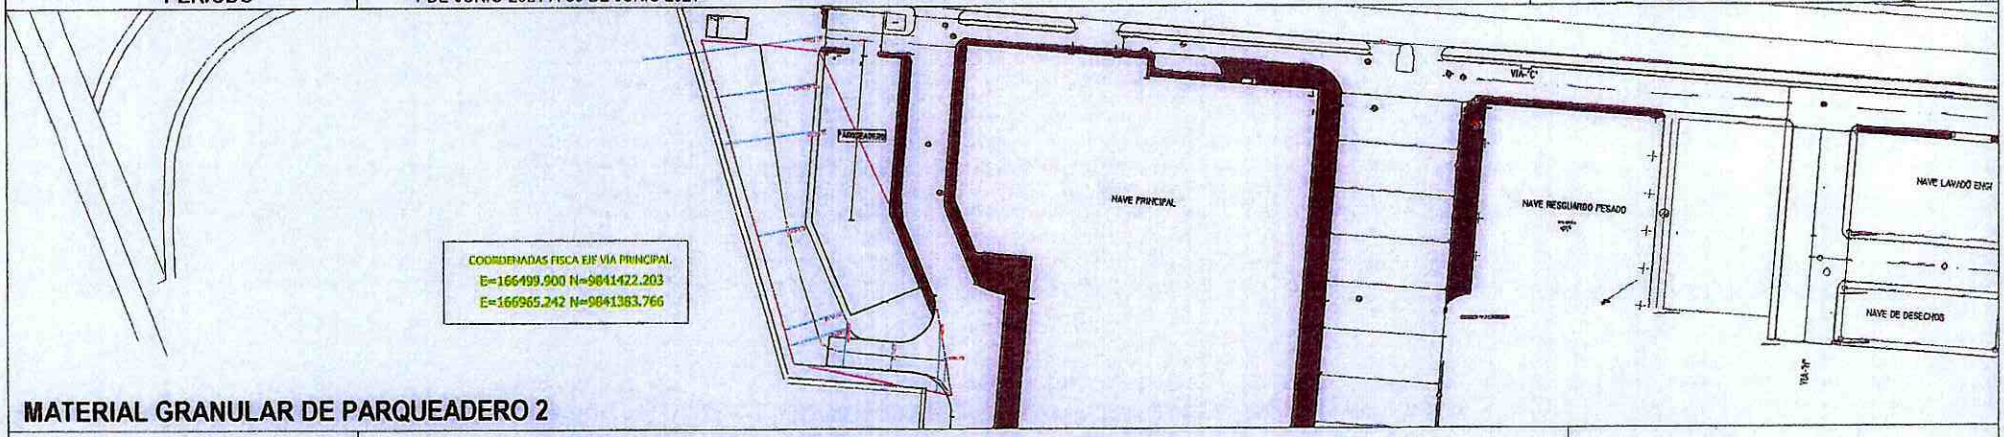

MATERIAL GRANULAR DE PARQUEADERO 2

Total Volume Table

Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+000.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+010.00	4.26	0.00	32.95	0.00	32.95	0.00
0+010.00	4.26	0.00	32.95	0.00	32.95	0.00
0+020.00	3.99	0.00	19.94	0.00	52.90	0.00
0+040.00	2.08	0.00	60.62	0.00	113.52	0.00
0+060.00	2.54	0.00	46.34	0.00	159.86	0.00
0+063.50	2.63	0.00	9.05	0.00	168.92	0.00
0+070.00	1.88	0.00	12.98	0.00	181.90	0.00
0+080.00	1.29	0.00	15.81	0.00	197.70	0.00
0+090.00	2.94	0.00	21.12	0.00	218.83	0.00
0+091.45	1.10	0.00	2.93	0.00	221.76	0.00


CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	8 **ANEXO: 2**
DESCRIPCION	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

PERFIL LONGITUDINAL VIA PRINCIPAL

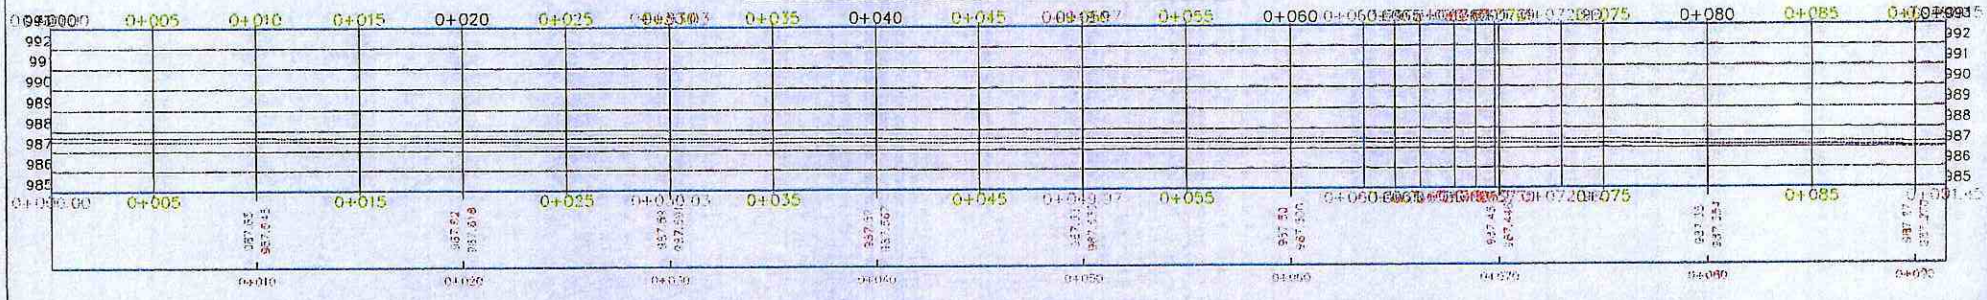

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE
PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	8 **ANEXO: 3**
DESCRIPCION	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

0+010.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	4.26
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	32.95
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	32.95
Volumen Neto	-32.95

0+040.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	2.08
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	60.62
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	113.52
Volumen Neto	-113.52

0+060.00

SECCCIONES DE CORTE




ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	2.54
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	46.34
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	159.86
Volumen Neto	-159.86

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO D[redacted]A
PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	8 **ANEXO: 7**
DESCRIPCION	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

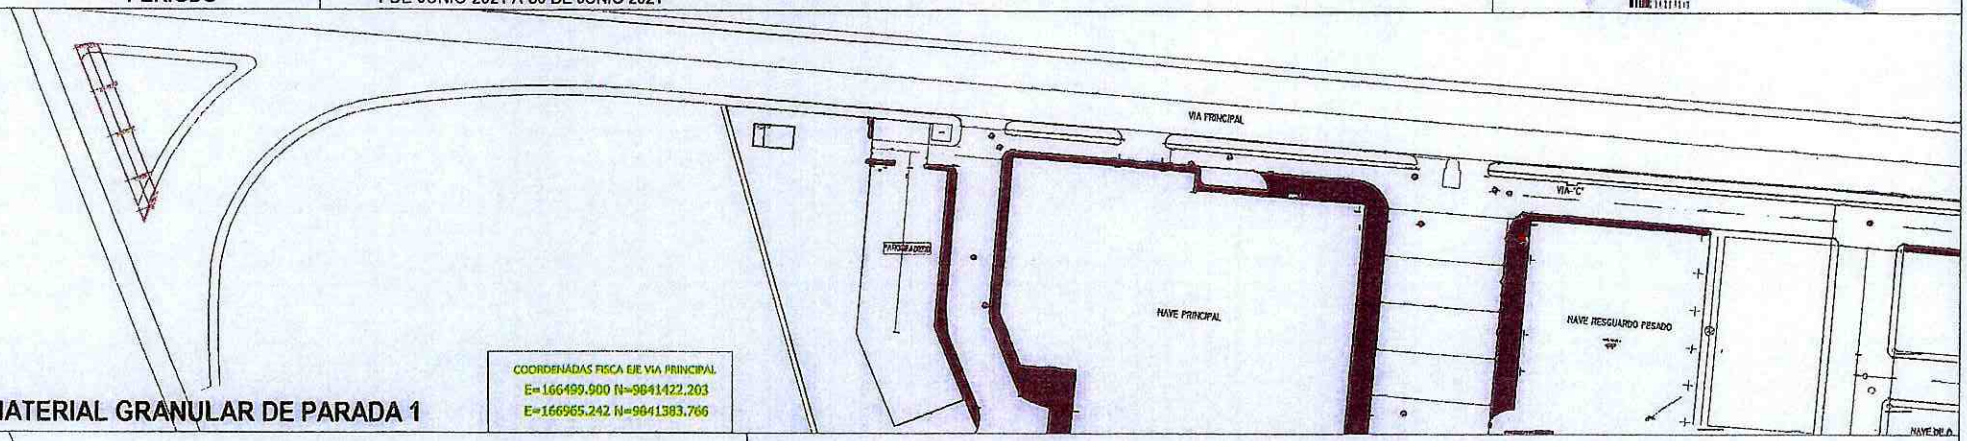

MATERIAL GRANULAR DE PARADA 1

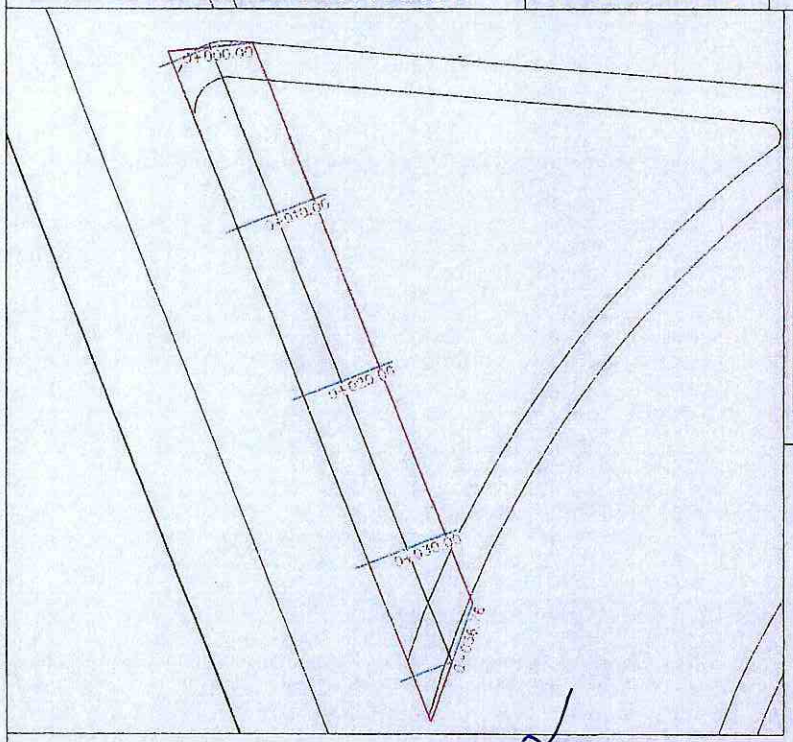

Total Volume Table

Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+000.10	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
0+010.00	0.00	0.67	0.00	6.74	0.00	6.74
0+020.00	0.00	0.67	0.00	6.75	0.00	13.49
0+030.00	0.00	0.67	0.00	6.75	0.00	20.24
0+036.75	0.00	0.86	0.00	5.18	0.00	25.41


CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO D
PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	8 — **ANEXO:** 5
DESCRIPCION	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

PERFIL LONGITUDINAL VIA PRINCIPAL

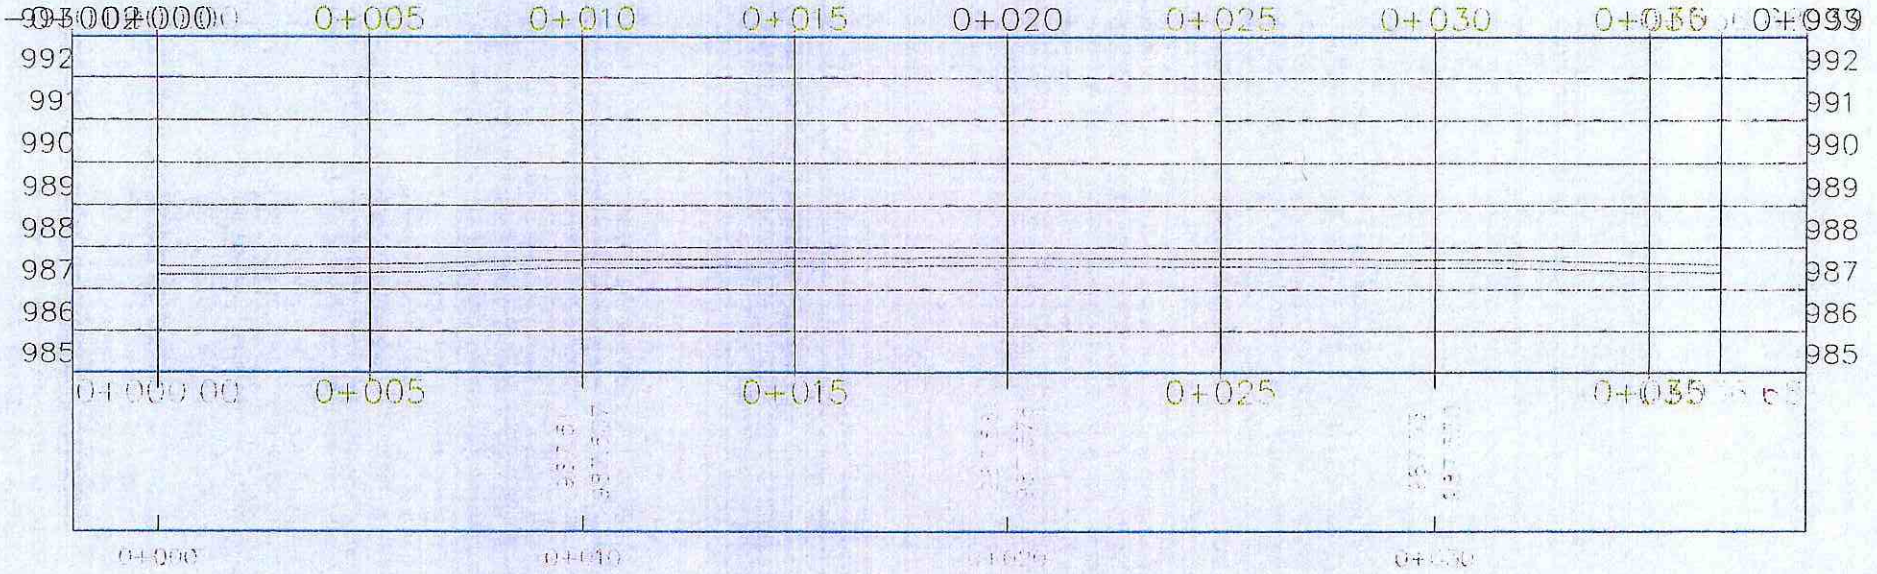


CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO D
PROVINCIA DEL PASTAZA


PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	8 — **ANEXO: 6**
DESCRIPCION	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

0+000.00
SECCCIONES DE CORTE




ABSCISA	
Area en Corte	0.47
Area	0.00
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	0.00

0+030.00
SECCCIONES DE CORTE




ABSCISA	
Area en Corte	0.90
Area	0.00
Volumen en Corte	8.96
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	24.73
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	24.73

0+010.00
SECCCIONES DE CORTE




ABSCISA	
Area en Corte	0.89
Area	0.00
Volumen en Corte	6.83
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	6.83
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	6.83

0+036.68
SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.45
Area	0.00
Volumen en Corte	4.49
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	29.22
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	29.22

0+020.00
SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.89
Area	0.00
Volumen en Corte	8.94
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	15.77
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	15.77

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA"

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

RUBRO N° 8 ANEXO 1

DESCRIPCIÓN: mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS

UNIDAD: m3

PERIODO: 01-jun 30-jun

mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS

VOLUMEN DE RELLENO

RELLENO M. DE BASE 2 DEL PARQUEADERO 2

ABCSISAS	AREA PARCIAL	AREA MEDIA	DISTANCIA	VOLUMEN PARCIAL	VOLUMEN ACUMULADO	ABCSISAS	AREA PARCIAL	AREA MEDIA	DISTANCIA	VOLUMEN PARCIAL	VOLUMEN ACUMULADO
0+000	21,05										
		20,25	10,00	0,00	0,00						
0+010	19,45										
		17,47	0,00		0,00						
0+010	15,48										
		13,60	10,00	32,95	32,95						
0+020	11,72										
		10,53	20,00	19,94	52,89						
0+040	9,34										
		9,10	20,00	60,62	113,51						
0+060	8,86										
		10,56	3,50	46,34	159,85						
0+064	12,26										
		11,92	6,50	9,05	168,90						
0+070	11,58										
		9,85	10,00	12,98	181,88						
0+080	8,12										
		6,60	10,00	15,81	197,69						
0+090	5,08										
		5,75	1,45	21,12	218,81						
0+091	6,42										
		3,21	-91,45	2,93	221,74						

RESUMEN	
RELLENO M. DE BASE 2 DEL PARQUEADERO 2	221,74
RELLENO BASE 2 DE LA VIA Y ACERA DE LA PARADA DE BUS 1	25,42
RELLENO DE BASE 2 DE LA VIA DE LA PARADA DE BUS 2	21,91
RELLENO DE BASE 2 DE LA ACERA DE LA PARADA DE BUS 2	22,94
TOTAL	**292,01**

RESUMEN DE PLANILLA DE INCREMENTOS

DESCRIPCION	CONTRATADO	ANTERIOR	ACTUAL	INCR. ANT.	INCR. ACT.	UNIDAD
mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS	1.942,49	2.644,85			292,01	m3

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO " CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

RUBRO N° 8 ANEXO 2

DESCRIPCIÓN: mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS

UNIDAD: m3

PERIODO: 01-jun 30-jun

mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS

VOLUMEN DE RELLENO

RELLENO BASE 2 DE LA VIA Y ACERA DE LA PARADA DE BUS 1

ABCSISAS	AREA PARCIAL	AREA MEDIA	DISTANCIA	VOLUMEN PARCIAL	VOLUMEN ACUMULADO
0+000	8,33				
		8,26	10,00	0,00	0,00
0+010	8,19				
		8,19	10,00	6,74	6,74
0+020	8,19				
		8,19	10,00	6,75	13,49
0+030	8,19				
		9,33	6,75	6,75	20,24
0+037	10,47				
		5,24	-36,75	5,18	**25,42**

VOLUMEN DE RELLENO

RELLENO DE BASE 2 DE LA VIA DE LA PARADA DE BUS 2

ABCSISAS	AREA PARCIAL	AREA MEDIA	DISTANCIA	VOLUMEN PARCIAL	VOLUMEN ACUMULADO
0+000	2,72				
		2,91	9,98	0,00	0,00
0+010	3,09				
		3,13	10,00	5,12	5,12
0+020	3,16				
		3,23	10,00	6,70	11,82
0+030	3,30				
		3,42	6,68	6,72	18,54
0+037	3,54				
		1,77	-36,68	3,37	**21,91**

VOLUMEN DE RELLENO

RELLENO DE BASE 2 DE LA ACERA DE LA PARADA DE BUS 2


ABCSISAS	AREA PARCIAL	AREA MEDIA	DISTANCIA	VOLUMEN PARCIAL	VOLUMEN ACUMULADO
0+000	2,72				
		2,91	10,00	3,40	3,40
0+010	3,09				
		3,13	1,72	0,77	4,17
0+012	3,16				
		3,23	0,79	0,37	4,54
0+013	3,30				
		3,42	0,79	0,37	4,91
0+013	3,54				
		3,32	6,70	3,02	7,93
0+020	3,09				
		3,13	10,00	4,50	12,43
0+030	3,16				
		3,23	10,00	4,50	16,93
0+040	3,30				
		3,42	0,49	0,22	17,15
0+040	3,54				
		3,35	1,23	0,57	17,72
0+042	3,16				
		3,23	1,22	0,57	18,29
0+043	3,30				
		3,42	7,06	3,18	21,47
0+050	3,54				
		3,32	4,34	1,47	**22,94**
0+054	3,09				

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO D
PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	8 **ANEXO: 1**
DESCRIPCION	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

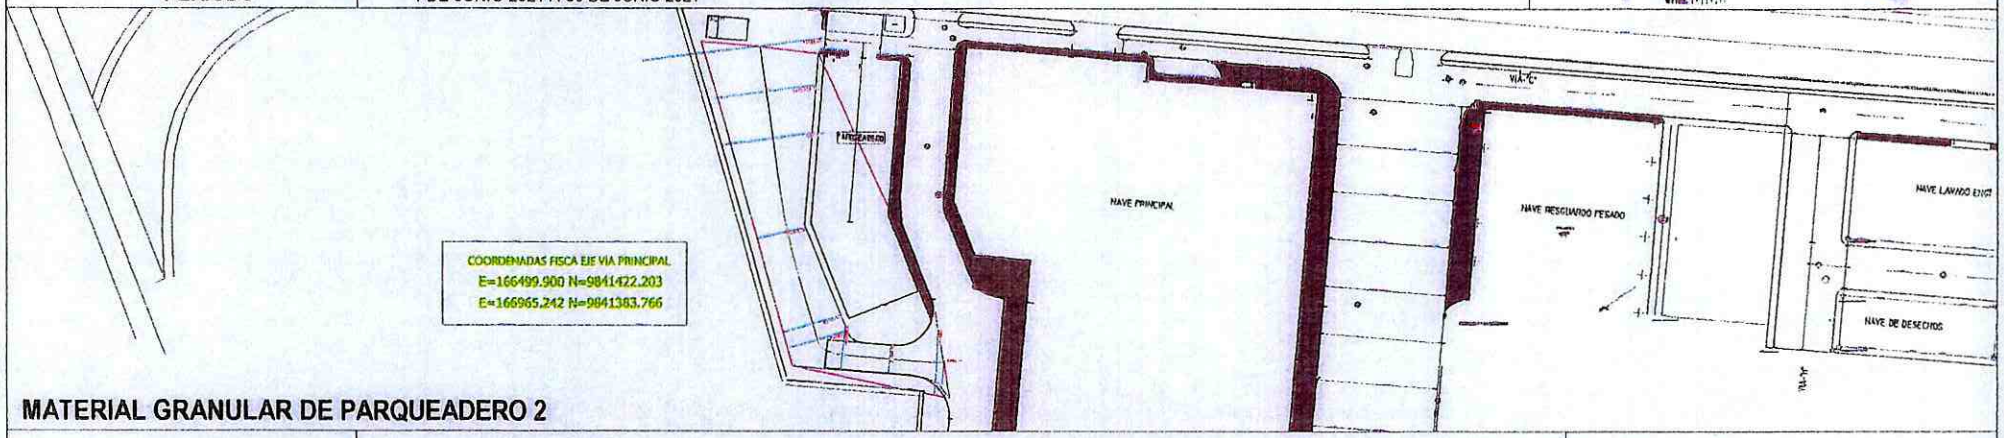

MATERIAL GRANULAR DE PARQUEADERO 2

Total Volume Table

Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+000.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+010.00	4.26	0.00	32.95	0.00	32.95	0.00
0+010.00	4.26	0.00	32.95	0.00	32.95	0.00
0+020.00	3.99	0.00	19.94	0.00	52.90	0.00
0+040.00	2.08	0.00	60.62	0.00	113.52	0.00
0+060.00	2.54	0.00	46.34	0.00	159.86	0.00
0+063.50	2.63	0.00	9.05	0.00	168.92	0.00
0+070.00	1.88	0.00	12.98	0.00	181.90	0.00
0+080.00	1.29	0.00	15.81	0.00	197.70	0.00
0+090.00	2.94	0.00	21.12	0.00	218.83	0.00
0+091.45	1.10	0.00	2.93	0.00	221.76	0.00


CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO D
PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	8 **ANEXO: 2**
DESCRIPCION	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

PERFIL LONGITUDINAL VIA PRINCIPAL

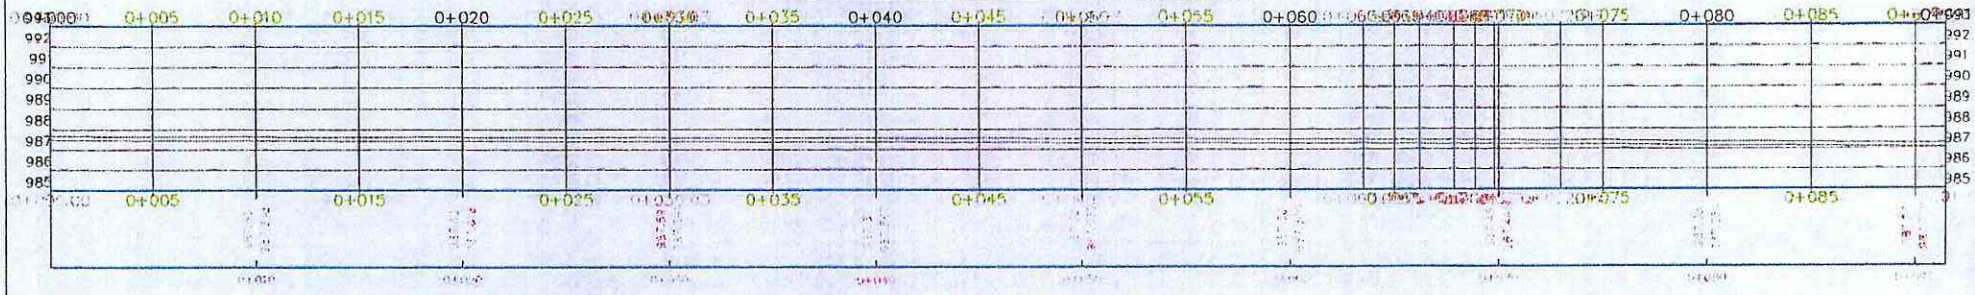

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO D
PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	8 **ANEXO: 3**
DESCRIPCION	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

0+010.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	4.26
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	32.95
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	32.95
Volumen Neto	-32.95

0+040.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	2.08
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	60.62
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	113.52
Volumen Neto	-113.52

0+060.00

SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	2.54
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	46.34
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	159.86
Volumen Neto	-159.86

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO D
PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	8 **ANEXO: 4**
DESCRIPCION	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

0+063.50


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	2.63
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	9.05
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	168.92
Volumen Neto	-168.92

0+070.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	1.88
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	12.98
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	181.90
Volumen Neto	-181.90

0+080.00

SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	1.29
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	15.81
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	197.70
Volumen Neto	-197.70

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO D
PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	8 **ANEXO: 5**
DESCRIPCION	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

0+063.50


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	2.63
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	9.05
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	168.92
Volumen Neto	-168.92

0+070.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	1.88
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	12.98
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	181.90
Volumen Neto	-181.90

0+080.00

SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	1.29
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	15.81
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	197.70
Volumen Neto	-197.70

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO D[redacted].
PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	8 **ANEXO: 6**
DESCRIPCION	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

0+090.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	2.94
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	21.12
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	218.83
Volumen Neto	-218.83

0+091.45

SECCCIONES DE CORTE




ABSCISA	
Area en Corte	0.00
Area	1.10
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	2.93
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	221.76
Volumen Neto	-221.76

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

[redacted]BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE[redacted]
PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	8 **ANEXO: 7**
DESCRIPCION	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

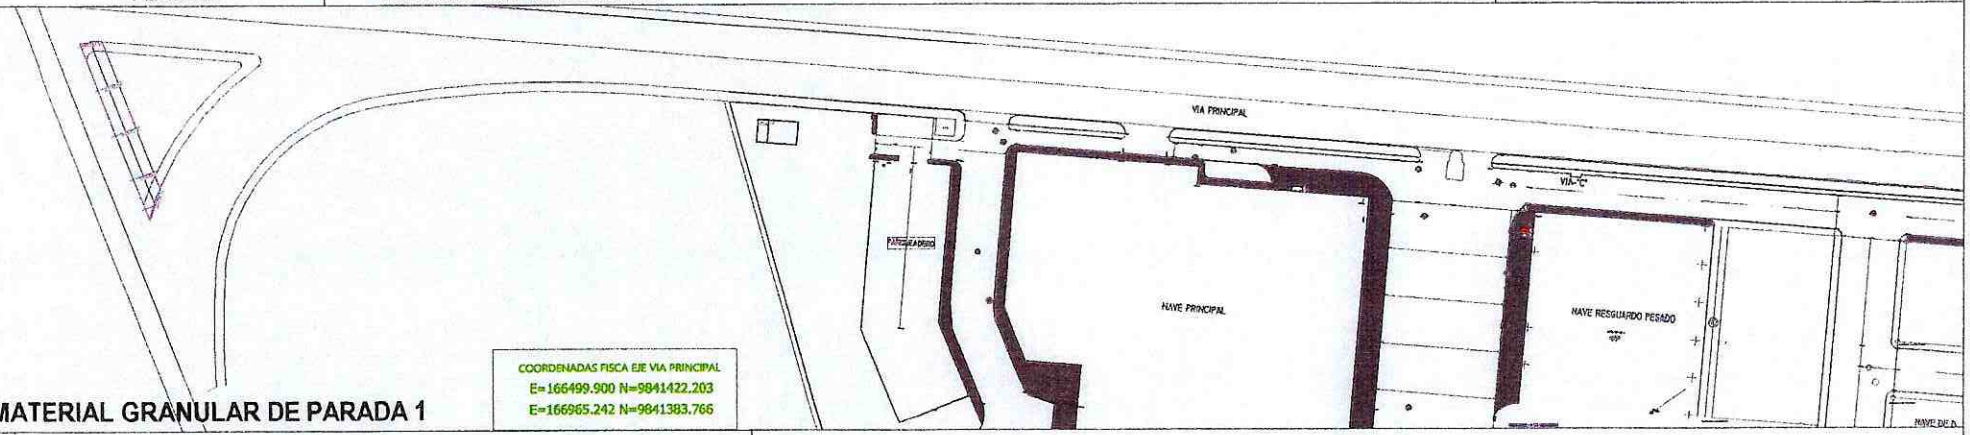

MATERIAL GRANULAR DE PARADA 1

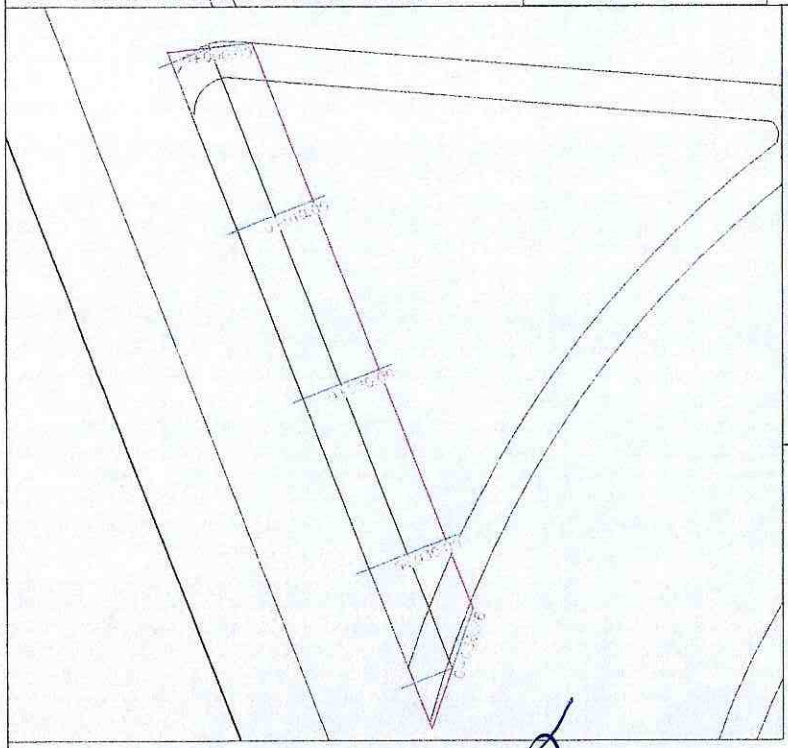

Total Volume Table

Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+000.10	0.00	0 69	0.00	0 00	0.00	0.00
0+010 00	0 00	0.67	0.00	6 74	0 00	6 74
0+020 00	0.00	0.67	0.00	6.75	0.00	13.49
0+030.00	0.00	0.67	0 00	6 75	0.00	20.24
0+036.75	0.00	0.86	0.00	5 18	0 00	25 41


CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

[redacted]BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE[redacted]
PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	8 **ANEXO: 8**
DESCRIPCION	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

PERFIL LONGITUDINAL PARADA DE BUSS

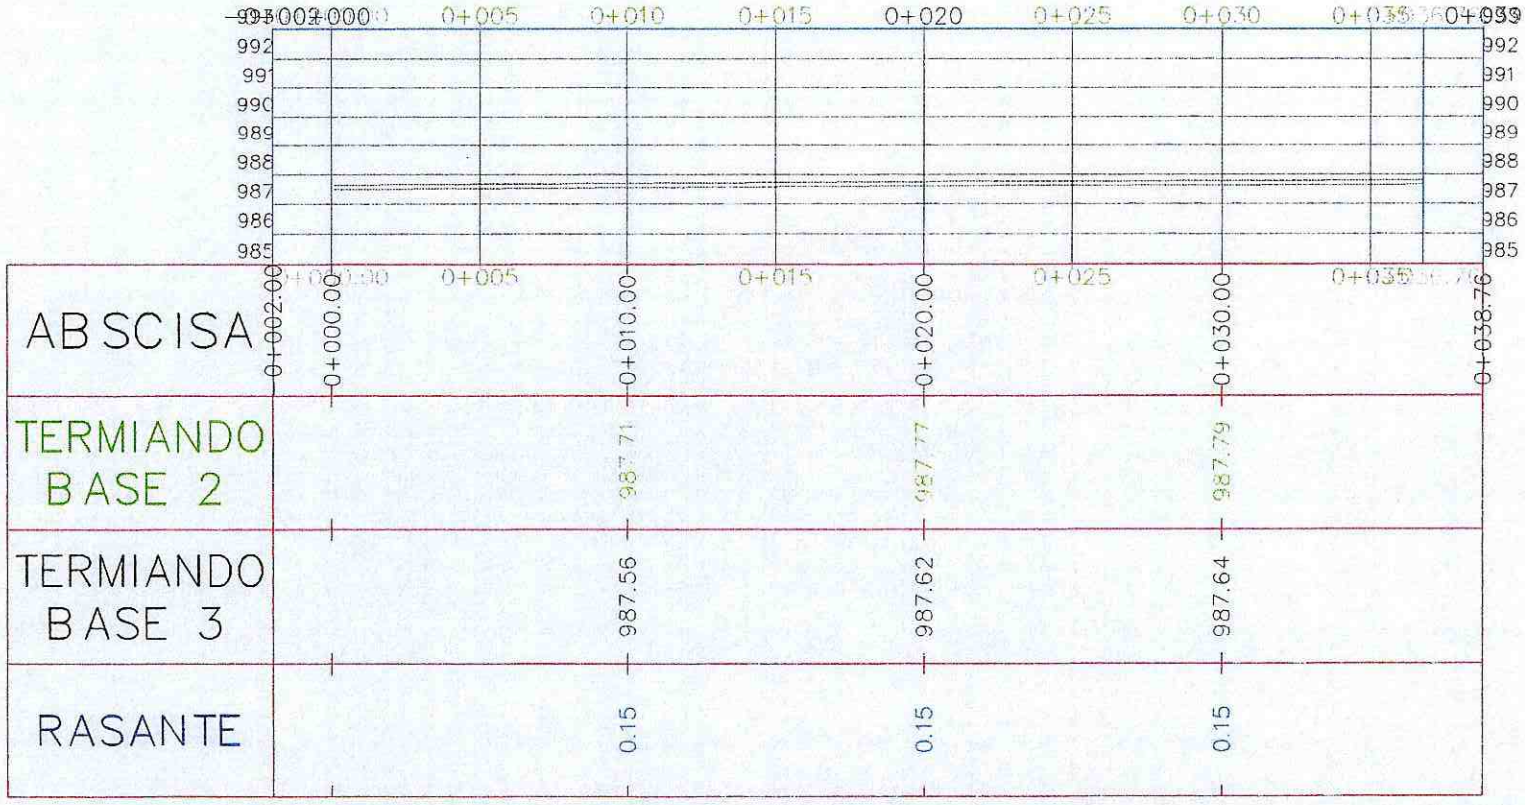

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	8 — **ANEXO: 9**
DESCRIPCION	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

0+000.10


SECCCIONES DE BASE 2



ABSCISA	
Area en Corte	0.69
Area	0.00
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	0.00

0+030.00


SECCCIONES DE BASE 2



ABSCISA	
Area en Corte	0.67
Area	0.00
Volumen en Corte	6.75
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	20.24
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	20.24

0+010.00


SECCCIONES DE BASE 2



ABSCISA	
Area en Corte	0.67
Area	0.00
Volumen en Corte	6.74
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	6.74
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	6.74

0+036.75


SECCCIONES DE BASE 2



ABSCISA	
Area en Corte	0.86
Area	0.00
Volumen en Corte	5.18
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	25.41
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	25.41

0+020.00

SECCCIONES DE BASE 2




ABSCISA	
Area en Corte	0.67
Area	0.00
Volumen en Corte	6.75
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	13.49
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	13.49

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	8 **ANEXO: 10**
DESCRIPCION	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

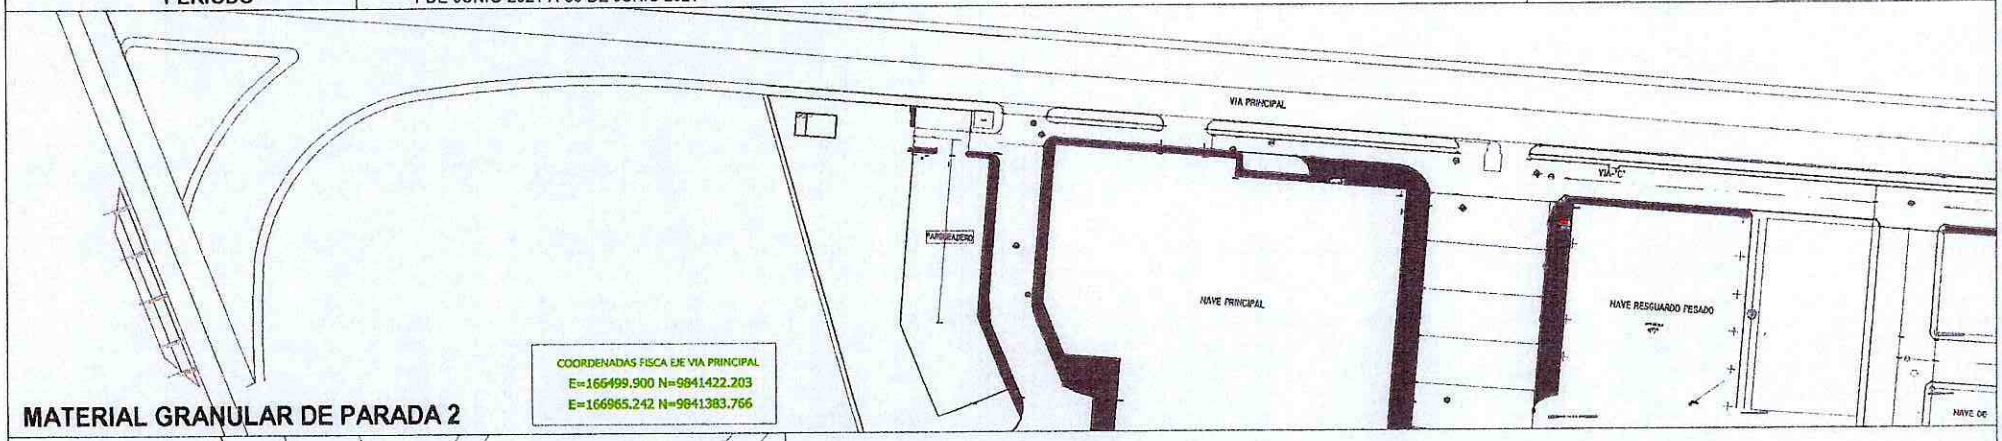

MATERIAL GRANULAR DE PARADA 2

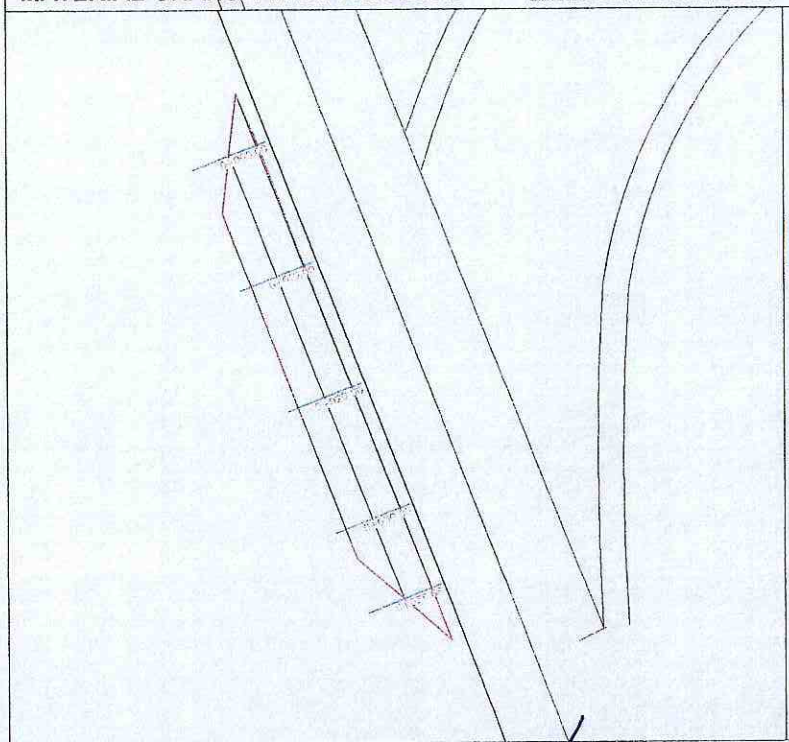

Total Volume Table

Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+000.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
0+010.00	0.00	0.67	0.00	5.12	0.00	5.12
0+020.00	0.00	0.67	0.00	6.70	0.00	11.83
0+030.00	0.00	0.67	0.00	6.72	0.00	18.54
0+036.68	0.00	0.34	0.00	3.37	0.00	21.91

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

[redacted]BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE [redacted]
PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	8 — ANEXO: 11
DESCRIPCION	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

0+000.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.35
Area	0.00
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	0.00

0+030.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.67
Area	0.00
Volumen en Corte	6.72
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	18.54
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	18.54

0+010.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.67
Area	0.00
Volumen en Corte	5.12
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	5.12
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	5.12

0+036.68


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.34
Area	0.00
Volumen en Corte	3.37
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	21.91
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	21.91

0+020.00

SECCCIONES DE CORTE




ABSCISA	
Area en Corte	0.67
Area	0.00
Volumen en Corte	6.70
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	11.83
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	11.83

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	8 **ANEXO: 12**
DESCRIPCION	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

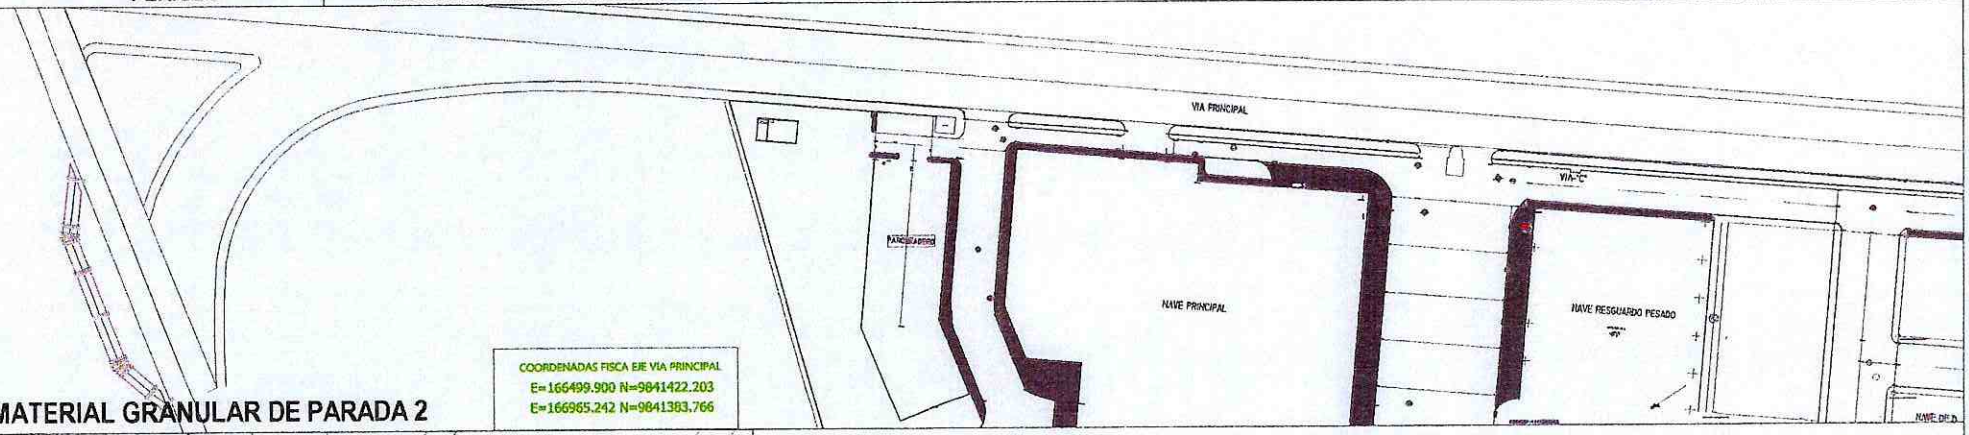

Total Volume Table

Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+000.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
0+010.00	0.00	0.45	0.00	3.40	0.00	3.40
0+011.72	0.00	0.45	0.00	0.77	0.00	4.18
0+012.51	0.00	0.46	0.00	0.37	0.00	4.54
0+013.30	0.00	0.45	0.00	0.37	0.00	4.91
0+020.00	0.00	0.45	0.00	3.02	0.00	7.93
0+030.00	0.00	0.45	0.00	4.50	0.00	12.43
0+040.00	0.00	0.45	0.00	4.50	0.00	16.92
0+040.49	0.00	0.45	0.00	0.22	0.00	17.15
0+041.72	0.00	0.46	0.00	0.57	0.00	17.72
0+042.94	0.00	0.45	0.00	0.57	0.00	18.28
0+050.00	0.00	0.45	0.00	3.18	0.00	21.47
0+054.34	0.00	0.22	0.00	1.47	0.00	22.94


CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE
PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	8 **ANEXO: 13**
DESCRIPCION	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

PERFIL LONGITUDINAL VIA PRINCIPAL

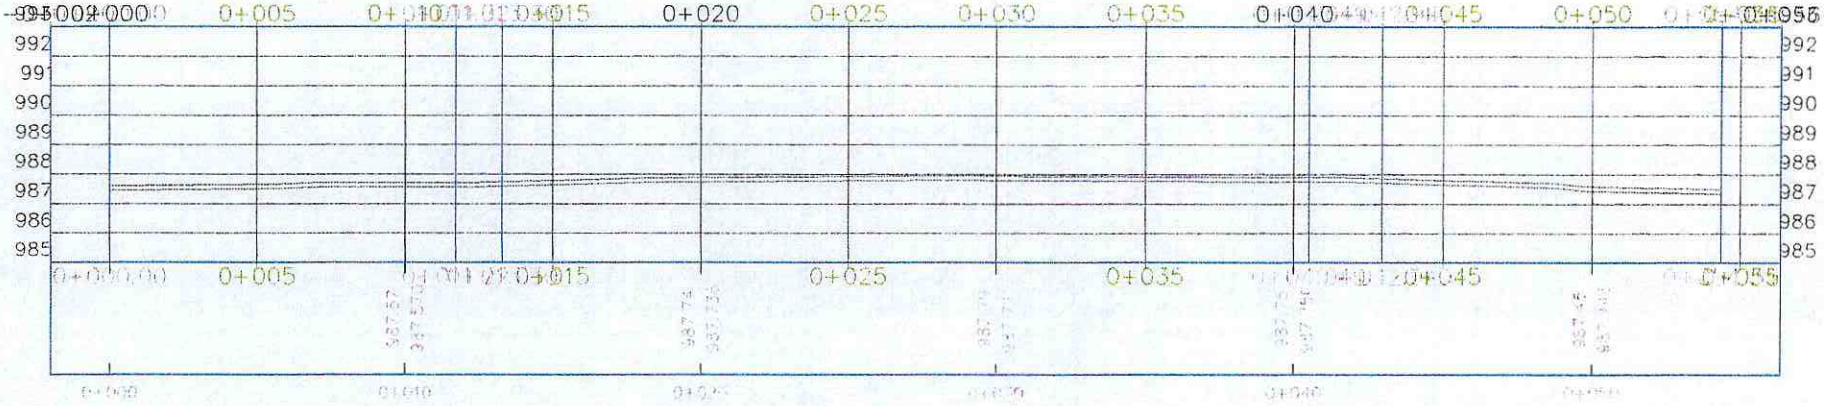

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE
PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	8
DESCRIPCION	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

ANEXO: 14

0+000.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.23
Area	0.00
Volumen en Corte	0.00
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	0.00
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	0.00

0+013.30


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.45
Area	0.00
Volumen en Corte	0.37
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	4.91
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	4.91

0+040.49


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.45
Area	0.00
Volumen en Corte	0.22
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	17.15
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	17.15

0+010.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.45
Area	0.00
Volumen en Corte	3.40
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	3.40
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	3.40

0+020.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.45
Area	0.00
Volumen en Corte	3.02
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	7.93
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	7.93

0+041.72


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.46
Area	0.00
Volumen en Corte	0.57
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	17.72
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	17.72

0+011.72


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.45
Area	0.00
Volumen en Corte	0.77
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	4.18
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	4.18

0+030.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.45
Area	0.00
Volumen en Corte	4.50
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	12.43
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	12.43

0+042.94

SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.45
Area	0.00
Volumen en Corte	0.57
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	18.28
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	18.28

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

[redacted]OBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO D[redacted]
PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	8 **ANEXO: 15**
DESCRIPCION	mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

0+012.51


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.46
Area	0.00
Volumen en Corte	0.37
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	4.54
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	4.54

0+040.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.45
Area	0.00
Volumen en Corte	4.50
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	16.92
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	16.92

0+050.00


SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.45
Area	0.00
Volumen en Corte	3.18
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	21.47
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	21.47

0+054.34

SECCCIONES DE CORTE



ABSCISA	
Area en Corte	0.22
Area	0.00
Volumen en Corte	1.47
Volumen en Relleno	0.00
Volumen Acomulado En Corte	22.94
Volumen Acomulado En Relleno	0.00
Volumen Neto	22.94

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO **" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "**

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°23

RUBRO N° 9 ANEXO 1
DESCRIPCIÓN: TRANSPORTE mATERIAL PETREODE mEJORAmIENTO
UNIDAD: m3-km
PERIODO: 01-jun 30-jun

ANEXO DE CALCULO DE VOLÚMENES DE OBRA EJECUTADA


DESCRIPCION	VOLUMEN (m3)	%COMPACTACION (20%) m3	TRANSPORTE(Km)	VOLUMEN TOTAL(m3-Km)
RELLENO M. MEJORAMIENTO DEL PARQUEADERO 2	608,14	1,20	18,10	13.208,80
RELLENO DE LA VIA Y ACERA DE LA PARADA DE BUS 1	169,53	1,20	18,10	3.682,19
RELLENO DE LA VIA DE LA PARADA DE BUS 2	87,66	1,20	18,10	1.903,98
RELLENO DE LA ACERA DE LA PARADA DE BUS 2	30,58	1,20	18,10	664,20
RELLENO DE ACERA INTERNAS	697,06	1,20	18,10	15.140,14

TOTAL 34.599,31

Distancia desde la mina Marisela en el Río Pastaza, hasta al inicio del proyecto = 17,76 km.
Distancia al centro de gravedad del proyecto= 0,34 Km.
Distancia total calculada para Transportarse= 18,100 km

INICIO	FIN	LONGITUD
MINA MARISELA	PROYECTO FATIMA	m
0+000	18+100	m
TOTAL	18,10	KM

RUTA

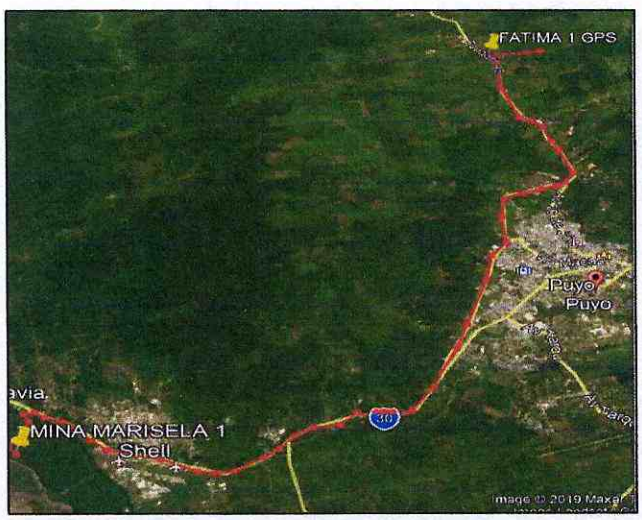

RESUMEN DE PLANILLA AL 100%					
DESCRIPCION	CONTRATADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	UNIDAD
TRANSPORTE mATERIAL PETREODE mEJORAmIENTO	937.976,72	741.378,36	34.599,31	775.977,67	m3-km

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO **" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "**

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°23

RUBRO N° 10 ANEXO 1
DESCRIPCIÓN: TRANSPORTE DE mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3
UNIDAD: m3-km
PERIODO: 01-jun 30-jun

ANEXO DE CALCULO DE VOLÚMENES DE OBRA EJECUTADA


DESCRIPCION	VOLUMEN (m3)		TRANSPORTE(Km)	VOLUMEN TOTAL(m3-Km)
RELLENO BASE 3 DE LA VIA Y ACERA DE LA PARADA DE BUS 1	173,33		18,10	3.137,31
RELLENO DE BASE 3 DE LA VIA DE LA PARADA DE BUS 2	29,22		18,10	528,88
RELLENO DE ACERA INTERNAS	139,41		18,10	2.523,36

TOTAL 6.189,55

Distancia desde la mina Marisela en el Río Pastaza, hasta al inicio del proyecto = 17,76 km.
Distancia al centro de gravedad del proyecto= 0,34 Km.
Distancia total calculada para Transportarse= 18,100 km

INICIO	FIN	LONGITUD
MINA MARISELA	PROYECTO FATIMA	m
0+000	18+100	m
TOTAL	18,10	KM

RUTA

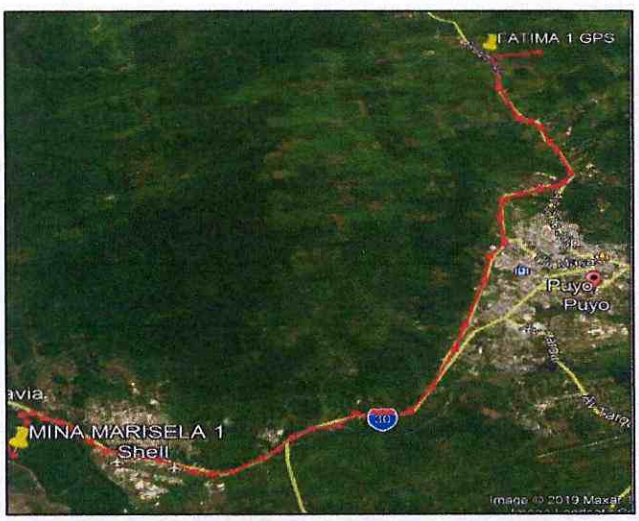

RESUMEN DE PLANILLA AL 100%					
DESCRIPCION	CONTRATADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	UNIDAD
TRANSPORTE DE mATERIAL DE SuBBASE CLASE 3	117.701,06	65.521,34	6.189,55	71.710,89	UNIDAD:

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA"

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°23

RUBRO N° 11 ANEXO 1
DESCRIPCIÓN: TRANSPORTE DE mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS
UNIDAD: m3-km
PERIODO: 01-jun 30-jun

ANEXO DE CALCULO DE VOLÚMENES DE OBRA EJECUTADA

DESCRIPCION	VOLUMEN (m3)		TRANSPORTE(Km)	VOLUMEN TOTAL(m3-Km)
RELLENO M. DE BASE 2 DEL PARQUEADERO 2	221,74		18,10	4.013,49
RELLENO BASE 2 DE LA VIA Y ACERA DE LA PARADA DE BUS 1	25,42		18,10	460,10
RELLENO DE LA VIA DE LA PARADA DE BUS 2	21,91		18,10	396,57
RELLENO DE BASE 2 DE LA ACERA DE LA PARADA DE BUS 2	22,94		18,10	415,21

TOTAL 5.285,37

Distancia desde la mina Marisela en el Río Pastaza, hasta al inicio del proyecto = 17,76 km.
Distancia al centro de gravedad del proyecto= 0,34 Km.
Distancia total calculada para Transportarse= 18,100 km

INICIO	FIN	LONGITUD
MINA MARISELA	PROYECTO FATIMA	m
0+000	18+100	m
TOTAL	18,10	KM

RUTA



RESUMEN DE PLANILLA DE INCREMENTOS

DESCRIPCION	CONTRATADO	ANTERIOR	ACTUAL	INCR. ANT.	INCR. ACT.	UNIDAD
TRANSPORTE DE mATERIAL DE BASE GRANuLAR DE AGREGADOS	34.964,82	47.871,85			5.285,37	m3-km

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

RUBRO N° 18 ANEXO 1

DESCRIPCIÓN: ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)

UNIDAD: m2

PERIODO: 01-jun 30-jun

ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)							
AREA INTERVENIDA PARA MESETAS Y TALUDES							
DESCRIPCION		LARGO (X)	ANCHO (Y)	ALTO (Z)	No.	SUBTOTAL	TOTAL
AREA 1		95,96	42,00		1,00	4.030,36	4.030,36
					TOTAL 1		4.030,36


RESUMEN DE PLANILLA AL 100%					
DESCRIPCION	CONTRATADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	UNIDAD
ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)	4.030,36	-	4.030,36	4.030,36	m2

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	18 **ANEXO: 1**
DESCRIPCION	ARREGLO Y LImPIEZA (INCLuYE DESALOJO)
UNIDAD	m2
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

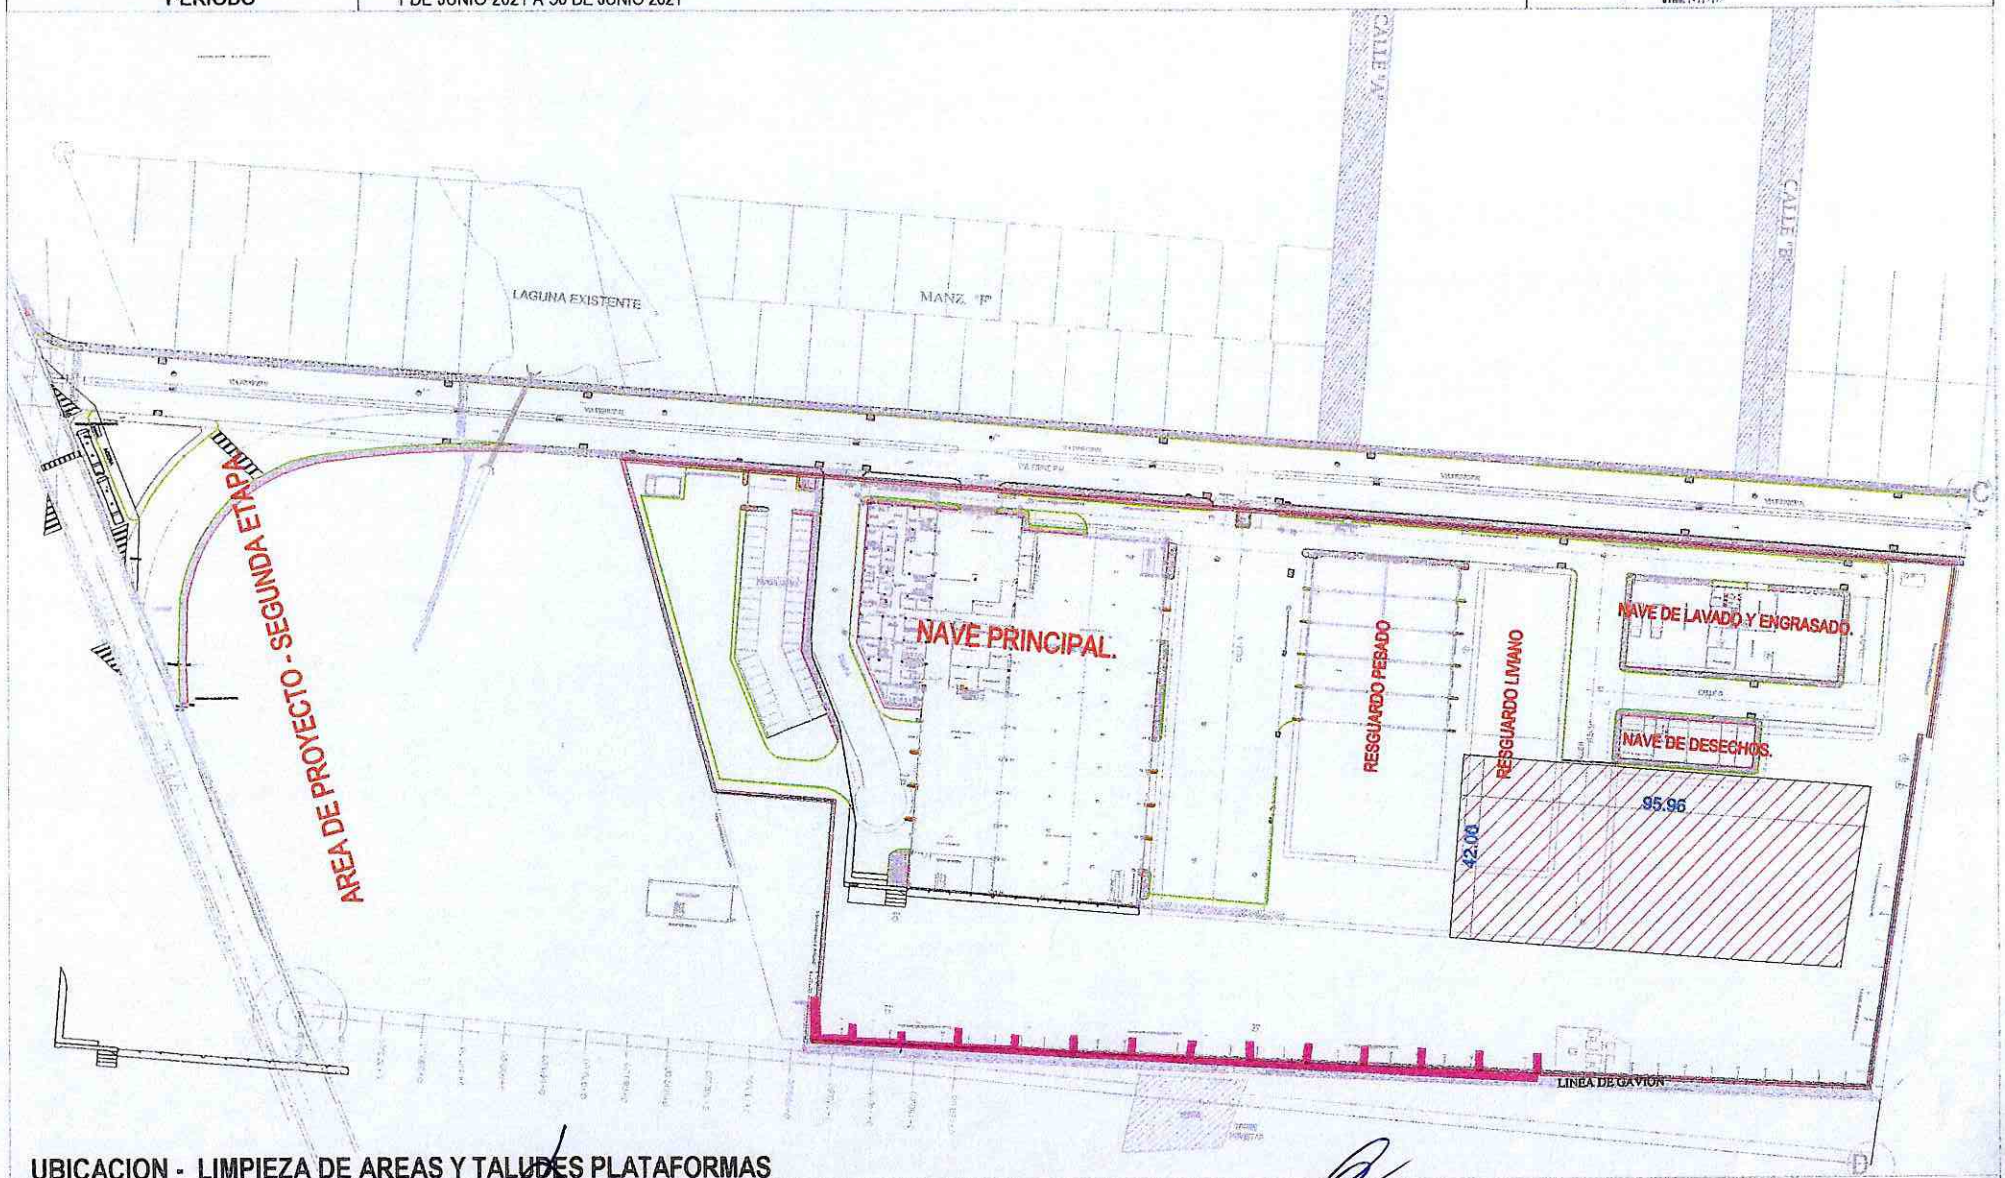

UBICACION - LIMPIEZA DE AREAS Y TALUDES PLATAFORMAS

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

RUBRO N° 19 ANEXO 1

DESCRIPCIÓN: TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)

UNIDAD: m2

PERIODO: 01-jun 30-jun

TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)							
AREA DE PARQUEADERO #2							
DESCRIPCION		AREA		ALTO (Z)	No.	SUBTOTAL	TOTAL
AREA 1		1.292,01			1,00	1.292,01	1.292,01
					TOTAL 1		1.292,01


RESUMEN DE PLANILLA AL 100%					
DESCRIPCION	CONTRATADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	UNIDAD
TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)	4.613,56	2.109,52	1.292,01	3.401,53	m2

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	19 **ANEXO: 1**
DESCRIPCION	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION DE EDIFICACIONES, PARQuEADERO,Y PLATAFORmAS (EQ. TOPOGRAFICO)
UNIDAD	m2
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

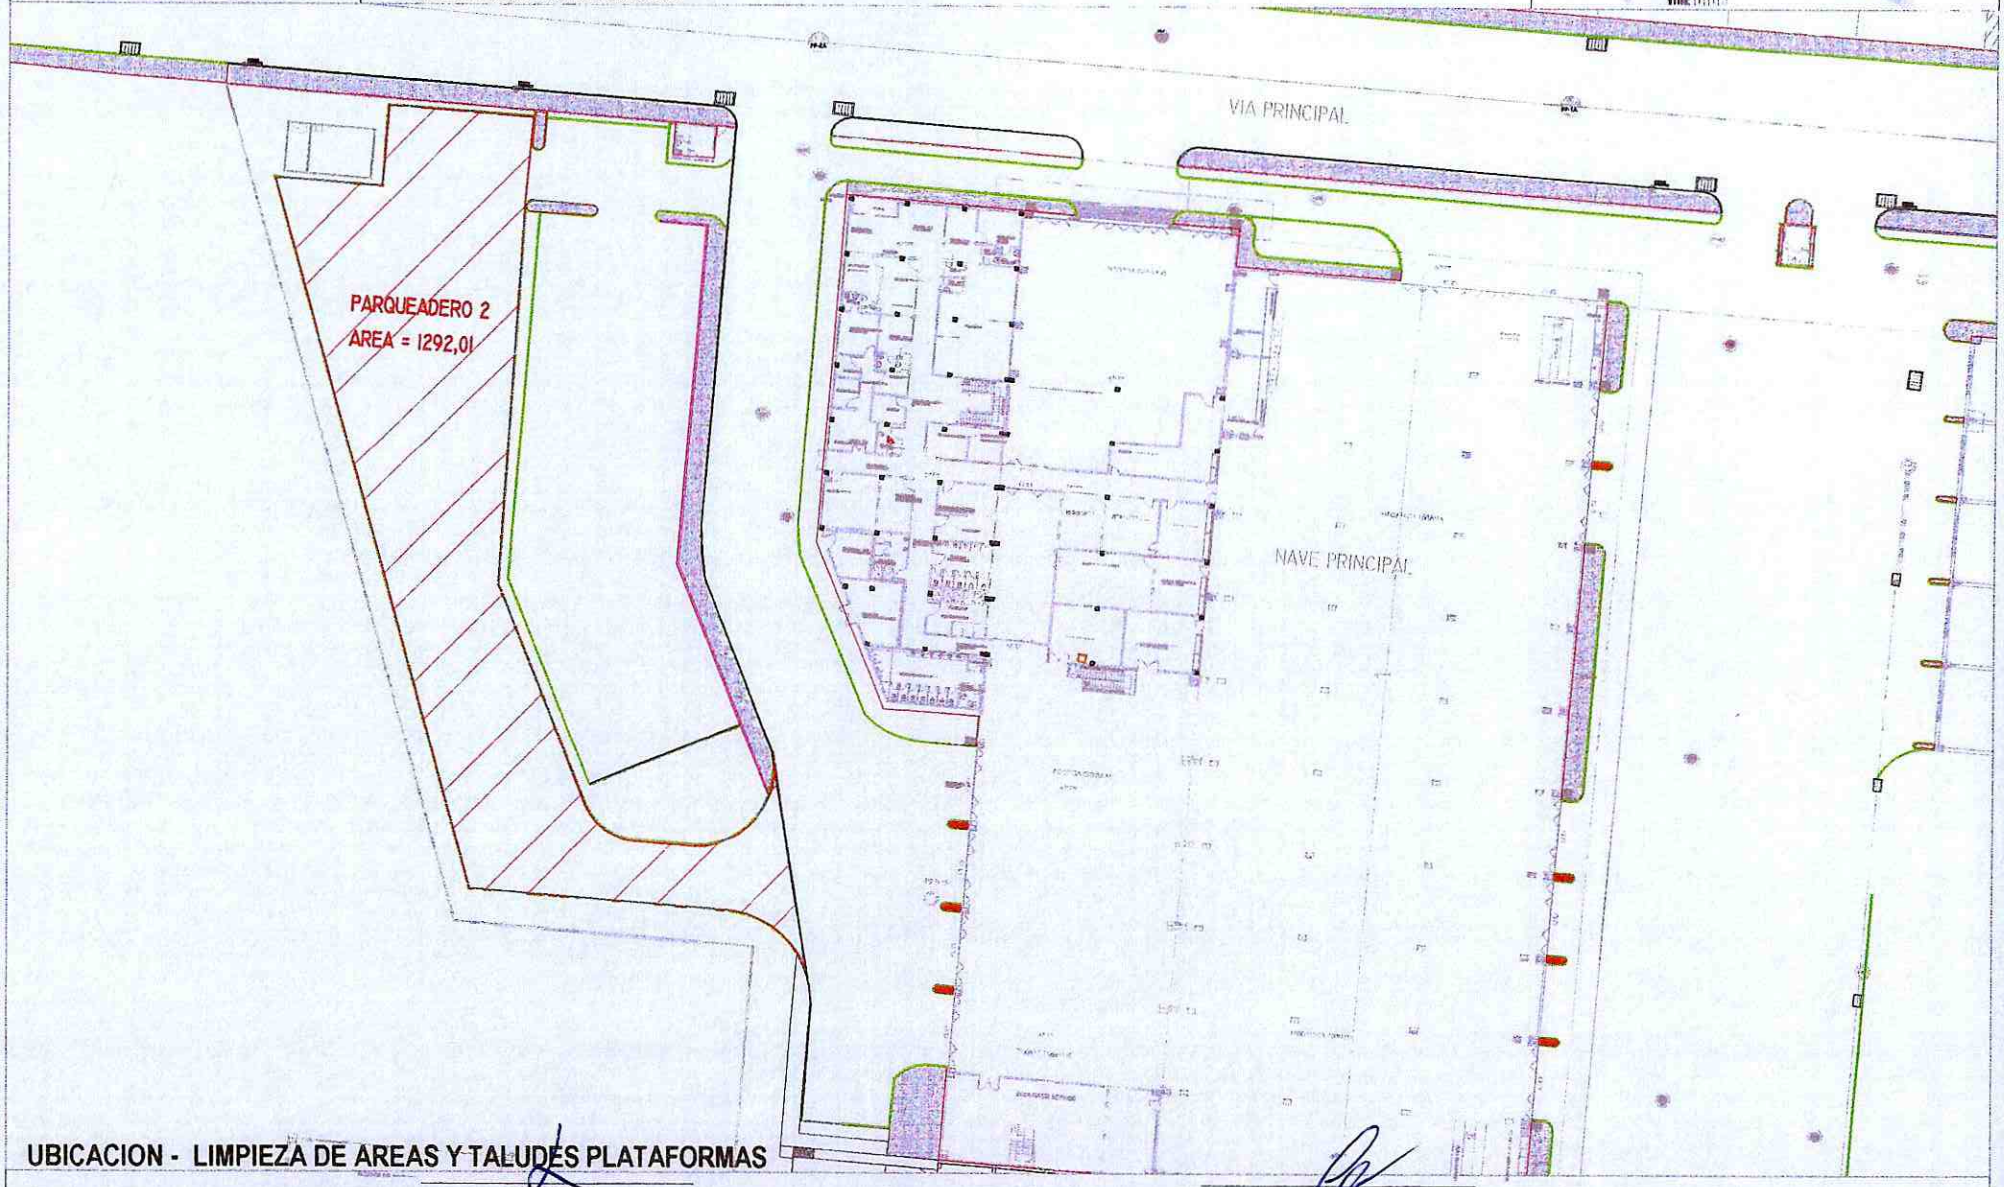

UBICACION - LIMPIEZA DE AREAS Y TALUDES PLATAFORMAS

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO " CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 23

RUBRO N° 20 ANEXO 1

DESCRIPCIÓN: EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA) ESTRuCTuRAS

UNIDAD: m3

PERIODO: 01-jun 30-jun

EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA) ESTRuCTuRAS						
TRAMPAS DE GRASA DEL PROYECTO						
DESCRIPCION	**LARGO (X)**	**ANCHO (Y)**	**ALTO (Z)**	**No.**	**SUBTOTAL**	**TOTAL**
TRAMPA DE GRASA 1 MEC. LIVIANA						
TRAMAPA DE GRASA 1	2,45	0,85	2,50	1,00	5,21	5,21
TRAMPA DE GRASA 2 MEC. PESADA						
TRAMAPA DE GRASA 2	3,50	1,20	2,50	1,00	10,50	10,50
TRAMPA DE GRASA 1 MEC. LIVIANA - 3 LAVADO ENGRASADO						
TRAMAPA DE GRASA 3	2,45	0,85	2,50	1,00	5,21	5,21
TRAMPA DE GRASA 4 MEC. PESADA						
TRAMAPA DE GRASA 4	2,45	0,85	2,50	1,00	5,21	5,21
				TOTAL 1		26,13

EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA) ESTRuCTuRAS						
BASES PARA GENERADORES INTERNOS Y EXTERNOS						
DESCRIPCION	**LARGO (X)**	**ANCHO (Y)**	**ALTO (Z)**	**No.**	**SUBTOTAL**	**TOTAL**
BASE PARA GENERADORES ADM PB						
BASE 1	2,25	1,90	1,10	1,00	4,70	4,70
BASES PARA CUARTO ELECTROGENO ADM PB						
BASE 2	3,85	1,90	1,10	1,00	8,05	8,05
BASE PARA GENERADORES EXTERIOR VIA C						
BASE 3	2,25	1,90	1,10	1,00	4,70	4,70
BASE PARA GENERADORES LAVADO ENGRASADO						
BASE 4	2,25	1,90	1,10	1,00	4,70	4,70
				TOTAL 2		22,15

RESUMEN DE PLANILLA AL 100%					
DESCRIPCION	**CONTRATADO**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**	**UNIDAD**
EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA) ESTRuCTuRAS	9.606,48	5.718,04	48,28	5.766,32	m3

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	20
DESCRIPCION	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA) ESTRuCTuRAS
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021

ANEXO: 1

CERRAMIENTO MALLA OESTE


PLANTA DE TRANPA DE GRASA 1
MEC. LIVIANA







PLANTA DE TRANPA DE GRASA 1

PLANTA DE TRANPA DE GRASA 2
MEC. PESADA

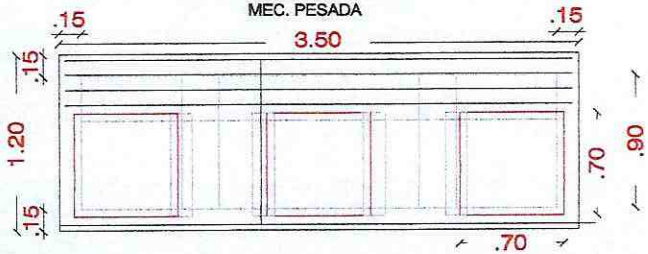


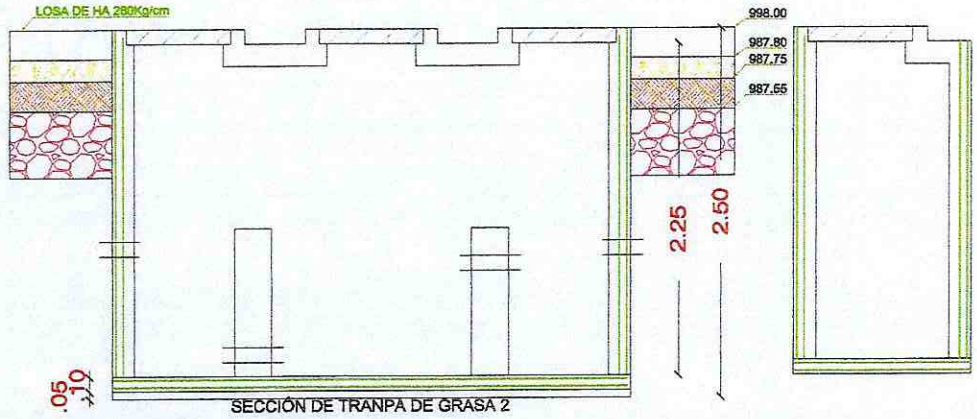

SECCIÓN DE TRANPA DE GRASA 2

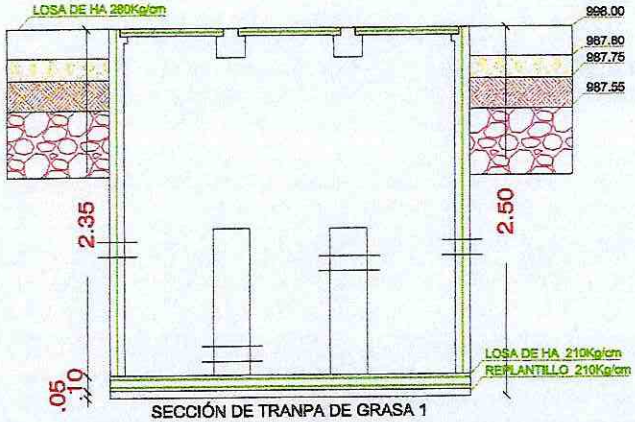

SECCIÓN DE TRANPA DE GRASA 1

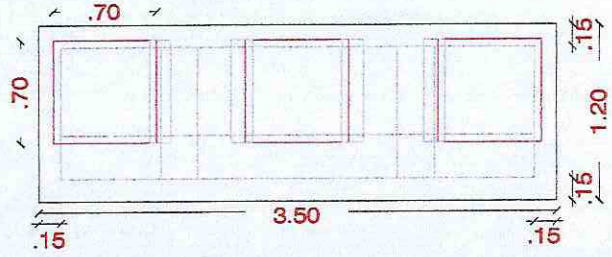

CONTRATISTA


FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

PROYECTO:	" CONSTRUCCIÓN DE LOS HANGARES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA (GADPPz) I ETAPA, PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA "
RUBRO	20 **ANEXO: 2**
DESCRIPCION	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (A mAQuINA) ESTRuCTuRAS
UNIDAD	m3
PERIODO	1 DE JUNIO 2021 A 30 DE JUNIO 2021


CERRAMIENTO MALLA OESTE

PLANTA DE TRANPA DE GRASA 3
NAVE DE LAVADO ENGRASADO




PLANTA DE TRANPA DE GRASA 1


PLANTA DE TRANPA DE GRASA 4
MAMPOSTERIA MEC. PESADA



PLANTA DE TRANPA DE GRASA 1

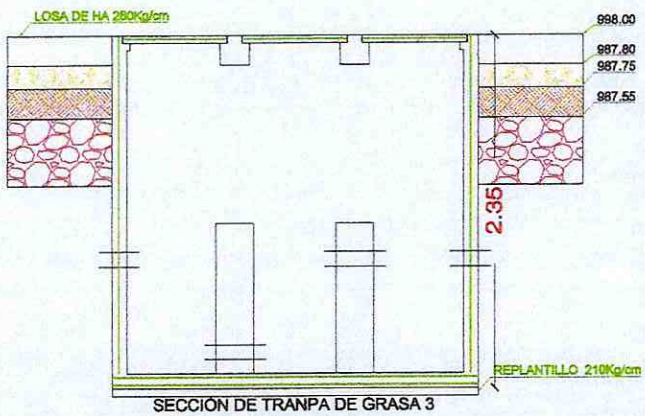

SECCIÓN DE TRANPA DE GRASA 3

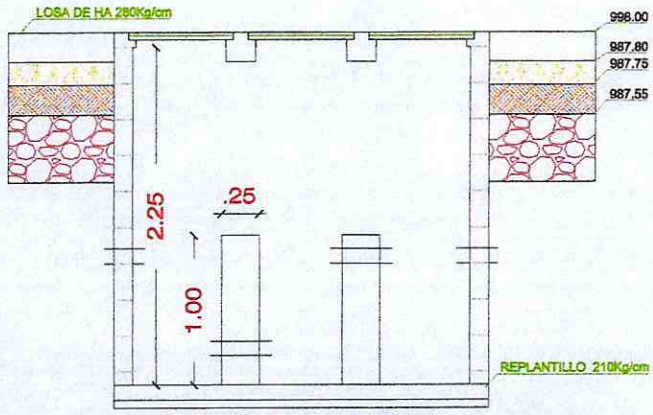

SECCIÓN DE TRANPA DE GRASA 4

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA

Dirección: Francisco de Orellana y 27 de Febrero

Telefono: 032885380 / Fax: 032886179

E-mail: financiero@pastaza.gob.ec

Web: www.pastaza.gob.ec

Contribuyente Especial: 590

RUC: 1660000170001

COMPROBANTE DE RETENCION

Nº 001-010-000018422

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

3108202107166000017000120010100000184221438939211

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

02/09/2021 9:33:04

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:

3108202107166000017000120010100000184221438939211

Razon Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO FATIMA **RUC/CI:** 1691725347001

Fecha Emisión: 31 de Agosto del 2021 **Guía de Remisión:**

Número de Documento	Cód. SRI	Descrip. Reten.	% Reten.	Base Retenciòn	Valor Retenido
001-002-000000044	346	1.75% IMPUESTO A LA RENTA	1.75	116,319.65	2,035.59
001-002-000000044	731	100% SRI RESOLUCION 074 075	100.00	13,958.36	13,958.36
				Total	15,993.95

Información Adicional:

Dirección:
Teléfono:



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 2-9-2021

Hora: 9:47:49

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: TELLO BENALCAZAR CARLOS PATRICIO 76210011

Num. Ref. BCE.:16810638

Institución Pública: GAD. PROV. PASTAZA/BDE CREDITO								# Cta.: 76210011
Institución Receptora: BANCO DEL AUSTRO								# Cta. Cte: 3600186
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO DEL AUSTRO	2117209353	67,756.20	418	1691725347001	CONSORCIO FATIMA	1	01-09-2021 00:00:00	ACREDITADA
Total:	67,756.20	Reg.:1						

Atrás
