GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 1484

Fecha: 12/09/2023

Asiento N° 4291 Compromiso N° 212

3BCE BDE CREDITO Cta Cte No 76210011 Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.** **USD 81,952.22**

LA SUMA DE: **OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS Dolares 22/100 Ctvs**

PUYO, 12 de Septiembre del 2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA..- ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500 PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA. REFERENCIA ASIENTO DE DIARIO N 4283 DE FECHA 05/09/2023 Y 4290 DE FECHA 12/09/2023.

Usuario: JESSIE

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor
CTA 16845671	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.	81,952.22
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	81,952.22

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS AI	58,017.65	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	139,969.87	
1.1.1.03.01.009	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / BDE CREDITO		81,952.22
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES		58,017.65
1.2.4.97.08.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTER. DE GAD'S Y EMPR. I		58,017.65
	SUMAN o PASAN USD	197,987.52	197,987.52

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D511.519.750105.000.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			139,969.87
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	139,969.87
01.01.A100.114.380108.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS		58,017.65	58,017.65
	TOTAL INGRESOS USD		58,017.65	58,017.65

Lcdo. Andre Granda
Prefecto Provincial

Lcda. Marilu Ordoñez
Directora Financiera(e)

Ing. Alexandra Pozo
Jefa De Contabilidad(e)

Ing. Gabriel
Tesorer

GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno del Árbol

Orden de Pago Nro. GADPPZ-GADPPZ-2023-0307-GOP

Puyo, 12 de septiembre de 2023

PARA: Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
Directora Financiera (E)

ASUNTO: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA.LTDA.

De mi consideración:

En conformidad con la solicitud orden de pago Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-0314-SOLOP del 12 de septiembre del 2023, considerando que la Dirección Financiera ha realizado el control previo del trámite de la "**PLANILLA DE LIQUIDACION Y EXCEDENTES DE LAS PLANILLAS Nro.- 4, 5 ,6 Y 7 DEL PROYECTO ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TENIENTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**, autorizo proceda con el pago en observancia de las disposiciones legales, a favor de **CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA.LTDA.** por el valor de 81,952.23 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. André Mauricio Granda Garrido
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

Anexos:
- solicitud_orden_de_pago_nro._gadppz-financiero-2023-0314-solop.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Abg. Jazmin Paola Rea Sangoquiza - Asistente Administrativo 2 --> Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes - Directora Financiera (E)

Firmado electrónicamente por:
ANDRE MAURICIO
GRANDA GARRIDO



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 20-9-2023
Hora: 10:54:24

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: SOSA ESPINEL GABRIEL ALEJANDRO 76210011

Num. Ref. BCE.:19056196

Institución Pública: GAD. PROV. PASTAZA/BDE CREDITO **# Cta.: 76210011**

Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO DEL AUSTRO	16845671	1,715.94	383	1691704528001	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTD	1	14-09-2023 00:00:00	ACREDITADA
BANCO DEL AUSTRO	16845671	81,952.22	383	1691704528001	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTD	1	14-09-2023 00:00:00	ACREDITADA
Total:	**83,668.16**	**Reg.:2**						

Atrás

GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno del Agua

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA

Dirección: Francisco de Orellana y 27 de Febrero

Telefono: 032885380 / Fax: 032886179

E-mail: financiero@pastaza.gob.ec

Web: www.pastaza.gob.ec

Contribuyente Especial: 590

RUC: 1660000170001

COMPROBANTE DE RETENCION

Nº 001-010-000021350

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1209202307166000017000120010100000213501438921215

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

13/09/2023 15:37:44

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:

1209202307166000017000120010100000213501438921215

Razon Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. **RUC/CI:** 1691704528001

Fecha Emisión: 12 de Septiembre del 2023 **Guía de Remisión:**

Número de Documento	Cód. SRI	Descrip. Reten.	% Reten.	Base Retenciòn	Valor Retenido
001-100-000000034	346	1.75% IMPUESTO A LA RENTA	1.75	10,962.64	191.85
001-100-000000034	731	100% SRI RESOLUCION 074 075	100.00	1,315.52	1,315.52
				Total	1,507.37

Información Adicional:

Dirección:
Teléfono:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE DIARIO N° 2361

Fecha: 12/09/2023

Asiento N° 4290 Compromiso N° 212 Retención N° 001-010-000021350

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA..- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION REAJUSTE PROVISONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION Y EXCEDENTE DE LA PLANILLA N 06 DEL PROYECTO ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500 PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

Usuario: JESSIE

DOCUMENTOS

Fecha	Documento	No	Autorización	Valor
07/09/2023	FACTURA	001100000000034	48755431514	12,278.16
07/09/2023	FACTURA	001100000000035	58755431511	70,468.90

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IVA	8,865.76	
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	73,881.30	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS		72,588.37
2.1.3.75.01.112	IMPUESTO A LA RENTA 1.75%		1,292.93
2.1.3.81.14.001	CXP IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI		8,865.76
	SUMAN o PASAN USD	82,747.06	82,747.06

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D511.519.750105.000.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS		73,881.30	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	73,881.30	0.00

Ing. Alexanda Pozo
Contadora General (e)

Ing. Jessie Rivadeneira
Contadora 1

R.U.C.: 1691704528001

FACTURA

No. 001-100-000000035

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0709202301169170452800120011000000000358755431511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-09-07 10:58:37

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0709202301169170452800120011000000000358755431511

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

Dirección Matriz: AMBATO / S/N / MACHALA

Dirección Sucursal: AMBATO / S/N / MACHALA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Identificación: 1660000170001

Fecha Emisión: 07/09/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PE-001		1.0	PLANILLA DE EXCEDENTES N. 6 - ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO (DESDED LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500)PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA		62918.660000	0.000000	62918.660000

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.468,90

SUBTOTAL 12%	62.918,66
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62.918,66
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.550,24
IRBPNR	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	70.468,90

Información Adicional

VENDEDOR: LOPEZ CHAVEZ ANGEL MISAEL

Nombre	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
Correo	financiero@pastaza.gob.ec
Direccion	FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO
Teléfono	032994220

R.U.C.: 1691704528001

FACTURA

No. 001-100-000000034

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0709202301169170452800120011000000000348755431514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-09-07 10:21:21

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0709202301169170452800120011000000000348755431514

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

Dirección Matriz: AMBATO / S/N / MACHALA

Dirección Sucursal: AMBATO / S/N / MACHALA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Identificación: 1660000170001

Fecha Emisión: 07/09/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
020		1.0	PLANILLA DE LIQUIDACION N. 8 ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO (DESDED LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500)PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA		10708.660000	0.000000	10708.660000
021		1.0	PLANILLA DE REAJUSTE N 08 - ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO (DESDED LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500)PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA		253.980000	0.000000	253.980000

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.278,16

SUBTOTAL 12%	10.962,64
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.962,64
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.315,52
IRBPNR	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	12.278,16

Información Adicional

VENDEDOR: LOPEZ CHAVEZ ANGEL MISAEL

Nombre GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

Correo financiero@pastaza.gob.ec

Direccion FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO

Teléfono 032994220

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE DIARIO N° 2360

Fecha: 05/09/2023

Asiento N° 4283 Compromiso N° 212 Retención N° 001-010-000021347

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA..- CONTABILIZACION DE LAS PLANILLAS DE EXCEDENTES DE LAS PLANILLAS N04, 05 Y 07 DEL PROYECTO ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500 PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

Usuario: ALE

DOCUMENTOS

Fecha	Documento	No	Autorización	Valor
01/09/2023	FACTURA	001100000000030	08755431515	27,064.88
01/09/2023	FACTURA	001100000000031	18755431510	3,566.25
04/09/2023	FACTURA	001100000000033	38755431515	46,180.36

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IVA	8,229.81	
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	68,581.68	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS		67,381.50
2.1.3.75.01.112	IMPUESTO A LA RENTA 1.75%		1,200.18
2.1.3.81.14.001	CXP IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI		8,229.81
	SUMAN o PASAN USD	76,811.49	76,811.49

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D511.519.750105.000.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS		68,581.68	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	68,581.68	0.00

LCDO. MARCELO CUEVA
Jefe De Contabilidad

ING. ALEXANDRA POZO
Contador 1

R.U.C.: 1691704528001

FACTURA

No. 001-100-000000030

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0109202301169170452800120011000000000308755431515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-09-04 10:47:24

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0109202301169170452800120011000000000308755431515

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

Dirección Matriz: AMBATO / S/N / MACHALA

Dirección Sucursal: AMBATO / S/N / MACHALA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Identificación: 1660000170001

Fecha Emisión: 01/09/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PE-001		1.0	PLANILLA DE EXCEDENTES N.4 - ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO (DESDED LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500)PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA		24165.070000	0.000000	24165.070000

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27.064,88

SUBTOTAL 12%	24.165,07
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.165,07
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.899,81
IRBPNR	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	27.064,88

Información Adicional

VENDEDOR: LOPEZ CHAVEZ ANGEL MISAEL

Nombre	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
Correo	financiero@pastaza.gob.ec
Direccion	FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO
Teléfono	032994220

R.U.C.: 1691704528001

FACTURA

No. 001-100-000000031

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0109202301169170452800120011000000000318755431510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-09-04 10:48:48

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0109202301169170452800120011000000000318755431510

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

Dirección Matriz: AMBATO / S/N / MACHALA

Dirección Sucursal: AMBATO / S/N / MACHALA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Identificación: 1660000170001

Fecha Emisión: 01/09/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PE-001		1.0	PLANILLA DE EXCEDENTES N. 5 - ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO (DESDED LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500)PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA		3184.150000	0.000000	3184.150000

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.566,25

SUBTOTAL 12%	3.184,15
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.184,15
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	382,10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	3.566,25

Información Adicional

VENDEDOR: LOPEZ CHAVEZ ANGEL MISAEL

Nombre	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
Correo	financiero@pastaza.gob.ec
Direccion	FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO
Teléfono	032994220

R.U.C.: 1691704528001

FACTURA

No. 001-100-000000033

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202301169170452800120011000000000338755431515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-09-04 10:50:44

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0409202301169170452800120011000000000338755431515

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

Dirección Matriz: AMBATO / S/N / MACHALA

Dirección Sucursal: AMBATO / S/N / MACHALA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Identificación: 1660000170001

Fecha Emisión: 04/09/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PE-001		1.0	PLANILLA DE EXCEDENTES N. 7 - ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO (DESDED LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500)PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA		41232.460000	0.000000	41232.460000

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	46.180,36

SUBTOTAL 12%	41.232,46
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	41.232,46
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.947,90
IRBPNR	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	46.180,36

Información Adicional

VENDEDOR: LOPEZ CHAVEZ ANGEL MISAEL

Nombre	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
Correo	financiero@pastaza.gob.ec
Direccion	FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO
Teléfono	032994220

GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno del Ánimo

Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-7596-M

Puyo, 06 de septiembre de 2023

PARA: Sr. Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
Director de Fiscalizacion

ASUNTO: INFORME GENERAL DE LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

De mi consideración:

Señor Director, como es de su conocimiento el proceso de construcción y planillaje del proyecto ***"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"***, ha finalizado. Una vez que el Banco de Desarrollo del Ecuador ha realizado los desembolsos correspondientes a los saldos pendientes para el pago de planillas de rubros contractuales, me permito remitir la descripción de los valores de cada una de las planillas aprobadas por la fiscalización y cuyos expedientes han sido remitidos a su Dirección en fechas anteriores. Lo anterior con el objetivo de que se revisen los valores pendientes de pago y los mismos sean cancelados según lo establecido en el contrato principal.

Para el efecto he solicitado al contratista un detalle de las facturas cobradas a la fecha, misma que describo a continuación para su revisión y validación con sus registros contables.

N°	DESCRIPCIÓN DE LA PLANILLA	VALOR DE LA PLANILLA CON IVA	FACTURA #	FECHA DE EMISIÓN	FACTURADO CON IVA	ANTICIPO DEVENGADO
PL. 1	CONTRACTUALES	$ 118,328.75	08	14/12/2022	$ 118,328.75	$ 47,331.50
PL. 2	CONTRACTUALES	$ 74,973.19	10	22/12/2022	$ 74,973.19	$ 29,989.28
PL. 3	CONTRACTUALES	$ 63,713.26	11	02/02/2023	$ 63,713.26	$ 25,485.30
PL. 4	CONTRACTUALES	$ 149,605.33	13	03/03/2023	$ 149,605.33	$ 59,842.13
PL. 5	CONTRACTUALES	$ 120,522.15	16	20/03/2023	$ 120,522.15	$ 48,208.86
PL. 6	CONTRACTUALES	$ 115,675.58	15	20/03/2023	$ 115,675.58	$ 46,270.23
PL. 7	CONTRACTUALES	$ 1,602.00	17	19/04/2023	$ 1,602.00	$ 640.80
PL. 8	CONTRACTUALES	$ 10,708.66	-	-	$ 10,708.66	$ 5,417.51
	TOTAL	**$655,128.92**			**$655,128.92**	**$ 263,185.61**

Cada planilla incluye su reajuste provisional, y en la planilla 8 se han enviado las planillas de reajustes definitivos de las planillas 1, 2 y 3, quedando por calcularse los reajustes definitivos de las planillas 4, 5, 6, 7 y 8 que se incluirán en el acta de entrega recepción definitiva.

Como usted podrá verificar en el cuadro anterior existen valores pendientes de pago, el valor pendiente de la planilla 4 es de $24,165.07 (valor por devengar, correspondiente al anticipo $9,666.03); el valor pendiente de la planilla 5 es de $3,184.15 (valor por devengar, correspondiente al anticipo $1,273.66),

Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-7596-M

Puyo, 06 de septiembre de 2023

el valor pendiente de la planilla 6 es de $62,918.66 (valor por devengar, correspondiente al anticipo $25,167.47); el valor pendiente de la planilla 7 es de $41,232.46 (valor por devengar, correspondiente al anticipo $16,492.98) y el valor pendiente de la planilla 8 es de $ 10,708.66 (valor por devengar, correspondiente al anticipo $5,417.51). Sin embargo, fueron ejecutadas y verificadas por fiscalización, como consta en las planillas consolidadas (planilla al 100% + planilla de incrementos).

En el siguiente cuadro la descripción de los valores de todas las planillas aprobadas en el contrato.

N°	DESCRIPCION DE LA PLANILLA	VALOR DE LA PLANILLA	ANTICIPO AMORTIZADO POR PLANILLA 40%
PL. 1	CONTRACTUALES	118,328.75	47,331,50
	INCREMENTO CONTRACTUAL	0.00	0.00
	TOTAL	$ 118,328.75	$ 47,331.50
PL. 2	CONTRACTUALES	63,897.32	25,558.93
	INCREMENTO CONTRACTUAL	11,075.87	4,430.35
	TOTAL	$ 74,973.19	$ 29,989.28
PL. 3	CONTRACTUALES	60,767.98	24,307.19
	INCREMENTO CONTRACTUAL	2,945.28	1,178.11
	TOTAL	$ 63,713.26	$ 25,485.30
PL. 4	CONTRACTUALES	149,605.33	59,842,13
	INCREMENTO CONTRACTUAL	24,165.07	9,666.03
	TOTAL	$ 173,770.40	$ 69,508.16
PL. 5	CONTRACTUALES	120,522.15	48,208.86
	INCREMENTO CONTRACTUAL	3,184.15	1,273.66
	TOTAL	$ 123,706.30	$ 49,482.52
PL. 6	CONTRACTUALES	115,675.58	46,270.23
	INCREMENTO CONTRACTUAL	62,918.66	25,167.47
	TOTAL	$ 178,594.24	$ 71,437.70
PL. 7	CONTRACTUALES	1,602.00	640.80
	INCREMENTO CONTRACTUAL	41,232.46	16,492.98
	TOTAL	$ 42,834.46	$ 17,133.78
PL. 8	CONTRACTUALES	6,765.79	5,417.51
	INCREMENTO CONTRACTUAL	3,942.87	0.00
	TOTAL	$ 10,708.66	$ 5,417.51
TOTALPLANILLADO		$ 786,629.26	$ 315,785.75

Particular que remito para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno del Ánimo

Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-7596-M

Puyo, 06 de septiembre de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edwin Gustavo Navas Manjarrez
FISCALIZADOR 1

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Ing. Mayra Alexandra Romero Peña - Analista de Estudios y Proyectos 1

Firmado electrónicamente por:
EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

GOBIERNO DE PASTAZA
El Gobierno del Ánimo

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA
Pastaza
Fecha: 06 SEP 2023
Recibido: Pao Pea
Número: 6115 Hora: 14:30

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-6115-M

Puyo, 05 de septiembre de 2023

PARA: Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
Directora Financiera (E)

ASUNTO: REINGRESO DE LA SOLUCITUD DE PAGO PLANILLA DE LIQUIDACIÓN, REAJUSTE PROVISIONAL Y DESCUENTO DEL VALOR DEL ANTICIPO NO DEVENGADO DEL CONTRATO DEL PROYECTO ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO.

En alcance al Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACIÓN-2023-5784-M, de fecha 18 de julio de 2023, se reingresa la Planilla de Liquidación del proyecto: **"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",** una vez que el ingeniero Edwin Gustavo Navas Manjarrez – Fiscalizador 1 (Administrador de Contrato) a través del Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023 -7575-M, ha subsanado las observaciones emitidas por el área de Contabilidad.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: JEFE (A) DE PRESUPUESTO
Pastaza
Fecha: 06 SEP 2023

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
DIRECTOR DE FISCALIZACION

Ejecutar el control previo al compromiso Verificando disponibilidad presupuestaria, y emitir certificación financiera, conforme a las Leyes y Reglamentos vigentes.

Referencias:
- GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-7575-M

Anexos:
- reprogramacion_04_y_05_aprobada0303423001689266313.rar
- cronogramas_ofertado0143114001689264835.rar
- ensayos_control_de_calidad0472523001689264849.rar
- facturas_iess_abril_20230525374001689264862.rar
- garantias033707300168926487 4.rar
- informe_ambiental_abril_20230790326001689264889.rar
- informe_contratista_abril_2023_planilla_08_liq-signed0304378001689264903.pdf
- libro_de_obra_abril_2023-signed0492847001689264927.pdf
- oficios_enviados_a_fiscalizacion_abril_20230267794001689264949.rar
- oficios_recibidos_fisca_abril_2023068874400168926573 2.rar
- planilla_08_liquidacion_escaneada-signed0594535001689266265.pdf
- planilla_08_liquidacion_aprobada0998541001689266280.rar
- reaustes_definitivos0966507001689266296.rar
- poliza_de_fiel_cumplimiento.pdf
- cotizaciÓn_de_obra_allushungo_rec-signed-signed-signed-signed.pdf
- adjudicar_a_proveedores0920049001653574506.pdf
- resoluciÓn_ad.alishungo-signed-signed-signed.pdf
- autorizacion_de_inicio0219584001651006283.pdf
- compromiso755-signed-signed.pdf

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL
Pastaza
Fecha: 06 SEP 2023

Ejecutar el control previo y efectuar La contabilización, conforme leyes y Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL
Pastaza
Fecha: 06 SEP 2023

Ejecutar el control previo al pago Conforme leyes y reglamentos Vigentes.

* Documento firmado electrónicamente por Quipux - yasuni.pastaza.gob.ec producción

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-6115-M

Puyo, 05 de septiembre de 2023

- obras_publicas_2022_5374-m.pdf
- acta_apertura_de_ofertas_005-signed_(1)-signed-signed_(1)-signed.pdf
- acta_calificacion_coto-gadppz-005-2022-signed-signed-signed-signed.pdf
- acta_acta_de_mypes_y_eps_locales-signed-signed_(2)-signed-signed.pdf
- estudio_ambiental_aprobado_pma.pdf
- especificaciones_tecnicas_allishungo008744900165100628 4.pdf
- certf_presupuestaria.pdf
- presupuesto_asfaltado_cv_allishungo___palma_roja___el_pantanal_20220735003001647273776.pdf
- preguntas_respuesta_1.pdf
- proveedores_que_enviaron_propuestas.pdf
- acta_de_convalidacion_allishungo-signed-signed-signed-signed.pdf
- borrador_de_pliego_coto_005_-signed.pdf
- preguntas_respuesta_2.pdf
- resolucion_de_aprobacion_e_inicio_de_proceso.pdf
- parametros_cotizacion3.pdf
- perez_alvarez_washington_antonio_mypes0643870001652902552.pdf
- narvaez_guevara_jose_luis_mypes0429342001652902552.pdf
- horna_sanchez_tania_lisbeth_mypes.pdf
- flores_carvajal_carlos_santiago_mypes.pdf
- constructora_eddymich_cia_ltda_mypes0690228001652902551.pdf
- aillon_aillon_alex_paul_mypes.pdf
- proveedores_que_enviaron_propuestas0214008001652902551.pdf
- torres_arteaga_nathalia_ximena_mypes0857411001652902552.pdf
- acta_sesion_3_preguntas_aclaraciones_allishungo-signed-signed-signed-signed.pdf
- acta_sesion_2_allishungo-signed-signed-signed-signed037665500165100628 3.pdf
- notificacion_administrador_de_contrato094_coto_005-signed.pdf
- poliza_de_buen_uso_anticipo0025228001655826736.pdf
- ambiental0004128001689264589.rar
- ampliaciones.rar
- contratista_obra0617975001689264619.rar
- fiscalizacion0222175001689264635.rar
- ampliaciÓn_nº_3-signed0136582001689264645.pdf
- recepciÓn_provisional_de_obra-signed0996543001689264652.pdf
- planillas_aprobadas0790881001689264671.rar
- reaustes_definitivos0223499001689264685.rar
- informe_020_aprobacion_planilla_8-signed.pdf
- oficio_fisca_2023-47-solicitud_pagoplanilla_obra_08-signed.pdf
- memoria_fotografica_planilla_08-signed0031552001689264736.pdf
- señaleticas0610515001689264754.rar
- anexo_abril_2023_planilla_080379344001689264790.dwg
- anexo_planilla_08_0492819001689264818.lsx
- memorando_nro._gadppz-estudios-proyectos-2023-7575-m.pdf

Copia:
Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaria Ejecutiva 2 /**

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - Secretaria Ejecutiva 2

Firmado electrónicamente por:
JAIR FERNANDO LEDESMA BASTIDAS

* Documento firmado electrónicamente por Quipux - yasuni.pastaza.gob.ec producción

GOBIERNO DE PASTAZA
El Gobierno del Aliento

Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-7575-M

Puyo, 04 de septiembre de 2023

PARA: Sr. Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
Director de Fiscalizacion

ASUNTO: ENTREGA DE INFORMACIÓN TRÁMITE DE PAGO PLANILLA DE LIQUIDACIÓN, REAJUSTE PROVISIONAL D8 - PLANILLA DE LIQUIDACIÓN Y DESCUENTO DEL VALOR DE ANTICIPO NO DEVENGADO DEL CONTRATO DEL PROYECTO ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO.

De mi consideración:

En relación al Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5882-M, en el cual se realiza algunas observaciones para que las mismas sean solventadas referente al Proyecto: **"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",** cuyo código es **COTO-GADPPz-005-2022.**
Adjunto al presente Usted puede encontrar lo solicitado y de la manera como se indica en el Documento; tales como:

- Las observaciones en CD.
- Las observaciones en físico: check list, justificaciones para las ampliaciones de plazo, planillas de obra, informe económico, oficios de conformidad ambiental.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN DE FISCALIZACION
Pastaza
Fecha: 04 SEP 2023
Recibido: EM
Número: 7573. Hora: 14:35

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edwin Gustavo Navas Manjarrez
FISCALIZADOR 1

1.75% = 2.493.11
Ant = 58.017,65
Benef = 81,952,22

Referencias:
- GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5882-M

Anexos:
- reprogramacion_04_y_05_aprobada0303423001689266313.rar
- reaustes_definitivos0966507001689266296.rar
- planilla_08_liquidacion_aprobada0998541001689266280.rar
- planilla_08_liquidacion_escaneada-signed0594535001689266265.pdf
- oficios_recibidos_fisca_abril_20230688744001689265732.rar
- oficios_enviados_a_fiscalizacion_abril_20230267794001689264949.rar
- libro_de_obra_abril_2023-signed0492847001689264927.pdf
- informe_contratista_abril_2023_planilla_08_liq-signed0304378001689264903.pdf
- informe_ambiental_abril_20230790326001689264889.rar
- garantias0337073001689264874.rar
- facturas_iess_abril_20230525374001689264862.rar

Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-7575-M

Puyo, 04 de septiembre de 2023

- ensayos_control_de_calidad0472523001689264849.rar
- cronogramas_ofertado0143114001689264835.rar
- anexo_planilla_08_0492819001689264818.lsx
- anexo_abril_2023_planilla_080379344001689264790.dwg
- señaleticas0610515001689264754.rar
- memoria_fotografica_planilla_08-signed0031552001689264736.pdf
- oficio_fisca_2023-47-solicitud_pagoplanilla_obra_08-signed.pdf
- informe_020_aprobacion_planilla_8-signed.pdf
- reaustes_definitivos0223499001689264685.rar
- planillas_aprobadas0790881001689264671.rar
- recepciÓn_provisional_de_obra-signed0996543001689264652.pdf
- ampliaciÓn_n°_3-signed0136582001689264645.pdf
- fiscalizacion0222175001689264635.rar
- contratista_obra0617975001689264619.rar
- ampliaciones.rar
- ambiental0004128001689264589.rar
- poliza_de_buen_uso_anticipo0025228001655826736.pdf
- notificacion_administrador_de_contrato094_coto_005-signed.pdf
- acta_sesion_2_allishungo-signed-signed-signed-signed0376655001651006283.pdf
- acta_sesion_3_preguntas_aclaraciones_allishungo-signed-signed-signed-signed.pdf
- torres_arteaga_nathalia_ximena_mypes0857411001652902552.pdf
- proveedores_que_enviaron_propuestas0214008001652902551.pdf
- aillon_aillon_alex_paul_mypes.pdf
- constructora_eddymich_cia_ltda_mypes0690228001652902551.pdf
- flores_carvajal_carlos_santiago_mypes.pdf
- horna_sanchez_tania_lisbeth_mypes.pdf
- narvaez_guevara_jose_luis_mypes0429342001652902552.pdf
- perez_alvarez_washington_antonio_mypes0643870001652902552.pdf
- parametros_cotizacion3.pdf
- resolucion_de_aprobacion_e_inicio_de_proceso.pdf
- preguntas_respuesta_2.pdf
- borrador_de_pliego_coto_005_-signed.pdf
- acta_de_convalidacion_allishungo-signed-signed-signed-signed.pdf
- proveedores_que_enviaron_propuestas.pdf
- preguntas_respuesta_1.pdf
- presupuesto_asfaltado_cv_allishungo___palma_roja___el_pantanal_20220735003001647273776.pdf
- certf_presupuestaria.pdf
- especificaciones_tecnicas_allishungo0087449001651006284.pdf
- estudio_ambiental_aprobado_pma.pdf
- acta_acta_de_mypes_y_eps_locales-signed-signed_(2)-signed-signed.pdf
- acta_calificacion_coto-gadppz-005-2022-signed-signed-signed-signed.pdf
- acta_apertura_de_ofertas_005-signed_(1)-signed-signed_(1)-signed.pdf
- obras_publicas_2022_5374-m.pdf
- compromiso755-signed-signed.pdf
- autorizacion_de_inicio0219584001651006283.pdf
- resoluciÓn_ad.alishungo-signed-signed-signed.pdf
- adjudicar_a_proveedores0920049001653574506.pdf
- cotizaciÓn_de_obra_allushungo_rec-signed-signed-signed-signed.pdf
- poliza_de_fiel_cumplimiento.pdf
- formatos_de_ampliaciones_de_plazo.rar
- ampliacion_de_plazo.rar
- planilla_10752555001693846983.rar
- planilla_20254842001693846984.rar
- planilla_30570470001693846984.rar
- planilla_40867397001693846984.rar
- planilla_50039986001693846985.rar
- planilla_60344524001693846985.rar

* Documento firmado electrónicamente por Quipux - yasuni.pastaza.gob.ec producción

Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-7575-M

Puyo, 04 de septiembre de 2023

- planilla_70841026001693846985.rar
- planilla_8_-_liquidaciÓn00167190016938469 86.rar
- check_list_8-allishungo-signed03525510016938470 23.pdf
- liquidaciÓn_econÓmica_-_allishungo-signed.pdf

EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

CONTROL PREVIO

				FINANCIERO	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.	**TIPO DE PROCESO**		**TIPO DE PROCESO**	
DOCUMENTO:	PLANILLA Nº 8 - PLANILLA DE LIQUIDACIÓN , REAJUSTE PROVISIONAL DE PLANILLA Nº 8 - PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	**CONTRATO**	**PLANILLA**	**CONTRATO**	**PLANILLA**
CONCEPTO:	PAGO		X		
FECHA DEL DOCUMENTO:	12 de julio de 2023				
TIPO DE PROCESO	COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-005-2022				
VALOR INCLUIDO IVA:	$ 6,210.55	**APLICA**		**APLICA**	
	CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**
1	Requerimiento				
2	Estudios del proyecto				
3	Informe técnico y económico				
4	Factibilidad Ambiental				
5	Certificación POA				
6	Certificación Presupuestaria				
7	Convenio				
8	Pliegos del Procedimiento				
9	Informe Técnico de Evaluación de Ofertas				
10	Resolución de Adjudicación				
11	Garantía Original de fiel Cumplimiento del contrato				
12	Garantía Original de Buen Uso del Anticipo				
13	Certificado de no Adeudar al GADPPz				
14	Documentos Personales / Representante Legal				
15	Certificación Bancaria				
16	Certificado de cumplimiento Tributario (SRI)				
17	RUC Actualizado				
18	Contrato original y disposición escrita de trabajo (proceso completo)				
19	Planilla Nº 8 - Planilla de Liquidación	X		✓	
20	Rejuste Definitivo del Anticipo				
21	Reajuste Provisional de la Planilla Nº 8 - Planilla de Liquidación	X		✓	
22	Orden de Inicio de Trabajos				
23	Planilla de obra de liquidación			✓	
24	Planilla de obra orden de trabajo				
25	Anexos de Obra	X			
26	Cuadro de Diferencia de Cantidades			✓	
27	Conformidad Ambiental	X		✓	
28	Informe de avance de Obra de Administrador de contrato	X		✓	
29	Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales (IESS) Planilla	X		✓	
30	Libro de obra	X			
31	Acta de recepción provisional			✓	
32	Certificado de no ser obra nueva				
33	Multa				
34	Autorizacion de la máxima Autoridad para prórroga de Plazos				
35	Autorizacion de la máxima Autoridad para Rubros Nuevos				
36	Certificado que no es obra nueva				
37	Solicitud de recepción de Obra				
38	Solicitud de pago del Administrador del Contrato	X		✓	
39	Solicitud de pago del Dierector de la Unidad al Financiero			✓	
40	Factura/Nota de Venta			✓	
41	Validación de la factura/Nota de Venta			✓	
OBSERVACIONES:					
Revisado por:	EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ **ING. EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ** **ADMINISTRADOR DE CONTRATO**			**DEPARTAMENTO FINANCIERO**	

Puyo, 25 de enero de 2023

Oficio No. 03-EDDYMICH-2023

INGENIERO
Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO - *"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"*

ASUNTO: AMPLIACIÓN DE PLAZO 01

Presente.-

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus funciones cotidianas.

En función de las distintas actividades programadas que se ha venido desarrollando en el proyecto ***ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA***, solicito que se otorgue una ampliación de plazo de 40 días por causa de excedentes en ciertos rubros contractuales, incidencia de lluvias que paralizaron actividades programadas y caso fortuito o de fuerza mayor suscitados en la vía durante la ejecución de los trabajos, la documentación probatoria a la solicitud de prorroga se anexa al presente documento y se detalla en el mismo.

ANTECEDENTES Y ASPECTOS RELEVANTES:

- En la ciudad de Puyo, a los 20 días del mes de junio del 2022, se suscribe el contrato COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-005-2022, cuyo objeto es: "**ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500) PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",** entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza legalmente representado por el Ing. Jaime Patricio Guevara Blaschke, Prefecto Provincial; y por otra parte, en calidad de Contratista, la Constructora EDDYMICH CIA. LTDA., por un monto contractual de **$789.464,39 (SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 39/100)** dólares americanos sin incluir IVA, y con un plazo de 180 días.

- Mediante contrato ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500) PARROQUIA TNTE.

HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, se designa al Ing. Gustavo Navas como Administrador de Contrato.

- Con fecha 4 de julio de 2022 el GAD Provincial de Pastaza, acredito en la cuenta del contratista el monto de $ 315,785.75 correspondiente al anticipo.

- Con fecha 18 de agosto de 2022 se efectuó el pago por parte del GAD Provincial de Pastaza a la cuenta del Fiscalizador el monto de $ 19,984,06 correspondiente al anticipo mediante SPI-SP del BCE.

- Mediante ACTA DE NOTIFICACIÓN DE INICIO, en la ciudad de puyo, a los 31 días del mes de agosto de 2022, se procede a la entrega en sitio donde se ejecutarán los trabajos concernientes al Contrato suscrito con fecha 27 de julio de 2022, cuyo objeto de contratación es la **"FISCALIZACIÓN DEL ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500) PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",** por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza con su representante legal Ing. Jaime Patricio Guevara Blashke, Prefecto de Pastaza; por otro lado el Ing. Guamán Iler Omar Henry FISCALIZADOR EXTERNO, para este propósito se reúnen el Ing. Gustavo Navas, en calidad de Administrador de Contrato de Fiscalización, el Ing. Guamán Iler Omar Henry, en calidad de Fiscalizador Externo, con la finalidad de suscribir la presente Acta de inicio de plazo contractual. Conforme a la RESOLUCIÓN No. RE – SERCOP – 2021 se establece la notificación de que los dos anticipos se encuentran disponibles, para lo cual se remite esta NOTIFICACIÓN DE INICIO DE PLAZO hoy 31 de agosto de 2022 y para efectos de contabilización de plazo será a partir del día siguiente de esta notificación (1 de septiembre de 2022).

- En el registro del libro de obra del día 1 de octubre de 2022, por parte de la fiscalización ***"Se autoriza realizar los incrementos de movimiento de tierras "Excavación sin clasificar".***

  Como observaciones se pone en conocimiento que ***"Se dará tramite de una Orden de Cambio con los incrementos realizados a partir de este periodo del rubro correspondiente R3 "Excavación sin clasificar (Mov. de tierra) con la disminución del Rubro R11 "Muro de Gaviones calibre # 12".***

  Dentro de las instrucciones de la fiscalización da a conocer que ***"Se debe realizar el movimiento de tierras "Excavación sin clasificar" que sobrepasa el 100% de volumen contratado, con el fin de cumplir el objeto contractual."***

- En el registro del libro de obra del día 1 de noviembre de 2022, por parte de la fiscalización ***"Se autoriza realizar los incrementos de movimiento de tierras "Excavación sin clasificar" y se autoriza el desalojo de excavaciones a las escombreras autorizadas."*** Como observaciones realizadas por la fiscalización se pone en conocimiento que ***"Se dará tramite de una Orden de Cambio N° 2 con los incrementos realizados a partir de este periodo del rubro incrementado R3 "Excavación sin clasificar (Mov. de tierras) y Rubro R15 transporte material de desalojo"".***
  Dentro de las instrucciones de la fiscalización da a conocer que ***"Se debe realizar movimiento de tierras "Excavación sin clasificar" que sobrepasa el 100% de volumen contratado, con el fin de cumplir el objeto contractual y realizar el los desalojos en las escombreras autorizadas."***

- Con fecha 17 de octubre de 2022 mediante Oficio No. 008-EDDYMICH-2022 se procede realizar la entrega a la fiscalización de la planilla de avance 01 correspondiente al periodo septiembre de 2022, donde el Rubro N°3 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR (MOV. DE TIERRA) se encuentra ejecutado en un 96,63% en la planilla de avance de obra total y planilla de avance de obra al 100%, lo cual nos indica que para el siguiente periodo de octubre se generaría excedentes de obra por la diferencia de cantidades reales y las que consta en el cuadro de cantidades estimadas en el contrato.

- Mediante Oficio No. 009-EDDYMICH-2022 de fecha 19 de octubre de 2022 dirigido a la fiscalización, se procede a entregar una proyección de las cantidades de obra que se estima superaran las cantidades contratadas para que sea considerado para su revisión, análisis y aprobación, y de ser pertinente se proceda conforme lo establece el contrato COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-005-2022 en su CLAUSULA VIGÉSIMA.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ORDENES DE TRABAJO, 19.1. *"Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir e la ejecución de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u ordenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica."*

- Con fecha 22 de noviembre de 2022 mediante Oficio No. 012-EDDYMICH-2022 se procede realizar la entrega a la fiscalización de la planilla de avance 02 correspondiente al periodo octubre de 2022, donde el Rubro N°3 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR (MOV. DE TIERRA) se encuentra ejecutado en un 263,31% en la planilla de avance de obra total y en un 163,31% en la planilla de excedentes (monto de incremento 11,075,87 USD equivalente al 1,40%), siendo un rubro en el cual existe la necesidad de ejecutar en una

cantidad mayor, para que la vía disponga de todas las características necesarias y cumpla con la funcionalidad con la que fue destinada inicialmente, para poder cumplir con las normas y especificaciones técnicas de la vía que se encuentra en construcción y que no fueron previstas en el contrato.

- Mediante Oficio No. 013-EDDYMICH-2022, de fecha 24 de noviembre de 2022 dirigido a fiscalización, se envía una SOLICITUD PARA PRESENTACIÓN DE REPROGRAMACIÓN N° 02, debido a los incrementos de volúmenes de obra del Rubro N°3 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR (MOV. DE TIERRA), el cual ha superado el 100% de la cantidad contratada, siendo los trabajos que están considerados en la ejecución de este rubro principalmente corte de taludes y cajoneras para determinar los anchos de vías necesarios para poder cumplir con la normas y especificaciones técnicas de la vía que se encuentra en construcción y que no fueron previstas en el contrato.

- Con fecha 01 de diciembre de 2022, la fiscalización mediante OFICIO N. 020-2022-FISC-EXT comunica que en atención al Oficio No. 013-EDDYMICH-2022 de fecha 24 de noviembre de 2022 donde el contratista solicita la presentación de la reprogramación Nro. 2 en base a los incrementos presentados en el periodo de ejecución del mes 2 del proyecto "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.", se emite la ORDEN DE CAMBIO No. 1 aprobada por Fiscalización Externa y el Administrador de contrato; por tal motivo solicita se realice la reprogramación No 2 en base a la orden de cambio No. 1 y la proyección de ejecución del periodo del mes 3.

- Con fecha 6 de diciembre de 2022 mediante OFICIO N. 022-2022-FIS-EXT la fiscalización comunica que en atención al Oficio No. 015-EDDYMICH-2022, que la Reprogramación Nro. 2 ha sido aprobada por parte del Administrador de Contrato y Fiscalización Externa; comunica se dé cumplimiento con la ejecución reprogramada.

- Mediante Oficio No. 021-EDDYMICH-2022 del 20 de diciembre de 2022, se solicita la APROBACIÓN DE UNA VARIANTE DEL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA ABSC. 2+480-2+666,73 POR MOTIVO DE DESLIZAMIENTO DE LA MESA DE LA VÍA EXISTENTE, ya que posterior a los trabajos terminados de excavación de cajeras y relleno con material de mejoramiento de la vía en el tramo comprendido entre las abscisas 2+540 hasta la 2+560, el día miércoles 27 de diciembre de 2022 se produjo un deslizamiento del suelo natural de la rasante de la vía ya conformada a nivel de relleno con material de

mejoramiento, dicho deslizamiento provoco que se fuera la mesa de la vía casi en la totalidad (80%) de su acho, dicho deslizamiento acarreo gran parte del material que conformaba la vía a una distancia de aproximadamente 40 metros, provisionalmente se ha tratado de habilitar la vía en este tramo tomando en cuenta todas las medidas de seguridad para garantizar el tránsito vehicular y peatonal. Cabe indicar que de acuerdo a testimonios de los moradores del sector este tramo de vía fue conformado con material de relleno resultante de desalojos años atrás cuando recién se construía la vía, y que anteriormente ya había existido este inconveniente con la vía en este tramo por la presencia de un gran nivel freático que se encuentra cerca de sitio (ojo de agua), y que el lugar por encontrarse en una hondonada acumula gran parte de agua lluvia que no es drenada correctamente. De acuerdo a las características que se dio el deslizamiento se presume que las aguas se han venido acumulando en este sitio ya sea por el aporte del ojo de agua existente en la cercanía o por las aguas lluvias que no se escurren correctamente, lo cual provocaron que el suelo que conformaba la vía existente (proveniente de desalojos) no tenga la capacidad portante requerida para soportar el peso del material de relleno que se venía colocando en la vía y el transitar permanente de la carga ocasionada por la volquetas cargadas, en este sitio se tiene previsto la colocación de una alcantarilla metálica (armico) para evacuar las aguas que se junten en este sector ya sea por escurrimiento de aguas lluvias y/o el ojo de agua que se encuentra cerca.

- En la Planilla de Avance de Obra 04, correspondiente al periodo de diciembre de 2022, se registra los siguientes excedentes:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U	CONTRATO		CANTIDADES REALIZADAS	% EJECUTADO EN EXCEDENTE
			CANTIDAD	DÍAS TOTALES CONTABILIZADOS EN CRONOGRAMA VIGENTE	ACUMULADO	
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9419,69	60	19.473,82	206,74
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M3	1412,95	60	29.833,42	2.111,43

Siendo estas cantidades (excedentes) de obra ejecutadas mayores a las cantidades contratadas, la cuales tenían un determinado tiempo de ejecución de acuerdo al cronograma valorado de trabajos ofertado.

- De acuerdo a la reprogramación N° 02 del cronograma valorado de trabajos, en el periodo de diciembre de 2022, donde se tenía previsto iniciar con los trabajos de asfaltado desde la Absc. 0+000 a 2+000, donde las actividades más relevantes a ser

desarrolladas serian el RUBRO N°14 de MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS, RUBRO N° 19 de ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACIÓN y RUBRO N°20 de C. RODADURA HORMIGÓN ASF. MEZCLADO EN PLANTA E=2". En este periodo de diciembre de 2022 se produjeron paralizaciones de los trabajos relacionados con los rubros antes mencionados por cuestiones climatológicas de lluvias intensas suscitadas en los días 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, lo cual fue registrado en el libro de obra y en un registro de estado del tiempo. La información climatológica para corroborar las lluvias en este periodo se encuentra sustentada en el Registro de Información Climatológica Aeronáutica de Precipitaciones (código: GMET-PR-001-RG-005) de la Dirección General de Aviación Civil-Aeropuerto "Rio amazonas"-Shell Mera.

ANÁLISIS:

- Contrato de COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-005-2022, **Clausula Novena: Prorroga de plazo**, numeral **9.1**, literal **b)** Cuando la contratante ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizara las figuras del contrato complementario , diferencia en cantidades de obra u ordenes de trabajo, según aplique de acuerdo con la ley Orgánica del sistema Nacional de Contratación Pública., literal **c)**Por suspensiones en los trabajos o cabios de las actividades previstas en el cronograma motivadas por la contratante u ordenadas por ella, a través de la fiscalización , y que no se deban a causas imputables al contratista., numeral **9.2** En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que, suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la contratante, previo informe del administrador del contrato y de la fiscalización.

- Que, la Norma de control Interno de la Contraloría General del Estado No. 408-27 el contratista deberá imponer la solicitud de prórroga de conformidad con las disposiciones contractuales después de conocer el hecho que demorará la ejecución

y en cuanto tenga la información suficiente, aportará la documentación probatoria necesaria para que la administración pueda resolver el reclamo.

- Que, la Norma de control Interno de la Contraloría General del Estado No. 408-27 el aumento del plazo de la construcción procede cuando se presentan atrasos por caso fortuito o fuerza mayor que afecte el progreso de la obra. En el primer caso, el atraso puede ser causado en situaciones, como: robos del equipo utilizado, destrucción vandálica de las obras, cierres de carreteras o cualquier acto realizado por personas o animales que causen daños a la obra o afecten su desarrollo normal. En el caso de fuerza mayor, el atraso puede darse por inundaciones, terremotos, huracanes, etc., es decir por fenómenos naturales.

- Que, las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, en su numeral *408-25 Incidencia de lluvias* y *408-27 Prorrogas de plazo*, indican:

  *"**408-25**...Si las labores se suspenden a causa de la lluvia, se hará constar en el libro de obra o un registro la fecha en la cual se presentó esa condición, cuales trabajos se suspendieron, a qué hora y por cuanto tiempo, en qué medida fueron afectados y se expondrán las razones por las cuales no se pudo continuar. Las anotaciones serán ratificadas por la firma del Fiscalizador encargado de llevar este control, así como por la del profesional representante del contratista. Los datos así recabados se emplearán, en conjunto con el programa de ejecución, para determinar la prórroga de plazo que se autorizara por este concepto.*

  ***408-27**...son motivos de ampliación las siguientes causas comprobadas:*
  - *Falta de materiales de construcción o equipos a incorporar en el mercado nacional o internacional.*
  - *Periodos de lluvia que perjudiquen el avance de las obras conforme lo señalado en las Normas de Control Interno 408-25.*
  - *Cambios, trabajos extraordinarios o ampliaciones de la obra que requieran aumento de plazo."*

- La **normal ejecución de los trabajos de imprimación y asfaltado en la vía**, depende en gran parte de la presencia de condiciones climatológicas favorables, en las cuales no haya la presencia de lluvias, ya que técnicamente la superficie sobre la cual se desarrollan estos trabajos no debe estar saturada de agua, por tal razón debe considerarse lo siguiente:
  - NORMA ECUATORIANA VIAL **NEVI-12-MTOP, VOLUMEN Nº 3** ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, **numeral 405-5.07. Limitaciones climáticas. -** Las mezclas asfálticas calientes se colocarán únicamente cuando la base a tratar se encuentre seca, la temperatura atmosférica a la sombra se superior a 10° C en ascenso y el tiempo no esté neblinoso ni lluvioso; además la base preparada debe estar en condiciones satisfactorias.

  - NORMA ECUATORIANA VIAL **NEVI-12-MTOP, VOLUMEN Nº 3** ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, **numeral 405-5.12. Extensión de la mezcla. -** "...No se permitirá la extensión y compactación de la mezcla en momentos de lluvia, ni cuando haya fundado temor de que ella ocurra o cuando la temperatura ambiente a la sombra y la del pavimento sean inferiores a diez grados Celsius (10°)."

  - NORMA ECUATORIANA VIAL **NEVI-12-MTOP, VOLUMEN Nº 3** ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, SECCIÓN 405. CAPAS DE RODADURA, 405-1. Riego de imprimación, **numeral 405-1.06. Limitaciones de la ejecución -** "El riego de imprimación se podrá aplicar solo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez grados Celsius (10°C), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho limite se podrá rebajar por el fiscalizador a cinco grados Celsius (5°C), si la temperatura ambiente tiende a aumentar."

  - NORMA MOP-001-F 2002, ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, **numeral 405-1.04.1. Distribución del material bituminoso. -** "...La distribución no deberá efectuarse cuando el tiempo este nublado, lluvioso o con amenaza de lluvia inminente..."

Mail: edypollito@hotmail.es Tel.03-2884546 Cel. 0984787283
Puyo-Pastaza-Ecuador Direc.: Obrero, Calle Ambato S/N y Machala

- NORMA MOP-001-F 2002, ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, **numeral 405-5.05.3. Distribución.** - "La distribución del hormigón asfaltico deberá efectuarse sobre una base preparada, de acuerdo con los requerimientos contractuales, imprimada, limpia y seca, o sobre un pavimento existente..."

- Para un adecuado trabajo de tendido y compactación del material de base granular, es necesario que el material se encuentre correctamente hidratado y no sobre hidratado, debido a que el exceso de humedad lubrica el suelo y lo hace inestable, ya que si el contenido de agua es mayor que el óptimo el agua ya no tiene la acción lubricante sino que contribuye con su volumen a la separación de las partículas del suelo, lo cual ocasiona que no se pueda lograr el grado de compactación deseado o especificado.
- Detalle de los **11 días** de ampliación de plazo por motivos de lluvias:

FECHA DE LA INCIDENCIA EN LOS TRABAJOS	TIEMPO VALIDADO POR LA FISCALIZACIÓN		OBSERVACIONES
	HORAS	DÍAS	
1/12/2022	8	1	❖ Paralización de los trabajos por incidencia de la lluvia, NCICGE 408-25. ❖ REGISTRO INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA AERONÁUTICA PRECIPITACIÓN - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN CIVIL AEROPUERTO RIO AMAZONAS-SHELL. ❖ REGISTRO DE ESTADO DEL TIEMPO. ❖ REGISTRO EN EL LIBRO DE OBRA
2/12/2022	8	1	
3/12/2022	8	1	
4/12/2022	8	1	
6/12/2022	8	1	
8/12/2022	8	1	
9/12/2022	8	1	
10/12/2022	8	1	
11/12/2022	8	1	
13/12/2022	8	1	
14/12/2022	8	1	
TOTAL:	**88**	**11**	***Total de días validados.***
NOTA: Se considera a la jornada diaria de trabajo con una duración de 8 horas.			

- Se considera **29 días** de ampliación de plazo de los 40 días solicitados por los siguientes acontecimientos:

  ❖ En el libro de obra, el día 1 de octubre de 2022 y el día 1 de noviembre de 2022 la fiscalización Autoriza el incremento de cantidades de obra del Rubro 3 de EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR (MOV. DE TIERRA), el cual hasta el periodo de diciembre de 2022 se encuentra con un excedente del 206,74% equivalente a 19.473,82 m3. Se dará tramite a una Orden de Cambio 01 por los incrementos realizados.

  Conforme el cronograma valorado de trabajos vigente, el rubro antes indicado estaba programado su culminación en 60 días, de acuerdo a la totalidad de la cantidad contratada.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U	CONTRATO		CANTIDADES REALIZADAS	% EJECUTADO EN EXCEDENTE
			CANTIDAD	DÍAS TOTALES CONTABILIZADOS EN CRONOGRAMA VIGENTE	ACUMULADO	
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9419,69	60	19.473,82	206,74

❖ En el libro de obra, el día 1 de noviembre de 2022 la fiscalización Autoriza el desalojo de excavaciones a las escombreras autorizadas, el Rubro 15 de TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO, hasta el periodo de diciembre de 2022 se encuentra con un excedente del 2.111,43% equivalente a 29.833,42 m3. Se dará tramite a una Orden de Cambio 02 por los incrementos realizados.

Conforme el cronograma valorado de trabajos vigente, el rubro antes indicado estaba programado su culminación en 60 días, de acuerdo a la totalidad de la cantidad contratada.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U	CONTRATO		CANTIDADES REALIZADAS	% EJECUTADO EN EXCEDENTE
			CANTIDAD	DÍAS TOTALES CONTABILIZADOS EN CRONOGRAMA VIGENTE	ACUMULADO	
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M3	1412,95	60	29.833,42	2.111,43

- Por incrementos de volúmenes de obra puesto en conocimiento la fiscalización mediante Oficio No. 013-EDDYMICH-2022 se aprueba una REPROGRAMACIÓN N° 02 mediante OFICIO N. 022-2022-FISC-EXT y una ORDEN DE CAMBIO No. 1 aprobada por Fiscalización y el Administrador de contrato.
- Por causa de fuerza mayor se solicita mediate Oficio No. 021-EDDYMICH-2022 la aprobación de una variante del proyecto en el tramo de la Absc. 2+480 – 2+666,73 por motivo de deslizamiento de la mesa de la vía existente, dicho acontecimiento sucedió posterior a los trabajos terminados de excavación de cajeras y relleno con material de mejoramiento de la vía en el tramo comprendido entre las abscisas 2+540 hasta la 2+560, el día miércoles 27 de diciembre de 2022 se produjo un deslizamiento del suelo natural de la rasante de la vía ya conformada a nivel de relleno con material de mejoramiento, dicho deslizamiento provoco que se fuera la mesa de la vía casi en la totalidad (80%) de su acho, dicho deslizamiento acarreo gran parte del material que conformaba la vía a una distancia de aproximadamente 40 metros, provisionalmente se ha tratado de habilitar la vía en este tramo tomando en cuenta todas las medidas de seguridad para garantizar el tránsito vehicular y peatonal.

  Lo sucedió provoca que los trabajos programados sufran un desface en los tiempos propuestos.

CONCLUSIONES:

Por lo expuesto, en función de la documentación presentada se considera que es factible la solicitud de **prórroga de plazo de 40 días** al contrato de COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-005-2022 ***"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"***, para lo cual se ha contabilizado 11 días por motivos de lluvias y 29 días por causa de incrementos de cantidades de volúmenes de obra y causas de fuerza mayor.

Dicha prorroga se encuentra realizada con fundamento en lo siguiente:

- Contrato de COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-005-2022, **Clausula Novena: Prorroga de plazo**, numeral **9.1**, literal **b)** Cuando la contratante ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizara las figuras del contrato complementario , diferencia en cantidades de obra u ordenes de trabajo, según aplique de acuerdo con la ley Orgánica del sistema Nacional de Contratación Pública., literal **c)**Por suspensiones en los trabajos o cabios de las actividades previstas en el cronograma motivadas por la contratante u ordenadas por ella, a través de la fiscalización , y que no se deban a causas imputables al contratista., numeral **9.2** En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que, suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la contratante, previo informe del administrador del contrato y de la fiscalización.

- Que, la Norma de control Interno de la Contraloría General del Estado No. 408-27 el aumento del plazo de la construcción procede cuando se presentan atrasos por caso fortuito o fuerza mayor que afecte el progreso de la obra. En el primer caso, el atraso puede ser causado en situaciones, como: robos del equipo utilizado, destrucción vandálica de las obras, cierres de carreteras o cualquier acto realizado por personas o animales que causen daños a la obra o afecten su desarrollo normal. En el caso de fuerza mayor, el atraso puede darse por inundaciones, terremotos, huracanes, etc., es decir por fenómenos naturales.

- Que, las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, en su numeral *408-25 Incidencia de lluvias* y *408-27 Prorrogas de plazo*, indican:

*"**408-25**...Si las labores se suspenden a causa de la lluvia, se hará constar en el libro de obra o un registro la fecha en la cual se presentó esa condición, cuales*

trabajos se suspendieron, a qué hora y por cuanto tiempo, en qué medida fueron afectados y se expondrán las razones por las cuales no se pudo continuar. Las anotaciones serán ratificadas por la firma del Fiscalizador encargado de llevar este control, así como por la del profesional representante del contratista. Los datos así recabados se emplearán, en conjunto con el programa de ejecución, para determinar la prórroga de plazo que se autorizara por este concepto.

***408-27**...son motivos de ampliación las siguientes causas comprobadas:*

- *Falta de materiales de construcción o equipos a incorporar en el mercado nacional o internacional.*
- *Periodos de lluvia que perjudiquen el avance de las obras conforme lo señalado en las Normas de Control Interno 408-25.*
- *Cambios, trabajos extraordinarios o ampliaciones de la obra que requieran aumento de plazo."*

- La **normal ejecución de los trabajos de imprimación y asfaltado en la vía**, depende en gran parte de la presencia de condiciones climatológicas favorables, en las cuales no haya la presencia de lluvias, ya que técnicamente la superficie sobre la cual se desarrollan estos trabajos no debe estar saturada de agua, por tal razón debe considerarse lo siguiente:

  - NORMA ECUATORIANA VIAL **NEVI-12-MTOP, VOLUMEN Nº 3** ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, **numeral 405-5.07. Limitaciones climáticas.** - Las mezclas asfálticas calientes se colocarán únicamente cuando la base a tratar se encuentre seca, la temperatura atmosférica a la sombra se superior a 10° C en ascenso y el tiempo no esté neblinoso ni lluvioso; además la base preparada debe estar en condiciones satisfactorias.

  - NORMA ECUATORIANA VIAL **NEVI-12-MTOP, VOLUMEN Nº 3** ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, **numeral 405-5.12. Extensión de la mezcla.** - "...No se permitirá la extensión y compactación de la mezcla en momentos de lluvia, ni cuando haya fundado temor de que ella ocurra o cuando la temperatura ambiente a la sombra y la del pavimento sean inferiores a diez grados Celsius (10°)."

- NORMA ECUATORIANA VIAL **NEVI-12-MTOP, VOLUMEN Nº 3** ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, SECCIÓN 405. CAPAS DE RODADURA, 405-1. Riego de imprimación, **numeral 405-1.06. Limitaciones de la ejecución** - "El riego de imprimación se podrá aplicar solo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez grados Celsius (10°C), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho limite se podrá rebajar por el fiscalizador a cinco grados Celsius (5°C), si la temperatura ambiente tiende a aumentar."

- NORMA MOP-001-F 2002, ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, **numeral 405-1.04.1. Distribución del material bituminoso.** - "...La distribución no deberá efectuarse cuando el tiempo este nublado, lluvioso o con amenaza de lluvia inminente..."

- NORMA MOP-001-F 2002, ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, **numeral 405-5.05.3. Distribución.** - "La distribución del hormigón asfaltico deberá efectuarse sobre una base preparada, de acuerdo con los requerimientos contractuales, imprimada, limpia y seca, o sobre un pavimento existente..."

- Para un adecuado trabajo de tendido y compactación del material de base granular, es necesario que el material se encuentre correctamente hidratado y no sobre hidratado, debido a que el exceso de humedad lubrica el suelo y lo hace inestable, ya que si el contenido de agua es mayor que el óptimo el agua ya no tiene la acción lubricante sino que contribuye con su volumen a la separación de las partículas del suelo, lo cual ocasiona que no se pueda lograr el grado de compactación deseado o especificado.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: Ángel Misael López Chávez
CONTRATISTA

ANEXO:

- ANEXO 1: ACTA DE NOTIFICACIÓN DE INICIO (3 HOJAS).
- ANEXO 2: COPIA LIBRO DE OBRA _ AUTORIZACIONES DE INCREMENTOS DE VOLÚMENES DE OBRA (2 HOJAS).
- ANEXO 3: Oficio No. 008-EDDYMICH-2022 (3 HOJAS).
- ANEXO 4: Oficio No. 009-EDDYMICH-2022 (14 HOJAS).
- ANEXO 5: Oficio No. 012-EDDYMICH-2022 (5 HOJAS).
- ANEXO 6: Oficio No. 013-EDDYMICH-2022 (6 HOJAS).
- ANEXO 7: OFICIO N. 020-2022-FISC-EXT (3 HOJAS).
- ANEXO 8: OFICIO N. 022-2022-FISC-EXT (3 HOJAS).
- ANEXO 9: Oficio No. 021-EDDYMICH-2022 (8 HOJAS).
- ANEXO 10: REGISTRO INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA AERONÁUTICA PRECIPITACIÓN (2 HOJAS).
- ANEXO 11: COPIA LIBRO DE OBRA _ DÍAS DE LLUVIA QUE PARALIZARON LOS TRABAJOS (11 HOJAS).
- ANEXO 12: REGISTRO DE ESTADO DEL TIEMPO NCICGE 408-25 (11 HOJAS).

OGI Omar H. Guamán I.
Ingeniero Civil

OFICIO N. 011-2023-FISC-EXT
Pastaza, 08 de febrero de 2023

Señor
Ing. Gustavo Navas
Administrador de Contrato

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 01.

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus funciones cotidianas.

En atención al Oficio No. 003-EDDYMICH-2023 de fecha 25 de enero del 2023 donde el contratista solicita una ampliación de plazo de 40 días para el proyecto denominado "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.", con el fin de dar trámite pertinente a dicha ampliación de plazo, en este periodo de ejecución, me permito informar que:

- Es criterio de la fiscalización, en función de la documentación presentada por parte del Sr. Ángel Misael López Chávez, en calidad de Representante Legal de la CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA en calidad de contratista, **OTORGAR UNA PRORROGA DE PLAZO DE 40 DÍAS, al contrato de COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-005-2022 "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**, para lo cual se ha contabilizado 11 días por motivos de lluvias y 29 días por causa de incrementos de cantidades de volúmenes de obra y causas de fuerza mayor. El contratista en función de los días de prorroga deberá realizar la REPROGRAMACIÓN AL CRONOGRAMA DE TRABAJOS vigente.

- La fecha de terminación contractual o entrega de la obra que estaba para el 27 de febrero de 2023, se aplazaría hasta el 8 de abril de 2023, para lo cual se adjunta documentación de respaldo presentada por el contratista.

DETALLE DE PLAZO CONTRACTUAL-PRORROGA 01	
AMPLIACIÓN DE PLAZO 01:	40 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 01:	8 DE ABRIL DEL 2023

Particular que comunico y solicito se de los trámites pertinentes.

@IngenieroCivilOGI
ohgi@hotmail.es
ohgomar@gmail.com
0987571382 / 0979894628
Calle Bolívar 1-38 y Av. Marco Aurelio Subía
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

ATENTAMENTE,

OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO

ANEXO:
-INFORME DE FISCALIZACIÓN N.13: INFORME DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 01.

-OFICIO No. 03-EDDYMICH-2023 (15 Hojas) que contiene:

- ANEXO 1: ACTA DE NOTIFICACIÓN DE INICIO (3 HOJAS).
- ANEXO 2: COPIA LIBRO DE OBRA _ AUTORIZACIONES DE INCREMENTOS DE VOLÚMENES DE OBRA (2 HOJAS).
- ANEXO 3: Oficio No. 008-EDDYMICH-2022 (3 HOJAS).
- ANEXO 4: Oficio No. 009-EDDYMICH-2022 (14 HOJAS).
- ANEXO 5: Oficio No. 012-EDDYMICH-2022 (5 HOJAS).
- ANEXO 6: Oficio No. 013-EDDYMICH-2022 (6 HOJAS).
- ANEXO 7: OFICIO N. 020-2022-FISC-EXT (3 HOJAS).
- ANEXO 8: OFICIO N. 022-2022-FISC-EXT (3 HOJAS).
- ANEXO 9: Oficio No. 021-EDDYMICH-2022 (8 HOJAS).
- ANEXO 10: REGISTRO INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA AERONÁUTICA PRECIPITACIÓN (2 HOJAS).
- ANEXO 11: COPIA LIBRO DE OBRA _ DÍAS DE LLUVIA QUE PARALIZARON LOS TRABAJOS (11 HOJAS).
- ANEXO 12: REGISTRO DE ESTADO DEL TIEMPO NCICGE 408-25 (11 HOJAS).

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

INFORME Y ORDEN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO
- PROYECTOS -

ORDEN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°	Orden No. 1	FECHA:	25 de febrero de 2023
NOMBRE DEL PROYECTO	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"		
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.	SOLICITUD Y FECHA	CONTRATISTA: Oficio No. 09-EDDYMICH-2023; de fecha 17 de febrero de 2023 (recibido 22 de febrero de 23023); FISCALIZADOR: OFICIO N. 016-2023-FISC-EXT, de fecha 24 de febrero de 2023
FECHA DE INICIO	01 de septiembre de 2022	FECHA TÉRMINO	27 de febrero de 2023
PLAZO DEL CONTRATO	180 días	MONTO CONTRATADO	$ 789.464,39 USD

MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	DÍAS	JUSTIFICACIÓN
01	INCIDENCIA DE LA LLUVIA	11 días	MOTIVOS DE LLIVIAS
02	INCREMENTOS DE CANTIDADES DE OBRA	29 días	INCREMENTO EN EL RUBRO EXCAVACIÓN SI CLASIFICAR

CRITERIO APROBACIÓN AMPLICACIÓN

ANÁLISIS TÉCNICO	ITEM	SI	NO
Del análisis técnico de los ítems en mención, la Unidad de Fiscalización considera procedente aprobar la ampliación de plazo solicitada.	01	X	
	02	X	
	03		
	04		
	05		

DETALLE DE LA AMPLIACIÓN

DETALLE	DÍAS	AMPLIACIONES ANTERIORES		DÍAS
Plazo Inicial Contractual	180	Ampliación de Plazo N° ...		
Ampliación de Plazo Solicitada	40	Ampliación de Plazo N° ...		
Ampliación de Plazo N° 01 Aprobada	40	Ampliación de Plazo N° ...		
Nueva Fecha Término de Obra	08-04-2023	Ampliación de Plazo N° ...		
		TOTAL DE DÍAS		

SE LEGALIZA AMPLIACIÓN DE PLAZO SEGÚN CONTRATO N°	Clausula Novena: Prorrogas de plazo	
ADJUNTO: INFORME FISCALIZACIÓN N°	OFICIO N. 016-2023-FISC-EXT	FECHA: 24 de febrero de 2023
ADJUNTO: INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO N°	Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-6407-M	FECHA: 25 de febrero de 2023

NOTA: De conformidad con el artículo 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los fiscalizadores y Administradores de los contratos, certifican con su firma que, verificaron y garantizan por ser de su única responsabilidad, el cumplimiento de veracidad y legalidad de las motivaciones, valores autorizados, de los documentos justificativos y comprobatorios, y de las modificaciones contractuales autorizadas, garantizando que las mismas, no afectan la calidad, cantidad, avance físico y financiero, la ejecución del contrato y proyectos programados.

OMAR HENRY GUAMAN ILER	EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ
Ing. Omar Henry Guamán Iler REVISADO Y REQUERIDO POR: **FISCALIZADOR**	*Ing. Edwin Gustavo Navas Manjarrez* APROBADO POR: **ADMINISTRADOR**

ADAN MARINO MONTESDEOCA

AUTORIZADO POR:
PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA Ó DELEGADO

Puyo, 27 de febrero de 2023

Oficio No. 11-EDDYMICH-2023

INGENIERO
GUSTAVO NAVAS
ADMINISTRADO DE CONTRATO DE *"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"*

ASUNTO: AMPLIACIÓN DE PLAZO 02

Presente.-

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus funciones cotidianas.

En función de las distintas actividades programadas que se ha venido desarrollando en el proyecto ***ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA***, solicito que se otorgue una ampliación de plazo de **40 días** por causa de excedentes en ciertos rubros contractuales, incidencia de lluvias que paralizaron actividades programadas y caso fortuito o de fuerza mayor suscitados en la vía durante la ejecución de los trabajos, la documentación probatoria a la solicitud de prorroga se anexa al presente documento y se detalla en el mismo.

ANTECEDENTES Y ASPECTOS RELEVANTES:

- En la ciudad de Puyo, a los 20 días del mes de junio del 2022, se suscribe el contrato COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-005-2022, cuyo objeto es: "**ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500) PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",** entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza legalmente representado por el Ing. Jaime Patricio Guevara Blaschke, Prefecto Provincial; y por otra parte, en calidad de Contratista, la Constructora EDDYMICH CIA. LTDA., por un monto contractual de **$789.464,39 (SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 39/100)** dólares americanos sin incluir IVA, y con un plazo de 180 días.

- Mediante contrato ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500) PARROQUIA TNTE.

HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, se designa al Ing. Gustavo Navas como Administrador de Contrato.

- Con fecha 4 de julio de 2022 el GAD Provincial de Pastaza, acredito en la cuenta del contratista el monto de $ 315,785.75 correspondiente al anticipo.

- Mediante ACTA DE NOTIFICACIÓN DE INICIO, en la ciudad de puyo, a los 31 días del mes de agosto de 2022, se procede a la entrega en sitio donde se ejecutarán los trabajos concernientes al Contrato suscrito con fecha 27 de julio de 2022, cuyo objeto de contratación es la **"FISCALIZACIÓN DEL ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500) PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",** por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza con su representante legal Ing. Jaime Patricio Guevara Blashke, Prefecto de Pastaza; por otro lado el Ing. Guamán Iler Omar Henry FISCALIZADOR EXTERNO, para este propósito se reúnen el Ing. Gustavo Navas, en calidad de Administrador de Contrato de Fiscalización, el Ing. Guamán Iler Omar Henry, en calidad de Fiscalizador Externo, con la finalidad de suscribir la presente Acta de inicio de plazo contractual. Conforme a la RESOLUCIÓN No. RE – SERCOP – 2021 se establece la notificación de que los dos anticipos se encuentran disponibles, para lo cual se remite esta NOTIFICACIÓN DE INICIO DE PLAZO hoy 31 de agosto de 2022 y para efectos de contabilización de plazo será a partir del día siguiente de esta notificación (1 de septiembre de 2022).

- De acuerdo a la reprogramación N° 02 del cronograma valorado de trabajos, en el periodo de enero de 2023, se encontraba programado entre las principales actividades los trabajos de HORMIGÓN PARA CUNETAS (F´C=180 KG/CM2), MURO DE H.S. F´C=180 KG/CM2 TIPO B (CABEZALES), MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS, TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS, y por cuestiones de excedentes y precipitaciones suscitadas suscitados en el mes anterior se desplazaron para este periodo trabajos de ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACIÓN y C. RODADURA HORMIGÓN ASF. MEZCLADO EN PLANTA E=2". Las actividades programadas descritas anteriormente sufrieron paralizaciones por cuestiones climatológicas de lluvias intensas suscitadas en los días 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 19, 20, 24, lo cual fue registrado en el libro de obra y en un registro de estado del tiempo. La información climatológica para corroborar las lluvias en este periodo se encuentra sustentada en el Registro de Información Climatológica Aeronáutica de Precipitaciones (código: GMET-PR-001-RG-005) de la Dirección General de Aviación Civil-Aeropuerto "Rio amazonas"-Shell Mera.

ANÁLISIS:

- Que, la Norma de control Interno de la Contraloría General del Estado No. 408-27 el contratista deberá imponer la solicitud de prórroga de conformidad con las disposiciones contractuales después de conocer el hecho que demorará la ejecución y en cuanto tenga la información suficiente, aportará la documentación probatoria necesaria para que la administración pueda resolver el reclamo.

- Que, las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, en su numeral *408-25 Incidencia de lluvias* y *408-27 Prorrogas de plazo*, indican:

  *"**408-25**...Si las labores se suspenden a causa de la lluvia, se hará constar en el libro de obra o un registro la fecha en la cual se presentó esa condición, cuales trabajos se suspendieron, a qué hora y por cuanto tiempo, en qué medida fueron afectados y se expondrán las razones por las cuales no se pudo continuar. Las anotaciones serán ratificadas por la firma del Fiscalizador encargado de llevar este control, así como por la del profesional representante del contratista. Los datos así recabados se emplearán, en conjunto con el programa de ejecución, para determinar la prórroga de plazo que se autorizara por este concepto.*

  ***408-27**...son motivos de ampliación las siguientes causas comprobadas:*
  - *Falta de materiales de construcción o equipos a incorporar en el mercado nacional o internacional.*
  - *Periodos de lluvia que perjudiquen el avance de las obras conforme lo señalado en las Normas de Control Interno 408-25.*
  - *Cambios, trabajos extraordinarios o ampliaciones de la obra que requieran aumento de plazo."*

- La presencia de lluvias intensas provocó la suspensión de los trabajos programados de HORMIGÓN EN CUNETAS (F´C=180 KG/CM2), debido a que la presencia del agua lluvia influye en el aumento de la proporción de agua en la mezcla de hormigón no solo en el momento de la mezcla, también en el

transporte, la colocación, la compactación y en el acabado. Estos factores aumentan la relación agua -cemento de la mezcla, lo cual reduce la resistencia mecánica final del hormigón.

- La **normal ejecución de los trabajos de imprimación y asfaltado en la vía**, depende en gran parte de la presencia de condiciones climatológicas favorables, en las cuales no haya la presencia de lluvias, ya que técnicamente la superficie sobre la cual se desarrollan estos trabajos no debe estar saturada de agua, por tal razón debe considerarse lo siguiente:
  - NORMA ECUATORIANA VIAL **NEVI-12-MTOP, VOLUMEN Nº 3** ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, **numeral 405-5.07. Limitaciones climáticas.** - Las mezclas asfálticas calientes se colocarán únicamente cuando la base a tratar se encuentre seca, la temperatura atmosférica a la sombra se superior a 10° C en ascenso y el tiempo no esté neblinoso ni lluvioso; además la base preparada debe estar en condiciones satisfactorias.

  - NORMA ECUATORIANA VIAL **NEVI-12-MTOP, VOLUMEN Nº 3** ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, **numeral 405-5.12. Extensión de la mezcla.** - "...No se permitirá la extensión y compactación de la mezcla en momentos de lluvia, ni cuando haya fundado temor de que ella ocurra o cuando la temperatura ambiente a la sombra y la del pavimento sean inferiores a diez grados Celsius (10°)."

  - NORMA ECUATORIANA VIAL **NEVI-12-MTOP, VOLUMEN Nº 3** ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, SECCIÓN 405. CAPAS DE RODADURA, 405-1. Riego de imprimación, **numeral 405-1.06. Limitaciones de la ejecución** - "El riego de imprimación se podrá aplicar solo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez grados Celsius (10°C), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho limite se podrá rebajar por el fiscalizador a cinco grados Celsius (5°C), si la temperatura ambiente tiende a aumentar."

  - NORMA MOP-001-F 2002, ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, **numeral 405-1.04.1. Distribución del material bituminoso.** - "...La distribución no deberá

efectuarse cuando el tiempo este nublado, lluvioso o con amenaza de lluvia inminente..."

- NORMA MOP-001-F 2002, ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, **numeral 405-5.05.3. Distribución.** - "La distribución del hormigón asfaltico deberá efectuarse sobre una base preparada, de acuerdo con los requerimientos contractuales, imprimada, limpia y seca, o sobre un pavimento existente..."

- Para un adecuado trabajo de tendido y compactación del material de base granular, es necesario que el material se encuentre correctamente hidratado y no sobre hidratado, debido a que el exceso de humedad lubrica el suelo y lo hace inestable, ya que si el contenido de agua es mayor que el óptimo el agua ya no tiene la acción lubricante sino que contribuye con su volumen a la separación de las partículas del suelo, lo cual ocasiona que no se pueda lograr el grado de compactación deseado o especificado.
- Detalle de los **10 días** de ampliación de plazo por motivos de lluvias:

FECHA DE LA INCIDENCIA EN LOS TRABAJOS	TIEMPO VALIDADO POR LA FISCALIZACIÓN		OBSERVACIONES
	HORAS	DÍAS	
2/01/2023	4	½	❖ Paralización de los trabajos por incidencia de la lluvia, NCICGE 408-25. ❖ REGISTRO INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA AERONÁUTICA PRECIPITACIÓN - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN CIVIL AEROPUERTO RIO AMAZONAS-SHELL. ❖ REGISTRO DE ESTADO DEL TIEMPO. ❖ REGISTRO EN EL LIBRO DE OBRA
4/01/2023	4	½	
5/01/2023	4	½	
7/01/2023	8	1	
8/01/2023	4	½	
9/01/2023	8	1	
11/01/2023	8	1	
14/01/2023	8	1	
15/01/2023	8	1	
19/01/2023	8	1	
20/01/2023	8	1	
24/01/2023	8	1	

TOTAL:	**10**	**10**	***Total de días validados.***
NOTA: Se considera a la jornada diaria de trabajo con una duración de 8 horas.			

CONCLUSIONES:

Por lo expuesto, en función de la documentación presentada se considera que es factible la solicitud de **prórroga de plazo de 10 días** al contrato de COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-005-2022 ***"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"***, para lo cual se ha contabilizado 10 días por motivos de lluvias.

Dicha prorroga se encuentra realizada con fundamento en lo siguiente:

- Que, las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, en su numeral *408-25 Incidencia de lluvias* y *408-27 Prorrogas de plazo*, indican:

  *"**408-25**...Si las labores se suspenden a causa de la lluvia, se hará constar en el libro de obra o un registro la fecha en la cual se presentó esa condición, cuales trabajos se suspendieron, a qué hora y por cuanto tiempo, en qué medida fueron afectados y se expondrán las razones por las cuales no se pudo continuar. Las anotaciones serán ratificadas por la firma del Fiscalizador encargado de llevar este control, así como por la del profesional representante del contratista. Los datos así recabados se emplearán, en conjunto con el programa de ejecución, para determinar la prórroga de plazo que se autorizara por este concepto.*

  ***408-27**...son motivos de ampliación las siguientes causas comprobadas:*
  - *Falta de materiales de construcción o equipos a incorporar en el mercado nacional o internacional.*
  - *Periodos de lluvia que perjudiquen el avance de las obras conforme lo señalado en las Normas de Control Interno 408-25.*
  - *Cambios, trabajos extraordinarios o ampliaciones de la obra que requieran aumento de plazo."*

- La **normal ejecución de los trabajos de imprimación y asfaltado en la vía**, depende en gran parte de la presencia de condiciones climatológicas favorables, en las cuales no haya la presencia de lluvias, ya que técnicamente la superficie sobre la cual se

desarrollan estos trabajos no debe estar saturada de agua, por tal razón debe considerarse lo siguiente:

- NORMA ECUATORIANA VIAL **NEVI-12-MTOP, VOLUMEN Nº 3** ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, **numeral 405-5.07. Limitaciones climáticas. -** Las mezclas asfálticas calientes se colocarán únicamente cuando la base a tratar se encuentre seca, la temperatura atmosférica a la sombra se superior a 10° C en ascenso y el tiempo no esté neblinoso ni lluvioso; además la base preparada debe estar en condiciones satisfactorias.

- NORMA ECUATORIANA VIAL **NEVI-12-MTOP, VOLUMEN Nº 3** ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, **numeral 405-5.12. Extensión de la mezcla. -** "...No se permitirá la extensión y compactación de la mezcla en momentos de lluvia, ni cuando haya fundado temor de que ella ocurra o cuando la temperatura ambiente a la sombra y la del pavimento sean inferiores a diez grados Celsius (10°)."

- NORMA ECUATORIANA VIAL **NEVI-12-MTOP, VOLUMEN Nº 3** ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, SECCIÓN 405. CAPAS DE RODADURA, 405-1. Riego de imprimación, **numeral 405-1.06. Limitaciones de la ejecución -** "El riego de imprimación se podrá aplicar solo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez grados Celsius (10°C), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho limite se podrá rebajar por el fiscalizador a cinco grados Celsius (5°C), si la temperatura ambiente tiende a aumentar."

- NORMA MOP-001-F 2002, ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, **numeral 405-1.04.1. Distribución del material bituminoso. -** "...La distribución no deberá efectuarse cuando el tiempo este nublado, lluvioso o con amenaza de lluvia inminente..."

- NORMA MOP-001-F 2002, ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, **numeral 405-5.05.3.**

Distribución. - "La distribución del hormigón asfaltico deberá efectuarse sobre una base preparada, de acuerdo con los requerimientos contractuales, imprimada, limpia y seca, o sobre un pavimento existente..."

- Técnicamente en presencia de lluvias intensas es recomendable no ejecutar trabajos de hormigonado al aire libre, debido a que la presencia del agua lluvia influye en el aumento de la proporción de agua en la mezcla de hormigón no solo en el momento de la mezcla, también en el transporte, la colocación, la compactación y en el acabado. Estos factores aumentan la relación agua - cemento de la mezcla, lo cual reduce la resistencia mecánica final del hormigón.

- Para un adecuado trabajo de tendido y compactación del material de base granular, es necesario que el material se encuentre correctamente hidratado y no sobre hidratado, debido a que el exceso de humedad lubrica el suelo y lo hace inestable, ya que si el contenido de agua es mayor que el óptimo el agua ya no tiene la acción lubricante sino que contribuye con su volumen a la separación de las partículas del suelo, lo cual ocasiona que no se pueda lograr el grado de compactación deseado o especificado.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: Ángel Misael López Chávez
CONTRATISTA

ANEXO:

- ANEXO 1: ACTA DE NOTIFICACIÓN DE INICIO (3 HOJAS).
- ANEXO 2: REGISTRO INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA AERONÁUTICA PRECIPITACIÓN (1 HOJA).
- ANEXO 3: COPIA LIBRO DE OBRA _ DÍAS DE LLUVIA QUE PARALIZARON LOS TRABAJOS (12 HOJAS).
- ANEXO 4: REGISTRO DE ESTADO DEL TIEMPO NCICGE 408-25 (12 HOJAS).

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

"FISCALIZACIÓN ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

INFORME DE FISCALIZACIÓN N.016

INFORME DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 02

PROYECTO: ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA Representante legal Sr. Ángel Misael López C.

MONTO DEL CONTRATO: 789.464,39 sin IVA

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 de abril de 2023

1.- ANTECEDENTES

- Con fecha 20 de junio de 2022 se suscribió el contrato cuyo objeto de contratación es el: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", los trabajos se ejecutarán en la vía a Allishungo, Parroquia Teniente Hugo Ortiz, Cantón y Provincia de Pastaza, con sujeción a diseños, especificaciones y más documentos contractuales, por un monto de U.S.D. $789.464,39 con un plazo de 180 días.

- Con fecha 31 de agosto de 2022 se suscribió el Acta de inicio de obra por una parte Ing. Gustavo Navas, en calidad de Administrador de Contrato, el Ing. Omar Henry Guaman Iler, en calidad de Fiscalizador, los mismos en representación del GADPPz y por otra parte la constructora CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA.LTDA en calidad de contratista ejecutor, con la finalidad de suscribir la presente Acta de inicio de obra e inicio de plazo contractual.

- Mediante Oficio GNM - GADPPZz - 2022 de fecha 31 de agosto del 2022 el Ing. Gustavo Navas en calidad de Administrador de Contrato realiza la Notificación de orden de inicio de contrato de obra y de fiscalización externa

- Mediante OFICIO N. 001-2022-FISC-EXT de fecha 01 de septiembre de 2022 la fiscalización Externa Solicita la reprogramación del cronograma ofertado del contratista de la obra.

- Mediante OFICIO N. 002-2022-FISC-EXT de fecha 01 de septiembre de 2022 la fiscalización Externa Solicita la documentación correspondiente a la metodología, personal técnico y equipo mínimo al contratista.

- Mediante Oficio No:001-EDDYMICH-2022 de fecha 02 de septiembre de 2022 el contratista emite la reprogramación de los cronogramas ofertados.

- Mediante Oficio No:002-EDDYMICH-2022 de fecha 05 de septiembre de 2022 el contratista emite la Metodología de trabajo.

- Mediante OFICIO N. 003-2022-FISC-EXT de fecha 05 de septiembre de 2022 la fiscalización Externa solicita la aprobación de la reprogramación de cronogramas al Administrador de contrato de obra.

- Mediante OFICIO N. 004-2022-FISC-EXT de fecha 05 de septiembre de 2022 la fiscalización Externa solicita la aprobación de la reprogramación de cronogramas de fiscalización al Administrador de la fiscalización.

- Mediante Oficio No:004-EDDYMICH-2022 de fecha 12 de septiembre de 2022 el contratista solicita la revisión y aprobación del replanteo y nivelación del trazado de la vía existente.

- Mediante OFICIO N. 005-2022-FISC-EXT de fecha 27 de septiembre de 2022 la fiscalización Externa solicita la aprobación de los planos del levantamiento topográfico de las condiciones de la vía existente al administrador de contrato.

- Mediante OFICIO N. 005-2022-FISC-EXT de fecha 27 de septiembre de 2022 la fiscalización Externa solicita la aprobación de los planos del levantamiento topográfico de las condiciones de la vía existente al administrador de contrato.

- Mediante OFICIO N. 006-2022-FISC-EXT de fecha 27 de septiembre de 2022 la fiscalización Externa emite la documentación del equipo mínimo y personal técnico propuesto para el contrato de la fiscalización, el cual cumple con lo solicitado en los pliegos.

- Mediante OFICIO N. 007-2022-FISC-EXT de fecha 30 de septiembre de 2022 la fiscalización Externa emite la documentación de la metodología, el equipo mínimo y personal técnico propuesto para la obra y cronogramas reprogramados ofertados, el cual cumple con lo solicitado en los pliegos.

- Mediante Oficio No:009-EDDYMICH-2022 de fecha 19 de octubre de 2022 el contratista solicita cantidades de obra en excedentes a ser considerados en el proyecto para su revisión, análisis y aprobación.

- Mediante Oficio No:013-EDDYMICH-2022 de fecha 24 de noviembre de 2022 el contratista solicita la presentación de la reprogramación de obra Nro.02.

- Mediante OFICIO N. 018-2022-FISC-EXT de fecha 29 de noviembre de 2022 la fiscalización Externa solicita al Administrador de contrato la aprobación de la orden de Cambio N.01.

- Mediante Oficio No:015-EDDYMICH-2022 de fecha 01 de diciembre de 2022 el contratista emite reprogramación de obra No.002.

- Mediante OFICIO N. 020-2022-FISC-EXT de fecha 01 de diciembre de 2022 la fiscalización Externa solicita al contratista la reprogramación de obra No.02 en base a la orden de cambio Nro.01 aprobada.

- Mediante OFICIO N. 021-2022-FISC-EXT de fecha 05 de diciembre de 2022 la fiscalización Externa solicita al Administrador de contrato la aprobación de la reprogramación de obra Nro.002.

- Mediante OFICIO N. 022-2022-FISC-EXT de fecha 06 de diciembre de 2022 la fiscalización Externa informa al contratista sobre LA APROBACION DE LA REPROGRAMACION DE OBRA Nro.02.

- Mediante Oficio No:020-EDDYMICH-2022 de fecha 21 de diciembre de 2022 el contratista solicita la creación del rubro nuevo 001_ DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO DE ZONAS DE DEPOSITO DEL MATERIAL DESALOJADO DEL MOV. DE TIERRAS.

- Mediante Oficio No:021-EDDYMICH-2022 de fecha 29 de diciembre de 2022 el contratista solicita la aprobación de variante del proyecto en el tramo de la absc. 2+480-2+666.73 por motivo de deslizamiento de la mesa de la vía existente.

- Mediante OFICIO N. 031-2022-FISC-EXT de fecha 29 de diciembre de 2022 la fiscalización Externa emite al Contratista la Orden de Cambio Nro. 2 Aprobada por Fiscalización y Administrador de Contrato.

- Mediante OFICIO N. 032-2022-FISC-EXT de fecha 03 de enero de 2023 la fiscalización Externa emite al Director de Fiscalización del GADPPz el informe de cumplimiento ambiental del proyecto, perteneciente a la planilla de avance No. 04 para que se proceda con el trámite pertinente.

- Mediante Oficio No:003-EDDYMICH-2023 de fecha 25 de enero de 2023 el contratista solicita una AMPLIACIÓN DE PLAZO 01 de 40 días.

- Mediante Oficio No. 004-EDDYMICH-2023 de fecha 27 de enero de 2023 el contratista solicita la creación del rubro nuevo 002_SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO DN=875MM, DI=800MM, INEN 2059 SERIE 5.

- Mediante Oficio No. 006-EDDYMICH-2023 de fecha 30 de enero de 2023 el contratista solicita AUTORIZACIÓN PARA TRABAJOS DE CONTENCIÓN DE VÍA POR CAUSA DE UN ALTO NIVEL FREÁTICO EN LA ABSCISA 0+185 MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO A MANERA DE MURO DE CONTENCIÓN, Y COLOCACIÓN DE UNA FILA DE MALLA DE GAVIÓN EN LA PARTE SUPERIOR PARA CONFINAMIENTO DEL ANCHO DE VÍA EN US PARTE SUPERIOR.

- Mediante OFICIO N. 008-2023-FISC-EXT de fecha 07 de febrero de 2023 la fiscalización Externa da la APROBACIÓN DE VARIANTE DEL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA ABSC. 2+480-2+666.73 POR MOTIVO DE DESLIZAMIENTO DE LA MESA DE LA VÍA EXISTENTE.

- Mediante Oficio No. 009-EDDYMICH-2023 de fecha 17 de febrero de 2023 el contratista solicita la AMPLIACIÓN DE PLAZO 01, en la cual contabiliza 40 días por causa de excedentes en ciertos rubros contractuales, incidencia de lluvias que paralizaron actividades programadas y caso fortuito o de fuerza mayor suscitados en la vía durante la ejecución de los trabajos.

- Mediante OFICIO N. 008-2023-FISC-EXT de fecha 27 de febrero de 2023 la fiscalización externa aprueba la orden de ampliación de plazo No. 1 y solicitud de reprogramación No. 3, la cual es de 40 días y cuya fecha de terminación de la obra sería el 8 de abril de 2023.

- Mediante Oficio No. 011-EDDYMICH-2023 de fecha 27 de febrero de 2023 el contratista solicita la AMPLIACIÓN DE PLAZO 02, en la cual contabiliza 10 días por causa de excedentes en ciertos rubros contractuales, incidencia de lluvias que paralizaron actividades programadas y caso fortuito o de fuerza mayor suscitados en la vía durante la ejecución de los trabajos.

- De acuerdo a la reprogramación N° 02 del cronograma valorado de trabajos, en el periodo de enero de 2023, se encontraba programado entre las principales actividades los trabajos de HORMIGÓN PARA CUNETAS (F´C=180 KG/CM2), MURO DE H.S. F´C=180 KG/CM2 TIPO B (CABEZALES), MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS, TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS, y por cuestiones

de excedentes y precipitaciones suscitadas suscitados en el mes anterior se desplazaron para este periodo trabajos de ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACIÓN y C. RODADURA HORMIGÓN ASF. MEZCLADO EN PLANTA E=2". Las actividades programadas descritas anteriormente sufrieron paralizaciones por cuestiones climatológicas de lluvias intensas suscitadas en los días 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 19, 20, 24, lo cual fue registrado en el libro de obra y en un registro de estado del tiempo. La información climatológica para corroborar las lluvias en este periodo se encuentra sustentada en el Registro de Información Climatológica Aeronáutica de Precipitaciones (código: GMET-PR-001-RG-005) de la Dirección General de Aviación Civil-Aeropuerto "Rio amazonas"-Shell Mera.

- El Administrador de Contrato de Obra mediante Oficio No. 015-G.N.-ALLISHUNGO-2022 de fecha 02 de maro de 2023, solicita realizar el informe correspondiente sobre ampliación de plazo No. 2, en relación al OFICIO No.11-EDDYMICH-2023 de fecha 27 de febrero de 2023.

2.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO:	ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.
CÓDIGO DEL PROCESO:	COTO-GADPPz-005-2022
MONTO DEL CONTRATO:	USD. 789.464,39
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20 DE JUNIO DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL:	180 DÍAS
MONTO DEL ANTICIPO:	USD. 315.785,75
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:	04 DE JULIO DE 2022
FECHA DE INICIO DE TRABAJO:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01:	8 DE ABRIL DE 2023
SUSPENSIÓN DE TRABAJO:	NINGUNA
AMPLIACIÓN DE PLAZO 01:	40 DÍAS
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA
GEORREFERENCIACIÓN DEL PROYECTO:	PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA

3.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN

OBJETO DEL CONTRATO:	FISCALIZACIÓN ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
CÓDIGO DEL PROCESO:	CDC-GADPPz-012-2022
MONTO DEL CONTRATO:	49.960,16 USD
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27 DE JULIO DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL:	180 DÍAS
MONTO DEL ANTICIPO:	19.984,06 USD
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:	18 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE INICIO DE TRABAJO:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01:	8 DE ABRIL DE 2023
SUSPENSIÓN DE TRABAJO:	NINGUNA
AMPLIACIÓN DE PLAZO 01:	40 DÍAS
CONTRATISTA:	ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
ADMINISTRADOR DE CONTRATO OBRA	ING. EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

4.- ANALISIS DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO 02

- En respuesta al Oficio No. 015-G.N.-ALLISHUNGO-2022 del Administrador de Contrato de Obra y de acuerdo a la documentación presentada en el Oficio No. 11-EDDYMICH-2023 suscrito por el Sr. Ángel Misael López Chávez, en calidad de Representante Legal de la CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA., luego de la revisión y análisis del documento me permito informar lo siguiente:

  En el proceso de ejecución del contrato de COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-005-2022, **ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**; como se indica en el oficio anteriormente detallado, es necesario realizar una prórroga de plazo que conllevaría en una reprogramación del cronograma vigente, debido a que las actividades programadas a ser ejecutadas en el periodo de enero de 2023 sufrieron paralizaciones por cuestiones climatológicas de lluvias intensas suscitadas los días 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 19, 20, 24, lo cual se encuentra debidamente registrado en

el libro de obra y en un registro de estado del tiempo. La información climatológica para corroborar las lluvias en este periodo se encuentra sustentada en el Registro de Información Climatológica Aeronáutica de Precipitaciones (código: GMET-PR-001-RG-005) de la Dirección General de Aviación Civil-Aeropuerto "Rio amazonas"-Shell Mera, cabe indicar que es factible realizar prórrogas de la ejecución de trabajos con fundamento en las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, numeral 408-25 y 408-27

- Que, la Norma de control Interno de la Contraloría General del Estado No. 408-27 el contratista deberá imponer la solicitud de prórroga de conformidad con las disposiciones contractuales después de conocer el hecho que demorará la ejecución y en cuanto tenga la información suficiente, aportará la documentación probatoria necesaria para que la administración pueda resolver el reclamo.

- Que, las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, en su numeral *408-25 Incidencia de lluvias* y *408-27 Prorrogas de plazo*, indican:

> *"**408-25**...Si las labores se suspenden a causa de la lluvia, se hará constar en el libro de obra o un registro la fecha en la cual se presentó esa condición, cuales trabajos se suspendieron, a qué hora y por cuanto tiempo, en qué medida fueron afectados y se expondrán las razones por las cuales no se pudo continuar. Las anotaciones serán ratificadas por la firma del Fiscalizador encargado de llevar este control, así como por la del profesional representante del contratista. Los datos así recabados se emplearán, en conjunto con el programa de ejecución, para determinar la prórroga de plazo que se autorizara por este concepto.*
>
> ***408-27**...son motivos de ampliación las siguientes causas comprobadas:*
> - *Falta de materiales de construcción o equipos a incorporar en el mercado nacional o internacional.*
> - *Periodos de lluvia que perjudiquen el avance de las obras conforme lo señalado en las Normas de Control Interno 408-25.*
> - *Cambios, trabajos extraordinarios o ampliaciones de la obra que requieran aumento de plazo."*

- La presencia de lluvias intensas provocó la suspensión de los trabajos programados de HORMIGÓN EN CUNETAS (F´C=180 KG/CM2), debido a que la presencia del agua lluvia influye en el aumento de la proporción de agua en la mezcla de hormigón no solo en el momento de la mezcla, también en el transporte, la colocación, la compactación y en el acabado. Estos factores aumentan la relación agua -cemento de la mezcla, lo cual reduce la resistencia mecánica final del hormigón.

- La **normal ejecución de los trabajos de imprimación y asfaltado en la vía**, depende en gran parte de la presencia de condiciones climatológicas favorables, en las cuales no haya la presencia de lluvias, ya que técnicamente la superficie sobre la cual se desarrollan estos trabajos no debe estar saturada de agua, por tal razón debe considerarse lo siguiente:

  - NORMA ECUATORIANA VIAL **NEVI-12-MTOP, VOLUMEN N° 3** ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, **numeral 405-5.07. Limitaciones climáticas. -** Las mezclas asfálticas calientes se colocarán únicamente cuando la base a tratar se encuentre seca, la temperatura atmosférica a la sombra se superior a 10° C en ascenso y el tiempo no esté neblinoso ni lluvioso; además la base preparada debe estar en condiciones satisfactorias.

  - NORMA ECUATORIANA VIAL **NEVI-12-MTOP, VOLUMEN N° 3** ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, **numeral 405-5.12. Extensión de la mezcla. -** "...No se permitirá la extensión y compactación de la mezcla en momentos de lluvia, ni cuando haya fundado temor de que ella ocurra o cuando la temperatura ambiente a la sombra y la del pavimento sean inferiores a diez grados Celsius (10°)."

  - NORMA ECUATORIANA VIAL **NEVI-12-MTOP, VOLUMEN N° 3** ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, SECCIÓN 405. CAPAS DE RODADURA, 405-1. Riego de imprimación, **numeral 405-1.06. Limitaciones de la ejecución -** "El riego de imprimación se podrá aplicar solo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez grados Celsius (10°C), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho limite se podrá rebajar por el fiscalizador a cinco grados Celsius (5°C), si la temperatura ambiente tiende a aumentar."

  - NORMA MOP-001-F 2002, ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, **numeral 405-1.04.1. Distribución del material bituminoso. -** "...La distribución no deberá efectuarse cuando el tiempo este nublado, lluvioso o con amenaza de lluvia inminente..."

  - NORMA MOP-001-F 2002, ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, **numeral 405-5.05.3. Distribución. -** "La distribución del hormigón asfaltico deberá efectuarse sobre una base preparada, de acuerdo con los requerimientos contractuales, imprimada, limpia y seca, o sobre un pavimento existente..."

- Para un adecuado trabajo de tendido y compactación del material de base granular, es necesario que el material se encuentre correctamente hidratado y no sobre hidratado, debido a que el exceso de humedad lubrica el suelo y lo hace inestable, ya que si el contenido de agua es mayor que el óptimo el agua ya no tiene la acción lubricante sino que contribuye con su volumen a la separación de las partículas del suelo, lo cual ocasiona que no se pueda lograr el grado de compactación deseado o especificado.

- Detalle de los **10 días** debidamente registrados y validados por la fiscalización para la ampliación de plazo por motivos de lluvias:

FECHA DE LA INCIDENCIA EN LOS TRABAJOS	**TIEMPO VALIDADO POR LA FISCALIZACIÓN**		**OBSERVACIONES**
	HORAS	**DÍAS**	
2/01/2023	4	½	❖ Paralización de los trabajos por incidencia de la lluvia, NCICGE 408-25. ❖ REGISTRO INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA AERONÁUTICA PRECIPITACIÓN - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN CIVIL AEROPUERTO RIO AMAZONAS-SHELL. ❖ REGISTRO DE ESTADO DEL TIEMPO. ❖ REGISTRO EN EL LIBRO DE OBRA
4/01/2023	4	½	
5/01/2023	4	½	
7/01/2023	8	1	
8/01/2023	4	½	
9/01/2023	8	1	
11/01/2023	8	1	
14/01/2023	8	1	
15/01/2023	8	1	
19/01/2023	8	1	
20/01/2023	8	1	
24/01/2023	8	1	
TOTAL:	**10**	**10**	***TOTAL DE DÍAS VALIDADOS.***
NOTA: Se considera a la jornada diaria de trabajo con una duración de 8 horas.			

- Análisis de plazo contractual:

DETALLE DE PLAZO CONTRACTUAL	
FECHA DE INICIO DE TRABAJO:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL:	180 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	27 DE FEBRERO DE 2023
AMPLIACIÓN DE PLAZO 01	40 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01	8 DE ABRIL DE 2023

5.- CONCLUSIONES

Por lo expuesto, es criterio de la fiscalización, en función de la documentación presentada por parte del Sr. Ángel Misael López Chávez, en calidad de Representante Legal de la CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA en calidad de contratista, **OTORGAR UNA PRORROGA DE PLAZO DE 10 DÍAS**, al contrato de COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-005-2022 ***"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"***, para lo cual se ha contabilizado 10 días por motivos de lluvias. El contratista en función de los días de prorroga deberá realizar la REPROGRAMACIÓN AL CRONOGRAMA DE TRABAJOS vigente.

Dicha prorroga se encuentra realizada con fundamento en lo siguiente:

- Que, las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, en su numeral *408-25 Incidencia de lluvias* y *408-27 Prorrogas de plazo*, indican:

  *"**408-25**...Si las labores se suspenden a causa de la lluvia, se hará constar en el libro de obra o un registro la fecha en la cual se presentó esa condición, cuales trabajos se suspendieron, a qué hora y por cuanto tiempo, en qué medida fueron afectados y se expondrán las razones por las cuales no se pudo continuar. Las anotaciones serán ratificadas por la firma del Fiscalizador encargado de llevar este control, así como por la del profesional representante del contratista. Los datos así recabados se emplearán, en conjunto con el programa de ejecución, para determinar la prórroga de plazo que se autorizara por este concepto.*

  ***408-27**...son motivos de ampliación las siguientes causas comprobadas:*
  - *Falta de materiales de construcción o equipos a incorporar en el mercado nacional o internacional.*
  - *Periodos de lluvia que perjudiquen el avance de las obras conforme lo señalado en las Normas de Control Interno 408-25.*
  - *Cambios, trabajos extraordinarios o ampliaciones de la obra que requieran aumento de plazo."*

- La **normal ejecución de los trabajos de imprimación y asfaltado en la vía**, depende en gran parte de la presencia de condiciones climatológicas favorables, en las cuales no haya la presencia de lluvias, ya que técnicamente la superficie sobre la cual se desarrollan estos trabajos no debe estar saturada de agua, por tal razón debe considerarse lo siguiente:

  - NORMA ECUATORIANA VIAL **NEVI-12-MTOP, VOLUMEN Nº 3** ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, **numeral 405-5.07. Limitaciones climáticas. -** Las

mezclas asfálticas calientes se colocarán únicamente cuando la base a tratar se encuentre seca, la temperatura atmosférica a la sombra se superior a 10° C en ascenso y el tiempo no esté neblinoso ni lluvioso; además la base preparada debe estar en condiciones satisfactorias.

- NORMA ECUATORIANA VIAL **NEVI-12-MTOP, VOLUMEN Nº 3** ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, **numeral 405-5.12. Extensión de la mezcla. -** "…No se permitirá la extensión y compactación de la mezcla en momentos de lluvia, ni cuando haya fundado temor de que ella ocurra o cuando la temperatura ambiente a la sombra y la del pavimento sean inferiores a diez grados Celsius (10°)."

- NORMA ECUATORIANA VIAL **NEVI-12-MTOP, VOLUMEN Nº 3** ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, SECCIÓN 405. CAPAS DE RODADURA, 405-1. Riego de imprimación, **numeral 405-1.06. Limitaciones de la ejecución -** "El riego de imprimación se podrá aplicar solo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez grados Celsius (10°C), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho limite se podrá rebajar por el fiscalizador a cinco grados Celsius (5°C), si la temperatura ambiente tiende a aumentar."

- NORMA MOP-001-F 2002, ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, **numeral 405-1.04.1. Distribución del material bituminoso. -** "…La distribución no deberá efectuarse cuando el tiempo este nublado, lluvioso o con amenaza de lluvia inminente…"

- NORMA MOP-001-F 2002, ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, **numeral 405-5.05.3. Distribución. -** "La distribución del hormigón asfaltico deberá efectuarse sobre una base preparada, de acuerdo con los requerimientos contractuales, imprimada, limpia y seca, o sobre un pavimento existente…"

➢ Técnicamente en presencia de lluvias intensas es recomendable no ejecutar trabajos de hormigonado al aire libre, debido a que la presencia del agua lluvia influye en el aumento de la proporción de agua en la mezcla de hormigón no solo en el momento de la mezcla, también en el transporte, la colocación, la compactación y en el acabado. Estos factores aumentan la relación agua -cemento de la mezcla, lo cual reduce la resistencia mecánica final del hormigón.

- Para un adecuado trabajo de tendido y compactación del material de base granular, es necesario que el material se encuentre correctamente hidratado y no sobre hidratado, debido a que el exceso de humedad lubrica el suelo y lo hace inestable, ya que si el contenido de agua es mayor que el óptimo el agua ya no tiene la acción lubricante sino que contribuye con su volumen a la separación de las partículas del suelo, lo cual ocasiona que no se pueda lograr el grado de compactación deseado o especificado.

- Se determina que:

  La fecha de terminación contractual o entrega de la obra que estaba para el 8 de abril de 2023, se aplaza hasta el 18 de abril de 2023, para lo cual se adjunta documentación de respaldo presentada por el contratista.

DETALLE DE PLAZO CONTRACTUAL-PRORROGA 02	
AMPLIACIÓN DE PLAZO 02:	10 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 02:	18 DE ABRIL DEL 2023

6.- RECOMENDACIONES

1.- Continuar con los tramites administrativos para la PRORROGA DE PLAZO 02.

2.-Continuar con las labores encomendadas en la fiscalización con el fin de dar cumplimiento con la correcta ejecución del contrato conforme a la normativa legal vigente.

3.- Coordinar de manera oportuna todos los trámites administrativos entre el contratista de obra, fiscalizador externo y Gobierno Provincial del Pastaza con el fin de garantizar la correcta ejecución del contrato.

4.- Continuar con las labores encomendadas de cada personal técnico y su porcentaje de participación que garanticen el fiel cumplimiento del contrato.

7.- RESPONSABLE

OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO
RUC: 0503341257001
Telf: 0987571382

ANEXO:
OFICIO No. 015-G.N.-ALLISHUNGO-2022 que contiene:
- OFICIO No. 11-EDDYMICH-2023

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

INFORME Y ORDEN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO
- PROYECTOS -

ORDEN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°	Orden No. 2		FECHA:	06 de abril de 2023	
NOMBRE DEL PROYECTO	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"				
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.		SOLICITUD Y FECHA	OFICIO N. 027-2023-FISC-EXT, de fecha 03 de abril de 2023	
FECHA DE INICIO	01 de septiembre de 2022		FECHA TÉRMINO	08 de abril de 2023	
PLAZO DEL CONTRATO	180 días		MONTO CONTRATADO	$ 789,464.39 USD	
MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN	ITEM	DESCRIPCIÓN	DÍAS	JUSTIFICACIÓN	
	01	INCIDENCIA DE LA LLUVIA	10 días	MOTIVOS DE LLIVIAS	

CRITERIO APROBACIÓN AMPLICACIÓN	ANÁLISIS TÉCNICO		ITEM	SI	NO
	Del análisis técnico de los ítems en mención, la Unidad de Fiscalización considera procedente aprobar la ampliación de plazo solicitada.		01	X	
			02	X	
			03		
			04		
			05		

DETALLE DE LA AMPLIACIÓN	DETALLE	DÍAS	AMPLIACIONES ANTERIORES		DÍAS
	Plazo Inicial Contractual	180	Ampliación de Plazo N° 01		40
	Ampliación de Plazo Solicitada N° 01 (aprobada, nueva terminación 08-04-2023)	40	Ampliación de Plazo N° 02		10
	Ampliación de Plazo N° 0 2 Aprobada	10	Ampliación de Plazo N° ...		
	Nueva Fecha Término de Obra	18-04-2023	Ampliación de Plazo N° ...		
			TOTAL DE DÍAS:		50

SE LEGALIZA AMPLIACIÓN DE PLAZO SEGÚN CONTRATO N°	Clausula Novena: Prorrogas de plazo	
ADJUNTO: INFORME FISCALIZACIÓN N°	OFICIO N. 027-2023-FISC-EXT	FECHA: 04 de abril de 2023
ADJUNTO: INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO N°	Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-6740-M	FECHA: 06 de abril de 2023

NOTA: De conformidad con el artículo 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los fiscalizadores y Administradores de los contratos, certifican con su firma que, verificaron y garantizan por ser de su única responsabilidad, el cumplimiento de veracidad y legalidad de las motivaciones, valores autorizados, de los documentos justificativos y comprobatorios, y de las modificaciones contractuales autorizadas, garantizando que las mismas, no afectan la calidad, cantidad, avance físico y financiero, la ejecución del contrato y proyectos programados.

OMAR HENRY GUAMAN ILER	EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ
Ing. Omar Henry Guamán Iler REVISADO Y REQUERIDO POR: **FISCALIZADOR**	*Ing. Edwin Gustavo Navas Manjarrez* APROBADO POR: **ADMINISTRADOR**

ALVARO RENATO SOSA CASTRO

AUTORIZADO POR:
PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA Ó DELEGADO

OGI Omar H. Guamán I.
Ingeniero Civil

OFICIO N. 033-2023-FISC-EXT
Pastaza, 17 de abril de 2023

Señor
Ing. Gustavo Navas
Administrador de Contrato

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA No.03

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus funciones cotidianas.

En atención al Oficio Nº 018-G.N.-ALLISHUNGO-2022 de fecha 12 de abril de 2023, en el cual el Administrador de contrato solicita realizar el informe correspondiente sobre ampliación de plazo No. 3, en relación al OFICIO No. 18-EDDYMICH-2023 de fecha 05 de abril de 2023 de la obra denominada "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", bajo este contexto se a realizado el siguiente análisis:

- En función de la documentación presentada por parte del Sr. Ángel Misael López Chávez, en calidad de Representante Legal de la CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA en calidad de contratista, OTORGAR UNA PRORROGA DE PLAZO DE 15 DÍAS, al contrato de COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-005-2022 "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", para lo cual se ha contabilizado y validado 15 días por motivos de lluvias intensas que incidieron en la paralización de los trabajos programados. El contratista en función de los días de prorroga deberá realizar la REPROGRAMACIÓN AL CRONOGRAMA DE TRABAJOS vigente.

- La fecha de terminación contractual o entrega de la obra que estaba para el 18 de abril de 2023, se aplaza hasta el 03 de mayo de 2023, para lo cual se adjunta documentación de respaldo presentada por el contratista.

DETALLE DE PLAZO CONTRACTUAL-PRORROGA 03	
AMPLIACIÓN DE PLAZO 03:	15 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 03:	3 DE MAYO DEL 2023

Particular que comunico para los trámites subsiguientes.

ATENTAMENTE,

@IngenieroCivilOGI
ohgi@hotmail.es
ohgiomar@gmail.com
0987571382 / 0979894628
Calle Bolívar 1-38 y Av. Marco Aurelio Subía
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO

Adjunto Informe de Fiscalización No.17

@IngenieroCivilOGI
ohgi@hotmail.es
ohgiomar@gmail.com
0987571582 / 0979894628
Calle Bolívar 1-38 y Av. Marco Aurelio Subia
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

"FISCALIZACIÓN ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

INFORME DE FISCALIZACIÓN N.017

INFORME DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 03

PROYECTO: ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. Representante legal Sr. Ángel Misael López C.

MONTO DEL CONTRATO: 789.464,39 sin IVA

FECHA DE ELABORACIÓN: 17 de abril de 2023

1.- ANTECEDENTES

- Con fecha 20 de junio de 2022 se suscribió el contrato cuyo objeto de contratación es el: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", los trabajos se ejecutarán en la vía a Allishungo, Parroquia Teniente Hugo Ortiz, Cantón y Provincia de Pastaza, con sujeción a diseños, especificaciones y más documentos contractuales, por un monto de U.S.D. $789.464,39 con un plazo de 180 días.

- Con fecha 31 de agosto de 2022 se suscribió el Acta de inicio de obra por una parte Ing. Gustavo Navas, en calidad de Administrador de Contrato, el Ing. Omar Henry Guaman Iler, en calidad de Fiscalizador, los mismos en representación del GADPPz y por otra parte la constructora CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA.LTDA en calidad de contratista ejecutor, con la finalidad de suscribir la presente Acta de inicio de obra e inicio de plazo contractual.

- Mediante Oficio GNM - GADPPZz - 2022 de fecha 31 de agosto del 2022 el Ing. Gustavo Navas en calidad de Administrador de Contrato realiza la Notificación de orden de inicio de contrato de obra y de fiscalización externa

- Mediante OFICIO N. 001-2022-FISC-EXT de fecha 01 de septiembre de 2022 la fiscalización Externa Solicita la reprogramación del cronograma ofertado del contratista de la obra.

- Mediante OFICIO N. 002-2022-FISC-EXT de fecha 01 de septiembre de 2022 la fiscalización Externa Solicita la documentación correspondiente a la metodología, personal técnico y equipo mínimo al contratista.

- Mediante Oficio No:001-EDDYMICH-2022 de fecha 02 de septiembre de 2022 el contratista emite la reprogramación de los cronogramas ofertados.

- Mediante Oficio No:002-EDDYMICH-2022 de fecha 05 de septiembre de 2022 el contratista emite la Metodología de trabajo.

- Mediante OFICIO N. 003-2022-FISC-EXT de fecha 05 de septiembre de 2022 la fiscalización Externa solicita la aprobación de la reprogramación de cronogramas al Administrador de contrato de obra.

- Mediante OFICIO N. 004-2022-FISC-EXT de fecha 05 de septiembre de 2022 la fiscalización Externa solicita la aprobación de la reprogramación de cronogramas de fiscalización al Administrador de la fiscalización.

- Mediante Oficio No:004-EDDYMICH-2022 de fecha 12 de septiembre de 2022 el contratista solicita la revisión y aprobación del replanteo y nivelación del trazado de la vía existente.

- Mediante OFICIO N. 005-2022-FISC-EXT de fecha 27 de septiembre de 2022 la fiscalización Externa solicita la aprobación de los planos del levantamiento topográfico de las condiciones de la vía existente al administrador de contrato.

- Mediante OFICIO N. 006-2022-FISC-EXT de fecha 27 de septiembre de 2022 la fiscalización Externa emite la documentación del equipo mínimo y personal técnico propuesto para el contrato de la fiscalización, el cual cumple con lo solicitado en los pliegos.

- Mediante OFICIO N. 007-2022-FISC-EXT de fecha 30 de septiembre de 2022 la fiscalización Externa emite la documentación de la metodología, el equipo mínimo y personal técnico propuesto para la obra y cronogramas reprogramados ofertados, el cual cumple con lo solicitado en los pliegos.

- Mediante Oficio No:009-EDDYMICH-2022 de fecha 19 de octubre de 2022 el contratista solicita cantidades de obra en excedentes a ser considerados en el proyecto para su revisión, análisis y aprobación.

- Mediante Oficio No:015-EDDYMICH-2022 de fecha 01 de diciembre de 2022 el contratista emite reprogramación de obra No.002.

- Mediante OFICIO N. 020-2022-FISC-EXT de fecha 01 de diciembre de 2022 la fiscalización Externa solicita al contratista la reprogramación de obra No.02 en base a la orden de cambio Nro.01 aprobada.

- Mediante OFICIO N. 021-2022-FISC-EXT de fecha 05 de diciembre de 2022 la fiscalización Externa solicita al Administrador de contrato la aprobación de la reprogramación de obra Nro.002.

- Mediante OFICIO N. 022-2022-FISC-EXT de fecha 06 de diciembre de 2022 la fiscalización Externa informa al contratista sobre LA APROBACION DE LA REPROGRAMACION DE OBRA Nro.02.

- Mediante Oficio No:003-EDDYMICH-2023 de fecha 25 de enero de 2023 el contratista solicita una AMPLIACIÓN DE PLAZO 01 de 40 días.

- Mediante Oficio No. 006-EDDYMICH-2023 de fecha 30 de enero de 2023 el contratista solicita AUTORIZACIÓN PARA TRABAJOS DE CONTENCIÓN DE VÍA POR CAUSA DE UN ALTO NIVEL FREÁTICO EN LA ABSCISA 0+185 MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO A MANERA DE MURO DE CONTENCIÓN, Y COLOCACIÓN

DE UNA FILA DE MALLA DE GAVIÓN EN LA PARTE SUPERIOR PARA CONFINAMIENTO DEL ANCHO DE VÍA EN US PARTE SUPERIOR.

- Mediante OFICIO N. 008-2023-FISC-EXT de fecha 07 de febrero de 2023 la fiscalización Externa da la APROBACIÓN DE VARIANTE DEL PROYECTO EN EL TRAMO DE LA ABSC. 2+480-2+666.73 POR MOTIVO DE DESLIZAMIENTO DE LA MESA DE LA VÍA EXISTENTE.

- Mediante Oficio No. 009-EDDYMICH-2023 de fecha 17 de febrero de 2023 el contratista solicita la AMPLIACIÓN DE PLAZO 01, en la cual contabiliza 40 días por causa de excedentes en ciertos rubros contractuales, incidencia de lluvias que paralizaron actividades programadas y caso fortuito o de fuerza mayor suscitados en la vía durante la ejecución de los trabajos.

- Mediante OFICIO N. 008-2023-FISC-EXT de fecha 27 de febrero de 2023 la fiscalización externa aprueba la orden de ampliación de plazo No. 1 y solicitud de reprogramación No. 3, la cual es de 40 días y cuya fecha de terminación de la obra sería el 8 de abril de 2023.

- Mediante Oficio No. 011-EDDYMICH-2023 de fecha 27 de febrero de 2023 el contratista solicita la AMPLIACIÓN DE PLAZO 02, en la cual contabiliza 10 días por causa de excedentes en ciertos rubros contractuales, incidencia de lluvias que paralizaron actividades programadas y caso fortuito o de fuerza mayor suscitados en la vía durante la ejecución de los trabajos.

- El Administrador de Contrato de Obra mediante Oficio No. 015-G.N.-ALLISHUNGO-2022 de fecha 02 de marzo de 2023, solicita realizar el informe correspondiente sobre ampliación de plazo No. 2, en relación al OFICIO No.11-EDDYMICH-2023 de fecha 27 de febrero de 2023.

- Mediante OFICIO N. 027-2023-FISC-EXT de fecha 3 de abril de 2023, la fiscalización externa en atención al Oficio No. 015-G.N.-ALLISHUNGO-2022 de fecha 02 de marzo de 2023 del Administrador del Contrato, procede a enviar el informe cuyo asunto es SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE OBRA No. 02

- El contratista mediante Oficio No. 18-EDDYMICH-2023 de fecha 5 de abril de 2023, solicita se otorgue una ampliación de plazo 03 de 15 días por incidencia de lluvias intensas que paralizaron actividades programadas.

De acuerdo a la reprogramación N° 03 del cronograma valorado de trabajos vigente, en el periodo de marzo de 2023, se encontraba programado los trabajos de HORMIGÓN PARA CUNETAS (F´C=180 KG/CM2), donde dicha actividad programada sufrió paralizaciones por cuestiones climatológicas de lluvias intensas suscitadas en los días 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 21, 24, 27, 28, 31, lo cual fue registrado en el libro de obra y en un registro de estado del tiempo. La información climatológica para corroborar las lluvias en este periodo se encuentra sustentada en el Registro de Información Climatológica Aeronáutica de Precipitaciones del mes de MARZO-

2023 (código: GMET-PR-001-RG-005) de la Dirección General de Aviación Civil-Aeropuerto "Rio amazonas"-Shell Mera.

- El Administrador de contrato de Obra mediante Oficio No. 019-G.N.-ALLISHUNGO-2022 de fecha 12 de abril de 2023, manifiesta que en relación al Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4934-M, de fecha 11 de abril de 2023, en donde se hace referencia a la aprobación de AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 2 del proyecto "**ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**, es importante indicar que el contratista debe presentar la reprogramación la misma que debe ser analizada y aprobada.

- Mediante OFICIO N. 031-2023-FISC-EXT de fecha 14 de abril de 2023 se da a conocer al contratista que en referencia al OFICIO No. 18-EDDYMICH-2023 de fecha 8 de abril de 2023, donde solicita una ampliación de plazo de 10 días, se aprueba lo solicitado por Fiscalización Externa, Administrador de contrato y el delegado de la máxima autoridad del Gobierno autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, siendo la nueva fecha de terminación contractual el 18 de abril de 2023. El contratista en función de los días de prorroga deberá realizar la reprogramación al cronograma de trabajos vigente.

2.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO:	ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.
CÓDIGO DEL PROCESO:	COTO-GADPPz-005-2022
MONTO DEL CONTRATO:	USD. 789.464,39
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20 DE JUNIO DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL:	180 DÍAS
MONTO DEL ANTICIPO:	USD. 315.785,75
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:	04 DE JULIO DE 2022
FECHA DE INICIO DE TRABAJO:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01:	8 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01 + AMPLIACIÓN DE PLAZO 02:	18 DE ABRIL DE 2023
SUSPENSIÓN DE TRABAJO:	NINGUNA
AMPLIACIÓN DE PLAZO 01:	40 DÍAS
AMPLIACIÓN DE PLAZO 02:	10 DÍAS
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA
GEORREFERENCIACIÓN DEL PROYECTO:	PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA

3.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN

OBJETO DEL CONTRATO:	FISCALIZACIÓN ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
CÓDIGO DEL PROCESO:	CDC-GADPPz-012-2022
MONTO DEL CONTRATO:	49.960,16 USD
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27 DE JULIO DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL:	180 DÍAS
MONTO DEL ANTICIPO:	19.984,06 USD
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:	18 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE INICIO DE TRABAJO:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01:	8 DE ABRIL DE 2023
SUSPENSIÓN DE TRABAJO:	NINGUNA
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01 + AMPLIACIÓN DE PLAZO 02:	18 DE ABRIL DE 2023
AMPLIACIÓN DE PLAZO 01:	40 DÍAS
AMPLIACIÓN DE PLAZO 02:	10 DÍAS
CONTRATISTA:	ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
ADMINISTRADOR DE CONTRATO OBRA	ING. EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

4.- ANÁLISIS DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO 03

- En atención al Oficio No. 018-G.N.-ALLISHUNGO-2022 de fecha 12 de abril de 2023 del Administrador de Contrato de Obra, y de acuerdo a la documentación presentada en el Oficio No. 18-EDDYMICH-2023 suscrito por el Sr. Ángel Misael López Chávez, en calidad de Representante Legal de la CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA., luego de la revisión y análisis del documento cuyo asunto es la SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 03, me permito informar lo siguiente:

  En el proceso de ejecución del contrato de COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-005-2022, **ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**; como se indica en el oficio anteriormente detallado, es necesario realizar una prórroga de plazo que conllevaría en una reprogramación del cronograma vigente, ya que de acuerdo a la reprogramación N° 03 del cronograma valorado de trabajos vigente, en el periodo de marzo de 2023, se encontraba programado los trabajos de HORMIGÓN PARA CUNETAS (F´C=180 KG/CM2), donde dicha actividad programada sufrió paralizaciones por cuestiones climatológicas de lluvias intensas suscitadas en los días 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 21, 24, 27, 28, 31, lo cual fue registrado en el libro de obra y en un registro de estado del tiempo. La información climatológica para corroborar las lluvias en este periodo se encuentra sustentada en el Registro de Información Climatológica Aeronáutica de Precipitaciones del mes de MARZO-2023 (código: GMET-PR-001-RG-005) de la Dirección General de Aviación Civil-Aeropuerto "Rio amazonas"-Shell Mera.

- Con fundamento en el ACUERDO No. 004-CG-2023, las Norma de control Interno de la Contraloría General del Estado No. **408-26 Prorrogas de plazo**, establece que *"Se concederán prórrogas de plazo cuando por razones no imputables al contratista se produzcan atrasos en actividades críticas o en actividades cuya holgura total sea sobrepasada, tornándolas críticas y de conformidad con las estipulaciones contractuales y con la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública."*.

- Con fundamento en el ACUERDO No. 004-CG-2023, las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, en su numeral ***408-24 Incidencia de lluvias***, indican:

  > *"**408-24**...Si las labores se suspenden a causa de la lluvia, se hará constar en el libro de obra o un registro la fecha en la cual se presentó esa condición, cuales trabajos se suspendieron, a qué hora y por cuanto tiempo, en qué medida fueron afectados y se expondrán las razones por las cuales no se pudo continuar. Las anotaciones serán ratificadas por la firma del Fiscalizador encargado de llevar este control, así como por la del profesional representante del contratista. Los*

datos así recabados se emplearán, en conjunto con el programa de ejecución, para determinar la prórroga de plazo que se autorizara por este concepto.

- La presencia de lluvias intensas provocó la suspensión de los trabajos programados de HORMIGÓN EN CUNETAS (F´C=180 KG/CM2), debido a que la presencia del agua lluvia influye en el aumento de la proporción de agua en la mezcla de hormigón no solo en el momento del mezclado, también en el transporte, la colocación, la compactación y en el acabado. Estos factores aumentan la relación agua -cemento de la mezcla, lo cual reduce la resistencia mecánica final del hormigón.

- Detalle de los **15 días** debidamente registrados y validados por la fiscalización para la ampliación de plazo por motivos de lluvias:

FECHA DE LA INCIDENCIA EN LOS TRABAJOS	**TIEMPO VALIDADO POR FISCALIZACIÓN**		**OBSERVACIONES**
	HORAS	**DÍAS**	
2/03/2023	8	1	❖ Paralización de los trabajos por incidencia de la lluvia, NCICGE 408-25. ❖ REGISTRO INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA AERONÁUTICA PRECIPITACIÓN - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN CIVIL AEROPUERTO RIO AMAZONAS-SHELL. ❖ REGISTRO DE ESTADO DEL TIEMPO. ❖ REGISTRO EN EL LIBRO DE OBRA
3/03/2023	8	1	
4/03/2023	8	1	
6/03/2023	8	1	
8/03/2023	8	1	
9/03/2023	8	1	
11/03/2023	8	1	
12/03/2023	8	1	
14/03/2023	8	1	
17/03/2023	8	1	
21/03/2023	8	1	
24/03/2023	8	1	
27/03/2023	8	1	
28/03/2023	8	1	
31/03/2023	8	1	
TOTAL:	**120**	**15**	***TOTAL DE DÍAS VALIDADOS.***
NOTA: Se considera a la jornada diaria de trabajo con una duración de 8 horas.			

- Análisis de plazo contractual:

DETALLE DE PLAZO CONTRACTUAL	
FECHA DE INICIO DE TRABAJO:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL:	180 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	27 DE FEBRERO DE 2023
AMPLIACIÓN DE PLAZO 01	40 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01	8 DE ABRIL DE 2023
AMPLIACIÓN DE PLAZO 02	10 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01 + AMPLIACIÓN DE PLAZO 02	18 DE ABRIL DE 2023

5.- CONCLUSIONES

Por lo expuesto, es criterio de la fiscalización, en función de la documentación presentada por parte del Sr. Ángel Misael López Chávez, en calidad de Representante Legal de la CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA en calidad de contratista, **OTORGAR UNA PRORROGA DE PLAZO DE 15 DÍAS**, al contrato de COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-005-2022 ***"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"***, para lo cual se ha contabilizado y validado 15 días por motivos de lluvias intensas que incidieron en la paralización de los trabajos programados. El contratista en función de los días de prorroga deberá realizar la REPROGRAMACIÓN AL CRONOGRAMA DE TRABAJOS vigente.

Dicha prorroga se encuentra realizada con fundamento en lo siguiente:

- Que, en base al ACUERDO No. 004-CG-2023, las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, en su numeral *408-24 Incidencia de lluvias* y *408-26 Prorrogas de plazo*, indican:

> *"**408-24**...Si las labores se suspenden a causa de la lluvia, se hará constar en el libro de obra o un registro la fecha en la cual se presentó esa condición, cuales*

trabajos se suspendieron, a qué hora y por cuanto tiempo, en qué medida fueron afectados y se expondrán las razones por las cuales no se pudo continuar. Las anotaciones serán ratificadas por la firma del Fiscalizador encargado de llevar este control, así como por la del profesional representante del contratista. Los datos así recabados se emplearán, en conjunto con el programa de ejecución, para determinar la prórroga de plazo que se autorizara por este concepto.

***408-26** "Se concederán prórrogas de plazo cuando por razones no imputables al contratista se produzcan atrasos en actividades críticas o en actividades cuya holgura total sea sobrepasada, tornándolas críticas y de conformidad con las estipulaciones contractuales y con la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública."*

- Técnicamente en presencia de lluvias intensas es recomendable no ejecutar trabajos de hormigonado al aire libre, debido a que la presencia del agua lluvia influye en el aumento de la proporción de agua en la mezcla de hormigón no solo en el momento de la mezcla, también en el transporte, la colocación, la compactación y en el acabado. Estos factores aumentan la relación agua -cemento de la mezcla, lo cual reduce la resistencia mecánica final del hormigón.

- Se determina que:
  La fecha de terminación o entrega de la obra que estaba para el 18 de abril de 2023, se aplazaría hasta el 3 de mayo de 2023.

DETALLE DE PLAZO CONTRACTUAL-PRORROGA 03	
AMPLIACIÓN DE PLAZO 03:	15 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 03:	3 DE MAYO DEL 2023

6.- RECOMENDACIONES

1.- Continuar con los trámites administrativos para la PRORROGA DE PLAZO 03.

2.-Continuar con las labores encomendadas en la fiscalización con el fin de dar cumplimiento con la correcta ejecución del contrato conforme a la normativa legal vigente.

3.- Coordinar de manera oportuna todos los trámites administrativos entre el contratista de obra, fiscalizador externo y Gobierno Provincial del Pastaza con el fin de garantizar la correcta ejecución del contrato.

4.- Continuar con las labores encomendadas de cada personal técnico y su porcentaje de participación que garanticen el fiel cumplimiento del contrato.

7.- RESPONSABLE



Ing. Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO
RUC: 0503341257001
Telf: 0987571382

ANEXO:
OFICIO No. 018-G.N.-ALLISHUNGO-2022 que contiene:

- OFICIO No. 18-EDDYMICH-2023

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

INFORME Y ORDEN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO
- PROYECTOS -

ORDEN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°	Orden No. 3		FECHA:	17 de abril de 2023
NOMBRE DEL PROYECTO	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"			
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.		SOLICITUD Y FECHA	OFICIO N. 033-2023-FISC-EXT , de fecha 17 de abril de 2023
FECHA DE INICIO	01 de septiembre de 2022		FECHA TÉRMINO	03 de mayo de 2023
PLAZO DEL CONTRATO	180 días		MONTO CONTRATADO	$ 789,464.39 USD

MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN	ITEM	DESCRIPCIÓN	DÍAS	JUSTIFICACIÓN
	01	INCIDENCIA DE LA LLUVIA	15 dias	MOTIVOS DE LLIVIAS

CRITERIO APROBACIÓN AMPLICACIÓN	ANÁLISIS TÉCNICO	ITEM	SI	NO
	Del análisis técnico de los ítems en mención, la Unidad de Fiscalización considera procedente aprobar la ampliación de plazo solicitada.	01	X	
		02	X	
		03		
		04		
		05		

DETALLE DE LA AMPLIACIÓN	DETALLE	DÍAS	AMPLIACIONES ANTERIORES		DÍAS
	Plazo Inicial Contractual	180	Ampliación de Plazo N° 01		40
	Ampliación de Plazo Solicitada N° 01 (aprobada, nueva terminación 08-04-2023)	40	Ampliación de Plazo N° 02		10
	Ampliación de Plazo N° 0 2 Aprobada	10	Ampliación de Plazo N° 03		15
	Ampliación de Plazo N° 0 3 Aprobada	15	Ampliación de Plazo N° ...		
	Nueva Fecha Término de Obra	03-05-2023	Ampliación de Plazo N° ...		
			TOTAL DE DÍAS:		65

SE LEGALIZA AMPLIACIÓN DE PLAZO SEGÚN CONTRATO N°	Clausula Novena: Prorrogas de plazo	
ADJUNTO: INFORME FISCALIZACIÓN N°	OFICIO N. 033-2023-FISC-EXT	FECHA: 17 de abril de 2023
ADJUNTO: INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO N°	Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-6788-M	FECHA: 17 de abril de 2023

NOTA: De conformidad con el artículo 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los fiscalizadores y Administradores de los contratos, certifican con su firma que, verificaron y garantizan por ser de su única responsabilidad, el cumplimiento de veracidad y legalidad de las motivaciones, valores autorizados, de los documentos justificativos y comprobatorios, y de las modificaciones contractuales autorizadas, garantizando que las mismas, no afectan la calidad, cantidad, avance físico y financiero, la ejecución del contrato y proyectos programados.

OMAR HENRY GUAMAN ILER	EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ
Ing. Omar Henry Guamán Iler REVISADO Y REQUERIDO POR: **FISCALIZADOR**	*Ing. Edwin Gustavo Navas Manjarrez* APROBADO POR: **ADMINISTRADOR**

ALVARO RENATO SOSA CASTRO

AUTORIZADO POR:
PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA Ó DELEGADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 01

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789.464,39		
PERIODO:	1-sep.-22	30-sep.-22	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315.785,75	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7,00	476,17	3.333,19000		0,20	0,20		95,23	95,23	2,86
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3,50	405,49	1.419,21500		3,50	3,50		1.419,22	1.419,22	100,00
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9.419,69	0,72	6.782,17680		9.102,22	9.102,22		6.553,60	6.553,60	96,63
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189,90	11,34	2.153,46600		7,20	7,20		81,65	81,65	3,79
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M3	1.706,60	3,70	6.314,42000							
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	368,64	3,94	1.452,44160							
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	1.412,95	1,35	1.907,48250							
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80,00	243,32	19.465,60000							
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314,88	189,47	59.660,31360							
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M3	91,84	177,81	16.330,07040							
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770,00	60,24	46.384,80000							
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M3	17.988,24	2,38	42.812,01120		7.051,49	7.051,49		16.782,55	16.782,55	39,20
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M3	4.611,60	10,16	46.853,85600		1.812,91	1.812,91		18.419,17	18.419,17	39,31
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M3	2.880,87	12,94	37.278,45780					0,00		
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1.412,95	0,81	1.144,48950		1.382,88	1.382,88		1.120,13	1.120,13	97,87
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863.435,52	0,22	189.955,81440		267.956,54	267.956,54		58.950,44	58.950,44	31,03
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204.755,04	0,22	45.046,10880		63.451,85	63.451,85		13.959,41	13.959,41	30,99
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127.910,63	0,22	28.140,33860							
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32.340,00	0,66	21.344,40000							
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23.100,00	8,05	185.955,00000							
	SEÑALIZACION											
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9.800,00	0,22	2.156,00000							
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875,00	5,36	4.690,00000							
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1,00	332,16	332,16000							
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6,00	283,40	1.700,40000							
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6,00	283,40	1.700,40000							
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10,00	117,23	1.172,30000							
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100,00	117,23	11.723,00000							
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2,00	66,74	133,48000							
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2,00	145,37	290,74000		2,00	2,00		290,74	290,74	100,00
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500,00	0,28	140,00000		88,40	88,40		24,75	24,75	17,68
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10,00	20,40	204,00000		10,00	10,00		204,00	204,00	100,00
	MEDIDAS AMBIENTALES											
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2,00	15,93	31,86000		2,00	2,00		31,86	31,86	100,00
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2,00	143,00	286,00000		2,00	2,00		286,00	286,00	100,00
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1,00	110,00	110,00000		1,00	1,00		110,00	110,00	100,00
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1,00	110,00	110,00000							
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1,00	110,00	110,00000							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 01

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789.464,39		
PERIODO:	1-sep.-22	30-sep.-22	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315.785,75	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20,00	42,02	840,40000							
					789.464,39220				**0,00**	**118.328,75**	**118.328,75**	**14,99**

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	1-sep.-22	
FIN PLAZO CONTRACTUAL	27-feb.-23	
SUSPENSION DIAS	0	DIAS
AMPLIACIÓN DÍAS	0	DIAS
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN	27-feb.-23	
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	17-oct.-20	
FECHA DE APROBACIÓN	17-oct.-20	

VALOR PLANILLADO AVANCE DE OBRA	0,00	118.328,75	118.328,75
			0,00
			0,00
TOTAL PLANILLADO	**0,00**	**118.328,75**	**118.328,75**

DESCUENTOS Y RETENCIONES				
ANTICIPO :	40%	0,00	47.331,50	47.331,50
OTROS:				0,00
TOTAL DE DESCUENTOS:		**0,00**	**47.331,50**	**47.331,50**
VALOR LIQUIDO ESTA PLANILLA :		**0,00**	**70.997,25**	**70.997,25**

Firmado electrónicamente por:
ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por:
OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 01

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789.464,39		
PERIODO:	1-sep.-22	30-sep.-22	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315.785,75	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7	476,17	3333,19							
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3,5	405,49	1419,215							
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9419,69	0,72	6782,1768							
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189,9	11,34	2153,466							
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M3	1706,6	3,7	6314,42							
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	368,64	3,94	1452,4416							
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	1412,95	1,35	1907,4825							
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80	243,32	19465,6							
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314,88	189,47	59660,3136							
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M3	91,84	177,81	16330,0704							
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770	60,24	46384,8							
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M3	17988,24	2,38	42812,0112							
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M3	4611,6	10,16	46853,856							
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M3	2880,87	12,94	37278,4578							
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M^3	1412,95	0,81	1144,4895							
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M^3-KM	863435,52	0,22	189955,8144							
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M^3-KM	204755,04	0,22	45046,1088							
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M^3-KM	127910,63	0,22	28140,3386							
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32340	0,66	21344,4							
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23100	8,05	185955							
	SEÑALIZACION											
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9800	0,22	2156							
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875	5,36	4690							
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1	332,16	332,16							
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6	283,4	1700,4							
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6	283,4	1700,4							
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10	117,23	1172,3							
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100	117,23	11723							
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2	66,74	133,48							
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2	145,37	290,74							
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500	0,28	140							
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10	20,4	204							
	MEDIDAS AMBIENTALES											
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2	15,93	31,86							
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2	143	286							
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110							
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110							
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 01

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789.464,39		
PERIODO:	1-sep.-22	30-sep.-22	
PLAZO:	180	DIAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315.785,75	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20	42,02	840,4							
					789.464,39220				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	1-sep.-22	
FIN PLAZO CONTRACTUAL	27-feb.-23	
SUSPENSION DIAS	0	DIAS
AMPLIACIÓN DÍAS	0	DIAS
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN	27-feb.-23	
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	17-oct.-20	
FECHA DE APROBACIÓN	17-oct.-20	

VALOR PLANILLADO AVANCE DE OBRA	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL PLANILLADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESCUENTOS Y RETENCIONES				
ANTICIPO :	40%	0,00	0,00	0,00
OTROS:				0,00
TOTAL DE DESCUENTOS:		**0,00**	**0,00**	**0,00**
VALOR LIQUIDO ESTA PLANILLA :		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Firmado electrónicamente por:
ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONSORCIO FATIMA

Firmado electrónicamente por:
OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789.464,39		
PERIODO:	1-sep.-22	30-sep.-22	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315.785,75	40%	

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7	476,17	3333,19	0,20	95,23	0,01%	0,00	0,00	0,00%	-0,20	-95,23	-1,21%
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3,5	405,49	1419,215	3,50	1419,22	0,18%	0,00	0,00	0,00%	-3,50	-1419,22	-17,98%
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9419,69	0,72	6782,1768	9102,22	6553,60	0,83%	0,00	0,00	0,00%	-9102,22	-6553,60	-83,01%
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189,9	11,34	2153,466	7,20	81,65	0,01%	0,00	0,00	0,00%	-7,20	-81,65	-1,03%
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M3	1706,6	3,7	6314,42									
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	368,64	3,94	1452,4416									
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	1412,95	1,35	1907,4825									
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80	243,32	19465,6									
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314,88	189,47	59660,3136									
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M3	91,84	177,81	16330,0704									
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770	60,24	46384,8									
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M3	17988,24	2,38	42812,0112	7051,49	16782,55	2,13%	0,00	0,00	0,00%	-7051,49	-16782,55	-212,58%
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M3	4611,6	10,16	46853,856	1812,91	18419,17	2,33%	0,00	0,00	0,00%	-1812,91	-18419,17	-233,31%
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M3	2880,87	12,94	37278,4578									
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M^3	1412,95	0,81	1144,4895	1382,88	1120,13	0,14%	0,00	0,00	0,00%	-1382,88	-1120,13	-14,19%
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M^3-KM	863435,52	0,22	189955,8144	267956,54	58950,44	7,47%	0,00	0,00	0,00%	-267956,54	-58950,44	-746,71%
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M^3-KM	204755,04	0,22	45046,1088	63451,85	13959,41	1,77%	0,00	0,00	0,00%	-63451,85	-13959,41	-176,82%
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M^3-KM	127910,63	0,22	28140,3386									
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32340	0,66	21344,4									
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23100	8,05	185955									
	SEÑALIZACION													
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9800	0,22	2156									
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875	5,36	4690									
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1	332,16	332,16									
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6	283,4	1700,4									
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6	283,4	1700,4									
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10	117,23	1172,3									
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100	117,23	11723									
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2	66,74	133,48									
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2	145,37	290,74	2,00	290,74	0,04%	0,00	0,00	0,00%	-2,00	-290,74	-3,68%
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500	0,28	140	88,40	24,75	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-88,40	-24,75	-0,31%
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10	20,4	204	10,00	204,00	0,03%	0,00	0,00	0,00%	-10,00	-204,00	-2,58%
	MEDIDAS AMBIENTALES													
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2	15,93	31,86	2,00	31,86	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-2,00	-31,86	-0,40%
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2	143	286	2,00	286,00	0,04%	0,00	0,00	0,00%	-2,00	-286,00	-3,62%
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110	1,00	110,00	0,01%	0,00	0,00	0,00%	-1,00	-110,00	-1,39%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789.464,39		
PERIODO:	1-sep.-22	30-sep.-22	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315.785,75	40%	

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110									
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110									
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20	42,02	840,4									
				TOTALES :	789.464,39220		118.328,75	14,99%		0,00	0,00%		-118.328,75	-14,99%

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	1-sep.-22		
FIN PLAZO CONTRACTUAL	27-feb.-23		
SUSPENSION DIAS	0	DIAS	
AMPLIACION DIAS	0	DIAS	
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN	27-feb.-23		
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	17-oct.-20		
FECHA DE APROBACIÓN	17-oct.-20		

MONTO PLANILLADO AVANCE DE OBRA	118.328,75	14,99%	%
MONTO DE INCREMENTOS	0,00	0,00%	%
MONTO DECREMENTOS	-118.328,75	-14,99%	%
TOTAL PLANILLADO	**118.328,75**	**14,99%**	

ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN EXTERNA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 02

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789.464,39		
PERIODO:	1-oct.-22	31-oct.-22	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315.785,75	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7,00	476,17	3.333,19000	0,20		0,20	95,23	0,00	95,23	2,86
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3,50	405,49	1.419,21500	3,50		3,50	1.419,22	0,00	1.419,22	100,00
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9.419,69	0,72	6.782,17680	9.102,22	15.700,63	24.802,85	6.553,60	11.304,45	17.858,05	263,31
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189,90	11,34	2.153,46600	7,20		7,20	81,65	0,00	81,65	3,79
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M3	1.706,60	3,70	6.314,42000		173,80	173,80	0,00	643,06	643,06	10,18
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	368,64	3,94	1.452,44160		285,00	285,00	0,00	1.122,90	1.122,90	77,31
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	1.412,95	1,35	1.907,48250							
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80,00	243,32	19.465,60000							
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314,88	189,47	59.660,31360							
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M3	91,84	177,81	16.330,07040							
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770,00	60,24	46.384,80000		78,00	78,00	0,00	4.698,72	4.698,72	10,13
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M3	17.988,24	2,38	42.812,01120	7.051,49	3.508,08	10.559,57	16.782,55	8.349,23	25.131,78	58,70
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M3	4.611,60	10,16	46.853,85600	1.812,91	1.079,72	2.892,63	18.419,17	10.969,96	29.389,13	62,73
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M3	2.880,87	12,94	37.278,45780							
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1.412,95	0,81	1.144,48950	1.382,88		1.382,88	1.120,13	0,00	1.120,13	97,87
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863.435,52	0,22	189.955,81440	267.956,54	133.307,04	401.263,58	58.950,44	29.327,55	88.277,99	46,47
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204.755,04	0,22	45.046,10880	63.451,85	37.790,20	101.242,05	13.959,41	8.313,84	22.273,25	49,45
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127.910,63	0,22	28.140,33860							
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32.340,00	0,66	21.344,40000							
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23.100,00	8,05	185.955,00000							
	SEÑALIZACION											
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9.800,00	0,22	2.156,00000							
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875,00	5,36	4.690,00000							
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1,00	332,16	332,16000							
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6,00	283,40	1.700,40000							
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6,00	283,40	1.700,40000							
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10,00	117,23	1.172,30000							
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100,00	117,23	11.723,00000							
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2,00	66,74	133,48000		2,00	2,00	0,00	133,48	133,48	100,00
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2,00	145,37	290,74000	2,00		2,00	290,74	0,00	290,74	100,00
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500,00	0,28	140,00000	88,40		88,40	24,75	0,00	24,75	17,68
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10,00	20,40	204,00000	10,00		10,00	204,00	0,00	204,00	100,00
	MEDIDAS AMBIENTALES											
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2,00	15,93	31,86000	2,00		2,00	31,86	0,00	31,86	100,00
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2,00	143,00	286,00000	2,00		2,00	286,00	0,00	286,00	100,00
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1,00	110,00	110,00000	1,00		1,00	110,00	0,00	110,00	100,00
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1,00	110,00	110,00000		1,00	1,00	0,00	110,00	110,00	100,00
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1,00	110,00	110,00000							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 02

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789.464,39		
PERIODO:	1-oct.-22	31-oct.-22	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315.785,75	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20,00	42,02	840,40000							
					789.464,39220				**118.328,75**	**74.973,19**	**193.301,94**	**24,49**

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	1-sep.-22	
FIN PLAZO CONTRACTUAL	27-feb.-23	
SUSPENSION DIAS	0	DIAS
AMPLIACIÓN DÍAS	0	DIAS
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN	27-feb.-23	
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	22-nov.-22	
FECHA DE APROBACIÓN	22-nov.-22	

VALOR PLANILLADO AVANCE DE OBRA	118.328,75	74.973,19	193.301,94
			0,00
			0,00
TOTAL PLANILLADO	**118.328,75**	**74.973,19**	**193.301,94**

DESCUENTOS Y RETENCIONES				
ANTICIPO :	40%	47.331,50	29.989,28	77.320,78
OTROS:				0,00
TOTAL DE DESCUENTOS:		**47.331,50**	**29.989,28**	**77.320,78**
VALOR LIQUIDO ESTA PLANILLA :		**70.997,25**	**44.983,91**	**115.981,16**

Firmado electrónicamente por:
ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por:
OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 02

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789.464,39		
PERIODO:	1-oct.-22	31-oct.-22	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315.785,75	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7	476,17	3333,19000							
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3,5	405,49	1419,21500							
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9419,69	0,72	6782,17680		15.383,16	15.383,16	0,00	11.075,87	11.075,87	163,31
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189,9	11,34	2153,46600							
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M3	1706,6	3,7	6314,42000							
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	368,64	3,94	1452,44160							
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	1412,95	1,35	1907,48250							
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80	243,32	19465,60000							
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314,88	189,47	59660,31360							
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M3	91,84	177,81	16330,07040							
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770	60,24	46384,80000							
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M3	17988,24	2,38	42812,01120							
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M3	4611,6	10,16	46853,85600							
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M3	2880,87	12,94	37278,45780							
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1412,95	0,81	1144,48950							
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863435,52	0,22	189955,81440							
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204755,04	0,22	45046,10880							
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127910,63	0,22	28140,33860							
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32340	0,66	21344,40000							
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23100	8,05	185955,00000							
	SEÑALIZACION											
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9800	0,22	2156,00000							
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875	5,36	4690,00000							
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1	332,16	332,16000							
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6	283,4	1700,40000							
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6	283,4	1700,40000							
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10	117,23	1172,30000							
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100	117,23	11723,00000							
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2	66,74	133,48000							
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2	145,37	290,74000							
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500	0,28	140,00000							
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10	20,4	204,00000							
	MEDIDAS AMBIENTALES											
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2	15,93	31,86000							
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2	143	286,00000							
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110,00000							
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110,00000							
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110,00000							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 02

CONTRATO: C0TO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789.464,39		
PERIODO:	1-oct.-22	31-oct.-22	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315.785,75	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20	42,02	840,40000							
					789.464,39220				**0,00**	**11.075,87**	**11.075,87**	**1,40**

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	1-sep.-22	
FIN PLAZO CONTRACTUAL	27-feb.-23	
SUSPENSION DIAS	0	DIAS
AMPLIACIÓN DÍAS	0	DIAS
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN	27-feb.-23	
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	22-nov.-22	
FECHA DE APROBACIÓN	22-nov.-22	

VALOR PLANILLADO AVANCE DE OBRA	0,00	11.075,87	11.075,87
			0,00
			0,00
TOTAL PLANILLADO	**0,00**	**11.075,87**	**11.075,87**

DESCUENTOS Y RETENCIONES				
ANTICIPO :	0%	0,00	0,00	0,00
OTROS:				0,00
TOTAL DE DESCUENTOS:		**0,00**	**0,00**	**0,00**
VALOR LIQUIDO ESTA PLANILLA :		**0,00**	**11.075,87**	**11.075,87**

Firmado electrónicamente por:
ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONSORCIO FATIMA

Firmado electrónicamente por:
OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES - PLANILLA AVANCE 02

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789.464,39		
PERIODO:	1-oct.-22	31-oct.-22	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315.785,75	40%	

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7	476,17	3333,19000	0,20	95,23	1,21%	0,00	0,00	0,00%	-0,20	-95,23	-1,20%
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3,5	405,49	1419,21500	3,50	1419,22	17,98%	0,00	0,00	0,00%	-3,50	-1419,22	-18,00%
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9419,69	0,72	6782,17680	24802,85	17858,05	226,20%	15383,16	11075,87	140,30%	-9419,69	-6782,18	-85,90%
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189,9	11,34	2153,46600	7,20	81,65	1,03%	0,00	0,00	0,00%	-7,20	-81,65	-1,00%
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M3	1706,6	3,7	6314,42000	173,80	643,06	8,15%	0,00	0,00	0,00%	-173,80	-643,06	-8,10%
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	368,64	3,94	1452,44160	285,00	1122,90	14,22%	0,00	0,00	0,00%	-285,00	-1122,90	-14,20%
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	1412,95	1,35	1907,48250									
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80	243,32	19465,60000									
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314,88	189,47	59660,31360									
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M3	91,84	177,81	16330,07040									
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770	60,24	46384,80000	78,00	4698,72	59,52%	0,00	0,00	0,00%	-78,00	-4698,72	-59,50%
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M3	17988,24	2,38	42812,01120	10559,57	25131,78	318,34%	0,00	0,00	0,00%	-10559,57	-25131,78	-318,30%
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M3	4611,6	10,16	46853,85600	2892,63	29389,13	372,27%	0,00	0,00	0,00%	-2892,63	-29389,13	-372,30%
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M3	2880,87	12,94	37278,45780									
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1412,95	0,81	1144,48950	1382,88	1120,13	14,19%	0,00	0,00	0,00%	-1382,88	-1120,13	-14,20%
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863435,52	0,22	189955,81440	401263,58	88277,99	1118,20%	0,00	0,00	0,00%	-401263,58	-88277,99	-1118,20%
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204755,04	0,22	45046,10880	101242,05	22273,25	282,13%	0,00	0,00	0,00%	-101242,05	-22273,25	-282,10%
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127910,63	0,22	28140,33860									
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32340	0,66	21344,40000									
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23100	8,05	185955,00000									
	SEÑALIZACION													
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9800	0,22	2156,00000									
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875	5,36	4690,00000									
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1	332,16	332,16000									
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6	283,4	1700,40000									
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6	283,4	1700,40000									
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10	117,23	1172,30000									
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100	117,23	11723,00000									
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2	66,74	133,48000	2,00	133,48	1,69%	0,00	0,00	0,00%	-2,00	-133,48	-1,70%
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2	145,37	290,74000	2,00	290,74	3,68%	0,00	0,00	0,00%	-2,00	-290,74	-3,70%
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500	0,28	140,00000	88,40	24,75	0,31%	0,00	0,00	0,00%	-88,40	-24,75	-0,30%
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10	20,4	204,00000	10,00	204,00	2,58%	0,00	0,00	0,00%	-10,00	-204,00	-2,60%
	MEDIDAS AMBIENTALES													
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2	15,93	31,86000	2,00	31,86	0,40%	0,00	0,00	0,00%	-2,00	-31,86	-0,40%
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2	143	286,00000	2,00	286,00	3,62%	0,00	0,00	0,00%	-2,00	-286,00	-3,60%
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110,00000	1,00	110,00	1,39%	0,00	0,00	0,00%	-1,00	-110,00	-2,40%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES - PLANILLA AVANCE 02

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789.464,39		
PERIODO:	1-oct.-22	31-oct.-22	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315.785,75	40%	

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110,00000	1,00	110,00	1,39%	0,00	0,00	0,00%	-1,00	-110,00	-1,40%
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110,00000									
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20	42,02	840,40000									
				TOTALES :	789.464,39220		193.301,94	24,49%		11.075,87	1,40%		-182.226,07	-23,09%

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	1-sep.-22	
FIN PLAZO CONTRACTUAL	27-feb.-23	
SUSPENSION DIAS	0	DIAS
AMPLIACION DIAS	0	DIAS
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN	27-feb.-23	
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	22-nov.-22	
FECHA DE APROBACIÓN	22-nov.-22	

MONTO PLANILLADO AVANCE DE OBRA	193.301,94	24,49%	%
MONTO DE INCREMENTOS	11.075,87	1,40%	%
MONTO DECREMENTOS	-182.226,07	-23,09%	%
TOTAL PLANILLADO	**193.301,94**	**24,49%**	

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN EXTERNA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 03

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789.464,39		
PERIODO:	1-nov.-22	30-nov.-22	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315.785,75	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7,00	476,17	3.333,19000	0,20		0,20	95,23	0,00	95,23	2,86
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3,50	405,49	1.419,21500	3,50		3,50	1.419,22	0,00	1.419,22	100,00
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9.419,69	0,72	6.782,17680	24.802,85	4.090,66	28.893,51	17.858,05	2.945,28	20.803,33	306,74
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189,90	11,34	2.153,46600	7,20		7,20	81,65	0,00	81,65	3,79
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M3	1.706,60	3,70	6.314,42000	173,80		173,80	643,06	0,00	643,06	10,18
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	368,64	3,94	1.452,44160	285,00		285,00	1.122,90	0,00	1.122,90	77,31
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	1.412,95	1,35	1.907,48250							
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80,00	243,32	19.465,60000							
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314,88	189,47	59.660,31360							
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M3	91,84	177,81	16.330,07040							
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770,00	60,24	46.384,80000	78,00		78,00	4.698,72	0,00	4.698,72	10,13
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M3	17.988,24	2,38	42.812,01120	10.559,57	4.144,49	14.704,06	25.131,78	9.863,89	34.995,67	81,74
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M3	4.611,60	10,16	46.853,85600	2.892,63	910,20	3.802,83	29.389,13	9.247,63	38.636,76	82,46
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M3	2.880,87	12,94	37.278,45780							
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1.412,95	0,81	1.144,48950	1.382,88		1.382,88	1.120,13	0,00	1.120,13	97,87
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863.435,52	0,22	189.955,81440	401.263,58	157.490,54	558.754,12	88.277,99	34.647,92	122.925,91	64,71
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204.755,04	0,22	45.046,10880	101.242,05	31.857,00	133.099,05	22.273,25	7.008,54	29.281,79	65,00
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127.910,63	0,22	28.140,33860							
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32.340,00	0,66	21.344,40000							
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23.100,00	8,05	185.955,00000							
	SEÑALIZACION											
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9.800,00	0,22	2.156,00000							
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875,00	5,36	4.690,00000							
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1,00	332,16	332,16000							
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6,00	283,40	1.700,40000							
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6,00	283,40	1.700,40000							
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10,00	117,23	1.172,30000							
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100,00	117,23	11.723,00000							
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2,00	66,74	133,48000	2,00		2,00	133,48	0,00	133,48	100,00
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2,00	145,37	290,74000	2,00		2,00	290,74	0,00	290,74	100,00
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500,00	0,28	140,00000	88,40		88,40	24,75	0,00	24,75	17,68
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10,00	20,40	204,00000	10,00		10,00	204,00	0,00	204,00	100,00
	MEDIDAS AMBIENTALES											
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2,00	15,93	31,86000	2,00		2,00	31,86	0,00	31,86	100,00
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2,00	143,00	286,00000	2,00		2,00	286,00	0,00	286,00	100,00
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1,00	110,00	110,00000	1,00		1,00	110,00	0,00	110,00	100,00
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1,00	110,00	110,00000	1,00		1,00	110,00	0,00	110,00	100,00
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1,00	110,00	110,00000							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 03

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789.464,39		
PERIODO:	1-nov.-22	30-nov.-22	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315.785,75	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20,00	42,02	840,40000							
					789.464,39220				**193.301,94**	**63.713,26**	**257.015,20**	**32,56**

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	1-sep.-22		
FIN PLAZO CONTRACTUAL	27-feb.-23		
SUSPENSION DIAS	0	DIAS	
AMPLIACIÓN DÍAS	0	DIAS	
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN	27-feb.-23		
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	12-dic.-22		
FECHA DE APROBACIÓN	12-dic.-22		

VALOR PLANILLADO AVANCE DE OBRA	193.301,94	63.713,26	257.015,20
			0,00
			0,00
TOTAL PLANILLADO	**193.301,94**	**63.713,26**	**257.015,20**

DESCUENTOS Y RETENCIONES				
ANTICIPO :	40%	77.320,78	25.485,30	102.806,08
OTROS:				0,00
TOTAL DE DESCUENTOS:		**77.320,78**	**25.485,30**	**102.806,08**
VALOR LIQUIDO ESTA PLANILLA :		**115.981,16**	**38.227,96**	**154.209,12**

ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 03

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789.464,39		
PERIODO:	1-nov.-22	30-nov.-22	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315.785,75	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7	476,17	3333,19000							
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3,5	405,49	1419,21500							
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9419,69	0,72	6782,17680	15.383,16	4.090,66	19.473,82	11.075,87	2.945,28	14.021,15	206,74
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189,9	11,34	2153,46600							
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M3	1706,6	3,7	6314,42000							
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	368,64	3,94	1452,44160							
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	1412,95	1,35	1907,48250							
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80	243,32	19465,60000							
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314,88	189,47	59660,31360							
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M3	91,84	177,81	16330,07040							
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770	60,24	46384,80000							
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M3	17988,24	2,38	42812,01120							
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M3	4611,6	10,16	46853,85600							
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M3	2880,87	12,94	37278,45780							
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1412,95	0,81	1144,48950							
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863435,52	0,22	189955,81440							
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204755,04	0,22	45046,10880							
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127910,63	0,22	28140,33860							
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32340	0,66	21344,40000							
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23100	8,05	185955,00000							
	SEÑALIZACION											
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9800	0,22	2156,00000							
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875	5,36	4690,00000							
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1	332,16	332,16000							
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6	283,4	1700,40000							
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6	283,4	1700,40000							
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10	117,23	1172,30000							
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100	117,23	11723,00000							
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2	66,74	133,48000							
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2	145,37	290,74000							
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500	0,28	140,00000							
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10	20,4	204,00000							
	MEDIDAS AMBIENTALES											
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2	15,93	31,86000							
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2	143	286,00000							
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110,00000							
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110,00000							
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110,00000							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 03

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789.464,39		
PERIODO:	1-nov.-22	30-nov.-22	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315.785,75	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20	42,02	840,40000							
					789.464,39220				**11.075,87**	**2.945,28**	**14.021,15**	**1,78**

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	1-sep.-22	
FIN PLAZO CONTRACTUAL	27-feb.-23	
SUSPENSION DIAS	0	DIAS
AMPLIACIÓN DÍAS	0	DIAS
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN	27-feb.-23	
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	12-dic.-22	
FECHA DE APROBACIÓN	12-dic.-22	

VALOR PLANILLADO AVANCE DE OBRA	11.075,87	2.945,28	14.021,15
			0,00
			0,00
TOTAL PLANILLADO	**11.075,87**	**2.945,28**	**14.021,15**

DESCUENTOS Y RETENCIONES			
ANTICIPO : 0%	0,00	0,00	0,00
OTROS:			0,00
TOTAL DE DESCUENTOS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VALOR LIQUIDO ESTA PLANILLA :	**11.075,87**	**2.945,28**	**14.021,15**

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR
ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONSORCIO FATIMA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR
OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES - PLANILLA AVANCE 03

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789.464,39		
PERIODO:	1-nov.-22	30-nov.-22	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315.785,75	40%	

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7	476,17	3333,19000	0,20	95,23	1,21%	0,00	0,00	0,00%	-0,20	-95,23	-1,20%
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3,5	405,49	1419,21500	3,50	1419,22	17,98%	0,00	0,00	0,00%	-3,50	-1419,22	-18,00%
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9419,69	0,72	6782,17680	28893,51	20803,33	263,51%	19473,82	14021,15	177,60%	-9419,69	-6782,18	-85,90%
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189,9	11,34	2153,46600	7,20	81,65	1,03%	0,00	0,00	0,00%	-7,20	-81,65	-1,00%
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M3	1706,6	3,7	6314,42000	173,80	643,06	8,15%	0,00	0,00	0,00%	-173,80	-643,06	-8,10%
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	368,64	3,94	1452,44160	285,00	1122,90	14,22%	0,00	0,00	0,00%	-285,00	-1122,90	-14,20%
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	1412,95	1,35	1907,48250									
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80	243,32	19465,60000									
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314,88	189,47	59660,31360									
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M3	91,84	177,81	16330,07040									
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770	60,24	46384,80000	78,00	4698,72	59,52%	0,00	0,00	0,00%	-78,00	-4698,72	-59,50%
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M3	17988,24	2,38	42812,01120	14704,06	34995,67	443,28%	0,00	0,00	0,00%	-14704,06	-34995,67	-443,30%
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M3	4611,6	10,16	46853,85600	3802,83	38636,76	489,40%	0,00	0,00	0,00%	-3802,83	-38636,76	-489,40%
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M3	2880,87	12,94	37278,45780									
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1412,95	0,81	1144,48950	1382,88	1120,13	14,19%	0,00	0,00	0,00%	-1382,88	-1120,13	-14,20%
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863435,52	0,22	189955,81440	558754,12	122925,91	1557,08%	0,00	0,00	0,00%	-558754,12	-122925,91	-1557,10%
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204755,04	0,22	45046,10880	133099,05	29281,79	370,91%	0,00	0,00	0,00%	-133099,05	-29281,79	-370,90%
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127910,63	0,22	28140,33860									
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32340	0,66	21344,40000									
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23100	8,05	185955,00000									
	SEÑALIZACION													
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9800	0,22	2156,00000									
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875	5,36	4690,00000									
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1	332,16	332,16000									
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6	283,4	1700,40000									
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6	283,4	1700,40000									
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10	117,23	1172,30000									
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100	117,23	11723,00000									
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2	66,74	133,48000	2,00	133,48	1,69%	0,00	0,00	0,00%	-2,00	-133,48	-1,70%
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2	145,37	290,74000	2,00	290,74	3,68%	0,00	0,00	0,00%	-2,00	-290,74	-3,70%
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500	0.28	140,00000	88,40	24,75	0,31%	0,00	0,00	0,00%	-88,40	-24,75	-0,30%
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10	20,4	204,00000	10,00	204,00	2,58%	0,00	0,00	0,00%	-10,00	-204,00	-2,60%
	MEDIDAS AMBIENTALES													
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2	15,93	31,86000	2,00	31,86	0,40%	0,00	0,00	0,00%	-2,00	-31,86	-0,40%
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2	143	286,00000	2,00	286,00	3,62%	0,00	0,00	0,00%	-2,00	-286,00	-3,60%
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110,00000	1,00	110,00	1,39%	0,00	0,00	0,00%	-1,00	-110,00	-1,40%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES - PLANILLA AVANCE 03

Pastaza

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789.464,39		
PERIODO:	1-nov.-22	30-nov.-22	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315.785,75	40%	

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110,00000	1,00	110,00	1,39%	0,00	0,00	0,00%	-1,00	-110,00	-1,40%
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110,00000									
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20	42,02	840,40000									
				TOTALES :	789.464,39220		257.015,20	32,56%		14.021,15	1,78%		-242.994,05	-30,78%

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	1-sep.-22	
FIN PLAZO CONTRACTUAL	27-feb.-23	
SUSPENSION DIAS	0	DIAS
AMPLIACION DIAS	0	DIAS
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN	27-feb.-23	
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	12-dic.-22	
FECHA DE APROBACIÓN	12-dic.-22	

MONTO PLANILLADO AVANCE DE OBRA	257.015,20	32,56%	%
MONTO DE INCREMENTOS	14.021,15	1,78%	%
MONTO DECREMENTOS	-242.994,05	-30,78%	%
TOTAL PLANILLADO	**257.015,20**	**32,56%**	

ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN EXTERNA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 04

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789.464,39		
PERIODO:	1-dic.-22	31-dic.-22	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315.785,75	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7,00	476,17	3.333,19000	0,20		0,20	95,23	0,00	95,23	2,86
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3,50	405,49	1.419,21500	3,50		3,50	1.419,22	0,00	1.419,22	100,00
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9.419,69	0,72	6.782,17680	28.893,51		28.893,51	20.803,33	0,00	20.803,33	306,74
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189,90	11,34	2.153,46600	7,20		7,20	81,65	0,00	81,65	3,79
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M3	1.706,60	3,70	6.314,42000	173,80		173,80	643,06	0,00	643,06	10,18
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	368,64	3,94	1.452,44160	285,00		285,00	1.122,90	0,00	1.122,90	77,31
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	1.412,95	1,35	1.907,48250							
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80,00	243,32	19.465,60000							
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314,88	189,47	59.660,31360							
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M3	91,84	177,81	16.330,07040							
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770,00	60,24	46.384,80000	78,00		78,00	4.698,72	0,00	4.698,72	10,13
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M3	17.988,24	2,38	42.812,01120	14.704,06		14.704,06	34.995,67	0,00	34.995,67	81,74
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M3	4.611,60	10,16	46.853,85600	3.802,83		3.802,83	38.636,76	0,00	38.636,76	82,46
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M3	2.880,87	12,94	37.278,45780		2.052,55	2.052,55	0,00	26.560,00	26.560,00	71,25
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1.412,95	0,81	1.144,48950	1.382,88	29.863,49	31.246,37	1.120,13	24.189,43	25.309,56	2.211,43
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863.435,52	0,22	189.955,81440	558.754,12		558.754,12	122.925,91	0,00	122.925,91	64,71
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204.755,04	0,22	45.046,10880	133.099,05		133.099,05	29.281,79	0,00	29.281,79	65,00
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127.910,63	0,22	28.140,33860		71.839,25	71.839,25	0,00	15.804,64	15.804,64	56,16
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32.340,00	0,66	21.344,40000		16.726,42	16.726,42	0,00	11.039,44	11.039,44	51,72
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23.100,00	8,05	185.955,00000		11.947,44	11.947,44	0,00	96.176,89	96.176,89	51,72
	SEÑALIZACION											
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9.800,00	0,22	2.156,00000							
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875,00	5,36	4.690,00000							
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1,00	332,16	332,16000							
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6,00	283,40	1.700,40000							
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6,00	283,40	1.700,40000							
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10,00	117,23	1.172,30000							
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100,00	117,23	11.723,00000							
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2,00	66,74	133,48000	2,00		2,00	133,48	0,00	133,48	100,00
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2,00	145,37	290,74000	2,00		2,00	290,74	0,00	290,74	100,00
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500,00	0,28	140,00000	88,40		88,40	24,75	0,00	24,75	17,68
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV. 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10,00	20,40	204,00000	10,00		10,00	204,00	0,00	204,00	100,00
	MEDIDAS AMBIENTALES											
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2,00	15,93	31,86000	2,00		2,00	31,86	0,00	31,86	100,00
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2,00	143,00	286,00000	2,00		2,00	286,00	0,00	286,00	100,00
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1,00	110,00	110,00000	1,00		1,00	110,00	0,00	110,00	100,00
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1,00	110,00	110,00000	1,00		1,00	110,00	0,00	110,00	100,00
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1,00	110,00	110,00000							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 04

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789.464,39		
PERIODO:	1-dic.-22	31-dic.-22	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315.785,75	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20,00	42,02	840,40000							
					789.464,39220				**257.015,20**	**173.770,40**	**430.785,60**	**54,57**

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	1-sep.-22	
FIN PLAZO CONTRACTUAL	27-feb.-23	
SUSPENSION DIAS	0	DIAS
AMPLIACIÓN DÍAS	0	DIAS
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN	27-feb.-23	
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	1-feb.-23	
FECHA DE APROBACIÓN	1-feb.-23	

VALOR PLANILLADO AVANCE DE OBRA	257.015,20	173.770,40	430.785,60
			0,00
			0,00
TOTAL PLANILLADO	**257.015,20**	**173.770,40**	**430.785,60**

DESCUENTOS Y RETENCIONES			
ANTICIPO : 40%	102.806,08	69.508,16	172.314,24
OTROS:			0,00
TOTAL DE DESCUENTOS:	**102.806,08**	**69.508,16**	**172.314,24**
VALOR LIQUIDO ESTA PLANILLA :	**154.209,12**	**104.262,24**	**258.471,36**

ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 04

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789.464,39		
PERIODO:	1-dic.-22	31-dic.-22	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315.785,75	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7	476,17	3333,19000							
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3,5	405,49	1419,21500							
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9419,69	0,72	6782,17680	19.473,82		19.473,82	14.021,15	0,00	14.021,15	206,74
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189,9	11,34	2153,46600							
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M3	1706,6	3,7	6314,42000							
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	368,64	3,94	1452,44160							
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	1412,95	1,35	1907,48250							
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80	243,32	19465,60000							
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314,88	189,47	59660,31360							
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M3	91,84	177,81	16330,07040							
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770	60,24	46384,80000							
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M3	17988,24	2,38	42812,01120							
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M3	4611,6	10,16	46853,85600							
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M3	2880,87	12,94	37278,45780							
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1412,95	0,81	1144,48950		29.833,42	29.833,42	0,00	24.165,07	24.165,07	2.111,43
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863435,52	0,22	189955,81440							
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204755,04	0,22	45046,10880							
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127910,63	0,22	28140,33860							
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32340	0,66	21344,40000							
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23100	8,05	185955,00000							
	SEÑALIZACION											
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9800	0,22	2156,00000							
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875	5,36	4690,00000							
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1	332,16	332,16000							
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6	283,4	1700,40000							
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6	283,4	1700,40000							
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10	117,23	1172,30000							
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100	117,23	11723,00000							
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2	66,74	133,48000							
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2	145,37	290,74000							
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500	0,28	140,00000							
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV. 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10	20,4	204,00000							
	MEDIDAS AMBIENTALES											
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2	15,93	31,86000							
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2	143	286,00000							
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110,00000							
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110,00000							
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110,00000							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 04

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789.464,39		
PERIODO:	1-dic.-22	31-dic.-22	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315.785,75	40%	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20	42,02	840,40000							
					789.464,39220				**14.021,15**	**24.165,07**	**38.186,22**	**4,84**

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	1-sep.-22		
FIN PLAZO CONTRACTUAL	27-feb.-23		
SUSPENSION DIAS	0	DIAS	
AMPLIACIÓN DÍAS	0	DIAS	
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN	27-feb.-23		
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	1-feb.-23		
FECHA DE APROBACIÓN	1-feb.-23		

VALOR PLANILLADO AVANCE DE OBRA	14.021,15	24.165,07	38.186,22
			0,00
			0,00
TOTAL PLANILLADO	**14.021,15**	**24.165,07**	**38.186,22**

DESCUENTOS Y RETENCIONES				
ANTICIPO :	40%	5.608,46	9.666,03	15.274,49
OTROS:				0,00
TOTAL DE DESCUENTOS:		**5.608,46**	**9.666,03**	**15.274,49**
VALOR LIQUIDO ESTA PLANILLA :		**8.412,69**	**14.499,04**	**22.911,73**

ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONSORCIO FATIMA

OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES - PLANILLA AVANCE 04

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789.464,39		
PERIODO:	1-dic.-22	31-dic.-22	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315.785,75	40%	

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7	476,17	3333,19000	0,20	95,23	1,21%	0,00	0,00	0,00%	-0,20	-95,23	-1,20%
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3,5	405,49	1419,21500	3,50	1419,22	17,98%	0,00	0,00	0,00%	-3,50	-1419,22	-18,00%
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9419,69	0,72	6782,17680	28893,51	20803,33	263,51%	19473,82	14021,15	177,60%	-9419,69	-6782,18	-85,90%
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189,9	11,34	2153,46600	7,20	81,65	1,03%	0,00	0,00	0,00%	-7,20	-81,65	-1,00%
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M3	1706,6	3,7	6314,42000	173,80	643,06	8,15%	0,00	0,00	0,00%	-173,80	-643,06	-8,10%
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	368,64	3,94	1452,44160	285,00	1122,90	14,22%	0,00	0,00	0,00%	-285,00	-1122,90	-14,20%
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	1412,95	1,35	1907,48250									
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80	243,32	19465,60000									
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314,88	189,47	59660,31360									
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M3	91,84	177,81	16330,07040									
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770	60,24	46384,80000	78,00	4698,72	59,52%	0,00	0,00	0,00%	-78,00	-4698,72	-59,50%
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M3	17988,24	2,38	42812,01120	14704,06	34995,67	443,28%	0,00	0,00	0,00%	-14704,06	-34995,67	-443,30%
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M3	4611,6	10,16	46853,85600	3802,83	38636,76	489,40%	0,00	0,00	0,00%	-3802,83	-38636,76	-489,40%
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M3	2880,87	12,94	37278,45780	2052,55	26560,00	336,43%	0,00	0,00	0,00%	-2052,55	-26560,00	-336,40%
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1412,95	0,81	1144,48950	31246,37	25309,56	320,59%	29833,42	24165,07	306,10%	-1412,95	-1144,49	-14,50%
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863435,52	0,22	189955,81440	558754,12	122925,91	1557,08%	0,00	0,00	0,00%	-558754,12	-122925,91	-1557,10%
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204755,04	0,22	45046,10880	133099,05	29281,79	370,91%	0,00	0,00	0,00%	-133099,05	-29281,79	-370,90%
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127910,63	0,22	28140,33860	71839,25	15804,64	200,19%	0,00	0,00	0,00%	-71839,25	-15804,64	-200,20%
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32340	0,66	21344,40000	16726,42	11039,44	139,83%	0,00	0,00	0,00%	-16726,42	-11039,44	-139,80%
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23100	8,05	185955,00000	11947,44	96176,89	1218,25%	0,00	0,00	0,00%	-11947,44	-96176,89	-1218,30%
	SEÑALIZACION													
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9800	0,22	2156,00000									
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875	5,36	4690,00000									
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1	332,16	332,16000									
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6	283,4	1700,40000									
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6	283,4	1700,40000									
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10	117,23	1172,30000									
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100	117,23	11723,00000									
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2	66,74	133,48000	2,00	133,48	1,69%	0,00	0,00	0,00%	-2,00	-133,48	-1,70%
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2	145,37	290,74000	2,00	290,74	3,68%	0,00	0,00	0,00%	-2,00	-290,74	-3,70%
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500	0,28	140,00000	88,40	24,75	0,31%	0,00	0,00	0,00%	-88,40	-24,75	-0,30%
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10	20,4	204,00000	10,00	204,00	2,58%	0,00	0,00	0,00%	-10,00	-204,00	-2,60%
	MEDIDAS AMBIENTALES													
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2	15,93	31,86000	2,00	31,86	0,40%	0,00	0,00	0,00%	-2,00	-31,86	-0,40%
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2	143	286,00000	2,00	286,00	3,62%	0,00	0,00	0,00%	-2,00	-286,00	-3,60%
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110,00000	1,00	110,00	1,39%	0,00	0,00	0,00%	-1,00	-110,00	-1,40%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES - PLANILLA AVANCE 04

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789.464,39		
PERIODO:	1-dic.-22	31-dic.-22	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315.785,75	40%	

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110,00000	1,00	110,00	1,39%	0,00	0,00	0,00%	-1,00	-110,00	-1,40%
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110,00000									
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20	42,02	840,40000									
				TOTALES :	789.464,39220		430.785,60	54,57%		38.186,22	4,84%		-392.599,38	-49,73%

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	1-sep.-22	
FIN PLAZO CONTRACTUAL	27-feb.-23	
SUSPENSION DIAS	0	DIAS
AMPLIACION DIAS	0	DIAS
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN	27-feb.-23	
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	1-feb.-23	
FECHA DE APROBACIÓN	1-feb.-23	

MONTO PLANILLADO AVANCE DE OBRA	430.785,60	54,57%	%
MONTO DE INCREMENTOS	38.186,22	4,84%	%
MONTO DECREMENTOS	-392.599,38	-49,73%	%
TOTAL PLANILLADO	**430.785,60**	**54,57%**	

ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN EXTERNA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 05

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO: 789.464,39
PERIODO: 1-ene.-23 31-ene.-23
PLAZO: 180 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 315.785,75 40%
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01: 220 DÍAS

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7,00	476,17	3.333,19000	0,20		0,20	95,23	0,00	95,23	2,86
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3,50	405,49	1.419,21500	3,50		3,50	1.419,22	0,00	1.419,22	100,00
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9.419,69	0,72	6.782,17680	28.893,51	3.789,18	32.682,69	20.803,33	2.728,21	23.531,54	346,96
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189,90	11,34	2.153,46600	7,20		7,20	81,65	0,00	81,65	3,79
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M3	1.706,60	3,70	6.314,42000	173,80	426,40	600,20	643,06	1.577,68	2.220,74	35,17
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	368,64	3,94	1.452,44160	285,00	199,36	484,36	1.122,90	785,48	1.908,38	131,39
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	1.412,95	1,35	1.907,48250		1.396,40	1.396,40	0,00	1.885,14	1.885,14	98,83
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80,00	243,32	19.465,60000		22,40	22,40	0,00	5.450,37	5.450,37	28,00
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314,88	189,47	59.660,31360		218,12	218,12	0,00	41.327,20	41.327,20	69,27
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M3	91,84	177,81	16.330,07040		14,48	14,48	0,00	2.574,69	2.574,69	15,77
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770,00	60,24	46.384,80000	78,00		78,00	4.698,72	0,00	4.698,72	10,13
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M3	17.988,24	2,38	42.812,01120	14.704,06	2.840,33	17.544,39	34.995,67	6.759,99	41.755,66	97,53
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M3	4.611,60	10,16	46.853,85600	3.802,83		3.802,83	38.636,76	0,00	38.636,76	82,46
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M3	2.880,87	12,94	37.278,45780	2.052,55	498,40	2.550,95	26.560,00	6.449,30	33.009,30	88,55
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1.412,95	0,81	1.144,48950	31.246,37		31.246,37	25.309,56	0,00	25.309,56	2.211,43
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863.435,52	0,22	189.955,81440	558.754,12	107.932,46	666.686,58	122.925,91	23.745,14	146.671,05	77,21
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204.755,04	0,22	45.046,10880	133.099,05		133.099,05	29.281,79	0,00	29.281,79	65,00
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127.910,63	0,22	28.140,33860	71.839,25	17.444,00	89.283,25	15.804,64	3.837,68	19.642,32	69,80
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32.340,00	0,66	21.344,40000	16.726,42	4.032,00	20.758,42	11.039,44	2.661,12	13.700,56	64,19
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23.100,00	8,05	185.955,00000	11.947,44	2.880,00	14.827,44	96.176,89	23.184,00	119.360,89	64,19
	SEÑALIZACION											
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9.800,00	0,22	2.156,00000							
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875,00	5,36	4.690,00000							
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1,00	332,16	332,16000							
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6,00	283,40	1.700,40000							
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6,00	283,40	1.700,40000							
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10,00	117,23	1.172,30000							
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100,00	117,23	11.723,00000							
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2,00	66,74	133,48000	2,00		2,00	133,48	0,00	133,48	100,00
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2,00	145,37	290,74000	2,00		2,00	290,74	0,00	290,74	100,00
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500,00	0,28	140,00000	88,40		88,40	24,75	0,00	24,75	17,68
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10,00	20,40	204,00000	10,00		10,00	204,00	0,00	204,00	100,00
	MEDIDAS AMBIENTALES											
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2,00	15,93	31,86000	2,00		2,00	31,86	0,00	31,86	100,00
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2,00	143,00	286,00000	2,00		2,00	286,00	0,00	286,00	100,00
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1,00	110,00	110,00000	1,00		1,00	110,00	0,00	110,00	100,00
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1,00	110,00	110,00000	1,00		1,00	110,00	0,00	110,00	100,00
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1,00	110,00	110,00000		1,00	1,00	0,00	110,00	110,00	100,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 05

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789.464,39		
PERIODO:	1-ene.-23	31-ene.-23	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315.785,75	40%	
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01:	220	DÍAS	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20,00	42,02	840,40000		15,00	15,00	0,00	630,30	630,30	75,00
					789.464,39220				**430.785,60**	**123.706,30**	**554.491,90**	**70,24**

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	1-sep.-22	
FIN PLAZO CONTRACTUAL	27-feb.-23	
SUSPENSION DIAS	0	DIAS
AMPLIACIÓN N° 01 DÍAS	40	DIAS
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN	8-abr.-23	
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	2-mar.-23	
FECHA DE APROBACIÓN	2-mar.-23	

VALOR PLANILLADO AVANCE DE OBRA	430.785,60	123.706,30	554.491,90
			0,00
			0,00
TOTAL PLANILLADO	**430.785,60**	**123.706,30**	**554.491,90**

DESCUENTOS Y RETENCIONES				
ANTICIPO :	40%	172.314,24	49.482,52	221.796,76
OTROS:				0,00
TOTAL DE DESCUENTOS:		**172.314,24**	**49.482,52**	**221.796,76**
VALOR LIQUIDO ESTA PLANILLA :		**258.471,36**	**74.223,78**	**332.695,14**

ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 05

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO: 789.464,39
PERIODO: 1-ene.-23 31-ene.-23
PLAZO: 180 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 315.785,75 40%
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01: 220 DÍAS

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7	476,17	3333,19000							
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3,5	405,49	1419,21500							
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9419,69	0,72	6782,17680	19.473,82	3.789,18	23.263,00	14.021,15	2.728,21	16.749,36	246,96
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189,9	11,34	2153,46600							
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M3	1706,6	3,7	6314,42000							
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	368,64	3,94	1452,44160		115,72	115,72	0,00	455,94	455,94	31,39
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	1412,95	1,35	1907,48250							
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80	243,32	19465,60000							
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314,88	189,47	59660,31360							
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M3	91,84	177,81	16330,07040							
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770	60,24	46384,80000							
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M3	17988,24	2,38	42812,01120							
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M3	4611,6	10,16	46853,85600							
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M3	2880,87	12,94	37278,45780							
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1412,95	0,81	1144,48950	29.833,42	0,00	29.833,42	24.165,07	0,00	24.165,07	2.111,43
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863435,52	0,22	189955,81440							
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204755,04	0,22	45046,10880							
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127910,63	0,22	28140,33860							
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32340	0,66	21344,40000							
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23100	8,05	185955,00000							
	SEÑALIZACION											
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9800	0,22	2156,00000							
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875	5,36	4690,00000							
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1	332,16	332,16000							
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6	283,4	1700,40000							
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6	283,4	1700,40000							
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10	117,23	1172,30000							
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100	117,23	11723,00000							
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2	66,74	133,48000							
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2	145,37	290,74000							
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500	0,28	140,00000							
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10	20,4	204,00000							
	MEDIDAS AMBIENTALES											
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2	15,93	31,86000							
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2	143	286,00000							
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110,00000							
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110,00000							
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110,00000							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 05

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789.464,39		
PERIODO:	1-ene.-23	31-ene.-23	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315.785,75	40%	
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01:	220	DÍAS	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20	42,02	840,40000							
					789.464,39220				**38.186,22**	**3.184,15**	**41.370,37**	**5,24**

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	1-sep.-22	
FIN PLAZO CONTRACTUAL	27-feb.-23	
SUSPENSION DIAS	0	DIAS
AMPLIACIÓN N° 01 DÍAS	40	DIAS
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN	8-abr.-23	
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	2-mar.-23	
FECHA DE APROBACIÓN	2-mar.-23	

VALOR PLANILLADO AVANCE DE OBRA	38.186,22	3.184,15	41.370,37
			0,00
			0,00
TOTAL PLANILLADO	**38.186,22**	**3.184,15**	**41.370,37**

DESCUENTOS Y RETENCIONES			
ANTICIPO : 40%	15.274,49	1.273,66	16.548,15
OTROS:			0,00
TOTAL DE DESCUENTOS:	**15.274,49**	**1.273,66**	**16.548,15**
VALOR LIQUIDO ESTA PLANILLA :	**22.911,73**	**1.910,49**	**24.822,22**

ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONSORCIO FATIMA

OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES - PLANILLA AVANCE 05

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO: 789.464,39
PERIODO: 1-ene.-23 31-ene.-23
PLAZO: 180 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 315.785,75 40%
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01: 180 DÍAS

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7	476,17	3333,19000	0,20	95,23	1,21%	0,00	0,00	0,00%	-0,20	-95,23	-1,20%
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3,5	405,49	1419,21500	3,50	1419,22	17,98%	0,00	0,00	0,00%	-3,50	-1419,22	-18,00%
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9419,69	0,72	6782,17680	32682,69	23531,54	298,07%	23263,00	16749,36	212,20%	-9419,69	-6782,18	-85,90%
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189,9	11,34	2153,46600	7,20	81,65	1,03%	0,00	0,00	0,00%	-7,20	-81,65	-1,00%
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M3	1706,6	3,7	6314,42000	600,20	2220,74	28,13%	0,00	0,00	0,00%	-600,20	-2220,74	-28,10%
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	368,64	3,94	1452,44160	484,36	1908,38	24,17%	115,72	455,94	5,80%	-368,64	-1452,44	-18,40%
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	1412,95	1,35	1907,48250	1396,40	1885,14	23,88%	0,00	0,00	0,00%	-1396,40	-1885,14	-23,90%
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80	243,32	19465,60000	22,40	5450,37	69,04%	0,00	0,00	0,00%	-22,40	-5450,37	-69,00%
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314,88	189,47	59660,31360	218,12	41327,20	523,48%	0,00	0,00	0,00%	-218,12	-41327,20	-523,50%
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M3	91,84	177,81	16330,07040	14,48	2574,69	32,61%	0,00	0,00	0,00%	-14,48	-2574,69	-32,60%
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770	60,24	46384,80000	78,00	4698,72	59,52%	0,00	0,00	0,00%	-78,00	-4698,72	-59,50%
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M3	17988,24	2,38	42812,01120	17544,39	41755,66	528,91%	0,00	0,00	0,00%	-17544,39	-41755,65	-528,90%
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M3	4611,6	10,16	46853,85600	3802,83	38636,76	489,40%	0,00	0,00	0,00%	-3802,83	-38636,76	-489,40%
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M3	2880,87	12,94	37278,45780	2550,95	33009,30	418,12%	0,00	0,00	0,00%	-2550,95	-33009,30	-418,10%
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1412,95	0,81	1144,48950	31246,37	25309,56	320,59%	29833,42	24165,07	306,10%	-1412,95	-1144,49	-14,50%
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863435,52	0,22	189955,81440	666686,58	146671,05	1857,86%	0,00	0,00	0,00%	-666686,58	-146671,06	-1857,90%
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204755,04	0,22	45046,10880	133099,05	29281,79	370,91%	0,00	0,00	0,00%	-133099,05	-29281,79	-370,90%
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127910,63	0,22	28140,33860	89283,25	19642,32	248,81%	0,00	0,00	0,00%	-89283,25	-19642,32	-248,80%
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32340	0,66	21344,40000	20758,42	13700,56	173,54%	0,00	0,00	0,00%	-20758,42	-13700,56	-173,50%
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23100	8,05	185955,00000	14827,44	119360,89	1511,92%	0,00	0,00	0,00%	-14827,44	-119360,89	-1511,90%
	SEÑALIZACION													
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9800	0,22	2156,00000									
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875	5,36	4690,00000									
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1	332,16	332,16000									
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6	283,4	1700,40000									
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6	283,4	1700,40000									
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10	117,23	1172,30000									
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100	117,23	11723,00000									
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2	66,74	133,48000	2,00	133,48	1,69%	0,00	0,00	0,00%	-2,00	-133,48	-1,70%
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2	145,37	290,74000	2,00	290,74	3,68%	0,00	0,00	0,00%	-2,00	-290,74	-3,70%
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500	0,28	140,00000	88,40	24,75	0,31%	0,00	0,00	0,00%	-88,40	-24,75	-0,30%
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10	20,4	204,00000	10,00	204,00	2,58%	0,00	0,00	0,00%	-10,00	-204,00	-2,60%
	MEDIDAS AMBIENTALES													
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2	15,93	31,86000	2,00	31,86	0,40%	0,00	0,00	0,00%	-2,00	-31,86	-0,40%
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2	143	286,00000	2,00	286,00	3,62%	0,00	0,00	0,00%	-2,00	-286,00	-3,60%
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110,00000	1,00	110,00	1,39%	0,00	0,00	0,00%	-1,00	-110,00	-1,40%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES - PLANILLA AVANCE 05

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO: 789.464,39
PERIODO: 1-ene.-23 31-ene.-23
PLAZO: 180 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 315.785,75 40%
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01: 180 DÍAS

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110,00000	1,00	110,00	1,39%	0,00	0,00	0,00%	-1,00	-110,00	-1,40%
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110,00000	1,00	110,00	1,39%	0,00	0,00	0,00%	-1,00	-110,00	-1,40%
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20	42,02	840,40000	15,00	630,30	7,98%	0,00	0,00	0,00%	-15,00	-630,30	-8,00%
				TOTALES :	789.464,39220		554.491,90	70,24%		41.370,37	5,24%		-513.121,53	-65,00%

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO) 1-sep.-22
FIN PLAZO CONTRACTUAL 27-feb.-23
SUSPENSION DIAS 0 DIAS
AMPLIACIÓN N° 01 DÍAS 40 DIAS

FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN 8-abr.-23
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA 2-mar.-23
FECHA DE APROBACIÓN 2-mar.-23

MONTO PLANILLADO AVANCE DE OBRA	554.491,90	70,24%	%
MONTO DE INCREMENTOS	41.370,37	5,24%	%
MONTO DECREMENTOS	-513.121,53	-65,00%	%
TOTAL PLANILLADO	**554.491,90**	**70,24%**	

ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN EXTERNA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 06

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO: 789,464.39
PERIODO: 1-feb.-23 28-feb.-23
PLAZO: 180 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 315,785.75 40%
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01: 220 DÍAS

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7.00	476.17	3,333.19000	0.20		0.20	95.23	0.00	95.23	2.86
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3.50	405.49	1,419.21500	3.50		3.50	1,419.22	0.00	1,419.22	100.00
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9,419.69	0.72	6,782.17680	32,682.69	2,342.80	35,025.49	23,531.54	1,686.82	25,218.36	371.83
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189.90	11.34	2,153.46600	7.20		7.20	81.65	0.00	81.65	3.79
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M3	1,706.60	3.70	6,314.42000	600.20	598.40	1,198.60	2,220.74	2,214.08	4,434.82	70.23
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	368.64	3.94	1,452.44160	484.36	53.81	538.17	1,908.38	212.01	2,120.39	145.99
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	1,412.95	1.35	1,907.48250	1,396.40		1,396.40	1,885.14	0.00	1,885.14	98.83
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1.20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80.00	243.32	19,465.60000	22.40		22.40	5,450.37	0.00	5,450.37	28.00
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314.88	189.47	59,660.31360	218.12	361.76	579.88	41,327.20	68,542.67	109,869.87	184.16
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M3	91.84	177.81	16,330.07040	14.48	57.27	71.75	2,574.69	10,183.18	12,757.87	78.13
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770.00	60.24	46,384.80000	78.00		78.00	4,698.72	0.00	4,698.72	10.13
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M3	17,988.24	2.38	42,812.01120	17,544.39	4,258.08	21,802.47	41,755.66	10,134.23	51,889.89	121.20
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M3	4,611.60	10.16	46,853.85600	3,802.83	697.20	4,500.03	38,636.76	7,083.55	45,720.31	97.58
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M3	2,880.87	12.94	37,278.45780	2,550.95	463.80	3,014.75	33,009.30	6,001.57	39,010.87	104.65
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1,412.95	0.81	1,144.48950	31,246.37		31,246.37	25,309.56	0.00	25,309.56	2,211.43
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863,435.52	0.22	189,955.81440	666,686.58	161,807.04	828,493.62	146,671.05	35,597.55	182,268.60	95.95
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204,755.04	0.22	45,046.10880	133,099.05	24,402.00	157,501.05	29,281.79	5,368.44	34,650.23	76.92
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127,910.63	0.22	28,140.33860	89,283.25	16,233.00	105,516.25	19,642.32	3,571.26	23,213.58	82.49
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32,340.00	0.66	21,344.40000	20,758.42	4,368.00	25,126.42	13,700.56	2,882.88	16,583.44	77.69
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23,100.00	8.05	185,955.00000	14,827.44	3,120.00	17,947.44	119,360.89	25,116.00	144,476.89	77.69
	SEÑALIZACION											
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9,800.00	0.22	2,156.00000							
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875.00	5.36	4,690.00000							
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1.00	332.16	332.16000							
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6.00	283.40	1,700.40000							
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6.00	283.40	1,700.40000							
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10.00	117.23	1,172.30000							
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100.00	117.23	11,723.00000							
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2.00	66.74	133.48000	2.00		2.00	133.48	0.00	133.48	100.00
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2.00	145.37	290.74000	2.00		2.00	290.74	0.00	290.74	100.00
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500.00	0.28	140.00000	88.40		88.40	24.75	0.00	24.75	17.68
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10.00	20.40	204.00000	10.00		10.00	204.00	0.00	204.00	100.00
	MEDIDAS AMBIENTALES											
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2.00	15.93	31.86000	2.00		2.00	31.86	0.00	31.86	100.00
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2.00	143.00	286.00000	2.00		2.00	286.00	0.00	286.00	100.00
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110.00	110.00000	1.00		1.00	110.00	0.00	110.00	100.00
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110.00	110.00000	1.00		1.00	110.00	0.00	110.00	100.00
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110.00	110.00000	1.00		1.00	110.00	0.00	110.00	100.00
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20.00	42.02	840.40000	15.00		15.00	630.30	0.00	630.30	75.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 06

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789,464.39		
PERIODO:	1-feb.-23	28-feb.-23	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315,785.75	40%	
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01:	220	DÍAS	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
					789,464.39220				**554,491.90**	**178,594.24**	**733,086.14**	**92.86**

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	1-sep.-22		
FIN PLAZO CONTRACTUAL	27-feb.-23		
SUSPENSION DIAS	0	DIAS	
AMPLIACIÓN N° 01 DÍAS	40	DIAS	
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN	8-abr.-23		
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	23-mar.-23		
FECHA DE APROBACIÓN	23-mar.-23		

VALOR PLANILLADO AVANCE DE OBRA	554,491.90	178,594.24	733,086.14
			0.00
			0.00
TOTAL PLANILLADO	**554,491.90**	**178,594.24**	**733,086.14**

DESCUENTOS Y RETENCIONES			
ANTICIPO : 40%	221,796.76	71,437.70	293,234.46
OTROS:			0.00
TOTAL DE DESCUENTOS:	**221,796.76**	**71,437.70**	**293,234.46**
VALOR LIQUIDO ESTA PLANILLA :	**332,695.14**	**107,156.54**	**439,851.68**

ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 06

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789,464.39		
PERIODO:	1-feb.-23	28-feb.-23	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315,785.75	40%	
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01:	220	DÍAS	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7	476.17	3333.19000							
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3.5	405.49	1419.21500							
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9419.69	0.72	6782.17680	23,263.00	2,342.80	25,605.80	16,749.36	1,686.82	18,436.18	271.83
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189.9	11.34	2153.46600							
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M3	1706.6	3.7	6314.42000							
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	368.64	3.94	1452.44160	115.72	53.81	169.53	455.94	212.01	667.95	45.99
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	1412.95	1.35	1907.48250							
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80	243.32	19465.60000							
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314.88	189.47	59660.31360		265.00	265.00	0.00	50,209.55	50,209.55	84.16
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M3	91.84	177.81	16330.07040							
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770	60.24	46384.80000							
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M3	17988.24	2.38	42812.01120		3,814.23	3,814.23	0.00	9,077.87	9,077.87	21.20
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M3	4611.6	10.16	46853.85600							
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M3	2880.87	12.94	37278.45780		133.88	133.88	0.00	1,732.41	1,732.41	4.65
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1412.95	0.81	1144.48950	29,833.42		29,833.42	24,165.07	0.00	24,165.07	2,111.43
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863435.52	0.22	189955.81440							
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204755.04	0.22	45046.10880							
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127910.63	0.22	28140.33860							
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32340	0.66	21344.40000							
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23100	8.05	185955.00000							
	SEÑALIZACION											
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9800	0.22	2156.00000							
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875	5.36	4690.00000							
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1	332.16	332.16000							
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6	283.4	1700.40000							
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6	283.4	1700.40000							
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10	117.23	1172.30000							
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100	117.23	11723.00000							
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2	66.74	133.48000							
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2	145.37	290.74000							
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500	0.28	140.00000							
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10	20.4	204.00000							
	MEDIDAS AMBIENTALES											
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2	15.93	31.86000							
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2	143	286.00000							
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110.00000							
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110.00000							
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110.00000							
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20	42.02	840.40000							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 06

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789,464.39		
PERIODO:	1-feb.-23	28-feb.-23	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315,785.75	40%	
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01:	220	DÍAS	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
					789,464.39220				**41,370.37**	**62,918.66**	**104,289.03**	**13.21**

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	1-sep.-22		
FIN PLAZO CONTRACTUAL	27-feb.-23		
SUSPENSION DIAS	0	DIAS	
AMPLIACIÓN N° 01 DÍAS	40	DIAS	
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN	8-abr.-23		
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	23-mar.-23		
FECHA DE APROBACIÓN	23-mar.-23		

VALOR PLANILLADO AVANCE DE OBRA	41,370.37	62,918.66	104,289.03
			0.00
			0.00
TOTAL PLANILLADO	**41,370.37**	**62,918.66**	**104,289.03**

DESCUENTOS Y RETENCIONES			
ANTICIPO : 40%	16,548.15	25,167.46	41,715.61
OTROS:			0.00
TOTAL DE DESCUENTOS:	**16,548.15**	**25,167.46**	**41,715.61**
VALOR LIQUIDO ESTA PLANILLA :	**24,822.22**	**37,751.20**	**62,573.42**

ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONSORCIO FATIMA

OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES - PLANILLA AVANCE 06

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO: 789,464.39
PERIODO: 1-feb.-23 28-feb.-23
PLAZO: 180 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 315,785.75 40%
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01: 180 DÍAS

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7	476.17	3333.19000	0.20	95.23	1.21%	0.00	0.00	0.00%	-0.20	-95.23	-1.20%
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3.5	405.49	1419.21500	3.50	1419.22	17.98%	0.00	0.00	0.00%	-3.50	-1419.22	-18.00%
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9419.69	0.72	6782.17680	35025.49	25218.36	319.44%	25605.80	18436.18	233.50%	-9419.69	-6782.18	-85.90%
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189.9	11.34	2153.46600	7.20	81.65	1.03%	0.00	0.00	0.00%	-7.20	-81.65	-1.00%
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M3	1706.6	3.7	6314.42000	1198.60	4434.82	56.18%	0.00	0.00	0.00%	-1198.60	-4434.82	-56.20%
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	368.64	3.94	1452.44160	538.17	2120.39	26.86%	169.53	667.95	8.50%	-368.64	-1452.44	-18.40%
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	1412.95	1.35	1907.48250	1396.40	1885.14	23.88%	0.00	0.00	0.00%	-1396.40	-1885.14	-23.90%
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80	243.32	19465.60000	22.40	5450.37	69.04%	0.00	0.00	0.00%	-22.40	-5450.37	-69.00%
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314.88	189.47	59660.31360	579.88	109869.87	1391.70%	265.00	50209.55	636.00%	-314.88	-59660.32	-755.70%
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M3	91.84	177.81	16330.07040	71.75	12757.87	161.60%	0.00	0.00	0.00%	-71.75	-12757.87	-161.60%
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770	60.24	46384.80000	78.00	4698.72	59.52%	0.00	0.00	0.00%	-78.00	-4698.72	-59.50%
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M3	17988.24	2.38	42812.01120	21802.47	51889.89	657.28%	3814.23	9077.87	115.00%	-17988.24	-42812.02	-542.30%
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M3	4611.6	10.16	46853.85600	4500.03	45720.31	579.13%	0.00	0.00	0.00%	-4500.03	-45720.31	-579.10%
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M3	2880.87	12.94	37278.45780	3014.75	39010.87	494.14%	133.88	1732.41	21.90%	-2880.87	-37278.46	-472.20%
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1412.95	0.81	1144.48950	31246.37	25309.56	320.59%	29833.42	24165.07	306.10%	-1412.95	-1144.49	-14.50%
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863435.52	0.22	189955.81440	828493.62	182268.60	2308.76%	0.00	0.00	0.00%	-828493.62	-182268.60	-2308.80%
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204755.04	0.22	45046.10880	157501.05	34650.23	438.91%	0.00	0.00	0.00%	-157501.05	-34650.23	-438.90%
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127910.63	0.22	28140.33860	105516.25	23213.58	294.04%	0.00	0.00	0.00%	-105516.25	-23213.58	-294.00%
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32340	0.66	21344.40000	25126.42	16583.44	210.06%	0.00	0.00	0.00%	-25126.42	-16583.44	-210.10%
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23100	8.05	185955.00000	17947.44	144476.89	1830.06%	0.00	0.00	0.00%	-17947.44	-144476.89	-1830.10%
	SEÑALIZACION													
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9800	0.22	2156.00000									
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875	5.36	4690.00000									
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1	332.16	332.16000									
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6	283.4	1700.40000									
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6	283.4	1700.40000									
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10	117.23	1172.30000									
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100	117.23	11723.00000									
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2	66.74	133.48000	2.00	133.48	1.69%	0.00	0.00	0.00%	-2.00	-133.48	-1.70%
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2	145.37	290.74000	2.00	290.74	3.68%	0.00	0.00	0.00%	-2.00	-290.74	-3.70%
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500	0.28	140.00000	88.40	24.75	0.31%	0.00	0.00	0.00%	-88.40	-24.75	-0.30%
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10	20.4	204.00000	10.00	204.00	2.58%	0.00	0.00	0.00%	-10.00	-204.00	-2.60%
	MEDIDAS AMBIENTALES													
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2	15.93	31.86000	2.00	31.86	0.40%	0.00	0.00	0.00%	-2.00	-31.86	-0.40%
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2	143	286.00000	2.00	286.00	3.62%	0.00	0.00	0.00%	-2.00	-286.00	-3.60%
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110.00000	1.00	110.00	1.39%	0.00	0.00	0.00%	-1.00	-110.00	-1.40%
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110.00000	1.00	110.00	1.39%	0.00	0.00	0.00%	-1.00	-110.00	-1.40%
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110.00000	1.00	110.00	1.39%	0.00	0.00	0.00%	-1.00	-110.00	-1.40%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES - PLANILLA AVANCE 06

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789,464.39		
PERIODO:	1-feb.-23	28-feb.-23	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315,785.75	40%	
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01:	180	DÍAS	

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20	42.02	840.40000	15.00	630.30	7.98%	0.00	0.00	0.00%	-15.00	-630.30	-8.00%
				TOTALES :	789,464.39220		733,086.14	92.86%		104,289.03	13.21%		-628,797.11	-79.65%

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	1-sep.-22	
FIN PLAZO CONTRACTUAL	27-feb.-23	
SUSPENSION DIAS	0	DIAS
AMPLIACIÓN N° 01 DÍAS	40	DIAS
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN	8-abr.-23	
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	23-mar.-23	
FECHA DE APROBACIÓN	23-mar.-23	

MONTO PLANILLADO AVANCE DE OBRA	733,086.14	92.86%	%
MONTO DE INCREMENTOS	104,289.03	13.21%	%
MONTO DECREMENTOS	-628,797.11	-79.65%	%
TOTAL PLANILLADO	**733,086.14**	**92.86%**	

ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ
CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ
ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

OMAR HENRY GUAMAN ILER
ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN EXTERNA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 07

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO: 789,464.39
PERIODO: 1-mar.-23 31-mar.-23
PLAZO: 180 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 315,785.75 40%
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01: 220 DÍAS

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7.00	476.17	3,333.19000	0.20		0.20	95.23	0.00	95.23	2.86
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3.50	405.49	1,419.21500	3.50		3.50	1,419.22	0.00	1,419.22	100.00
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9,419.69	0.72	6,782.17680	35,025.49		35,025.49	25,218.36	0.00	25,218.36	371.83
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189.90	11.34	2,153.46600	7.20		7.20	81.65	0.00	81.65	3.79
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M3	1,706.60	3.70	6,314.42000	1,198.60	343.20	1,541.80	4,434.82	1,269.84	5,704.66	90.34
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	368.64	3.94	1,452.44160	538.17		538.17	2,120.39	0.00	2,120.39	145.99
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	1,412.95	1.35	1,907.48250	1,396.40		1,396.40	1,885.14	0.00	1,885.14	98.83
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80.00	243.32	19,465.60000	22.40		22.40	5,450.37	0.00	5,450.37	28.00
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314.88	189.47	59,660.31360	579.88	217.62	797.50	109,869.87	41,232.46	151,102.33	253.27
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M3	91.84	177.81	16,330.07040	71.75		71.75	12,757.87	0.00	12,757.87	78.13
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770.00	60.24	46,384.80000	78.00		78.00	4,698.72	0.00	4,698.72	10.13
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M3	17,988.24	2.38	42,812.01120	21,802.47		21,802.47	51,889.89	0.00	51,889.89	121.20
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M3	4,611.60	10.16	46,853.85600	4,500.03		4,500.03	45,720.31	0.00	45,720.31	97.58
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M3	2,880.87	12.94	37,278.45780	3,014.75		3,014.75	39,010.87	0.00	39,010.87	104.65
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1,412.95	0.81	1,144.48950	31,246.37		31,246.37	25,309.56	0.00	25,309.56	2,211.43
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863,435.52	0.22	189,955.81440	828,493.62		828,493.62	182,268.60	0.00	182,268.60	95.95
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204,755.04	0.22	45,046.10880	157,501.05		157,501.05	34,650.23	0.00	34,650.23	76.92
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127,910.63	0.22	28,140.33860	105,516.25		105,516.25	23,213.58	0.00	23,213.58	82.49
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32,340.00	0.66	21,344.40000	25,126.42		25,126.42	16,583.44	0.00	16,583.44	77.69
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23,100.00	8.05	185,955.00000	17,947.44		17,947.44	144,476.89	0.00	144,476.89	77.69
	SEÑALIZACION											
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9,800.00	0.22	2,156.00000							
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875.00	5.36	4,690.00000							
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1.00	332.16	332.16000		1.00	1.00	0.00	332.16	332.16	100.00
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6.00	283.40	1,700.40000							
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6.00	283.40	1,700.40000							
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10.00	117.23	1,172.30000							
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100.00	117.23	11,723.00000							
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2.00	66.74	133.48000	2.00		2.00	133.48	0.00	133.48	100.00
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2.00	145.37	290.74000	2.00		2.00	290.74	0.00	290.74	100.00
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500.00	0.28	140.00000	88.40		88.40	24.75	0.00	24.75	17.68
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10.00	20.40	204.00000	10.00		10.00	204.00	0.00	204.00	100.00
	MEDIDAS AMBIENTALES											
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2.00	15.93	31.86000	2.00		2.00	31.86	0.00	31.86	100.00
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2.00	143.00	286.00000	2.00		2.00	286.00	0.00	286.00	100.00
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110.00	110.00000	1.00		1.00	110.00	0.00	110.00	100.00
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110.00	110.00000	1.00		1.00	110.00	0.00	110.00	100.00
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110.00	110.00000	1.00		1.00	110.00	0.00	110.00	100.00
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20.00	42.02	840.40000	15.00		15.00	630.30	0.00	630.30	75.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 07

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789,464.39		
PERIODO:	1-mar.-23	31-mar.-23	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315,785.75	40%	
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01:	220	DÍAS	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
					789,464.39220				**733,086.14**	**42,834.46**	**775,920.60**	**98.28**

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	1-sep.-22	
FIN PLAZO CONTRACTUAL	27-feb.-23	
SUSPENSION DIAS	0	DIAS
AMPLIACIÓN N° 01 DÍAS	40	DIAS
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN	8-abr.-23	
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	13-abr.-23	
FECHA DE APROBACIÓN	13-abr.-23	

VALOR PLANILLADO AVANCE DE OBRA	733,086.14	42,834.46	775,920.60
			0.00
			0.00
TOTAL PLANILLADO	**733,086.14**	**42,834.46**	**775,920.60**

DESCUENTOS Y RETENCIONES				
ANTICIPO :	40%	293,234.46	17,133.78	310,368.24
OTROS:				0.00
TOTAL DE DESCUENTOS:		**293,234.46**	**17,133.78**	**310,368.24**
VALOR LIQUIDO ESTA PLANILLA :		**439,851.68**	**25,700.68**	**465,552.36**

ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 07

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO: 789,464.39
PERIODO: 1-mar.-23 31-mar.-23
PLAZO: 180 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 315,785.75 40%
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01: 220 DÍAS

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7	476.17	3333.19000							
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3.5	405.49	1419.21500							
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9419.69	0.72	6782.17680	25,605.80	0.00	25,605.80	18,436.18	0.00	18,436.18	271.83
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189.9	11.34	2153.46600							
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M3	1706.6	3.7	6314.42000							
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	368.64	3.94	1452.44160	169.53	0.00	169.53	667.95	0.00	667.95	45.99
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	1412.95	1.35	1907.48250							
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80	243.32	19465.60000							
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314.88	189.47	59660.31360	265.00	217.62	482.62	50,209.55	41,232.46	91,442.01	153.27
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M3	91.84	177.81	16330.07040							
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770	60.24	46384.80000							
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M3	17988.24	2.38	42812.01120	3,814.23	0.00	3,814.23	9,077.87	0.00	9,077.87	21.20
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M3	4611.6	10.16	46853.85600							
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M3	2880.87	12.94	37278.45780	133.88	0.00	133.88	1,732.41	0.00	1,732.41	4.65
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1412.95	0.81	1144.48950	29,833.42		29,833.42	24,165.07	0.00	24,165.07	2,111.43
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863435.52	0.22	189955.81440							
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204755.04	0.22	45046.10880							
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127910.63	0.22	28140.33860							
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32340	0.66	21344.40000							
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23100	8.05	185955.00000							
	SEÑALIZACION											
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9800	0.22	2156.00000							
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875	5.36	4690.00000							
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1	332.16	332.16000							
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6	283.4	1700.40000							
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6	283.4	1700.40000							
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10	117.23	1172.30000							
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100	117.23	11723.00000							
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2	66.74	133.48000							
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2	145.37	290.74000							
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500	0.28	140.00000							
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10	20.4	204.00000							
	MEDIDAS AMBIENTALES											
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2	15.93	31.86000							
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2	143	286.00000							
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110.00000							
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110.00000							
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110.00000							
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20	42.02	840.40000							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA No. 07

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789,464.39			
PERIODO:	1-mar.-23	31-mar.-23		
PLAZO:	180	DÍAS		
ANTICIPO RECIBIDO:	315,785.75	40%		
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01:	220	DÍAS		

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
					789,464.39220				**104,289.03**	**41,232.46**	**145,521.49**	**18.43**

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	1-sep.-22	
FIN PLAZO CONTRACTUAL	27-feb.-23	
SUSPENSION DIAS	0	DIAS
AMPLIACIÓN N° 01 DÍAS	40	DIAS
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN	8-abr.-23	
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	13-abr.-23	
FECHA DE APROBACIÓN	13-abr.-23	

VALOR PLANILLADO AVANCE DE OBRA	104,289.03	41,232.46	145,521.49
			0.00
			0.00
TOTAL PLANILLADO	**104,289.03**	**41,232.46**	**145,521.49**

DESCUENTOS Y RETENCIONES			
ANTICIPO : 40%	41,715.61	16,492.98	58,208.59
OTROS:			0.00
TOTAL DE DESCUENTOS:	**41,715.61**	**16,492.98**	**58,208.59**
VALOR LIQUIDO ESTA PLANILLA :	**62,573.42**	**24,739.48**	**87,312.90**

ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONSORCIO FATIMA

OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES - PLANILLA AVANCE 07

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO: 789,464.39
PERIODO: 1-mar.-23 31-mar.-23
PLAZO: 180 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 315,785.75 40%
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01: 180 DÍAS

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7	476.17	3333.19000	0.20	95.23	1.21%	0.00	0.00	0.00%	-0.20	-95.23	-1.20%
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3.5	405.49	1419.21500	3.50	1419.22	17.98%	0.00	0.00	0.00%	-3.50	-1419.22	-18.00%
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9419.69	0.72	6782.17680	35025.49	25218.36	319.44%	25605.80	18436.18	233.50%	-9419.69	-6782.18	-85.90%
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189.9	11.34	2153.46600	7.20	81.65	1.03%	0.00	0.00	0.00%	-7.20	-81.65	-1.00%
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M3	1706.6	3.7	6314.42000	1541.80	5704.66	72.26%	0.00	0.00	0.00%	-1541.80	-5704.66	-72.30%
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	368.64	3.94	1452.44160	538.17	2120.39	26.86%	169.53	667.95	8.50%	-368.64	-1452.44	-18.40%
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	1412.95	1.35	1907.48250	1396.40	1885.14	23.88%	0.00	0.00	0.00%	-1396.40	-1885.14	-23.90%
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80	243.32	19465.60000	22.40	5450.37	69.04%	0.00	0.00	0.00%	-22.40	-5450.37	-69.00%
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314.88	189.47	59660.31360	797.50	151102.33	1913.99%	482.62	91442.01	1158.30%	-314.88	-59660.32	-755.70%
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M3	91.84	177.81	16330.07040	71.75	12757.87	161.60%	0.00	0.00	0.00%	-71.75	-12757.87	-161.60%
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770	60.24	46384.80000	78.00	4698.72	59.52%	0.00	0.00	0.00%	-78.00	-4698.72	-59.50%
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M3	17988.24	2.38	42812.01120	21802.47	51889.89	657.28%	3814.23	9077.87	115.00%	-17988.24	-42812.02	-542.30%
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M3	4611.6	10.16	46853.85600	4500.03	45720.31	579.13%	0.00	0.00	0.00%	-4500.03	-45720.31	-579.10%
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M3	2880.87	12.94	37278.45780	3014.75	39010.87	494.14%	133.88	1732.41	21.90%	-2880.87	-37278.46	-472.20%
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1412.95	0.81	1144.48950	31246.37	25309.56	320.59%	29833.42	24165.07	306.10%	-1412.95	-1144.49	-14.50%
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863435.52	0.22	189955.81440	828493.62	182268.60	2308.76%	0.00	0.00	0.00%	-828493.62	-182268.60	-2308.80%
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204755.04	0.22	45046.10880	157501.05	34650.23	438.91%	0.00	0.00	0.00%	-157501.05	-34650.23	-438.90%
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127910.63	0.22	28140.33860	105516.25	23213.58	294.04%	0.00	0.00	0.00%	-105516.25	-23213.58	-294.00%
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32340	0.66	21344.40000	25126.42	16583.44	210.06%	0.00	0.00	0.00%	-25126.42	-16583.44	-210.10%
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23100	8.05	185955.00000	17947.44	144476.89	1830.06%	0.00	0.00	0.00%	-17947.44	-144476.89	-1830.10%
	SEÑALIZACION													
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9800	0.22	2156.00000									
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875	5.36	4690.00000									
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1	332.16	332.16000	1.00	332.16	4.21%	0.00	0.00	0.00%	-1.00	-332.16	-4.20%
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6	283.4	1700.40000									
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6	283.4	1700.40000									
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10	117.23	1172.30000									
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100	117.23	11723.00000									
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MOVILES	U	2	66.74	133.48000	2.00	133.48	1.69%	0.00	0.00	0.00%	-2.00	-133.48	-1.70%
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2	145.37	290.74000	2.00	290.74	3.68%	0.00	0.00	0.00%	-2.00	-290.74	-3.70%
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500	0.28	140.00000	88.40	24.75	0.31%	0.00	0.00	0.00%	-88.40	-24.75	-0.30%
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10	20.4	204.00000	10.00	204.00	2.58%	0.00	0.00	0.00%	-10.00	-204.00	-2.60%
	MEDIDAS AMBIENTALES													
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2	15.93	31.86000	2.00	31.86	0.40%	0.00	0.00	0.00%	-2.00	-31.86	-0.40%
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2	143	286.00000	2.00	286.00	3.62%	0.00	0.00	0.00%	-2.00	-286.00	-3.60%
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110.00000	1.00	110.00	1.39%	0.00	0.00	0.00%	-1.00	-110.00	-1.40%
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110.00000	1.00	110.00	1.39%	0.00	0.00	0.00%	-1.00	-110.00	-1.40%
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110.00000	1.00	110.00	1.39%	0.00	0.00	0.00%	-1.00	-110.00	-1.40%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES - PLANILLA AVANCE 07

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789,464.39		
PERIODO:	1-mar.-23	31-mar.-23	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315,785.75	40%	
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01:	180	DÍAS	

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20	42.02	840.40000	15.00	630.30	7.98%	0.00	0.00	0.00%	-15.00	-630.30	-8.00%
				TOTALES :	789,464.39220		775,920.60	98.28%		145,521.49	18.43%		-630,399.11	-79.85%

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	1-sep.-22	
FIN PLAZO CONTRACTUAL	27-feb.-23	
SUSPENSION DIAS	0	DIAS
AMPLIACIÓN N° 01 DÍAS	40	DIAS
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN	8-abr.-23	
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	13-abr.-23	
FECHA DE APROBACIÓN	13-abr.-23	

MONTO PLANILLADO AVANCE DE OBRA	775,920.60	98.28%	%
MONTO DE INCREMENTOS	145,521.49	18.43%	%
MONTO DECREMENTOS	-630,399.11	-79.85%	%
TOTAL PLANILLADO	**775,920.60**	**98.28%**	

ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ
CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ
ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

OMAR HENRY GUAMAN ILER
ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN EXTERNA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA 08_LIQUIDACIÓN DE OBRA

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO: 789,464.39
PERIODO: 1-abr.-23 30-abr.-23
PLAZO: 180 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 315,785.75 40%
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01+02+03: 245 DÍAS

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7.00	476.17	3,333.19000	0.20		0.20	95.23	0.00	95.23	2.86
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3.50	405.49	1,419.21500	3.50		3.50	1,419.22	0.00	1,419.22	100.00
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9,419.69	0.72	6,782.17680	35,025.49		35,025.49	25,218.36	0.00	25,218.36	371.83
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189.90	11.34	2,153.46600	7.20		7.20	81.65	0.00	81.65	3.79
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M3	1,706.60	3.70	6,314.42000	1,541.80		1,541.80	5,704.66	0.00	5,704.66	90.34
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	368.64	3.94	1,452.44160	538.17		538.17	2,120.39	0.00	2,120.39	145.99
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	1,412.95	1.35	1,907.48250	1,396.40		1,396.40	1,885.14	0.00	1,885.14	98.83
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80.00	243.32	19,465.60000	22.40		22.40	5,450.37	0.00	5,450.37	28.00
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314.88	189.47	59,660.31360	797.50	20.81	818.31	151,102.33	3,942.87	155,045.20	259.88
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M3	91.84	177.81	16,330.07040	71.75		71.75	12,757.87	0.00	12,757.87	78.13
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770.00	60.24	46,384.80000	78.00		78.00	4,698.72	0.00	4,698.72	10.13
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M3	17,988.24	2.38	42,812.01120	21,802.47		21,802.47	51,889.89	0.00	51,889.89	121.20
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M3	4,611.60	10.16	46,853.85600	4,500.03		4,500.03	45,720.31	0.00	45,720.31	97.58
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M3	2,880.87	12.94	37,278.45780	3,014.75		3,014.75	39,010.87	0.00	39,010.87	104.65
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1,412.95	0.81	1,144.48950	31,246.37		31,246.37	25,309.56	0.00	25,309.56	2,211.43
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863,435.52	0.22	189,955.81440	828,493.62		828,493.62	182,268.60	0.00	182,268.60	95.95
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204,755.04	0.22	45,046.10880	157,501.05		157,501.05	34,650.23	0.00	34,650.23	76.92
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127,910.63	0.22	28,140.33860	105,516.25		105,516.25	23,213.58	0.00	23,213.58	82.49
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32,340.00	0.66	21,344.40000	25,126.42		25,126.42	16,583.44	0.00	16,583.44	77.69
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23,100.00	8.05	185,955.00000	17,947.44		17,947.44	144,476.89	0.00	144,476.89	77.69
	SEÑALIZACION											
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9,800.00	0.22	2,156.00000		8,906.20	8,906.20	0.00	1,959.36	1,959.36	90.88
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875.00	5.36	4,690.00000							
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1.00	332.16	332.16000	1.00		1.00	332.16	0.00	332.16	100.00
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6.00	283.40	1,700.40000				0.00	0.00	0.00	0.00
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6.00	283.40	1,700.40000				0.00	0.00	0.00	0.00
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10.00	117.23	1,172.30000				0.00	0.00	0.00	0.00
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100.00	117.23	11,723.00000		41.00	41.00	0.00	4,806.43	4,806.43	41.00
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2.00	66.74	133.48000	2.00		2.00	133.48	0.00	133.48	100.00
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2.00	145.37	290.74000	2.00		2.00	290.74	0.00	290.74	100.00
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500.00	0.28	140.00000	88.40		88.40	24.75	0.00	24.75	17.68
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10.00	20.40	204.00000	10.00		10.00	204.00	0.00	204.00	100.00
	MEDIDAS AMBIENTALES											
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2.00	15.93	31.86000	2.00		2.00	31.86	0.00	31.86	100.00
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2.00	143.00	286.00000	2.00		2.00	286.00	0.00	286.00	100.00
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110.00	110.00000	1.00		1.00	110.00	0.00	110.00	100.00
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110.00	110.00000	1.00		1.00	110.00	0.00	110.00	100.00
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110.00	110.00000	1.00		1.00	110.00	0.00	110.00	100.00
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20.00	42.02	840.40000	15.00		15.00	630.30	0.00	630.30	75.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA 08_LIQUIDACIÓN DE OBRA

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789,464.39		
PERIODO:	1-abr.-23	30-abr.-23	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315,785.75	40%	
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01+02+03:	245	DÍAS	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
					789,464.39220				775,920.60	10,708.66	786,629.26	99.64

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	1-sep.-22
FIN PLAZO CONTRACTUAL	27-feb.-23
SUSPENSION DIAS	0 DIAS
AMPLIACIÓN N° 01 DÍAS	40 DIAS
AMPLIACIÓN N° 02 DÍAS	10 DIAS
AMPLIACIÓN N° 03 DÍAS	15 DIAS
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN 01	8-abr.-23
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN 02	18-abr.-23
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN 03	3-may.-23
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	18-may.-23
FECHA DE APROBACIÓN	18-may.-23

VALOR PLANILLADO AVANCE DE OBRA	775,920.60	10,708.66	786,629.26
			0.00
			0.00
TOTAL PLANILLADO	**775,920.60**	**10,708.66**	**786,629.26**

DESCUENTOS Y RETENCIONES				
ANTICIPO :	40%	310,368.24	5,417.51	315,785.75
OTROS:				0.00
TOTAL DE DESCUENTOS:		**310,368.24**	**5,417.51**	**315,785.75**
VALOR LIQUIDO ESTA PLANILLA :		**465,552.36**	**5,291.15**	**470,843.51**

ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA 08_LIQUIDACIÓN - EXCEDENTES

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO: 789,464.39
PERIODO: 1-abr.-23 30-abr.-23
PLAZO: 180 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 315,785.75 40%
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01+02+03: 245 DÍAS

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7	476.17	3333.19000							
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3.5	405.49	1419.21500							
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9419.69	0.72	6782.17680	25,605.80		25,605.80	18,436.18	0.00	18,436.18	271.83
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189.9	11.34	2153.46600							
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M3	1706.6	3.7	6314.42000							
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	368.64	3.94	1452.44160	169.53		169.53	667.95	0.00	667.95	45.99
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	1412.95	1.35	1907.48250							
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80	243.32	19465.60000							
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314.88	189.47	59660.31360	482.62	20.81	503.43	91,442.01	3,942.87	95,384.88	159.88
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M3	91.84	177.81	16330.07040							
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770	60.24	46384.80000							
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M3	17988.24	2.38	42812.01120	3,814.23		3,814.23	9,077.87	0.00	9,077.87	21.20
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M3	4611.6	10.16	46853.85600							
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M3	2880.87	12.94	37278.45780	133.88		133.88	1,732.41	0.00	1,732.41	4.65
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1412.95	0.81	1144.48950	29,833.42		29,833.42	24,165.07	0.00	24,165.07	2,111.43
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863435.52	0.22	189955.81440							
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204755.04	0.22	45046.10880							
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127910.63	0.22	28140.33860							
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32340	0.66	21344.40000							
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23100	8.05	185955.00000							
	SEÑALIZACION											
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9800	0.22	2156.00000							
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875	5.36	4690.00000							
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1	332.16	332.16000							
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6	283.4	1700.40000							
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6	283.4	1700.40000							
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10	117.23	1172.30000							
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100	117.23	11723.00000							
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2	66.74	133.48000							
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2	145.37	290.74000							
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500	0.28	140.00000							
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10	20.4	204.00000							
	MEDIDAS AMBIENTALES											
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2	15.93	31.86000							
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2	143	286.00000							
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110.00000							
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110.00000							
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110.00000							
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20	42.02	840.40000							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA 08_LIQUIDACIÓN - EXCEDENTES

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789,464.39		
PERIODO:	1-abr.-23	30-abr.-23	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315,785.75	40%	
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01+02+03:	245	DÍAS	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
					789,464.39220				145,521.49	3,942.87	149,464.36	18.93

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	1-sep.-22	
FIN PLAZO CONTRACTUAL	27-feb.-23	
SUSPENSION DIAS	0	DIAS
AMPLIACIÓN N° 01 DÍAS	40	DIAS
AMPLIACIÓN N° 02 DÍAS	10	DIAS
AMPLIACIÓN N° 03 DÍAS	15	DIAS
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN 01	8-abr.-23	
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN 02	18-abr.-23	
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN 03	3-may.-23	
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	18-may.-23	
FECHA DE APROBACIÓN	18-may.-23	

VALOR PLANILLADO AVANCE DE OBRA	145,521.49	3,942.87	149,464.36
			0.00
			0.00
TOTAL PLANILLADO	**145,521.49**	**3,942.87**	**149,464.36**

DESCUENTOS Y RETENCIONES				
ANTICIPO :	40%	58,208.59	1,577.15	59,785.74
OTROS:				0.00
TOTAL DE DESCUENTOS:		**58,208.59**	**1,577.15**	**59,785.74**
VALOR LIQUIDO ESTA PLANILLA :		**87,312.90**	**2,365.72**	**89,678.62**

ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONSORCIO FATIMA

OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA 08_LIQUIDACIÓN-DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789,464.39		
PERIODO:	1-abr.-23	30-abr.-23	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315,785.75	40%	
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01+02+03:	180	DÍAS	

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7	476.17	3333.19000	0.20	95.23	1.21%	0.00	0.00	0.00%	-0.20	-95.23	-1.20%
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3.5	405.49	1419.21500	3.50	1419.22	17.98%	0.00	0.00	0.00%	-3.50	-1419.22	-18.00%
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9419.69	0.72	6782.17680	35025.49	25218.36	319.44%	25605.80	18436.18	233.50%	-9419.69	-6782.18	-85.90%
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189.9	11.34	2153.46600	7.20	81.65	1.03%	0.00	0.00	0.00%	-7.20	-81.65	-1.00%
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M3	1706.6	3.7	6314.42000	1541.80	5704.66	72.26%	0.00	0.00	0.00%	-1541.80	-5704.66	-72.30%
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	368.64	3.94	1452.44160	538.17	2120.39	26.86%	169.53	667.95	8.50%	-368.64	-1452.44	-18.40%
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	1412.95	1.35	1907.48250	1396.40	1885.14	23.88%	0.00	0.00	0.00%	-1396.40	-1885.14	-23.90%
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80	243.32	19465.60000	22.40	5450.37	69.04%	0.00	0.00	0.00%	-22.40	-5450.37	-69.00%
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314.88	189.47	59660.31360	818.31	155045.20	1963.93%	503.43	95384.88	1208.20%	-314.88	-59660.32	-755.70%
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M3	91.84	177.81	16330.07040	71.75	12757.87	161.60%	0.00	0.00	0.00%	-71.75	-12757.87	-161.60%
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770	60.24	46384.80000	78.00	4698.72	59.52%	0.00	0.00	0.00%	-78.00	-4698.72	-59.50%
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y ,REGADA)	M3	17988.24	2.38	42812.01120	21802.47	51889.89	657.28%	3814.23	9077.87	115.00%	-17988.24	-42812.02	-542.30%
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M3	4611.6	10.16	46853.85600	4500.03	45720.31	579.13%	0.00	0.00	0.00%	-4500.03	-45720.31	-579.10%
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M3	2880.87	12.94	37278.45780	3014.75	39010.87	494.14%	133.88	1732.41	21.90%	-2880.87	-37278.46	-472.20%
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1412.95	0.81	1144.48950	31246.37	25309.56	320.59%	29833.42	24165.07	306.10%	-1412.95	-1144.49	-14.50%
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863435.52	0.22	189955.81440	828493.62	182268.60	2308.76%	0.00	0.00	0.00%	-828493.62	-182268.60	-2308.80%
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204755.04	0.22	45046.10880	157501.05	34650.23	438.91%	0.00	0.00	0.00%	-157501.05	-34650.23	-438.90%
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127910.63	0.22	28140.33860	105516.25	23213.58	294.04%	0.00	0.00	0.00%	-105516.25	-23213.58	-294.00%
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32340	0.66	21344.40000	25126.42	16583.44	210.06%	0.00	0.00	0.00%	-25126.42	-16583.44	-210.10%
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23100	8.05	185955.00000	17947.44	144476.89	1830.06%	0.00	0.00	0.00%	-17947.44	-144476.89	-1830.10%
	SEÑALIZACION													
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9800	0.22	2156.00000	8906.20	1959.36	24.82%	0.00	0.00	0.00%	-8906.20	-1959.36	-24.80%
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875	5.36	4690.00000									
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1	332.16	332.16000	1.00	332.16	4.21%	0.00	0.00	0.00%	-1.00	-332.16	-4.20%
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6	283.4	1700.40000									
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6	283.4	1700.40000									
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10	117.23	1172.30000									
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100	117.23	11723.00000	41.00	4806.43	60.88%	0.00	0.00	0.00%	-41.00	-4806.43	-60.90%
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2	66.74	133.48000	2.00	133.48	1.69%	0.00	0.00	0.00%	-2.00	-133.48	-1.70%
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2	145.37	290.74000	2.00	290.74	3.68%	0.00	0.00	0.00%	-2.00	-290.74	-3.70%
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500	0.28	140.00000	88.40	24.75	0.31%	0.00	0.00	0.00%	-88.40	-24.75	-0.30%
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10	20.4	204.00000	10.00	204.00	2.58%	0.00	0.00	0.00%	-10.00	-204.00	-2.60%
	MEDIDAS AMBIENTALES													
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2	15.93	31.86000	2.00	31.86	0.40%	0.00	0.00	0.00%	-2.00	-31.86	-0.40%
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2	143	286.00000	2.00	286.00	3.62%	0.00	0.00	0.00%	-2.00	-286.00	-3.60%
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110.00000	1.00	110.00	1.39%	0.00	0.00	0.00%	-1.00	-110.00	-1.40%
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110.00000	1.00	110.00	1.39%	0.00	0.00	0.00%	-1.00	-110.00	-1.40%
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110.00000	1.00	110.00	1.39%	0.00	0.00	0.00%	-1.00	-110.00	-1.40%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA 08_LIQUIDACIÓN-DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789,464.39		
PERIODO:	1-abr.-23	30-abr.-23	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315,785.75	40%	
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01+02+03:	180	DÍAS	

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20	42.02	840.40000	15.00	630.30	7.98%	0.00	0.00	0.00%	-15.00	-630.30	-8.00%
				TOTALES :	789,464.39220		786,629.26	99.64%		149,464.36	18.93%		-637,164.90	-80.71%

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	1-sep.-22	
FIN PLAZO CONTRACTUAL	27-feb.-23	
SUSPENSION DIAS	0	DIAS
AMPLIACIÓN N° 01 DÍAS	40	DIAS
AMPLIACIÓN N° 02 DÍAS	10	DIAS
AMPLIACIÓN N° 03 DÍAS	15	DIAS
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN 01	8-abr.-23	
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN 02	18-abr.-23	
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN 03	3-may.-23	
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	18-may.-23	
FECHA DE APROBACIÓN	18-may.-23	

MONTO PLANILLADO AVANCE DE OBRA	786,629.26	99.64%	%
MONTO DE INCREMENTOS	149,464.36	18.93%	%
MONTO DECREMENTOS	-637,164.90	-80.71%	%
TOTAL PLANILLADO	**786,629.26**	**99.64%**	

ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN EXTERNA

GOBIERNO DE PASTAZA
El Gobierno del Ánimo

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

PROCESO: COTO-GADPPz-005-2022

CONTRATO PRINCIPAL	
DESCRIPCIÓN DE MONTOS	**VALORES EN USD**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	789,464.39
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO (40%)	315,785.75
1.- Resumen de Planillas al 100%	
Valor de la planilla de Avance Nº 1	118,328.75
Valor de la planilla de Avance Nº 2	63,897.32
Valor de la planilla de Avance Nº 3	60,767.98
Valor de la planilla de Avance Nº 4	149,605.33
Valor de la planilla de Avance Nº 5	120,522.15
Valor de la planilla de Avance Nº 6	115,675.58
Valor de la planilla de Avance Nº 7	1,602.00
Valor de la planilla de Avance Nº 8	6,765.79
Subtotal 1:	**637,164.90**
2.- Resumen de Planillas de Incrementos	
Valor de la planilla de Avance Nº 1	
Valor de la planilla de Avance Nº 2	11,075.87
Valor de la planilla de Avance Nº 3	2,945.28
Valor de la planilla de Avance Nº 4	24,165.07
Valor de la planilla de Avance Nº 5	3,184.15
Valor de la planilla de Avance Nº 6	62,918.66
Valor de la planilla de Avance Nº 7	41,232.46
Valor de la planilla de Avance Nº 8	3,942.87

Subtotal 2:	**149,464.36**
3.- Resumen de Planillas (Plan. al 100% + Plan. de Increm.)	
Valor de la planilla de Avance Nº 1	118,328.75
Valor de la planilla de Avance Nº 2	74,973.19
Valor de la planilla de Avance Nº 3	63,713.26
Valor de la planilla de Avance Nº 4	173,770.40
Valor de la planilla de Avance Nº 5	123,706.30
Valor de la planilla de Avance Nº 6	178,594.24
Valor de la planilla de Avance Nº 7	42,834.46
Valor de la planilla de Avance Nº 8	10,708.66
Subtotal 3:	**786,629.26**
4.- Resumen Liquidación del Anticipo	
Valor de Anticipo Entregado	315,785.75
Valor de la planilla de Avance Nº 1	47,331.50
Valor de la planilla de Avance Nº 2	29,989.28
Valor de la planilla de Avance Nº 3	25,485.30
Valor de la planilla de Avance Nº 4	69,508.16
Valor de la planilla de Avance Nº 5	49,482.52
Valor de la planilla de Avance Nº 6	71,437.70
Valor de la planilla de Avance Nº 7	17,133.78
Valor de la planilla de Avance Nº 8	4,283.46
Valor de Anticipo no Devengado	1,134.05
Subtotal 4:	**315,785.75**
Saldo de Anticipo:	**-**
5.- Resumen de Reajustes Provisionales	
Valor en la planilla de Avance Nº 1, Provisional	1,703.93
Valor en la planilla de Avance Nº 2, Provisional	1,124.60
Valor en la planilla de Avance Nº 3, Provisional	802.79
Valor en la planilla de Avance Nº 4, Provisional	2,085.24
Valor en la planilla de Avance Nº 5, Provisional	2,300.94
Valor en la planilla de Avance Nº 6, Provisional	3,321.85
Valor en la planilla de Avance Nº 7, Provisional	796.72
Valor en la planilla de Avance Nº 8, Provisional	253.98
Subtotal 5:	**12,390.05**
6.- Resumen de Reajustes Definitivos	
Valor en la planilla de Avance Nº 1, Definitivo	-354.98
Valor en la planilla de Avance Nº 2, Definitivo	-269.91
Valor en la planilla de Avance Nº 3, Definitivo	1,032.15
Subtotal 6:	**407.26**

GOBIERNO DE
PASTAZA

7.- Resumen de Multas	
Multas Planillas	-
Multas Plazo	-
Subtotal 7:	-

EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Edwin Gustavo Navas Manjarrez

ADMINISTRADOR DE CONTRATO - FISCALIZADOR 1

OGI Omar H. Guamán I.
Ingeniero Civil

OFICIO N. 009-2022-FISC-EXT
Pastaza, 04 de octubre de 2022

Ingeniero
Álvaro Sosa
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DEL GADPPz

Presente. -

Reciba un atento y cordial saludo, a la vez desearle éxitos en las funciones a usted encomendadas, de la misma manera pongo en conocimiento que se adjunta el informe de cumplimiento ambiental del proyecto "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", perteneciente a la planilla de avance No. 01 para que se proceda con el trámite pertinente.

Verificado en territorio lo presentado en el informe ambiental de cumplimiento remitido por el contratista, fiscalización externa emite la **CONFORMIDAD AMBIENTAL**, correspondiente al periodo 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2022.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
OMAR HENRY
GUAMAN ILER

Ing. Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO

Copia: Ing. Christian Vargas - Director de Gestión Ambiental del GADPPz

@IngenieroCivilOGI
ohg@hotmail.es
ohg.omar@gmail.com
0987571382 / 0979894628
Calle Bolívar 1-38 y Av. Marco Aurelio Subía
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

OGI Omar H. Guamán I.
Ingeniero Civil

OFICIO N. 013-2022-FISC-EXT
Pastaza, 01 de noviembre de 2022

Ingeniero
Adán Mariño
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN SUBROGANTE DEL GADPPz

Presente. -

Reciba un atento y cordial saludo, a la vez desearle éxitos en las funciones a usted encomendadas, de la misma manera pongo en conocimiento que se adjunta el informe de cumplimiento ambiental del proyecto "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", perteneciente a la planilla de avance No. 02 para que se proceda con el trámite pertinente.

Verificado en territorio lo presentado en el informe ambiental de cumplimiento remitido por el contratista, fiscalización externa emite la **CONFORMIDAD AMBIENTAL**, correspondiente al periodo 01 de octubre al 31 de octubre de 2022

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
OMAR HENRY
GUAMAN ILER

Ing. Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO

Copia: Ing. Christian Vargas - Director de Gestión Ambiental del GADPPz

@IngenieroCivilOGI
ohgi@hotmail.es
ohgiomar@gmail.com
0987571382 / 0979894628
Calle Bolívar 1-38 y Av. Marco Aurelio Subía
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

OGI Omar H. Guamán I.
Ingeniero Civil

OFICIO N. 021-2022-FISC-EXT
Pastaza, 01 de diciembre de 2022

Ingeniero
Álvaro Sosa
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DEL GADPPz

Presente. -

Reciba un atento y cordial saludo, a la vez desearle éxitos en las funciones a usted encomendadas, de la misma manera pongo en conocimiento que se adjunta el informe de cumplimiento ambiental del proyecto "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", perteneciente a la planilla de avance No. 03 para que se proceda con el trámite pertinente.

Verificado en territorio lo presentado en el informe ambiental de cumplimiento remitido por el contratista, fiscalización externa emite la **CONFORMIDAD AMBIENTAL**, correspondiente al periodo 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2022

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO

Copia: Ing. Christian Vargas - Director de Gestión Ambiental del GADPPz

@IngenieroCivilOGI
obgi@hotmail.es
obgiomar@gmail.com
0987571382 / 0979804628
Calle Bolívar 1-38 y Av. Marco Aurelio Subía
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

OGI Omar H. Guamán I.
Ingeniero Civil

OFICIO N. 032-2022-FISC-EXT
Pastaza, 03 de enero de 2023

Ingeniero
Álvaro Sosa
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DEL GADPPz

Presente. -

Reciba un atento y cordial saludo, a la vez desearle éxitos en las funciones a usted encomendadas, de la misma manera pongo en conocimiento que se adjunta el informe de cumplimiento ambiental del proyecto "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", perteneciente a la planilla de avance No. 04 para que se proceda con el trámite pertinente.

Verificado en territorio lo presentado en el informe ambiental de cumplimiento remitido por el contratista, fiscalización externa emite la **CONFORMIDAD AMBIENTAL**, correspondiente al periodo 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2022

Atentamente,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:
OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO

Copia: Ing. David Yedra - Director de Gestión Ambiental del GADPPz

@IngenieroCivilOGI
ohgi@hotmail.es
ohgiomar@gmail.com
0987571382 / 0979894628
Calle Bolívar 1-38 y Av. Marco Aurelio Subia
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

OGI Omar H. Guamán I.
Ingeniero Civil

OFICIO N. 007-2023-FISC-EXT
Pastaza, 01 de febrero de 2023

Ingeniero
Álvaro Sosa
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DEL GADPPz

Presente. -

Reciba un atento y cordial saludo, a la vez desearle éxitos en las funciones a usted encomendadas, de la misma manera pongo en conocimiento que se adjunta el informe de cumplimiento ambiental del proyecto "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", perteneciente a la planilla de avance No. 05 para que se proceda con el trámite pertinente.

Verificado en territorio lo presentado en el informe ambiental de cumplimiento remitido por el contratista, fiscalización externa emite la **CONFORMIDAD AMBIENTAL**, correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de enero de 2023

Atentamente,

OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO

Copia: Ing. David Yedra - Director de Gestión Ambiental del GADPPz

@IngenieroCivilOGI
ohgi@hotmail.es
ohg.omar@gmail.com
0987571382 / 0979894628
Calle Bolívar 1-38 y Av. Marco Aurelio Subia
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

OGI Omar H. Guamán I.
Ingeniero Civil

OFICIO N. 020-2023-FISC-EXT
Pastaza, 03 de marzo de 2023

Ingeniero
Adán Mariño
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN SUBROGANTE DEL GADPPz

Presente. -

Reciba un atento y cordial saludo, a la vez desearle éxitos en las funciones a usted encomendadas, de la misma manera pongo en conocimiento que se adjunta el informe de cumplimiento ambiental del proyecto "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", perteneciente a la planilla de avance No. 06 para que se proceda con el trámite pertinente.

Verificado en territorio lo presentado en el informe ambiental de cumplimiento remitido por el contratista, fiscalización externa emite la **CONFORMIDAD AMBIENTAL**, correspondiente al periodo 01 de febrero al 28 de febrero de 2023

Atentamente,

OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO

Copia: Ing. David Yedra - Director de Gestión Ambiental del GADPPz

@IngenieroCivilOGI
ohgi@hotmail.es
ohgiomar@gmail.com
0987571382 / 0979894628
Calle Bolívar 1-38 y Av. Marco Aurelio Subía
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

OGI Omar H. Guamán I.
Ingeniero Civil

OFICIO N. 029-2023-FISC-EXT
Pastaza, 04 de abril de 2023

Ingeniero
Álvaro Sosa
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DEL GADPPz

Presente. -

Reciba un atento y cordial saludo, a la vez desearle éxitos en las funciones a usted encomendadas, de la misma manera pongo en conocimiento que se adjunta el informe de cumplimiento ambiental del proyecto "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", perteneciente a la planilla de avance No. 07 para que se proceda con el trámite pertinente.

Verificado en territorio lo presentado en el informe ambiental de cumplimiento remitido por el contratista, fiscalización externa emite la **CONFORMIDAD AMBIENTAL**, correspondiente al periodo 01 de marzo al 31 de marzo de 2023

Atentamente,

OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO

Copia: Ing. David Yedra - Director de Gestión Ambiental del GADPPz

@IngenieroCivilOGI
ohg@hotmail.es
ohg.omar@gmail.com
0987571382 / 0979894628
Calle Bolívar 1-38 y Av. Marco Aurelio Subía
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

OGI Omar H. Guamán I.
Ingeniero Civil

OFICIO N. 046-2023-FISC-EXT
Pastaza, 19 de mayo de 2023

Ingeniero
Jair Ledesma
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DEL GADPPz

Presente. -

Reciba un atento y cordial saludo, a la vez desearle éxitos en las funciones a usted encomendadas, de la misma manera pongo en conocimiento que se adjunta el informe de cumplimiento ambiental del proyecto "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", perteneciente a la planilla de avance No. 08 (liquidación) para que se proceda con el trámite pertinente.

Verificado en territorio lo presentado en el informe ambiental de cumplimiento remitido por el contratista, fiscalización externa emite la **CONFORMIDAD AMBIENTAL**, correspondiente al periodo 01 de abril al 30 de abril de 2023

Atentamente,

OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO

Copia: Ing. Ricarda Landazuri- Directora de Gestión Ambiental del GADPPz

@IngenieroCivilOGI
ohgi@hotmail.es
ohgi.omar@gmail.com
0987511382 / 0979804628
Calle Bolívar 1-38 y Av. Marco Aurelio Subía
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

GOBIERNO DE PASTAZA
El Gobierno del Ánimo

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5882-M

Puyo, 04 de agosto de 2023

PARA: Sr. Ing. Edwin Gustavo Navas Manjarrez
Fiscalizador 1

ASUNTO: DEVOLUCION DEL TRÁMITE DE PAGO PLANILLA DE LIQUIDACIÓN, REAJUSTE PROVISIONAL D8 - PLANILLA DE LIQUIDACIÓN Y DESCUENTO DEL VALOR DE ANTICIPO NO DEVENGADO DEL CONTRATO DEL PROYECTO ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO.

En relación al Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2368-M, de fecha 02 de agosto de 2023, procedo a devolver la Planilla de Liquidación y Reajuste Provisional del proyecto: **"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO"**, dando a conocer las observaciones emitidas por la Dirección Financiera:

1.- Por favor se requiere verificar los valores del anticipo que está pendiente por devengar.
2.- Falta el check list.
3.- Faltan justificativos para las dos ampliaciones.
4.- Detallar las planillas al 100%, excedentes y consolidada.
5.- Realizar un cuadro con los reajustes provisionales pagados y los que están pendientes por pagar.
6.- Falta el oficio de ingreso de la Conformidad Ambiental a Fiscalización

Con estos antecedentes, se solicita subsanar las observaciones descritas, con el fin de dar continuidad al trámite administrativo pertinente; *adicional aquello, toda información deberá ser anexada en el Sistema de Gestión Documental Yasuni Quipux y de forma física.*

Particular que remito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Recibido
04-08-2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
DIRECTOR DE FISCALIZACION

Referencias:
- GADPPZ-FINANCIERO-2023-2368-M

Anexos:
- poliza_de_fiel_cumplimiento.pdf
- cotizaciÓn_de_obra_allushungo_rec-signed-signed-signed-signed.pdf
- adjudicar_a_proveedores0920049001653574506.pdf
- resoluciÓn_ad.alishungo-signed-signed-signed.pdf
- autorizacion_de_inicio0219584001651006283.pdf
- compromiso755-signed-signed.pdf

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5882-M

Puyo, 04 de agosto de 2023

- obras_publicas_2022_5374-m.pdf
- acta_apertura_de_ofertas_005-signed_(1)-signed-signed_(1)-signed.pdf
- acta_calificacion_coto-gadppz-005-2022-signed-signed-signed-signed.pdf
- acta_acta_de_mypes_y_eps_locales-signed-signed_(2)-signed-signed.pdf
- estudio_ambiental_aprobado_pma.pdf
- especificaciones_tecnicas_allishungo008744900l651006284.pdf
- certf_presupuestaria.pdf
- presupuesto_asfaltado_cv_allishungo___palma_roja___el_pantanal_20220735003001647273776.pdf
- preguntas_respuesta_1.pdf
- proveedores_que_enviaron_propuestas.pdf
- acta_de_convalidacion_allishungo-signed-signed-signed-signed.pdf
- borrador_de_pliego_coto_005_-signed.pdf
- preguntas_respuesta_2.pdf
- resolucion_de_aprobacion_e_inicio_de_proceso.pdf
- parametros_cotizacion3.pdf
- perez_alvarez_washington_antonio_mypes0643870001652902552.pdf
- narvaez_guevara_jose_luis_mypes0429342001652902552.pdf
- horna_sanchez_tania_lisbeth_mypes.pdf
- flores_carvajal_carlos_santiago_mypes.pdf
- constructora_eddymich_cia_ltda_mypes0690228001652902551.pdf
- aillon_aillon_alex_paul_mypes.pdf
- proveedores_que_enviaron_propuestas0214008001652902551.pdf
- torres_arteaga_nathalia_ximena_mypes0857411001652902552.pdf
- acta_sesion_3_preguntas_aclaraciones_allishungo-signed-signed-signed-signed.pdf
- acta_sesion_2_allishungo-signed-signed-signed-signed0376655001651006283.pdf
- notificacion_administrador_de_contrato094_coto_005-signed.pdf
- poliza_de_buen_uso_anticipo0025228001655826736.pdf
- ambiental0004128001689264589.rar
- ampliaciones.rar
- contratista_obra0617975001689264619.rar
- fiscalizacion022217500l689264635.rar
- ampliaciÓn_n°_3-signed0136582001689264645.pdf
- recepciÓn_provisional_de_obra-signed0996543001689264652.pdf
- planillas_aprobadas0790881001689264671.rar
- reaustes_definitivos0223499001689264685.rar
- informe_020_aprobacion_planilla_8-signed.pdf
- oficio_fisca_2023-47-solicitud_pagoplanilla_obra_08-signed.pdf
- memoria_fotografica_planilla_08-signed0031552001689264736.pdf
- señaleticas0610515001689264754.rar
- anexo_abril_2023_planilla_080379344001689264790.dwg
- anexo_planilla_08_0492819001689264818.lsx
- cronogramas_ofertado0143114001689264835.rar
- ensayos_control_de_calidad0472523001689264849.rar
- facturas_iess_abril_2023052537400l689264862.rar
- garantias0337073001689264874.rar
- informe_ambiental_abril_20230790326001689264889.rar
- informe_contratista_abril_2023_planilla_08_liq-signed0304378001689264903.pdf
- libro_de_obra_abril_2023-signed0492847001689264927.pdf
- oficios_enviados_a_fiscalizacion_abril_2023026779400l689264949.rar
- oficios_recibidos_fisca_abril_2023068874400l689265732.rar
- planilla_08_liquidacion_escaneada-signed0594535001689266265.pdf
- planilla_08_liquidacion_aprobada0998541001689266280.rar
- reaustes_definitivos0966507001689266296.rar
- reprogramacion_04_y_05_aprobada0303423001689266313.rar

* Documento firmado electrónicamente por Quipux - yasuni.pastaza.gob.ec producción

GOBIERNO DE PASTAZA
El Gobierno del Ánimo

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5882-M

Puyo, 04 de agosto de 2023

Copia:
Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaria Ejecutiva 2 /**

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Jomara Daniela Martinez Moya - Asistente Administrativo 1

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:
JAIR FERNANDO
LEDESMA BASTIDAS

GOBIERNO DE PASTAZA
El Gobierno del Ánimo

Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2368-M

Puyo, 02 de agosto de 2023

PARA: Sr. Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
Director de Fiscalizacion

ASUNTO: DEVOLUCION DEL TRÁMITE DE PAGO PLANILLA DE LIQUIDACIÓN, REAJUSTE PROVISIONAL D8 - PLANILLA DE LIQUIDACIÓN Y DESCUENTO DEL VALOR DE ANTICIPO NO DEVENGADO DEL CONTRATO DEL PROYECTO ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO.

En respuesta al Documento No. GADPPZ- FISCALIZACION-2023-5784-M, adjunto en físico el tramite del PAGO PLANILLA DE LIQUIDACIÓN, REAJUSTE PROVISIONAL D8 - PLANILLA DE LIQUIDACIÓN Y DESCUENTO DEL VALOR DE ANTICIPO NO DEVENGADO DEL CONTRATO DEL PROYECTO ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO, la misma que al hacer el control previo se encontró, la siguientes observaciones.

1.- Por favor se requiere verificar los valores del anticipo que esta pendiente por devengar.
2.- Falta el check list.
3.- Faltan justificativos para las dos ampliaciones.
4.- Detallar las planillas al 100%, excedentes y consolidada.
5.- Realizar un cuadro con los reajustes provisionales pagados y los que están pendientes por pagar.
6.- Falta el oficio de ingreso de la Conformidad Ambiental a Fiscalización.

Atentamente,

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN DE FISCALIZACION
Pastaza 02 AGO 2023
Fecha:
Recibido:
Número: Hora: 11h20

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
DIRECTORA FINANCIERA (E)

Referencias:
- GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5784-M

Anexos:
- reprogramacion_04_y_05_aprobada03034230016892663l3.rar
- reaustes_definitivos0966507001689266296.rar
- planilla_08_liquidacion_aprobada0998541001689266280.rar
- planilla_08_liquidacion_escaneada-signed0594535001689266265.pdf
- oficios_recibidos_fisca_abril_2023068874400l689265732.rar
- oficios_enviados_a_fiscalizacion_abril_2023026779400l689264949.rar
- libro_de_obra_abril_2023-signed0492847001689264927.pdf
- informe_contratista_abril_2023_planilla_08_liq-signed0304378001689264903.pdf
- informe_ambiental_abril_2023079032600l689264889.rar
- garantias033707300l689264874.rar
- facturas_iess_abril_2023052537400l689264862.rar
- ensayos_control_de_calidad0472523001689264849.rar
- cronogramas_ofertado0143114001689264835.rar
- anexo_planilla_08_0492819001689264818.lsx
- anexo_abril_2023_planilla_080379344001689264790.dwg

GOBIERNO DE PASTAZA
El Gobierno del Ánimo

Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2368-M

Puyo, 02 de agosto de 2023

- señaleticas0610515001689264754.rar
- memoria_fotografica_planilla_08-signed0031552001689264736.pdf
- oficio_fisca_2023-47-solicitud_pagoplanilla_obra_08-signed.pdf
- informe_020_aprobacion_planilla_8-signed.pdf
- reaustes_definitivos0223499001689264685.rar
- planillas_aprobadas0790881001689264671.rar
- recepciÓn_provisional_de_obra-signed0996543001689264652.pdf
- ampliaciÓn_n°_3-signed0136582001689264645.pdf
- fiscalizacion0222175001689264635.rar
- contratista_obra0617975001689264619.rar
- ampliaciones.rar
- ambiental0004128001689264589.rar
- poliza_de_buen_uso_anticipo0025228001655826736.pdf
- notificacion_administrador_de_contrato094_coto_005-signed.pdf
- acta_sesion_2_allishungo-signed-signed-signed-signed0376655001651006283.pdf
- acta_sesion_3_preguntas_aclaraciones_allishungo-signed-signed-signed-signed.pdf
- torres_arteaga_nathalia_ximena_mypes0857411001652902552.pdf
- proveedores_que_enviaron_propuestas0214008001652902551.pdf
- aillon_aillon_alex_paul_mypes.pdf
- constructora_eddymich_cia_ltda_mypes0690228001652902551.pdf
- flores_carvajal_carlos_santiago_mypes.pdf
- horna_sanchez_tania_lisbeth_mypes.pdf
- narvaez_guevara_jose_luis_mypes0429342001652902552.pdf
- perez_alvarez_washington_antonio_mypes0643870001652902552.pdf
- parametros_cotizacion3.pdf
- resolucion_de_aprobacion_e_inicio_de_proceso.pdf
- preguntas_respuesta_2.pdf
- borrador_de_pliego_coto_005_-signed.pdf
- acta_de_convalidacion_allishungo-signed-signed-signed-signed.pdf
- proveedores_que_enviaron_propuestas.pdf
- preguntas_respuesta_1.pdf
- presupuesto_asfaltado_cv_allishungo___palma_roja___el_pantanal_2022073500300164727377 6.pdf
- certf_presupuestaria.pdf
- especificaciones_tecnicas_allishungo0087449001651006284.pdf
- estudio_ambiental_aprobado_pma.pdf
- acta_acta_de_mypes_y_eps_locales-signed-signed_(2)-signed-signed.pdf
- acta_calificacion_coto-gadppz-005-2022-signed-signed-signed-signed.pdf
- acta_apertura_de_ofertas_005-signed_(1)-signed-signed_(1)-signed.pdf
- obras_publicas_2022_5374-m.pdf
- compromiso755-signed-signed.pdf
- autorizacion_de_inicio0219584001651006283.pdf
- resoluciÓn_ad.alishungo-signed-signed-signed.pdf
- adjudicar_a_proveedores0920049001653574506.pdf
- cotizaciÓn_de_obra_allushungo_rec-signed-signed-signed-signed.pdf
- poliza_de_fiel_cumplimiento.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Ing. Mercy Johana Quishpi Cuenca - Contador 1

Firmado electrónicamente por:
OLIVIA MARILU
ORDONEZ PAREDES


Verbatim

GOBIERNO DE PASTAZA
El Gobierno del Aroma

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA
Pastaza
Fecha: 18 JUL 2023
Recibido: Tao Roa
Número: 5784 Hora: 14h23

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5784-M

Puyo, 18 de julio de 2023

PARA: Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
Directora Financiera (E)

ASUNTO: TRÁMITE DE PAGO PLANILLA DE LIQUIDACIÓN, REAJUSTE PROVISIONAL D8 - PLANILLA DE LIQUIDACIÓN Y DESCUENTO DEL VALOR DE ANTICIPO NO DEVENGADO DEL CONTRATO DEL PROYECTO ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO.

En referencia a los documentos: OFICIO N° 047-2023-FISC-EXT de fecha 15 de junio de 2023, suscrito por el ingeniero Omar Guamán Iler – FISCALIZADOR EXTERNO; y, Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-7297-M, de fecha 13 de julio de 2023, suscrito por el ingeniero Edwin Navas – Fiscalizador 1 (Administrador de Contrato), hago hincapié lo siguiente:

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado 408-17 Administrador del contrato, que indica: *"El administrador del contrato velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sí para lograr el éxito del proyecto.- Es función del administrador del contrato establecer un sistema que evalúe el logro de los objetivos, mediante el cual pueda obtenerse información sobre su estado. Esto con el fin de tomar oportunamente acciones correctivas o para informar a las autoridades de la entidad sobre el desarrollo del proyecto"*

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado **408-18** Jefe de Fiscalización, indica: *"El Jefe de Fiscalización establecerá un sistema para asegurar la correcta ejecución de la obra, mediante el control de la calidad, el avance físico y el avance financiero de la obra. Dichos controles conllevan una evaluación mensual, de los aspectos mencionados y la comunicación de resultados a los mandos superiores, incluyendo los problemas surgidos, especialmente cuando afectan las condiciones pactadas en relación al plazo, presupuesto y calidad de la obra.- El Jefe de Fiscalización, se asegurará de que la obra se ejecute de conformidad con las bases establecidas en los estudios de preinversión, es decir, de acuerdo con el diseño definitivo, las especificaciones y demás normas técnicas aplicables, para lograr obtener del proyecto los beneficios esperados".*

Con estos antecedentes, adjunto al presente la Planilla 8 de Liquidación y Reajuste Provisional (con todos los anexos), de la consultoría: **"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"** documentación que ha sido revisada y aprobada por el Administrador de Contrato y Fiscalizador Externo; por lo que, en base a los informes anexos, se determina como viable y procedente realizar el pago de $ 5.545,13 USD (CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 13/100), a favor de la CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. – Contratista, de acuerdo al siguiente detalle:

* Documento firmado electrónicamente por Quipux - yasuni.pastaza.gob.ec producción

GOBIERNO DE PASTAZA
El Gobierno del Aliento

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5784-M

Puyo, 18 de julio de 2023

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	$ 10,708.66 USD
DESCUENTO DE ANTICIPO EN ESTE PERIODO	$ -4,283.46 USD
REAJUSTE PROVISIONAL DE LIQUIDACION	$ 253.98 USD
VALOR DE ANTICIPO DE DEVENGADO	$ -1,134.05 USD
VALOR TOTAL A PAGAR	**$ 5.545,13 USD**

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
DIRECTOR DE FISCALIZACION

Referencias:
- GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-7294-M

Anexos:
- poliza_de_fiel_cumplimiento.pdf
- cotizaciÓn_de_obra_allushungo_rec-signed-signed-signed-signed.pdf
- adjudicar_a_proveedores0920049001653574506.pdf
- resoluciÓn_ad.alishungo-signed-signed-signed.pdf
- autorizacion_de_inicio0219584001651006283.pdf
- compromiso755-signed-signed.pdf
- obras_publicas_2022_5374-m.pdf
- acta_apertura_de_ofertas_005-signed_(1)-signed-signed_(1)-signed.pdf
- acta_calificacion_coto-gadppz-005-2022-signed-signed-signed-signed.pdf
- acta_acta_de_mypes_y_eps_locales-signed-signed_(2)-signed-signed.pdf
- estudio_ambiental_aprobado_pma.pdf
- especificaciones_tecnicas_allishungo008744900165100628 4.pdf
- certf_presupuestaria.pdf
- presupuesto_asfaltado_cv_allishungo___palma_roja___el_pantanal_20220735003001647273776.pdf
- preguntas_respuesta_1.pdf
- proveedores_que_enviaron_propuestas.pdf
- acta_de_convalidacion_allishungo-signed-signed-signed-signed.pdf
- borrador_de_pliego_coto_005_-signed.pdf
- preguntas_respuesta_2.pdf
- resolucion_de_aprobacion_e_inicio_de_proceso.pdf
- parametros_cotizacion3.pdf
- perez_alvarez_washington_antonio_mypes0643870001652902552.pdf
- narvaez_guevara_jose_luis_mypes0429342001652902552.pdf
- horna_sanchez_tania_lisbeth_mypes.pdf
- flores_carvajal_carlos_santiago_mypes.pdf
- constructora_eddymich_cia_ltda_mypes0690228001652902551.pdf
- aillon_aillon_alex_paul_mypes.pdf
- proveedores_que_enviaron_propuestas0214008001652902551.pdf

* Documento firmado electrónicamente por Quipux - yasuni.pastaza.gob.ec producción

GOBIERNO DE PASTAZA
El Gobierno del Ánimo

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5784-M

Puyo, 18 de julio de 2023

- torres_arteaga_nathalia_ximena_mypes0857411001652902552.pdf
- acta_sesion_3_preguntas_aclaraciones_allishungo-signed-signed-signed-signed.pdf
- acta_sesion_2_allishungo-signed-signed-signed-signed037665500165100628 3.pdf
- notificacion_administrador_de_contrato094_coto_005-signed.pdf
- poliza_de_buen_uso_anticipo0025228001655826736.pdf
- ambiental0004128001689264589.rar
- ampliaciones.rar
- contratista_obra0617975001689264619.rar
- fiscalizacion022217500168926463 5.rar
- ampliaciÓn_n°_3-signed0136582001689264645.pdf
- recepciÓn_provisional_de_obra-signed0996543001689264652.pdf
- planillas_aprobadas0790881001689264671.rar
- reaustes_definitivos0223499001689264685.rar
- informe_020_aprobacion_planilla_8-signed.pdf
- oficio_fisca_2023-47-solicitud_pagoplanilla_obra_08-signed.pdf
- memoria_fotografica_planilla_08-signed0031552001689264736.pdf
- señaleticas0610515001689264754.rar
- anexo_abril_2023_planilla_080379344001689264790.dwg
- anexo_planilla_08_0492819001689264818.lsx
- cronogramas_ofertado0143114001689264835.rar
- ensayos_control_de_calidad0472523001689264849.rar
- facturas_iess_abril_20230525374001689264862.rar
- garantias033707300168926487 4.rar
- informe_ambiental_abril_20230790326001689264889.rar
- informe_contratista_abril_2023_planilla_08_liq-signed0304378001689264903.pdf
- libro_de_obra_abril_2023-signed0492847001689264927.pdf
- oficios_enviados_a_fiscalizacion_abril_20230267794001689264949.rar
- oficios_recibidos_fisca_abril_2023068874400168926573 2.rar
- planilla_08_liquidacion_escaneada-signed0594535001689266265.pdf
- planilla_08_liquidacion_aprobada0998541001689266280.rar
- reaustes_definitivos0966507001689266296.rar
- reprogramacion_04_y_05_aprobada0303423001689266313.rar

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: JEFE (A) DE PRESUPUESTO
Pastaza
Fecha: 13 JUL 2023

Ejecutar el control previo al compromiso verificando disponibilidad presupuestaria, y emitir certificacion financiera, conforme a las Leyes y Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL
Pastaza
Fecha: 18 JUL 2023

Ejecutar el control previo y efectuar La contabilización, conforme leyes y Reglamentos vigentes.

Copia:
Sr. Mgs. Jorge Luis Nuñez Meneses - **Director de Obras Públicas** / Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaria Ejecutiva 2** /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Jomara Daniela Martinez Moya - Asistente Administrativo 1

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL
Pastaza
Fecha: 18 JUL 2023

Ejecutar el control previo al pago Conforme leyes y reglamentos Vigentes.

Firmado electrónicamente por:
JAIR FERNANDO LEDESMA BASTIDAS

* Documento firmado electrónicamente por Quipux - yasuni.pastaza.gob.ec producción

GOBIERNO DE PASTAZA
El Gobierno del Amino

GAD PRO... DE PASTAZA
DIRECCION DE FISCALIZACION
Pastaza
Fecha: 13 JUL 2023
Recibido: SOLORZO M
Número: _____ Hora: 13h30

Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-7294-M

Puyo, 13 de julio de 2023

PARA: Sr. Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
Director de Fiscalizacion

ASUNTO: TRÁMITE DE Nº 8 â PLANILLA DE LIQUIDACIÓN, REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA Nº 8 â PLANILLA DE LIQUIDACIÓN Y DESCUENTO DEL VALOR DE ANTICIPO NO DEVENGADO DEL CONTRATO DEL PROYECTO "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PRO

De mi consideración:

De acuerdo a los Art(s). 70. de la LOSNCP; 121. del RLOSNCP; 408 – 16 y 408 - 17 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS (Acuerdo 039-CG), en lo que refiere a la "ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO", en atribuciones exclusivas y únicas a lo que la Ley señala para mi designación como Administrador de Contrato; en relación al **"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", PROCESO COTO-GADPPz-005-2022**, a la presente fecha una vez que el Ing. Fiscalizador Externo ha procedido a remitir la PLANILLA Nº 8 – PLANILLA DE LIQUIDACIÓN ($ 10,708.66), DESCUENTO DE ANTICIPO EN ESTE PERIODO ($ -4,283.46), REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA Nº 8 – PLANILLA DE LIQUIDACIÓN ($ 253.98) y VALOR DE ANTICIPO DE DEVENGADO ($ -1,134.05); correspondiente al mes y periodo desde el 01 de abril del 2023 al 30 de abril del 2023 con un **VALOR LIQUIDO A PAGAR TOTAL de $ 5,545.13 USD Dólares Americanos sin I.V.A.** (cinco mil quinientos cuarenta y cinco dólares con trece centavos), una vez revisada la información me permito manifestar la conformidad de la documentación adjunta para su debido proceso.

En virtud de lo expuesto y en cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas en el CONTRATO - CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO, solicito por medio de su persona SE PROCEDA CON EL PAGO de PLANILLA Nº 8 – PLANILLA DE LIQUIDACIÓN y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA Nº 8 – PLANILLA DE LIQUIDACIÓN, a favor de la **CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.**, Contratista responsable de la obra.

Particular que se comunica para los fines pertinentes.

Atentamente,

* Documento firmado electrónicamente por Quipux - yasuni.pastaza.gob.ec producción

GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno del Aroma

Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-7294-M

Puyo, 13 de julio de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edwin Gustavo Navas Manjarrez
FISCALIZADOR 1

Referencias:
- GADPPZ-COMPRAS-PUBLICAS-2022-5972-M

Anexos:
- cotizaciÓn_de_obra_allushungo_rec-signed-signed-signed-signed.pdf
- adjudicar_a_proveedores0920049001653574506.pdf
- resoluciÓn_ad.alishungo-signed-signed-signed.pdf
- autorizacion_de_inicio0219584001651006283.pdf
- compromiso755-signed-signed.pdf
- obras_publicas_2022_5374-m.pdf
- acta_apertura_de_ofertas_005-signed_(1)-signed-signed_(1)-signed.pdf
- acta_calificacion_coto-gadppz-005-2022-signed-signed-signed-signed.pdf
- acta_acta_de_mypes_y_eps_locales-signed-signed_(2)-signed-signed.pdf
- estudio_ambiental_aprobado_pma.pdf
- especificaciones_tecnicas_allishungo0087449001651006284.pdf
- certf_presupuestaria.pdf
- presupuesto_asfaltado_cv_allishungo___palma_roja___el_pantanal_20220735003001647273776.pdf
- preguntas_respuesta_1.pdf
- proveedores_que_enviaron_propuestas.pdf
- acta_de_convalidacion_allishungo-signed-signed-signed-signed.pdf
- borrador_de_pliego_coto_005_-signed.pdf
- preguntas_respuesta_2.pdf
- resolucion_de_aprobacion_e_inicio_de_proceso.pdf
- parametros_cotizacion3.pdf
- perez_alvarez_washington_antonio_mypes0643870001652902552.pdf
- narvaez_guevara_jose_luis_mypes0429342001652902552.pdf
- horna_sanchez_tania_lisbeth_mypes.pdf
- flores_carvajal_carlos_santiago_mypes.pdf
- constructora_eddymich_cia_ltda_mypes0690228001652902551.pdf
- aillon_aillon_alex_paul_mypes.pdf
- proveedores_que_enviaron_propuestas0214008001652902551.pdf
- torres_arteaga_nathalia_ximena_mypes0857411001652902552.pdf
- acta_sesion_3_preguntas_aclaraciones_allishungo-signed-signed-signed-signed.pdf
- acta_sesion_2_allishungo-signed-signed-signed-signed0376655001651006283.pdf
- notificacion_administrador_de_contrato094_coto_005-signed.pdf
- poliza_de_buen_uso_anticipo0025228001655826736.pdf
- poliza_de_fiel_cumplimiento.pdf
- ambiental0004128001689264589.rar
- ampliaciones.rar
- contratista_obra0617975001689264619.rar
- fiscalizacion0222175001689264635.rar
- ampliaciÓn_n°_3-signed0136582001689264645.pdf
- recepciÓn_provisional_de_obra-signed0996543001689264652.pdf
- planillas_aprobadas0790881001689264671.rar
- reaustes_definitivos0223499001689264685.rar
- informe_020_aprobacion_planilla_8-signed.pdf
- oficio_fisca_2023-47-solicitud_pagoplanilla_obra_08-signed.pdf
- memoria_fotografica_planilla_08-signed0031552001689264736.pdf
- señaleticas0610515001689264754.rar
- anexo_abril_2023_planilla_080379344001689264790.dwg
- anexo_planilla_08_0492819001689264818.lsx
- cronogramas_ofertado0143114001689264835.rar

* Documento firmado electrónicamente por Quipux - yasuni.pastaza.gob.ec producción

GOBIERNO DE PASTAZA
El Gobierno del Árbol

Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-7294-M

Puyo, 13 de julio de 2023

- ensayos_control_de_calidad0472523001689264849.rar
- facturas_iess_abril_20230525374001689264862.rar
- garantias0337073001689264874.rar
- informe_ambiental_abril_2023079032600168926 4889.rar
- informe_contratista_abril_2023_planilla_08_liq-signed030437800168926 4903.pdf
- libro_de_obra_abril_2023-signed0492847001689264927.pdf
- oficios_enviados_a_fiscalizacion_abril_2023026779400168926 4949.rar
- oficios_recibidos_fisca_abril_2023068874400168926 5732.rar
- planilla_08_liquidacion_escaneada-signed0594535001689266265.pdf
- planilla_08_liquidacion_aprobada0998541001689266280.rar
- reaustes_definitivos0966507001689266296.rar
- reprogramacion_04_y_05_aprobada0303423001689266313.rar
- contrato_de_obra0137805001689266329.pdf
- oficio_fisca_2023-44_correcciones_planilla_8-signed0255889001689266338.pdf
- oficio_24_eddymich_2023_planilla_avance_08_liquidacion-signed0170132001689266347.pdf
- oficio_25_eddymich_2023_solicitud_recepcion_provisional-signed0587918001689266355.pdf
- oficio_26_eddymich_2023_aviso_ingreso__recepcion__provisional-signed0459199001689266363.pdf
- oficio_28_eddymich_2023_planilla_avance_08_liquidacion_-correcciones-signed0471511001689266373.pdf
- recibido_de_oficio_de_recepcion_provisional0291048001689266382.pdf
- oficio_fisca_2023-49-alcance_planilla_8_obra-signed.pdf
- alcance_informe_020_aprobacion_planilla_8-signed.pdf
- check_list_8-allishungo-signed.pdf
- infor_admin_planilla_n°_8_allishungo-formato-bde-word-signed.pdf
- infor_admin_planilla_n°_8_allishungo-formato-gadppz-word-signed.pdf

EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

* Documento firmado electrónicamente por Quipux - yasuni.pastaza.gob.ec producción

Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-10604-M

Puyo, 05 de mayo de 2023

PARA: Sr. Ing. Edwin Gustavo Navas Manjarrez
Fiscalizador 1
Sr. Mgs. Hector Vinicio Alarcon Yepez
Jefe de Estudios y Proyectos (E)

ASUNTO: RECEPCIÓN PROVISIONAL de la obra "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

En atención al Oficio No. 025-EDDYMICH-2023, de fecha 03 de mayo de 2023, suscrito por el señor Ángel Misael López Chávez, en su calidad de Representante Legal CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. - CONTRATISTA, documento en el cual solicita la Recepción Provisional del Proyecto: **"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",** una vez concluido los trabajos del proyecto antes mencionado solicito de la manera más atenta se designe la comisión técnica para la Recepción Provisional de la obra, para lo cual detallo lo siguiente:

DATOS DEL PROYECTO:

Proyecto:	ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
Fiscalizador Externo:	Ing. Omar Henry Guamán Iler
Administrador de Contrato:	Ing. Gustavo Navas Manjarrez
Contratista:	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
Estado del Proyecto:	Terminado

DESIGNACIÓN:
Por lo expuesto, y de conformidad con la Resolución Administrativa No.004-GADPPz-2022, de fecha 06 de enero del 2022, en su Art. 1 numeral 2; me permito designar delegados a la Comisión de **Recepción Provisional de la obra:** "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", a los siguientes funcionarios:

MIEMBROS DE LA COMISION TECNICA

Técnico Delegado:	Ing. Vinicio Alarcón Yepez
Administrador de Contrato:	Ing. Gustavo Navas

Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-10604-M

Puyo, 05 de mayo de 2023

Será obligación de los delegados excusarse en caso de conflicto de intereses, y velar por el cabal cumplimiento General a la ley Orgánica Nacional de Contratación Pública, las disposiciones, normativas y plazos legales, la Dirección solicitante deberá verificar y supervisar el cumplimiento del proceso y plazos de la recepción, y notificará la presente designación a los servidores públicos delegados.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Referencias:
- GADPPZ-RECEPCION-2023-17220-E

Anexos:
- oficio_25_eddymich_2023_solicitud_recepcion_provisional-signed.pdf
- hr_17220-e_2023.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Lcda. Maria Fernanda Valle Lopez - Secretaria Ejecutiva 2

Firmado electrónicamente por:
DANIEL ANIBAL RAMOS CAMPAÑA

GOBIERNO DE PASTAZA
El Gobierno del Aliento

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN

ACTA DE ENTREGA ***RECEPCIÓN PROVISIONAL*** DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LA CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA PARA: *CONTRATO "**ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**"* a favor de la CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA Representante legal Sr. Ángel Misael López C.

En la ciudad de Puyo el quince de junio del 2023, nos constituimos los señores: Ing. Edwin Gustavo Navas Manjarrez como administrador, el Ing. Héctor Vinicio Alarcón Y. delegado, por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial De Pastaza; el (la). Ing. Omar Henry Guamán Iler en calidad de Fiscalizador Externo; y el (la). Sr. Ángel Misael López C. representante legal de CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA en calidad de contratista, con el objeto de celebrar la diligencia de *Recepción Provisional* de los trabajos.

Cláusula Primera. - Antecedentes

En la ciudad de Puyo el veinte de junio del 2022 se celebra el contrato suscrito por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial De Pastaza, representado por el Señor Prefecto, y por otra parte el Sr. Ángel Misael López C. representante legal de CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA en calidad de Contratista para el Contrato *"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"* A Favor De: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA, en la provincia de Pastaza.

El valor del contrato es *$ 789.464,39* de conformidad con el presupuesto elaborado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial De Pastaza.

Cláusula Segunda. - Plazo de Ejecución

Del análisis realizado en la cláusula anterior, revisadas las planillas de obra se desprende lo siguiente:

Plazo contractual:	180 días
Fecha de inicio:	01 de septiembre de 2022
Suspensión de plazo:	0 días

GOBIERNO DE PASTAZA
El Gobierno del Aliento

Ampliación de plazo	65 días
Fecha de terminación ampliada:	03 de mayo de 2023
Mora:	Ninguna
Multa diaria:	Ninguna
Multa Total:	Ninguna

Cláusula Tercera. – Inspección de la Obra

Previo al cumplimiento de los requisitos legales, la comisión de recepción se trasladó al lugar de los trabajos el día jueves 25 de mayo de 2023 y efectuó la inspección de los mismos, comprobándose que la obra ha sido ejecutada en su totalidad de lo contratado, con sujeción a las especificaciones técnicas y cláusulas contractuales, con resultados satisfactorios, en consecuencia, la comisión reciben forma *provisional* todos los trabajos realizados en el: Contrato "*ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA*" A Favor De: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

La comisión deja constancia expresa que será de cuenta del contratista la reparación o reposición de parte de la obra que se deba a defectos de la construcción.

Cláusula Cuarta. - Cantidades de Obra Contratadas y Ejecutadas

Es de estricta responsabilidad de la Fiscalización las cantidades de obra contratada y ejecutada en el contrato del ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA" A Favor De: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA, que se detalla en el anexo adjunto, en la presente acta de entrega *Recepción Provisional.*

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	% EJECUTADO
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	0.20	476.17	95.23	2.86
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3.50	405.49	1,419.22	100.00
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9,419.69	0.72	6,782.18	100.00
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	7.20	11.34	81.65	3.79
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M3	1,541.80	3.7	5,704.66	90.34
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	368.64	3.94	1,452.44	100.00
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	1,396.40	1.35	1,885.14	98.83

8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	22.40	243.32	5,450.37	28.00
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314.88	189.47	59,660.31	100.00
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M3	71.75	177.81	12,757.87	78.13
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	78.00	60.24	4,698.72	10.13
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M3	17,988.24	2.38	42,812.02	100.00
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M3	4,500.03	10.16	45,720.31	97.58
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M3	2,880.87	12.94	37,278.47	100.00
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M^3	1,412.95	0.81	1,144.49	100.00
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M^3-KM	828,493.62	0.22	182,268.60	95.95
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M^3-KM	157,501.05	0.22	34,650.23	76.92
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M^3-KM	105,516.25	0.22	23,213.58	82.49
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	25,126.42	0.66	16,583.44	77.69
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	17,947.44	8.05	144,476.89	77.69
	SEÑALIZACION					
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	8,906.20	0.22	1,959.36	90.88
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	0.00	5.36	0.00	0.00
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1.00	332.16	332.16	100.00
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	0.00	283.4	0.00	0.00
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	0.00	283.4	0.00	0.00
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	0.00	117.23	0.00	0.00
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	41.00	117.23	4,806.43	41.00
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2.00	66.74	133.48	100.00
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2.00	145.37	290.74	100.00
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	88.40	0.28	24.75	17.68
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10.00	20.4	204.00	100.00
	MEDIDAS AMBIENTALES					
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2.00	15.93	31.86	100.00
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2.00	143	286.00	100.00
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110	110.00	100.00
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110	110.00	100.00

36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110	110.00	100.00
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	15.00	42.02	630.30	75.00
				TOTAL	**637,164.90**	

Cláusula Quinta. – Liquidación Económica

Por los trabajos realizados el contratista presentó las planillas que a continuación se detalla y cuyo valor alcanza los $ 799,426.57 (*Setecientos noventa y nueve mil cuatrocientos veintiséis con 31/100 centavos).*

PLANILLAS	MONTOS
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 01	**$ 118,328.75**
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA AVANCE 01	$ 1,703.93
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 02	**$ 63,897.32**
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA AVANCE 02	$ 1,124.6
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 03	**$ 60,767.98**
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA AVANCE 03	$ 802.79
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 04	**$ 149,605.33**
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA AVANCE 04	$ 2,085.24
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 05	**$120,522.15**
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA AVANCE 05	$2,300.94
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 06	**$115,675.58**
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA AVANCE 06	$ 3,321.85
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 07	**$1,602.00**
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA AVANCE 07	$ 796.72
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA 08	**$6,765.79**
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE LIQUIDACIÓN 08	$253.98
SUBTOTAL EJECUTADO PLANILLAS DE AVANCE	$637,164.90
SUMATORIA REAJUSTES PROVISIONALES DE PLANILLAS	$12,390.05
SUMATORIA REAJUSTES DEFINITIVOS DE PLANILLAS	$407.26
PLANILLA RUBROS EXCEDENTES	**$149,464.36**
PLANILLA RUBROS NUEVOS	**$0.00**
TOTAL, PLANILLADO	**$799,426.57**

GOBIERNO DE PASTAZA
El Gobierno del Ánimo

Cláusula Sexta. - Reajuste de Precios

Se han enviado las planillas de reajuste provisionales y reajustes definitivos de las planillas 1, 2 y 3, quedando por calcularse los reajustes definitivos de las planillas 4, 5, 6, 7 y 8 que se incluirán en el acta de entrega recepción definitiva.

Cláusula Séptima. - Recepción de la Obra

Habiéndose constatado que los trabajos ejecutados se han realizado de conformidad con las normas, Especificaciones Generales y cláusulas contractuales, la comisión procede a la *Recepción Provisional* de los trabajos de Contrato *"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"* A Favor De: *CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.*

Para el cabal ejercicio de las atribuciones en el Art. 11 literal b de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el contratista NO OBSTANTE DE SUSCRIBIR el acta de entrega *Recepción Provisional*, se compromete a responder por vicios ocultos que pudieren existir y que por su naturaleza son imperceptibles, de conformidad con el Art. 108 del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, en concordancia con el Art. 114 de la Ley citada y el Art. 1964 del Código Civil.

Para constancia de lo actuado, en fe de conformidad y aceptación por parte de las personas que han intervenido en esta diligencia, se suscribe en unidad de acto la presente acta de recepción en el original y dos copias de igual tenor y efecto.

Firmado electrónicamente por: EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Edwin Gustavo Navas Manjarrez
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Firmado electrónicamente por: HECTOR VINICIO ALARCON YEPEZ

Ing. Héctor Vinicio Alarcón Y
DELEGADO

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

GOBIERNO DE PASTAZA
El Gobierno del Ánimo

PUYO, 14 de Julio de 2023

"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

ADMINISTRADOR

INFORME DE FAVORAVILIDAD DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO	ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
CÓDIGO DEL PROCESO	COTO-GADPPz-005-2022
MONTO DEL CONTRATO	USD. 789.464,39 SIN INCLUIR IVA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 de junio de 2022
PLAZO CONTRACTUAL	180 días
MONTO DEL ANTICIPO	USD. 315.785,75 SIN INCLUIR IVA
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	04 de julio de 2022
FECHA DE INICIO DE TRABAJO	01 septiembre 2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	27 febrero 2023
SUSPENSIÓN DE TRABAJO	0 días
AMPLIACIÓN DE PLAZO 01:	40 días
AMPLIACIÓN DE PLAZO 02:	10 días
AMPLIACIÓN DE PLAZO 03:	15 días
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	03 de mayo de 2023
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL	Sr. ÁNGEL MISALE LÓPEZ CHÁVEZ
GEORREFERENCIACIÓN DEL PROYECTO	PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA

1.- ANTECEDENTES.

Con fecha 20 de junio de 2022 se firma el contrato entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza y la CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA., representada legalmente por el Sr. Ángel Misael López Chávez; cuyo objeto es ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO

GOBIERNO DE
PASTAZA

(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

Mediante Resolución Administrativa N° 342-GADPPz-2022, el Ing. Jaime Guevara Blaschke, Prefecto Provincial; designa al Ing. Edwin Gustavo Navas Manjarrez como Administrador del Contrato para el ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

De acuerdo a lo determinado en la Cláusula Sexta del Contrato COTO-GADPPz-005-2022, FORMA DE PAGO: Los pagos se realizarán de la siguiente manera:

6.1 Se otorgará el 40% de anticipo Previo a la presentación de los Documentos Habilitantes y el 60% contado desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible.

6.2 Se estará a lo previsto en las Condiciones Particulares del contrato, y, además:

6.3 La contratante pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública.

6.4 Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la contratante, previa la aprobación de la fiscalización y del administrador del contrato.

6.5 Para la aprobación de las planillas previamente la fiscalización y el contratista de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del contratista ni recepción por parte de la contratante; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto. Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

6.6 Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas:

a. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del formulario de la oferta, con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

b. Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores al período al que corresponde la planilla, el contratista preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.

c. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.

d. Por cada rubro, el contratista deberá indicar el origen de los bienes y servicios que [illegible] deben cumplir con la previsión hecha en la oferta. La fiscalización deberá verificar esta

información teniendo en cuenta las facturas entregadas por el contratista y la planilla de aportes al IESS del personal de la obra

e. Con las planillas, el contratista presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

f. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la contratante y será requisito indispensable para la aprobación de la planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente.

6.7 Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La entidad contratante tiene la obligación de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del contratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la ejecución de dicho contrato.

6.8 De los pagos que deba hacer, la contratante retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

6.9 Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar a la contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

2.- RESUMEN EJECUTIVO

Descripción general de la obra:

La obra comprende 3.5 kilómetros de capa de rodadura con terminación de carpeta Asfáltica, fue contratada mediante contrato de obra No. COTO-06-88-2022 y fiscalizada con fiscalización Externa contratada mediante contrato No. CDC-114-07-2022.

El proyecto se encuentra ubicado en la Parroquia Teniente Hugo Ortiz, Cantón Pastaza, Provincia de Pastaza; en su abscisa 0+000 se encuentra en la terminación del asfalto antiguo a 1 kilómetro desde la entrada principal a la parroquia.

Objetivos del Proyecto:

El proyecto tiene como objetivo "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

Resultados Obtenidos:

El proyecto culminó a nivel de asfalto y cunetas en la abscisa 3+000 y a nivel de mejoramiento 3+080 a nivel de base clase III; con un avance presupuestario de 99.64% con respecto al monto del contrato.

Estado general de la obra:

La obra se encuentra finalizada y recibida provisionalmente por la entidad contratante

3.- HISTORIAL DE LA EJECUCIÓN

Planificación inicial

Con fecha 01 de septiembre de 2023 se inició con la ejecución contractual de la obra, autorizada mediante Orden de inicio de Obra suscrita entre el contratista, fiscalizador externo y administrador de contrato.

Se procedió con la revisión correspondiente de la documentación para la ejecución contractual y se determina que las condiciones actuales de la vía varían con la del estudio presentado en el proyecto.

Cambios al diseño definitivo – justificados

En la abscisa 0+760 hasta la abscisa 0+920 existen varias curvas horizontales y verticales que dificultan el acceso al puente existente en la abscisa 0+840, para lo cual se propone el siguiente diseño horizontal y vertical (referirse al plano GADPPz. ALLISHUNGO A0-001); dicha propuesta considera un incremento en volúmenes de los rubros de excavación, transporte de material de desalojo y mejoramiento de suelo.

Bajo las nuevas condiciones de la vía se determina que existe un incremento en cantidades de volúmenes de los rubros de excavación, transporte de material de desalojo y mejoramiento de suelo, que conforme el avance de obra se determinará con total exactitud se recomienda al GAD Provincial de Pastaza, considerar un incremento del presupuesto sobre el valor del contrato que permitirá cumplir con los objetivos institucionales y objeto de contrato.

4.- RUBROS NUEVOS

Mediante Oficio No:020-EDDYMICH-2022 de fecha 21 de diciembre de 2022 el contratista solicita la creación del rubro nuevo 001_ DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO DE ZONAS DE DEPOSITO DEL MATERIAL DESALOJADO DEL MOV. DE TIERRAS.

Mediante Oficio No:004-EDDYMICH-2023 de fecha 27 de enero de 2023 el contratista solicita la creación del rubro nuevo 002_SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO DN=875MM, DI=800MM, INEN 2059 SERIE

Mediante OFICIO N. 012-2023-FISC-EXT de fecha 09 de febrero de 2023 la fiscalización Externa solicita al Administrador de Contrato la autorización para la creación de rubros nuevos previa disponibilidad de la partida presupuestaria para los mismos.

Se realizó el trámite correspondiente para solicitar partida presupuestaria, la cual fue negada y no se pudo realizar la contratación de rubros nuevos.

5.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

Mediante Oficio No. 017-EDDYMICH-2023 de fecha 28 de marzo de 2023 el contratista informa sobre el cumplimiento del 100% del monto contractual a nivel de asfalto hasta la abscisa 3+000 y solicita partida presupuestaria para un contrato complementario

Mediante OFICIO N. 026-2023-FISC-EXT de fecha 03 de abril de 2023 la fiscalización Externa emite el informe sobre el avance físico de la obra y solicita partida presupuestaria para un contrato complementario.

Se realizó el trámite correspondiente para solicitar partida presupuestaria.

Cabe mencionar que se gestionó el trámite correspondiente por parte de la fiscalización

Externa y la Administración de Contrato para solicitar partida presupuestaria, la cual fue proyectada para realizar la carpeta asfáltica hasta la abscisa 3+500, con el fin de dar cumplimiento al objeto de contrato; la petición fue negada y no se pudo realizar la contratación de contrato complementario.

Otros eventos relevantes

Mediante Oficio No:021-EDDYMICH-2022 de fecha 29 de diciembre de 2022 el contratista solicita la aprobación de variante del proyecto en el tramo de la abscisa 2+480 - 2+666.73 por motivo de deslizamiento de la mesa de la vía existente.

Mediante OFICIO N. 008-2023-FISC-EXT de fecha 07 de febrero de 2023 la fiscalización Externa aprueba al contratista la construcción de la variante del proyecto en el tramo de la abscisa 2+480-2+666.73 por motivo de deslizamiento de la mesa de la vía existente.

Debido a percances suscitados en la vía por condiciones geológicas, se realizó una variante para evitar una zona de deslizamiento, la cual durante la realización de relleno se deslizó un tramo de 173.27 metros de longitud desde la abscisa 2+840 hasta 2+666.73 por tal motivo se optó por realizar una variante la cual generó un impacto significativo en el incremento de volúmenes de excavación y mejoramiento de suelo.

6.- RESULTADOS ALCANZADOS

Los trabajos realizados para la ejecución del proyecto ha finalizado exitosamente, alcanzando un porcentaje de ejecución del 99.64% con respecto al monto contractual; y en avance físico la abscisa 3+000 a nivel de asfalto con cunetas y señalización horizontal y vertical, cabe mencionar que se realizaron las gestiones correspondientes para un contrato complementario y lograr alcanzar un nivel de

asfalto hasta la abscisa 3+500, la cual fue negada y por lo tanto se ha cumplido con el monto programado en el contrato.

Bajo este contexto la Fiscalización Externa concluye que es procedente realizar la recepción Provisional del contrato de Obra No. COTO-06-88-2022.

7.- AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

El monto del proyecto alcanza la suma de USD $ 786,629.26 (Setecientos ochenta y seis mil seis cientos veintinueve con 26/100 DÓLARES) equivalente al 99.64%, para la construcción de **"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".**

DESCRIPCIÓN	MONTO (USD)	PORCENTAJE (%)
MONTO DEL CONTRATO:	789,464.39	100.00
PLANILLAS CONTRACTUALES:	786,629.26	99.64
MONTO DE INCREMENTOS:	149,464.36	18.93
MONTO DE DECREMENTOS:	637,164.90	80.71
CONTRATO COMPLEMENTARIO:		
COSTO+PORCENTAJE:		

8.- PLANILLAS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS

PLANILLA Nº	MONTO PLANILLADO ($)	ANTICIPO DEVENGADO ($)	MONTO LIQUIDO EN ESTA PLANILLA ($) (PLANILLADO - ANTICIPO)
PLANILLA DE AVANCE N° 1	118,328.75	47,331.50	70,997.25
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 1	1,703.93		
PLANILLA DE AVANCE N° 2	74,973.19	29,989.28	44,983.91
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 2	1,124.60		
REAJUSTE DEFINITIVO DEL ANTICIPO	3,789.43		
PLANILLA DE AVANCE N° 3	63,713.26	25,485.30	38,227.96
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 3	802.79		

PLANILLA DE AVANCE N° 4	173,770.40	69,508.16	104,262.24
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 4	2,085.24		
PLANILLA DE AVANCE N° 5	123,706.30	49,482.52	74,223.78
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 5	2,300.94		
PLANILLA DE AVANCE N° 6	178,594.24	71,437.70	107,156.54
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 6	3,321.85		
PLANILLA DE AVANCE N° 7	42,834.46	17,133.78	25,700.68
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 7	796.72		
PLANILLA N° 8 – PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	10,708.66	4,283.47	5,545.13
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA N° 8 – PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	253.98		
ANTICIPO NO DEVENGADO		1,134.05	
TOTAL:	**802,808.74**	**315,785.75**	**471,097.49**

PLANILLAS	EJECUTADO		PLANILLA AL 100%		INCREMENTOS	
	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
PLANILLA 1	$118,328.75	14.99	$118,328.75	14.99	$0,00	0,00
PLANILLA 2	$74,973.19	9.50	$63,897.32	8.09	$11,075.87	1.40
PLANILLA 3	$63,713.26	8.07	$60,767.98	7.70	$2,945.28	0.37
PLANILLA 4	$173,770.40	22.01	$149,605.33	18.95	$24,165.07	3.06
PLANILLA 5	$123,706.30	15.67	$120,522.15	15.27	$3,184.15	0.40
PLANILLA 6	$178,594.24	22.62	$115,675.58	14.65	$62,918.66	7.97
PLANILLA 7	$42,834.46	5.43	$1,602.00	0.20	$41,232.46	5.22
PLANILLA 8 – PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	$10,708.66	1.36	$6,765.79	0.86	$3,942.87	0.50
ACUMULADAS	**$786,629.26**	**99.64**	**$637,164.90**	**80.71**	**$149,464.36**	**18.93**

9.- AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

La relación se la realizó en base al objeto de contrato:

- Total, Kilómetro contratado: 3.5 Km
- Total, Kilómetro alcanzado: 3.0 Km
- % Ejecutado: 3.0/3.5= 85.71%

PROGRAMADO	**100%**
EJECUTADO	**85.71%**

Cabe mencionar que se gestionó el trámite correspondiente por parte de la fiscalización Externa y la Administración de Contrato para solicitar partida presupuestaria, la cual fue proyectada para realizar la carpeta asfáltica hasta la abscisa 3+500, con el fin de dar cumplimiento al objeto de contrato; la petición fue negada y no se pudo realizar la contratación de contrato complementario.

10.- TIEMPO UTILIZADO

245 días, desde el inicio de los trabajos 01 de septiembre de 2022 hasta el 03 de mayo de 2023, correspondiente al corte de la planilla No. 8 – Planilla de Liquidación, y que corresponde al 100% del plazo total del proyecto.

	PLAZO	**PORCENTAJE (%)**
PLAZO TOTAL	245	100
DÍAS UTILIZADOS	245	100

11.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

Para la aprobación del material pétreo de mejoramiento, se realizan los ensayos de densidad de campo según la normativa ASTM D2922.

A través de los ensayos de densidad entregada por la empresa EcuaSuelos21, efectuados en distintos puntos a lo largo de la vía se determinaron que los valores de compactación del material de mejoramiento cumplen con lo requerido por las especificaciones técnicas.

Para la aprobación del material de subbase clase 3, el contratista entrega al personal de la empresa EcuaSuelos21, una muestra para que se efectúen los respectivos ensayos granulométricos, de acuerdo con la normativa ASTM D 422. Los resultados fueron revisados, para determinar que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, determinándose que el material ocupado en obra está cumpliendo con lo necesario.

12.- CONCLUSIONES

- Con las condiciones de la vía se procedió a realizar un levantamiento topográfico en el que se determinó el incremento de volúmenes de obra para el trazado vía que garantice un diseño geométrico eficiente y funcional.
- Se ejecutó una variante para evitar una zona de deslizamiento, la cual durante la realización de relleno se deslizó un tramo de 173.27 metros de longitud desde la abscisa 2+840 hasta 2+666.73 por tal motivo se optó por realizar una variante la cual generó un impacto significativo en el incremento de volúmenes de excavación y mejoramiento de suelo.

- Se formalizó el incremento de volúmenes de Hormigón en cunetas con el fin de garantizar un buen sistema impermeable para la vía y alcanzar los 3.00 Kilómetros de cunetas en ambos lados de la vía.
- Debido a los incrementos presentados en el proyecto con el fin de garantizar la buena funcionalidad de la vía, obtuvo un alcance de 3+000 kilómetros a nivel de asfalto, cunetas y Señalización Horizontal y vertical alcanzando un avance físico del 85.71% con respecto al objeto de contratación, cabe mencionar que se solicitó un contrato complementario para alcanzar los 3+500 kilómetros de asfalto, pero la solicitud de partida presupuestaria fue negada por la entidad contratante.
- El proyecto obtuvo una ejecución presupuestaría de USD 786,629.26, con un porcentaje de 99.64% con respecto al monto contractual,
- El plazo inicial de la obra fue de 180 días contratados, pero debido a los incrementos antes mencionados y los percances suscitados en la obra por motivos de lluvia se amplió el plazo obteniendo 245 días de ejecución aprobados.

13.- RECOMENDACIONES

- Utilizar topografía actualizada para la elaboración de proyectos con el fin de garantizar un diseño con condiciones reales de la vía.
- Gestionar de manera más eficiente contratos complementarios y rubros nuevos en el caso de ser necesarios, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto de contrato y la buena funcionalidad de la obra.
- Gestionar la señalización horizontal con tachas reflectivas para garantizar una mejor señalización horizontal, debido a que no se logró ejecutar en este contrato por los percances presentados en incrementos de volúmenes.
- Con el fin de cumplir con las metas propuestas en el proyecto general, se recomienda gestionar la segunda etapa la construcción del proyecto "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", con el fin de garantizar que alcance el centro poblado de la Comunidad San Pablo de Alishungo.
- Continuar con la gestión de proyectos con el fin de ejecutar proyectos en beneficio y desarrollo vial de la provincia de Pastaza.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Gustavo Navas M.

FISCALIZADOR 1 – ADMINISTRADOR DE CONTRATO

GOBIERNO DE PASTAZA
El Gobierno del Ánimo

INFORME N°8 – ADMINISTRADOR DE CONTRATO

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

PROYECTO "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

PROCESO: COTO-GADPPZ-005-2022

Puyo, 15 de junio de 2023.

1. **ANTECEDENTES.**

- Con fecha 20 de junio de 2022 se firma el contrato entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza y la CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA., representada legalmente por el Sr. Ángel Misael López Chávez; cuyo objeto es **ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**
- Mediante Resolución Administrativa N° 342-GADPPz-2022, el Ing. Jaime Guevara Blaschke, Prefecto Provincial; designa al Ing. Edwin Gustavo Navas Manjarrez como Administrador del Contrato para el **ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**
- De acuerdo a lo determinado en la Cláusula Sexta del Contrato COTO-GADPPz-005-2022, **FORMA DE PAGO:** Los pagos se realizarán de la siguiente manera:

  - 6.1 Se otorgará el 40% de anticipo Previo a la presentación de los Documentos Habilitantes y el 60% contado desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible.
  - 6.2 Se estará a lo previsto en las Condiciones Particulares del contrato, y, además:
  - 6.3 La contratante pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública.
  - 6.4 Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la contratante, previa la aprobación de la fiscalización y del administrador del contrato.
  - 6.5 Para la aprobación de las planillas previamente la fiscalización y el contratista de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del contratista ni recepción por parte de la contratante; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto. Las cantidades de obra no

incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

- 6.6 Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas:
    - a. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del formulario de la oferta, con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.
    - b. Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores al período al que corresponde la planilla, el contratista preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.
    - c. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.
    - d. Por cada rubro, el contratista deberá indicar el origen de los bienes y servicios, los que deben cumplir con la previsión hecha en la oferta. La fiscalización deberá verificar esta información teniendo en cuenta las facturas entregadas por el contratista y la planilla de aportes al IESS del personal de la obra
    - e. Con las planillas, el contratista presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América.
    - f. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la contratante y será requisito indispensable para la aprobación de la planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente.
- 6.7 Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La entidad contratante tiene la obligación de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del contratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la ejecución de dicho contrato.
- 6.8 De los pagos que deba hacer, la contratante retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.
- 6.9 Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar a la contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a

plantear la contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

2. ALCANCE DEL INFORME.

- Emitir el informe de Administración de Contrato del proyecto cuyo objeto es el ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, respecto a la Planilla N°8 - Planilla de Liquidación de Obra, con la finalidad de continuar con los trámites respectivos de pago.
- Aprobar el informe de Fiscalización Externa respecto a la Planilla N°8 – Planilla de Liquidación de Obra.

3. OBJETIVO.

- Elaborar el informe de Administrador del Contrato verificando el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el contrato para el pago correspondiente a la Planilla N°8 – Planilla de Liquidación de Obra.

4. DESARROLLO DEL INFORME

4.1 GENERALIDADES:

Objeto del Contrato:	**ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**
Monto Contractual:	**$789,464.39 USD**
Contratista:	**CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.**
Representante Legal:	**Sr. Ángel Misael López Chávez**
Administrador de Contrato:	**Ing. Edwin Gustavo Navas Manjarrez**
Plazo Contractual:	**180 días**
Fecha firma de contrato:	**20 de junio de 2022**
Fecha de inicio:	**01 de septiembre de 2022**
Anticipo:	**40% del monto contractual**
Monto de Anticipo:	**$315,785.75 USD**
Fecha Entrega de Anticipo:	**04 de julio de 2022**
Período del Informe:	**01 de abril de 2023 al 30 de abril de 2023**

GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno de Pastaza

4.2 AVANCE ECONÓMICO

Valor del Anticipo:	**$315,785.75 USD**
Forma de pago:	**Se otorgará el 40% de anticipo Previo a la presentación de los Documentos Habilitantes y el 60% contado desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible.**
Número de Planilla de Obra:	**Planilla de Avance N°8 - Planilla de Liquidación**
Valor de Planilla de Obra (100%):	**$6,765.79 USD**
Valor Descuento Anticipo:	**$2,706.32 USD**
Porcentaje de Avance de obra (100%):	**0.86%**
Valor Planilla de Incrementos:	**$3,942.87 USD**
Porcentaje de Planilla de Incrementos:	**0.50%**
Valor Descuento Anticipo Plani. Incre.:	**$1,577.15 USD**
Valor Anticipo no devengado:	**$1,134.05 USD**
Valor Planilla Consolidada:	**$10,708.66 USD**
Valor Descuento Anticipo (total):	**$5,417.51 USD (valor descuento de anticipo planilla de obra (100%) + valor descuento anticipo Plani. Incre. + valor anticipo no devengado)**
Valor Liquido en esta Planilla:	**$5,291.15 USD (valor de planilla consolidada – valor descuento anticipo (total))**
Valor de Reajuste en esta Planilla:	**$253.98 USD (reajuste provisional)**
Valor de Reajuste del Anticipo :	**$0.00 USD (reajuste definitivo)**
Valor a pagarse:	**$5,545.13 USD (valor liquido en esta planilla + reajuste en esta planilla + valor de reajuste del anticipo)**

PARA LA FISCALIZACIÓN

Valor de Contrato de Fiscalización:	**$49,960.16 USD**
Porcentaje de Anticipo:	**40%**
Valor del Anticipo:	**$19,984.06 USD**
Valor Planilla Consolidada:	**$677.68 USD**
Valor Planilla al 100%:	**$428.16 USD**
Valor Planilla Incrementos:	**$249.52 USD**
Valor Descuento Anticipo:	**$342.83 USD**
Valor Liquido en esta Planilla:	**$334.85 USD (valor de planilla consolidada – valor descuento anticipo)**

RESUMEN PLANILLAS DE OBRA

PLANILLAS	EJECUTADO		PLANILLA AL 100%		INCREMENTOS	
	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%

PLANILLA 1	$118,328.75	14.99	$118,328.75	14.99	$0,00	0,00
PLANILLA 2	$74,973.19	9.50	$63,897.32	8.09	$11,075.87	1.40
PLANILLA 3	$63,713.26	8.07	$60,767.98	7.70	$2,945.28	0.37
PLANILLA 4	$173,770.40	22.01	$149,605.33	18.95	$24,165.07	3.06
PLANILLA 5	$123,706.30	15.67	$120,522.15	15.27	$3,184.15	0.40
PLANILLA 6	$178,594.24	22.62	$115,675.58	14.65	$62,918.66	7.97
PLANILLA 7	$42,834.46	5.43	$1,602.00	0.20	$41,232.46	5.22
PLANILLA 8 – PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	$10,708.66	1.36	$6,765.79	0.86	$3,942.87	0.50
ACUMULADAS	**$786,629.26**	**99.64**	**$637,164.90**	**80.71**	**$149,464.36**	**18.93**

RESUMEN PLANILLAS DE FISCALIZACIÓN

PLANILLAS	EJECUTADO		PLANILLA AL 100%		INCREMENTOS	
	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
PLANILLA 1	$7,488.27	14.99	$7,488.27	14.99	$0,00	0,00
PLANILLA 2	$4,744.57	9.50	$4,043.65	8.09	$700.92	1.40
PLANILLA 3	$4,032.01	8.07	$3,845.62	7.70	$186.39	0.37
PLANILLA 4	$10,996.82	22.01	$9,467.57	18.95	$1,529.25	3.06
PLANILLA 5	$7,828.58	15.67	$7,627.08	15.27	$201.50	0.40
PLANILLA 6	$11,302.09	22.62	$7,320.37	14.65	$3,981.72	7.97
PLANILLA 7	$2,710.72	5.43	$101.38	0.20	$2,609.34	5.22
PLANILLA 8 – PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	$677.68	1.36	$428.16	0.86	$249.52	0.50
ACUMULADAS	**$49,780.74**	**99.64**	**$40,322.10**	**80.71**	**$9,548.64**	**18.93**

4.3 TIEMPO UTILIZADO DESDE LA FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO.

Hasta la aprobación de la planilla de Avance Nro. 8 – Planilla de Liquidación, se han utilizado 242 días del plazo contractual de 180 días (plazo inicial), existen tres ampliaciones de plazo solicitadas y debidamente legalizadas con un total de días ampliados de 65; el plazo total para la ejecución y terminación de la obra es de 245 días (180 días de plazo inicial + 65 días en ampliaciones de plazo (1+2+3)).

Las ampliaciones de plazo son según el siguiente detalle:

AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº	DÍAS APROBADOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Nº 1	40	08 de abril de 2023
Nº 2	10	18 de abril de 2023

Nº 3	15	03 de mayo de 2023
TOTAL DE DÍAS	**65**	

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 03 de mayo 2023

PLANILLA	MES	Nro. DE DÍAS
1	Septiembre 2022	30
2	Octubre 2022	31
3	Noviembre 2022	30
4	Diciembre 2022	31
5	Enero 2023	31
6	Febrero 2023	28
7	Marzo 2023	31
8 - LIQUIDACIÓN	Abril 2023	30
	TOTAL	**242**

4.4 PRODUCTOS ESPERADOS.

- Informe inicial: Contiene plan de trabajo, metodología para la realización de actividades, informes mensuales y finales, cronograma de ejecución.
  SI PRESENTA
- Informe de aprobación de Planilla N°8 – Planilla de Liquidación de Obra.
  SI PRESENTA
- Informe Mensual de Actividades realizadas dentro del período.
  SI PRESENTA

4.5 PERSONAL TÉCNICO DE LA CONSTRUCTORA

PERSONAL OFERTADO	CANT.	PERSONAL PRESENTE EN OBRA	CHECK LIST
Superintendente de Obra	1	√	Cumple
Residente de Obra	1	√	Cumple
Técnico Hidráulico	1	√	Cumple
Técnico Ambiental	1	√	Cumple
Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional	1	√	Cumple
Topógrafo	1	√	Cumple

NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DE CÈDULA	TÌTULO	CARGO	TIEMPO DE PARTICIPACIÓN
Leonardo Joselito Barrionuevo Díaz	1801851906	Ingeniero Civil	Superintendente de Obra	100%

Cristian Rodolfo Huachi Cuji	1600406605	Ingeniero Civil	Residente de Obra	100%
Alex Gary Díaz Villarruel	1600655862	Ingeniero Ambiental	Técnico Ambiental	50%
José Miguel Guaman Iler	0502497795	Ingeniero Industrial	Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional	50%
Juan Samuel Lozada Proaño	1600377418	Ingeniero Civil	Topógrafo	100%

4.6 PRINCIPALES RUBROS EJECUTADOS EN EL PERÍODO.

- Reuniones de trabajo en oficina y en campo conjuntamente con el Administrador del Contrato y Fiscalización para revisión de documentación proporcionada por la institución contratante, definición de parámetros a cumplir y recomendaciones necesarias para la ejecución de los trabajos.
- Revisión, análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo, personal técnico dispuesto en obra en función de los trabajos que se ejecutan.
- Cumplimiento de especificaciones técnicas y seguimiento del cronograma valorado de trabajos.
- Cumplimiento del plan de manejo ambiental y de seguridad industrial.
- Verificación de cumplimiento de las leyes laborales.
- Conformación de Marcas en pavimento.
- Colocación de señales ecológicas, informativas y preventivas.
- Revisión y medición de cantidades de obra ejecutadas para el trámite de planilla correspondiente al mes de ABRIL de 2023.

4.7 AREAS INTERVENIDAS.

- Vía principal.

4.8 LIQUIDACIÓN DE MULTAS.

No presenta multas en este período.

4.9 OBSERVACIONES.

- La Planilla N°8 – Planilla de Liquidación de Obra no presenta observaciones.

GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno del Agua

5. CONCLUSIONES.

- Revisada la documentación del referido informe y al cumplir con los requerimientos estipulados en el contrato respectivo, se procede a Aprobar el Informe de Fiscalización N°20 y la Planilla N°8 – Planilla de Liquidación con su respectivo reajuste provisional, toda vez que han sido validados por el Fiscalizador Externo responsable.

6. RECOMENDACIONES.

- Se recomienda continuar con el respectivo trámite de pago.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

.....

Ing. Edwin Gustavo Navas Manjarrez
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

GOBIERNO DE
PASTAZA

CONSTRUCCION DE: ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA

PLANILLA Nº 8 – PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

Período de Ejecución: 01/04/2023 al 30/04/2023

A) ANTECEDENTES:

Con fecha 20 del mes de junio del 2022, el GAD Provincial de Pastaza suscribe con la CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA., el contrato para la ejecución de la obra: **"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".**

Mediante Contrato por COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-005-2022, según CLÁUSULA PRIMERA, se designa al Ing. Edwin Gustavo Navas Manjarrez como Administrador del Contrato de Obra: **"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**.

B) DATOS GENERALES:

Código del proceso de contratación:	COTO-GADPPz-005-2022
Objeto del contrato:	ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
Monto del contrato:	$ 789,464.39 USD sin incluir IVA
Fecha de suscripción:	20 de junio de 2022
Porcentaje de anticipo:	40%
Monto del anticipo:	$ 315,785.75 USD
Fecha de inicio de plazo:	01 de septiembre de 2022
Fecha de terminación contractual:	27 de febrero de 2023
Contratista:	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
Administrador de Contrato:	Ing. Edwin Gustavo Navas Manjarrez

C) PLAZOS Y AVANCE

C.1 PLAZO DEL CONTRATO

Plazo total inicial: 180 días.

GOBIERNO DE
PASTAZA

C.2 AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA DE LA PLANILLA

Fecha de aprobación Nº 1:	25 de febrero 2023
Días de ampliación aprobados:	40 días
Motivación:	Incidencia de lluvia (11 días), incrementos de cantidades de obra (29 días).
Fecha de aprobación Nº 2:	06 de abril 2023
Días de ampliación aprobados:	10 días
Motivación:	Incidencia de lluvia (10 días)
Fecha de aprobación Nº 3:	17 de abril 2023
Días de ampliación aprobados:	15 días
Motivación:	Incidencia de lluvia (15 días)
TOTAL DE DÍAS	**65 DÍAS**

DOCUMENTACIÓN IMPORTANTE PARA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO:

AMPLIACIÓN Nº 1 (40 días)

FISCALIZADOR: OFICIO N. 016-2023-FISC-EXT, de fecha 24 de febrero de 2023.

ADMINISTRADOR DE CONTRATO: Memorando Nro. GAPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-6407-M, de fecha 25 de febrero de 2023.

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 08 DE ABRIL DE 2023.

AMPLIACIÓN Nº 2 (10 días) — falta

FISCALIZADOR: OFICIO N. 027-2023-FISC-EXT, de fecha 03 de abril de 2023

ADMINISTRADOR DE CONTRATO: Memorando Nro. GAPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-6740-M, de fecha 06 de abril de 2023.

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 18 DE ABRIL DE 2023.

AMPLIACIÓN Nº 3 (15 días) -> falta.

FISCALIZADOR: OFICIO N. 033-2023-FISC-EXT, de fecha 17 de abril de 2023.

ADMINISTRADOR DE CONTRATO: Memorando Nro. GAPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-6788-M, de fecha 17 de abril de 2023.

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 03 DE MAYO DE 2023.

GOBIERNO DE
PASTAZA

C.3 PARALIZACIONES EN EL MES A PLANILLAR

Fecha de suspensión:	
Fecha de reinicio:	

C.4 REPROGRAMACIONES

No.	Fecha	Motivación
1	01 de septiembre de 2022	Reprogramado a la fecha de inicio.
2	25 de febrero de 2023	Ampliación de Plazo Nº 1
3	06 de abril de 2023	Ampliación de Plazo Nº 2 No hay
4	17 de abril de 2023	Ampliación de Plazo Nº 3

C.5 CONTRATO

No.	Fecha de suscripción	Código de contrato	Monto	Motivación
1	20 DE JUNIO DE 2022	COTIZACION DE OBRA-GADPPz-005-2022	$ 789,464.39 USD sin incluir IVA	

D) DESARROLLO DEL PLANILLAJE DE CONTRATO

PLANILLA Nº	MONTO PLANILLADO ($)	ANTICIPO DEVENGADO ($)	MONTO LIQUIDO EN ESTA PLANILLA ($) (PLANILLADO - ANTICIPO)
PLANILLA DE AVANCE N° 1	118,328.75	47,331.50	70,997.25
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 1	1,703.93		
PLANILLA DE AVANCE N° 2	74,973.19	29,989.28	44,983.91
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 2	1,124.60		
REAJUSTE DEFINITIVO DEL ANTICIPO	3,789.43		
PLANILLA DE AVANCE N° 3	63,713.26	25,485.30	38,227.96

REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 3	802.79		
PLANILLA DE AVANCE N° 4	173,770.40	69,508.16	104,262.24
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 4	2,085.24		
PLANILLA DE AVANCE N° 5	123,706.30	49,482.52	74,223.78
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 5	2,300.94		
PLANILLA DE AVANCE N° 6	178,594.24	71,437.70	107,156.54
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 6	3,321.85		
PLANILLA DE AVANCE N° 7	42,834.46	17,133.78	25,700.68
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 7	796.72		
PLANILLA N° 8 – PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	10,708.66	4,283.47	5,545.13
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA N° 8 – PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	253.98		
ANTICIPO NO DEVENGADO		1,134.05	
TOTAL:	**802,808.74**	**315.785.75**	**471.097.49**

MONTO DE AVANCE ECONÓMICO TOTAL ($)	**802,808.74**
TOTAL ANTICIPO DEVENGADO	**315,785.75**
% DE AVANCE TOTAL	99.64
MULTA	
VALOR LIQUIDO A PAGAR EN ESTA PLANILLA	**5,545.13**

Nota: De acuerdo al trámite de aprobación de pago, según el OFICIO N. 049-2023-FISC-EXT, de fecha 12 de julio de 2023, se detalla la Planilla Nº 8 – Planilla de Liquidación, Reajuste Provisional de la Planilla Nº 8 – Planilla de Liquidación y Descuento de anticipo no devengado.

E) ANÁLISIS DEL PERÍODO DE PLANILLAJE

E.1 ANÁLISIS DE PLANILLAJE

ÍTEM	PARÁMETRO DE CUMPLIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
A	Avance de obra de acuerdo al cronograma	X		
B	Retardo parcial en el período de la planilla		X	
C	Disposiciones del Administrador	X		
D	Disposiciones del Fiscalizador	X		
E	Cumplimiento de especificaciones técnicas	X		
F	Utilización de maquinaria ofertada	X		
G	Asistencia a las reuniones	X		

H	Asistencia del personal ofertado	X		
I	Obstaculización de trabajos a otros contratistas o al contratante		X	
J	Demora en la presentación de planillas a Fiscalización		X	
K	Normativa de Seguridad Industrial y Seguro Ocupacional	X		
L	Normativa de Manejo Ambiental	X		

E.2 ANÁLISIS DE MULTAS

ÍTEM	DETALLE DEL OBJETO DE SANCIÓN	MONTO BASE PARA CÁLCULO	%	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	No. DE DÍAS	VALOR DE LA MULTA
A							
B							
C							
D							
TOTAL DE MULTAS EN ESTE PERIODO DE PLANILLAJE:							

F) CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN

GARANTÍA BUEN USO DE ANTICIPO – FIEL CUMPLIMIENTO	VIGENTE
SEGURO SOCIAL	SI CUMPLE

En virtud del presente informe y en calidad de Administrador de Obra, **SE APRUEBA Y SE SOLICITA** se proceda con el pago de la Planilla Nº 8 – Planilla de Liquidación y Reajuste Provisional de la Planilla Nº 8 – Planilla de Liquidación, con el siguiente detalle.

PORCENTAJE DE AVANCE PARCIAL EN ESTE PERIODO (%)	1.36
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO (%)	99.64
VALOR TOTAL PLANILLA N° 8 – PLANILLA DE LIQUIDACION ($)	10,708.66
DEVENGACION DEL ANTICIPO EN ESTE PERIODO ($) (40%)	-4,283.46
REAJUSTE DEFINITIVO DEL ANTICIPO ($)	
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA N° 8 – PLANILLA DE LIQUIDACION ($)	253.98
VALOR TOTAL PLANILLA DE LIQUIDACION ($)	
VALOR DE ANTICIPO NO DEVENGADO ($)	-1,134.05
VALOR TOTAL REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION ($)	
VALOR TOTAL PLANILLA DE AVANCE N° 1 EXCEDENTES ($)	
VALOR TOTAL REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 1 EXCEDENTES ($)	
VALOR TOTAL DE LA PLANILLA ORDEN DE TRABAJO ($)	
VALOR TOTAL REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA ORDEN DE TRABAJO ($)	
DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTAS PARA ESTA PLANILLA ($)	
VALOR LIQUIDO A PAGAR ($)	**5,545.13**

SON: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES, 13/100 CENTAVOS, SIN IVA.

TODAS LAS RETENCIONES TRIBUTARIAS SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL GADPPz.

GOBIERNO DE
PASTAZA

Atentamente,

EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

.....

Ing. Gustavo Navas M.

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

OGI Omar H. Guamán I.
Ingeniero Civil

OFICIO N. 049-2023-FISC-EXT
Pastaza, 12 de julio de 2023

Señor
Ing. Gustavo Navas
Administrador de Contrato

ASUNTO: ALCANCE A LA SOLICITUD DE PAGO DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.8 DE LIQUIDACIÓN APROBADA POR FISCALIZACION EXTERNA CORRESPONDIENTRE AL PERIODO 01 DE ABRIL 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023.

En atención No:28-EDDYMICH-2023 de fecha 19 de mayo de 2023 donde el contratista emite la planilla de avance de obra No.8 de liquidación con correcciones subsanadas para su respectivo trámite de pago de la obra denominada "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.", hace la entrega de un original y 4 copias de planilla de avance de obra No. 08 de liquidación y su reajuste de precios, respaldada con toda la documentación habilitante para el trámite de pago pertinente, Fiscalización recepta la documentación y de no presentarse más novedades la Fiscalización Externa **APRUEBA** la planilla de avance de obra No. 08 de liquidación; por tal motivo se adjunta informe de fiscalización No.20 para que se continúe con el trámite de pago correspondiente.

Los valores de la planilla 8 son:

PLANILLA AVANCE N.° 08	**PERIODO:** 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 **FECHA:** 15 DE JUNIO DE 2023
VALOR PLANILLA 100% LIQUIDACIÓN DE OBRA:	**6,765.79 USD**
PORCENTAJE PROPORCIONAL ANTICIPO DESCONTADO 40%:	2,706.32USD
VALOR PLANILLA LIQUIDACIÓN DE INCREMENTOS OBRA:	**3,942.87 USD**
PORCENTAJE PROPORCIONAL ANTICIPO DESCONTADO 40%:	1,577.15 USD
VALOR ANTICIPO NO DEVENGADO:	1.134,05 USD
VALOR PLANILLA LIQUIDACIÓN DE OBRA:	**10,708.66 USD**
TOTAL, DESCUENTOS:	5.417,51 USD
VALOR LIQUIDO A PAGARSE:	**5.291,15 USD**
VALOR A RECIBIR EN ESTE PERIODO	
VALOR LIQUIDO PLANILLA AVANCE N°08 (LIQUIDACIÓN):	5.291,15 USD
REAJUSTE DE PLANILLA AVANCE N°08 (LIQUIDACIÓN):	253.98 USD

@IngenieroCivilOGI
ohgi@hotmail.es
ohgiomar@gmail.com
0987571582 / 0979894628
Calle Bolívar 1-38 y Av. Marco Aurelio Subia
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

REAJUSTE ANTICIPO:	0 USD
TOTAL:	**5.545,13 USD**
SON: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 13/100 DÓLARES.	

EL VALOR TOTAL A PAGARSE ES: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 13/100 DÓLARES AMERICANOS, MAS IVA.

Nota: La unidad correspondiente deberá realizar los descuentos de Ley

Particular que comunico y solicito se de los tramites subsiguientes para el pago de la planilla de avance Nro.8 de liquidación.

ATENTAMENTE,

Firmado electrónicamente por:
OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO

@IngenieroCivilOGI
ohgi@hotmail.es
ohgiomar@gmail.com
0987571382 / 0979894628
Calle Bolívar 1-38 y Av. Marco Aurelio Subía
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

OGI Omar H. Guamán I.
Ingeniero Civil

OFICIO N. 047-2023-FISC-EXT
Pastaza, 15 de junio de 2023

Señor
Ing. Gustavo Navas
Administrador de Contrato

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.8 DE LIQUIDACIÓN APROBADA POR FISCALIZACION EXTERNA CORRESPONDIENTRE AL PERIODO 01 DE ABRIL 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023.

En atención No:28-EDDYMICH-2023 de fecha 19 de mayo de 2023 donde el contratista emite la planilla de avance de obra No.8 de liquidación con correcciones subsanadas para su respectivo trámite de pago de la obra denominada "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.", hace la entrega de un original y 4 copias de planilla de avance de obra No. 08 de liquidación y su reajuste de precios, respaldada con toda la documentación habilitante para el trámite de pago pertinente, Fiscalización recepta la documentación y de no presentarse más novedades la Fiscalización Externa **APRUEBA** la planilla de avance de obra No. 08 de liquidación; por tal motivo se adjunta informe de fiscalización No.20 para que se continúe con el trámite de pago correspondiente.

Los valores de la planilla 8 son:

PLANILLA AVANCE N.º 08	**PERIODO:** 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 **FECHA:** 15 DE JUNIO DE 2023
VALOR PLANILLA 100% LIQUIDACIÓN DE OBRA:	**6,765.79 USD**
PORCENTAJE PROPORCIONAL ANTICIPO DESCONTADO 40%:	2,706.32USD
VALOR PLANILLA LIQUIDACIÓN DE INCREMENTOS OBRA:	**3,942.87 USD**
PORCENTAJE PROPORCIONAL ANTICIPO DESCONTADO 40%:	1,577.15 USD
VALOR PLANILLA LIQUIDACIÓN DE OBRA:	**10,708.66 USD**
TOTAL, DESCUENTOS:	4,283.47 USD
VALOR LIQUIDO A PAGARSE:	**6,425.19 USD**
VALOR A RECIBIR EN ESTE PERIODO	
VALOR LIQUIDO PLANILLA AVANCE Nº08 (LIQUIDACIÓN):	6,425.19 USD
REAJUSTE DE PLANILLA AVANCE Nº08 (LIQUIDACIÓN):	253.98 USD
REAJUSTE ANTICIPO:	0 USD

@IngenieroCivilOGI
ohgi@hotmail.es
ohgiomar@gmail.com
0987571382 / 0979894628
Calle Bolívar 1-38 y Av. Marco Aurelio Subía
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

TOTAL:	6,679.17 USD

EL VALOR TOTAL A PAGARSE ES: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 17/100 DOLARES AMERICANOS, MAS IVA.

Nota: La unidad correspondiente deberá realizar los descuentos de Ley

Particular que comunico y solicito se de los tramites subsiguientes para el pago de la planilla de avance Nro.8 de liquidación.

ATENTAMENTE,

Firmado electrónicamente por:
OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO

@IngenieroCivilOGI
ohgi@hotmail.es
ohgiomar@gmail.com
0987571382 / 0979894628
Calle Bolívar 1-38 y Av. Marco Aurelio Subia
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

013-30
-2-

TIMBRE 0.50 GAD PROVINCIAL DE PASTAZA CINCUENTA CENTAVOS

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

Puyo, 3 de mayo de 2023

Oficio No. 025-EDDYMICH-2023

GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA
Recibido:
Fecha: 03 MAY 2023
Hora: 16:07
Número: 17220-E

Ing.
Jaime Guevara Blaschke
PREFECTO DEL GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

ASUNTO: SOLICITUD DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

Presente.-

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus funciones cotidianas.

Con fundamento en la CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA del contrato **COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-005-2022** cuyo objeto es "***ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA*** ",pongo en su conocimiento que la obra antes mencionada ha sido culminada en su totalidad, por tal razón solicito autorice a quien corresponda se procesa con la **RECEPCIÓN PROVISIONAL** de la obra.

Por la atención que se sirva dar a la presente, quedo ante Usted agradecido

Atentamente,

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: Ángel Misael López Chávez
CONTRATISTA

Mail: edypollito@hotmail.es
Puyo-Pastaza-Ecuador
Tel.03-2884546 Cel. 0984787283
Direc.: Obrero, Calle Ambato S/N y Machala

Para Ver si, ya se puede realizar la recepción provisional y definitiva 2023-05-03

CONSTRUCTORA

EDDYMICH CIA. LTDA.

Puyo, 19 de mayo de 2023

Oficio No. 028-EDDYMICH-2023

INGENIERO
Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO - *"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"*

ASUNTO: ENTREGA DE CORRECCIONES DE PLANILLA 08 – LIQUIDACIÓN DE OBRA

Presente.-

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus funciones cotidianas.

En respuesta a su Oficio N. 044-2023-FISC-EXT de fecha 10 de mayo de 2023, procedo a realizar la entrega de la documentación solicitada con las correcciones pertinentes de la **PLANILLA 08-LIQUIDACIÓN,** correspondiente al periodo de abril de 2023 para su respectiva revisión y aprobación.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: Ángel Misael López Chávez
CONTRATISTA

Recibido:
19/05/2023
Omar Guamán

ANEXO:

- ANEXO DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA 08-LIQUIDACIÓN.

Mail: edypollito@hotmail.es
Puyo-Pastaza-Ecuador
Tel.03-2884546
Cel. 0984787283
Direc.: Obrero, Calle Ambato S/N y Machala

OGI Omar H. Guamán I.
Ingeniero Civil

OFICIO N. 044-2023-FISC-EXT
Pastaza, 10 de mayo de 2023

Señor
Angel Misael Lopez Chavez
Representante legal - CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA.LTDA
CONTRATISTA

ASUNTO: SOLICITUD DE CORRECCIONES EN LA PLANILLA DE AVANCE Nro.8 - LIQUIDACIÓN

Presente.-

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus funciones cotidianas.

En atención al Oficio No. 024-EDDYMICH-2023 de fecha 03 de mayo de 2023, donde la CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. Contratista emite la planilla de avance Nro. 8 - LIQUIDACIÓN de la obra **"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA" y la FISCALIZACION ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500) PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**; me permito informar que la Planilla de avance Nro. 8 - LIQUIDACIÓN presenta observaciones, para lo cual solicito se realice la corrección a las siguientes observaciones:

- Adjunte Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales
- Adjunte Certificado de pago de IESS del personal operativo y/ó Facturas del personal técnico
- Adjunte Copia de la Póliza Vigente

Es todo con respecto a la planilla de Avance Nro. 8 - LIQUIDACIÓN, por tal motivo solicito se realice las correcciones de manera oportuna con el fin de dar continuidad con los trámites pertinentes.

Particular se informa para fines pertinentes.

ATENTAMENTE,

Firmado electrónicamente por:
OMAR HENRY GUAMAN ILER

Recibido:
10/05/2023
Residente de Obra
1600406605

Ing. Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO

Documentos Adjuntos:

- *Planilla de Avance No.8 – LIQUIDACIÓN*

@IngenieroCivilOGI
ohgi@hotmail.es
ohgiomar@gmail.com
0987571382 / 0979894628
Calle Bolívar 1-38 y Av. Marco Aurelio Subía
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

CONSTRUCTORA

EDDYMICH CIA. LTDA.

Puyo, 3 de mayo de 2023

Oficio No. 024-EDDYMICH-2023

INGENIERO
Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO - *"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"*

ASUNTO: ENTREGA DE PLANILLA 08 – LIQUIDACIÓN DE OBRA

Presente.-

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus funciones cotidianas.

Procedo a realizar la entrega de la documentación correspondiente a la **PLANILLA 08-LIQUIDACIÓN,** correspondiente al periodo de abril de 2023 para su respectiva revisión y aprobación.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: Ángel Misael López Chávez
CONTRATISTA

Recibido:
Omar Guamán
3/05/2023

ANEXO:

- ANEXO DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA 08-LIQUIDACIÓN.

Mail: edypollito@hotmail.es Tel.03-2884546 Cel. 0984787283
Puyo-Pastaza-Ecuador Direc.: Obrero, Calle Ambato S/N y Machala


PLANILLA 08 - LIQUIDACIÓN DE OBRA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

ANEXO:

CD – ARCHIVO MAGNÉTICO

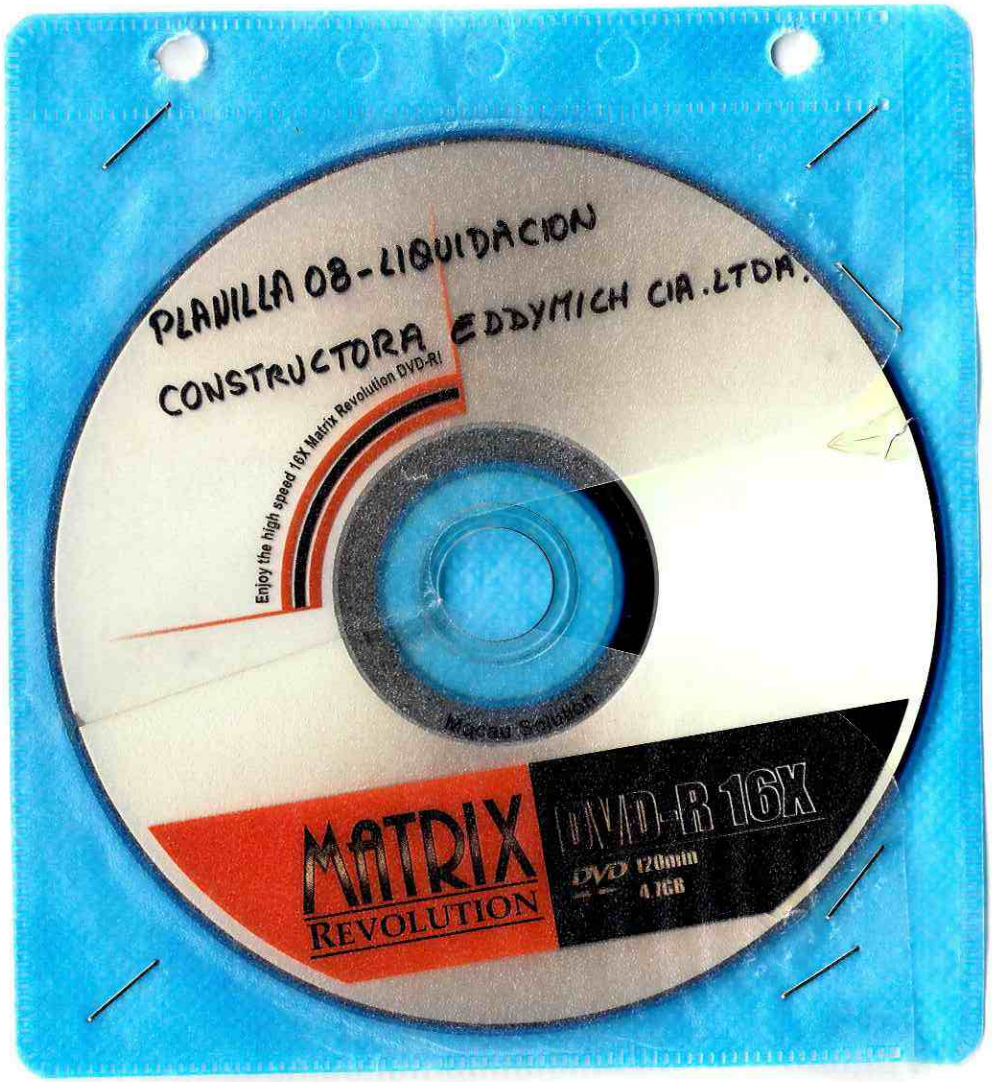
PLANILLA 08-LIQUIDACION
CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA.LTDA.
Enjoy the high speed 16X Matrix Revolution DVD-R!
MATRIX
REVOLUTION
DVD-R 16X
DVD 120min
4.7GB

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

INFORME DE FISCALIZACIÓN N.20

APROBACION DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.8 – LIQUIDACIÓN DE OBRA

PROYECTO: ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA Representante legal Sr. Ángel Misael López C.

MONTO DEL CONTRATO: 789.464,39 sin IVA

PERIODO DE PLANILLAJE: 01 de abril de 2023 al 30 de abril de 2023

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de junio de 2023

@IngenieroCivilOGI
ohgi@hotmail.es
ohgiomar@gmail.com
0987571382 / 0979894628
Calle Bolívar 1-38 y Av. Marco Aurelio Subía
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

Índice

1.- ANTECEDENTES 3
2.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 3
3.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN 4
4.- PERIODO DEL INFORME 5
5.- PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE PERÍODO 5
6.- AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO 5
7.- PLANILLAS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS 8
8.- AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 10
9.- TIEMPO UTILIZADO DESDE LA FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO 12
10.- RESUMEN FINANCIERO Y DE AVANCE A LA FECHA DEL PROYECTO: 12
11.- ACCIONES EFECTUADAS POR FISCALIZACIÓN: 12
11.1. - VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL: 13
11.2. - VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA: 15
11.3. – INCIDENCIAS PRODUCIDAS EN LA OBRA: 16
11.4. - CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES 16
11.5. – VERIFICACIONES REALIZADAS 16
11.6. – VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES 18
11.7. – CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA ZONA DEL PROYECTO 18
12.- DOCUMENTACION CURSADA 19
12.1. – OFICIOS 19
CONTRATOS 21
13.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 22
14.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS 23
15.- CONCLUSIONES 23
16.- RECOMENDACIONES 25
17.- RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME 26

INFORME DE FISCALIZACIÓN PARA TRÁMITE DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA No. 08 - LIQUIDACIÓN DE OBRA

PLANILLA No. 8	
FECHA PRESENTACION:	03 de mayo de 2023
PERIODO PLANILLADO:	01 de abril al 30 de abril de 2023
FECHA ENTREGA DE PLANILLA AL GADPPz:	15 de junio de 2023

1.- ANTECEDENTES

- Con fecha 20 de junio de 2022 se suscribió el contrato cuyo objeto de contratación es el: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", los trabajos se ejecutarán en la vía a Allishungo, Parroquia Teniente Hugo Ortiz, Cantón y Provincia de Pastaza, con sujeción a diseños, especificaciones y más documentos contractuales, por un monto de U.S.D. $789.464,39 con un plazo de 180 días.

- Con fecha 31 de agosto de 2022 se suscribió el Acta de inicio de obra por una parte Ing. Gustavo Navas, en calidad de Administrador de Contrato, el Ing. Omar Henry Guaman Iler, en calidad de Fiscalizador, los mismos en representación del GADPPz y por otra parte la constructora CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA.LTDA en calidad de contratista ejecutor, con la finalidad de suscribir la presente Acta de inicio de obra e inicio de plazo contractual.

- Mediante Oficio GNM - GADPPZz - 2022 de fecha 31 de agosto del 2022 el Ing. Gustavo Navas en calidad de Administrador de Contrato realiza la Notificación de orden de inicio de contrato de obra y de fiscalización externa.

- Con fecha 25 de febrero de 2023 se aprueba mediante orden No. 1 la ampliación de plazo No.1 con 40 días adicionales al plazo contractual, con su fecha de terminación 08 de abril de 2023.

- Con fecha 06 de abril de 2023 se aprueba mediante orden No. 2 la ampliación de plazo No.2 con 10 días adicionales al plazo contractual, con su fecha de terminación 18 de abril de 2023.

- Con fecha 17 de abril de 2023 se aprueba mediante orden No. 3 la ampliación de plazo No.3 con 15 días adicionales al plazo contractual, con su fecha de terminación 03 de mayo de 2023.

2.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO:	ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

CÓDIGO DEL PROCESO:	COTO-GADPPz-005-2022
MONTO DEL CONTRATO:	USD. 789.464,39
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20 DE JUNIO DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL:	180 DÍAS
MONTO DEL ANTICIPO:	USD. 315.785,75
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:	04 DE JULIO DE 2022
FECHA DE INICIO DE TRABAJO:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	27 DE FEBRERO DE 2023
SUSPENSIÓN DE TRABAJO:	NINGUNA
AMPLIACIÓN DE PLAZO 01:	40 DÍAS
AMPLIACIÓN DE PLAZO 02:	10 DÍAS
AMPLIACIÓN DE PLAZO 03:	15 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL MAS AMPLIACIÓN 03:	03 DE MAYO DE 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA
GEORREFERENCIACIÓN DEL PROYECTO:	PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA

3.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN

OBJETO DEL CONTRATO:	FISCALIZACIÓN ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
CÓDIGO DEL PROCESO:	CDC-GADPPz-012-2022
MONTO DEL CONTRATO:	49.960,16 USD
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27 DE JULIO DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL:	180 DÍAS
MONTO DEL ANTICIPO:	19.984,06 USD
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:	18 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE INICIO DE TRABAJO:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	27 DE FEBRERO DE 2023
SUSPENSIÓN DE TRABAJO:	NINGUNA
AMPLIACIÓN DE PLAZO 01, 02 Y 03:	65 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	03 DE MAYO DE 2023

CONTRACTUAL MAS AMPLIACIÓN 01, 02 Y 03:	
CONTRATISTA:	ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
ADMINISTRADOR DE CONTRATO OBRA	ING. EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

4.- PERIODO DEL INFORME

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023.

5.- PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE PERÍODO

El seguimiento por parte de Fiscalización de los trabajos ejecutados por el contratista durante el mes de ABRIL de 2023:

- Reuniones de trabajo en oficina y en campo con representantes de la constructora EDDYMICH CIA LTDA., Administrador del Contrato y Fiscalización para revisión de documentación, definición de parámetros a cumplir y recomendaciones necesarias para desarrollar de la manera más adecuada los rubros de obra programados.
- Desarrollo de trabajos con hormigón para cunetas (f'c = 180 kg/cm2) con el objetivo de captar, conducir, y evacuar en forma adecuada los flujos de agua superficial en el proyecto.
- Desarrollo de actividades concernientes a la conformación de marcas en la estructura de pavimento de la vía.
- Control del cumplimiento del plan de manejo ambiental y de seguridad industrial.
- Colocación de señalética reglamentaria de (0.75 x 0.75) m2 en la vía.

6.- AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

El monto total del proyecto alcanza la suma de USD. 789.464,39 (setecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 39/100 DÓLARES) para la construcción de: ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

MONTO TOTAL DEL PROYECTO:	USD $ 789.464,39	100,00 %
VALOR ANTICIPO ENTREGADO:	USD $ 315.785,75	40,00 %

PLANILLA AVANCE N.° 08	**PERIODO:** 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023
	FECHA: 15 DE JUNIO DE 2023

VALOR PLANILLA 100% LIQUIDACIÓN DE OBRA:	**6,765.79 USD**
PORCENTAJE PROPORCIONAL ANTICIPO DESCONTADO 40%:	2,706.32USD
VALOR PLANILLA LIQUIDACIÓN DE INCREMENTOS OBRA:	**3,942.87 USD**
PORCENTAJE PROPORCIONAL ANTICIPO DESCONTADO 40%:	1,577.15 USD
VALOR ANTICIPO NO DEVENGADO:	1.134,05 USD
VALOR PLANILLA LIQUIDACIÓN DE OBRA:	**10,708.66 USD**
TOTAL, DESCUENTOS:	5.417,51 USD
VALOR LIQUIDO A PAGARSE:	**5.291,15 USD**
VALOR A RECIBIR EN ESTE PERIODO	
VALOR LIQUIDO PLANILLA AVANCE N°08 (LIQUIDACIÓN):	5.291,15 USD
REAJUSTE DE PLANILLA AVANCE N°08 (LIQUIDACIÓN):	253.98 USD
REAJUSTE ANTICIPO:	0 USD
TOTAL:	**5.545,13 USD**
SON: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 13/100 DÓLARES.	

MONTOS PROPUESTOS Y EJECUTADOS:

PLANILLAS	MES	MONTO (USD)			
		PROGRAMADO		EJECUTADO	
		PROPUESTO	ACUMULADO	EJECUTADO	ACUMULADO
AVANCE 1	SEPT 2022	118,328.75	**118,328.75**	118,328.75	**118,328.75**
INCREMENTOS	SEPT 2022				
DECREMENTOS	SEPT 2022				
RUBROS NUEVOS	SEPT 2022				
AVANCE 2	OCT 2022	74,973.19	**193,301.94**	74,973.19	**193,301.94**
INCREMENTOS	OCT 2022			*11,075.87*	***11,075.87***
DECREMENTOS	OCT 2022				
RUBROS NUEVOS	OCT 2022				
AVANCE 3	NOV 2022	63,713.26	**257,015.20**	63,713.26	**257,015.20**
INCREMENTOS	NOV 2022			*2,945.28*	***14,021.15***

DECREMENTOS	NOV 2022				
RUBROS NUEVOS	NOV 2022				
AVANCE 4	DIC 2022	173,770.40	**430,785.60**	173,770.40	**430,785.60**
INCREMENTOS	DIC 2022			*24,165.07*	***38,186.22***
DECREMENTOS	DIC 2022				
RUBROS NUEVOS	DIC 2022				
AVANCE 5	ENE 2023	123,706.30	**554,491.90**	123,706.30	**554,491.90**
INCREMENTOS	ENE 2023		120	*3,184.15*	***41,370.37***
DECREMENTOS	ENE 2023				
RUBROS NUEVOS	ENE 2023				
AVANCE 6	FEB 2023	178,594.24	**604,106.26**	*178,594.24*	***733,086.14***
INCREMENTOS	FEB 2023			*62,918.66*	
DECREMENTOS	FEB 2023				
RUBROS NUEVOS	FEB 2023				
AVANCE 7	MAR 2023	42,834.46	**775,920.60**	*1,602.00*	***775,920.6***
INCREMENTOS	MAR 2023			*41,232.46*	
DECREMENTOS	MAR 2023				
RUBROS NUEVOS	MAR 2023				
AVANCE 8	ABR 2023	13,543.79	**789,464.39**	*6,765.79*	***786,629.26***
INCREMENTOS	ABR 2023			*3,942.87*	
DECREMENTOS	ABR 2023				
RUBROS NUEVOS	ABR 2023				
MONTO TOTAL		789,464.39	**789,464.39**	*786,629.26*	***786,629.26***

Se trabajan con montos reprogramados de acuerdo a la REPROGRAMACIÓN 05 - CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS.

@IngenieroCivilOGI
ohgi@hotmail.es
ohgiomar@gmail.com
0987571582 / 0979894628
Calle Bolívar 1-58 y Av. Marco Aurelio Subía
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

7.- PLANILLAS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS

PLANILLAS	VALORES					PORCENTAJES			
	MONTO PROGRAMADO		MONTO PLANILLADO			AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL	
	DIC 2022	ACUM	ANT.	ACTUAL	ACUM	ABR 2023	ACUM	ABR 2023	ACUM
PLANILLA 1	118,328.75	118,328.75	-	118,328.75	118,328.75	14.99%	14.99%	14.99%	14.99%
OBRA CIVIL EXCEDENTE 1									
OBRA CIVIL RUBROS NUEVOS 1									
PLANILLA 2	74,973.19	193,301.94	118,328.75	74,973.19	193,301.94	9.50%	24.49%	9.50%	24.49%
OBRA CIVIL EXCEDENTE 2			-	11,075.87	**11,075.87**	-	-	1.40%	1.40%
OBRA CIVIL RUBROS NUEVOS 2									
PLANILLA 3	63,713.26	257,015.20	74,973.19	63,713.26	257,015.20	8.07%	32.56%	8.07%	32.56%
OBRA CIVIL EXCEDENTE 3			11,075.87	2,945.28	**14,021.15**	-	-	0.38%	1.78%
OBRA CIVIL RUBROS NUEVOS 3									
PLANILLA 4	173,770.40	430,785.60	63,713.26	173,770.40	430,785.60	22.01%	54.57%	22.01%	54.57%
OBRA CIVIL EXCEDENTE 4			2,945.28	24,165.07	**38,186.22**	-	-	3.06%	4.84%
OBRA CIVIL RUBROS NUEVOS 4									
PLANILLA 5	123,706.30	554,491.36	173,770.40	123,706.30	554,491.90	15.67%	70.24%	15.67%	70.24%

@IngenieroCivilOGI
ohgi@hotmail.es
ohgiomar@gmail.com
0987571582 / 0979894628
Calle Bolívar 1-38 y Av. Marco Aurelio Subía
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

OBRA CIVIL EXCEDENTE 5			24,165.07	3,184.15	**41,370.37**	-	-	0.40%	5.24%
OBRA CIVIL RUBROS NUEVOS 5									
PLANILLA 6	178,594.24	604,106.26	123,706.30	178,594.24	733,086.14	22.62%	92.86%	22.62%	92.86%
OBRA CIVIL EXCEDENTE 6			3,184.15	62,918.66	**104,289.03**	-	-	7.97%	13.21%
OBRA CIVIL RUBROS NUEVOS 6									
PLANILLA 7	42,834.46	**775,920.60**	*178,594.24*	*1,602.00*	***775,920.60***	5.43%	98.28%	5.43%	**98.28%**
OBRA CIVIL EXCEDENTE 7			62,918.66	41,232.46	**145,521.49**	-	-	5.22%	**18.43%**
OBRA CIVIL RUBROS NUEVOS 7									
PLANILLA 8	13,543.79	**789,464.39**	*1,602.00*	*6,765.79*	***786,629.26***	1.72%	100.00%	1.35%	**99.64%**
OBRA CIVIL EXCEDENTE 8			41,232.46	3,942.87	**149,464.36**	-	-	0.50%	**18.93%**
OBRA CIVIL RUBROS NUEVOS 8									
TOTAL	*789,464.39*	***789,464.39***		*786,629.26*	***786,629.26***	100.00%	**100.00%**	99.64%	**99.64%**

@IngenieroCivilOGI
ohgi@hotmail.es
ohgiomar@gmail.com
0987571382 / 0979894628
Calle Bolívar 1-38 y Av. Marco Aurelio Subía
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

8.- AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

PLANILLAS	MES	PORCENTAJES %			
		AVANCE PROGRAMADO %		AVANCE EJECUTADO %	
		PROPUESTO	ACUMULADO	EJECUTADO	ACUMULADO
AVANCE 1	SEPTIEMBRE 2022	14.99	**14.99**	14.99	**14.99**
INCREMENTOS	SEPTIEMBRE 2022				
DECREMENTOS	SEPTIEMBRE 2022				
RUBROS NUEVOS	SEPTIEMBRE 2022				
AVANCE 2	OCTUBRE 2022	9.50	**24.49**	9.50	**24.49**
INCREMENTOS	OCTUBRE 2022			1.40	1.40
DECREMENTOS	OCTUBRE 2022				
RUBROS NUEVOS	OCTUBRE 2022				
AVANCE 3	NOVIEMBRE 2022	8.07	**32.56**	8.07	**32.56**
INCREMENTOS	NOVIEMBRE 2022			0.38	1.78
DECREMENTOS	NOVIEMBRE 2022				
RUBROS NUEVOS	NOVIEMBRE 2022				
AVANCE 4	DICIEMBRE 2022	22.01	**54.57**	22.01	**54.57**
INCREMENTOS	DICIEMBRE 2022			3.06	4.84
DECREMENTOS	DICIEMBRE 2022				
RUBROS NUEVOS	DICIEMBRE 2022				
AVANCE 5	ENERO 2023	15.67	**70.24**	15.67	**70.24**

@IngenieroCivilOGI
ohgi@hotmail.es
ohgiomar@gmail.com
0987571382 / 0979894628
Calle Bolívar 1-38 y Av. Marco Aurelio Subía
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

INCREMENTOS	ENERO 2023			0.40	5.24
DECREMENTOS	ENERO 2023				
RUBROS NUEVOS	ENERO 2023				
AVANCE 6	FEBRERO 2023	22.62	**92.86**	22.62	**92.85**
INCREMENTOS	FEBRERO 2023			7.97	13.21
DECREMENTOS	FEBRERO 2023				
RUBROS NUEVOS	FEBRERO 2023				
AVANCE 7	MARZO 2023	5.43	**98.28**	5.43%	**98.28**
INCREMENTOS	MARZO 2023			5.22	18.43
DECREMENTOS	MARZO 2023				
RUBROS NUEVOS	MARZO 2023				
AVANCE 8	ABRIL 2023	1.72	**100.00**	1.35%	**99.64**
INCREMENTOS	ABRIL 2023			0.50	18.93
DECREMENTOS	ABRIL 2023				
RUBROS NUEVOS	ABRIL 2023				
PORCENTAJE TOTAL		100.00	**100.00**	99.64	**99.64**

Con relación al monto total acumulado hasta el 30 de abril de 2023, y de conformidad cronograma valorado de trabajos vigente (cronograma reprogramado) a la fecha, el Contratista NO TIENE MORA, cabe destacar que la valoración para las multas está en función del monto acumulado a la fecha.

@IngenieroCivilOGI
ohgi@hotmail.es
ohgiomar@gmail.com
0987571382 / 0979894628
Calle Bolívar 1-38 y Av. Marco Aurelio Subía
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

9.- TIEMPO UTILIZADO DESDE LA FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO

Total **242 días**, desde el inicio de los trabajos (01 de septiembre de 2022) hasta el 30 de abril de 2023, correspondiente a la Planilla de Avance 08.

PLAZO TOTAL: Plazo contractual más ampliación 01, 02 y 03: 245 días, equivalentes al 100%.

DESCRIPCIÓN	DÍAS	OBSERVACIONES
DÍAS TRASCURRIDOS	30	PLANILLA AVANCE N°01 SEPTIEMBRE DE 2022
DÍAS TRASCURRIDOS	31	PLANILLA AVANCE N°02 OCTUBRE DE 2022
DÍAS TRASCURRIDOS	30	PLANILLA AVANCE N°03 NOVIEMBRE DE 2022
DÍAS TRASCURRIDOS	31	PLANILLA AVANCE N°04 DICIEMBRE DE 2022
DÍAS TRASCURRIDOS	31	PLANILLA AVANCE N°05 ENERO DE 2023
DÍAS TRASCURRIDOS	28	PLANILLA AVANCE N°06 FEBRERO DE 2023
DÍAS TRASCURRIDOS	31	PLANILLA AVANCE N°07 MARZO DE 2023
DIAS TRANSCURRIDOS	30	PLANILLA AVANCE N°08 ABRIL DE 2023
TOTAL:	**242**	**TOTAL: 98.78%**

10.- RESUMEN FINANCIERO Y DE AVANCE A LA FECHA DEL PROYECTO:

DESCRIPCIÓN	MONTO (USD)	PORCENTAJE (%)
MONTO DEL CONTRATO:	**789.464,39**	**100.00**
PLANILLAS CONTRACTUALES:	*786,629.26*	**99.64%**
MONTO DE INCREMENTOS:	**149,464.36**	**18.93%**
MONTO DE DECREMENTOS:	**637,164.90**	**80.71%**
CONTRATO COMPLEMENTARIO:	**0.00**	**0.00**
COSTO+PORCENTAJE:	**0.00**	**0.00**

11.- ACCIONES EFECTUADAS POR FISCALIZACIÓN:

Las actividades y acciones efectuadas por el equipo de Fiscalización del Proyecto del están determinadas por el contrato de Consultoría y por los términos de referencia:

1. Revisión de la documentación proporcionada por la Entidad Contratante en función del avance de los trabajos.

2. Se realizó visitas continuas a la obra para evaluar el rendimiento y avance de los trabajos, así mismo se coordinó con la Contratista reuniones semanales para verificar actividades que se desarrollaran en el transcurso del periodo, para resolver detalles constructivos presentes en la obra y se lleve el control de la reprogramación de trabajos.

3. Se ha ejercido la supervisión continua de los equipos, personal y materiales del proyecto.

4. Se ha atendido oportunamente las consultas y requerimientos del contratista.

5. Se ha vigilado el cumplimiento de las leyes laborales y reglamentos de seguridad industrial, ambiental, etc. Se ha coordinado con el Ingeniero Industrial y Ambiental de la Obra, que el personal que labora use equipo de protección personal básica como son (chalecos reflectivos, cascos, mascarillas, botas de puntas de acero o caucho según la actividad, guantes, tapones auditivos).

6. Oportunamente se ha dado soluciones técnicas a los problemas surgidos durante la ejecución de la obra.

7. Se ha ejecutado el respectivo control de calidad y control de cumplimiento de especificaciones técnicas de los trabajos ejecutados y materiales empleados.

8. Se midió las cantidades de obra en conjunto con el Contratista, verificando así la exactitud de sus valores, también se calculó los reajustes de precios de la planilla presentada, comprobando así que la obra ejecutándose este acorde con lo programado.

9. Se verificó en obra que lleven diariamente el libro de obra, las especificaciones técnicas y planos constructivos.

10. Fiscalización corrobora los ensayos de compresión de las probetas cilíndricas de los elementos de hormigón correspondientes a los rubros ejecutados en el mes.

11. Se ha realizado la constatación permanente de la señalética ambiental que debe estar en la obra, así como la correcta utilización y ubicación de estos, para garantizar que estos cumplan con los fines pertinentes.

12. Se han organizado los controles de supervisión de campo, control de calidad de materiales y equipos, en acción permanente en los frentes de trabajo de la obra.

13. Se tramitó la documentación correspondiente.

14. Se informó y solicitó autorizaciones al Administrador de Contrato.

15. Se realizó el control cualitativo y cuantitativo de los rubros ejecutados.

11.1. - VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL:

El personal Técnico que se encuentra laborando en obra y oficina cumple con el ofertado en formulario de cumplimiento de compromiso contractual, destacando que de acuerdo a los rubros ejecutándose, la empresa Contratista dispondrá del personal técnico necesario.

CONTRATISTA

PERSONAL OFERTADO	CANT.	PERSONAL PRESENTE EN OBRA	CHECK LIST
SUPERINTENDENTE DE OBRA	1	✓	CUMPLE
RESIDENTE DE OBRA	1	✓	CUMPLE
TÉCNICO HIDRÁULICO	1	✓	CUMPLE
TÉCNICO AMBIENTAL	1	✓	CUMPLE
TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	1	✓	CUMPLE
TOPÓGRAFO	1	✓	CUMPLE

NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	TITULO	CARGO	TIEMPO PARTICIPACIÓN OBRA	OBSERVACIONES
Leonardo Joselito Barrionuevo Diaz	180185190-6	Ingeniero Civil	Superintendente de Obra	100%	
Cristian Rodolfo Huachi Cuji	160040660-5	Ingeniero Civil	Residente de Obra	100%	
Alex Gary Diaz Villarruel	160065586-2	Ingeniero Ambiental	Técnico Ambiental	50%	
José Miguel Guamán Iler	050249779-5	Ingeniero Industrial	Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional	50%	
Juan Samuel Lozada Proaño	160037741-8	Ingeniero Civil	Topógrafo	100%	

ASISTENCIA DEL PERSONAL DE OBRA:

MES	ABRIL 2023																												
Días / Cargos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Superintendente de Obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Residente de obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Técnico Ambiental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Topógrafo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Maestro Mayor																														
Albañil																														
Peón	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	
Soldador																														
Cadenero																														
Chofer Ch C1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
Ayudante Maq.																														
Operador Op C1																														
Operador Op C2																														
Fierrero		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pintor																														
Ayudante	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2													2							2

FISCALIZACIÓN

PERSONAL OFERTADO	CANTIDAD	PERSONAL PRESENTE	CHECK LIST

		EN OBRA	
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	1	✓	CUMPLE
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN	1	✓	CUMPLE
TÉCNICO AMBIENTAL	1	✓	CUMPLE
SECRETARIA	1	✓	CUMPLE
CHOFER	1	✓	CUMPLE

11.2. - VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA:

EQUIPO Y MAQUINARIA OFERTADO	CANT.	ESTADO EQUIPO Y MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA	CHEK LIST
EXCAVADORA ORUGAS	3	BUENO	CUMPLE
MOTONIVELADORA	1	BUENO	CUMPLE
CAMIÓN CISTERNA	1	BUENO	CUMPLE
VOLQUETA 10 M3	5	BUENO	CUMPLE
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	BUENO	CUMPLE
PLANTA DE ASFALTO	1	BUENO	CUMPLE
TERMINADORA DE ASFALTO	1	BUENO	CUMPLE
ESCOBA MECÁNICA	1	BUENO	CUMPLE
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	BUENO	CUMPLE
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	BUENO	CUMPLE
CONCRETERA 1 SACO	2	BUENO	CUMPLE
APARATOS DE TOPOGRAFÍA	1	BUENO	CUMPLE
CAMIONETA 1 TON	-	-	-
SOLDADORA ELÉCTRICA	1	BUENO	CUMPLE
VIBRADOR	-	-	-
MOTOSIERRA	-	-	-
HERRAMIENTA MENOR	-	-	-
OTROS: CAMIONETA (ROCIADOR)	1	BUENO	CUMPLE

USO DE EQUIPOS EN LA OBRA:

MES	ABRIL 2023																												
Días / Equipo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Excavadora Orugas																														
Motoniveladora																														
Camión Cisterna																														
Volqueta 10 m3																														
Distribuidor de Asfalto																														
Planta de Asfalto																														
Terminadora de Asfalto																														
Escoba Mecánica																														
Rodillo Vibratorio Liso																														
Rodillo Vibratorio Neumático																														
Concretera 1 saco																														
Aparatos de Topografía																														
Camioneta 1 ton											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
Soldadora Eléctrica											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vibrador																														
Motosierra																														
Herramienta menor	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Otros: (Camioneta - rociador)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																				

11.3. – INCIDENCIAS PRODUCIDAS EN LA OBRA:

Sin incidencias en la planilla vigente.

11.4. - CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES

Uno de los principales objetivos de la Fiscalización es el control de la calidad de los materiales que intervienen en los diferentes rubros, así como el cumplimiento de las especificaciones para la ejecución de los rubros. Por lo cual:

1.- Para el control de la resistencia a compresión de los elementos de hormigón que fueron fundidos en el mes de enero, se lleva a cabo ensayos con especímenes cilíndricos de acuerdo a la norma ASTM C39.

11.5. – VERIFICACIONES REALIZADAS

- Para el control de la resistencia a compresión de los elementos de hormigón que fueron fundidos en el mes de marzo, se lleva a cabo ensayos con especímenes cilíndricos de acuerdo a la norma ASTM C39.
  - Cunetas

Probeta #	Edad DÍAS	Elemento Hormigón	Resistencia F'C (kg/cm2)	Resistencia F'C (kg/cm2) ESPECIF.	CHECK LIST
1	28	CUNETA DERECHA	**196**	180	CUMPLE
2	28	CUNETA IZQUIERDA	**196**	180	CUMPLE

3	28	CUNETA DERECHA	**194**	180	CUMPLE
4	28	CUNETA IZQUIERDA	**194**	180	CUMPLE
5	28	CUNETA DERECHA	**195**	180	CUMPLE
6	28	CUNETA IZQUIERDA	**193**	180	CUMPLE
7	28	CUNETA DERECHA	**196**	180	CUMPLE
8	28	CUNETA IZQUIERDA	**196**	180	CUMPLE
9	28	CUNETA DERECHA	**192**	180	CUMPLE
10	28	CUNETA IZQUIERDA	**195**	180	CUMPLE
11	27	CUNETA DERECHA	**194**	180	CUMPLE
12	27	CUNETA IZQUIERDA	**194**	180	CUMPLE
13	25	CUNETA DERECHA	**192**	180	CUMPLE
14	25	CUNETA IZQUIERDA	**197**	180	CUMPLE
15	24	CUNETA DERECHA	**193**	180	CUMPLE
16	24	CUNETA IZQUIERDA	**192**	180	CUMPLE
17	23	CUNETA DERECHA	**195**	180	CUMPLE
18	23	CUNETA IZQUIERDA	**193**	180	CUMPLE
19	21	CUNETA DERECHA	**184**	180	CUMPLE
20	21	CUNETA IZQUIERDA	**184**	180	CUMPLE
21	20	CUNETA DERECHA	**184**	180	CUMPLE
22	20	CUNETA IZQUIERDA	**180**	180	CUMPLE
23	18	CUNETA DERECHA	**184**	180	CUMPLE
24	18	CUNETA IZQUIERDA	**185**	180	CUMPLE

@IngenieroCivilOGI
ohgi@hotmail.es
ohgiomar@gmail.com
0987571382 / 0979894628
Calle Bolívar 1-38 y Av. Marco Aurelio Subía
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

25	14	CUNETA DERECHA	**172**	180	CUMPLE
26	14	CUNETA IZQUIERDA	**172**	180	CUMPLE
27	13	CUNETA DERECHA	**174**	180	CUMPLE
28	13	CUNETA IZQUIERDA	**169**	180	CUMPLE

11.6. – VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

En lo que corresponde a este mes se ha cumplido con las obligaciones patronales del seguro social por parte del Contratista con el personal mínimo ofertado, lo cual queda justificado con el respectivo comprobante de pago y certificado de no adeudar al IESS del representante legal de la Constructora EDDYMICH CIA. LTDA., cabe destacar que, en obra, el Contratista tiene maquinaria pesada arrendada de las cuales el patrono pasa a ser el dueño de las maquinas.

11.7. – CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA ZONA DEL PROYECTO

Se presentaron condiciones de precipitación pluvial durante 11 días laborables de este periodo, condiciones que han interrumpido las actividades normales en la obra, las cuales se detallan en el libro de obra y en este cuadro de resumen, para conocimiento de la administración de contrato.

ABRIL 2023														
CONDICIONES CLIMÁTICAS											HORAS DE LLUVIAS			ACTIVIDADES AFECTADAS POR LA LLUVIA
FECHA	MAÑANA					TARDE					MAÑANA	TARDE	TOTAL EN HORAS	
	S	D	N	LL D	LL F	S	D	N	LL D	LL F				
01/04/2023					1				1		8h00 a 12h00	13h00 a 17h00	8	Colocación de marcas en pavimento
02/04/2023	1							1						
03/04/2023	1								1			13h00 a 17h00	4	
04/04/2023	1						1							
05/04/2023					1					1	8h00 a 12h00	13h00 a 17h00	8	Colocación de marcas en pavimento
06/04/2023					1					1	8h00 a 12h00	13h00 a 17h00	8	Colocación de marcas en pavimento
07/04/2023	1					1								
08/04/2023					1					1	8h00 a 12h00	13h00 a 17h00	8	Colocación de marcas en pavimento
09/04/2023		1				1								
10/04/2023	1					1								
11/04/2023					1					1	8h00 a 12h00	13h00 a 17h00	8	Colocación de marcas en pavimento
12/04/2023	1						1							
13/04/2023		1						1						
14/04/2023	1					1								
15/04/2023		1					1							
16/04/2023	1					1								
17/04/2023	1					1								
18/04/2023					1					1	8h00 a 12h00	13h00 a 17h00	8	Colocación de señalética (0.75x0.75) m2
19/04/2023	1					1								
20/04/2023	1					1								
21/04/2023					1					1	8h00 a 12h00	13h00 a 17h00	8	Colocación de señalética (0.75x0.75) m2
22/04/2023					1					1	8h00 a 12h00	13h00 a 17h00	8	Colocación de señalética (0.75x0.75) m2
23/04/2023	1					1								
24/04/2023	1					1								
25/04/2023					1					1	8h00 a 12h00	13h00 a 17h00	8	Colocación de señalética (0.75x0.75) m2
26/04/2023					1					1	8h00 a 12h00	13h00 a 17h00	8	Colocación de señalética (0.75x0.75) m2
27/04/2023	1									1				
28/04/2023					1					1	8h00 a 12h00	13h00 a 17h00	8	Colocación de señalética (0.75x0.75) m2
29/04/2023	1						1							
30/04/2023				1					1					
TOTAL				1	11				3	11			92 h	11 DÍAS DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES

12.- DOCUMENTACION CURSADA

A continuación, se detalla la documentación generada durante este periodo.

12.1. – OFICIOS

OFICIOS EMITIDOS POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

- Mediante Oficio N° 018-G.N.-ALLISHUNGO-2022 de fecha 12 de abril de 2023 el administrador solicita un informe correspondiente a la tercera ampliación de plazo.
- Mediante Oficio N° 018-G.N.-ALLISHUNGO-2022 de fecha 11 de mayo de 2023 el administrador solicita se informe sobre si procede o no la recepción provisional.

OFICIOS EMITIDOS POR EL CONTRATISTA

- Mediante Oficio No:18-EDDYMICH-2023 de fecha 05 de abril de 2023 el contratista solicita la ampliación de plazo No.03.
- Mediante Oficio No:19-EDDYMICH-2023 de fecha 05 de abril de 2023 el contratista emite la planilla de avance de obra No.07 correspondiente al periodo marzo de 2023.
- Mediante Oficio No:20-EDDYMICH-2023 de fecha 14 de abril de 2023 el contratista emite las correcciones a la planilla de avance de obra No.07 correspondiente al periodo marzo de 2023.
- Mediante Oficio No:21-EDDYMICH-2023 de fecha 17 de abril de 2023 el contratista emite la reprogramación No.04 del cronograma valorado de trabajos.
- Mediante Oficio No:22-EDDYMICH-2023 de fecha 21 de abril de 2023 el contratista emite la reprogramación No.05 del cronograma valorado de trabajos.
- Mediante Oficio No:23-EDDYMICH-2023 de fecha 27 de abril de 2023 el contratista emite el informe de cumplimiento ambiental correspondiente al periodo de abril de 2023.
- Mediante Oficio No:24-EDDYMICH-2023 de fecha 03 de mayo de 2023 el contratista emite la planilla de avance de obra No.08 de liquidación correspondiente al periodo marzo de 2023.
- Mediante Oficio No:24-EDDYMICH-2023 de fecha 03 de mayo de 2023 el contratista emite la planilla de avance de obra No.08 de liquidación correspondiente al periodo marzo de 2023.
- Mediante Oficio No:25-EDDYMICH-2023 de fecha 03 de mayo de 2023 el contratista solicita la recepción provisional de la obra.
- Mediante Oficio No:26-EDDYMICH-2023 de fecha 04 de mayo de 2023 el contratista pone en conocimiento al administrador de contrato sobre la solicitud de la recepción provisional de la obra.

- Mediante Oficio No:28-EDDYMICH-2023 de fecha 19 de mayo de 2023 el contratista solicita emite las correcciones de la planilla 8 de liquidación.

OFICIOS EMITIDOS POR LA FISCALIZACION EXTERNA

- Mediante OFICIO N. 026-2023-FISC-EXT de fecha 03 de abril de 2023 la fiscalización Externa emite el informe sobre el avance físico de la obra y solicita partida presupuestaria para un contrato complementario.
- Mediante OFICIO N. 027-2023-FISC-EXT de fecha 03 de abril de 2023 la fiscalización Externa solicita la autorización para una segunda ampliación de plazo de la obra.
- Mediante OFICIO N. 028-2023-FISC-EXT de fecha 04 de abril de 2023 la fiscalización Externa solicita la autorización para una segunda ampliación de plazo de la fiscalización externa.
- Mediante OFICIO N. 029-2023-FISC-EXT de fecha 04 de abril de 2023 la fiscalización Externa emite el informe de conformidad ambiental del periodo de marzo de 2023.
- Mediante OFICIO N. 030-2023-FISC-EXT de fecha 05 de abril de 2023 la fiscalización Externa realiza un alcance a la solicitud de pago de la planilla de avance de obra N.6.
- Mediante OFICIO N. 031-2023-FISC-EXT de fecha 14 de abril de 2023 la fiscalización Externa emite la orden de ampliación No.2 y solicita la reprogramación de obra N.4.
- Mediante OFICIO N. 032-2023-FISC-EXT de fecha 14 de abril de 2023 la fiscalización Externa solicita correcciones a la planilla de avance de obra No.07.
- Mediante OFICIO N. 033-2023-FISC-EXT de fecha 17 de abril de 2023 la fiscalización Externa solicita autorización para la tercera ampliación de plazo de la obra.
- Mediante OFICIO N. 034-2023-FISC-EXT de fecha 21 de abril de 2023 la fiscalización Externa emite la reprogramación de obra aprobada por fiscalización externa y el Administrador de contrato.
- Mediante OFICIO N. 035-2023-FISC-EXT de fecha 21 de abril de 2023 la fiscalización Externa emite la orden de ampliación de plazo N.2 y solicita la reprogramación No.4 de obra.
- Mediante OFICIO N. 036-2023-FISC-EXT de fecha 25 de abril de 2023 la fiscalización Externa solicita el pago de la planilla de obra No.07.
- Mediante OFICIO N. 037-2023-FISC-EXT de fecha 25 de abril de 2023 la fiscalización Externa solicita el pago de la planilla de fiscalización No.07.

- Mediante OFICIO N. 038-2023-FISC-EXT de fecha 28 de abril de 2023 la fiscalización Externa emite la reprogramación de obra No.5.

- Mediante OFICIO N. 039-2023-FISC-EXT de fecha 28 de abril de 2023 la fiscalización Externa emite la reprogramación de fiscalización No03.

- Mediante OFICIO N. 040-2023-FISC-EXT de fecha 03 de mayo de 2023 la fiscalización externa emite un alcance a la solicitud de pago de la planilla de avance de obra No.07.

- Mediante OFICIO N. 041-2023-FISC-EXT de fecha 03 de mayo de 2023 la fiscalización externa solicita la recepción definitiva del contrato de fiscalización externa.

- Mediante OFICIO N. 042-2023-FISC-EXT de fecha 08 de mayo de 2023 la fiscalización externa emite un alcance a la solicitud de pago de la planilla de avance de obra No.07.

- Mediante OFICIO N. 044-2023-FISC-EXT de fecha 10 de mayo de 2023 la fiscalización externa solicita correcciones a la planilla de avance de obra No.8 de liquidación.

- Mediante OFICIO N. 044-2023-FISC-EXT de fecha 17 de mayo de 2023 la fiscalización externa emite el criterio favorable para la recepción provisional de la obra.

- Mediante OFICIO N. 045-2023-FISC-EXT de fecha 01 de mayo de 2023 la fiscalización externa emite un alcance a la solicitud de pago de la planilla de avance de obra No.07.

CONTRATOS

- MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRA, V. Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de obras.

- CONTRATO No. COTO-06-88-2022 PARA LA CONSTRUCCION DEL "**ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**" de fecha 20 de junio de 2022, se suscribe el contrato por una parte el Ing. Jaime Guevara Blaschke Prefecto del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza y el Sr. Ángel Misael López Chávez Representante legal de la CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA LTDA.

- CONTRATO No. CDC-114-07-2022 PARA LA CONTRATACION DE "**FISCALIZACION ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**" de fecha 27 de julio de 2022, se suscribe el contrato por una parte el Ing. Jaime Guevara Blaschke Prefecto del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza y el Ing. Omar Henry Guamán Iler Contratista.

13.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

CONTRATO PRINCIPAL	
DESCRIPCION DE MONTOS	**VALORES EN USD.**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	789,464.39
MONTO DEL ANTICIPO (40%)	315,785.75
1.- Liquidación del anticipo	
Valor anticipo entregado	315,785.75
Valor descontado en Planilla 1	47,331.50
Valor descontado en Planilla 2	29,989.28
Valor descontado en Planilla 3	25,485.30
Valor descontado en Planilla 4	69,508.16
Valor descontado en Planilla 5	49,482.52
Valor descontado en Planilla 6	71,437.70
Valor descontado en Planilla 7	17,133.78
Valor descontado en Planilla 8	5,417.51
Saldo de anticipo	**0.00**
2.- Resumen de Planillas100%	
Valor Planilla 1	118,328.75
Valor Planilla 2	63,897.32
Valor Planilla 3	60,767.98
Valor Planilla 4	149,605.33
Valor Planilla 5	120,522.15
Valor Planilla 6	115,675.58
Valor Planilla 7	1,602.00
Valor Planilla 8	6,765.79
Subtotal 1	**637,164.90**
2.- Resumen de Planillas de incrementos	
Valor Planilla 1	-
Valor Planilla 2	11,075.87
Valor Planilla 3	2,945.28
Valor Planilla 4	24,165.07
Valor Planilla 5	3,184.15
Valor Planilla 6	62,918.66
Valor Planilla 7	41,232.46
Valor Planilla 8	3,942.87
Subtotal 2	**149,464.36**
3.- Resumen de Reajustes Provisionales	
Planilla 1 (Provisional)	1,703.93
Planilla 2 (Provisional)	1,124.60
Planilla 3 (Provisional)	802.79
Planilla 4 (Provisional)	2,085.24
Planilla 5 (Provisional)	2,300.94
Planilla 6 (Provisional)	3,321.85
Planilla 7 (Provisional)	796.72
Planilla 8 (Provisional)	253.98

Subtotal 3	**12,390.05**
3.- Resumen de Reajustes Definitivos	
Planilla 1 (Definitivo)	-354.98
Planilla 2 (Definitivo)	-269.91
Planilla 3 (Definitivo)	1,032.15
Subtotal 4	**407.26**
4.- Resumen de Multas	
Multas Planillas	0.00
Multas Plazo	0.00
Subtotal 5	**0.00**
COSTO TOTAL CONTRATADO PRINCIPAL (VALOR OBRA EJECUTADA + REAJUSTE DE PRECIOS - MULTA)	**799,426.57**

Nota: Se encuentra pendiente el cálculo y pago del reajuste definitivo de las planillas de avance de obra, los cuales se irán realizando conforme el pago y se dispongan de los índices de precios de la Construcción (IPCO).

14.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Fecha de suscripción del contrato	20/06/2022
Fecha de entrega del anticipo obra	04/07/2022
Fecha de entrega del anticipo fiscalización	18/08/2022
Fecha de inicio de obra	01/09/2022
Plazo contractual (días)	180
Ampliación de Plazo 01 (días)	40
Ampliación de Plazo 02 (días)	10
Ampliación de Plazo 03 (días)	15
Fecha de terminación del plazo contractual más ampliación de plazo 01, 02 y 03.	**03/05/2023**
Días trabajados hasta planilla No. 08 (30+31+30+31+31+28+31+30 días)	242
Total días prorrogados (por suspensión)	0
Plazo contractual incluido prorrogas vigente (días)	245

En tal virtud, **NO (X)** SI ( ) existe mora.

15.- CONCLUSIONES

1. Ha existido una permanente comunicación entre Fiscalización, el Contratista y la Comunidad, para tener a esta última informada acerca de la obra, los beneficios, así como la solución de inquietudes presentadas por los Moradores.

2. En el tiempo que lleva el Contrato se ha realizado una inspección permanente del impacto ambiental que tiene la obra, así como el cumplimiento de normas de seguridad industrial que deben cumplir los trabajadores que están participando en esta.
3. Se ha realizado la constatación permanente de la señalética ambiental que debe estar en obra, así como la correcta utilización y ubicación de esta para garantizar que cumpla con los fines pertinentes.
4. Conforme a los artículos 74 y 75 de la LOSNCP exige a los Contratistas que otorguen garantías de: Fiel cumplimiento y, Por anticipo. En tal virtud conforme al art. 73, numeral 2 de la LOSNCP, la Constructora EDDYMICH CIA. LTDA. presenta las siguientes pólizas:

Descripción	**No. Póliza**	**Fecha de emisión**	**Fecha de vencimiento**	**Plazo asegurado**	**Observación**
Póliza de fiel cumplimiento	53128	20-06-2022	20-06-2023	365 días	Vigente
Póliza de buen uso de anticipo	43759	16-05-2023	16-0-2023	30 días	Renovada Vigente

La Fiscalización a la fecha mantiene vigentes las pólizas para trámites de pago:

Descripción	**No. Póliza**	**Fecha de emisión**	**Fecha de vencimiento**	**Plazo asegurado**	**Observación**
Póliza de buen uso de anticipo	1132060	07/05/2023	05/08/2023	90 días	Renovada Vigente

5. Al tenor de lo dispuesto en el Contrato de Ejecución de Obra COTO-06-88-2022 la cláusula sexta. - forma de pago del trámite de planillas y requisitos previos al pago de planillas. Una vez que se ha completado con todos los requisitos para planillas, y subsanado las correcciones solicitadas por Fiscalización a la parte Contratista, se procede a revisar la información pertinente, esto es: memorias de cálculos, planos y todo el expediente que obra en el presente informe, por consiguiente, **se da por APROBADA la planilla de avance de obra No. 08**, en base a los términos establecidos en el Contrato de ejecución de obra en referencia. De acuerdo al siguiente detalle:

PLANILLA AVANCE N.° 08	**PERIODO:** 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023
	FECHA: 15 DE JUNIO DE 2023
VALOR PLANILLA 100% LIQUIDACIÓN DE OBRA:	**6,765.79 USD**

PORCENTAJE PROPORCIONAL ANTICIPO DESCONTADO 40%:	2,706.32USD
VALOR PLANILLA LIQUIDACIÓN DE INCREMENTOS OBRA:	**3,942.87 USD**
PORCENTAJE PROPORCIONAL ANTICIPO DESCONTADO 40%:	1,577.15 USD
VALOR ANTICIPO NO DEVENGADO:	1.134,05 USD
VALOR PLANILLA LIQUIDACIÓN DE OBRA:	**10,708.66 USD**
TOTAL, DESCUENTOS:	5.417,51 USD
VALOR LIQUIDO A PAGARSE:	**5.291,15 USD**
VALOR A RECIBIR EN ESTE PERIODO	
VALOR LIQUIDO PLANILLA AVANCE N°08 (LIQUIDACIÓN):	5.291,15 USD
REAJUSTE DE PLANILLA AVANCE N°08 (LIQUIDACIÓN):	253.98 USD
REAJUSTE ANTICIPO:	0 USD
TOTAL:	**5.545,13 USD**
SON: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 13/100 DÓLARES.	

EL VALOR TOTAL A PAGARSE ES: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 13/100 DÓLARES AMERICANOS, MAS IVA.

16.- RECOMENDACIONES

1. Conforme a la garantía Constitucional del debido proceso determinado en artículo 76, numeral 1 de nuestra norma suprema, preceptúa que, corresponde a la autoridad administrativa garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. A lo dispuesto por norma suprema, **RECOMIENDO** efectuar de manera ordinaria la liquidación de: **LA PLANILLA DE AVANCE No. 8**, de los trabajos inherentes al contrato en mención, los que son necesarios para el cumplimiento del objeto contractual prescrito en la cláusula cuarta del contrato, y, demás obligaciones claras, expresas, y exigibles dentro de lo que estipula el contrato en cita.

2. Realizar los descuentos de ley.

3. Tramitar a tiempo las planillas del Contratista para evitar reclamos posteriores.

4. Tramitar el pago de planillas de avance de obra No. 08 ejecutada, luego de la aprobación de Fiscalización.

5. Ingresar la información referente a la obra al Sistema Oficial de Contratación Pública.

Señor Administrador de Contrato, en el presente informe, pongo a su sana critica, todos los elementos de convicción, con observancia de la ley, estableciendo la causalidad entre la ley, el hecho, el objeto de mi actuación administrativa, y el fin que estos persiguen, en la satisfacción del interés público y de los fines institucionales del GADPPz.

17.- RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME

NOMBRE:	Ing. Omar Henry Guamán Iler
DIRECCIÓN:	Calle Bolívar 1-38 y Marco Aurelio Subía
CIUDAD:	Latacunga
CELULAR:	+593 987 571 382
CORREO ELECTRÓNICO:	ohgi@hotmail.es


Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
OMAR HENRY GUAMAN ILER


Ing. Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO
RUC: 0503341257001

18.- ANEXOS


ANEXOS FOTOGRÁFICOS

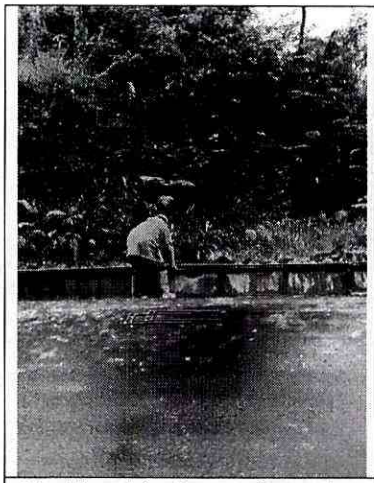

Verificación de uso de equipo de protección personal

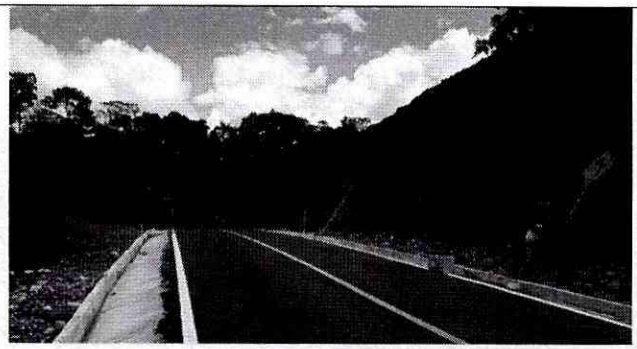

Colocación de señalización horizaontal

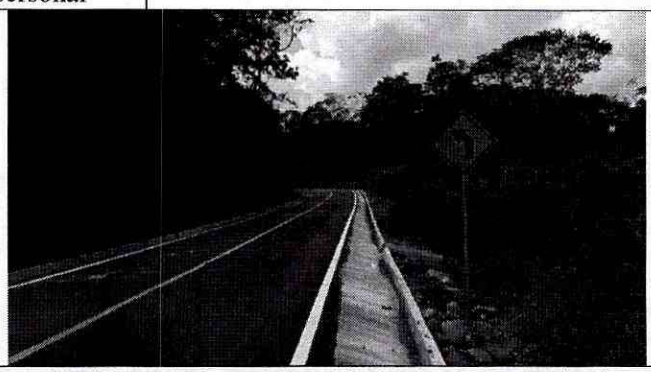

Verificación de señalización horizontal y vertical

@IngenieroCivilOGI
ohgi@hotmail.es
ohgiomar@gmail.com
0987571382 / 0979894628
Calle Bolívar 1-38 y Av. Marco Aurelio Subía
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

PLANILLA 08 - LIQUIDACIÓN DE OBRA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

ANEXO:

INFORME DEL CONTRATISTA PERIODO ABRIL DE 2023

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

INFORME DEL CONTRATISTA No. 08
LIQUIDACIÓN DE OBRA

PROYECTO: COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-005-2022

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

MONTO DEL CONTRATO: USD. 789.464,39 (SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 39/100) DÓLARES AMERICANOS SIN INCLUIR IVA.

PERIODO DEL INFORME: 1/04/2023 – 30/04/2023

FECHA DE ELABORACIÓN: 18 DE MAYO DE 2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN:

OBJETO DEL CONTRATO:	ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
CÓDIGO DEL PROCESO:	COTO-GADPPz-005-2022
MONTO DEL CONTRATO:	789.464,39 USD
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20 DE JUNIO DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL:	180 DÍAS
MONTO DEL ANTICIPO:	315.785,75 USD
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:	4 DE JULIO DE 2022
FECHA DE INICIO DE TRABAJO:	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	27 DE FEBRERO DE 2023
SUSPENSIÓN DE TRABAJO:	NINGUNA
AMPLIACIÓN DE PLAZO 01:	*40 DÍAS*
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN 01:	8 DE ABRIL DE 2023
AMPLIACIÓN DE PLAZO 02:	*10 DÍAS*
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN 02:	18 DE ABRIL DE 2023
AMPLIACIÓN DE PLAZO 03:	*15 DÍAS*
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN 03:	3 DE MAYO DE 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

2. PERIODO DEL INFORME

DEL 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE PERÍODO

Las principales actividades ejecutadas por parte del contratista durante el mes de ABRIL de 2023 son los siguientes:

- Reuniones de trabajo en oficina y en campo conjuntamente con el Administrador del Contrato y Fiscalización para revisión de documentación proporcionada por la institución contratante, definición de parámetros a cumplir y recomendaciones necesarias para la ejecución de los trabajos.

- Revisión, análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo, personal técnico dispuesto en obra en función de los trabajos que se ejecutan.
- Cumplimiento de especificaciones técnicas y seguimiento del cronograma valorado de trabajos.
- Cumplimiento del plan de manejo ambiental y de seguridad industrial.
- Verificación de cumplimiento de las leyes laborales.
- Conformación de Marcas en pavimento.
- Colocación de señales ecológicas, informativas y preventivas.
- Revisión y medición de cantidades de obra ejecutadas por el para tramite de planilla de Avance 06 correspondiente al mes de ABRIL de 2023.

4. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

El monto total del proyecto, alcanza la suma de USD $ 789.464,39 (Setecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 39/100 dólares) para la construcción de: *ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.*

MONTO TOTAL DEL PROYECTO:	USD $ 789.464,39	100,00 %
VALOR ANTICIPO ENTREGADO:	USD $ 315.785,75	40,00 %

PLANILLA Nº 08-LIQUIDACIÓN	**PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023 **FECHA:** 18 DE MAYO DE 2023
VALOR PLANILLA LIQUIDACIÓN DE OBRA:	10.708,66 USD
PORCENTAJE PROPORCIONAL ANTICIPO DESCONTADO %:	5.417,51 USD
TOTAL DESCUENTOS:	5.417,51 USD
VALOR LIQUIDO A PAGARSE:	***5.291,15 USD***
VALOR A RECIBIR EN ESTE PERIODO	
VALOR LIQUIDO PLANILLA Nº08 - LIQUIDACIÓN:	5.291,15 USD
REAJUSTE DE PLANILLA Nº08 - LIQUIDACIÓN:	253,98 USD
TOTAL:	***5.545,13* USD**
SON: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES CON 13/100 CENTAVOS.	

5. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:

Total **242 días**, desde el inicio de los trabajos (1 de septiembre de 2022) hasta el 30 de ABRIL de 2023, correspondiente a la Planilla 08 de Liquidación.

PLAZO CONTRACTUAL: 180 días

AMPLIACIÓN DE PLAZO 01: 40 días.

AMPLIACIÓN DE PLAZO 02: 10 días.

AMPLIACIÓN DE PLAZO 03: 15 días.

PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIONES: 245 días.

DESCRIPCIÓN	DÍAS	OBSERVACIONES
DÍAS TRASCURRIDOS SEPTIEMBRE 2022	30	PLANILLA AVANCE Nº 01 SEPTIEMBRE DE 2022
DÍAS TRASCURRIDOS OCTUBRE 2022	31	PLANILLA AVANCE Nº 02 OCTUBRE DE 2022
DÍAS TRASCURRIDOS NOVIEMBRE 2022	30	PLANILLA AVANCE Nº 03 NOVIEMBRE DE 2022
DÍAS TRASCURRIDOS DICIEMBRE 2022	31	PLANILLA AVANCE Nº 04 DICIEMBRE DE 2022
DÍAS TRASCURRIDOS ENERO 2023	31	PLANILLA AVANCE Nº 05 ENERO DE 2023
DÍAS TRASCURRIDOS FEBRERO 2023	28	PLANILLA AVANCE Nº 06 FEBRERO DE 2023
DÍAS TRASCURRIDOS MARZO 2023	31	PLANILLA AVANCE Nº 07 MARZO DE 2023
DÍAS TRASCURRIDOS ABRIL 2023	30	PLANILLA AVANCE Nº 08 ABRIL DE 2023
TOTAL:	**242**	**TOTAL: 98,78%**

6. RESUMEN DE MONTOS EJECUTADOS PLANILLAS CONTRACTUALES

PLANILLA Nº	MES	MONTO DE OBRA PROGRAMADO	PORCENTAJE DE OBRA PROGRAMADO	MONTO DE OBRA EJECUTADO	PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO
01	SEPT. 2022	118.328,75	14,99%	118.328,75	14,99%
02	OCT. 2022	74.973,19	9,50%	74.973,19	9,50%
03	NOV. 2022	63.713,26	8,07%	63.713,26	8,07%
04	DIC. 2022	173.770,40	22,01%	173.770,40	22,01%
05	ENERO 2023	123.706,30	15,67%	123.706,30	15,67%
06	FEB. 2023	178.594,24	22,62%	178.594,24	22,62%
07	MARZO 2023	42.834,46	5,43%	42.834,46	5,43%
08	ABRIL 2023	13.543,79	1,72%	10.708,66	1,35%
	TOTAL:	***789.464,39***	***100%***	***786.629,26***	***99.64%***

NOTA: Datos del Informe en función de la Reprogramación 05 aprobada mediante Oficio N. 038-2023-FISC-EXT, con base en la ampliación de plazo 03.

7. RESUMEN FINANCIERO Y DE AVANCE A LA FECHA DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	MONTO (USD)	PORCENTAJE (%)
MONTO DEL CONTRATO:	**789.464,39**	**100.00**
PLANILLAS CONTRACTUALES:	**786.629,26**	**99,64**
MONTO DE INCREMENTOS:	**149.464,36**	**18,93**
MONTO DE DECREMENTOS:	**637.164,90**	**80,71**
CONTRATO COMPLEMENTARIO:	**0,00**	**0,00**
COSTO+PORCENTAJE:	**0,00**	**0,00**

8. CUMPLIMIENTO DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL TÉCNICO

Se dispone en obra del siguiente personal técnico en función de su participación:

PERSONAL OFERTADO	CANT.	PERSONAL PRESENTE EN OBRA
SUPERINTENDENTE DE OBRA	1	✓
RESIDENTE DE OBRA	1	✓
TÉCNICO AMBIENTAL	1	✓
TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	1	✓
TOPÓGRAFO	1	✓

9. CUMPLIMIENTO DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y/O INSTRUMENTOS

Se dispone del siguiente equipo y/o instrumentos conforme los rubros que se han venido ejecutando:

EQUIPO Y MAQUINARIA OFERTADO	CANT.	ESTADO EQUIPO Y/O INSTRUMENTOS
EXCAVADORA SOBRE ORUGA	3	BUENO
MOTONIVELADORA	1	BUENO
CAMIÓN CISTERNA	1	BUENO
VOLQUETES	5	BUENO
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	BUENO
PLANTA DE ASFALTO	1	BUENO
TERMINADORA DE ASFALTO	1	BUENO
ESCOBA MECÁNICA	1	BUENO
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	BUENO
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	BUENO
CONCRETERA 1 SACO	2	BUENO
APARATOS DE TOPOGRAFÍA	1	BUENO

10. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES

- Se ha verificado que los trabajos que se han desarrollado en este periodo se ejecuten con estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas, cumplimiento del plan de manejo ambiental y de seguridad industrial.

11. OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

ENVIADOS:

DOCUMENTO	FECHA	ASUNTO
CONTRATISTA:		
Oficio No. 019-EDDYMICH-2023	05/04/2023	ENTREGA DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 07 – PERIODO MARZO DE 2023.
Oficio No. 020-EDDYMICH-2023	14/04/2023	ENTREGA DE CORRECCIONES DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 07 – PERIODO MARZO DE 2023.
Oficio No. 021-EDDYMICH-2023	17/04/2023	REPROGRAMACIÓN 04 DE CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS.
Oficio No. 022-EDDYMICH-2023	21/04/2023	REPROGRAMACIÓN 05 DE CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS.
Oficio No. 023-EDDYMICH-2023	27/04/2023	ENTREGA DEL INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL OCTAVO PERIODO (ABRIL).
PREFECTO DEL GAD PROVINCIAL DE PASTAZA:		
NINGUNO		
ADMINISTRADOR DE CONTRATO:		
Oficio No. 018-EDDYMICH-2023	05/04/2023	SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 03.

RECIBIDOS:

OFICIO	FECHA	ASUNTO
CONTRATISTA:		
OFICIO N. 031-2023-FISC-EXT	14/04/2023	ORDEN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 2 Y SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN No. 4.
OFICIO N. 032-2023-FISC-EXT	14/04/2023	SOLICITUD DE CORRECCIONES EN LA PLANILLA DE AVANCE Nro. 7.
OFICIO N. 034-2023-FISC-EXT	21/04/2023	EMITO REPROGRAMACIÓN DE OBRA #4 APROBADA.
OFICIO N. 035-2023-FISC-EXT	21/04/2023	ORDEN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N 2 Y SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN No. 4. (Se aprueba ampliación de plazo 03 y se solicita reprogramación No. 5).
OFICIO N. 038-2023-FISC-EXT	28/04/2023	EMITO REPROGRAMACIÓN DE OBRA #5 APROBADA.
ADMINISTRADOR DE CONTRATO:		
NINGUNO		

CONCLUSIONES

1. Ha existido una permanente comunicación entre Fiscalización, el Contratista y la Comunidad, para tener a esta última informada acerca de la obra, los beneficios, así como la solución de inquietudes presentadas por los Moradores.

2. En el tiempo que lleva el Contrato se ha realizado una inspección permanente del impacto ambiental que tiene la obra, así como el cumplimiento de normas de seguridad industrial que deben cumplir los trabajadores que están participando en esta.

3. Se ha realizado la constatación permanente de la señalética ambiental y de seguridad que debe estar en obra, así como la correcta utilización y ubicación de los mismos para garantizar que estos cumplan con los fines pertinentes.

4. Conforme a los artículos 74 y 75 de la LOSNCP exige a los Contratistas que otorguen garantías de: Fiel cumplimiento y, Por anticipo. En tal virtud conforme al art. 73, numeral 2 de la LOSNCP, la CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. presento las siguientes pólizas que se encuentran vigentes:

GARANTÍAS:	***BUEN USO DE ANTICIPO***	***FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO***
TIPO:	PÓLIZA ***RENOVACIÓN***	PÓLIZA
# PÓLIZA:	43759	53128
SUMA ASEGURADA:	22.551,30	83.046,45
VIGENCIA:	DESDE 16/05/2023 HASTA 15/06/2023	DESDE 20/06/2022 HASTA 20/06/2023
	30 DÍAS	365 DÍAS
COMPAÑÍA:	SEGUROS EQUINOCCIAL	SEGUROS EQUINOCCIAL

5. En la planilla de avance 07 y 06 se ejecutó el rubro de hormigón para cunetas (f'c=180kg/cm2), en dichas planillas no se consideró la totalidad del rubro ejecutado en esos periodos, por tal razón la cantidad ejecutada que no fue contabilizada es considerada para este periodo de abril de 2023, por lo que se emplea los mismos resultados del control de calidad de los hormigones presentados en La planilla 07 y 06 para el hormigón en rampas de ingreso vehicular a las viviendas, como se detalla a continuación:

HORMIGÓN EN CUNETAS Y CABEZALES: CUMPLE CON LA RESISTENCIA REQUERIDA.

RESISTENCIA REQUERIDA F´C=180KG/CM2 A LOS 28 DÍAS

ORDEN	IDENTIFICACIÓN	CARGA (KG)	RESISTENCIA (KG/CM2)	FECHA TOMA DE PROBETAS	FECHA DE ROTURA	EDAD (DÍAS)
CUNETA						
1	ABS. 2+220-2+260_Der	34656	196	1/03/2023	28/03/2023	28
2	ABS. 2+220-2+260_Izq	34651	196	1/03/2023	28/03/2023	28
3	ABS. 2+260-2+300_Der	34253	194	7/03/2023	3/04/2023	28
4	ABS. 2+260-2+300_Izq	34338	194	7/03/2023	3/04/2023	28
5	ABS. 2+300-2+340_Der	34411	195	10/03/2023	6/04/2023	28
6	ABS. 2+300-2+340_Izq	34165	193	10/03/2023	6/04/2023	28
7	ABS. 2+340-2+380_Der	34650	196	13/03/2023	9/04/2023	28
8	ABS. 2+340-2+380_Izq	34691	196	13/03/2023	9/04/2023	28
9	ABS. 2+380-2+420_Der	33854	192	15/03/2023	11/04/2023	28
10	ABS. 2+380-2+420_Izq	34429	195	15/03/2023	11/04/2023	28
11	ABS. 2+420-2+460_Der	34297	194	16/03/2023	11/04/2023	27
12	ABS. 2+420-2+460_Izq	34226	194	16/03/2023	11/04/2023	27
13	ABS. 2+460-2+500_Der	33937	192	18/03/2023	11/04/2023	25
14	ABS. 2+460-2+500_Izq	34749	197	18/03/2023	11/04/2023	25
15	ABS. 2+500-2+540_Der	34061	193	18/03/2023	11/04/2023	24
16	ABS. 2+500-2+540_Izq	33853	192	18/03/2023	11/04/2023	24
17	ABS. 2+540-2+580_Der	34478	195	20/03/2023	11/04/2023	23
18	ABS. 2+540-2+580_Izq	34114	193	20/03/2023	11/04/2023	23
19	ABS. 2+580-2+620_Der	32481	184	22/03/2023	11/04/2023	21
20	ABS. 2+580-2+620_Izq	32485	184	22/03/2023	11/04/2023	21
21	ABS. 2+620-2+660_Der	32429	184	23/03/2023	11/04/2023	20
22	ABS. 2+620-2+660_Izq	31843	180	23/03/2023	11/04/2023	20
23	ABS. 2+660-2+700_Der	32594	184	25/03/2023	11/04/2023	18
24	ABS. 2+660-2+700_Izq	32671	185	25/03/2023	11/04/2023	18
25	ABS. 2+700-2+740_Der	30395	172	29/03/2023	11/04/2023	14
26	ABS. 2+700-2+740_Izq	30416	172	29/03/2023	11/04/2023	14
27	ABS. 2+740-2+780_Der	30795	174	30/03/2023	11/04/2023	13
28	ABS. 2+740-2+780_Izq	29914	169	30/03/2023	11/04/2023	13

HORMIGÓN EN CUNETAS Y CABEZALES: CUMPLE CON LA RESISTENCIA REQUERIDA. RESISTENCIA REQUERIDA F´C=180KG/CM2 A LOS 28 DÍAS						
ORDEN	IDENTIFICACIÓN	CARGA (KG)	RESISTENCIA (KG/CM2)	FECHA TOMA DE PROBETAS	FECHA DE ROTURA	EDAD (DÍAS)
CUNETA						
1	ABS. 0+820-1+020_Der	34713	196	1/2/2023	28/2/2023	28
2	ABS. 0+820-1+020_Izq	34675	196	1/2/2023	28/2/2023	28
3	ABS. 1+020-1+220_Der	34201	194	4/2/2023	3/3/2023	28
4	ABS. 1+020-1+220_Izq	34592	196	4/2/2023	3/3/2023	28
5	ABS. 1+220-1+420_Der	33924	192	8/2/2023	7/3/2023	28
6	ABS. 1+220-1+420_Izq	34700	196	8/2/2023	7/3/2023	28
7	ABS. 1+420-1+620_Der	34347	194	11/2/2023	10/3/2023	28
8	ABS. 1+420-1+620_Izq	34649	196	11/2/2023	10/3/2023	28
9	ABS. 1+620-1+820_Der	34398	195	15/2/2023	14/3/2023	28
10	ABS. 1+620-1+820_Izq	34501	195	15/2/2023	14/3/2023	28
11	ABS. 1+820-2+020_Der	34335	194	18/2/2023	17/3/2023	28
12	ABS. 1+820-2+020_Izq	34525	195	18/2/2023	17/3/2023	28
13	ABS. 2+020-2+220_Der	34223	194	22/2/2023	22/2/2023	28
14	ABS. 2+020-2+220_Izq	34572	196	22/2/2023	22/2/2023	28

6. Cabe indicar que considerando el factor económico con respecto al monto contractual el proyecto alcanzo el 99,64% de su ejecución, teniendo presente que no fue posible ejecutar los siguientes rubros contractuales:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U	CONTRATO		
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
22	MARCAS SOBRE SALIDA DE PAVIMENTO (UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875.00	5.36	4,690.00000
24	SEÑALES ECOLÓGICAS (2.44x1.22)M2	U	6.00	283.40	1,700.40000
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44x1.22)M2	U	6.00	283.40	1,700.40000
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75x0.75)M2	U	10.00	117.23	1,172.30000

12. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME:

NOMBRE: CONSTRUCTOR EDDYMICH CIA. LTDA.
DIRECCIÓN: Calle Ambato SN y Machala
CIUDAD: Puyo
CELULAR: 0984787283
CORREO ELECTRÓNICO: edypollito@hotmail.es

Atentamente,




CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: Ángel Misael López Chávez
1691704528001
CONTRATISTA

13. ANEXOS FOTOGRÁFICOS






PRECAUCION

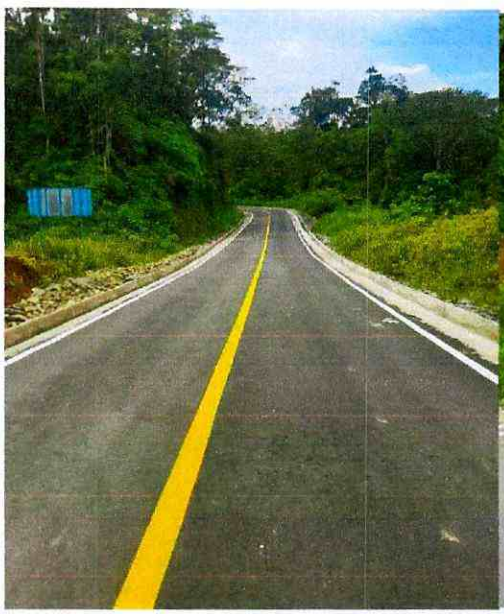







PLANILLA 08-LIQUIDACIÓN DE OBRA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

ANEXO:

PLANILLA 08-LIQUIDACIÓN DE OBRA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA 08_LIQUIDACIÓN DE OBRA

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO: 789,464.39
PERIODO: 1-abr.-23 30-abr.-23
PLAZO: 180 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 315,785.75 40%
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01+02+03: 245 DÍAS

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7.00	476.17	3,333.19000	0.20		0.20	95.23	0.00	95.23	2.86
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3.50	405.49	1,419.21500	3.50		3.50	1,419.22	0.00	1,419.22	100.00
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9,419.69	0.72	6,782.17680	35,025.49		35,025.49	25,218.36	0.00	25,218.36	371.83
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189.90	11.34	2,153.46600	7.20		7.20	81.65	0.00	81.65	3.79
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M3	1,706.60	3.70	6,314.42000	1,541.80		1,541.80	5,704.66	0.00	5,704.66	90.34
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	368.64	3.94	1,452.44160	538.17		538.17	2,120.39	0.00	2,120.39	145.99
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	1,412.95	1.35	1,907.48250	1,396.40		1,396.40	1,885.14	0.00	1,885.14	98.83
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80.00	243.32	19,465.60000	22.40		22.40	5,450.37	0.00	5,450.37	28.00
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314.88	189.47	59,660.31360	797.50	20.81	818.31	151,102.33	3,942.87	155,045.20	259.88
10	MURO DE H.S. FC=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M3	91.84	177.81	16,330.07040	71.75		71.75	12,757.87	0.00	12,757.87	78.13
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770.00	60.24	46,384.80000	78.00		78.00	4,698.72	0.00	4,698.72	10.13
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M3	17,988.24	2.38	42,812.01120	21,802.47		21,802.47	51,889.89	0.00	51,889.89	121.20
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M3	4,611.60	10.16	46,853.85600	4,500.03		4,500.03	45,720.31	0.00	45,720.31	97.58
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M3	2,880.87	12.94	37,278.45780	3,014.75		3,014.75	39,010.87	0.00	39,010.87	104.65
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1,412.95	0.81	1,144.48950	31,246.37		31,246.37	25,309.56	0.00	25,309.56	2,211.43
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863,435.52	0.22	189,955.81440	828,493.62		828,493.62	182,268.60	0.00	182,268.60	95.95
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204,755.04	0.22	45,046.10880	157,501.05		157,501.05	34,650.23	0.00	34,650.23	76.92
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127,910.63	0.22	28,140.33860	105,516.25		105,516.25	23,213.58	0.00	23,213.58	82.49
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32,340.00	0.66	21,344.40000	25,126.42		25,126.42	16,583.44	0.00	16,583.44	77.69
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23,100.00	8.05	185,955.00000	17,947.44		17,947.44	144,476.89	0.00	144,476.89	77.69
	SEÑALIZACION											
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9,800.00	0.22	2,156.00000		8,906.20	8,906.20	0.00	1,959.36	1,959.36	90.88
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875.00	5.36	4,690.00000							
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1.00	332.16	332.16000	1.00		1.00	332.16	0.00	332.16	100.00
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6.00	283.40	1,700.40000				0.00	0.00	0.00	0.00
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6.00	283.40	1,700.40000				0.00	0.00	0.00	0.00
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10.00	117.23	1,172.30000				0.00	0.00	0.00	0.00
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100.00	117.23	11,723.00000		41.00	41.00	0.00	4,806.43	4,806.43	41.00
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2.00	66.74	133.48000	2.00		2.00	133.48	0.00	133.48	100.00
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2.00	145.37	290.74000	2.00		2.00	290.74	0.00	290.74	100.00
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500.00	0.28	140.00000	88.40		88.40	24.75	0.00	24.75	17.68
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10.00	20.40	204.00000	10.00		10.00	204.00	0.00	204.00	100.00
	MEDIDAS AMBIENTALES											
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2.00	15.93	31.86000	2.00		2.00	31.86	0.00	31.86	100.00
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2.00	143.00	286.00000	2.00		2.00	286.00	0.00	286.00	100.00
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110.00	110.00000	1.00		1.00	110.00	0.00	110.00	100.00
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110.00	110.00000	1.00		1.00	110.00	0.00	110.00	100.00
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110.00	110.00000	1.00		1.00	110.00	0.00	110.00	100.00
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20.00	42.02	840.40000	15.00		15.00	630.30	0.00	630.30	75.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA 08_LIQUIDACIÓN DE OBRA

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789,464.39		
PERIODO:	1-abr.-23	30-abr.-23	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315,785.75	40%	
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01+02+03:	245	DÍAS	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
					789,464.39220				775,920.60	10,708.66	786,629.26	99.64

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	1-sep.-22	
FIN PLAZO CONTRACTUAL	27-feb.-23	
SUSPENSION DIAS	0	DIAS
AMPLIACIÓN N° 01 DÍAS	40	DIAS
AMPLIACIÓN N° 02 DÍAS	10	DIAS
AMPLIACIÓN N° 03 DÍAS	15	DIAS
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN 01	8-abr.-23	
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN 02	18-abr.-23	
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN 03	3-may.-23	
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	18-may.-23	
FECHA DE APROBACIÓN	18-may.-23	

VALOR PLANILLADO AVANCE DE OBRA	775,920.60	10,708.66	786,629.26
			0.00
			0.00
TOTAL PLANILLADO	**775,920.60**	**10,708.66**	**786,629.26**

DESCUENTOS Y RETENCIONES				
ANTICIPO :	40%	310,368.24	5,417.51	315,785.75
OTROS:				0.00
TOTAL DE DESCUENTOS:		**310,368.24**	**5,417.51**	**315,785.75**
VALOR LIQUIDO ESTA PLANILLA :		**465,552.36**	**5,291.15**	**470,843.51**

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN

PLANILLA 08-LIQUIDACIÓN DE OBRA

Pastaza GOBIERNO PROVINCIAL	**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**	bde BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

ANEXO:

PLANILLA 08 (100%)-LIQUIDACIÓN DE OBRA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA 08_LIQUIDACIÓN DE OBRA (100%)

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO: 789,464.39
PERIODO: 1-abr.-23 30-abr.-23
PLAZO: 180 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 315,785.75 40%
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01+02+03: 245 DÍAS

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7.00	476.17	3333.19000	0.20		0.20	95.23	0.00	95.23	2.86
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3.50	405.49	1419.21500	3.50		3.50	1,419.22	0.00	1,419.22	100.00
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9419.69	0.72	6782.17680	9,419.69		9,419.69	6,782.18	0.00	6,782.18	100.00
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189.90	11.34	2153.46600	7.20		7.20	81.65	0.00	81.65	3.79
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M3	1706.60	3.7	6314.42000	1,541.80		1,541.80	5,704.66	0.00	5,704.66	90.34
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	368.64	3.94	1452.44160	368.64		368.64	1,452.44	0.00	1,452.44	100.00
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	1412.95	1.35	1907.48250	1,396.40		1,396.40	1,885.14	0.00	1,885.14	98.83
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80.00	243.32	19465.60000	22.40		22.40	5,450.37	0.00	5,450.37	28.00
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314.88	189.47	59660.31360	314.88		314.88	59,660.31	0.00	59,660.31	100.00
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M3	91.84	177.81	16330.07040	71.75		71.75	12,757.87	0.00	12,757.87	78.13
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770.00	60.24	46384.80000	78.00		78.00	4,698.72	0.00	4,698.72	10.13
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M3	17988.24	2.38	42812.01120	17,988.24		17,988.24	42,812.02	0.00	42,812.02	100.00
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M3	4611.60	10.16	46853.85600	4,500.03		4,500.03	45,720.31	0.00	45,720.31	97.58
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M3	2880.87	12.94	37278.45780	2,880.87		2,880.87	37,278.47	0.00	37,278.47	100.00
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1412.95	0.81	1144.48950	1,412.95		1,412.95	1,144.49	0.00	1,144.49	100.00
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863435.52	0.22	189955.81440	828,493.62		828,493.62	182,268.60	0.00	182,268.60	95.95
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204755.04	0.22	45046.10880	157,501.05		157,501.05	34,650.23	0.00	34,650.23	76.92
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127910.63	0.22	28140.33860	105,516.25		105,516.25	23,213.58	0.00	23,213.58	82.49
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32340.00	0.66	21344.40000	25,126.42		25,126.42	16,583.44	0.00	16,583.44	77.69
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23100.00	8.05	185955.00000	17,947.44		17,947.44	144,476.89	0.00	144,476.89	77.69
	SEÑALIZACION											
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9800.00	0.22	2156.00000		8,906.20	8,906.20	0.00	1,959.36	1,959.36	90.88
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875.00	5.36	4690.00000							
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1.00	332.16	332.16000	1.00		1.00	332.16	0.00	332.16	100.00
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6.00	283.4	1700.40000							
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6.00	283.4	1700.40000							
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10.00	117.23	1172.30000							
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100.00	117.23	11723.00000		41.00	41.00		4,806.43	4,806.43	41.00
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2.00	66.74	133.48000	2.00		2.00	133.48	0.00	133.48	100.00
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2.00	145.37	290.74000	2.00		2.00	290.74	0.00	290.74	100.00
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500.00	0.28	140.00000	88.40		88.40	24.75	0.00	24.75	17.68
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10.00	20.4	204.00000	10.00		10.00	204.00	0.00	204.00	100.00
	MEDIDAS AMBIENTALES											
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2.00	15.93	31.86000	2.00		2.00	31.86	0.00	31.86	100.00
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2.00	143	286.00000	2.00		2.00	286.00	0.00	286.00	100.00
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110	110.00000	1.00		1.00	110.00	0.00	110.00	100.00
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110	110.00000	1.00		1.00	110.00	0.00	110.00	100.00
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110	110.00000	1.00		1.00	110.00	0.00	110.00	100.00
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20.00	42.02	840.40000	15.00		15.00	630.30	0.00	630.30	75.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA 08_LIQUIDACIÓN DE OBRA (100%)

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO: 789,464.39
PERIODO: 1-abr.-23 30-abr.-23
PLAZO: 180 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 315,785.75 40%
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01+02+03: 245 DÍAS

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
					789,464.39220				630,399.11	6,765.79	637,164.90	80.71

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	1-sep.-22	
FIN PLAZO CONTRACTUAL	27-feb.-23	
SUSPENSION DIAS	0	DIAS
AMPLIACIÓN N° 01 DÍAS	40	DIAS
AMPLIACIÓN N° 02 DÍAS	10	DIAS
AMPLIACIÓN N° 03 DÍAS	15	DIAS
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN 01	8-abr.-23	
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN 02	18-abr.-23	
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN 03	3-may.-23	
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	18-may.-23	
FECHA DE APROBACIÓN	18-may.-23	

VALOR PLANILLADO AVANCE DE OBRA	630,399.11	6,765.79	637,164.90
			0.00
			0.00
TOTAL PLANILLADO	630,399.11	6,765.79	637,164.90

DESCUENTOS Y RETENCIONES				
ANTICIPO :	40%	252,159.64	5,417.51	257,577.15
OTROS:				0.00
TOTAL DE DESCUENTOS:		252,159.64	5,417.51	257,577.15
VALOR LIQUIDO ESTA PLANILLA :		378,239.47	1,348.28	379,587.75

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN

PLANILLA 08 - LIQUIDACIÓN DE OBRA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

ANEXO:

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA 08

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA 08_LIQUIDACIÓN - EXCEDENTES

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO: 789,464.39
PERIODO: 1-abr.-23 30-abr.-23
PLAZO: 180 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 315,785.75 40%
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01+02+03: 245 DÍAS

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7	476.17	3333.19000							
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3.5	405.49	1419.21500							
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9419.69	0.72	6782.17680	25,605.80		25,605.80	18,436.18	0.00	18,436.18	271.83
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189.9	11.34	2153.46600							
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M3	1706.6	3.7	6314.42000							
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	368.64	3.94	1452.44160	169.53		169.53	667.95	0.00	667.95	45.99
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	1412.95	1.35	1907.48250							
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80	243.32	19465.60000							
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314.88	189.47	59660.31360	482.62	20.81	503.43	91,442.01	3,942.87	95,384.88	159.88
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M3	91.84	177.81	16330.07040							
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770	60.24	46384.80000							
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M3	17988.24	2.38	42812.01120	3,814.23		3,814.23	9,077.87	0.00	9,077.87	21.20
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M3	4611.6	10.16	46853.85600							
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M3	2880.87	12.94	37278.45780	133.88		133.88	1,732.41	0.00	1,732.41	4.65
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1412.95	0.81	1144.48950	29,833.42		29,833.42	24,165.07	0.00	24,165.07	2,111.43
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863435.52	0.22	189955.81440							
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204755.04	0.22	45046.10880							
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127910.63	0.22	28140.33860							
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32340	0.66	21344.40000							
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23100	8.05	185955.00000							
	SEÑALIZACION											
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9800	0.22	2156.00000							
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875	5.36	4690.00000							
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1	332.16	332.16000							
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6	283.4	1700.40000							
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6	283.4	1700.40000							
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10	117.23	1172.30000							
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100	117.23	11723.00000							
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2	66.74	133.48000							
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2	145.37	290.74000							
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500	0.28	140.00000							
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10	20.4	204.00000							
	MEDIDAS AMBIENTALES											
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2	15.93	31.86000							
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2	143	286.00000							
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110.00000							
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110.00000							
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110.00000							
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20	42.02	840.40000							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA 08_LIQUIDACIÓN - EXCEDENTES

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789,464.39		
PERIODO:	1-abr.-23	30-abr.-23	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315,785.75	40%	
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01+02+03:	245	DÍAS	

ÍTEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES REALIZADAS			COSTOS			% EJECUTADO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
					789,464.39220				**145,521.49**	**3,942.87**	**149,464.36**	**18.93**

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	1-sep.-22	
FIN PLAZO CONTRACTUAL	27-feb.-23	
SUSPENSION DIAS	0	DIAS
AMPLIACIÓN N° 01 DÍAS	40	DIAS
AMPLIACIÓN N° 02 DÍAS	10	DIAS
AMPLIACIÓN N° 03 DÍAS	15	DIAS
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN 01	8-abr.-23	
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN 02	18-abr.-23	
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN 03	3-may.-23	
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	18-may.-23	
FECHA DE APROBACIÓN	18-may.-23	

VALOR PLANILLADO AVANCE DE OBRA	145,521.49	3,942.87	149,464.36
			0.00
			0.00
TOTAL PLANILLADO	**145,521.49**	**3,942.87**	**149,464.36**

DESCUENTOS Y RETENCIONES				
ANTICIPO :	40%	58,208.59	1,577.15	59,785.74
OTROS:				0.00
TOTAL DE DESCUENTOS:		**58,208.59**	**1,577.15**	**59,785.74**
VALOR LIQUIDO ESTA PLANILLA :		**87,312.90**	**2,365.72**	**89,678.62**

y debería en cero.

Xq la suma del 100% + excedente debe. ser. 315785,75

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONSORCIO FATIMA

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN

PLANILLA 08 - LIQUIDACIÓN DE OBRA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

ANEXO:

PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES DE OBRA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA 08_LIQUIDACIÓN-DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO: 789,464.39
PERIODO: 1-abr.-23 30-abr.-23
PLAZO: 180 DÍAS
ANTICIPO RECIBIDO: 315,785.75 40%
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01+02+03: 180 DÍAS

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7	476.17	3333.19000	0.20	95.23	1.21%	0.00	0.00	0.00%	-0.20	-95.23	-1.20%
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3.5	405.49	1419.21500	3.50	1419.22	17.98%	0.00	0.00	0.00%	-3.50	-1419.22	-18.00%
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M3	9419.69	0.72	6782.17680	35025.49	25218.36	319.44%	25605.80	18436.18	233.50%	-9419.69	-6782.18	-85.90%
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189.9	11.34	2153.46600	7.20	81.65	1.03%	0.00	0.00	0.00%	-7.20	-81.65	-1.00%
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M3	1706.6	3.7	6314.42000	1541.80	5704.66	72.26%	0.00	0.00	0.00%	-1541.80	-5704.66	-72.30%
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M3	368.64	3.94	1452.44160	538.17	2120.39	26.86%	169.53	667.95	8.50%	-368.64	-1452.44	-18.40%
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	1412.95	1.35	1907.48250	1396.40	1885.14	23.88%	0.00	0.00	0.00%	-1396.40	-1885.14	-23.90%
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80	243.32	19465.60000	22.40	5450.37	69.04%	0.00	0.00	0.00%	-22.40	-5450.37	-69.00%
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314.88	189.47	59660.31360	818.31	155045.20	1963.93%	503.43	95384.88	1208.20%	-314.88	-59660.32	-755.70%
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M3	91.84	177.81	16330.07040	71.75	12757.87	161.60%	0.00	0.00	0.00%	-71.75	-12757.87	-161.60%
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770	60.24	46384.80000	78.00	4698.72	59.52%	0.00	0.00	0.00%	-78.00	-4698.72	-59.50%
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M3	17988.24	2.38	42812.01120	21802.47	51889.89	657.28%	3814.23	9077.87	115.00%	-17988.24	-42812.02	-542.30%
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M3	4611.6	10.16	46853.85600	4500.03	45720.31	579.13%	0.00	0.00	0.00%	-4500.03	-45720.31	-579.10%
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M3	2880.87	12.94	37278.45780	3014.75	39010.87	494.14%	133.88	1732.41	21.90%	-2880.87	-37278.46	-472.20%
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1412.95	0.81	1144.48950	31246.37	25309.56	320.59%	29833.42	24165.07	306.10%	-1412.95	-1144.49	-14.50%
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863435.52	0.22	189955.81440	828493.62	182268.60	2308.76%	0.00	0.00	0.00%	-828493.62	-182268.60	-2308.80%
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204755.04	0.22	45046.10880	157501.05	34650.23	438.91%	0.00	0.00	0.00%	-157501.05	-34650.23	-438.90%
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127910.63	0.22	28140.33860	105516.25	23213.58	294.04%	0.00	0.00	0.00%	-105516.25	-23213.58	-294.00%
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32340	0.66	21344.40000	25126.42	16583.44	210.06%	0.00	0.00	0.00%	-25126.42	-16583.44	-210.10%
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23100	8.05	185955.00000	17947.44	144476.89	1830.06%	0.00	0.00	0.00%	-17947.44	-144476.89	-1830.10%
	SEÑALIZACION													
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9800	0.22	2156.00000	8906.20	1959.36	24.82%	0.00	0.00	0.00%	-8906.20	-1959.36	-24.80%
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875	5.36	4690.00000									
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1	332.16	332.16000	1.00	332.16	4.21%	0.00	0.00	0.00%	-1.00	-332.16	-4.20%
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6	283.4	1700.40000									
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6	283.4	1700.40000									
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10	117.23	1172.30000									
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100	117.23	11723.00000	41.00	4806.43	60.88%	0.00	0.00	0.00%	-41.00	-4806.43	-60.90%
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2	66.74	133.48000	2.00	133.48	1.69%	0.00	0.00	0.00%	-2.00	-133.48	-1.70%
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2	145.37	290.74000	2.00	290.74	3.68%	0.00	0.00	0.00%	-2.00	-290.74	-3.70%
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500	0.28	140.00000	88.40	24.75	0.31%	0.00	0.00	0.00%	-88.40	-24.75	-0.30%
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10	20.4	204.00000	10.00	204.00	2.58%	0.00	0.00	0.00%	-10.00	-204.00	-2.60%
	MEDIDAS AMBIENTALES													
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2	15.93	31.86000	2.00	31.86	0.40%	0.00	0.00	0.00%	-2.00	-31.86	-0.40%
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2	143	286.00000	2.00	286.00	3.62%	0.00	0.00	0.00%	-2.00	-286.00	-3.60%
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110.00000	1.00	110.00	1.39%	0.00	0.00	0.00%	-1.00	-110.00	-1.40%
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110.00000	1.00	110.00	1.39%	0.00	0.00	0.00%	-1.00	-110.00	-1.40%
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1	110	110.00000	1.00	110.00	1.39%	0.00	0.00	0.00%	-1.00	-110.00	-1.40%

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PLANILLA 08_LIQUIDACIÓN-DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OBJETO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

MONTO DEL CONTRATO:	789,464.39		
PERIODO:	1-abr.-23	30-abr.-23	
PLAZO:	180	DÍAS	
ANTICIPO RECIBIDO:	315,785.75	40%	
PLAZO CONTRACTUAL + AMPLIACIÓN DE PLAZO 01+02+03:	180	DÍAS	

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			EJECUTADO			DIFERENCIAS DE CANTIDADES					
			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL	INCREMENTOS		%	DECREMENTOS		%
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20	42.02	840.40000	15.00	630.30	7.98%	0.00	0.00	0.00%	-15.00	-630.30	-8.00%
					TOTALES :	789,464.39220		786,629.26	99.64%		149,464.36	18.93%	-637,164.90	-80.71%

INICIO (ANTICIPO / ACTA DE INICIO)	1-sep.-22		
FIN PLAZO CONTRACTUAL	27-feb.-23		
SUSPENSION DIAS	0	DIAS	
AMPLIACIÓN N° 01 DÍAS		40	DIAS
AMPLIACIÓN N° 02 DÍAS		10	DIAS
AMPLIACIÓN N° 03 DÍAS		15	DIAS
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN 01	8-abr.-23		
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN 02	18-abr.-23		
FINAL INCLUIDA AMPLIACIÓN 03	3-may.-23		
FECHA RECEPCIÓN DE PLANILLA	18-may.-23		
FECHA DE APROBACIÓN	18-may.-23		

MONTO PLANILLADO AVANCE DE OBRA	786,629.26	99.64%	%
MONTO DE INCREMENTOS	149,464.36	18.93%	%
MONTO DECREMENTOS	-637,164.90	-80.71%	%
TOTAL PLANILLADO	**786,629.26**	**99.64%**	

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN EXTERNA

PLANILLA 08-LIQUIDACIÓN DE OBRA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

ANEXO:

REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL
PLANILLA 08-LIQUIDACIÓN DE OBRA

PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS

CONTRATANTE: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. **PERIODO:** *ABRIL DE 2023*

PLANILLA No. ***PLANILLA 08_LIQUIDACIÓN DE OBRA*** **MONTO PLANILLA: USD** 10708.66

MONTO DEL CONTRATO: USD 789464.39 **FECHA:** 18-may.-23

MONTO ANTICIPO: USD 315785.75

FECHA DE PRESENTACION DE LA OFERTA: *9-may.-22* 30 DIAS ANTES = Io *9-abr.-22*

TIPO DE REAJUSTE: ***PROVISIONAL***

CALCULO DEL COMPONENTE MANO DE OBRA Bo y B1

CUADRILLA TIPO	FACTOR DE INCIDENCIA	SALARIO/H abr.-22	SALARIO/H feb.-23	COSTOS Bo	COSTOS B1	OBSERVACIONES
OPERADOR EQUIPO PESADO C1	0.0510	4.29	4.55	0.219	0.232	
OPERADOR EQUIPO PESADO C2	0.0240	4.09	4.33	0.098	0.104	
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3	0.0000	4.30	4.55	-	-	
CHOFER C1	0.3680	5.62	5.95	2.068	2.190	TABLA DE SALARIOS CONTRALORIA MES FEBRERO 2023
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	0.1030	4.29	4.55	0.442	0.469	
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	0.0000	4.09	4.33	-	-	
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	0.1430	3.87	4.10	0.553	0.586	
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	0.3110	3.83	4.05	1.191	1.260	
INDICES	**1.0000**			**4.57**	**4.84**	

CALCULO DEL FACTOR DE REAJUSTE DE PRECIOS

Pr = Po (0,190 B1/Bo + 0,028 C1/Co + 0,421 E1/Eo + 0,028 F1/Fo + 0,023 G1/Go + 0,012 M1/Mo + 0,150 P1/Po + 0,098 Q1/Qo + 0,050 X1/Xo)

COMPONENTE	COEFICIENTES FORMULA	INDICE 0 abril-2022	INDICE 1 FEB-2023	IND.1 / IND.o	FACTORES REAJUSTE	OBSERVACIONES
MANO DE OBRA (B)	0.19000	4.571	4.841	1.059	0.201	
CEMENTO PORTLAND-SACOS (C)	0.02800	184.780	185.130	1.002	0.028	*NACIONAL*
EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUC. VIAL (E)	0.42100	173.930	192.080	1.104	0.465	*NACIONAL*
PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO (F)	0.02800	395.970	307.940	0.778	0.022	*NACIONAL*
MALLAS METALICAS (GAVIONES) (G)	0.02300	344.030	358.320	1.042	0.024	*NACIONAL*
MADERA ASERRADA, CEPILLADA Y/O ESCUADRADA (PREPARADA) (M)	0.01200	518.270	513.810	0.991	0.012	*NACIONAL*
MATERIALES PETREOS-TUNGURAHUA (P)	0.15000	218.680	214.220	0.980	0.147	*PROV. TUNGURAHUA*
BETUN PETROLEO (ASFALTO) (O) (Q)	0.09800	746.200	746.200	1.000	0.098	*IPC NACIONAL*
VARIOS IPC TUNGURAHUA (X)	0.05000	108.030	110.380	1.022	0.051	I. G. CONSUMIDOR
FACTOR DE REAJUSTE	**1.0000**				**1.048**	

VALOR DE LA PLANILLA (P0)	5,291.15
FACTOR DE REAJUSTE	1.048
VALOR DE LA PLANILLA REAJUSTADO (Pr)	5,545.13
VALOR TOTAL DE REAJUSTE (R= Pr - P0)	**253.98**
VALOR REAJUSTE PROVISIONAL	
DIFERENCIA A CANCELAR	**253.98**

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 98/100

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN

PLANILLA 08 - LIQUIDACIÓN DE OBRA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

ANEXO:

CUADRO INFORMATIVO DE PLANILLAS TRAMITADAS

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR

CUADRO INFORMATIVO DE PLANILLAS TRAMITADAS

Contrato No.	COTO - GADPPz - 005 - 2022	**AVANCE FISICO**
Contratista:	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.	99.64%
Objeto:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	

Monto del Contrato:	789,464.3900	**Monto del Anticipo (40%):**	315,785.75	
Plazo en días:	180	**Fecha entrega de anticipo:**	04/07/2022	
Fecha acta de inicio:	01/09/2022	**Fecha fin contractual:**	27/02/2023	
Ampliaciones de plazo 01:	40 días	**Nueva fecha final - Ampliación 01:**	08/04/2023	
Ampliaciones de plazo 02:	10 días	**Nueva fecha final - Ampliación 02:**	18/04/2023	
Ampliaciones de plazo 03:	15 días	**Nueva fecha final - Ampliación 03:**	03/05/2023	
Suspensión de plazo:		**Fecha de suspensión:**		
Segunda ampliación:		**Nueva fecha final:**		

PLANILLA No.	PLANILLA OBRA	PLANILLA INCREMENTO	PLANILLA C + %	PLANILLA REAJUSTE	TOTAL PLANILLAS	ANTICIPO DEVENGADO
1	118,328.75			1,703.93	72,701.18	47,331.50
2	63,897.32	11,075.87		1,124.60	46,108.51	29,989.28
3	60,767.98	2,945.28		802.79	39,030.75	25,485.30
4	149,605.33	24,165.07		2,085.24	106,347.48	69,508.16
5	120,522.15	3,184.15		2,300.94	76,524.72	49,482.52
6	115,675.58	62,918.66		3,321.85	110,478.39	71,437.70
7	1,602.00	41,232.46		796.72	26,497.40	17,133.78
8	6,765.79	3,942.87		253.98	5,545.13	5,417.51
INCREMENTO DE OBRA N° 1		149,464.36				
REAJUSTE PROVISIONAL / DEFINITIVO DE ANTICIPO				12,390.05		
LIQUIDACIÓN DE REAJUSTES DEL CONTRATO						

	(A+B)				**A CANCELAR**	
Total	**637,164.90**	**149,464.36**	**0.00**	**12,390.05**	**483,233.56**	**315,785.75**
%	**80.71%**	**18.93%**	**0.00%**	**1.57%**	**61.21%**	**100.00%**

TOTAL EJECUTADO :	**786,629.26**
% RESPECTO DEL MONTO CONTRACTUAL :	**99.64%**
ANTICIPO POR DEVENGAR	**0.00**

Atentamente,

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER

FISCALIZACIÓN EXTERNA

PLANILLA 08 - LIQUIDACIÓN DE OBRA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

ANEXO:

REAJUSTES DEFINITIVOS

- **PLANILLA 01**
- **PLANILLA 02**
- **PLANILLA 03**

PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS

CONTRATANTE: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.	**PERIODO:**		*SEPTIEMBRE DE 2022*
PLANILLA No.		***PLANILLA DE AVANCE 01***	**MONTO PLANILLA:**	**USD**	118328.75
MONTO DEL CONTRATO:	**USD**	789464.39	**FECHA:**		18 DE MAYO DE 2023
MONTO ANTICIPO:	**USD**	315785.75			
FECHA DE PRESENTACION DE LA OFERTA:		*9-may.-22*	30 DIAS ANTES = Io		*9-abr.-22*

TIPO DE REAJUSTE: ***DEFINITIVO***

CALCULO DEL COMPONENTE MANO DE OBRA Bo y B1

CUADRILLA TIPO	FACTOR DE INCIDENCIA	SALARIO/H abr.-22	SALARIO/H dic.-22	COSTOS Bo	COSTOS B1	OBSERVACIONES
OPERADOR EQUIPO PESADO C1	0.0510	4.29	4.29	0.219	0.219	
OPERADOR EQUIPO PESADO C2	0.0240	4.09	4.09	0.098	0.098	
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3	0.0000	4.30	4.30	-	-	
CHOFER C1	0.3680	5.62	5.62	2.068	2.068	TABLA DE SALARIOS CONTRALORIA MES DICIEMBRE 2022
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	0.1030	4.29	4.29	0.442	0.442	
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	0.0000	4.09	4.09	-	-	
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	0.1430	3.87	3.87	0.553	0.553	
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	0.3110	3.83	3.83	1.191	1.191	
INDICES	**1.0000**			**4.57**	**4.57**	

CALCULO DEL FACTOR DE REAJUSTE DE PRECIOS

Pr = Po (0,123 (B1/B0) + 0,090 (C1/C0) + 0,045 (D1/DO) + 0,149 (E1/EO) + 0,023 (F1/FO) + 0,345 (G1/GO) + 0,139 (H1/HO) + 0,086 (X1/XO))

COMPONENTE	COEFICIENTES FORMULA	INDICE 0 abril-2022	INDICE 1 DIC-2022	IND.1 / IND.o	FACTORES REAJUSTE	OBSERVACIONES
MANO DE OBRA (B)	0.19000	4.571	4.571	1.000	0.190	
CEMENTO PORTLAND-SACOS (C)	0.02800	184.780	181.390	0.982	0.027	*NACIONAL*
EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUC. VIAL (E)	0.42100	173.930	184.950	1.063	0.448	*NACIONAL*
PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO (F)	0.02800	395.970	312.150	0.788	0.022	*NACIONAL*
MALLAS METALICAS (GAVIONES) (G)	0.02300	344.030	358.320	1.042	0.024	*NACIONAL*
MADERA ASERRADA, CEPILLADA Y/O ESCUADRADA (PREPARADA) (M)	0.01200	518.270	512.780	0.989	0.012	*NACIONAL*
MATERIALES PETREOS-TUNGURAHUA (P)	0.15000	218.680	214.220	0.980	0.147	*PROV. TUNGURAHUA*
BETUN PETROLEO (ASFALTO) (O) (Q)	0.09800	746.200	746.200	1.000	0.098	*IPC NACIONAL*
VARIOS IPC TUNGURAHUA (X)	0.05000	108.030	110.230	1.020	0.051	I. G. CONSUMIDOR
FACTOR DE REAJUSTE	**1.0000**				**1.019**	

VALOR DE LA PLANILLA (P0)	70,997.25
FACTOR DE REAJUSTE	1.02
VALOR DE LA PLANILLA REAJUSTADO (Pr)	72,346.20
VALOR TOTAL DE REAJUSTE (R= Pr - P0)	**1,348.95**
VALOR REAJUSTE PROVISIONAL	**1703.93**
DIFERENCIA A CANCELAR	**-354.98**

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 98/100

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN

PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS

CONTRATANTE: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.	**PERIODO:**		*OCTUBRE DE 2022*
PLANILLA No.		***PLANILLA DE AVANCE 02***	**MONTO PLANILLA:**	**USD**	74973.19
MONTO DEL CONTRATO:	**USD**	789464.39	**FECHA:**		18 DE MAYO DE 2023
MONTO ANTICIPO:	**USD**	315785.75			
FECHA DE PRESENTACION DE LA OFERTA:		*9-may.-22*	30 DIAS ANTES = lo		*9-abr.-22*

TIPO DE REAJUSTE: ***DEFINITIVA***

CALCULO DEL COMPONENTE MANO DE OBRA Bo y B1

CUADRILLA TIPO	FACTOR DE INCIDENCIA	SALARIO/H abr.-22	SALARIO/H dic.-22	COSTOS Bo	COSTOS B1	OBSERVACIONES
OPERADOR EQUIPO PESADO C1	0.0510	4.29	4.29	0.219	0.219	
OPERADOR EQUIPO PESADO C2	0.0240	4.09	4.09	0.098	0.098	
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3	0.0000	4.30	4.30	-	-	
CHOFER C1	0.3680	5.62	5.62	2.068	2.068	TABLA DE SALARIOS CONTRALORIA MES DICIEMBRE 2022
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	0.1030	4.29	4.29	0.442	0.442	
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	0.0000	4.09	4.09	-	-	
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	0.1430	3.87	3.87	0.553	0.553	
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	0.3110	3.83	3.83	1.191	1.191	
INDICES	**1.0000**			**4.57**	**4.57**	

CALCULO DEL FACTOR DE REAJUSTE DE PRECIOS

Pr = Po (0,123 (B1/B0) + 0,090 (C1/C0) + 0,045 (D1/DO) + 0,149 (E1/EO) + 0,023 (F1/FO) + 0,345 (G1/GO) + 0,139 (H1/HO) + 0,086 (X1/XO))

COMPONENTE	COEFICIENTES FORMULA	INDICE 0 abril-2022	INDICE 1 DIC-2022	IND.1 / IND.o	FACTORES REAJUSTE	OBSERVACIONES
MANO DE OBRA (B)	0.19000	4.571	4.571	1.000	0.190	
CEMENTO PORTLAND-SACOS (C)	0.02800	184.780	181.390	0.982	0.027	*NACIONAL*
EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUC. VIAL (E)	0.42100	173.930	184.950	1.063	0.448	*NACIONAL*
PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO (F)	0.02800	395.970	312.150	0.788	0.022	*NACIONAL*
MALLAS METALICAS (GAVIONES) (G)	0.02300	344.030	358.320	1.042	0.024	*NACIONAL*
MADERA ASERRADA, CEPILLADA Y/O ESCUADRADA (PREPARADA) (M)	0.01200	518.270	512.780	0.989	0.012	*NACIONAL*
MATERIALES PETREOS-TUNGURAHUA (P)	0.15000	218.680	214.220	0.980	0.147	*PROV. TUNGURAHUA*
BETUN PETROLEO (ASFALTO) (O) (Q)	0.09800	746.200	746.200	1.000	0.098	*IPC NACIONAL*
VARIOS IPC TUNGURAHUA (X)	0.05000	108.030	110.230	1.020	0.051	I. G. CONSUMIDOR
FACTOR DE REAJUSTE	**1.0000**				**1.019**	

VALOR DE LA PLANILLA (P0)	44983.91
FACTOR DE REAJUSTE	1.019
VALOR DE LA PLANILLA REAJUSTADO (Pr)	45838.60
VALOR TOTAL DE REAJUSTE (R= Pr - P0)	**854.69**
VALOR REAJUSTE PROVISIONAL	**1124.60**
DIFERENCIA A CANCELAR	**-269.91**

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 91/100

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN

PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS

CONTRATANTE:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA				
PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"				
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.		**PERIODO:**		*NOVIEMBRE DE 2022*
PLANILLA No.	***PLANILLA DE AVANCE 03***		**MONTO PLANILLA:**	**USD**	63713.26
MONTO DEL CONTRATO:	**USD**	789464.39	**FECHA:**		18 DE MAYO DE 2023
MONTO ANTICIPO:	**USD**	315785.75			
FECHA DE PRESENTACION DE LA OFERTA:	*9-may.-22*	30 DIAS ANTES = Io	*9-abr.-22*		

TIPO DE REAJUSTE: ***DEFINITIVO***

CALCULO DEL COMPONENTE MANO DE OBRA Bo y B1

CUADRILLA TIPO	FACTOR DE INCIDENCIA	SALARIO/H abr.-22	SALARIO/H feb.-23	COSTOS Bo	COSTOS B1	OBSERVACIONES
OPERADOR EQUIPO PESADO C1	0.0510	4.29	4.55	0.219	0.232	
OPERADOR EQUIPO PESADO C2	0.0240	4.09	4.33	0.098	0.104	
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3	0.0000	4.30	4.55	-	-	
CHOFER C1	0.3680	5.62	5.95	2.068	2.190	TABLA DE SALARIOS CONTRALORIA MES FEBRERO 2023
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	0.1030	4.29	4.55	0.442	0.469	
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	0.0000	4.09	4.33	-	-	
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	0.1430	3.87	4.10	0.553	0.586	
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	0.3110	3.83	4.05	1.191	1.260	
INDICES	**1.0000**			**4.57**	**4.84**	

CALCULO DEL FACTOR DE REAJUSTE DE PRECIOS

Pr = Po (0,190 B1/Bo + 0,028 C1/Co + 0,421 E1/Eo + 0,028 F1/Fo + 0,023 G1/Go + 0,012 M1/Mo + 0,150 P1/Po + 0,098 Q1/Qo + 0,050 X1/Xo)

COMPONENTE	COEFICIENTES FORMULA	INDICE 0 abril-2022	INDICE 1 FEB-2023	IND.1 / IND.o	FACTORES REAJUSTE	OBSERVACIONES
MANO DE OBRA (B)	0.19000	4.571	4.841	1.059	0.201	
CEMENTO PORTLAND-SACOS (C)	0.02800	184.780	185.130	1.002	0.028	*NACIONAL*
EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUC. VIAL (E)	0.42100	173.930	192.080	1.104	0.465	*NACIONAL*
PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO (F)	0.02800	395.970	307.940	0.778	0.022	*NACIONAL*
MALLAS METALICAS (GAVIONES) (G)	0.02300	344.030	358.320	1.042	0.024	*NACIONAL*
MADERA ASERRADA, CEPILLADA Y/O ESCUADRADA (PREPARADA) (M)	0.01200	518.270	513.810	0.991	0.012	*NACIONAL*
MATERIALES PETREOS-TUNGURAHUA (P)	0.15000	218.680	214.220	0.980	0.147	*PROV. TUNGURAHUA*
BETUN PETROLEO (ASFALTO) (O) (Q)	0.09800	746.200	746.200	1.000	0.098	*IPC NACIONAL*
VARIOS IPC TUNGURAHUA (X)	0.05000	108.030	110.380	1.022	0.051	I. G. CONSUMIDOR
FACTOR DE REAJUSTE	**1.0000**				**1.048**	

VALOR DE LA PLANILLA (P0)	38227.96
FACTOR DE REAJUSTE	1.048
VALOR DE LA PLANILLA REAJUSTADO (Pr)	40062.90
VALOR TOTAL DE REAJUSTE (R= Pr - P0)	**1834.94**
VALOR REAJUSTE PROVISIONAL	**802.79**
DIFERENCIA A CANCELAR	**1032.15**

SON: MIL TREINTA Y DOS DOLARES CON 15/100

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILER

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZACIÓN

PLANILLA 08 - LIQUIDACIÓN DE OBRA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

ANEXO:

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS-OFERTADO

PROYECTO: ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
UBICACION: PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	PERIODOS (MESES/SEMANAS) 1 MES 1 2 3 4	2 MES 5 6 7 8	3 MES 9 10 11 12	4 MES 13 14 15 16	5 MES 17 18 19 20	6 MES 21 22 23 24
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7.00	476.17	3,333.19000	3,333.19000					
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3.50	405.49	1,419.21500	283.84300	283.84300	283.84300	283.84300	283.84300	
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M³	9,419.69	0.72	6,782.17680	6,782.17680					
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189.90	11.34	2,153.46600	2,153.46600					
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M³	1,706.60	3.70	6,314.42000	6,314.42000					
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M³	368.64	3.94	1,452.44160	1,452.44160					
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M²	1,412.95	1.35	1,907.48250	1,907.48250					
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80.00	243.32	19,465.60000	19,465.60000					
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314.88	189.47	59,660.31360					29,830.15680	29,830.15680
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M³	91.84	177.81	16,330.07040	16,330.07040					
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770.00	60.24	46,384.80000	46,384.80000					
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M³	17,988.24	2.38	42,812.01120		42,812.01120				
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³	4,611.60	10.16	46,853.85600			46,853.85600			
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³	2,880.87	12.94	37,278.45780				37,278.45780		
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1,412.95	0.81	1,144.48950	1,144.48950					
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863,435.52	0.22	189,955.81440		189,955.81440				
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204,755.04	0.22	45,046.10880			45,046.10880			
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127,910.63	0.22	28,140.33860				28,140.33860		
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32,340.00	0.66	21,344.40000					21,344.40000	
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23,100.00	8.05	185,955.00000					185,955.00000	
	SEÑALIZACION										
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9,800.00	0.22	2,156.00000						2,156.00000
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875.00	5.36	4,690.00000						4,690.00000
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1.00	332.16	332.16000	332.16000					
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6.00	283.40	1,700.40000						1,700.40000
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6.00	283.40	1,700.40000						1,700.40000
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10.00	117.23	1,172.30000						1,172.30000
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100.00	117.23	11,723.00000						11,723.00000
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2.00	66.74	133.48000	22.69160	22.15768	22.15768	22.15768	22.15768	22.15768
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2.00	145.37	290.74000	49.42580	48.26284	48.26284	48.26284	48.26284	48.26284
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500.00	0.28	140.00000	23.80000	23.24000	23.24000	23.24000	23.24000	23.24000
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10.00	20.40	204.00000	34.68000	33.86400	33.86400	33.86400	33.86400	33.86400
	MEDIDAS AMBIENTALES										
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2.00	15.93	31.86000	5.41620	5.28876	5.28876	5.28876	5.28876	5.28876
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2.00	143.00	286.00000	48.62000	47.47600	47.47600	47.47600	47.47600	47.47600
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110.00	110.00000	110.00000					
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110.00	110.00000	110.00000					
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110.00	110.00000	110.00000					
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20.00	42.02	840.40000	142.86800	139.50640	139.50640	139.50640	139.50640	139.50640

INVERSION MENSUAL	789,464.39220	106,541.64140	233,371.46428	92,503.60348	66,022.43508	237,733.19548	53,292.05248
AVANCE MENSUAL (%)		13.50	29.56	11.72	8.36	30.11	6.75
INVERSION ACUMULADA AL 100% (linea e=1p)		106,541.64140	339,913.10568	432,416.70916	498,439.14424	736,172.33972	789,464.39220
AVANCE ACUMULADO (%)		13.50	43.06	54.77	63.14	93.25	100.00
INVERSION ACUMULADA AL 80% (linea e=0.5p)		85,233.31312	271,930.48454	345,933.36733	398,751.31539	588,937.87178	631,571.51376
AVANCE ACUMULADO (%)		10.80	34.44	43.82	50.51	74.60	80.00

PLAZO TOTAL: 6 MESES

Firmado electrónicamente por:
ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OFERENTE

PUYO, 07 DE MAYO DE 2022

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

CRONOGRAMA DE EQUIPO

PERIODOS

DESCRIPCION	1 MES				2 MES				3 MES				4 MES				5 MES				6 MES			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
BODCAT	4,266.50																							
CAMION CISTERNA									1,291.20				806.60											
CAMIONETA 1 TON	0.51				0.50				0.50				0.50				0.50				0.50			
CARGADORA FRONTAL																	4,620.00							
CONCRETERA 1 SACO	-164.05																669.13				669.13			
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO																	1,778.70							
EQUIPO TOPOGRAFICO	78.40				78.40				78.40				78.40				78.40							
ESCOBA MECANICA																	808.50							
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	8,357.70				7,555.20																			
MOTONIVELADORA					7,555.20				1,936.80				1,209.90											
MOTOSIERRA 7 HP	157.50																							
PLT. DE ASFALTO COMPLETA																	18,480.00							
RODILLO VIBRATORIO LISO					6,296.00				1,614.00				1,008.25				2,887.50							
RODILLO VIBRATORIO NEUMATICO																	2,887.50							
SOLDADORA ELECTRICA	5.58				3.98				3.98				3.98				3.98				771.98			
TERMINADORA DE ASFALTO																	7,507.50							
TRACTOR DE CARRIL					10,073.60																			
VIBRADOR	505.10																							
VOLQUETE	1,248.99				132,105.64				31,327.60				19,570.40								1,499.40			
HERRAMIENTA MENOR	1,498.46				8.61				100.84				66.23				909.87				788.42			

PARCIAL	15,954.69	163,677.13	36,353.32	22,744.26	40,631.57	3,729.43
ACUMULADO	15,954.69	179,631.81	215,985.13	238,729.39	279,360.96	283,090.39

PLAZO TOTAL: 6 MESES
PUYO, 07 DE MAYO DE 2022

Firmado electrónicamente por:
ANGEL MISAEL
LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OFERENTE

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

CRONOGRAMA DE PERSONAL (MANO DE OBRA)

DESCRIPCION	PERIODOS					
	1 MES (1 2 3 4)	2 MES (5 6 7 8)	3 MES (9 10 11 12)	4 MES (13 14 15 16)	5 MES (17 18 19 20)	6 MES (21 22 23 24)
CHOFER -- (CH C1)	413.10	43,672.76	10,719.56	6,696.58	181.94	495.87
INSPECTOR DE OBRA -- (EO B3)	0.73	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
MAESTRO MAYOR -- (EO C1)	9,611.39	3.13	280.09	176.15	577.24	1,675.48
TOPÓGRAFO 2 -- (EO C1)	42.04	42.04	42.04	42.04	42.04	
PERFILERO -- (EO C2)	8.18					
ALBAÑIL/CARPINTERO -- (EO D2)	-893.43	5.14	5.14	5.14	2,076.73	4,069.78
AYUDANTE DE MAQUINARIA -- (EO D2)	1,765.55	2,969.15	253.72	158.50	2,269.58	
CADENEROS -- (EO D2)	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78	
FIERRERO/PINTOR/PLOMERO -- (EO D2)	7.74					
PINTOR -- (EO D2)	2.63	2.57	2.57	2.57	2.57	993.29
PEON -- (EO E2)	7,705.70	5.91	253.17	160.37	11,960.30	9,109.40
OPERADOR 1 -- (OP C1)	1,927.28	3,241.14	276.96	173.02	990.99	
OPERADOR 2 -- (OP C2)		1,030.03	264.05	164.95	1,549.45	
PARCIAL	20,704.69	51,086.37	12,211.80	7,693.82	19,765.34	16,344.54
ACUMULADO	20,704.69	71,791.06	84,002.85	91,696.67	111,462.00	127,806.54

PLAZO TOTAL: 6 MESES
PUYO, 07 DE MAYO DE 2022

Firmado electrónicamente por:
ANGEL MISAEL
LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OFERENTE

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

CRONOGRAMA DE MATERIALES

DESCRIPCION	PERIODOS																					
	1 MES				2 MES				3 MES				4 MES				5 MES				6 MES			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACEITE QUEMADO -- (GLN)																								51.01
ADHESIVO CON LEYENDA - FOCO REFLECTIVO ALTO -- (M²)	108.89				19.32				19.32				19.32				19.32				2,946.42			
AGREGADOS TRITURADOS -- (M3)																	12,705.00							
AGUA -- (M3)	-0.16																0.32				0.32			
ALAMBRE DE AMARRE GALVANIZADO -- (KG)	12.12																							
ALAMBRE N°12 -- (KG)	1,016.40																							
ALFAGÍA -- (U)																	0.01				1,322.50			
ANGULO 30 X 3MM -- (M)																					616.00			
ARENA -- (M3)																	8,778.00							
ASFALTO AP-3 -- (KG)																	59,078.25							
ASFALTO DILUIDO RC-250 -- (KG)																	11,027.94							
BASE GRANULAR -- (M3)													29,730.54											
BOTAS DE CAUCHO -- (PAR)	40.80				39.84				39.84				39.84				39.84				39.84			
CAPACITACIÓN AMBIENTAL (INCLUYE MATERIALES Y TRANSPORTE)	300.00																							
CASCOS DE SEGURIDAD -- (U)	27.20				26.56				26.56				26.56				26.56				26.56			
CEMENTO PORTLAND -- (SACO)	-3,022.85																7,254.84				7,254.84			
CHALECO REFLECTIVO -- (U)	27.20				26.56				26.56				26.56				26.56				26.56			
CINTA DE POLIETILENO DEMARCATORIA (LEYENDA "PELIGRO"), 55 MI	20.40				19.92				19.92				19.92				19.92				19.92			
CLAVOS -- (KG)	-115.97																240.88				240.88			
CONO CON PROTECCION UV 71CM INCLY CINTA REFLECTIVA -- (U)	31.45				30.71				30.71				30.71				30.71				30.71			

CONTENEDOR DE 55 GALONES METÁLICO PARA DESECHOS PELIGRO	4.08	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98
DIESEL -- (LT)					4,375.60	
DIESEL GENERADOR PLANTA -- (GL)					20,408.85	
ELECTRODOS -- (KG)	0.90	0.88	0.88	0.88	0.88	154.88
ESTACAS DE MADERA -- (U)	15.40	15.40	15.40	15.40	15.40	
HIERRO ESTRUCTURAL -- (KG)	4.79					
HORMIGÓN CICLOPEO 180 KG/CM2 -- (M3)	71.28					928.62
KIT ANTIDERRAMES -- (U)	44.20	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16
LAM.E TOOL GALV. (0.60 X 0.80) 1.1MM -- (U)	1.50	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46
LAM.E TOOL GALV. (1.1 X 0.60) 1.1 MM -- (U)	3.01	2.94	2.94	2.94	2.94	2.94
LAM.E TOOL GALV. (2.44 X 1.22) 1.1MM -- (U)						2,019.77
MADERA, PUNTALES -- (ML)	482.16					
MADERA, TABLA ENCOFRADO/ 20CM -- (U)	1,102.08					
MADERA,LISTONES PARA MUROS 6*6 -- (ML)	734.72					
MADERA,TABLA ENCOFRADA /20CM -- (U)						2,833.92
MALLA NO12(2*1*1)TRIPLETORSION -- (U)	16,362.50					
MASCARILLA PARA GASES -- (U)	7.48	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30
MASCARILLAS ATRAPAPOLVO -- (U)	6.80	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64
MATERIAL DE RELLENO -- (M3)	663.56					
MATERIAL SUBBASE CLASE 3 -- (M3)			35,970.48			
PARES DE GUANTES -- (PAR)	10.20	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96
PEGAMENTO EPOXICO PARA TACHAS (KIT DOS COMPONENTES) -- ((						472.50
PERFIL ESTRUCURAL ACERO LAMINADO AL FRIO A36 -- (KG)	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
PERFILES Y CANALES DE ACERO -- (KG)	79.80					
PERNOS INOXIDABLES -- (U)	1.70	1.66	1.66	1.66	1.66	135.66
PETREOS, PIEDRA BOLA SELECCIO. -- (M3)	6,545.00					
PETREOS, RIPIO TRITURADO -- (M3)	-1,613.80				2,991.40	2,991.40
PETREOS,ARENA NEGRA -- (M3)	-1,027.26				2,267.10	2,267.10

PINGO -- (M)					0.00	251.91
PINTURA ANTICORROSIVA -- (GLN)	3.52	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
PINTURA ESMALTE -- (LT)	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	
PLANCHA DE TOL 1.22*2.44*1.1MM -- (U)	27.32					
SUELDA 60/11 -- (KG)	0.36					
TACHAS (CERAMICOS REFLECTIVOS) BIDIRECCIONALES Y UNIDIRECC						1,706.25
TAPONES AUDITIVOS -- (U)	10.20	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96
TIÑER -- (GLN)	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
TRANSPORTE MEZCLA ASFALTICA -- (M3*KM)					20,790.00	
TUB. ACERO CORRUGADO D=1200MM -- (ML)	16,010.40					
TUB. CUADRADO GALVANIZADO 1"*1"*1.5M -- (M)						221.36
TUBO CUAD. GALVAN. 2"*2"*2MM -- (M)	16.31	15.92	15.92	15.92	15.92	1,768.64
PARCIAL	38,014.99	283.94	36,254.42	30,014.48	150,202.11	28,414.09
ACUMULADO	38,014.99	38,298.93	74,553.35	104,567.83	254,769.93	283,184.02

PLAZO TOTAL: 6 MESES
PUYO, 07 DE MAYO DE 2022

Firmado electrónicamente por:
ANGEL MISAEL
LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OFERENTE

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

CRONOGRAMA DE PERSONAL TECNICO


DESCRIPCION	PERIODOS																			
	1 MES				2 MES				3 MES				4 MES				5 MES				6 MES			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
SUPERINTEDENTE DE OBRA	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
RESIDENTE DE OBRA	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
TECNICO AMBIENTAL		▬	▬			▬	▬			▬	▬			▬	▬			▬	▬			▬	▬	
TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	▬	▬			▬	▬			▬	▬			▬	▬			▬	▬			▬	▬		
TOPOGRAFO	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬				

PLAZO TOTAL: 6 MESES
PUYO, 07 DE MAYO DE 2022

Firmado electrónicamente por:
ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
OFERENTE

CUADRO DE INCIDENCIA DE COMPONENTES			
ITEM	DESCRIPCION	MONTO(USD)	COEFICIENTE DE INCIDENCIA(%)
1	MANO DE OBRA	136,602.80	18.95
2	EQUIPOS	283,759.54	39.37
3	MATERIALES	300,397.87	41.68
	SUBTOTAL(COSTO DIRECTO)	720,760.21	100.00

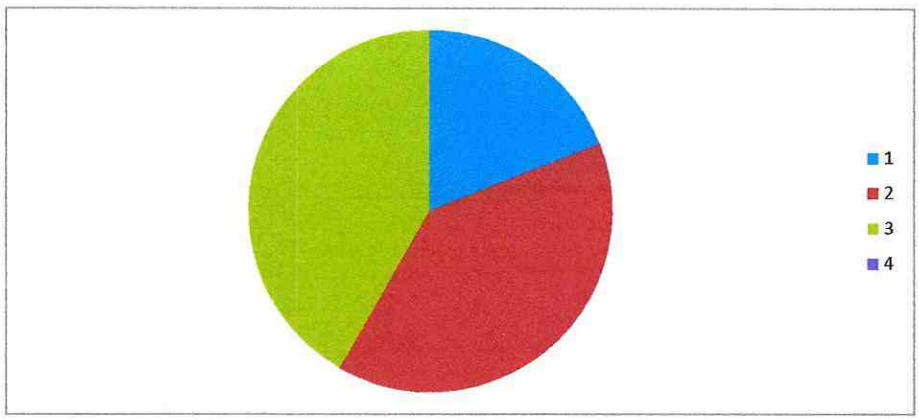

PLANILLA 08 - LIQUIDACIÓN DE OBRA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

ANEXO:

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS-REPROGRAMADO

REPROGRAMACIÓN

No. 05

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
UBICACION: PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

REPROGRAMACIÓN 05 - CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

PERIODOS (MESES/SEMANAS)

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	1 MES 1	2	3	4	2 MES 5	6	7	8	3 MES 9	10	11	12	4 MES 13	14	15	16	5 MES 17	18	19	20	6 MES 21	22	23	24	7 MES 25	26	27	28	8 MES 29	30	31	32	9 MES 33	34	35	36
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7.00	476.17	3,333.19000	95.23																																			
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3.50	405.49	1,419.21500	1,419.22																																			
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M³	9,419.69	0.72	6,782.17680	6,553.60				11,304.45				2,945.28								2,728.21				1,686.82															
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189.90	11.34	2,153.46600	81.65																																			
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M³	1,706.60	3.70	6,314.42000					643.06												1,577.68				2,214.08				1,269.84											
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M³	368.64	3.94	1,452.44160					1,122.90												785.48				212.01															
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M³	1,412.95	1.35	1,907.48250																	1,885.14																			
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80.00	243.32	19,465.60000																	5,450.37																			
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314.88	189.47	59,660.31360																	41,327.20				68,542.67				41,232.46											
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M³	91.84	177.81	16,330.07040																	2,574.69				10,183.18															
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770.00	60.24	46,384.80000					4,698.72																															
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M³	17,988.24	2.38	42,812.01120	16,782.55				8,349.23				9,863.89								6,759.99				10,134.23															
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³	4,611.60	10.16	46,853.85600	18,419.17				10,969.96				9,247.63												7,083.55															
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³	2,880.87	12.94	37,278.45780													26,560.00				6,449.30				6,001.57															
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1,412.95	0.81	1,144.48950	1,120.13												24,189.43																							
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863,435.52	0.22	189,955.81440	58,950.44				29,327.55				34,647.92								23,745.14				35,597.55															
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204,755.04	0.22	45,046.10880	13,959.41				8,313.84				7,008.54												5,368.44															
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127,910.63	0.22	28,140.33860													15,804.64				3,837.60				3,571.26															
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32,340.00	0.66	21,344.40000													11,039.44				2,661.12				2,882.88															
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23,100.00	8.05	185,955.00000													96,176.89				23,184.00				25,116.00															
	SEÑALIZACION																																								
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9,800.00	0.22	2,156.00000																													2,015.33							
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875.00	5.36	4,690.00000																													4,904.40							
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1.00	332.16	332.16000																									332.16											
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6.00	283.40	1,700.40000																													850.20							
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6.00	283.40	1,700.40000																													850.20							
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10.00	117.23	1,172.30000																													117.23							
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100.00	117.23	11,723.00000																													4,806.43							
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2.00	66.74	133.48000					133.48																															
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2.00	145.37	290.74000	290.74																																			
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500.00	0.28	140.00000	24.75																																			
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10.00	20.40	204.00000	204.00																																			
	MEDIDAS AMBIENTALES																																								
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2.00	15.93	31.86000	31.86																																			
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2.00	143.00	286.00000	286.00																																			
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110.00	110.00000	110.00																																			
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110.00	110.00000					110.00																															
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110.00	110.00000																	110.00																			
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20.00	42.02	840.40000																	630.30																			

INVERSION MENSUAL	789,464.39220	118,328.75	74,973.19	63,713.26	173,770.40	123,706.30	178,594.24	42,834.46	13,543.79	0,00
AVANCE MENSUAL (%)		14.99	9.50	8.07	22.01	15.67	22.62	5.43	1.72	0,00
INVERSION ACUMULADA AL 100% (linea e=1p)		118,328.75	193,301.94	257,015.20	430,785.60	554,491.90	733,086.14	775,920.60	789,464.39	789,464.39
AVANCE ACUMULADO (%)		14.99	24.49	32.56	54.57	70.24	92.86	98.28	100.00	100.00
INVERSION ACUMULADA AL 80% (linea e=0.5p)		94,663.00000	154,641.55	205,612.16	344,628.48	443,593.52	586,468.91	620,736.48	631,571.51	631,571.51
AVANCE ACUMULADO (%)		11.99	19.59	26.04	43.65	56.19	74.29	78.63	80.00	80.00

PLAZO CONTRACTUAL: 180 DIAS
PLAZO-AMPLIACION 01: 40 DIAS
PLAZO-AMPLIACION 02: 10 DIAS
PLAZO-AMPLIACION 03: 15 DIAS
PLAZO TOTAL: 245 DIAS

PUYO, 21 DE ABRIL DE 2023

Firmado electrónicamente por:
ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por:
OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Guaman Iler Omar Henry
FISCALIZADOR

Firmado electrónicamente por:
EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Gustavo Navas
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN [redacted] DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA [redacted]00), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

REPROGRAMACIÓN 05 - CRONOGRAMA DE EQUIPO

CRONOGRAMA DE EQUIPO

PERIODOS

DESCRIPCION	1 MES (1 2 3 4)	2 MES (5 6 7 8)	3 MES (9 10 11 12)	4 MES (13 14 15 16)	5 MES (17 18 19 20)	6 MES (21 22 23 24)	7 MES (25 26 27 28)	8 MES (29 30 31 32)	9 MES (33 34 35 36)
BODCAT		434.33			1,066.20	2,552.65		213.33	
CAMION CISTERNA	507.57	302.40	254.75	574.70	139.54	318.83			
CAMIONETA 1 TON	3.00								
CARGADORA FRONTAL				2,389.46	576.11	1,654.42			
CONCRETERA 1 SACO					1,006.66	234.85	601.85		
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO				919.94	221.80	636.95			
EQUIPO TOPOGRAFICO	392.00								
ESCOBA MECANICA				418.16	100.82	289.52			
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	7,648.69	1,795.59	1,788.76		2,377.95	2,301.91			
MOTONIVELADORA	3,722.99	1,926.86	2,122.85	862.05	1,402.28	664.86			
MOTOSIERRA 7 HP	4.50						153.00		
PLT. DE ASFALTO COMPLETA				9,557.86	2,304.46	6,617.69			
RODILLO VIBRATORIO LISO	3,102.50	1,605.72	1,769.04	2,211.79	1,528.64	1,588.06			
RODILLO VIBRATORIO NEUMATICO				1,493.42	360.07	1,034.01			
SOLDADORA ELECTRICA	12.00	12.00				1.50	768.00		
TERMINADORA DE ASFALTO				3,882.88	936.19	2,688.44			
TRACTOR DE CARRIL	3,948.85	1,964.35	2,320.96		1,590.62	248.82			
VIBRADOR					79.65	101.02	324.43		
VOLQUETE	51,453.00	26,180.19	28,967.51	11,007.11	19,657.41	21,433.12	27,053.69		
HERRAMIENTA MENOR	188.64	131.00	19.14	280.30	757.35	161.37	566.04	1,268.57	
PARCIAL	70,983.76	34,352.44	37,243.01	33,597.67	34,105.74	42,528.02	29,467.00	1,481.89	0,00
ACUMULADO	70,983.76	105,336.20	142,579.21	176,176.88	210,282.62	252,810.64	282,277.65	283,759.54	283,759.54

PLAZO TOTAL: 245 DIAS
PUYO, 21 DE ABRIL DE 2023

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILLER

Ing. Guaman Iler Omar Henry
FISCALIZADOR

Firmado electrónicamente por: EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Gustavo Navas
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

REPROGRAMACIÓN 05 - CRONOGRAMA DE MATERIALES

CRONOGRAMA DE MATERIALES

PERIODOS

DESCRIPCION	1 MES (1 2 3 4)	2 MES (5 6 7 8)	3 MES (9 10 11 12)	4 MES (13 14 15 16)	5 MES (17 18 19 20)	6 MES (21 22 23 24)	7 MES (25 26 27 28)	8 MES (29 30 31 32)	9 MES (33 34 35 36)
ACEITE QUEMADO -- (GLN)					70.67	10.20	21.15		
ADHESIVO CON LEYENDA - FOCO REFLECTIVO ALTO -- (M²)								3,132.60	
AGREGADOS TRITURADOS -- (M3)				6,571.03	1,584.31	2,274.83	2,274.83		
AGUA -- (M3)					0.46	0.09	0.12	0.10	
ALAMBRE DE AMARRE GALVANIZADO -- (KG)					1.91	2.42	2.42	5.36	
ALAMBRE Nº12 -- (KG)		102.96						913.44	
ALFAGÍA -- (U)					1,832.18	264.50	396.75	151.56	
ANGULO 30 X 3MM -- (M)							280.00	336.00	
ARENA -- (M3)				4,539.98	1,094.62	3,143.40			
ASFALTO AP-3 -- (KG)				30,555.27	7,367.06	21,155.92			
ASFALTO DILUIDO RC-250 -- (KG)				5,703.65	1,375.18	3,949.11			
BASE GRANULAR -- (M3)				21,183.01	5,143.38	3,404.15			
BOTAS DE CAUCHO -- (PAR)					180.00	60.00			
CAPACITACIÓN AMBIENTAL (INCLUYE MATERIALES Y TRANSPORTE)	100.00	100.00			100.00				
CASCOS DE SEGURIDAD -- (U)					120.00	40.00			
CEMENTO PORTLAND -- (SACO)					10,718.23	2,297.37	3,022.85	2,703.21	
CHALECO REFLECTIVO -- (U)					120.00	40.00			
CINTA DE POLIETILENO DEMARCATORIA (LEYENDA "PELIGRO"), 55 M	21.22					38.78	60.00		
CLAVOS -- (KG)					353.41	73.16	97.24	82.85	
CONO CON PROTECCION UV 71CM INCLY CINTA REFLECTIVA -- (U)	185.00								
CONTENEDOR DE 55 GALONES METÁLICO PARA DESECHOS PELIGR	24.00								
DIESEL -- (LT)				2,263.06	545.64	1,566.90			
DIESEL GENERADOR PLANTA -- (GL)				10,555.46	2,544.98	7,308.41			
ELECTRODOS -- (KG)	2.60	2.70					16.90	137.10	
ESTACAS DE MADERA -- (U)	77.00								
HIERRO ESTRUCTURAL -- (KG)						4.79			

HORMIGÓN CICLOPEO 180 KG/CM2 -- (M3)						71.28	346.50	582.12	
KIT ANTIDERRAMES -- (U)	260.00								
LAM.E TOOL GALV. (0.60 X 0.80) 1.1MM -- (U)		8.82							
LAM.E TOOL GALV. (1.1 X 0.60) 1.1 MM -- (U)	17.72								
LAM.E TOOL GALV. (2.44 X 1.22) 1.1MM -- (U)							2,019.77		
MADERA, PUNTALES -- (ML)					76.04	96.43	309.69		
MADERA, TABLA ENCOFRADO/ 20CM -- (U)					173.80	220.42	707.87		
MADERA,LISTONES PARA MUROS 6*6 -- (ML)					115.87	146.94	471.91		
MADERA,TABLA ENCOFRADA /20CM -- (U)					3,926.11	566.78	1,174.95		
MALLA NO12(2*1*1)TRIPLETORSION -- (U)		16,362.50							
MASCARILLA PARA GASES -- (U)					33.00		11.00		
MASCARILLAS ATRAPAPOLVO -- (U)					30.00		10.00		
MATERIAL DE RELLENO -- (M3)		513.00			150.56				
MATERIAL SUBBASE CLASE 3 -- (M3)	14,140.00	8,424.29	7,096.98		3,597.05	2,712.17			
PARES DE GUANTES -- (PAR)					45.00	15.00			
PEGAMENTO EPOXICO PARA TACHAS (KIT DOS COMPONENTES) --								472.50	
PERFIL ESTRUCURAL ACERO LAMINADO AL FRIO A36 -- (KG)		3.60							
PERFILES Y CANALES DE ACERO -- (KG)						79.80			
PERNOS INOXIDABLES -- (U)	8.00	2.00					50.00	84.00	
PETREOS, PIEDRA BOLA SELECCIO. -- (M3)		663.01						5,881.99	
PETREOS, RIPIO TRITURADO -- (M3)					4,361.53	873.80	1,172.94	952.13	
PETREOS,ARENA NEGRA -- (M3)					3,336.36	701.39	928.10	808.19	
PINGO -- (M)					348.99	50.38	75.57	28.87	
PINTURA ANTICORROSIVA -- (GLN)		2.75				3.05			
PINTURA ESMALTE -- (LT)	3.15								
PLANCHA DE TOL 1.22*2.44*1.1MM -- (U)						27.32			
SUELDA 60/11 -- (KG)						0.36			
TACHAS (CERAMICOS REFLECTIVOS) BIDIRECCIONALES Y UNIDIREC								1,706.25	
TAPONES AUDITIVOS -- (U)					45.00		15.00		
TIÑER -- (GLN)		0.39							
TRANSPORTE MEZCLA ASFALTICA -- (M3*KM)				10,752.59	2,592.51		7,444.90		
TUB. ACERO CORRUGADO D=1200MM -- (ML)					4,482.91		1,921.25	9,606.24	
TUB. CUADRADO GALVANIZADO 1"*1"*1.5M -- (M)								221.36	
TUBO CUAD. GALVAN. 2"*2"*2MM -- (M)	69.76	26.16					654.00	1,098.72	

PA[redacted]	14,908.44	26,212.18	7,096.98	92,124.04	[redacted]56,466.78	51,199.16	23,485.72	28,904.59	0,00
ACUMU[redacted]O	14,908.44	41,120.62	48,217.59	140,341.64	196,808.42	248,007.58	271,493.29	300,397.87	300,397.87

PLAZO TOTAL: 245 DIAS
PUYO, 21 DE ABRIL DE 2023

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILLER

Ing. Guaman Iler Omar Henry
FISCALIZADOR

Firmado electrónicamente por: EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Gustavo Navas
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO D[redacted]ISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABS[redacted]A 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

REPROGRAMACIÓN 05 - CRONOGRAMA MANO DE OBRA

CRONOGRAMA DE PERSONAL (MANO DE OBRA)

DESCRIPCION	PERIODOS																							
	1 MES				2 MES				3 MES				4 MES				5 MES				6 MES			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CHOFER -- (CH C1)	17,153.52				8,739.84				9,647.91				3,894.31				6,560.38				7,133.15			
INSPECTOR DE OBRA -- (EO B3)	0.76																				1.39			
MAESTRO MAYOR -- (EO C1)	141.45				1,033.19				54.64				123.28				936.42				237.85			
TOPÓGRAFO 2 -- (EO C1)	210.21																							
PERFILERO -- (EO C2)																					8.18			
ALBAÑIL/CARPINTERO -- (EO D2)	15.48				15.48												3,054.94				648.89			
AYUDANTE DE MAQUINARIA -- (EO D2)	1,877.65				748.91				740.44				1,286.76				1,102.10				274.31			
CADENEROS -- (EO D2)	568.89																							
FIERRERO/PINTOR/PLOMERO -- (EO D2)																					7.74			
PINTOR -- (EO D2)	15.48																							
PEON -- (EO E2)	192.48				1,034.43				48.78				3,111.79				9,879.86				1,813.15			
OPERADOR 1 -- (OP C1)	2,049.64				817.51				808.27				635.82				1,017.70				299.44			
OPERADOR 2 -- (OP C2)	507.57				262.70				289.42				918.90				384.39				60.09			
PARCIAL	22,733.12				12,652.06				11,589.47				9,970.85				22,935.80				10,484.19			
ACUMULADO	22,733.12				35,385.18				46,974.65				56,945.50				79,881.30				90,365.49			

DESCRIPCION	7 MES				8 MES				9 MES			
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
CHOFER -- (CH C1)	8,553.15				497.54							
INSPECTOR DE OBRA -- (EO B3)	2.15											
MAESTRO MAYOR -- (EO C1)	962.63				9,408.18							
TOPÓGRAFO 2 -- (EO C1)												
PERFILERO -- (EO C2)												
ALBAÑIL/CARPINTERO -- (EO D2)	1,243.05				2,362.22							
AYUDANTE DE MAQUINARIA -- (EO D2)	1,206.15				180.18							
CADENEROS -- (EO D2)												
FIERRERO/PINTOR/PLOMERO -- (EO D2)												
PINTOR -- (EO D2)	387.00				603.72							
PEON -- (EO E2)	6,600.18				12,664.74							
OPERADOR 1 -- (OP C1)	784.32				196.69							
OPERADOR 2 -- (OP C2)	585.41											
PARCIAL	20,324.04				25,913.27				0,00			
ACUMULADO	110,689.53				136,602.80				136,602.80			

PLAZO TOTAL: 245 DIAS
PUYO, 21 DE ABRIL DE 2023

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Guaman Iler Omar Henry
FISCALIZADOR

Firmado electrónicamente por: EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Gustavo Navas
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

REPROGRAMACIÓN 05 - PERSONAL TECNICO

CRONOGRAMA DE PERSONAL TECNICO

PERIODOS

DESCRIPCION	SEPT. 2022				OCT. 2022				NOV. 2022				DIC. 2022				ENERO. 2023				FEBRERO. 2023				MARZO. 2023				ABRIL. 2023				MAYO. 2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
SUPERINTENDENTE DE OBRA																																				
RESIDENTE DE OBRA																																				
TECNICO AMBIENTAL																																				
TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL																																				
TOPOGRAFO																																				

PLAZO TOTAL: 245 DIAS
PUYO, 21 DE ABRIL DE 2023

Firmado electrónicamente por:
ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por:
OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Guaman Iler Omar Henry
FISCALIZADOR

Firmado electrónicamente por:
EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Gustavo Navas
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA "
UBICACION: PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

CUADRO DE INCIDENCIA DE COMPONENTES

COMPONENTE	COSTO	PORCENTAJE
EQUIPOS	283,759.54	36
MANO DE OBRA	136,602.80	17
MATERIALES	300,397.87	38
TRANSPORTE	0.00	0
COSTOS INDIRECTOS	35,874.62	5
UTILIDAD	35,874.62	5
TOTAL :	789,464.39	100

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 21 DE ABRIL DE 2023
PLAZO TOTAL : 245 DIAS

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILER


Ing. Guaman Iler Omar Henry
FISCALIZADOR

Firmado electrónicamente por: EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Gustavo Navas
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"
UBICACION: PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

GRAFICO DE PORCENTAJES DE INCIDENCIA DE COMPONENTES

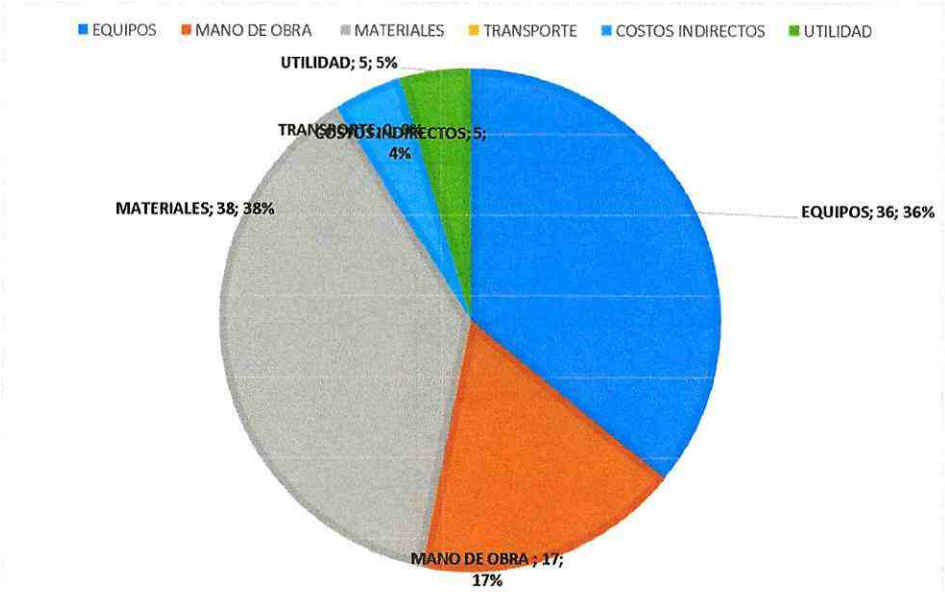

PUYO, 21 DE ABRIL DE 2023
PLAZO TOTAL : 245 DIAS

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Guaman Iler Omar Henry
FISCALIZADOR

Firmado electrónicamente por: EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Gustavo Navas
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

REPROGRAMACIÓN

No. 04

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
UBICACION: PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

REPROGRAMACIÓN 04 - CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PERIODOS (MESES/SEMANAS) 1 MES 1	2	3	4	2 MES 5	6	7	8	3 MES 9	10	11	12	4 MES 13	14	15	16	5 MES 17	18	19	20	6 MES 21	22	23	24	7 MES 25	26	27	28	8 MES 29	30	31	32
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7.00	476.17	3,333.19000	95.23																															
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3.50	405.49	1,419.21500	1,419.22																															
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M³	9,419.69	0.72	6,782.17680	6,553.60				11,304.45				2,945.28								2,728.21				1,686.82											
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189.90	11.34	2,153.46600	81.65																															
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M³	1,706.60	3.70	6,314.42000					643.06												1,577.68				2,214.08				1,269.84						
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M³	368.64	3.94	1,452.44160					1,122.90												785.48				212.01										
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M³	1,412.95	1.35	1,907.48250																	1,885.14														
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80.00	243.32	19,465.60000																	5,450.37														
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314.88	189.47	59,660.31360																	41,327.20				68,542.67				41,232.46						
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M³	91.84	177.81	16,330.07040																	2,574.69				10,183.18										
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770.00	60.24	46,384.80000					4,698.72																											
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M³	17,988.24	2.38	42,812.01120	16,782.55				8,349.23				9,863.89								6,759.99				10,134.23										
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³	4,611.60	10.16	46,853.85600	18,419.17				10,969.96				9,247.63												7,083.55										
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³	2,880.87	12.94	37,278.45780													26,560.00				6,449.30				6,001.57										
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1,412.95	0.81	1,144.48950	1,120.13												24,189.43																		
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863,435.52	0.22	189,955.81440	58,950.44				29,327.55				34,647.92								23,745.14				35,597.55										
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204,755.04	0.22	45,046.10880	13,959.41				8,313.84				7,008.54												5,368.44										
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127,910.63	0.22	28,140.33860													15,804.64				3,837.68				3,571.26										
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32,340.00	0.66	21,344.40000													11,039.44				2,661.12				2,882.88										
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23,100.00	8.05	185,955.00000													96,176.89				23,184.00				25,116.00										
	SEÑALIZACION																																				
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9,800.00	0.22	2,156.00000																													2,015.33			
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875.00	5.36	4,690.00000																													4,904.40			
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1.00	332.16	332.16000																									332.16						
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6.00	283.40	1,700.40000																													850.20			
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6.00	283.40	1,700.40000																													850.20			
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10.00	117.23	1,172.30000																													117.23			
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100.00	117.23	11,723.00000																													4,806.43			
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2.00	66.74	133.48000					133.48																											
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2.00	145.37	290.74000	290.74																															
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500.00	0.28	140.00000	24.75																															
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10.00	20.40	204.00000	204.00																															
	MEDIDAS AMBIENTALES																																				
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2.00	15.93	31.86000	31.86																															
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2.00	143.00	286.00000	286.00																															
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110.00	110.00000	110.00																															

35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110.00	110.00000		110.00						
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110.00	110.00000					110.00			
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20.00	42.02	840.40000					630.30			
INVERSION MENSUAL					789,464.39220	118,328.75	74,973.19	63,713.26	173,770.40	123,706.30	178,594.24	42,834.46	13,543.79
AVANCE MENSUAL (%)						14.99	9.50	8.07	22.01	15.67	22.62	5.43	1.72
INVERSION ACUMULADA AL 100% (linea e=1p)						118,328.75	193,301.94	257,015.20	430,785.60	554,491.90	733,086.14	775,920.60	789,464.39
AVANCE ACUMULADO (%)						14.99	24.49	32.56	54.57	70.24	92.86	98.28	100.00
INVERSION ACUMULADA AL 80% (linea e=0.5p)						94,663.00000	154,641.55	205,612.16	344,628.48	443,593.52	586,468.91	620,736.48	631,571.51
AVANCE ACUMULADO (%)						11.99	19.59	26.04	43.65	56.19	74.29	78.63	80.00

PLAZO CONTRACTUAL: 180 DIAS
PLAZO-AMPLIACION 01: 40 DIAS
PLAZO-AMPLIACION 02: 10 DIAS
PLAZO TOTAL: 230 DIAS

PUYO, 17 DE ABRIL DE 2023

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILLER

Ing. Guaman Iler Omar Henry
FISCALIZADOR

Firmado electrónicamente por: EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Gustavo Navas
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO [redacted] PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA AB[redacted]SA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

REPROGRAMACIÓN 04 - CRONOGRAMA DE EQUIPO

CRONOGRAMA DE EQUIPO

PERIODOS

DESCRIPCION	1 MES				2 MES				3 MES				4 MES				5 MES				6 MES				7 MES				8 MES			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
BODCAT					434.33												1,066.20				2,552.65								213.33			
CAMION CISTERNA	507.57				302.40				254.75				574.70				139.54				318.83											
CAMIONETA 1 TON	3.00																															
CARGADORA FRONTAL													2,389.46				576.11				1,654.42											
CONCRETERA 1 SACO																	1,006.66				234.85				601.85							
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO													919.94				221.80				636.95											
EQUIPO TOPOGRAFICO	392.00																															
ESCOBA MECANICA													418.16				100.82				289.52											
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	7,648.69				1,795.59				1,788.76								2,377.95				2,301.91											
MOTONIVELADORA	3,722.99				1,926.86				2,122.85				862.05				1,402.28				664.86											
MOTOSIERRA 7 HP	4.50																								153.00							
PLT. DE ASFALTO COMPLETA													9,557.86				2,304.46				6,617.69											
RODILLO VIBRATORIO LISO	3,102.50				1,605.72				1,769.04				2,211.79				1,528.64				1,588.06											
RODILLO VIBRATORIO NEUMATICO													1,493.42				360.07				1,034.01											
SOLDADORA ELECTRICA	12.00				12.00																1.50				768.00							
TERMINADORA DE ASFALTO													3,882.88				936.19				2,688.44											
TRACTOR DE CARRIL	3,948.85				1,964.35				2,320.96								1,590.62				248.82											
VIBRADOR																	79.65				101.02				324.43							
VOLQUETE	51,453.00				26,180.19				28,967.51				11,007.11				19,657.41				21,433.12				27,053.69							
HERRAMIENTA MENOR	188.64				131.00				19.14				280.30				757.35				161.37				566.04				1,268.57			
PARCIAL	70,983.76				34,352.44				37,243.01				33,597.67				34,105.74				42,528.02				29,467.00				1,481.89			
ACUMULADO	70,983.76				105,336.20				142,579.21				176,176.88				210,282.62				252,810.64				282,277.65				283,759.54			

PLAZO TOTAL: 230 DIAS
PUYO, 17 DE ABRIL DE 2023

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Guaman Iler Omar Henry
FISCALIZADOR

Firmado electrónicamente por: EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Gustavo Navas
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

REPROGRAMACIÓN 04 - CRONOGRAMA DE MATERIALES

CRONOGRAMA DE MATERIALES

DESCRIPCION	PERIODOS																											
	1 MES				2 MES				3 MES				4 MES				5 MES				6 MES				7 MES				8 MES			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
ACEITE QUEMADO -- (GLN)																	70.67				10.20				21.15							
ADHESIVO CON LEYENDA - FOCO REFLECTIVO ALTO -- (M²)																													3,132.60			
AGREGADOS TRITURADOS -- (M3)													6,571.03				1,584.31				2,274.83				2,274.83							
AGUA -- (M3)																	0.46				0.09				0.12				0.10			
ALAMBRE DE AMARRE GALVANIZADO -- (KG)																	1.91				2.42				2.42				5.36			
ALAMBRE Nº12 -- (KG)						102.96																							913.44			
ALFAGÍA -- (U)																	1,832.18				264.50				396.75				151.56			
ANGULO 30 X 3MM -- (M)																									280.00				336.00			
ARENA -- (M3)													4,539.98				1,094.62				3,143.40											
ASFALTO AP-3 -- (KG)													30,555.27				7,367.06				21,155.92											
ASFALTO DILUIDO RC-250 -- (KG)													5,703.65				1,375.18				3,949.11											
BASE GRANULAR -- (M3)													21,183.01				5,143.38				3,404.15											
BOTAS DE CAUCHO -- (PAR)																	180.00				60.00											
CAPACITACIÓN AMBIENTAL (INCLUYE MATERIALES Y TRANSPORTE)	100.00				100.00												100.00															
CASCOS DE SEGURIDAD -- (U)																	120.00				40.00											
CEMENTO PORTLAND -- (SACO)																	10,718.23				2,297.37				3,022.85				2,703.21			
CHALECO REFLECTIVO -- (U)																	120.00				40.00											
CINTA DE POLIETILENO DEMARCATORIA (LEYENDA "PELIGRO"), 55 MI	21.22																				38.78				60.00							
CLAVOS -- (KG)																	353.41				73.16				97.24				82.85			
CONO CON PROTECCION UV 71CM INCLY CINTA REFLECTIVA -- (U)	185.00																															
CONTENEDOR DE 55 GALONES METÁLICO PARA DESECHOS PELIGRO	24.00																															
DIESEL -- (LT)													2,263.06				545.64				1,566.90											

DIESEL GENERADOR PLANTA -- (GL)				10,555.46	2,544.98	7,308.41		
ELECTRODOS -- (KG)	2.60	2.70					16.90	137.10
ESTACAS DE MADERA -- (U)	77.00							
HIERRO ESTRUCTURAL -- (KG)						4.79		
HORMIGÓN CICLOPEO 180 KG/CM2 -- (M3)						71.28	346.50	582.12
KIT ANTIDERRAMES -- (U)	260.00							
LAM.E TOOL GALV. (0.60 X 0.80) 1.1MM -- (U)		8.82						
LAM.E TOOL GALV. (1.1 X 0.60) 1.1 MM -- (U)	17.72							
LAM.E TOOL GALV. (2.44 X 1.22) 1.1MM -- (U)							2,019.77	
MADERA, PUNTALES -- (ML)					76.04	96.43	309.69	
MADERA, TABLA ENCOFRADO/ 20CM -- (U)					173.80	220.42	707.87	
MADERA,LISTONES PARA MUROS 6*6 -- (ML)					115.87	146.94	471.91	
MADERA,TABLA ENCOFRADA /20CM -- (U)					3,926.11	566.78	1,174.95	
MALLA NO12(2*1*1)TRIPLETORSION -- (U)		16,362.50						
MASCARILLA PARA GASES -- (U)					33.00		11.00	
MASCARILLAS ATRAPAPOLVO -- (U)					30.00		10.00	
MATERIAL DE RELLENO -- (M3)		513.00			150.56			
MATERIAL SUBBASE CLASE 3 -- (M3)	14,140.00	8,424.29	7,096.98		3,597.05	2,712.17		
PARES DE GUANTES -- (PAR)					45.00	15.00		
PEGAMENTO EPOXICO PARA TACHAS (KIT DOS COMPONENTES) -- ((								472.50
PERFIL ESTRUCURAL ACERO LAMINADO AL FRIO A36 -- (KG)		3.60						
PERFILES Y CANALES DE ACERO -- (KG)						79.80		
PERNOS INOXIDABLES -- (U)	8.00	2.00					50.00	84.00
PETREOS, PIEDRA BOLA SELECCIO. -- (M3)		663.01						5,881.99
PETREOS, RIPIO TRITURADO -- (M3)					4,361.53	873.80	1,172.94	952.13
PETREOS,ARENA NEGRA -- (M3)					3,336.36	701.39	928.10	808.19
PINGO -- (M)					348.99	50.38	75.57	28.87
PINTURA ANTICORROSIVA -- (GLN)		2.75				3.05		
PINTURA ESMALTE -- (LT)	3.15							
PLANCHA DE TOL 1.22*2.44*1.1MM -- (U)						27.32		

SUELDA 60/11 -- (KG)						0.36		
TACHAS (CERAMICOS REFLECTIVOS) BIDIRECCIONALES Y UNIDIRECC								1,706.25
TAPONES AUDITIVOS -- (U)					45.00		15.00	
TIÑER -- (GLN)		0.39						
TRANSPORTE MEZCLA ASFALTICA -- (M3*KM)				10,752.59	2,592.51		7,444.90	
TUB. ACERO CORRUGADO D=1200MM -- (ML)					4,482.91		1,921.25	9,606.24
TUB. CUADRADO GALVANIZADO 1"*1"*1.5M -- (M)								221.36
TUBO CUAD. GALVAN. 2"*2"*2MM -- (M)	69.76	26.16					654.00	1,098.72
PARCIAL	14,908.44	26,212.18	7,096.98	92,124.04	56,466.78	51,199.16	23,485.72	28,904.59
ACUMULADO	14,908.44	41,120.62	48,217.59	140,341.64	196,808.42	248,007.58	271,493.29	300,397.87

PLAZO TOTAL: 230 DIAS
PUYO, 17 DE ABRIL DE 2023

Firmado electrónicamente por:
ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por:
OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Guaman Iler Omar Henry
FISCALIZADOR

Firmado electrónicamente por:
EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Gustavo Navas
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

REPROGRAMACIÓN 04 - CRONOGRAMA MANO DE OBRA

CRONOGRAMA DE PERSONAL (MANO DE OBRA)

DESCRIPCION	PERIODOS							
	1 MES (1 2 3 4)	2 MES (5 6 7 8)	3 MES (9 10 11 12)	4 MES (13 14 15 16)	5 MES (17 18 19 20)	6 MES (21 22 23 24)	7 MES (25 26 27 28)	8 MES (29 30 31 32)
CHOFER -- (CH C1)	17,153.52	8,739.84	9,647.91	3,894.31	6,560.38	7,133.15	8,553.15	497.54
INSPECTOR DE OBRA -- (EO B3)	0.76					1.39	2.15	
MAESTRO MAYOR -- (EO C1)	141.45	1,033.19	54.64	123.28	936.42	237.85	962.63	9,408.18
TOPÓGRAFO 2 -- (EO C1)	210.21							
PERFILERO -- (EO C2)						8.18		
ALBAÑIL/CARPINTERO -- (EO D2)	15.48	15.48			3,054.94	648.89	1,243.05	2,362.22
AYUDANTE DE MAQUINARIA -- (EO D2)	1,877.65	748.91	740.44	1,286.76	1,102.10	274.31	1,206.15	180.18
CADENEROS -- (EO D2)	568.89							
FIERRERO/PINTOR/PLOMERO -- (EO D2)						7.74		
PINTOR -- (EO D2)	15.48						387.00	603.72
PEON -- (EO E2)	192.48	1,034.43	48.78	3,111.79	9,879.86	1,813.15	6,600.18	12,664.74
OPERADOR 1 -- (OP C1)	2,049.64	817.51	808.27	635.82	1,017.70	299.44	784.32	196.69
OPERADOR 2 -- (OP C2)	507.57	262.70	289.42	918.90	384.39	60.09	585.41	
PARCIAL	22,733.12	12,652.06	11,589.47	9,970.85	22,935.80	10,484.19	20,324.04	25,913.27
ACUMULADO	22,733.12	35,385.18	46,974.65	56,945.50	79,881.30	90,365.49	110,689.53	136,602.80

PLAZO TOTAL: 230 DIAS
PUYO, 17 DE ABRIL DE 2023

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Guaman Iler Omar Henry
FISCALIZADOR

Firmado electrónicamente por: EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Gustavo Navas
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

REPROGRAMACIÓN 04 - PERSONAL TECNICO

CRONOGRAMA DE PERSONAL TECNICO

PERIODOS

DESCRIPCION	SEPT. 2022				OCT. 2022				NOV. 2022				DIC. 2022				ENERO. 2023				FEBRERO. 2023				MARZO. 2023				ABRIL. 2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
SUPERINTENDENTE DE OBRA																																
RESIDENTE DE OBRA																																
TECNICO AMBIENTAL																																
TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL																																
TOPOGRAFO																																

PLAZO TOTAL: 230 DIAS

PUYO, 17 DE ABRIL DE 2023

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Guaman Iler Omar Henry

FISCALIZADOR

Firmado electrónicamente por: EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Gustavo Navas

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA "
UBICACION: PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

CUADRO DE INCIDENCIA DE COMPONENTES

COMPONENTE	COSTO	PORCENTAJE
EQUIPOS	283,759.54	36
MANO DE OBRA	136,602.80	17
MATERIALES	300,397.87	38
TRANSPORTE	0.00	0
COSTOS INDIRECTOS	35,874.62	5
UTILIDAD	35,874.62	5
TOTAL :	789,464.39	100

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 17 DE ABRIL DE 2023
PLAZO TOTAL : 230 DIAS

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILER


Ing. Guaman Iler Omar Henry
FISCALIZADOR

Firmado electrónicamente por: EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Gustavo Navas
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"
UBICACION: PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

GRAFICO DE PORCENTAJES DE INCIDENCIA DE COMPONENTES

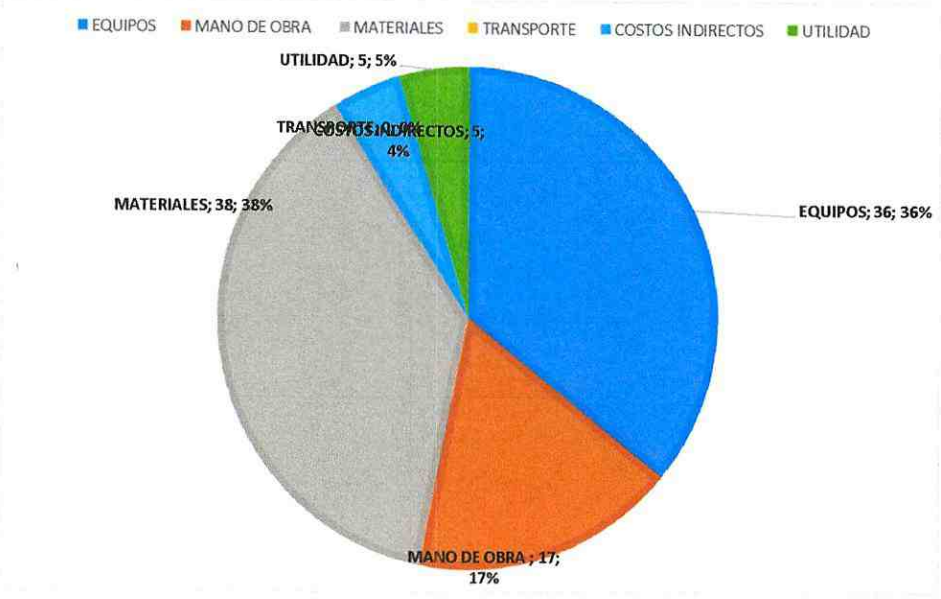

PUYO, 17 DE ABRIL DE 2023
PLAZO TOTAL : 230 DIAS

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Guaman Iler Omar Henry
FISCALIZADOR

Firmado electrónicamente por: EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Gustavo Navas
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

PLANILLA 08 - LIQUIDACIÓN DE OBRA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

ANEXO:

LIBRO DE OBRA (COPIAS)

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	N° 213

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. **CONTRATO:** COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ **FECHA:** 1/04/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Se suspenden trabajos de marcas en pavimento por motivo de lluvia intensa, por un periodo de 8 horas

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:		OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:		OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	2	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	1	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	
OPERADOR 1 OPC1:		OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	
FIERRERO:		OTRO:	VIBRADOR:	
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:	2	OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS: Camioneta con mecanismo rociador	1

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:			
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:		X	4 Horas
LLUVIA FUERTE:	X		4 Horas

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA	Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR	SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 214

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 2/04/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Mantenimiento de equipos.

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:		OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:		OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:		OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	1	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	
OPERADOR 1 OPC1:		OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	
FIERRERO:	1	OTRO:	VIBRADOR:	
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:	2	OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS: Camioneta con mecanismo vaciador	1

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:	X		4 Horas
DESPEJADO:			
NUBLADO:		X	4 Horas.
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:			

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR

SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	N° 215

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 31/04/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Marcas en pavimento desde la abscisa 0+000 – 0+835

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:		OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:		OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	2	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	1	OTRO:	CONCRETERA 1 SACC:	
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	
OPERADOR 1 OPC1:		OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	
FIERRERO:		OTRO:	VIBRADOR:	
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:	2	OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS: Camioneta con mecanismo rociador	1

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:	x		4 Horas
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:		x	4 Horas
LLUVIA FUERTE:			

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR

SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	N° 216

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. **CONTRATO:** COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ **FECHA:** 4/04/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Marcas en pavimento desde la abscisa 0+860 - 1+560.

PERSONAL:			*EQUIPOS:*	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:		OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:		OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	2	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	1	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	
OPERADOR 1 OPC1:		OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	
FIERRERO:	1	OTRO:	VIBRADOR:	
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:	2	OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS: Camioneta con mecanismo vaciador	1

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:	X		4 Horas
DESPEJADO:		X	4 Horas.
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:			

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR

SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 217

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 5/04/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Se suspenden trabajos de marcas en pavimento por motivo de lluvia intensa, por un periodo de 8 horas.

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:		OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:		OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	2	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	1	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	
OPERADOR 1 OPC1:		OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	
FIERRERO:	1	OTRO:	VIBRADOR:	
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:	2	OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS: Camioneta con mecanismo nociador	1

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:			
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:	x	x	8 Horas.

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA

Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR

SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	N° 218

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. **CONTRATO:** COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ **FECHA:** 6/04/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Se suspenden trabajos de marcas en pavimento por motivo de lluvia intensa, por un periodo de 3 horas.

PERSONAL:			***EQUIPOS:***	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:		OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:		OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	2	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	1	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	
OPERADOR 1 OPC1:		OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	
FIERRERO:	1	OTRO:	VIBRADOR:	
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:	2	OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS: Camioneta con mecanismo rociadores	1

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:			
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:	x	x	3 Horas.

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA	Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR	SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 219

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 7/04/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Marcas en pavimento desde la abscisa 1+560 – 2+260.

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:		OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:		OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	2	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	1	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	
OPERADOR 1 OPC1:		OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	
FIERRERO:	1	OTRO:	VIBRADOR:	
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:	2	OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS: Camioneta con mecanismo reciador	1

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:	X	X	8 Horas.
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:			

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA	Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR	SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	N° 220

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. **CONTRATO:** COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ **FECHA:** 8/04/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Se suspenden trabajos de marcas en pavimento por motivo de lluvia intensa, por un periodo de 8 horas.

PERSONAL:			***EQUIPOS:***	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:		OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:		OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	2	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	1	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	
OPERADOR 1 OPC1:		OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	
FIERRERO:	1	OTRO:	VIBRADOR:	
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:	2	OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS: Camioneta con mecanismo rociador	1

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:			
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:	x	x	8 Horas.

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA	Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR	SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	N° 221

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. **CONTRATO:** COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ **FECHA:** 8/04/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Mantenimiento de equipos, herramienta menor

PERSONAL:			*EQUIPOS:*	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:		OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:		OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	2	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	1	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	
OPERADOR 1 OPC1:		OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	
FIERRERO:	1	OTRO:	VIBRADOR:	
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:	2	OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS: Camioneta con mecanismo reciador	1

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:		X	4 Horas
DESPEJADO:	X		4 Horas.
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:			

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA	Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR	SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 222

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 10/04/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Marcas en pavimento desde la abscisa 2+960 - 3+000.

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:		OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:		OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	2	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	1	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	
OPERADOR 1 OPC1:		OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	
FIERRERO:	1	OTRO:	VIBRADOR:	
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:	2	OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS: Camioneta con mecanismo vaciador	1

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:	x	x	8 Horas.
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:			

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA	Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR	SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 224

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 12/04/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Colocación de 4 señales preventivas.

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:		OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:		OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	2	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	1	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	
OPERADOR 1 OPC1:		OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	1
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	1
FIERRERO:	1	OTRO:	VIBRADOR:	
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:	X		4 Horas
DESPEJADO:		X	4 Horas
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:			

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA	Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR	SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 225

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. **CONTRATO:** COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ **FECHA:** 13/04/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Colocación de 4 señales preventivas.

PERSONAL:			***EQUIPOS:***	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:		OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:		OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	2	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	1	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	
OPERADOR 1 OPC1:		OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	1
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	1
FIERRERO:	1	OTRO:	VIBRADOR:	
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:			
DESPEJADO:	X		4 Horas
NUBLADO:		X	4 Horas
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:			

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA	Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR	SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 226

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 14/04/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Colocación de 5 señales preventivas.

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:		OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:		OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	2	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	1	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	
OPERADOR 1 OPC1:		OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	1
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	1
FIERRERO:	1	OTRO:	VIBRADOR:	
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:	X	X	8 Horas
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:			

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR

SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 227

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 15/04/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Colocación de 4 señales preventivas.

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:		OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:		OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	2	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	1	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	
OPERADOR 1 OPC1:		OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	1
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	1
FIERRERO:	1	OTRO:	VIBRADOR:	
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:			
DESPEJADO:	X	X	8 Horas
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:			

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR

SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 228

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. **CONTRATO:** COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ **FECHA:** 16/04/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Mantenimiento de equipos y herramienta menor.

PERSONAL:			***EQUIPOS:***	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:		OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:		OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	2	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	1	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	
OPERADOR 1 OPC1:		OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	1
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	1
FIERRERO:	1	OTRO:	VIBRADOR:	
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:	X	X	8 Horas.
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:			

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA	Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR	SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 223

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 11/04/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Se suspenden trabajos de colocación de señaletica preventiva (0,75x0,75)m² por motivo de lluvia intensa, por un periodo de 8 horas.

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:		OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:		OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	2	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	1	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	
OPERADOR 1 OPC1:		OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	1
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	1
FIERRERO:	1	OTRO:	VIBRADOR:	
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:			
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:	x	x	8 Horas

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA	Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR	SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 229

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 17/04/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Colocación de 3 señales preventivas.

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:		OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:		OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	2	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	1	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	
OPERADOR 1 OPC1:		OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	1
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	1
FIERRERO:	1	OTRO:	VIBRADOR:	
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:			
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:			

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA	Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR	SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	N° 230

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 18/04/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Se suspenden los trabajos de colocación de señaletica preventiva (0,75x0,75) m² por motivo de lluvia intensa por un periodo de 8 Horas

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:		OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:		OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	2	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	1	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	
OPERADOR 1 OPC1:		OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	1
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	1
FIERRERO:	1	OTRO:	VIBRADOR:	
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:			
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:	x	x	8 Horas.

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA	Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR	SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	N° 231

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 19/04/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Colocación de 5 señales preventivas.

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:		OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:		OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	2	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	1	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	
OPERADOR 1 OPC1:		OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	1
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	1
FIERRERO:	1	OTRO:	VIBRADOR:	
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:	X	X	8 Horas.
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:			

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA	Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR	SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	N° 232

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 20/04/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Colocación de 4 señales preventivas.

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:		OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:		OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	2	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	1	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	
OPERADOR 1 OPC1:		OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	1
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	1
FIERRERO:	1	OTRO:	VIBRADOR:	
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:	X	X	8 Horas.
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:			

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR

SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	N° 233

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. **CONTRATO:** COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ **FECHA:** 21/04/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Suspensión de trabajos de colocación de señaletica preventiva (0,75x0,75)m² por motivo de lluvia intensa, por un periodo de 8 horas

PERSONAL:			***EQUIPOS:***	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:		OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:		OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	2	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	1	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	
OPERADOR 1 OPC1:		OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	1
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	1
FIERRERO:	1	OTRO:	VIBRADOR:	
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:			
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:	x	x	8 Horas.

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA	Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR	SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 234

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 22/04/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Suspención de trabajos de colocación de señaletica preventiva (0,75x0,75)m² por motivo de lluvia intensa, por un periodo de 8 horas.

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:		OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:		OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	2	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	1	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	
OPERADOR 1 OPC1:		OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	1
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	1
FIERRERO:	1	OTRO:	VIBRADOR:	
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:			
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:	x	x	8 Horas.

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA	Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR	SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 235

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 23/04/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Mantenimiento de equipos y herramienta menor.

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
[redacted]CNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	
[redacted]PÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:		OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:		OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:		OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:		OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	
OPERADOR 1 OPC1:		OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	1
FIERRERO:	1	OTRO:	VIBRADOR:	
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:	2	OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:	X	X	8 Horas.
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:			

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA	Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR	SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 236

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. **CONTRATO:** COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ **FECHA:** 24/04/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Colocación de 6 señales preventivas.

PERSONAL:			***EQUIPOS:***	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:		OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:		OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	2	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	1	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	
OPERADOR 1 OPC1:		OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	1
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	1
FIERRERO:	1	OTRO:	VIBRADOR:	
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:	x	x	8 Horas.
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:			

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR

SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 237

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. **CONTRATO:** COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ **FECHA:** 25/04/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Suspensión de trabajos de colocación de señaletica preventiva (0,75x0,75) m^2 por motivo de lluvia intensa, por un periodo de 8 Horas.

PERSONAL:			***EQUIPOS:***	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:		OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:		OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	2	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	1	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	
OPERADOR 1 OPC1:		OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	1
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	1
FIERRERO:	1	OTRO:	VIBRADOR:	
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:			
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:	x	x	8 Horas

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA	Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR	SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 238

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.	CONTRATO:	COTO-GADPPz-005-2022
FISCALIZADOR:	ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER		
ADMINISTRADOR:	ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ	FECHA:	26/04/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Suspención de trabajos de colocación de señaletica preventiva por motivo de lluvia intensa, por un periodo de 8 horas

PERSONAL:				EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:		EXCAVADORA ORUGAS:	
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:		MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:		CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:		VOLQUETA 10 M3	
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:		DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:		OTRO:		PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:		OTRO:		TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	2	OTRO:		ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:		RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:		RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	1	OTRO:		CONCRETERA 1 SACO:	
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:		APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	
OPERADOR 1 OPC1:		OTRO:		CAMIONETA 1 TON.:	1
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:		SOLDADORA ELÉCTRICA:	1
FIERRERO:	1	OTRO:		VIBRADOR:	
PINTOR:		OTRO:		MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:		HERRAMIENTA MENOR:	2
				OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:			
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:	x	x	8 Horas

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA	Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR	SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 239

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. **CONTRATO:** COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ **FECHA:** 27/04/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Colocacion de 2 señales preventivas.

PERSONAL:			***EQUIPOS:***	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:		OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:		OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	2	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	1	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	
OPERADOR 1 OPC1:		OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	1
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	1
FIERRERO:	1	OTRO:	VIBRADOR:	
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:	X		4 Horas
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:		X	4 Horas

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA	Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR	SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 240

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 28/04/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Suspención de trabajos de colocación de señaletica preventiva por motivo de lluvia intensa, por un periodo de 8 horas.

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:		OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:		OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	2	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	1	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	
OPERADOR 1 OPC1:		OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	1
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	1
FIERRERO:	1	OTRO:	VIBRADOR:	
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:			
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:	x	x	8 Horas.

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA	Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR	SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	N° 241

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 29/04/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Colocacion de 1 señaletica preventiva.

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:		OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:		OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	2	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	1	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	
OPERADOR 1 OPC1:		OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	1
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	1
FIERRERO:	1	OTRO:	VIBRADOR:	
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:	x		4 Horas
DESPEJADO:		x	4 Horas
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:			

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA	Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR	SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	N° 242

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.	CONTRATO:	COTO-GADPPz-005-2022
FISCALIZADOR:	ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER		
ADMINISTRADOR:	ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ	FECHA:	30/04/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Mantenimiento de equipos y herramienta menor

PERSONAL:				EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:		EXCAVADORA ORUGAS:	
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:		MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:		CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:		VOLQUETA 10 M3	
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:		DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:		OTRO:		PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:		OTRO:		TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:		OTRO:		ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:		RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:		RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:		OTRO:		CONCRETERA 1 SACO:	
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:		APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	
OPERADOR 1 OPC1:		OTRO:		CAMIONETA 1 TON.:	
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:		SOLDADORA ELÉCTRICA:	1
FIERRERO:	1	OTRO:		VIBRADOR:	
PINTOR:		OTRO:		MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:	2	OTRO:		HERRAMIENTA MENOR:	2
				OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:			
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:	x	x	8 Horas.
LLUVIA FUERTE:			

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA	Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR	SUPERVISOR

PLANILLA 08 - LIQUIDACIÓN DE OBRA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

ANEXO:

ANEXOS (MEMORIA DE CÁLCULO)


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

ANEXO-CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	**CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.	**PLANILLA No.** 08
PERIODO:	1 AL 30 DE ABRIL DE 2023	**FISCALIZADOR:** ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	**hoja del rubro/item:** Nº: 01 de: 02
RUBRO N°: 9	**DESCRIPCION:** HORMIGON PARA CUNETAS (F´C=180KG/CM2)		

CALCULO:

ABSCISA LADO IZQUIERDO	LONGITUD 1 L1 (m)	LONGITUD 2 L2 (m)	LONGITUD PROMEDIO-Lp	ANCHO A o a (m)	ALTO H o h (m)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES

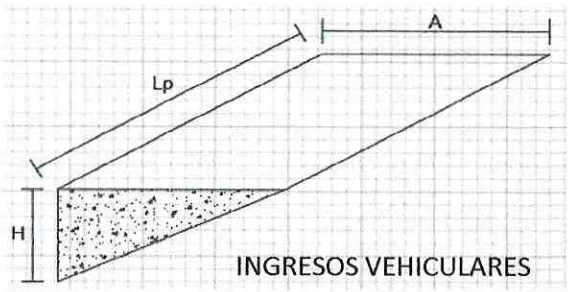

INGRESOS VEHICULARES EN CUNETAS-EJECUTADOS EN EL PERIODO DE MARZO DE 2023 QUE NO SE COBRARON

ABSCISA LADO IZQUIERDO	LONGITUD 1 L1 (m)	LONGITUD 2 L2 (m)	LONGITUD PROMEDIO-Lp	ANCHO A o a (m)	ALTO H o h (m)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
1+570			3.00	0.80	0.25	0.60	INGRESO-VIA LADO IZQUIERDO
1+640			3.00	0.80	0.25	0.60	INGRESO-VIA LADO DERECHO
1+700			3.00	0.80	0.25	0.60	INGRESO-VIA LADO IZQUIERDO
1+780			1.00	0.80	0.25	0.20	INGRESO-VIA LADO IZQUIERDO
1+780			6.00	0.70	0.25	1.05	INGRESO-VIA LADO DERECHO
1+770			3.00	0.80	0.25	0.60	INGRESO-VIA LADO IZQUIERDO
1+810			3.00	0.80	0.25	0.60	INGRESO-VIA LADO IZQUIERDO
1+850			4.00	0.80	0.25	0.80	INGRESO-VIA LADO DERECHO
1+850			3.00	0.80	0.25	0.60	INGRESO-VIA LADO IZQUIERDO
1+860			3.00	0.80	0.25	0.60	INGRESO-VIA LADO IZQUIERDO
1+880			3.00	0.80	0.25	0.60	INGRESO-VIA LADO DERECHO
1+900			3.00	0.80	0.25	0.60	INGRESO-VIA LADO IZQUIERDO
2+180			4.00	0.80	0.25	0.80	INGRESO-VIA LADO IZQUIERDO
2+260			4.00	0.80	0.25	0.80	INGRESO-VIA LADO DERECHO
2+340			4.00	0.80	0.25	0.80	INGRESO-VIA LADO IZQUIERDO
2+380			4.00	0.80	0.25	0.80	INGRESO-VIA LADO DERECHO
2+440			4.00	0.80	0.25	0.80	INGRESO-VIA LADO DERECHO
2+520			4.00	0.80	0.25	0.80	INGRESO-VIA LADO DERECHO
2+540			4.00	0.80	0.25	0.80	INGRESO-VIA LADO IZQUIERDO
2+610			4.00	0.80	0.25	0.80	INGRESO-VIA LADO IZQUIERDO
2+640			4.00	0.80	0.25	0.80	INGRESO-VIA LADO DERECHO
2+710			5.00	0.80	0.25	1.00	INGRESO-VIA LADO IZQUIERDO
2+760			4.00	0.80	0.25	0.80	INGRESO-VIA LADO DERECHO
2+840			4.00	0.80	0.25	0.80	INGRESO-VIA LADO IZQUIERDO
2+860			4.00	0.80	0.25	0.80	INGRESO-VIA LADO DERECHO
2+910			4.00	0.80	0.25	0.80	INGRESO-VIA LADO DERECHO
2+980			4.00	0.80	0.25	0.80	INGRESO-VIA LADO DERECHO
2+480			1.30	0.15	1.20	0.23	CAJA H.S. PARA DESCARGA PLUVIAL
2+480			1.30	0.15	1.20	0.23	CAJA H.S. PARA DESCARGA PLUVIAL
2+480			1.00	0.15	1.20	0.18	CAJA H.S. PARA DESCARGA PLUVIAL
2+480			1.00	0.15	1.20	0.18	CAJA H.S. PARA DESCARGA PLUVIAL
2+480			1.30	1.30	0.20	0.34	CAJA H.S. PARA DESCARGA PLUVIAL
						20.81	
VOLUMEN TOTAL DE HORMIGON :			***20.81 m3***				

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

ANEXO-CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	**CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.	**PLANILLA No.** 08
PERIODO:	1 AL 30 DE ABRIL DE 2023	**FISCALIZADOR:** ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	**hoja del rubro/item:** Nº: 02 de: 02
RUBRO Nº: 9	**DESCRIPCION:** HORMIGON PARA CUNETAS (F´C=180KG/CM2)		

CALCULO:

CANTIDAD TOTAL DE OBRA CONTRATADA:	**314.88 m3**	**CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA**	**TOTAL**	**20.81**
			UNIDAD	**m3**
		PLANILLA ANTERIOR =		797.50
		ESTA PLANILLA =		**20.81**
		TOTAL EJECUTADO A LA FECHA=		**818.31**
		% DE AVANCE =		**259.88%**

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZADOR

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

ANEXO-CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	**CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.	**PLANILLA No.** 08
PERIODO:	1 AL 30 DE ABRIL DE 2023	**FISCALIZADOR:** ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	**hoja del rubro/item:** Nº: 01 de: 07

RUBRO N°: 21 **DESCRIPCION:** MARCAS EN PAVIMENTO

CALCULO:

ABSCISA	LONGITUD (m)	NUMERO DE LINEAS	LONGITUD TOTAL (m)	OBSERVACIONES
0+000				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+020				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+040				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+060				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+080				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+100				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+120				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+140				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+160				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+180				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+200				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+220				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+240				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+260				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+280				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+300				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+320				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+340				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+360				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+380				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+400				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+420				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+440				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

ANEXO-CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	**CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.	**PLANILLA No.** 08
PERIODO:	1 AL 30 DE ABRIL DE 2023	**FISCALIZADOR:** ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	**hoja del rubro/item:** Nº: 02 de: 07
RUBRO N°: 21	**DESCRIPCION:** MARCAS EN PAVIMENTO		
CALCULO:			

ABSCISA	LONGITUD (m)	NUMERO DE LINEAS	LONGITUD TOTAL (m)	OBSERVACIONES
0+460				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+480				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+500				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+520				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+540				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+560				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+580				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+600				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+620				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+640				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+660				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+680				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+700				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+720				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+740				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+760				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+780				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+800				
	15	3.00	45.000	ANEXO RUBRO 21
0+835				
		SUBTOTAL 1:	**2445.000**	
0+860				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+880				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+900				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+920				

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

ANEXO-CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	**CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.	**PLANILLA No.** 08
PERIODO:	1 AL 30 DE ABRIL DE 2023	**FISCALIZADOR:** ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	**hoja del rubro/item:** Nº: 03 de: 07
RUBRO Nº: 21	**DESCRIPCION:** MARCAS EN PAVIMENTO		

CALCULO:

ABSCISA	LONGITUD (m)	NUMERO DE LINEAS	LONGITUD TOTAL (m)	OBSERVACIONES
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+940				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+960				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
0+980				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+000				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+020				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+040				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+060				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+080				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+100				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+120				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+140				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+160				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+180				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+200				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+220				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+240				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+260				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+280				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+300				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+320				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+340				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+360				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+380				

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

ANEXO-CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	**CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.	**PLANILLA No.** 08
PERIODO:	1 AL 30 DE ABRIL DE 2023	**FISCALIZADOR:** ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	**hoja del rubro/item:** Nº: 04 de: 07
RUBRO Nº: 21	**DESCRIPCION:** MARCAS EN PAVIMENTO		
CALCULO:			

ABSCISA	LONGITUD (m)	NUMERO DE LINEAS	LONGITUD TOTAL (m)	OBSERVACIONES
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+400				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+420				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+440				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+460				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+480				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+500				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+520				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+540				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+560				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+580				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+600				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+620				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+640				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+660				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+680				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+700				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+720				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+740				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+760				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+780				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+800				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+820				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+840				

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

ANEXO-CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	**CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. **FISCALIZADOR:** ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	**PLANILLA No.** 08
PERIODO:	1 AL 30 DE ABRIL DE 2023		**hoja del rubro/item:** Nº: 05 de: 07
RUBRO N°: 21	**DESCRIPCION:** MARCAS EN PAVIMENTO		
CALCULO:			

ABSCISA	LONGITUD (m)	NUMERO DE LINEAS	LONGITUD TOTAL (m)	OBSERVACIONES
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+860				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+880				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+900				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+920				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+940				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+960				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
1+980				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+000				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+020				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+040				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+060				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+080				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+100				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+120				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+140				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+160				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+180				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+200				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+220				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+240				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+260				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+280				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+300				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

ANEXO-CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	**CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. **FISCALIZADOR:** ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	**PLANILLA No.** 08
PERIODO:	1 AL 30 DE ABRIL DE 2023		**hoja del rubro/ítem:** Nº: 06 de: 07
RUBRO Nº: 21	**DESCRIPCION:** MARCAS EN PAVIMENTO		

CALCULO:

ABSCISA	LONGITUD (m)	NUMERO DE LINEAS	LONGITUD TOTAL (m)	OBSERVACIONES
2+320				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+340				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+360				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+380				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+400				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+420				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+440				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+460				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+480				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+500				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+520				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+540				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+560				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+580				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+600				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+620				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+640				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+660				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+680				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+700				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+720				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+740				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+760				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+780				

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

ANEXO-CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	**CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.	**PLANILLA No.** 08
PERIODO:	1 AL 30 DE ABRIL DE 2023	**FISCALIZADOR:** ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	**hoja del rubro/item:** Nº: 07 de: 07
RUBRO N°: 21	**DESCRIPCION:** MARCAS EN PAVIMENTO		


CALCULO:

ABSCISA	LONGITUD (m)	NUMERO DE LINEAS	LONGITUD TOTAL (m)	OBSERVACIONES
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+800				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+820				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+840				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+860				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+880				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+900				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+920				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+940				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+960				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
2+980				
	20	3.00	60.000	ANEXO RUBRO 21
3+000				
		SUBTOTAL 2:	**6420.000**	
0+835y0+860	20.6	2.000	41.200	LINEAS TRANSVERSALES-INGRESO PUENTE
		SUBTOTAL 3:	**41.200**	
TOTAL MARCAS EN PAVIMENTO (m):			**8906.20**	

CANTIDAD TOTAL DE OBRA CONTRATADA:	**9,800.00 m**	**CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA**	**TOTAL**	**8,906.20**
			UNIDAD	**m**
		PLANILLA ANTERIOR =		0.00
		ESTA PLANILLA =		**8,906.20**
		TOTAL EJECUTADO A LA FECHA=		**8,906.20**
		% DE AVANCE =		**90.88%**

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZADOR

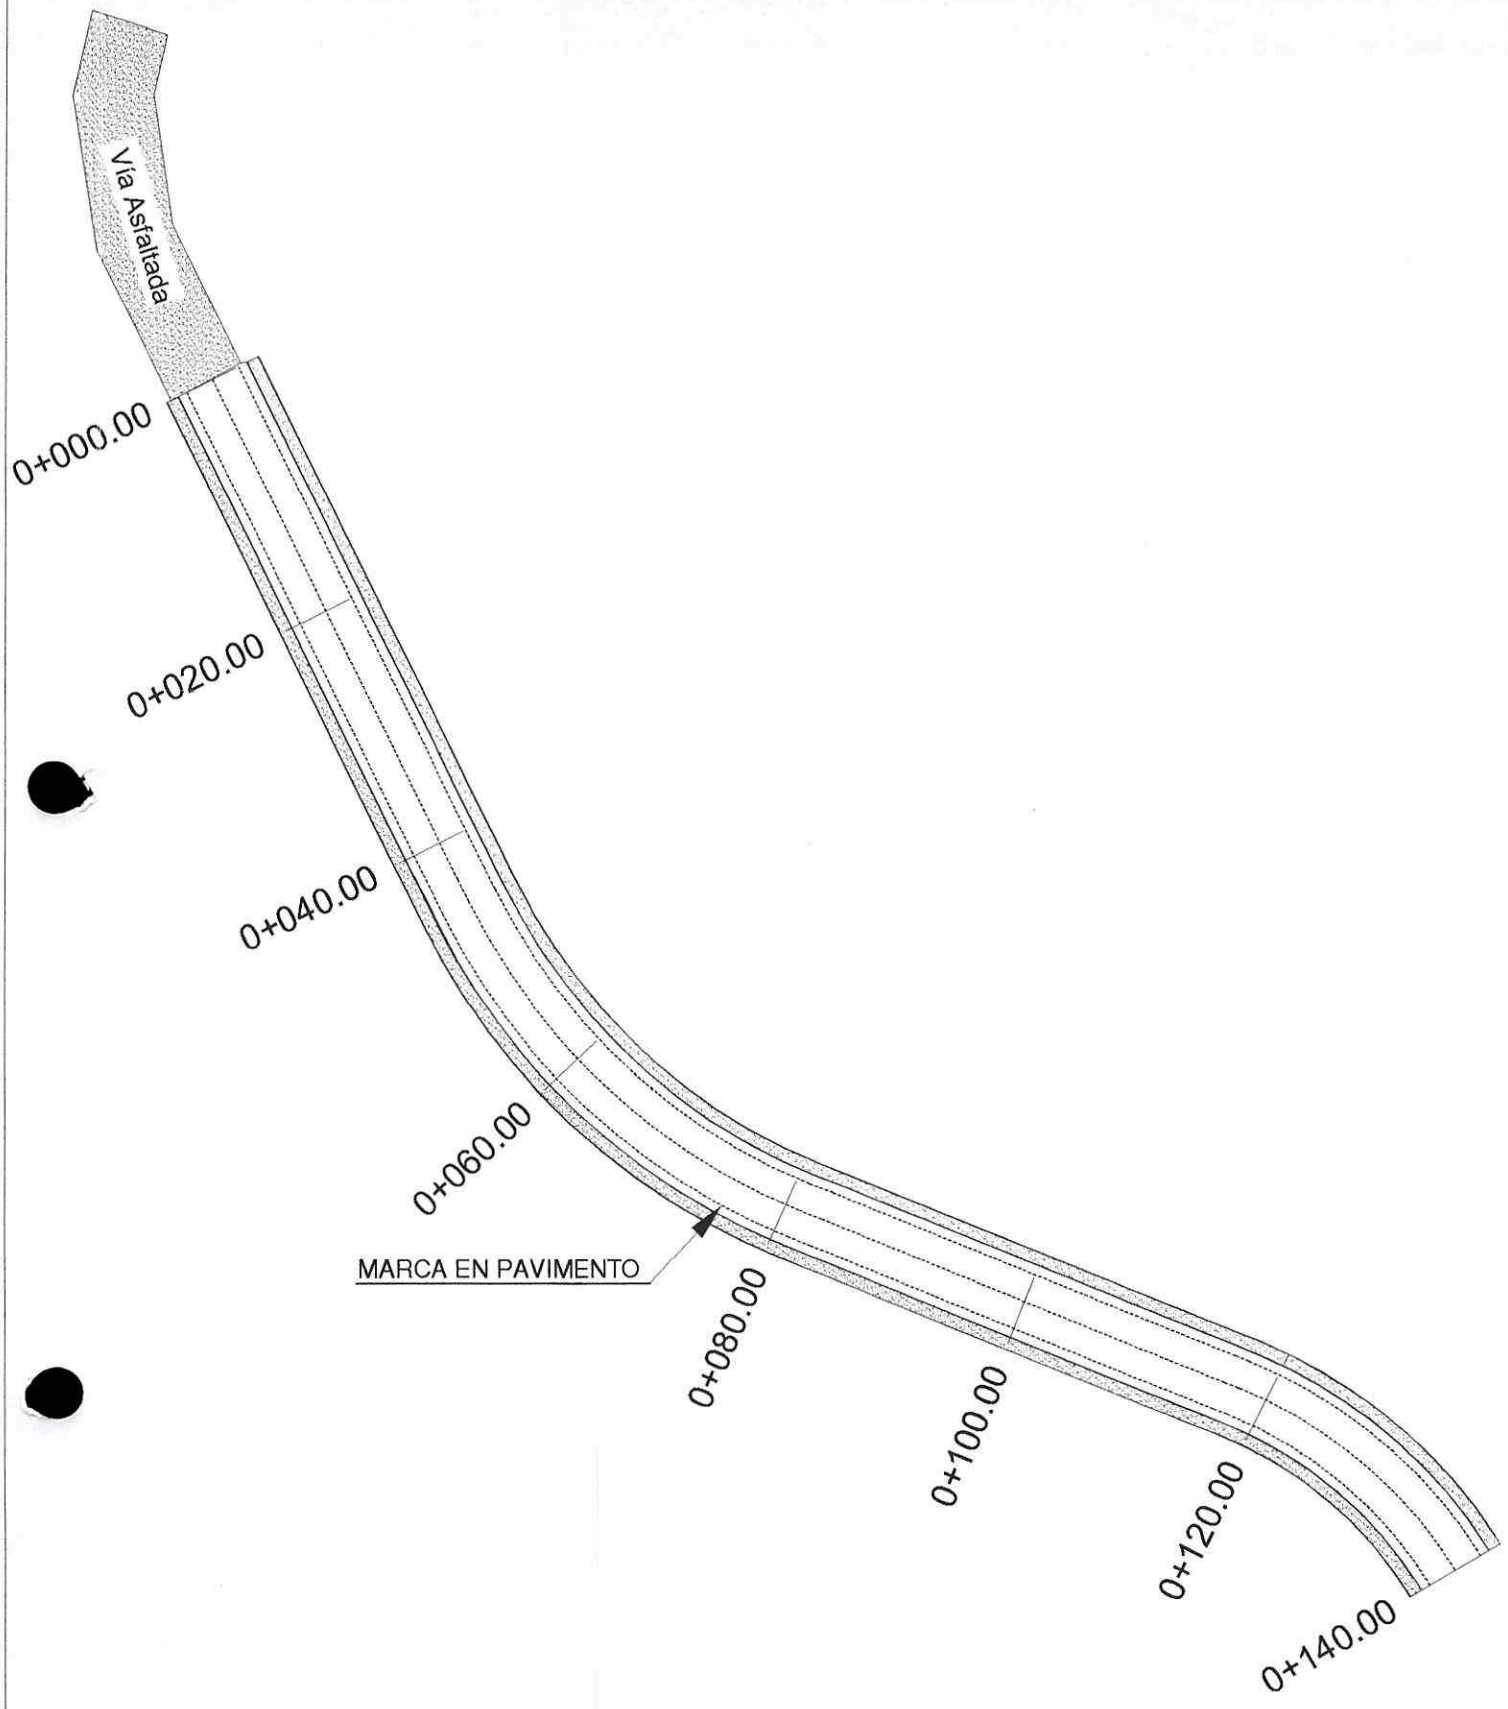


"ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTIENE: ANEXO GRAFICO
PLANILLA 08:

RUBRO 21: MARCAS EN PAVIMENTO

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA:	FISCALIZACION:	LAMINA: 1	ESCALA: SIN ESCALA
REPRESENTANTE LEGAL SR. MISAEL LOPEZ	ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	FECHA: Mayo de 2023	

OBSERVACIONES:

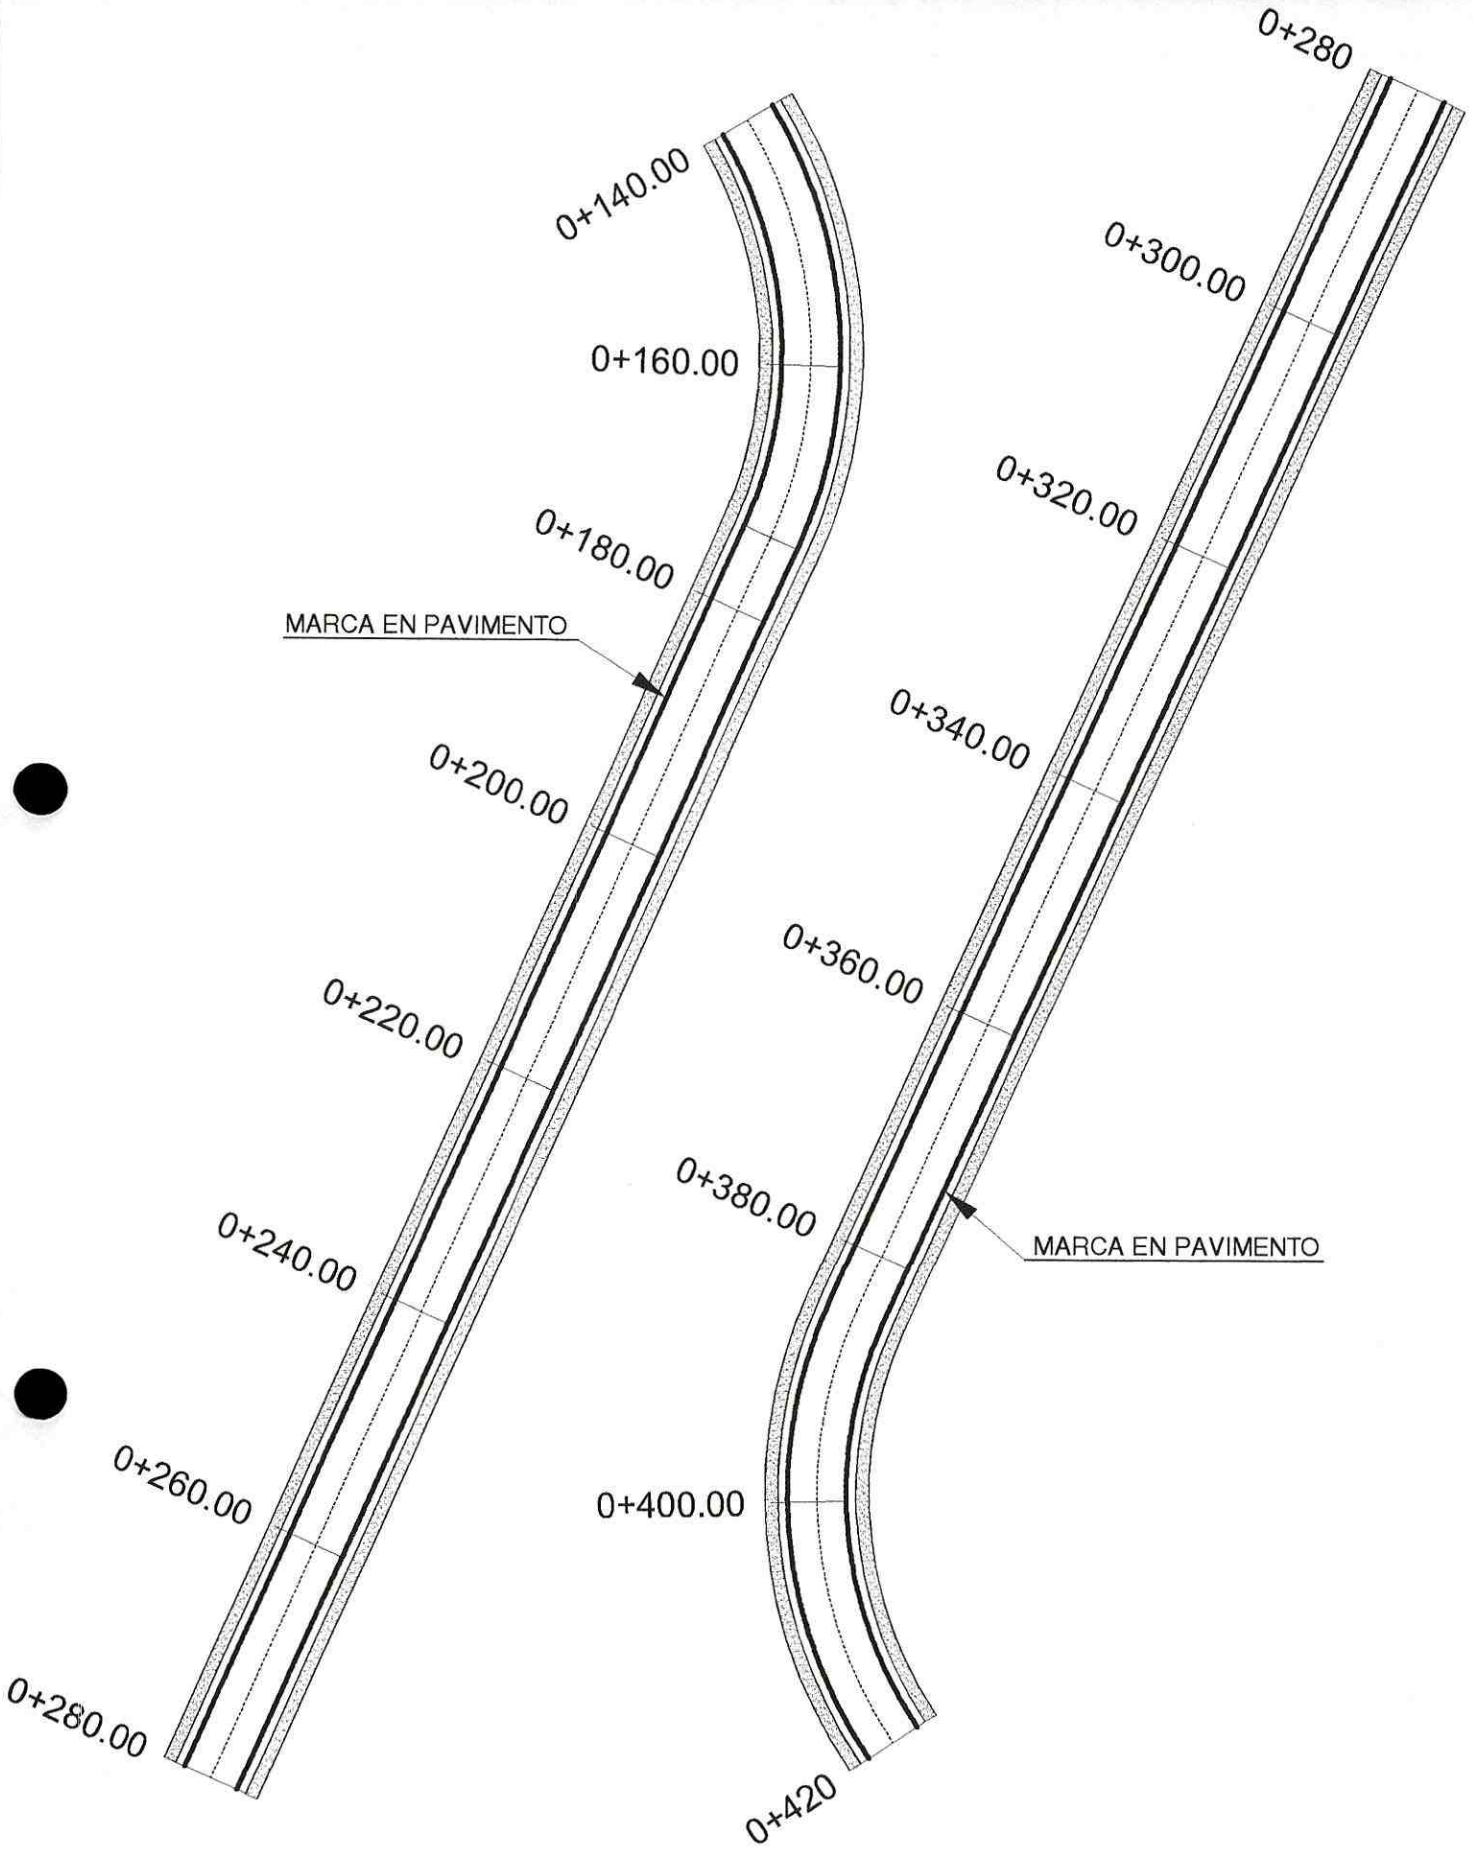


"ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTIENE: ANEXO GRAFICO — RUBRO 21: MARCAS EN PAVIMENTO
PLANILLA 08:

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA:	FISCALIZACION:	LAMINA: 2	ESCALA: SIN ESCALA
REPRESENTANTE LEGAL SR. MISAEL LOPEZ	ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	FECHA: Mayo de 2023	

OBSERVACIONES:

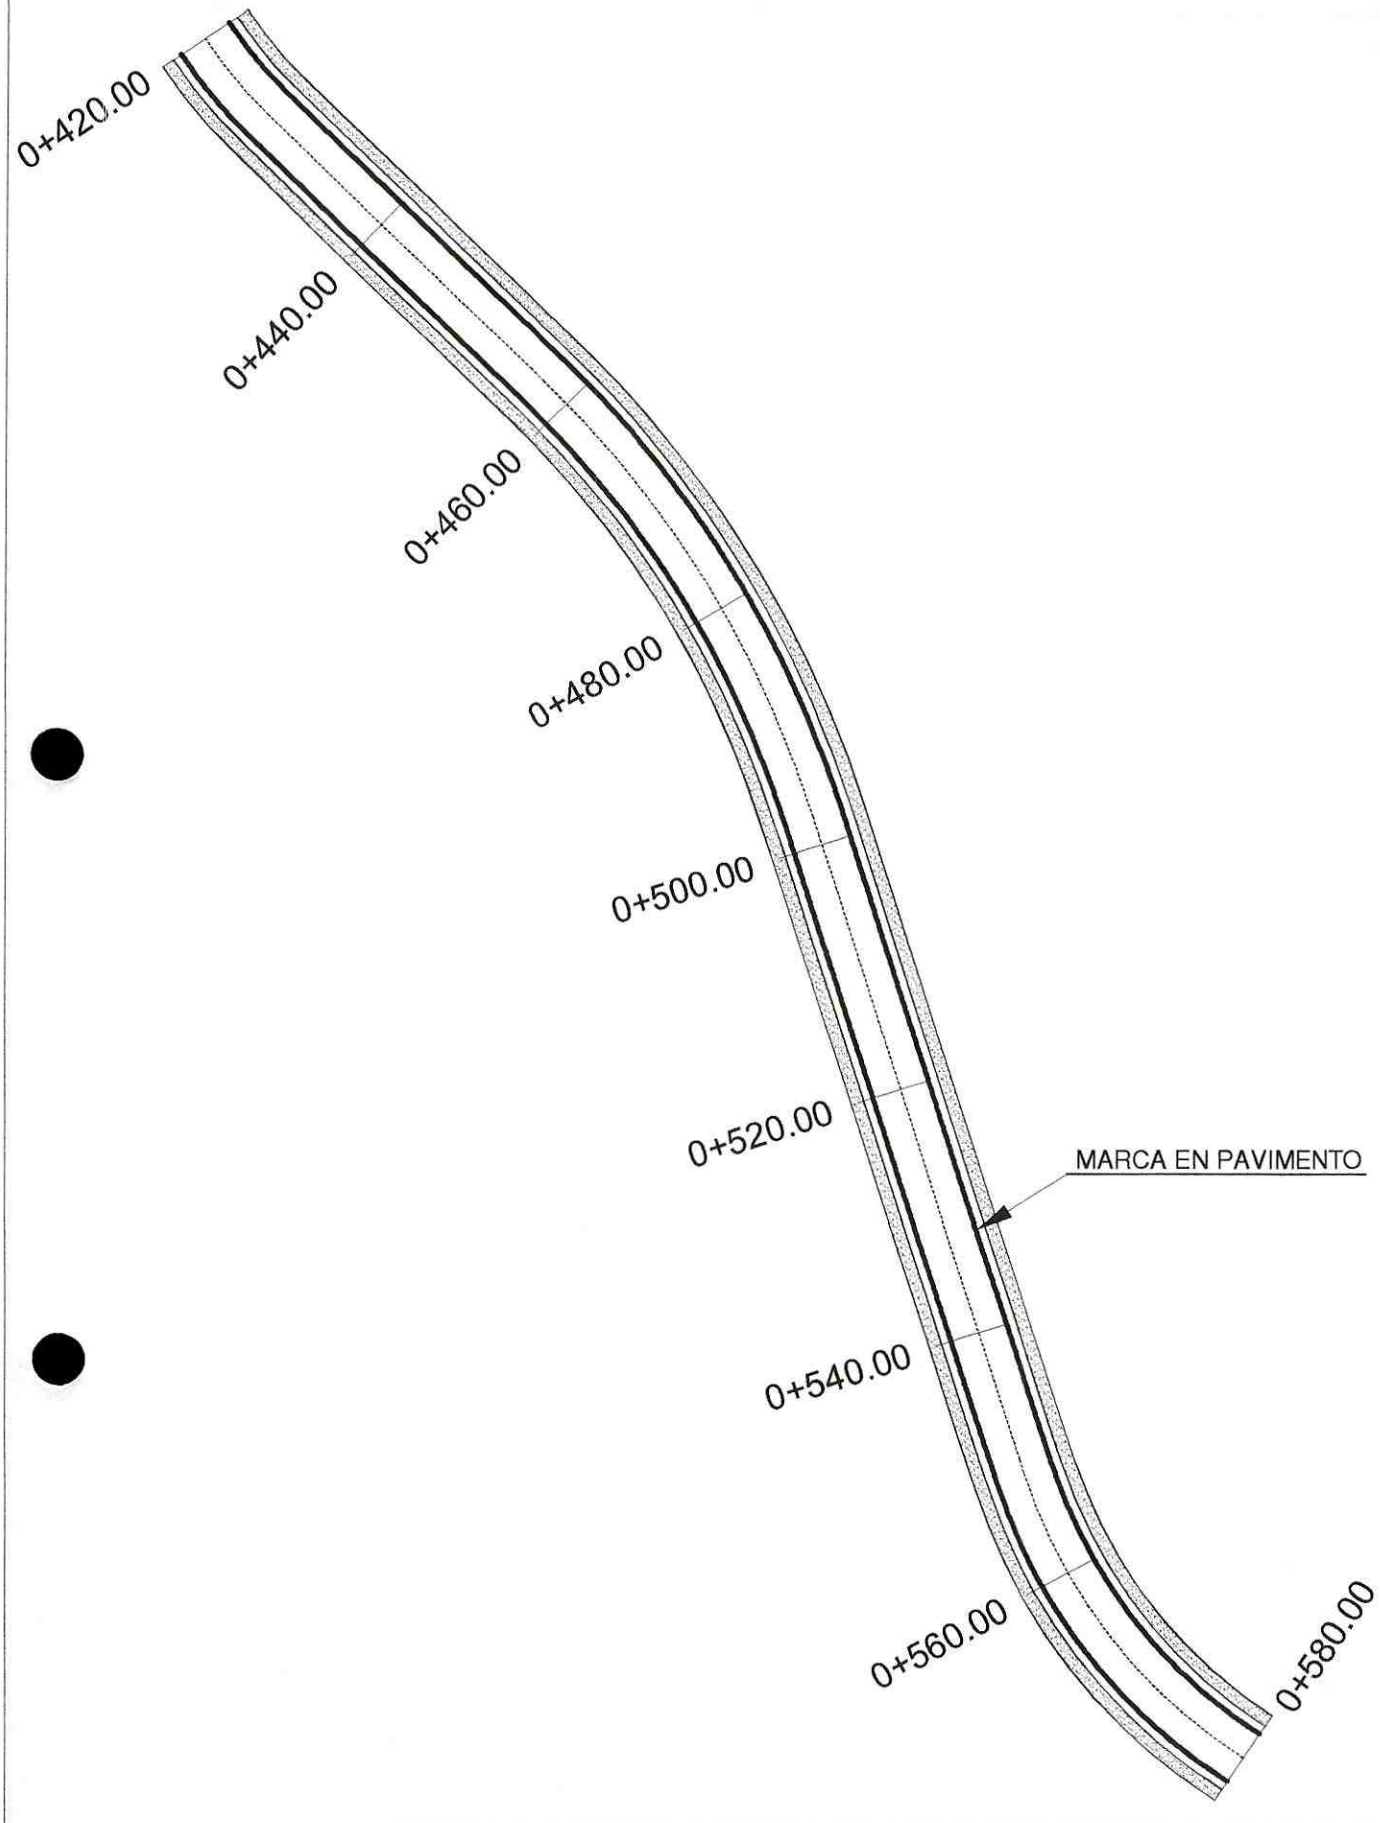


"ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTIENE: ANEXO GRAFICO PLANILLA 08: RUBRO 21: MARCAS EN PAVIMENTO

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA:	FISCALIZACION:	LAMINA: 3	ESCALA: SIN ESCALA
REPRESENTANTE LEGAL SR. MISAEL LOPEZ	ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	FECHA: Mayo de 2023	

OBSERVACIONES:

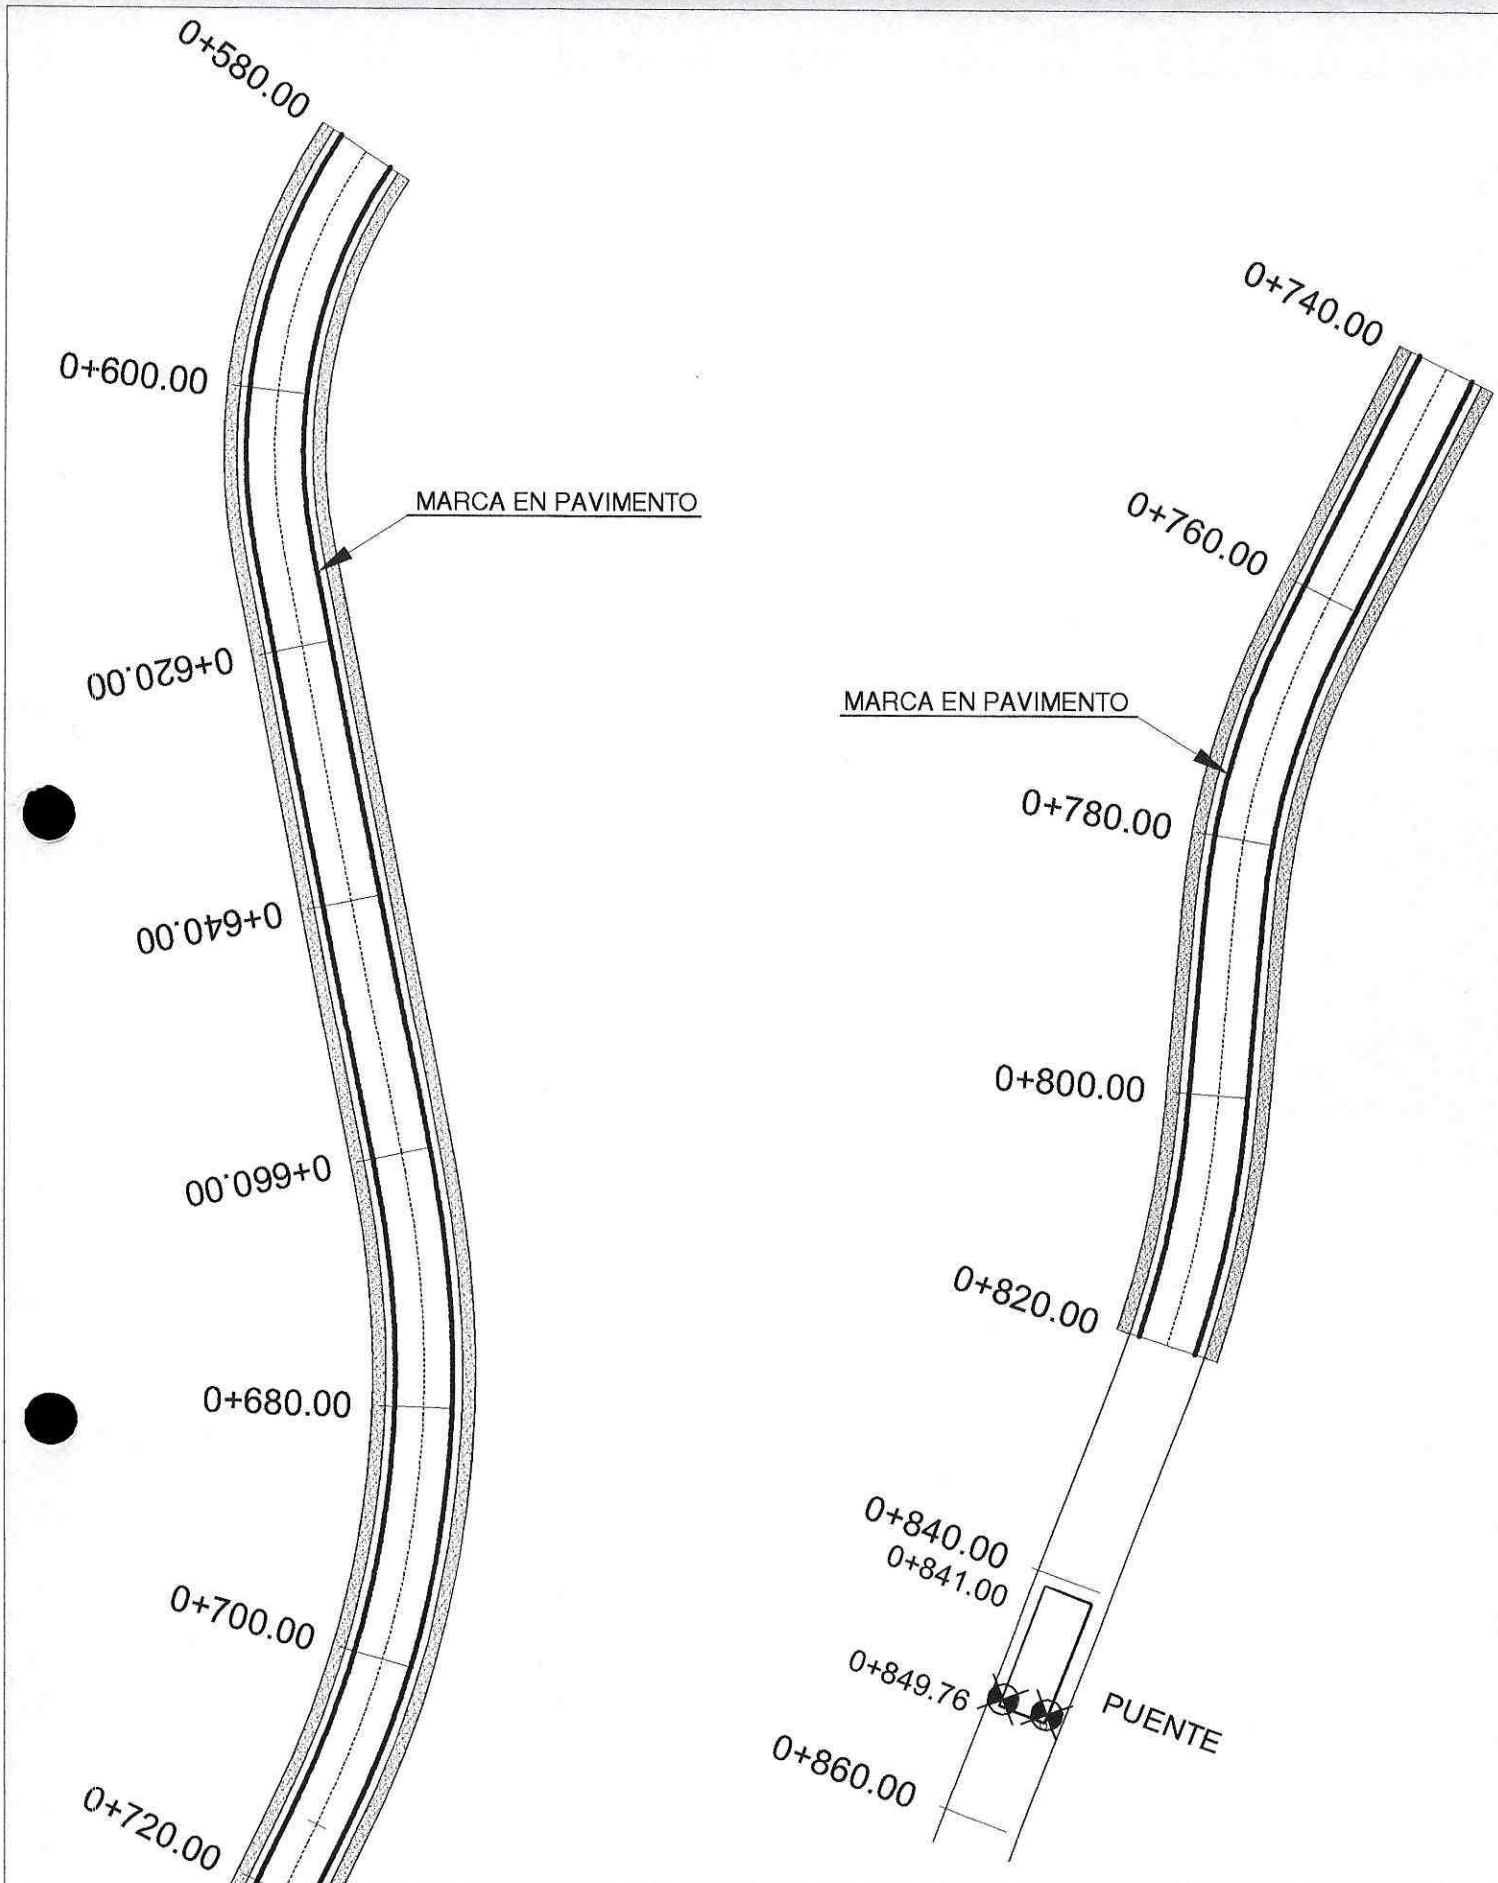


"ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTIENE: ANEXO GRAFICO PLANILLA 08: RUBRO 21: MARCAS EN PAVIMENTO

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA:	FISCALIZACION:	LAMINA: 4	ESCALA: SIN ESCALA
REPRESENTANTE LEGAL SR. MISAEL LOPEZ	ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	FECHA: Mayo de 2023	

OBSERVACIONES:

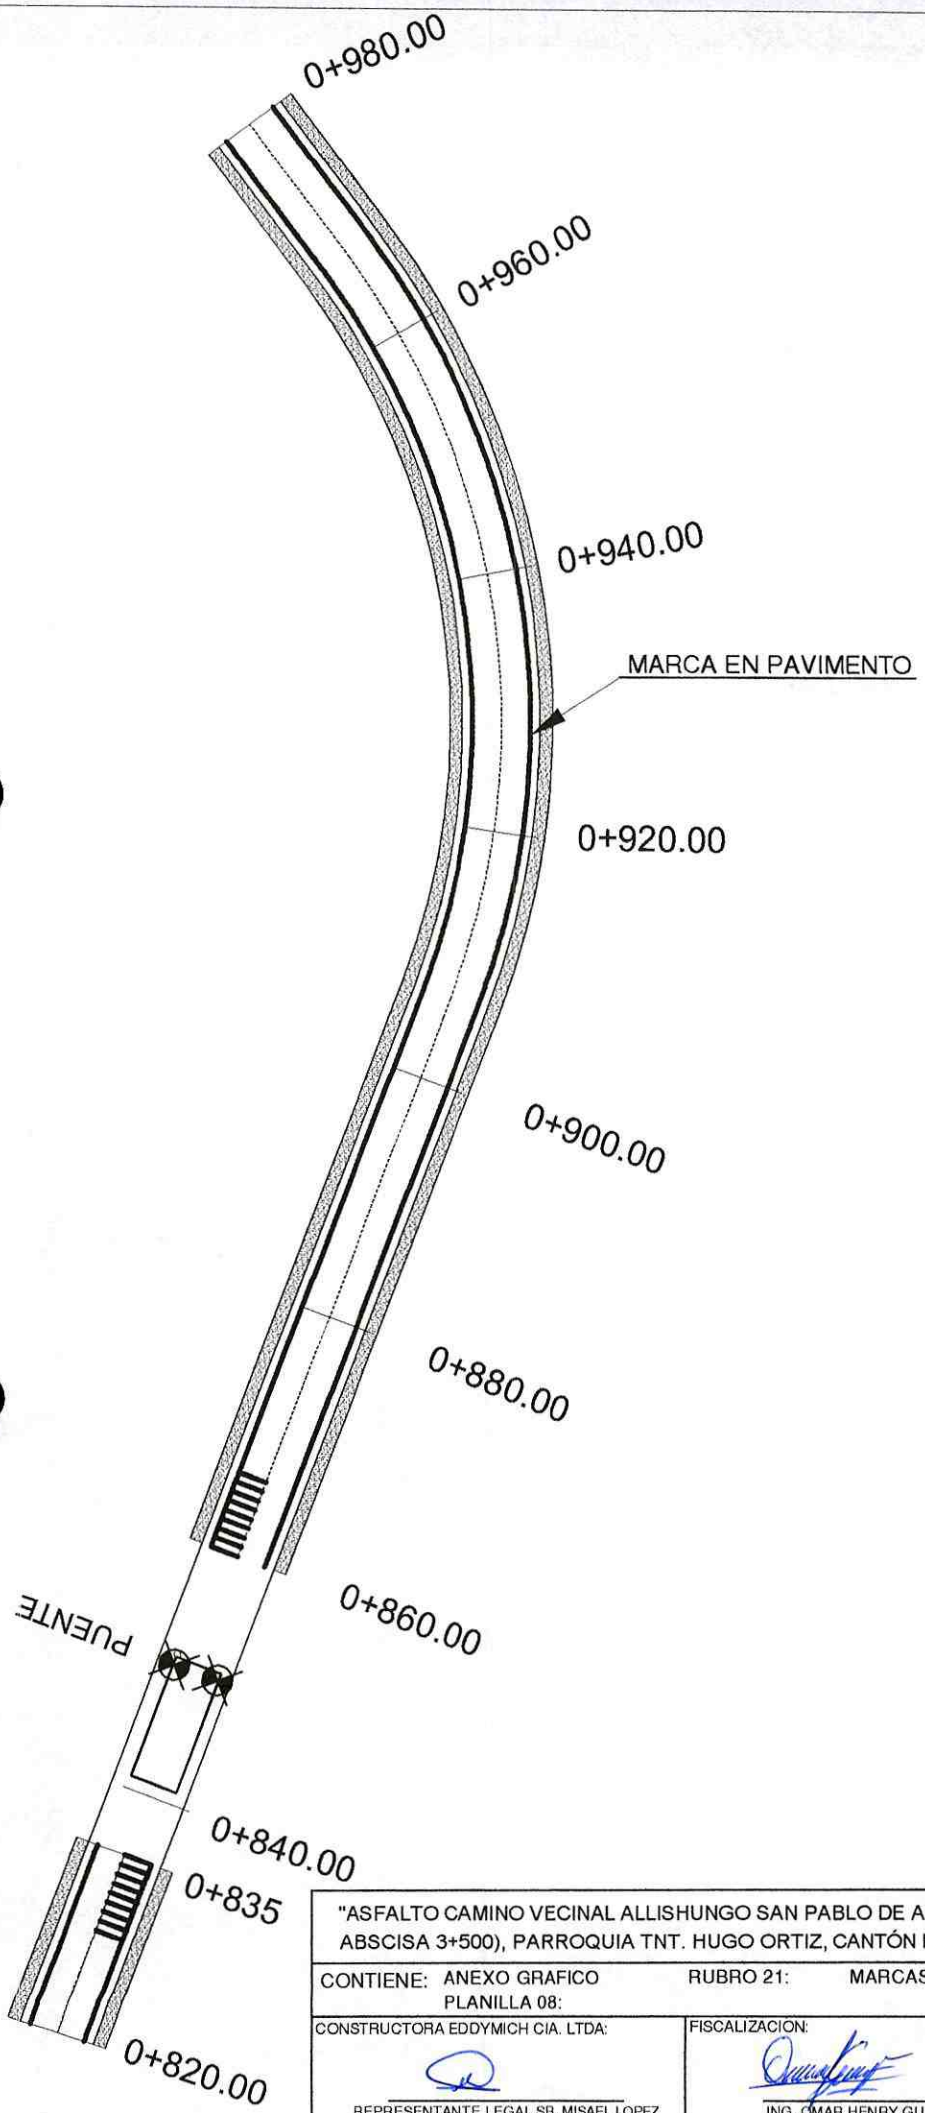


"ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTIENE: ANEXO GRAFICO PLANILLA 08: RUBRO 21: MARCAS EN PAVIMENTO

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA:	FISCALIZACIÓN:	LAMINA: 5	ESCALA: SIN ESCALA
REPRESENTANTE LEGAL SR. MISAEL LOPEZ	ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	FECHA: Mayo de 2023	

OBSERVACIONES:

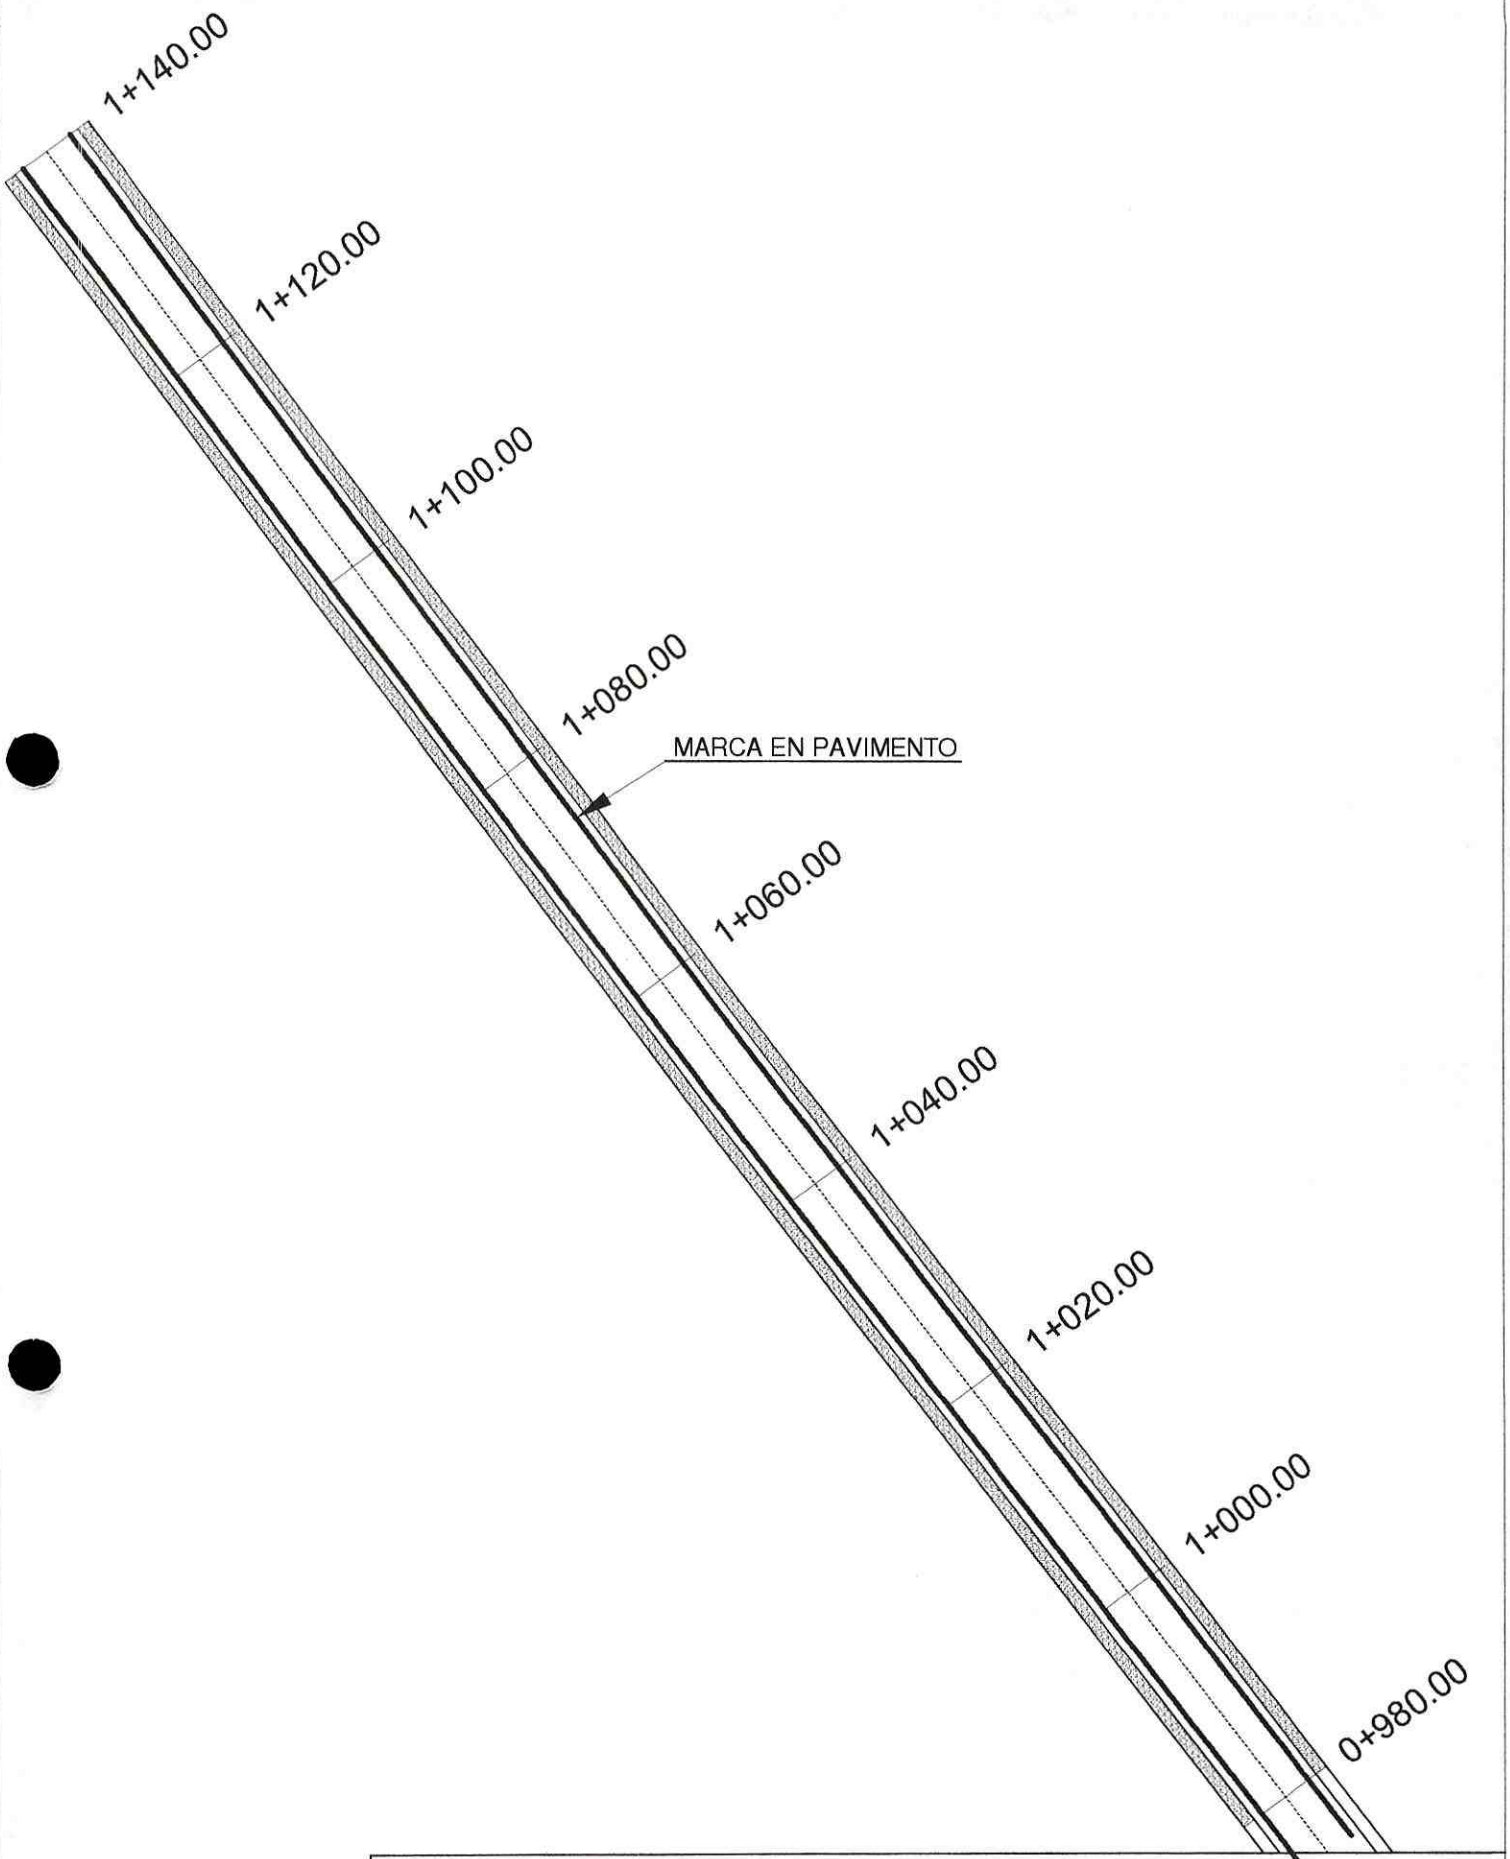


"ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTIENE: ANEXO GRAFICO PLANILLA 08: RUBRO 21: MARCAS EN PAVIMENTO

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA:	FISCALIZACION:	LAMINA: 6	ESCALA: SIN ESCALA
REPRESENTANTE LEGAL SR. MISAEL LOPEZ	ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	FECHA: Mayo de 2023	

OBSERVACIONES:

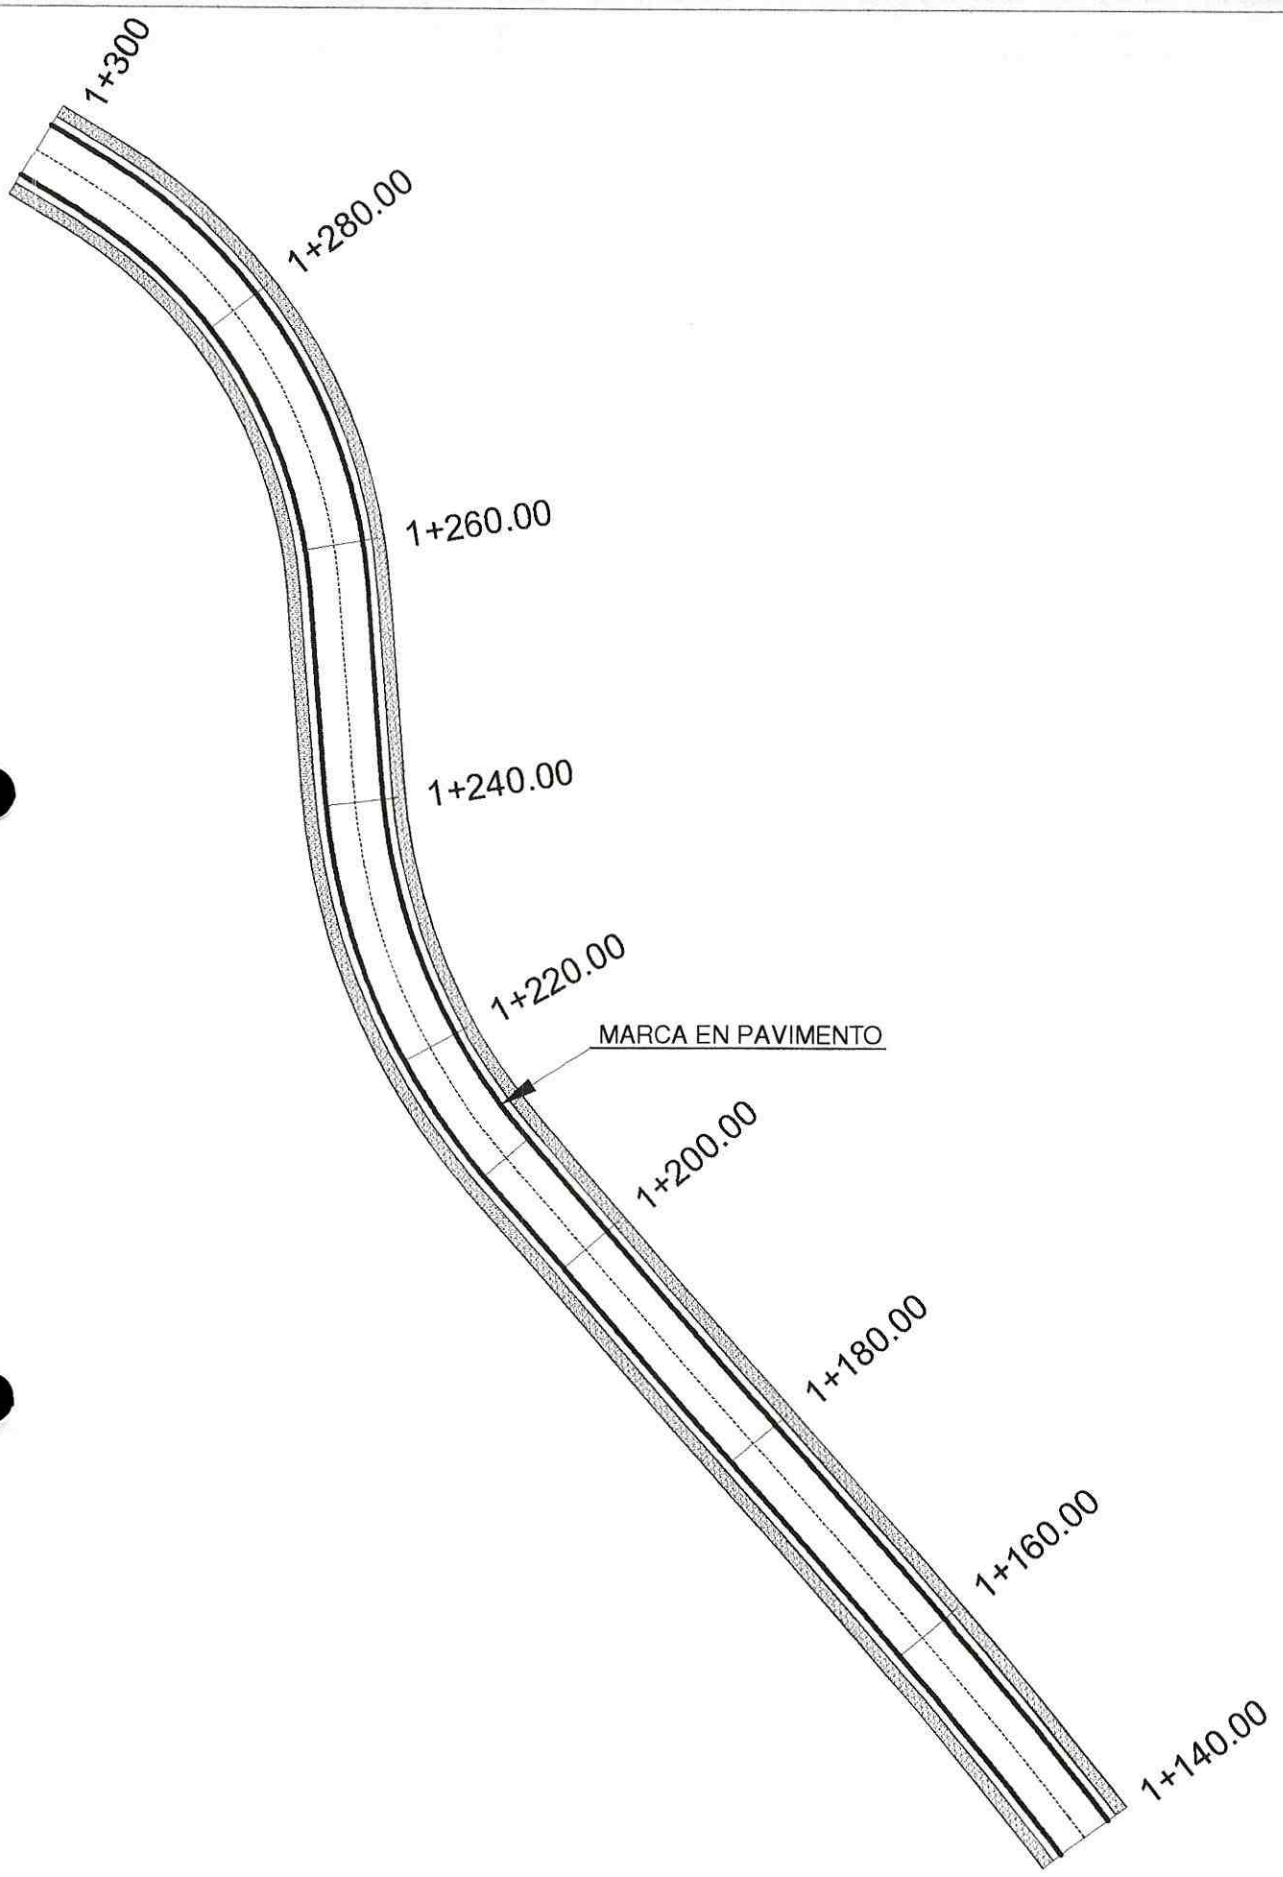


"ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTIENE: ANEXO GRAFICO PLANILLA 08: RUBRO 21: MARCAS EN PAVIMENTO

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA:	FISCALIZACION:	LAMINA: 7	ESCALA: SIN ESCALA
REPRESENTANTE LEGAL SR. MISAEL LOPEZ	ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	FECHA: Mayo de 2023	

OBSERVACIONES:

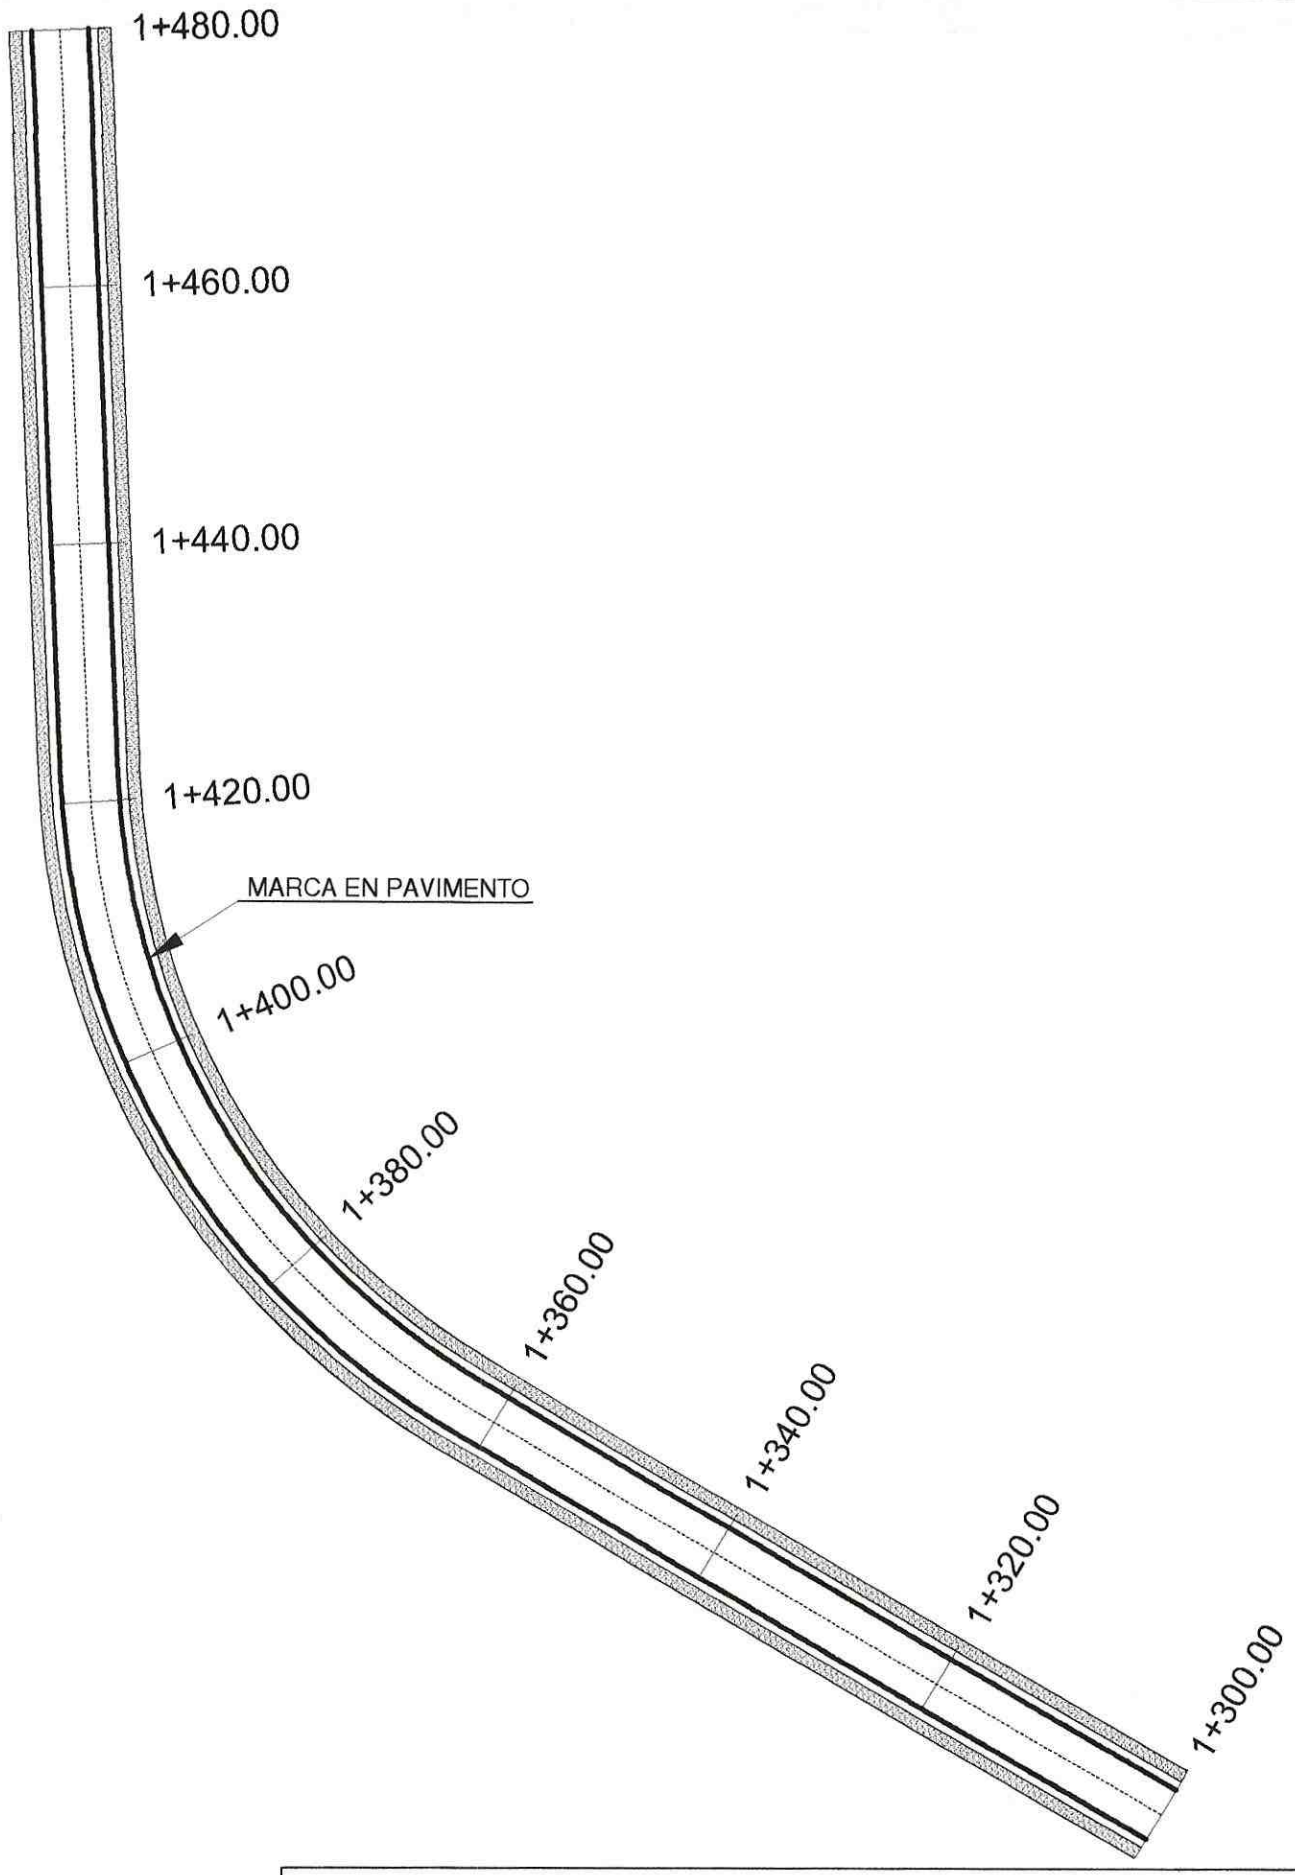


"ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTIENE: ANEXO GRAFICO PLANILLA 08: RUBRO 21: MARCAS EN PAVIMENTO

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA:	FISCALIZACION:	LAMINA: 8	ESCALA: SIN ESCALA
REPRESENTANTE LEGAL SR. MISAEL LOPEZ	ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	FECHA: Mayo de 2023	

OBSERVACIONES:

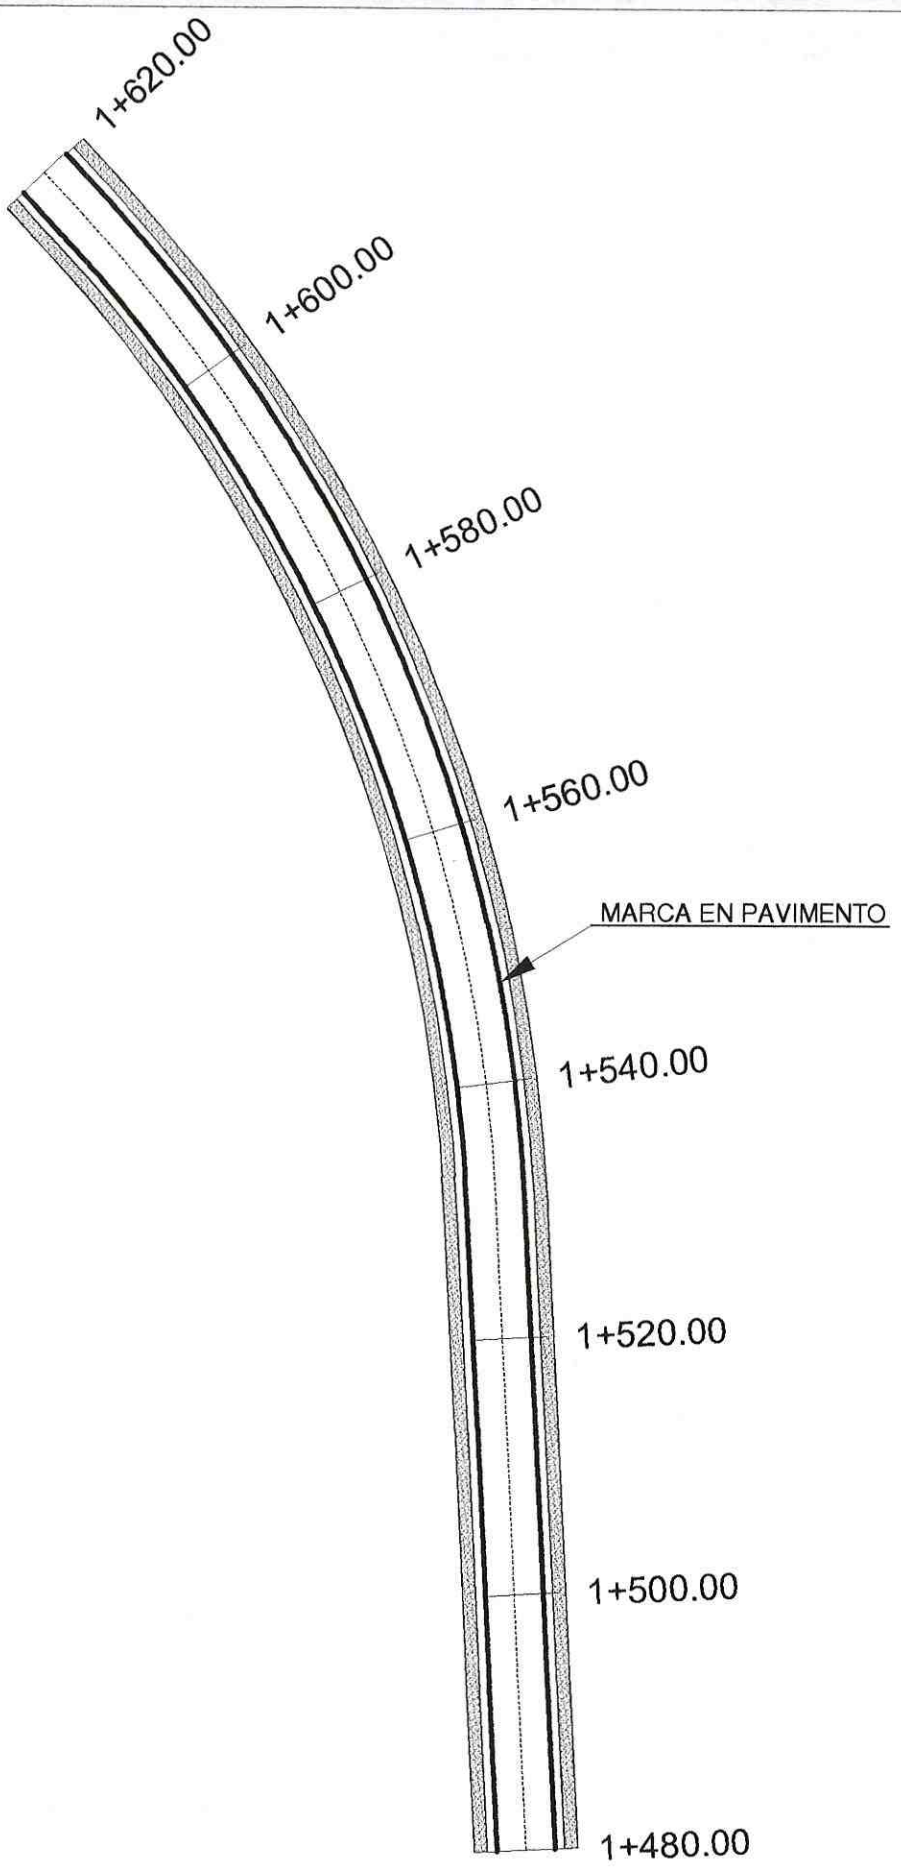


"ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTIENE: ANEXO GRAFICO PLANILLA 08: RUBRO 21: MARCAS EN PAVIMENTO

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA:	FISCALIZACION:	LAMINA: 9	ESCALA: SIN ESCALA
REPRESENTANTE LEGAL SR. MISAEL LOPEZ	ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	FECHA: Mayo de 2023	

OBSERVACIONES:

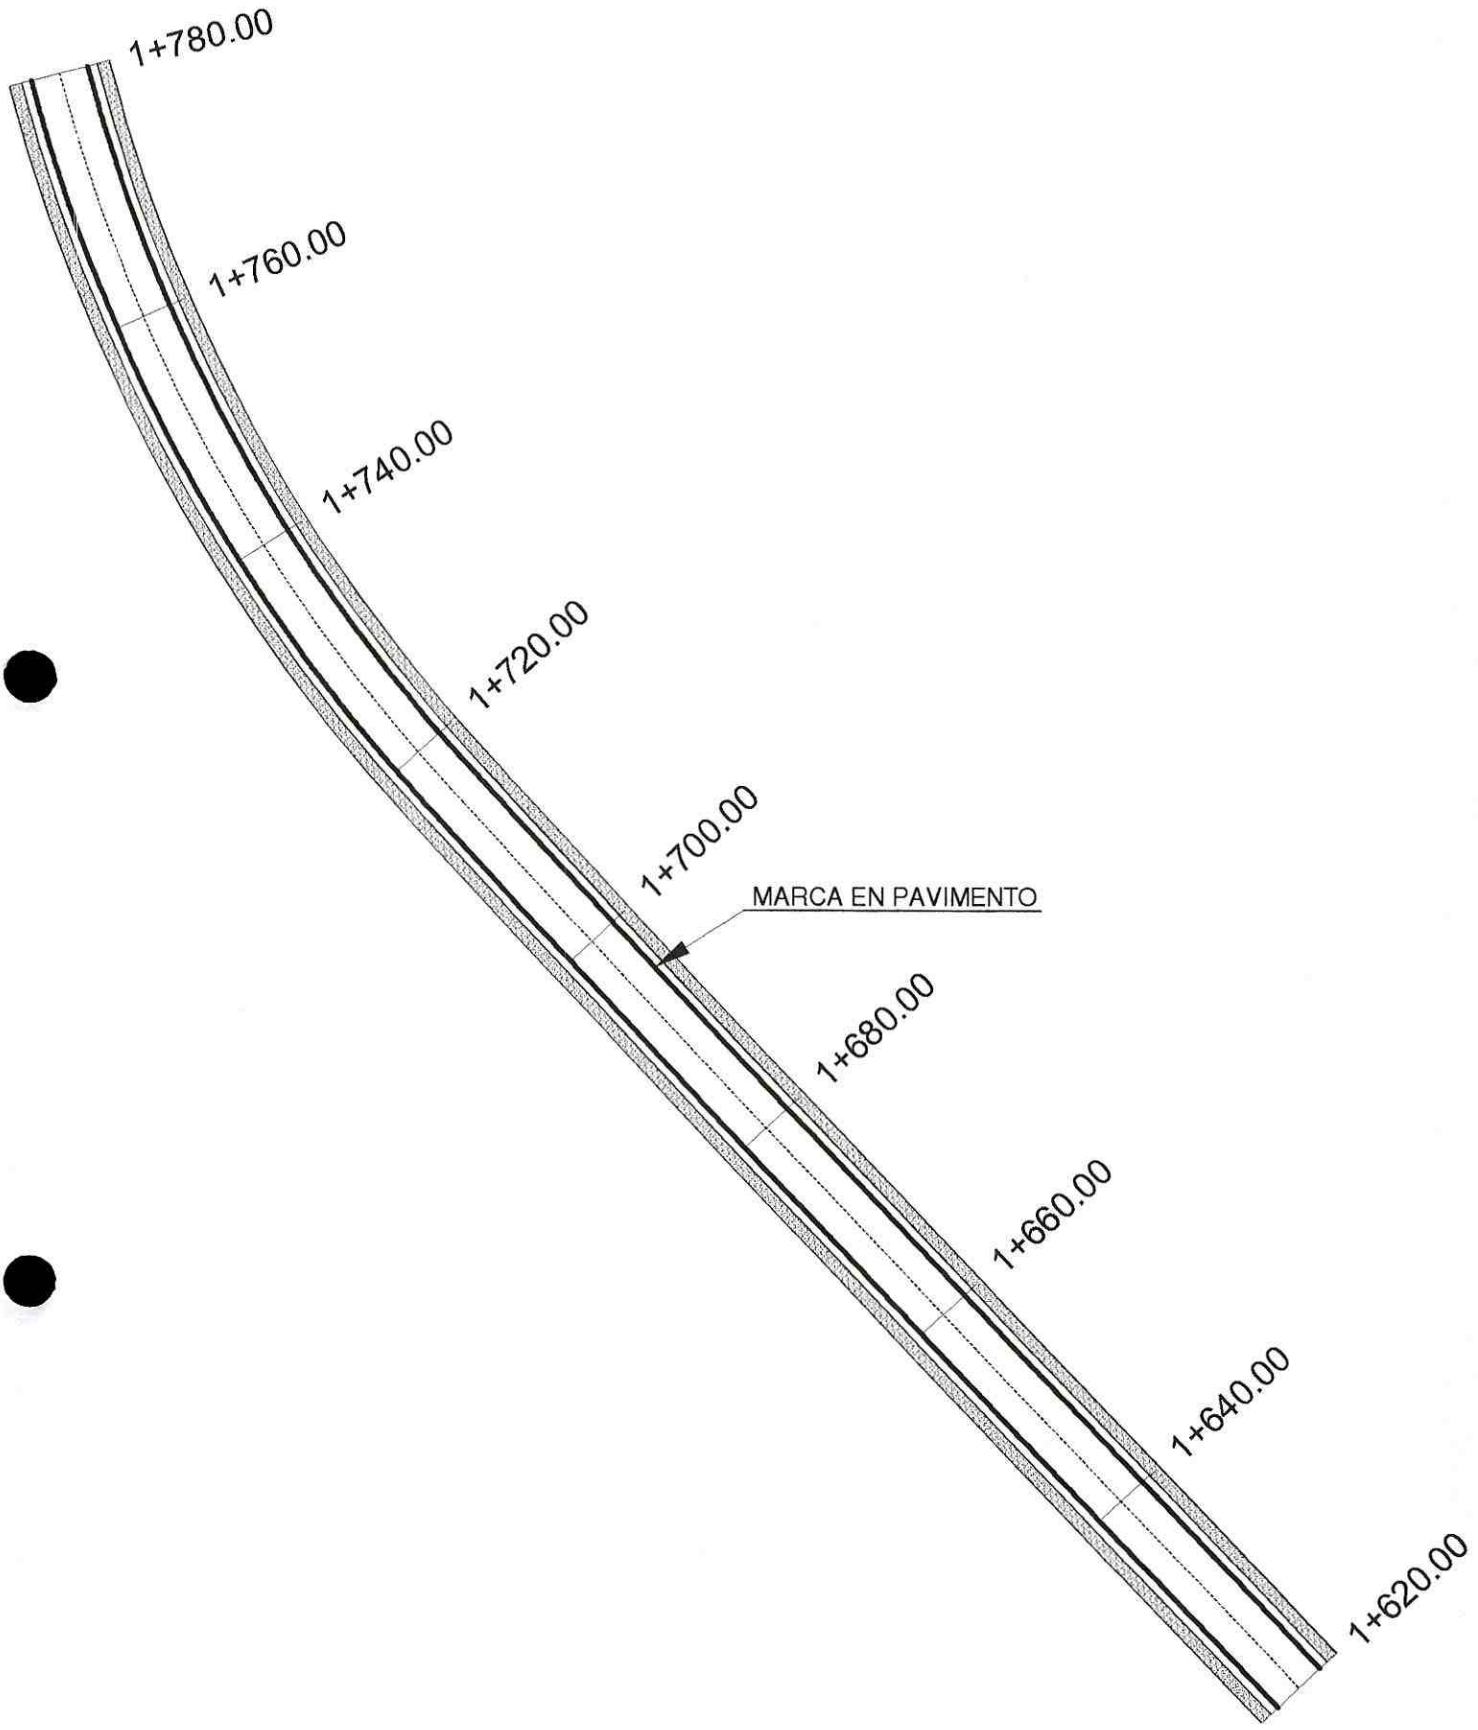


"ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTIENE: ANEXO GRAFICO PLANILLA 08: RUBRO 21: MARCAS EN PAVIMENTO

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA:	FISCALIZACION:	LAMINA: 10	ESCALA: SIN ESCALA
REPRESENTANTE LEGAL SR. MISAEL LOPEZ	ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	FECHA: Mayo de 2023	

OBSERVACIONES:

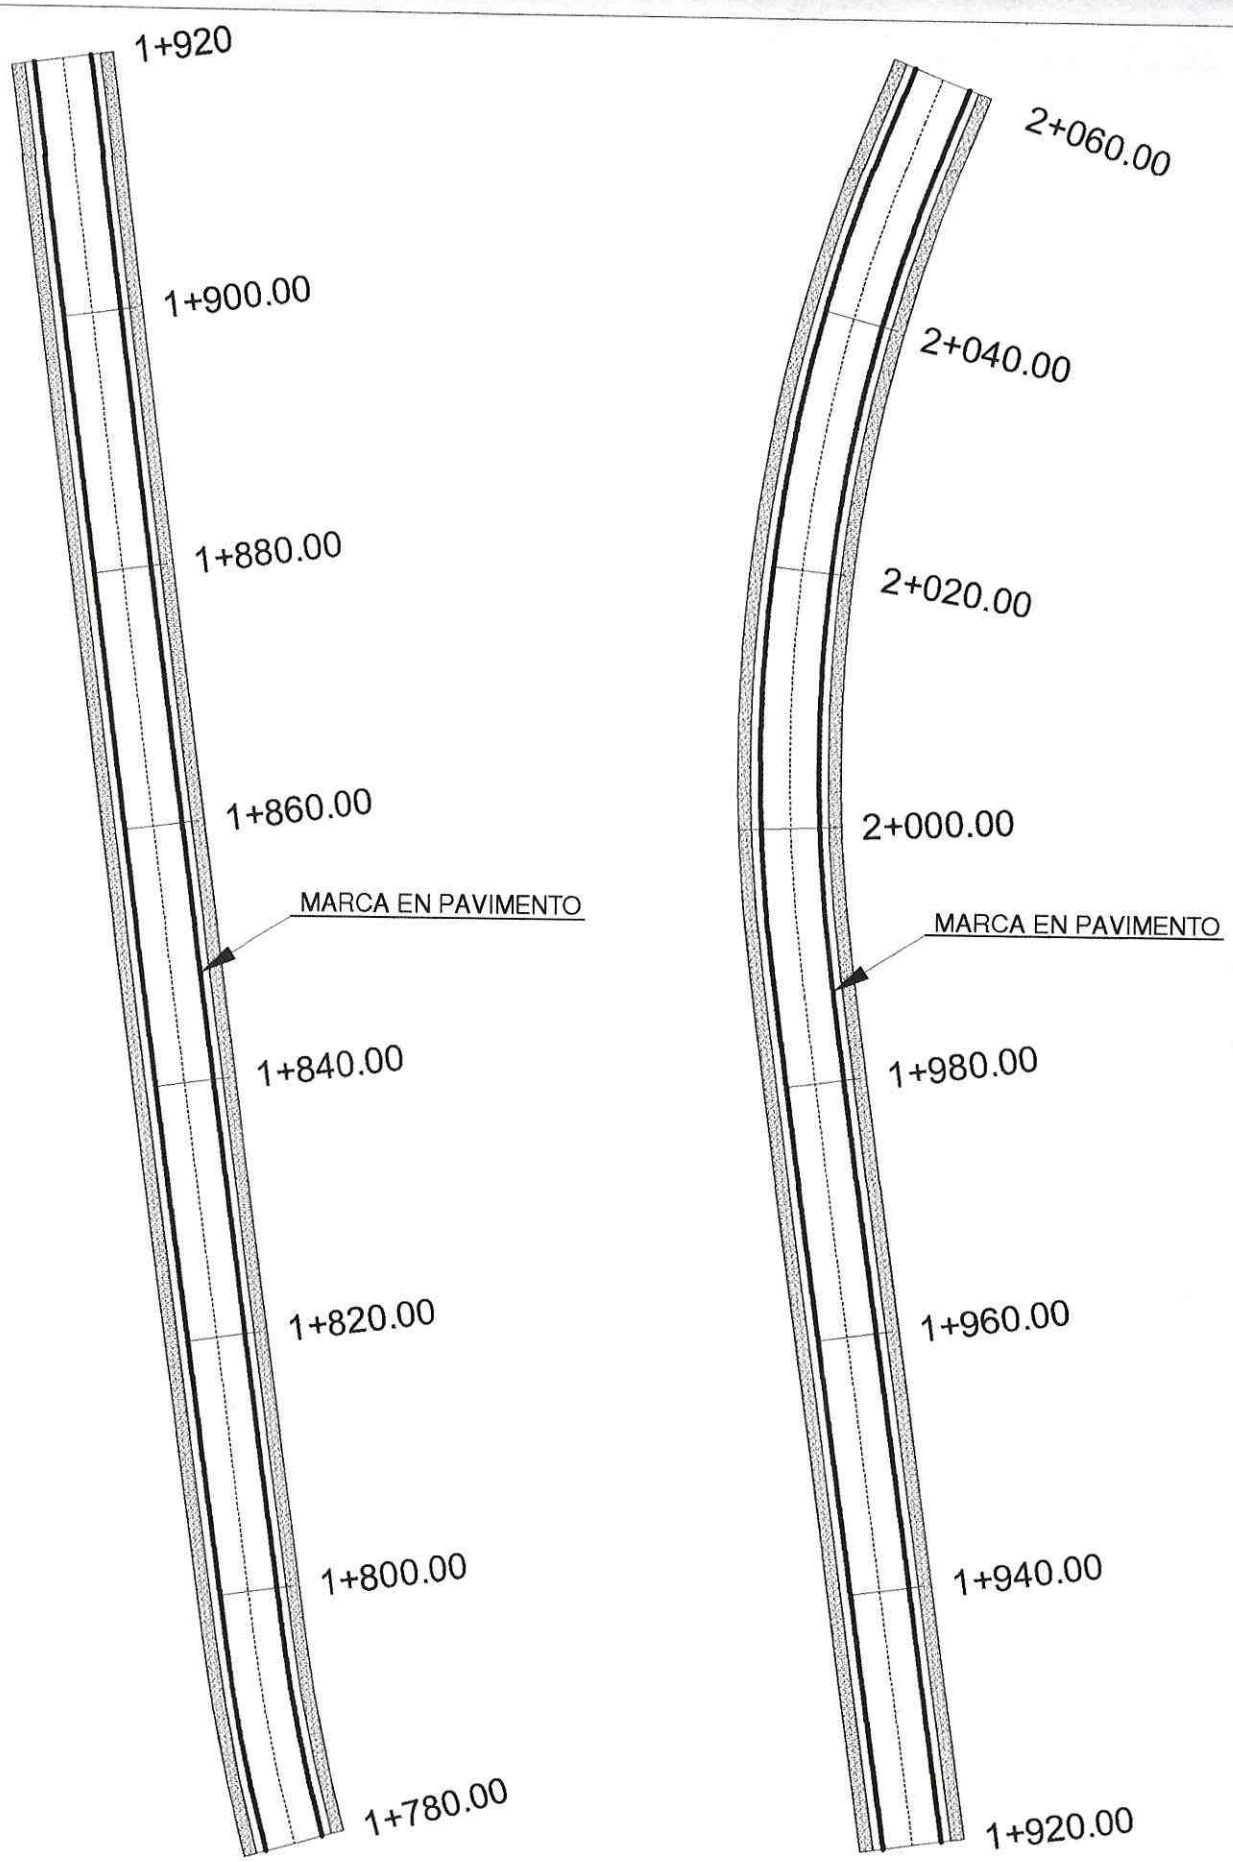


"ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTIENE: ANEXO GRAFICO PLANILLA 08: RUBRO 21: MARCAS EN PAVIMENTO

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA:	FISCALIZACION:	LAMINA: 11	ESCALA: SIN ESCALA
REPRESENTANTE LEGAL SR. MISAEL LOPEZ	ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	FECHA: Mayo de 2023	

OBSERVACIONES:

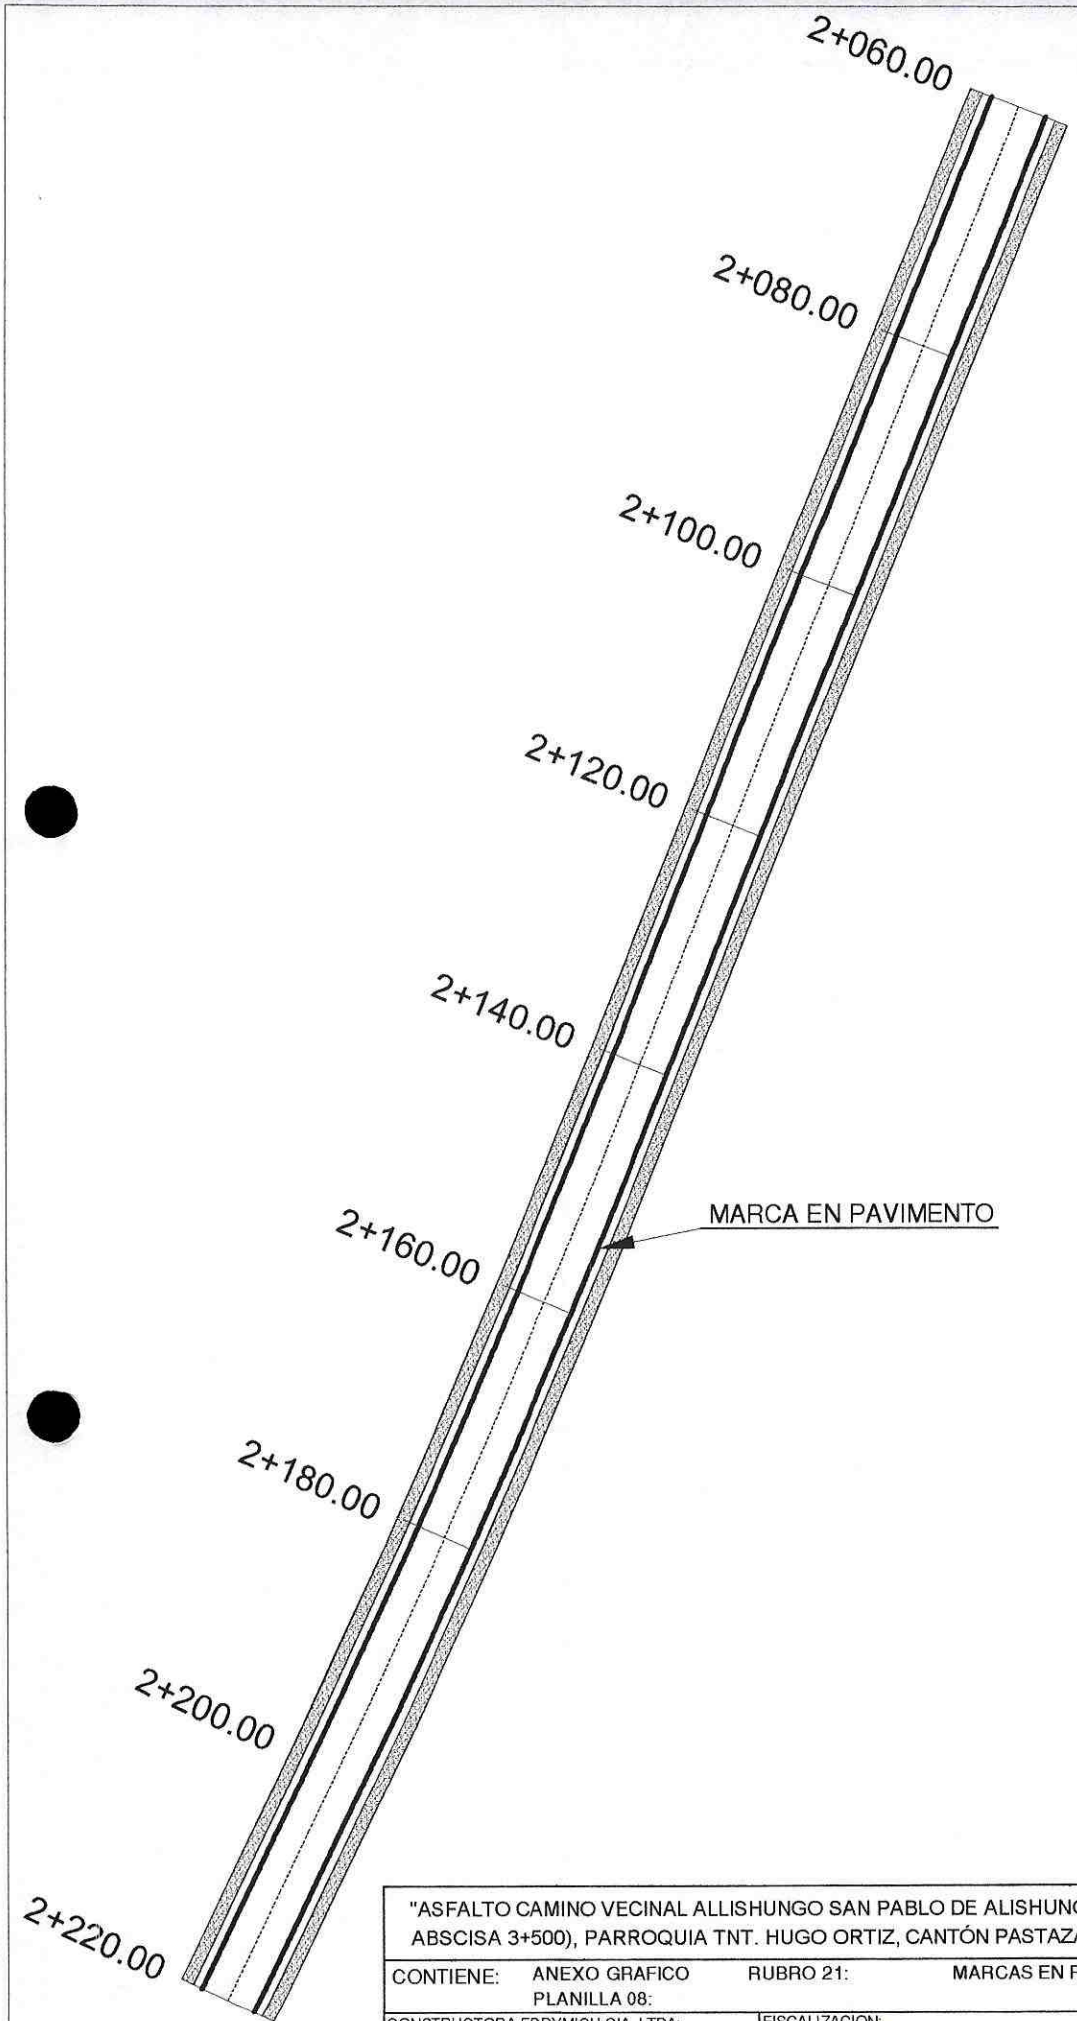


"ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTIENE: ANEXO GRAFICO PLANILLA 08: RUBRO 21: MARCAS EN PAVIMENTO

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA:	FISCALIZACION:	LAMINA: 12	ESCALA: SIN ESCALA
REPRESENTANTE LEGAL SR. MISAEL LOPEZ	ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	FECHA: Mayo de 2023	

OBSERVACIONES:

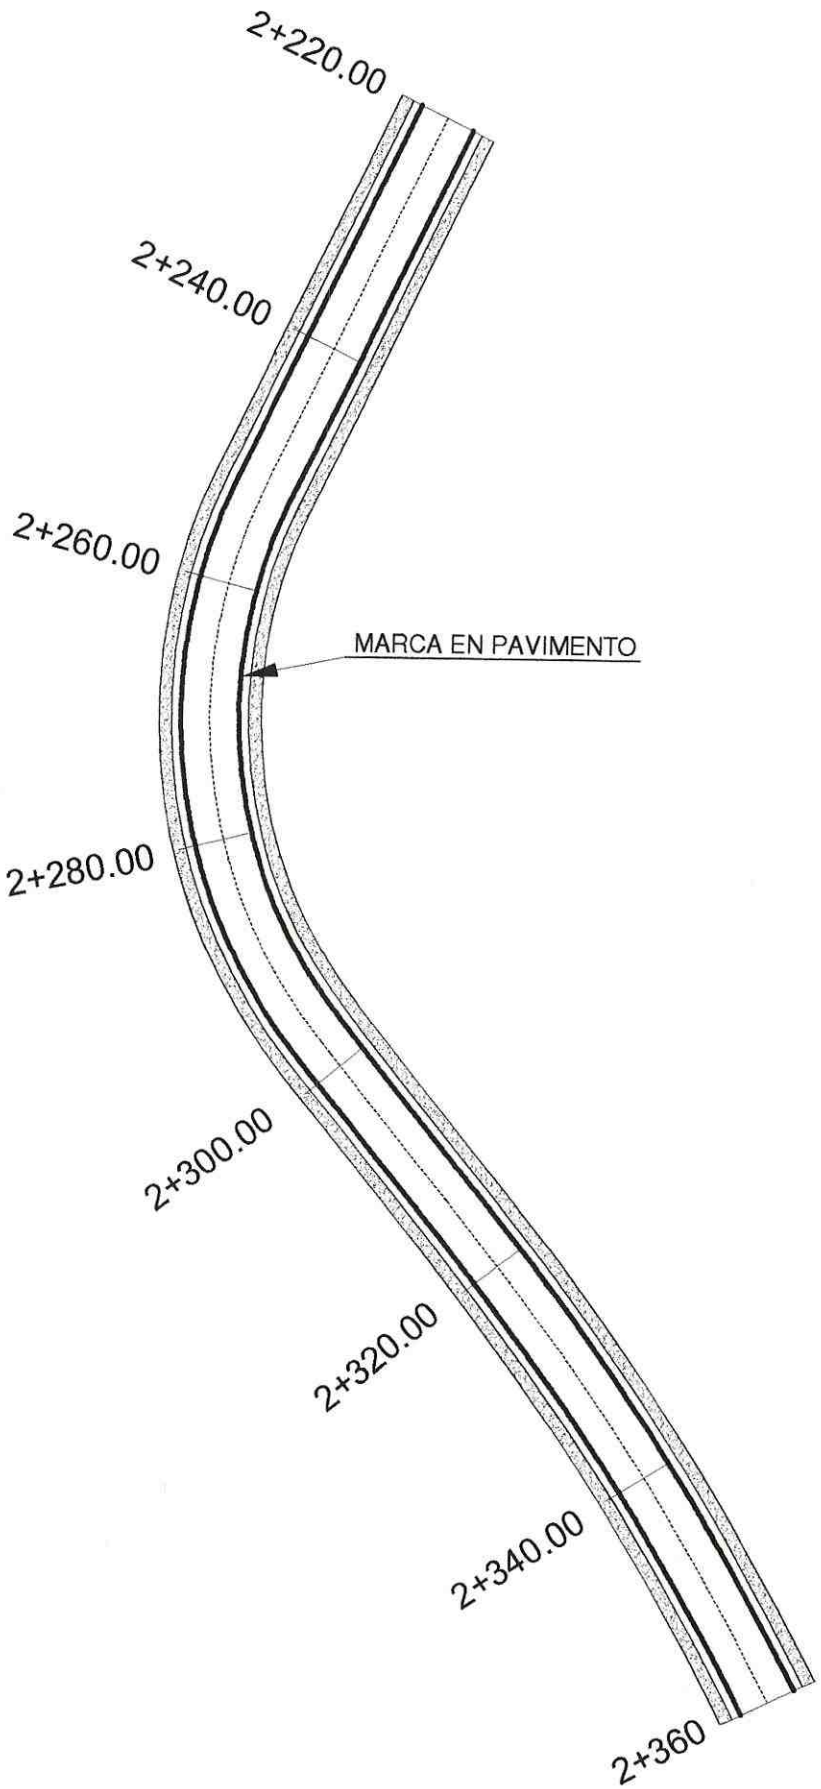


"ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTIENE: ANEXO GRAFICO PLANILLA 08: RUBRO 21: MARCAS EN PAVIMENTO

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA:	FISCALIZACION:	LAMINA: 13	ESCALA: SIN ESCALA
REPRESENTANTE LEGAL SR. MISAEL LOPEZ	ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	FECHA: Mayo de 2023	

OBSERVACIONES:

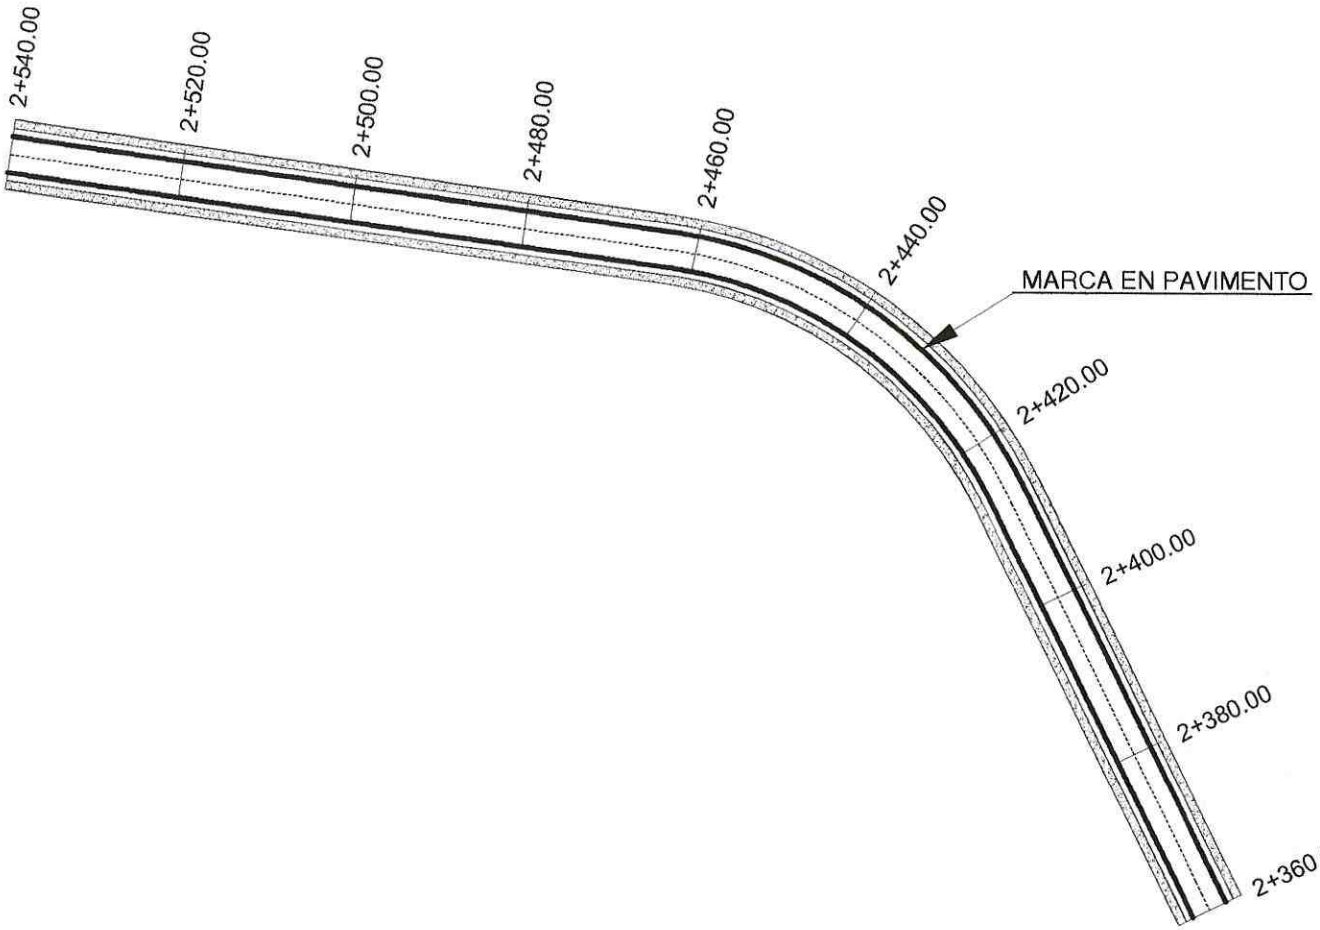


"ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTIENE: ANEXO GRAFICO PLANILLA 08: RUBRO 21: MARCAS EN PAVIMENTO

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA:	FISCALIZACION:	LAMINA: 14	ESCALA: SIN ESCALA
REPRESENTANTE LEGAL SR. MISAEL LOPEZ	ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	FECHA: Mayo de 2023	

OBSERVACIONES:

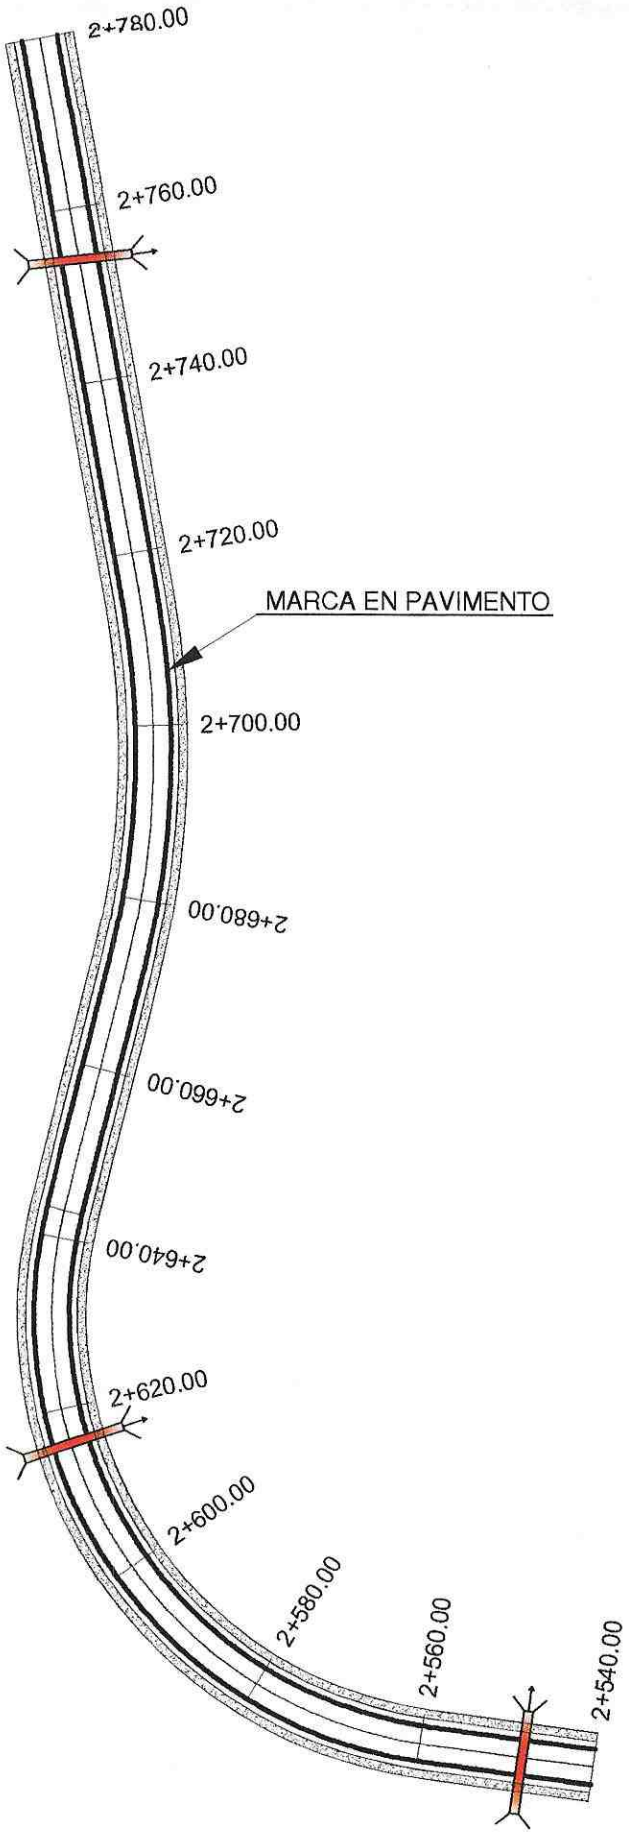


"ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTIENE: ANEXO GRAFICO — RUBRO 21: MARCAS EN PAVIMENTO

PLANILLA 08:

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA:	FISCALIZACION:	LAMINA: 15	ESCALA: SIN ESCALA
REPRESENTANTE LEGAL SR. MISAEL LOPEZ	ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	FECHA: Mayo de 2023	

OBSERVACIONES:

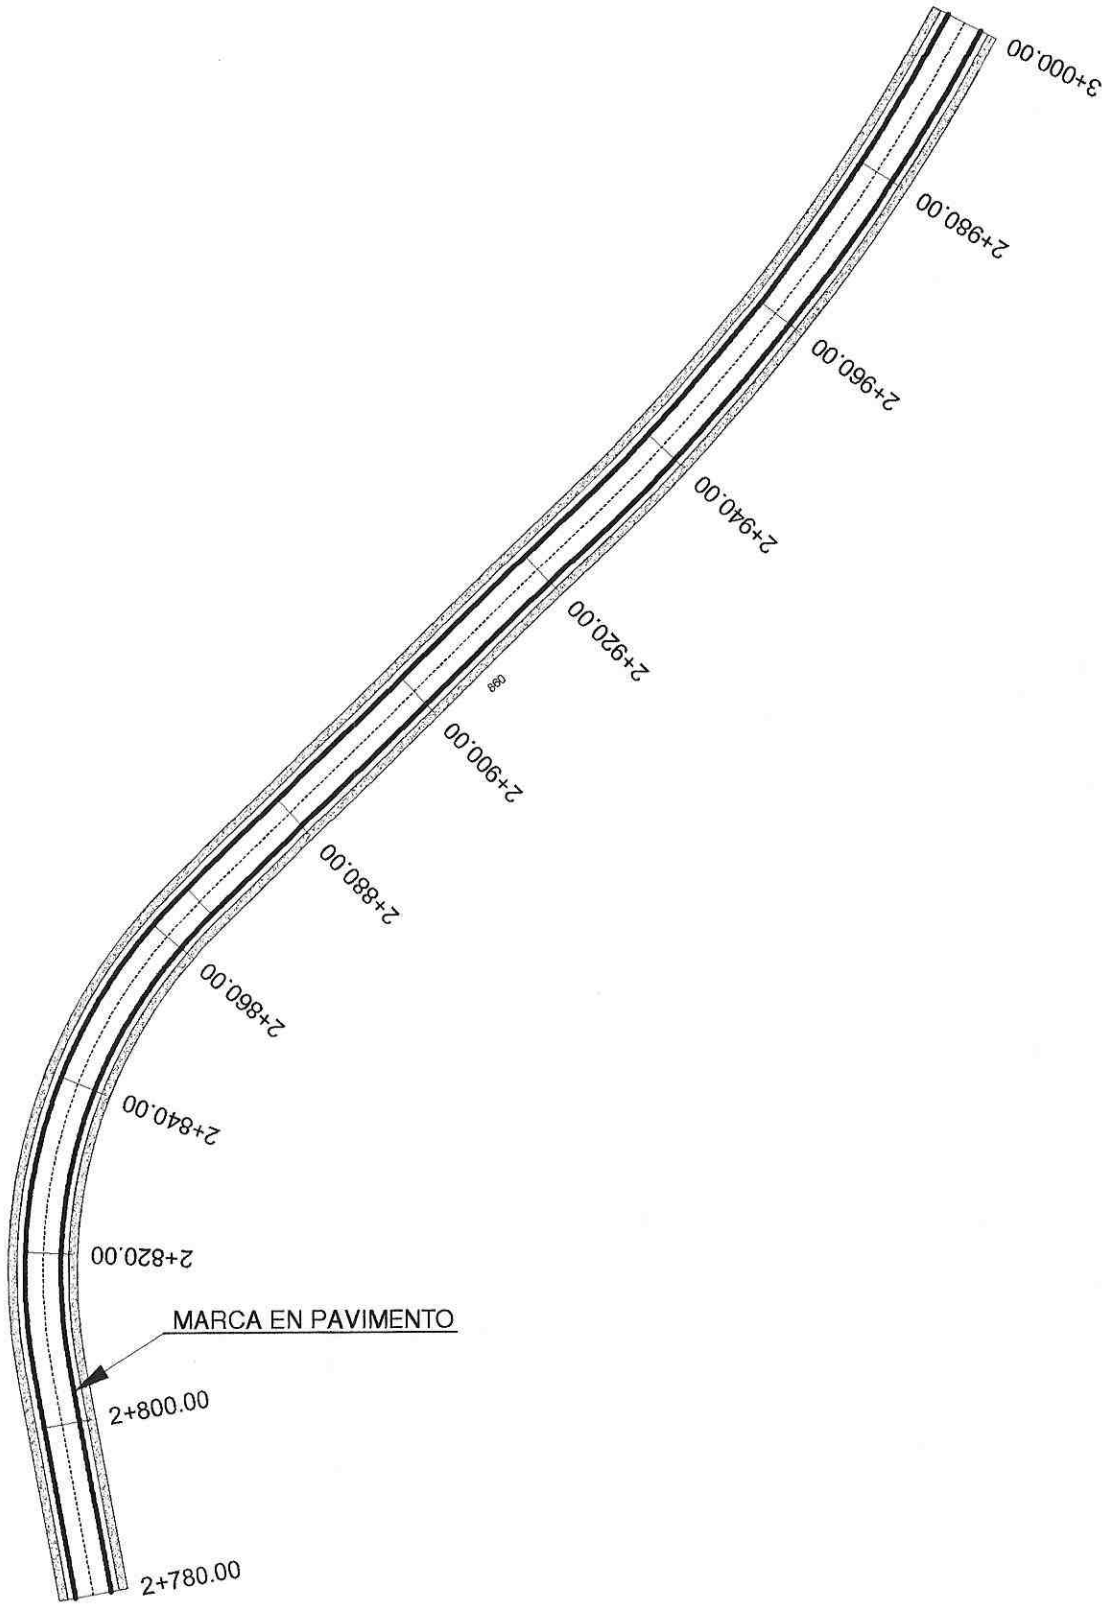

"ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTIENE: ANEXO GRAFICO PLANILLA 08: RUBRO 21: MARCAS EN PAVIMENTO

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA:	FISCALIZACION:	LAMINA: 16	ESCALA: SIN ESCALA
REPRESENTANTE LEGAL SR. MISAEL LOPEZ	ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	FECHA: Mayo de 2023	

OBSERVACIONES:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

ANEXO-CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	**CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.	**PLANILLA No.**	**08**
PERIODO:	1 AL 30 DE ABRIL DE 2023	**FISCALIZADOR:** ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	**hoja del rubro/item:** Nº: 01	de: 01
RUBRO N°: 27	**DESCRIPCION:** SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2			


CALCULO:

IDENTIFICACIÓN	TIPO DE SEÑAL	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
SP-03	PREVENTIVAS (0.75X0.75) M2	10.00	10.00	CURVA PRONUNCIADA A LA IZQUIERDA, LAMINA, 1,2,3,6,8,9,10,11
SP-04	PREVENTIVAS (0.75X0.75) M2	11.00	11.00	CURVA PRONUNCIADA A LA DERECHA, LAMINA 1,2,3,5,6,8,9,10,11
P9 (A)	PREVENTIVAS (0.75X0.75) M2	2.00	2.00	PENDIENTE (DESCENDENTE), LAMINA 2,8
SP-42	PREVENTIVAS (0.75X0.75) M2	5.00	5.00	ZONA DE DERRUMBE, LAMINA 2,3,4,5,
P-16	PREVENTIVAS (0.75X0.75) M2	2.00	2.00	PUENTE ANGOSTO, LAMINA 4,
P9 (B)	PREVENTIVAS (0.75X0.75) M2	3.00	3.00	PENDIENTE (ASCENDENTE), LAMINA 4,10
SP-13	PREVENTIVAS (0.75X0.75) M2	1.00	1.00	VIA LATERAL DERECHA, LAMINA 4,
SP-12	PREVENTIVAS (0.75X0.75) M2	1.00	1.00	VIA LATERAL IZQUIERDA, LAMINA 5
SP-10	PREVENTIVAS (0.75X0.75) M2	2.00	2.00	CURVA Y CONTRACURVA PRONUNCIADA DER-IZQ, LAMINA 6,7
SP-09	PREVENTIVAS (0.75X0.75) M2	3.00	3.00	CURVA Y CONTRACURVA PRONUNCIADA IZQ-DER, LAMINA 6,7,9
SP-57	PREVENTIVAS (0.75X0.75) M2	1.00	1.00	FINAL DE PAVIMENTO, LAMINA 11
		TOTAL:	**41.00**	

CANTIDAD TOTAL DE OBRA CONTRATADA:	**100.00 U**	**CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA**	**TOTAL**	**41.00**
			UNIDAD	**U**
		PLANILLA ANTERIOR =		0.00
		ESTA PLANILLA =		**41.00**
		TOTAL EJECUTADO A LA FECHA=		**41.00**
		% DE AVANCE =		**41.00%**

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZADOR

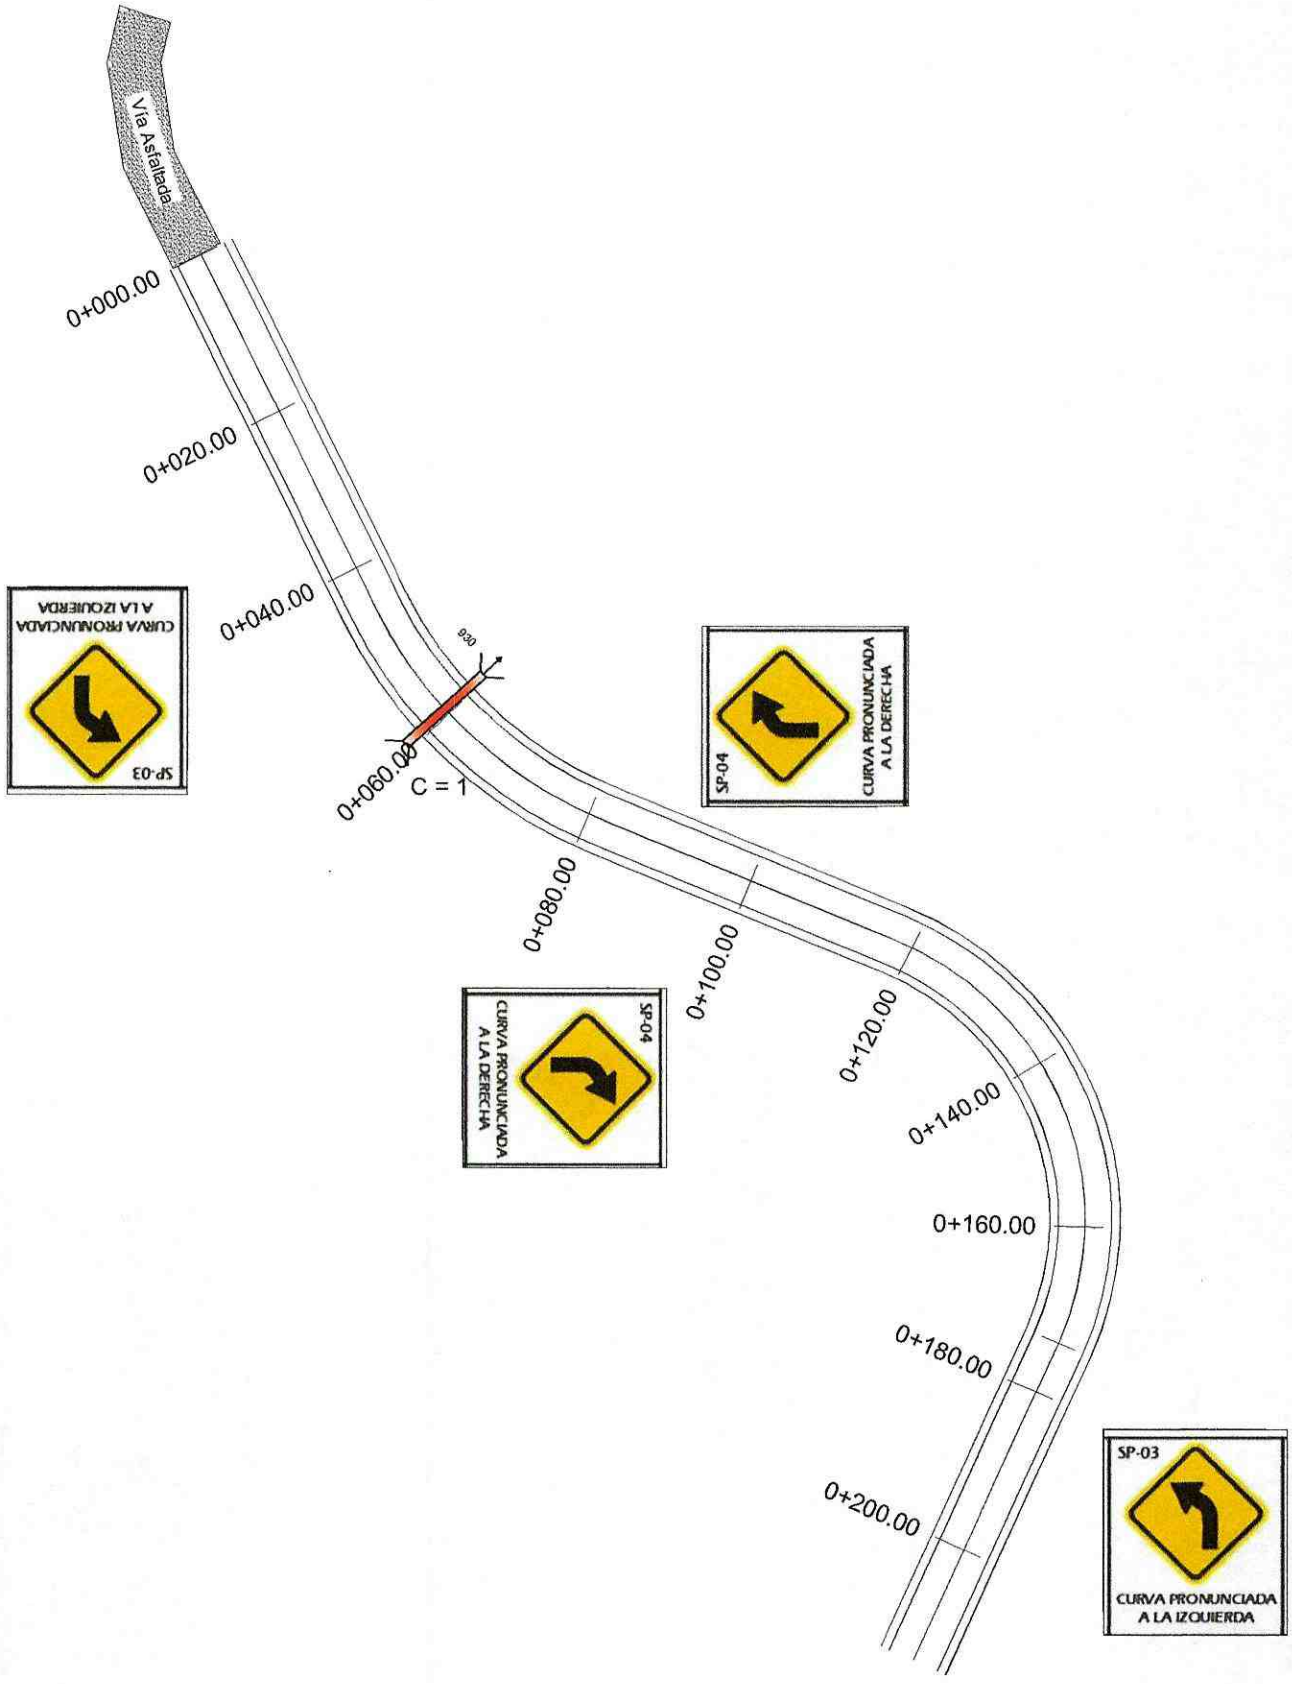

"ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTIENE: ANEXO GRAFICO
PLANILLA 08:

RUBRO 27: SEÑALES PREVENTIVAS (0.75x0.75)M2

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA:

REPRESENTANTE LEGAL SR. MISAEL LOPEZ

FISCALIZACIÓN:

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER

LAMINA: 1

ESCALA: SIN ESCALA

FECHA: Mayo de 2023

OBSERVACIONES:









0+320.00

0+340.00

0+360.00

0+380.00

0+400.00

0+420.00

0+440.00

0+460.00

0+480.00

0+500.00

0+520.00

"ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTIENE: ANEXO GRAFICO
PLANILLA 08:

RUBRO 27: SEÑALES PREVENTIVAS (0.75x0.75)M2

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA:

REPRESENTANTE LEGAL SR. MISAEL LOPEZ

FISCALIZACION:


ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER

LAMINA: 2

ESCALA: SIN ESCALA

FECHA: Mayo de 2023

OBSERVACIONES:

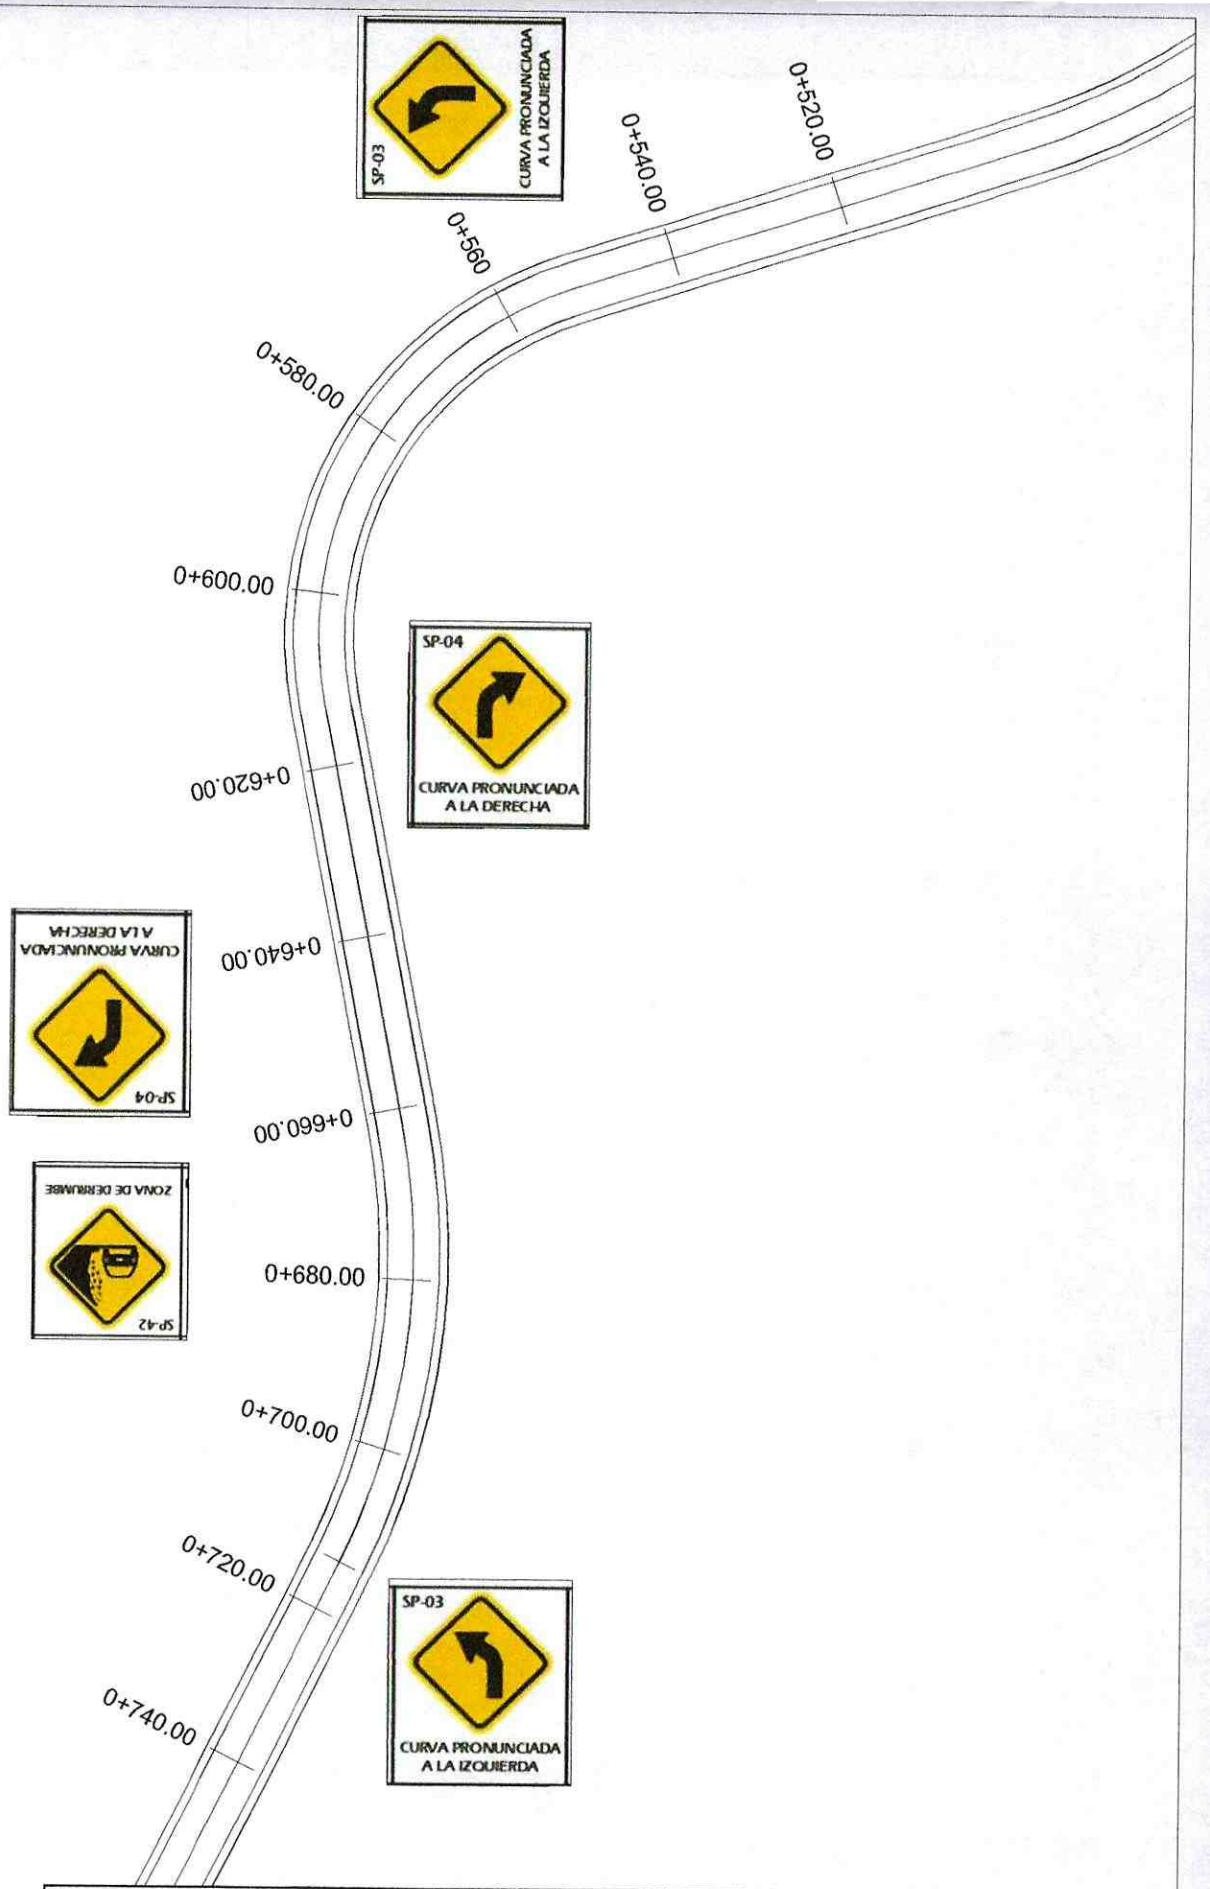


"ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTIENE: ANEXO GRAFICO
PLANILLA 08: RUBRO 27: SEÑALES PREVENTIVAS (0.75x0.75)M2

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA:	FISCALIZACION:	LAMINA: 3	ESCALA: SIN ESCALA
REPRESENTANTE LEGAL SR. MISAEL LOPEZ	ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	FECHA: Mayo de 2023	

OBSERVACIONES:

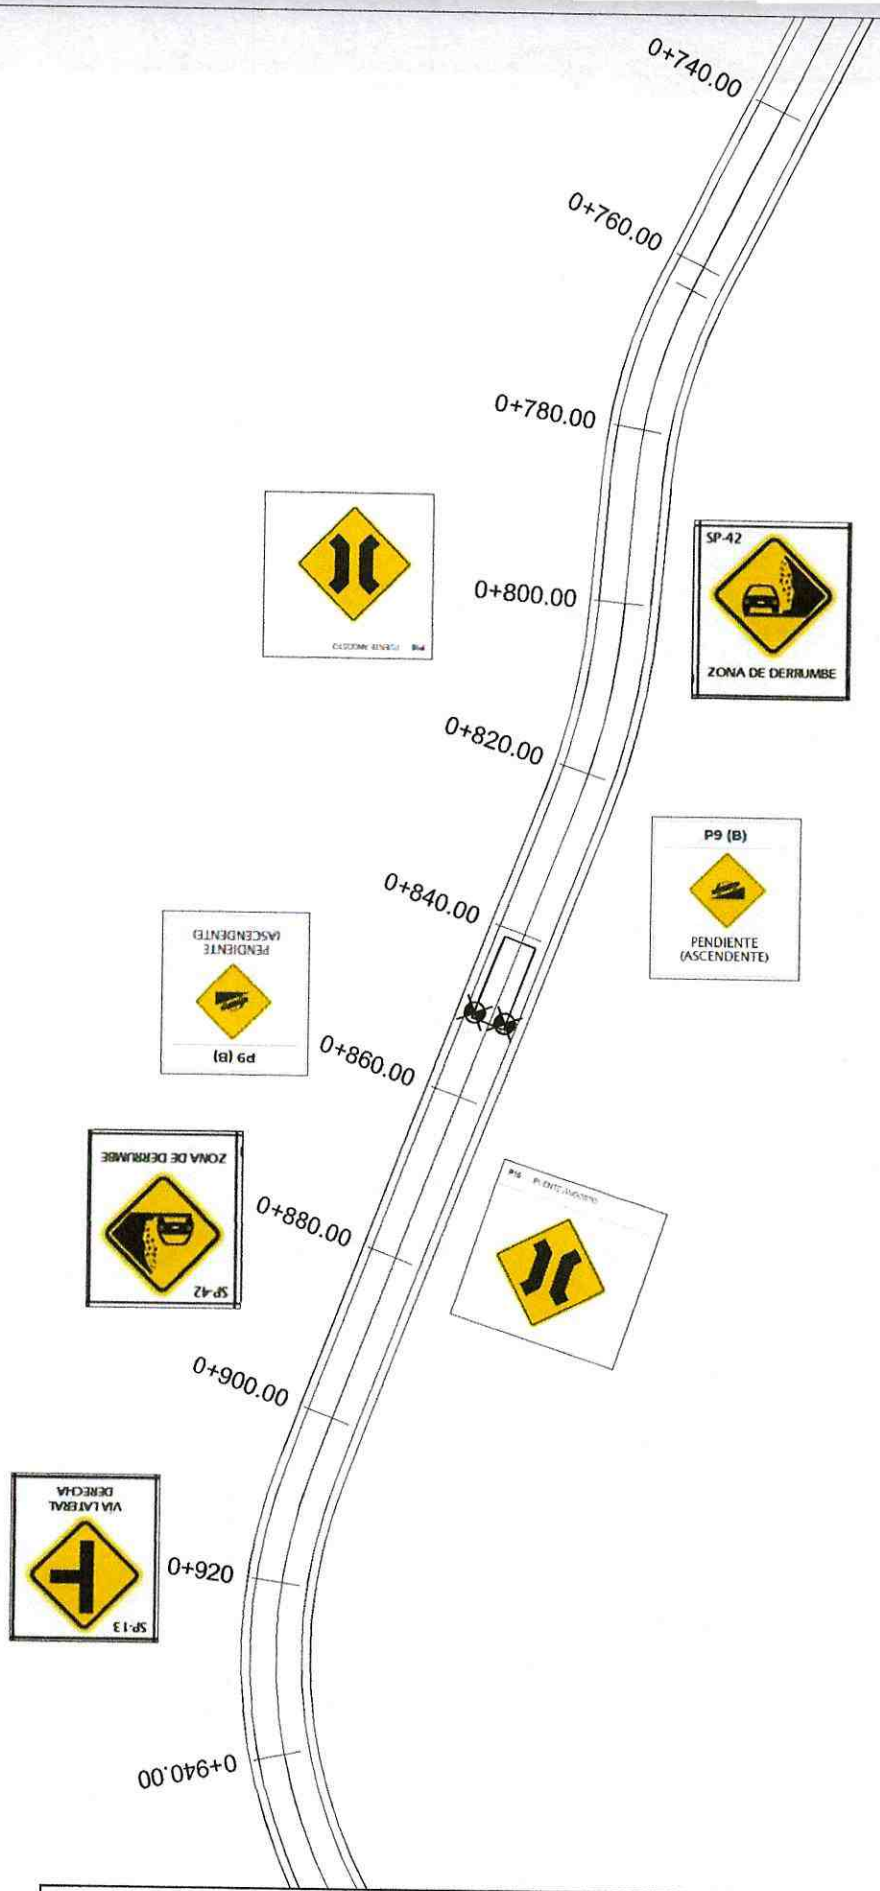


"ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTIENE: ANEXO GRAFICO
PLANILLA 08: RUBRO 27: SEÑALES PREVENTIVAS (0.75x0.75)M2

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA:	FISCALIZACION:	LAMINA: 4	ESCALA: SIN ESCALA
REPRESENTANTE LEGAL SR. MISAEL LOPEZ	ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	FECHA: Mayo de 2023	

OBSERVACIONES:

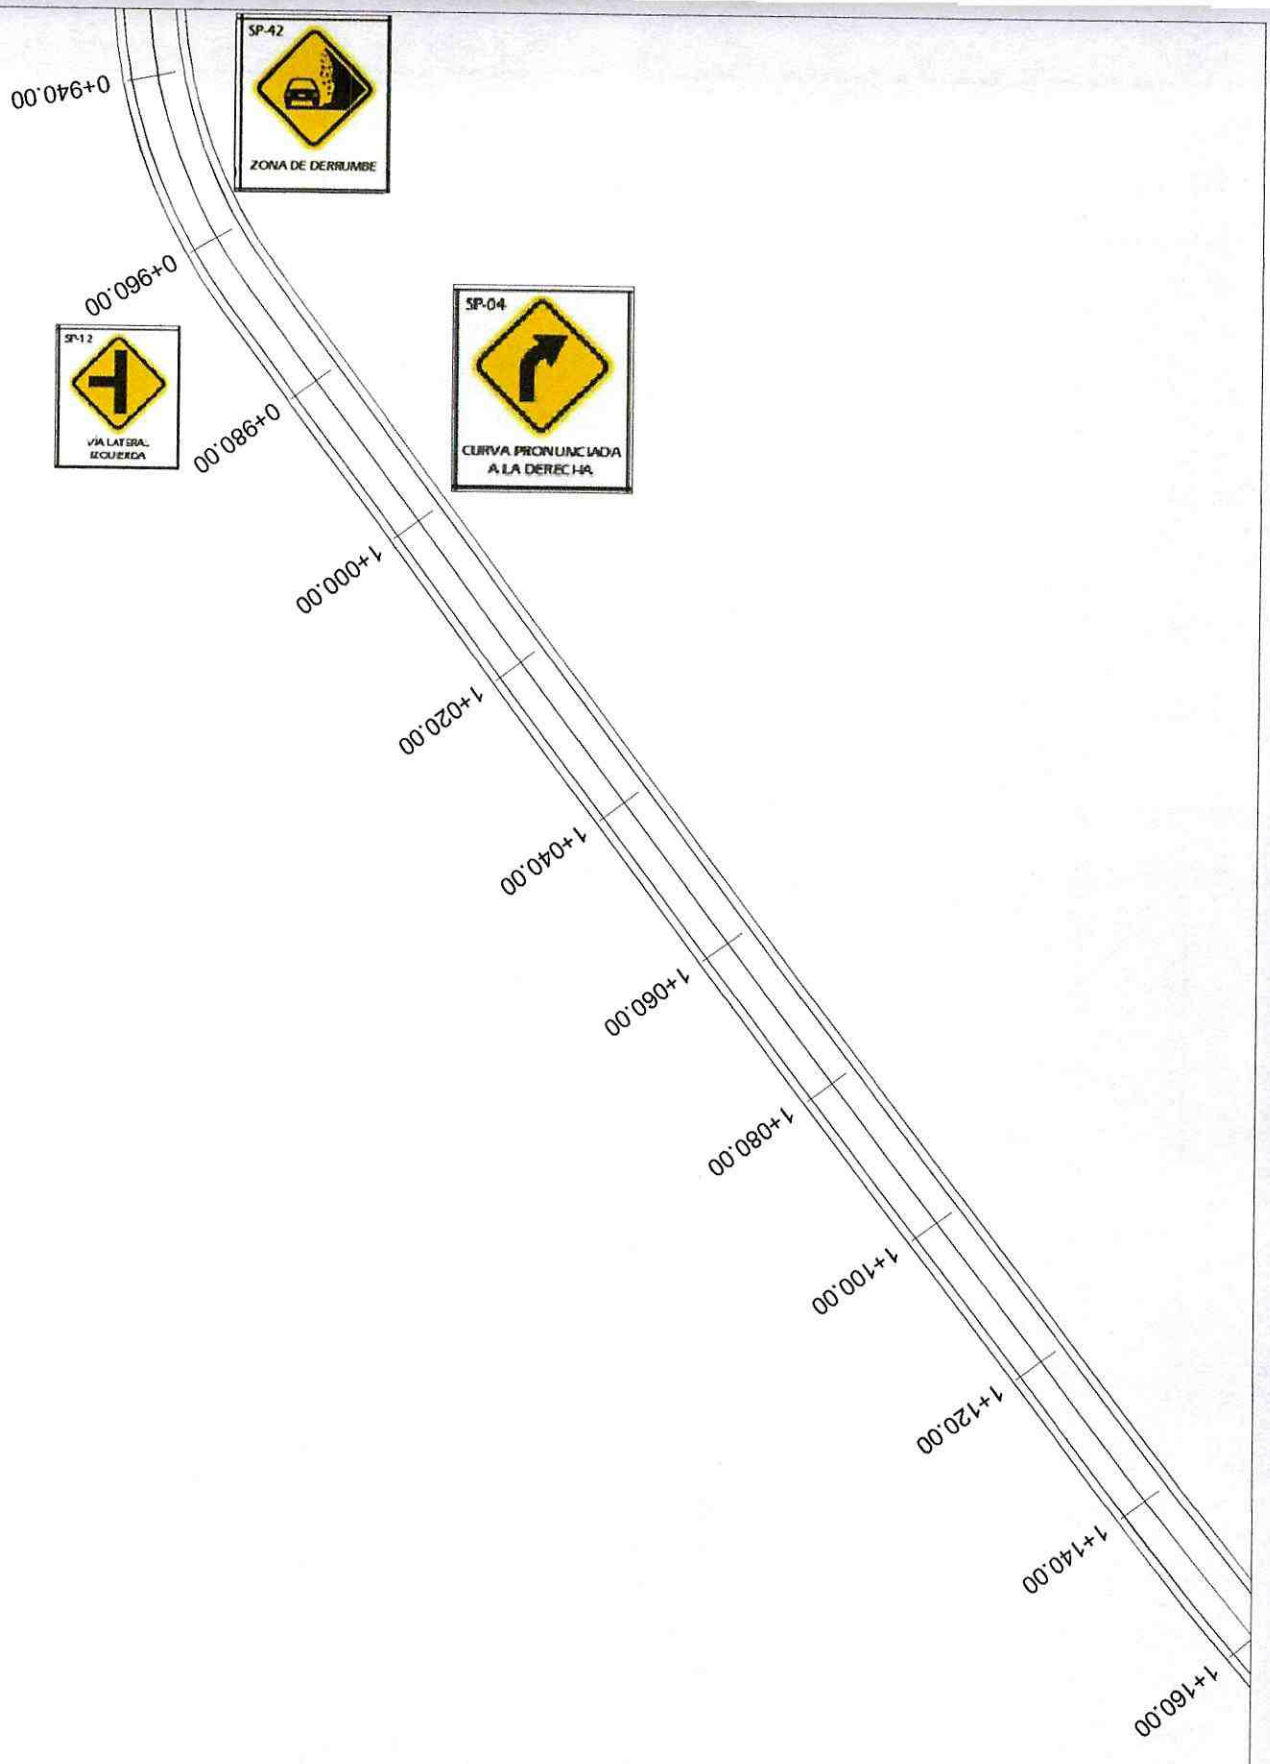

"ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTIENE: ANEXO GRAFICO
PLANILLA 08: RUBRO 27: SEÑALES PREVENTIVAS (0.75x0.75)M2

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA:	FISCALIZACION:	LAMINA: 5	ESCALA: SIN ESCALA
REPRESENTANTE LEGAL SR. MISAEL LOPEZ	ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	FECHA: Mayo de 2023	

OBSERVACIONES:

"ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTIENE: ANEXO GRAFICO
PLANILLA 08: RUBRO 27: SEÑALES PREVENTIVAS (0.75x0.75)M2

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA:	FISCALIZACION:	LAMINA: 6	ESCALA: SIN ESCALA
REPRESENTANTE LEGAL SR. MISAEL LOPEZ	ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	FECHA: Mayo de 2023	

OBSERVACIONES:

1+680.00

1+700.00

1+720.00

1+740.00

1+760.00

1+780.00

1+800.00

1+820.00

1+840.00

1+860.00

1+880.00


"ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTIENE: ANEXO GRAFICO
PLANILLA 08:

RUBRO 27: SEÑALES PREVENTIVAS (0.75x0.75)M2

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA:	FISCALIZACION:	LAMINA: 7	ESCALA: SIN ESCALA
REPRESENTANTE LEGAL SR. MISAEL LOPEZ	ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	FECHA: Mayo de 2023	

OBSERVACIONES:

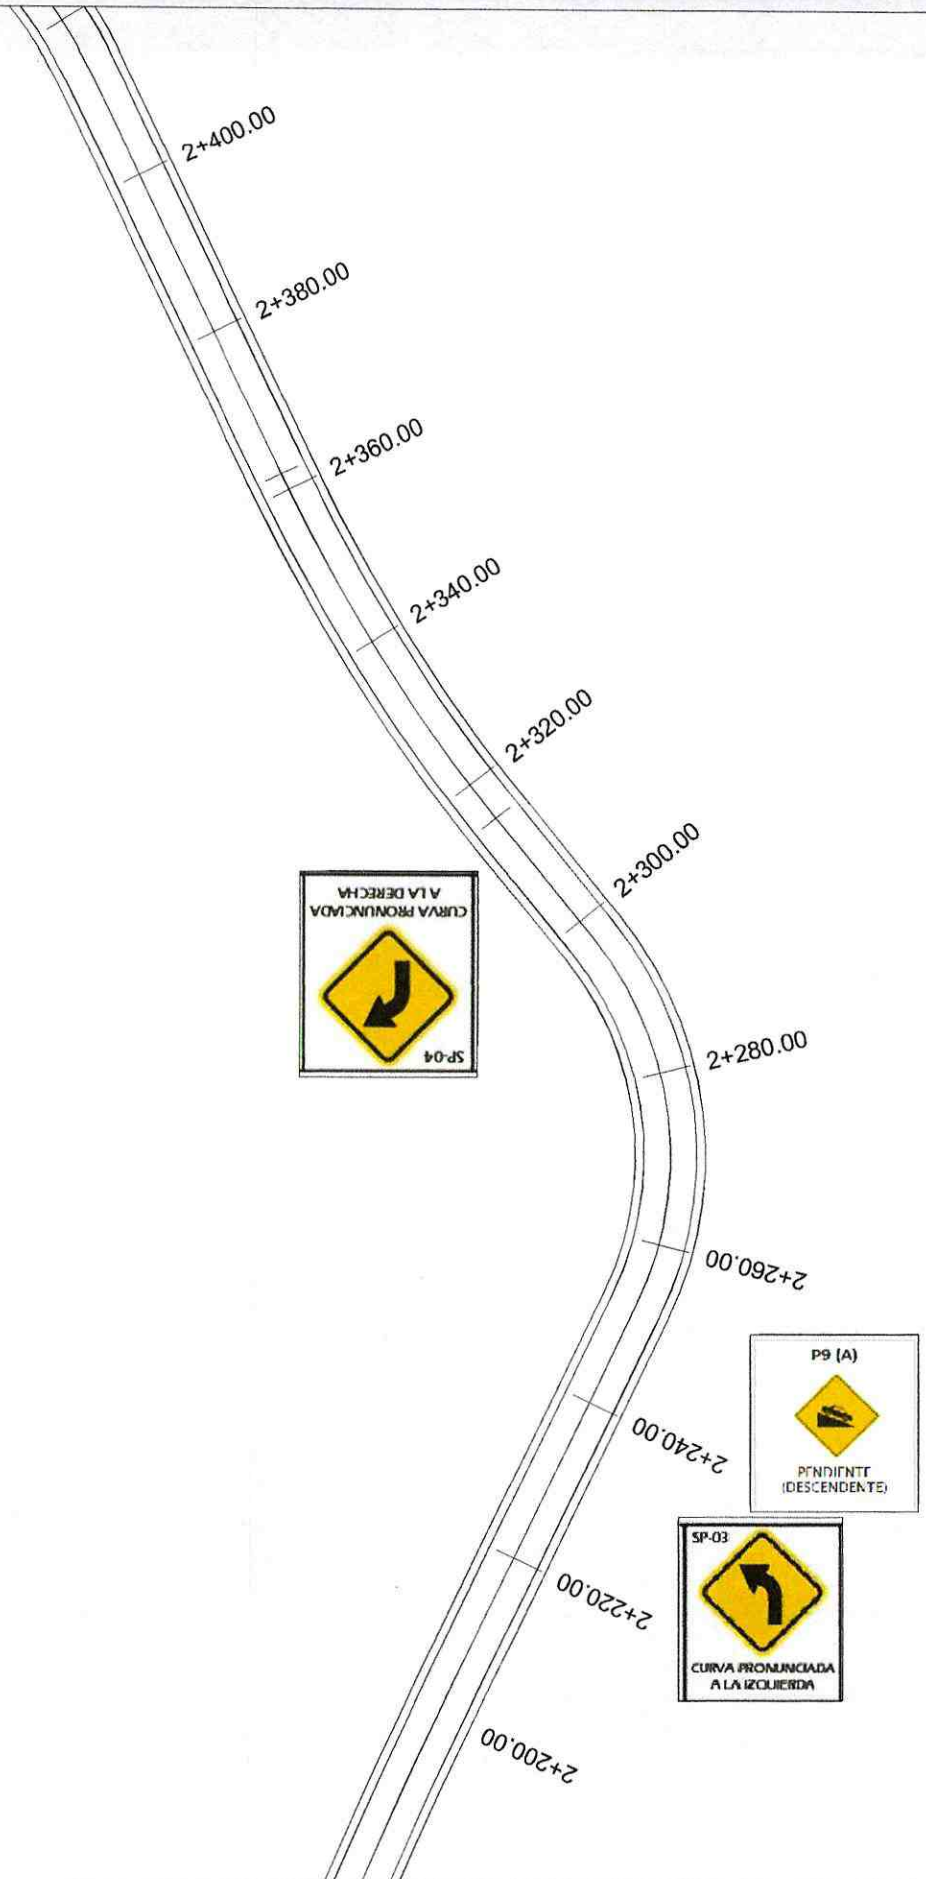


"ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTIENE: ANEXO GRAFICO PLANILLA 08: RUBRO 27: SEÑALES PREVENTIVAS (0.75x0.75)M2

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA:	FISCALIZACION:	LAMINA: 8	ESCALA: SIN ESCALA
REPRESENTANTE LEGAL SR. MISAEL LOPEZ	ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	FECHA: Mayo de 2023	

OBSERVACIONES:

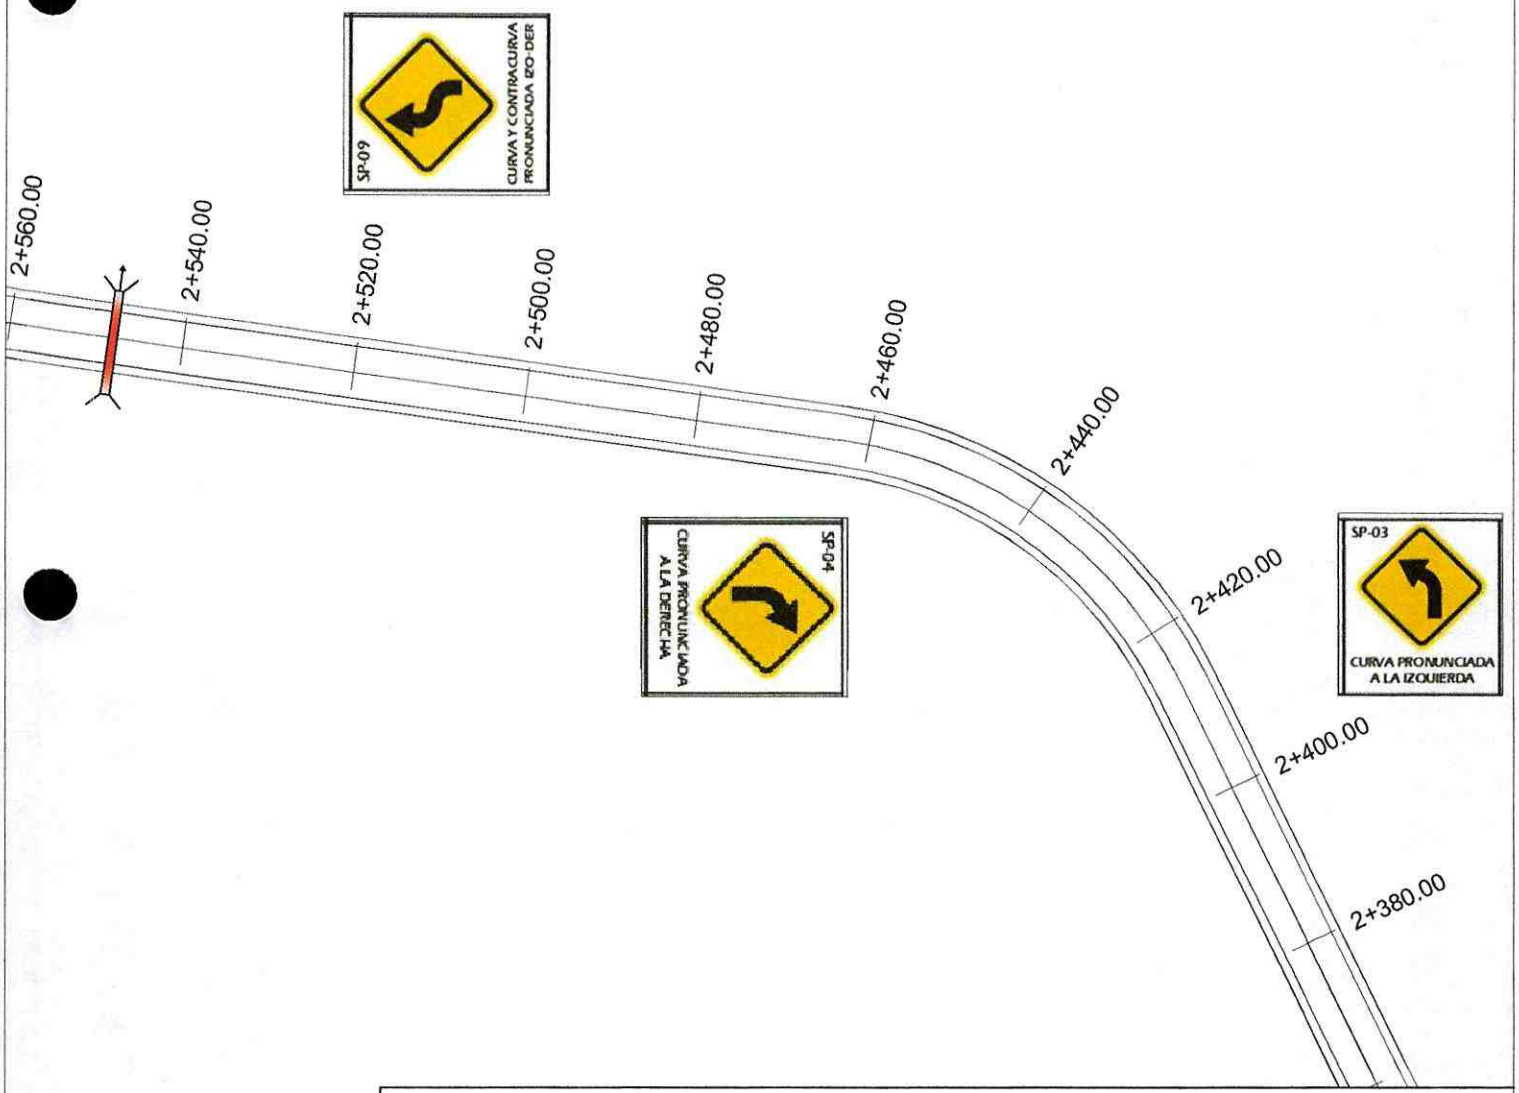


"ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTIENE: ANEXO GRAFICO
PLANILLA 08: RUBRO 27: SEÑALES PREVENTIVAS (0.75x0.75)M2

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA:	FISCALIZACION:	LAMINA: 9	ESCALA: SIN ESCALA
REPRESENTANTE LEGAL SR. MISAEL LOPEZ	ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	FECHA: Mayo de 2023	

OBSERVACIONES:

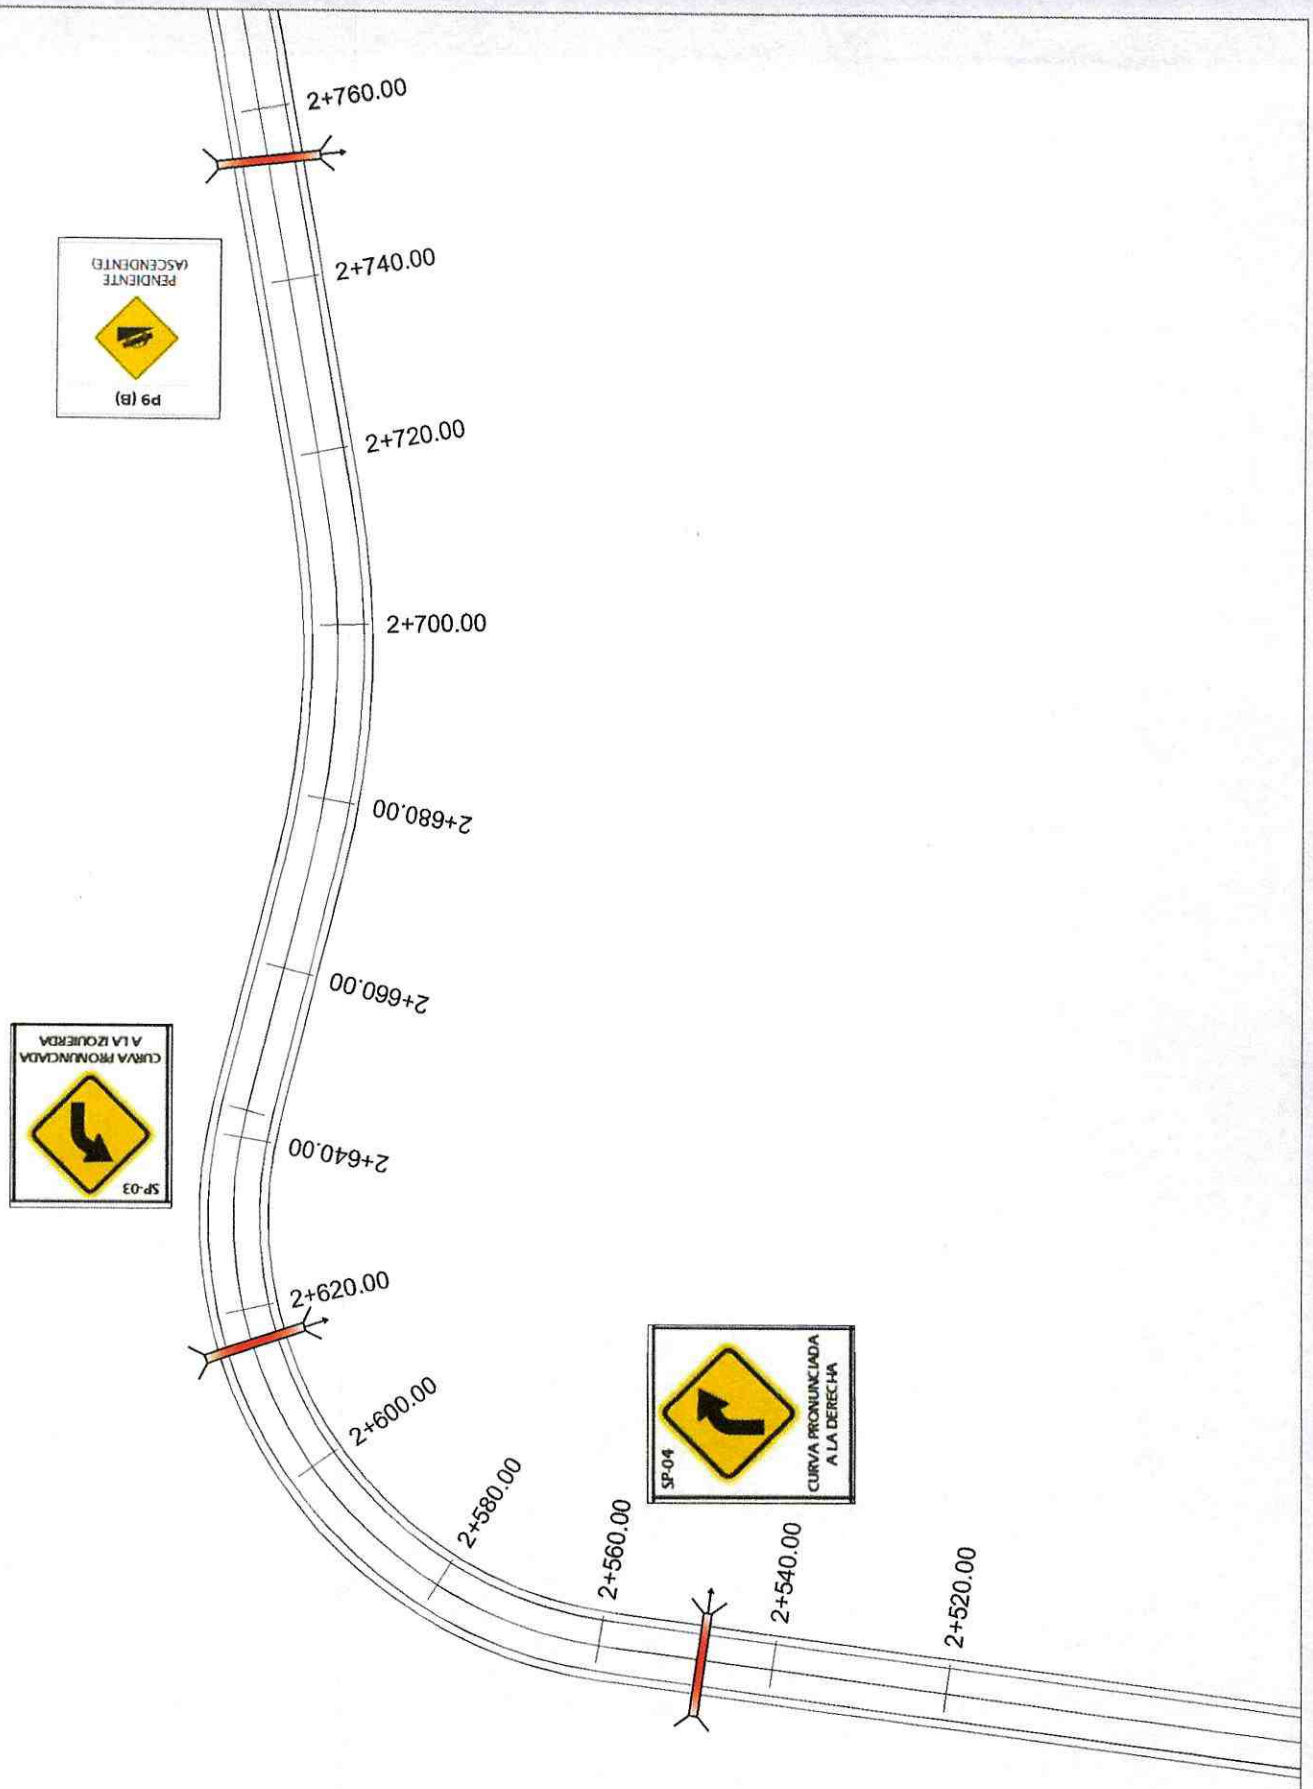

"ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTIENE: ANEXO GRAFICO PLANILLA 08: RUBRO 27: SEÑALES PREVENTIVAS (0.75x0.75)M2

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA:	FISCALIZACION:	LAMINA: 10	ESCALA: SIN ESCALA
REPRESENTANTE LEGAL SR. MISAEL LOPEZ	ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	FECHA: Mayo de 2023	

OBSERVACIONES:

"ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+00 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTIENE: ANEXO GRAFICO PLANILLA 08: RUBRO 27: SEÑALES PREVENTIVAS (0.75x0.75)M2

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA:	FISCALIZACION:	LAMINA: 11	ESCALA: SIN ESCALA
REPRESENTANTE LEGAL SR. MISAEL LOPEZ	ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER	FECHA: Mayo de 2023	

OBSERVACIONES:

PLANILLA 08 - LIQUIDACIÓN DE OBRA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

ANEXO:

MEMORIA FOTOGRÁFICA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023
CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
MONTO : $ 789.464,39

FECHA: MAYO DE 2023
FECHA DE INICIO: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL: 180 DÍAS
AMPLIACIÓN DE PLAZO 01: 40 DÍAS
AMPLIACIÓN DE PLAZO 02: 10 DÍAS
AMPLIACIÓN DE PLAZO 03: 15 DÍAS
PLAZO CONTRACTUAL+ AMPLIACIONES: 245 DÍAS

RUBRO 9: HORMIGÓN PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM2)
INGRESOS VEHICULARES:





CONSTRUCTORA EDDY MICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZADOR

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023
CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
MONTO : $ 789.464,39

FECHA: MAYO DE 2023
FECHA DE INICIO: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL: 180 DÍAS
AMPLIACIÓN DE PLAZO 01: 40 DÍAS
AMPLIACIÓN DE PLAZO 02: 10 DÍAS
AMPLIACIÓN DE PLAZO 03: 15 DÍAS
PLAZO CONTRACTUAL+ AMPLIACIONES: 245 DÍAS

RUBRO 21: MARCAS EN PAVIMENTO







CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZADOR

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023
CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022
MONTO : $ 789.464,39

FECHA: MAYO DE 2023
FECHA DE INICIO: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRACTUAL: 180 DÍAS
AMPLIACIÓN DE PLAZO 01: 40 DÍAS
AMPLIACIÓN DE PLAZO 02: 10 DÍAS
AMPLIACIÓN DE PLAZO 03: 15 DÍAS
PLAZO CONTRACTUAL+ AMPLIACIONES: 245 DÍAS

RUBRO 27: SEÑALES PREVENTIVAS (0.75x0.75) M2







CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZADOR

PLANILLA 08 - LIQUIDACIÓN DE OBRA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

ANEXO:

ENSAYOS DE LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD

INFORME DE RESULTADOS

DE


RESISTENCIA DE MATERIALES

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO, PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", (CONTROL DE HORMIGON SIMPLE EN CUNETAS)

UBICACIÓN: PROVINCIA DE PASTAZA

PARA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

FECHA: 11-04-2023

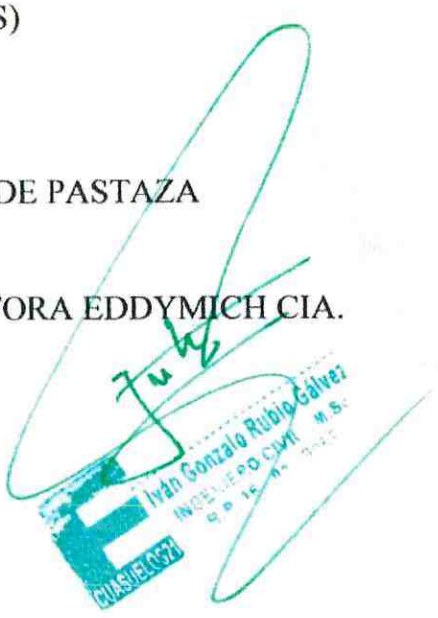

QUITO
Diego de Chávez 0e9-105 y Juan López de Velasco
Telfs.: C 0997 287 511 / M 0998 217 909 / (02) 2615 545
e-mail: ecuasuelos21@cablemodem.com.ec
PUYO
Francisco de Orellana No. 586 y Gral. Villamil
Telfs.: C 0997 287 511 / M 0998 217 909 / (03) 2889 706

ECUASUELOS21
HORMIGONES - SUELOS - ASFALTOS - INYECCIONES - ANCLAJES

PROYECTO: ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO - SAN PABLO DE ALLISHUNGO, PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ
OBRA: HORMIGON SIMPLE EN CUNETAS
LOCALIZACION: PROVINCIA DE PASTAZA
PARA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
ELEMENTO: CILINDRO DE HORMIGON, DIAMETRO 6". ENSAYO DE COMPRESION
ASTM C-39

PROBETA	FECHA TOMA	FECHA ENSAYO	EDAD (DIAS)	IDENTIFICACION ELEMENTO	CARGA (KG)	DIAMETRO (CM)	ALTURA (CM)	AREA (CM2)	VOLUMEN (CM3)	RESISTENCIA (KG/CM2)	F'C ESPECIFICADO (KG/CM2)
1	1/3/2023	28/3/2023	28	Cuneta lado derecho Abscisa 2+220 a 2+260	34656	15	30	176,7	5301,5	196	180
2	1/3/2023	28/3/2023	28	Cuneta lado izquierdo Abscisa 2+220 a 2+260	34651	15	30	176,7	5301,5	196	180
3	7/3/2023	3/4/2023	28	Cuneta lado derecho Abscisa 2+260 a 2+300	34253	15	30	176,7	5301,5	194	180
4	7/3/2023	3/4/2023	28	Cuneta lado izquierdo Abscisa 2+260 a 2+300	34338	15	30	176,7	5301,5	194	180
5	10/3/2023	6/4/2023	28	Cuneta lado derecho Abscisa 2+300 a 2+340	34411	15	30	176,7	5301,5	195	180
6	10/3/2023	6/4/2023	28	Cuneta lado izquierdo Abscisa 2+300 a 2+340	34165	15	30	176,7	5301,5	193	180
7	13/3/2023	9/4/2023	28	Cuneta lado derecho Abscisa 2+340 a 2+380	34650	15	30	176,7	5301,5	196	180
8	13/3/2023	9/4/2023	28	Cuneta lado izquierdo Abscisa 2+340 a 2+380	34691	15	30	176,7	5301,5	196	180
9	15/3/2023	11/4/2023	28	Cuneta lado derecho Abscisa 2+380 a 2+420	33854	15	30	176,7	5301,5	192	180
10	15/3/2023	11/4/2023	28	Cuneta lado izquierdo Abscisa 2+380 a 2+420	34429	15	30	176,7	5301,5	195	180
11	16/3/2023	11/4/2023	27	Cuneta lado derecho Abscisa 2+420 a 2+460	34297	15	30	176,7	5301,5	194	180
12	16/3/2023	11/4/2023	27	Cuneta lado izquierdo Abscisa 2+420 a 2+460	34226	15	30	176,7	5301,5	194	180
13	18/3/2023	11/4/2023	25	Cuneta lado derecho Abscisa 2+460 a 2+500	33937	15	30	176,7	5301,5	192	180
14	18/3/2023	11/4/2023	25	Cuneta lado izquierdo Abscisa 2+460 a 2+500	34749	15	30	176,7	5301,5	197	180
15	19/3/2023	11/4/2023	24	Cuneta lado derecho Abscisa 2+500 a 2+540	34061	15	30	176,7	5301,5	193	180
16	19/3/2023	11/4/2023	24	Cuneta lado izquierdo Abscisa 2+500 a 2+540	33853	15	30	176,7	5301,5	192	180
17	20/3/2023	11/4/2023	23	Cuneta lado derecho Abscisa 2+540 a 2+580	34478	15	30	176,7	5301,5	195	180
18	20/3/2023	11/4/2023	23	Cuneta lado izquierdo Abscisa 2+540 a 2+580	34114	15	30	176,7	5301,5	193	180

OBSERVACIONES: Las probetas de hormigón fueron entregadas en el Laboratorio por el contratista.

Iván Rubio Gálvez
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA: SUELOS Y Ho
MASTER EXE
MASTER OF SCIENCE CONSTRUCCIONES
R.P. 16-01-0052

Iván Gonzalo Rubio Gálvez
INGENIERO CIVIL
R.P. 16 - 01
ECUASUELOS21

QUITO
Diego de Chávez 0e9-105 y Juan López de Velasco
Telfs.: C 0997 287 511 / M 0998 217 909 / (02) 2615 645
e-mail: ecuasuelos21@cablemodem.com.ec
PUYO
Francisco de Orellana No. 586 y Gral. Villamil
Telfs.: C 0997 287 511 / M 0998 217 909 / (03) 2889 706

PROYECTO: ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO - SAN PABLO DE ALLISHUNGO, PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ
OBRA: HORMIGON SIMPLE EN CUNETAS
LOCALIZACION: PROVINCIA DE PASTAZA
PARA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
ELEMENTO: CILINDRO DE HORMIGON, DIAMETRO 6". ENSAYO DE COMPRESION
ASTM C-39

PROBETA	FECHA TOMA	FECHA ENSAYO	EDAD (DIAS)	IDENTIFICACION ELEMENTO	CARGA (KG)	DIAMETRO (CM)	ALTURA (CM)	AREA (CM2)	VOLUMEN (CM3)	RESISTENCIA (KG/CM2)	F'C ESPECIFICADO (KG/CM2)
19	22/3/2023	11/4/2023	21	Cuneta lado derecho Abscisa 2+580 a 2+620	32481	15	30	176,7	5301,5	184	180
20	22/3/2023	11/4/2023	21	Cuneta lado izquierdo Abscisa 2+580 a 2+620	32485	15	30	176,7	5301,5	184	180
21	23/3/2023	11/4/2023	20	Cuneta lado derecho Abscisa 2+620 a 2+660	32429	15	30	176,7	5301,5	184	180
22	23/3/2023	11/4/2023	20	Cuneta lado izquierdo Abscisa 2+620 a 2+660	31843	15	30	176,7	5301,5	180	180
23	25/3/2023	11/4/2023	18	Cuneta lado derecho Abscisa 2+660 a 2+700	32594	15	30	176,7	5301,5	184	180
24	25/3/2023	11/4/2023	18	Cuneta lado izquierdo Abscisa 2+660 a 2+700	32671	15	30	176,7	5301,5	185	180
25	29/3/2023	11/4/2023	14	Cuneta lado derecho Abscisa 2+700 a 2+740	30395	15	30	176,7	5301,5	172	180
26	29/3/2023	11/4/2023	14	Cuneta lado izquierdo Abscisa 2+700 a 2+740	30416	15	30	176,7	5301,5	172	180
27	30/3/2023	11/4/2023	13	Cuneta lado derecho Abscisa 2+740 a 2+780	30795	15	30	176,7	5301,5	174	180
28	30/3/2023	11/4/2023	13	Cuneta lado izquierdo Abscisa 2+740 a 2+780	29914	15	30	176,7	5301,5	169	180

OBSERVACIONES: Las probetas de hormigon fueron entregadas en el Laboratorio por el contratista.

Iván Rubio Gálvez
INGENIERO CIVIL
ESPECIALIST
MASTER EXECUTIVE: MEDIOAMBIENTE
MASTER OF SCIENCE: CONSTRUCCIONES
R.P. 16-01-0052

Iván Gonzalo Rubio Gálvez
INGENIERO CIVIL
R.P. 16-01-0052

ECUASUELOS21
HORMIGONES - SUELOS - ASFALTOS - INYECCIONES - ANCLAJES

INFORME DE RESULTADOS

DE

RESISTENCIA DE MATERIALES

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO, PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", (CONTROL DE HORMIGON SIMPLE EN CUNETAS, DESDE ABSCISA 0+820 HASTA 2+060)

UBICACIÓN: PROVINCIA DE PASTAZA

PARA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

FECHA: 19-03-2023

QUITO
Diego de Chávez 0e9-105 y Juan López de Velasco
Telfs.: C 0997 287 511 / M 0998 217 909 / (02) 2815 545
e-mail: ecuasuelos21@cablemodem.com.ec
PUYO
Francisco de Orellana No. 586 y Gral. Villamil
Telfs.: C 0997 287 511 / M 0998 217 909 / (03) 2889 706

PROYECTO: ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO - SAN PABLO DE ALLISHUNGO, PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ
OBRA: HORMIGON SIMPLE EN CUNETAS DESDE ABSCISA 0+820 HASTA 2+060
LOCALIZACION: PROVINCIA DE PASTAZA
PARA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
ELEMENTO: CILINDRO DE HORMIGON, DIAMETRO 6". ENSAYO DE COMPRESION
ASTM C-39

PROBETA	FECHA TOMA	FECHA ENSAYO	EDAD (DIAS)	IDENTIFICACION ELEMENTO	CARGA (KG)	DIAMETRO (CM)	ALTURA (CM)	AREA (CM2)	VOLUMEN (CM3)	RESISTENCIA (KG/CM2)	F'C ESPECIFICADO (KG/CM2)
1	1/2/2023	28/2/2023	28	Cuneta hormigón simple lado derecho 0+820 a 1+020	34713	15	30	176,7	5301,5	196	180
2	1/2/2023	28/2/2023	28	Cuneta hormigón simple lado izquierdo 0+820 a 1+020	34675	15	30	176,7	5301,5	196	180
3	4/2/2023	3/3/2023	28	Cuneta hormigón simple lado derecho 1+020 a 1+220	34201	15	30	176,7	5301,5	194	180
4	4/2/2023	3/3/2023	28	Cuneta hormigón simple lado izquierdo 1+020 a 1+220	34592	15	30	176,7	5301,5	196	180
5	8/2/2023	7/3/2023	28	Cuneta hormigón simple lado derecho 1+220 a 1+420	33924	15	30	176,7	5301,5	192	180
6	8/2/2023	7/3/2023	28	Cuneta hormigón simple lado izquierdo 1+220 a 1+420	34700	15	30	176,7	5301,5	196	180
7	11/2/2023	10/3/2023	28	Cuneta hormigón simple lado derecho 1+420 a 1+620	34347	15	30	176,7	5301,5	194	180
8	11/2/2023	10/3/2023	28	Cuneta hormigón simple lado izquierdo 1+420 a 1+620	34649	15	30	176,7	5301,5	196	180
9	15/2/2023	14/3/2023	28	Cuneta hormigón simple lado derecho 1+620 a 1+820	34398	15	30	176,7	5301,5	195	180
10	15/2/2023	14/3/2023	28	Cuneta hormigón simple lado izquierdo 1+620 a 1+820	34501	15	30	176,7	5301,5	195	180
11	18/2/2023	17/3/2023	28	Cuneta hormigón simple lado derecho 1+820 a 2+020	34335	15	30	176,7	5301,5	194	180
12	18/2/2023	17/3/2023	28	Cuneta hormigón simple lado izquierdo 1+820 a 2+020	34525	15	30	176,7	5301,5	195	180
13	22/2/2023	19/3/2023	26	Cuneta hormigón simple lado derecho 2+020 a 2+220	34223	15	30	176,7	5301,5	194	180
14	22/2/2023	19/3/2023	26	Cuneta hormigón simple lado izquierdo 2+020 a 2+220	34572	15	30	176,7	5301,5	196	180

OBSERVACIONES: Las probetas de hormigón fueron entregadas en el laboratorio por el contratista.

Iván Rubio Gálvez
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA: SUELOS Y Ho.
MASTER EXE
MASTER OF SCIENCE: CONSTRUCCIONES
R.P. 16-01-0052

ECUASUELOS21
HORMIGONES - SUELOS - ASFALTOS - INYECCIONES - ANCLAJES

PLANILLA 08 - LIQUIDACIÓN DE OBRA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

ANEXO:

GARANTÍAS (COPIAS)

Póliza de Seguro de Fianzas Nro. : 43759 **Endoso :** 15302

Renovación : 43759 **Referencia :** 0

SEGUROS EQUINOCCIAL
TÚ DEDÍCATE A VIVIR

9419612

SECTOR PUBLICO

RUC: 1790007502001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolución No. 5368

ASEGURADO : 9779 - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
Dirección : FRANCISCO DE ORELLANA 739 Y 27 DE FEBRERO Y

AFIANZADO : 411568 - CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
Dirección : AMBATO SN MACHALA FRENTE AULAS DEL SINDICATO

RIESGO ASEGURADO :	VALOR ASEGURADO :	VIGENCIA
BUEN USO DE ANTICIPO	US$ 22,551.30	Desde: 16-5-2023 Hasta: 15-6-2023 Dias: 30

PRIMA	:	US$	55.61
CONTRIBUCION SUPER DE BANCOS	:	US$	1.95
0.5 % SEGURO CAMPESINO	:	US$	0.28
0 % SSC NO RETENIDO	:	US$	0.00
DERECHOS DE EMISION	:	US$	0.50
12 % I.V.A.	:	US$	7.00
OTROS	:	US$	0.00
TOTAL	:	US$	65.34

Con sujeción a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la presente Póliza y mediante el pago de la prima convenida, SEGUROS EQUINOCCIAL S. A. que en adelante se llamará la Compañía, se obliga a favor de: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA que en adelante se llamará el Asegurado, al pago del valor de los daños que, hasta por la suma máxima de:
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 30/100 Dolares EE.UU le ocasione CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. que en adelante se llamará el Afianzado, , por el buen uso del anticipo para:

BUEN USO DE ANTICIPO PARA ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA SEGUN PROCESO NO. COTO-GADPPZ-005-2022

RENOVACION A SOLICITUD ESCRITA DEL BENEFICIARIO
SEGUN CONDICIONES DE LA POLIZA ORIGINAL

La presente póliza es Incondicional, Irrevocable y de Cobro Inmediato, de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento; y de conformidad con lo establecido en Contrato principal afianzado; y las condiciones generales de esta póliza.

Esta póliza no tiene relación con ningún otro instrumento, contrato o documento que exista o pueda existir entre el Asegurado, el Afianzado y terceras personas. Por lo tanto, dejamos expresa constancia que dichos documentos o contratos no modifican, enmiendan o amplían la presente póliza y que la Compañía, responderá exclusivamente por la obligación aquí expresada.

Transcurrido el período de vigencia señalado, la presente póliza caducará y cesará simultáneamente las obligaciones asumidas por la Compañía, aún cuando el original del presente documento no sea devuelto. Esta póliza podrá ser renovada a petición escrita del Asegurado o del Afianzado.

En testimonio de lo cual, firman la presente póliza un representante de la Compañía, conjuntamente con el Asegurado y el Afianzado, en AMBATO, 15 de MAYO de 2023

Seguros Equinoccial S.A.
Firmado por:
ESTEBAN RAMIRO VELA MALO
2023-05-16 15:12:55

El Asegurado
1660000170001

Seguros Equinoccial S. A.

ORIGINAL

El presente formulario fue aprobado por la Superintendencia de Bancos, según resolución No. 96-027-S, del 29 de enero 1996.

SEGUROS EQUINOCCIAL
TÚ DEDÍCATE A VIVIR

Póliza de Seguro de Fianzas Nro. : 53128 **Endoso :** 0
Renovación : **Referencia :** 0

8743838

SECTOR PUBLICO

RUC : 1790007502001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolución No. 5368

ASEGURADO : 9779 - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
Dirección : FRANCISCO DE ORELLANA 739 Y 27 DE FEBRERO Y

AFIANZADO : 411568 - CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
Dirección : AMBATO SN MACHALA FRENTE AULAS DEL SINDICATO

RIESGO ASEGURADO: FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

VALOR ASEGURADO US$ 83,046.45

VIGENCIA Desde: 20-6-2022 Hasta: 20-6-2023 Dias: 365

PRIMA	:	US$	2,491.39
CONTRIBUCION SUPER DE BANCOS	:	US$	87.20
SEGURO CAMPESINO	:	US$	12.46
DERECHOS DE EMISION	:	US$	7.00
% SSC NO RETENIDO	:	US$	0.00
12 % I.V.A.	:	US$	311.77
OTROS	:	US$	0.00
TOTAL	:	US$	2,909.82

Con sujeción a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la presente Póliza y mediante el pago de la prima convenida, **SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.** que en adelante se llamará la Compañía, se obliga a favor de: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA que en adelante se llamará el Asegurado, al pago del valor de los daños que, hasta por la suma máxima de: OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS CON 45/100 Dolares EE.UU

le ocasione CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

que en adelante se llamará el Afianzado, por la falta de cumplimiento del contrato celebrado para:

FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PARA ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA SEGUN PROCESO NO. COTO-GADPPZ-005-2022

ESTA POLIZA SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES ADJUNTAS

La presente póliza es Incondicional, Irrevocable y de Cobro Inmediato, de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento; y de conformidad con lo establecido en Contrato principal afianzado; y las condiciones generales de esta póliza.

Esta póliza no tiene relación con ningún otro instrumento, contrato o documento que exista o pueda existir entre el Asegurado, el Afianzado y terceras personas. Por lo tanto, dejamos expresa constancia que dichos documentos o contratos no modifican, enmiendan o amplían la presente póliza y que la Compañia, responderá exclusivamente por la obligación aqui expresada.

Transcurrido el período de vigencia señalado, la presente póliza caducará y cesará simultáneamente las obligaciones asumidas por la Compañia, aún cuando el original del presente documento no sea devuelto. Esta póliza podrá ser renovada a petición escrita del Asegurado o del Afianzado.

En testimonio de lo cual, firman la presente póliza un representante de la Compañía, conjuntamente con el Asegurado y el Afianzado, en AMBATO, 10 de JUNIO de 2022

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

Firmado electrónicamente por: SANDRA SALOME SALDARREAGA SALVADOR

El Asegurado
1660000170001

El Contratista
1691704528001

Seguros Equinoccial S. A.

ORIGINAL

El presente formulario fue aprobado por la Superintendencia de Bancos, según resolución No. 96-027-S, del 29 de enero 1996.

SEGUROS EQUINOCCIAL
TÚ DEDÍCATE A VIVIR

SEGURO DE	VIGENCIA DEL DOCUMENTO	POLIZA	ANEXO
FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Desde: 20-6-2022 Hasta: 20-6-2023	53128	0

Asegurado : 9779 - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

CONDICIONES GENERALES

POLIZA DE SEGUROS DE FIANZAS No. 53128
RIESGO ASEGURADO: FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
CONDICIONES GENERALES
Art.1.- En caso de discordancia entre las Condiciones Generales, Particulares y Especiales, predominarán estas últimas.
Art.2.- La vigencia de la presente póliza terminará antes de la fecha señalada en la misma, tan pronto como se presente
a la Compañía las Actas de Recepción correspondientes, el original de la póliza o la certificación correspondiente al
cumplimiento de las obligaciones contractuales, Hoy cuando la Compañía pague el valor asegurado, por incumplimiento del
contrato por parte del Contratista.
Art.3.- Cualquier modificación del contrato convenida entre el Asegurado y el Afianzado, que no haya sido aceptada por la
Compañía, no obligará a ésta a responder por tales modificaciones.
Art.4.- Este seguro se mantendrá vigente por el tiempo de duración del contrato y de sus prórrogas o ampliaciones legalmente
convenidas, en cuyo caso el Contratista pagará la prima respectiva por el período correspondiente.
Art.5.- Ni la Compañía, ni el Afianzado podrán revocar esta póliza.
Art.6.- AMPAROS:
6.1. SERIEDAD DE LA PROPUESTA
El amparo de seriedad de la propuesta para la adjudicación de una licitación o concurso, garantiza al asegurado contra el
incumplimiento por parte del afianzado, de las obligaciones establecidas, especialmente, la de celebrar el contrato objeto de la
licitación o concurso, en los términos acordados entre las partes.
6.2. CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
La presente póliza cubre el riesgo de incumplimiento de contrato y las obligaciones que contrajere el Afianzado a favor de terceros
relacionados con el Contrato. No responde la Compañía por el incumplimiento de contrato que sea ocasionado por fuerza mayor o
caso fortuito.
6.3. BUEN USO DE ANTICIPO
El amparo de anticipo garantiza al Asegurado contra el uso o apropiación indebida que el Afianzado haga de los anticipos de cualquier
naturaleza, sea con dinero, giros a la vista u otra forma de pago, que se le hayan otorgado para la ejecución del contrato.
6.4. BUEN USO DE CARTA DE CREDITO
La Compañía garantiza el buen uso de la carta de crédito abierta por el asegurado a Favor del contratista.
Art.7.- El reclamo del Asegurado por motivo de este seguro, deberá hacerlo tan pronto como se produzca la declaración de incumplimiento
de contrato o de que existan obligaciones en mora del Afianzado frente a terceros vinculados con el contrato, Hoy en cualquier momento
durante la vigencia de la Póliza.
Art.8.- El Afianzado se compromete a enviar a la Compañía copias certificadas de los informes del Asegurado respecto de las fiscalizaciones
periódicas que éste realizare.
Art.9.- En caso de pago del seguro por la Compañía, el Asegurado cederá a favor de ella todos los derechos contra el Afianzado, por razón de
la presente póliza, hasta cubrir la suma que la Compañía hubiera pagado al Asegurado-El Asegurado se obliga a hacer la cesión de tales
derechos a favor de la Compañía, hasta el valor total de la indemnización pagada.
Art.10.-La indemnización a que da derecho este seguro podrá ser cobrada únicamente por el Asegurado.
Art.11.-Para el pago de esta garantía, se requerirá presentar a la Compañía una declaración escrita y oficial suscrita por la máxima autoridad
de la entidad Asegurada, sobre el incumplimiento del respectivo contrato, o la mora del Afianzado en sus obligaciones frente a terceros.
Recibida dicha declaración, la Compañía procederá inmediatamente y sin más trámites al pago

1800 EQUINOCCIAL (1800 378466) PBX: 02-3984000
QUITO: DE LAS HIEDRAS N41-139 Y AV. DE LOS GRANADOS
CUENCA: AV. DEL ESTADIO 2-19 Y FLORENCIA ASTUDILLO, EDIFICIO TADEO, SEGUNDO PISO
GUAYAQUIL: LAS LOMAS "ROTARISMO" 416 Y CALLE QUINTA, ESQUINA
MANTA: AV. FLAVIO REYES Y AV. 24, ESQUINA
IBARRA: AV. CAMILO PONCE S/N Y LUIS JARAMILLO PÉREZ ESQUINA
AMBATO: AV. RODRIGO PACHANO N-1589 Y LA DELICIA
MACHALA: EDIFICIO PROFESIONAL CENTER – LOCAL: 111
LOJA: PASAJE ENRIQUE AGUIRRE BUSTAMANTE, ENTRE JOSE ANTONIO EGUIGUREN Y JUAN JOSE PEÑA

SEGUROS EQUINOCCIAL
TÚ DEDÍCATE A VIVIR

SEGURO DE	VIGENCIA DEL DOCUMENTO	POLIZA	ANEXO
FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Desde: 20-6-2022 Hasta: 20-6-2023	53128	0

Asegurado : 9779 - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

del valor asegurado en el caso de incumplimiento
del contrato o al pago del valor requerido para satisfacer obligaciones del Afianzado frente a terceros relacionados con el Contrato.
Art.12.- La Garantía se pagará a solicitud del Asegurado, aun cuando no medie orden o autorización del Afianzado.
Art.13.-El Afianzado se constituye en deudor de la Compañía por el valor de la indemnización que esta pague al Asegurado. También se considerará
de cargo del Afianzado todos los gastos que la Compañía hiciere en razón del pago del seguro. La sola declaración de la Compañía sobre el valor
de la indemnización, intereses y gastos causados, será aceptada obligatoriamente por el Afianzado, como prueba suficiente del valor a su cargo,
el cual se presumirá verdadero mientras no se compruebe lo contrario.
Art.14.-Toda cuestión que se suscitare por razón de esta póliza, queda sometida a la jurisdicción ecuatoriana.
Art.15.-Las acciones contra la Compañía deben ser deducidas en el domicilio de ésta; las acciones contra el Asegurado o el Afianzado, en el domicilio del demandado.

Según resolución No. SBS-INSP-2007-038 aprobada por la Superintendencia de Bancos y Seguros en Quito el 08 de Febrero de 2007

En testimonio de lo acordado se firma en AMBATO, 10 de JUNIO de 2022

EL ASEGURADO	CONTRATISTA	SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
	Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ	Firmado electrónicamente por: SANDRA SALOME SALDARREAGA SALVADOR

1800 EQUINOCCIAL (1800 378466) PBX: 02-3984000
QUITO: DE LAS HIEDRAS N41-130 Y AV. DE LOS GRANADOS
CUENCA: AV. DEL ESTADIO 2-19 Y FLORENCIA ASTUDILLO, EDIFICIO TADEO, SEGUNDO PISO
GUAYAQUIL: LAS LOMAS "ROTARISMO" 418 Y CALLE QUINTA, ESQUINA
MANTA: AV. FLAVIO REYES Y AV. 24, ESQUINA
IBARRA: AV. CAMILO PONCE S/N Y LUIS JARAMILLO PÉREZ ESQUINA
AMBATO: AV. RODRIGO PACHANO N-1589 Y LA DELICIA
MACHALA: EDIFICIO PROFESIONAL CENTER – LOCAL: 111
LOJA: PASAJE ENRIQUE AGUIRRE BUSTAMANTE, ENTRE JOSE ANTONIO EGUIGUREN Y JUAN JOSE PEÑA

PLANILLA 08 - LIQUIDACIÓN DE OBRA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

ANEXO:

FACTURAS, COMPROBANTES, PLANILLAS DE APORTE DEL IESS DEL PERSONAL EN OBRA-FORMA DE PAGO

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) LOPEZ CHAVEZ ANGEL MISAEL, representante legal de la empresa CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. con RUC Nro. 1691704528001 y dirección OBRERO. AMBATO. SN. MACHALA. TRAS EL SINDICATO., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.

Firmado electrónicamente por:
KARLA DENISSE BERMUDEZ ROLDAN

Abg. Karla Denisse Bermúdez Roldán

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 18 de mayo de 2023

Validez del Certificado 30 días

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

mayo 18 del 2023 09:50

LOPEZ CHAVEZ ANGEL MISAEL

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2023-05-17))

(BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO)

No. Comprobante: 0000000170251129

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	**Emitido en:**	2023-05-17
No. RUC / REGISTRO:	1691704528001 - 0001	**Fecha de Vigencia de Pago:**	2023-05-31
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. - CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.		

Periodo de Pago:	2023 - 04
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2023 - 4	06	0502497795	GUAMAN ILER JOSE MIGUEL	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 4	06	1600623555	INMUNDA ANDI ESLY FIDEL	494.94	30	NNA	101.96	0.00
2023 - 4	06	1600225815	LOPEZ CHAVEZ ANGEL MISAEL	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 4	06	1600303091	LOPEZ CHAVEZ WILLIAM IVAN	523.70	30	NNA	107.88	0.00
2023 - 4	06	1600823445	LOPEZ MIELES EDY MICHAEL	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 4	06	2100429733	MIELES GUERRERO GLORIA ESTHER	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 4	06	1600565046	TUSTON PICO JULIO ARMANDO	523.70	30	NNA	107.88	0.00
2023 - 4	16	1600255531	ALTAMIRANO ROSERO WILSON HUGO	345.85	15	NNA	71.25	15.25
				3688.19			**759.77**	**15.25**

Valor	796.66
Intereses por mora (+)	8.58
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	15.25
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	805.24
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	**820.49**

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.
*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO
*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego
*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuánto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

ING. CRISTIAN HUACHI C.



SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL
CEL: 0994718597 TELF: 03-2892584
EMAIL: ing_cristian_huachi@yahoo.es

HUACHI CUJI CRISTIAN RODOLFO

Dirección Matriz: Barrio: OBRERO Calle: CITAYACU Número: SN Intersección: AV. MANABI

Dirección Sucursal: Barrio: OBRERO Calle: CITAYACU Número: SN Intersección: AV. MANABI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1600406605001

FACTURA

No. 001-100-000000012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0205202301160040660500120011000000000123414437016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/05/2023 09:58:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0205202301160040660500120011000000000123414437016

0205202301160040660500120011000000000123414437016

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

Identificación 1691704528001

Fecha 02/05/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: OBRERO, CALLE AMBATO SN Y MACHALA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01		1.000000	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL EN CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA	PROYECTO: "ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	1250.000000	0.00	0.00	0.00	1250.00

Información Adicional	
Telefono:	098868928
Email:	edypollito@hotmail.es
REMUNERACION::	POR SERVICIOS DE RESIDENTE DE OBRA DEL PROYECTO "ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", PERIODO ABRIL DE 2023.

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1400.00

SUBTOTAL 12%	1250.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1250.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	150.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1400.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600655862001

FACTURA

No. 001-100-000000022

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0405202301160065586200120011000000000228416855619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/05/2023 09:57:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0405202301160065586200120011000000000228416855619

DIAZ VILLARRUEL ALEX GARY

Dirección Matriz: Calle: IMBABURA Intersección: CHIMBORAZO

Dirección Sucursal: Calle: IMBABURA Intersección: CHIMBORAZO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

Identificación 1691704528001

Fecha 04/05/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01		1.000000	SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE AMBIENTAL POR EL PERIODO DE ABRIL DE 2023 EN EL PROYECTO ""ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA"		700.000000	0.00	0.00	0.00	700.00

Información Adicional	
Telefono:	098868928
Email:	edypollito@hotmail.es

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	784.00

SUBTOTAL 12%	700.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	700.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	84.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	784.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1801851906001

FACTURA

No. 001-100-000000001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0512202201180185190600120011000000000015039166315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/05/2023 21:11:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0512202201180185190600120011000000000015

BARRIONUEVO DIAZ LEONARDO JOSELITO

Dirección Calle: QUITO Número: S/N Intersección: COTOPAXI

Dirección Calle: QUITO Número: S/N Intersección: COTOPAXI

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

Identificaci 1691704528001

Fecha 02/05/2023 Placa / null Guía

Obrero, Calle Ambato SN y Machala

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
001		1.00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		1250.00	0.00	0.00	0.00	1250.00

Información Adicional	
Telefono:	032885634
Email:	ing_cristian_huachi@yahoo.es

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1400.00

SUBTOTAL 12%	1250.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1250.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	150.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1400.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600377418001

FACTURA

No. 001-100-000000012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0812202201160037741800120011000000000121234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 02/05/2023 13:39:54.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0812202201160037741800120011000000000121234567810

JUAN SAMUEL LOZADA PROAÑO

Dirección Matriz: AV RIO CURARAY Y CALLE PABLO LOPEZ

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. Identificación: 1691704528001

Fecha Emisión: 02/05/2023 Guía Remisión:

Dirección

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
013		1	TECNICO EN TOPOGRAFIA -				535,71	0.00	0.00	0	535.71

Información Adicional

Email edypollito@hotmail.es

PROYECTO "ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

Firmado electrónicamente por: JUAN SAMUEL LOZADA PROANO

SUBTOTAL 12%	535,71
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	535,71
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	64,29
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	600,00

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	600.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

FACTURAS

GASTOS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802841187001

FACTURA

No. 001-002-000073731

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202301180284118700120010020000737310013356411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2023 09:37:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202301180284118700120010020000737310013356411

JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

Dirección Matriz: LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA

Dirección Sucursal: LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA LTDA

Identificación 1691704528001

Fecha 03/04/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: PUYO CIUDADELA EL CHOFER

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
271208		200.000000	CEMENTO CHIMBORAZO TIPO IP 50 KG		7.098210	0.00	0.00	0.00	1419.64

Información Adicional	
e de Retencion:	1
E-MAIL:	rosariomt32@yahoo.com.mx
VENDEDOR:	ADMINISTRADOR

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1590.00

SUBTOTAL 12%	1419.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1419.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	170.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1590.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500511027001

FACTURA

No. 001-003-001322809

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202301050051102700120010030013228091234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/04/2023 09:37:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202301050051102700120010030013228091234567810

PACHECO PACHECO HUGO VICENTE

ESTACION DE SERVICIO PUYO

Dirección Matriz: AV. ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS

Dirección Sucursal: AV. ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

Identificación 1691704528001

Fecha 04/04/2023 Placa / Matrícula: SAA0945 Guía

Direccion: PUYO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		3099.738000	DIESEL PREMIUM		1.562500	1.08	2.64	0.00	4843.39

Información Adicional	
Vendedor:	JAIME JAVIER ALDANA ITURRALDE
Email:	eddymich1969@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5424.60

SUBTOTAL 12%	4843.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4843.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	581.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5424.60

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	9165.31
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3740.76

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500511027001

FACTURA

No. 001-003-001292311

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202301050051102700120010030012923111234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2023 12:53:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0604202301050051102700120010030012923111234567817

0604202301050051102700120010030012923111234567817

PACHECO PACHECO HUGO VICENTE

ESTACION DE SERVICIO PUYO

Dirección Matriz: AV. ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS

Dirección Sucursal: AV. ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

[redacted]gente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

Identificación 1691704528001

Fecha 06/04/2023 Placa / Matrícula: ZZZ9999 Guía

Direccion: PUYO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		25.000000	EXTRA		2.142800	0.38	2.52	0.00	53.57

Información Adicional	
[redacted]edor:	MISHELL MONICA BEJARANO CHIMBO
Email:	eddymich1969@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.00

SUBTOTAL 12%	53.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	70.56
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	10.56

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500511027001

FACTURA

No. 001-003-001322816

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1104202301050051102700120010030013228161234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/04/2023 09:37:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1104202301050051102700120010030013228161234567819

1104202301050051102700120010030013228161234567819

PACHECO PACHECO HUGO VICENTE

ESTACION DE SERVICIO PUYO

Dirección Matriz: AV. ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS

Dirección Sucursal: AV. ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

Identificación 1691704528001

Fecha 11/04/2023 Placa / Matrícula: SAD0194 Guía

Direccion: PUYO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		174.296000	DIESEL PREMIUM		1.562500	1.08	2.64	0.00	272.34
0101		872.783000	EXTRA		2.142900	0.38	2.52	0.00	1870.25

Información Adicional	
Vendedor:	JAIME JAVIER ALDANA ITURRALDE
Email:	eddymich1969@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2399.70

SUBTOTAL 12%	2142.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2142.59
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	257.11
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2399.70

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	2978.70
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	578.96

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802841187001

FACTURA

No. 001-002-000074305

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202301180284118700120010020000743050013513915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/04/2023 08:17:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202301180284118700120010020000743050013513915

JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

Dirección Matriz: LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA

Dirección Sucursal: LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA LTDA

Identificación 1691704528001

Fecha 12/04/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: PUYO CIUDADELA EL CHOFER

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
271208		200.000000	CEMENTO CHIMBORAZO TIPO IP 50 KG		7.098210	0.00	0.00	0.00	1419.64
UND	27671641	12.000000	CHALECO REFLECTIVO VERDE CENT		2.230000	0.00	0.00	0.00	26.76
27673480		1.000000	SIKA PLASTOCRET HE 161 10KG		25.660000	0.00	0.00	0.00	25.66

Información Adicional	
Agente de Retencion:	1
E-MAIL:	rosariomt32@yahoo.com.mx
VENDEDOR:	ADMINISTRADOR

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1648.71

SUBTOTAL 12%	1472.06
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1472.06
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	176.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1648.71

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1804660569001

FACTURA

No. 001-002-000000003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1704202301180466056900120010020000000030118318218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/04/2023 18:36:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1704202301180466056900120010020000000030118318218

VASCONEZ GAVILANES MILTON HERNAN

JMS AROS Y LLAMTAS

Dirección Matriz: Calle: ALBERTO ZAMBRANO Número: OE72 Intersección: ALISHUNGO Referencia: A LADO DE LA LUBRICADORA VILLAFUERTE D

Dirección Sucursal: Calle: ALBERTO ZAMBRANO Número: OE72 Intersección: ALISHUNGO Referencia: A LADO DE LA LUBRICADORA VILLAFUERTE D

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

Identificación 1691704528001

Fecha 17/04/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: PUYO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
LLDR 315		2.000000	DURUN MIXTA		303.571400	0.00	0.00	0.00	607.14

Información Adicional	
[illegible]ón:	PUYO
E-MAIL:	eddymich1969@gmail.com
Teléfono:	0984787283

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	680.00

SUBTOTAL 12%	607.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	607.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	72.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	680.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802422129001

FACTURA

No. 001-002-000000150

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1704202301180242212900120010020000001501234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/04/2023 14:39:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1704202301180242212900120010020000001501234567819

CEVALLOS CASTILLO PEDRO ALBERTO

GORAL FERRETERIA

Dirección Matriz: TENIENTE HUGO ORTIZ Y SEGUNDO FREIRE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA LTDA

Identificación 1691704528001

Fecha 17/04/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: CDLA EL CHOFER CALLE AMBATO Y MACHALA / PUYO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
TCN002		7.000000	TUBO CUADRADO NEGRO 100X100X 2 MM	4" X 2 MM	45.220000	0.00	0.00	0.00	316.54
TRECN002		7.000000	TUBO RECTANGULAR NEGRO 100X50X 2 MM	4"X2"X 2 MM	33.610000	0.00	0.00	0.00	235.27
[redacted]FILG005		18.000000	CORREA G 80X40X15X2 MM	G 80X2 MM	18.480000	0.00	0.00	0.00	332.64

Información Adicional	
Dirección:	CDLA EL CHOFER CALLE AMBATO Y MACHALA / PUYO
Email:	eddymich1969@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	990.58

SUBTOTAL 12%	884.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	884.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	106.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	990.58

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500511027001

FACTURA

No. 001-003-001322820

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1804202301050051102700120010030013228201234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/04/2023 09:37:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1804202301050051102700120010030013228201234567812

PACHECO PACHECO HUGO VICENTE

ESTACION DE SERVICIO PUYO

Dirección Matriz: AV. ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS

Dirección Sucursal: AV. ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

Identificación 1691704528001

Fecha 18/04/2023 Placa / Matrícula: SAA0945 Guía

Direccion: PUYO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		2839.920000	DIESEL PREMIUM		1.562500	1.08	2.64	0.00	4437.38

Información Adicional	
Vendedor:	JAIME JAVIER ALDANA ITURRALDE
Email:	eddymich1969@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4969.86

SUBTOTAL 12%	4437.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4437.38
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	532.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4969.86

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	8397.08
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3427.22

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802841187001

FACTURA

No. 001-002-000074608

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1804202301180284118700120010020000746080013599016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/04/2023 10:20:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1804202301180284118700120010020000746080013599016

JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

Dirección Matriz: LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA

Dirección Sucursal: LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA LTDA

Identificación 1691704528001

Fecha 18/04/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: PUYO CIUDADELA EL CHOFER

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
271208		200.000000	CEMENTO CHIMBORAZO TIPO IP 50 KG		7.098210	0.00	0.00	0.00	1419.64
2722754		3.000000	GUANTE NITRILO NEGRO		1.100000	0.00	0.00	0.00	3.30
27673480		1.000000	SIKA PLASTOCRET HE 161 10KG		25.660000	0.00	0.00	0.00	25.66
91003		1.000000	BOTA CAUCHO VENUS AMARILLO NEGRO 39		9.375000	0.00	0.00	0.00	9.38
91013		1.000000	BOTA CAUCHO VENUS NEGRO AMARILLO 40 C LONA		9.380000	0.00	0.00	0.00	9.38
272255		9.000000	GUANTE NITRILO		1.020000	0.00	0.00	0.00	9.18
27673470		2.000000	SIKA PLASTOCRET HE 161 4KG		10.650000	0.00	0.00	0.00	21.30
27673465		1.000000	SIKA PLASTOCRET HE 161 2KG		4.520000	0.00	0.00	0.00	4.52

Información Adicional	
Agente de Retencion:	1
E-MAIL:	rosariomt32@yahoo.com.mx
VENDEDOR:	ADMINISTRADOR

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1682.64

SUBTOTAL 12%	1502.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1502.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	180.28
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1682.64

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802841187001

FACTURA

No. 001-002-000074765

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1904202301180284118700120010020000747650013638312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/04/2023 14:12:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1904202301180284118700120010020000747650013638312

JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

Dirección Matriz: LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA

Dirección Sucursal: LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA LTDA

Identificación 1691704528001

Fecha 19/04/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: PUYO CIUDADELA EL CHOFER

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
271208		200.000000	CEMENTO CHIMBORAZO TIPO IP 50 KG		7.098210	0.00	0.00	0.00	1419.64

Información Adicional	
[redacted]e de Retencion:	1
E-MAIL:	rosariomt32@yahoo.com.mx
VENDEDOR:	ADMINISTRADOR

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1590.00

SUBTOTAL 12%	1419.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1419.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	170.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1590.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500511027001

FACTURA

No. 001-003-001322824

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202301050051102700120010030013228241234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/04/2023 09:37:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2204202301050051102700120010030013228241234567810

2204202301050051102700120010030013228241234567810

PACHECO PACHECO HUGO VICENTE

ESTACION DE SERVICIO PUYO

Dirección Matriz: AV. ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS

Dirección Sucursal: AV. ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

[redacted]gente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

Identificación 1691704528001

Fecha 22/04/2023 Placa / Matrícula: SAD0194 Guía

Direccion: PUYO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		3357.142800	DIESEL PREMIUM		1.562500	1.08	2.64	0.00	5245.54

Información Adicional	
[redacted]edor:	JAIME JAVIER ALDANA ITURRALDE
Email:	eddymich1969@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5875.00

SUBTOTAL 12%	5245.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5245.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	629.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5875.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	9926.40
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	4051.40

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802422129001

FACTURA

No. 001-002-000000155

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1904202301180242212900120010020000001551234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/04/2023 10:47:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1904202301180242212900120010020000001551234567815

CEVALLOS CASTILLO PEDRO ALBERTO

GORAL FERRETERIA

Dirección Matriz: TENIENTE HUGO ORTIZ Y SEGUNDO FREIRE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA LTDA

Identificación 1691704528001

Fecha 19/04/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: CDLA EL CHOFER CALLE AMBATO Y MACHALA / PUYO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CEM001		20.000000	QQ CEMENTO		7.140000	0.00	0.00	0.00	142.80
TRECN004		12.000000	TUBO RECTANGULAR NEGRO 40X20X 1,5 MM	1 1/2" X 3/4" X 1,5 MM	12.050000	0.00	0.00	0.00	144.60
TCN009		5.000000	TUBO CUADRADO NEGRO 25X25X 1,5 MM	1" X 1,5 MM	10.940000	0.00	0.00	0.00	54.70
PERFILG009		8.000000	CORREA G 60X30X10X1,8 MM	G 60X1,8 MM	12.080000	0.00	0.00	0.00	96.64
ANG001		3.000000	ANGULO L 20X20X3 MM A36	3/4"x1/8"	7.580000	0.00	0.00	0.00	22.74
ANG002		6.000000	ANGULO 1" X 1/8" (25X3)		7.590000	0.00	0.00	0.00	45.54
PINT001		3.000000	GALON NEGRO ANTICORROSIVO		10.540000	0.00	0.00	0.00	31.62
SOLD001		1.000000	FUNDA AGA 6011		25.010000	0.00	0.00	0.00	25.01
DISC004		5.000000	DISCO 4 1/2" METAL		1.560000	0.00	0.00	0.00	7.80
CHOVA001		2.000000	CHOVA 0,20 X 10 MT		20.980000	0.00	0.00	0.00	41.96
CANAG001		5.000000	CANALON 6 MT		22.140000	0.00	0.00	0.00	110.70

Información Adicional	
Dirección:	CDLA EL CHOFER CALLE AMBATO Y MACHALA / PUYO
Email:	eddymich1969@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	811.00

SUBTOTAL 12%	724.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	724.11
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	86.89
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	811.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802841187001

FACTURA

No. 001-002-000075155

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202301180284118700120010020000751550013738416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2023 10:05:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202301180284118700120010020000751550013738416

JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

JESSY LORENA VILLAFUERTE MASABANDA

Dirección Matriz: LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA

Dirección Sucursal: LUIS ARIAS GUERRA Y CUMANDA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA LTDA

Identificación 1691704528001

Fecha 26/04/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: PUYO CIUDADELA EL CHOFER

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
271208		200.000000	CEMENTO CHIMBORAZO TIPO IP 50 KG		7.098210	0.00	0.00	0.00	1419.64
27673470		3.000000	SIKA PLASTOCRET HE 161 4KG		10.650000	0.00	0.00	0.00	31.95
272250		12.000000	GUANTE PUPO MULTIUSO (PAR)		0.600000	0.00	0.00	0.00	7.20

Información Adicional	
Agente de Retencion:	1
E-MAIL:	rosariomt32@yahoo.com.mx
VENDEDOR:	ADMINISTRADOR

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1633.84

SUBTOTAL 12%	1458.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1458.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	175.05
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1633.84

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1691713438001

FACTURA

No. 001-001-000000050

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2704202301169171343800120010010000000509846951117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2023 18:32:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202301169171343800120010010000000509846951117

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO SALDARRIAGA & ASOCIADOS S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO SALDARRIAGA & ASOCIADOS S.A.

Dirección Matriz: SHELL / MERA / PASTAZA

Dirección Sucursal: SHELL / MERA / PASTAZA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA EDDYMICH

Identificación 1691704528001

Fecha 27/04/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: puyo pastaza

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01	001	1.000000	TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO		1200.000000	0.00	0.00	0.00	1200.00

Información Adicional	
[illegible]ión:	puyo pastaza
Email:	eddymich1969@gmail.com
Teléfono:	0984787283

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1200.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1200.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1200.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1200.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802422129001

FACTURA

No. 001-002-000000159

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2804202301180242212900120010020000001591234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/04/2023 08:17:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2804202301180242212900120010020000001591234567816

2804202301180242212900120010020000001591234567816

CEVALLOS CASTILLO PEDRO ALBERTO

GORAL FERRETERIA

Dirección Matriz: TENIENTE HUGO ORTIZ Y SEGUNDO FREIRE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA LTDA

Identificación 1691704528001

Fecha 28/04/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: CDLA EL CHOFER CALLE AMBATO Y MACHALA / PUYO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DURAT002		30.000000	HOJA GALVALUME 6 MT X 0,30		26.250000	0.00	0.00	0.00	787.50
PERN012		700.000000	PERNO 2" MADERA		0.060000	0.00	0.00	0.00	42.00
CUMB001		8.000000	CUMBRERO NATURAL 3 MT X 0,30		6.700000	0.00	0.00	0.00	53.60

Información Adicional	
Dirección:	CDLA EL CHOFER CALLE AMBATO Y MACHALA / PUYO
Email:	eddymich1969@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	989.07

SUBTOTAL 12%	883.10
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	883.10
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	105.97
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	989.07

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802422129001

FACTURA

No. 001-002-000000160

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2904202301180242212900120010020000001601234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/04/2023 17:48:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2904202301180242212900120010020000001601234567816

CEVALLOS CASTILLO PEDRO ALBERTO

GORAL FERRETERIA

Dirección Matriz: TENIENTE HUGO ORTIZ Y SEGUNDO FREIRE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA LTDA

Identificación 1691704528001

Fecha 29/04/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: CDLA EL CHOFER CALLE AMBATO Y MACHALA / PUYO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
TCN002		5.000000	TUBO CUADRADO NEGRO 100X100X 2 MM	4" X 2 MM	54.380000	0.00	0.00	0.00	271.90
TRECN002		8.000000	TUBO RECTANGULAR NEGRO 100X50X 2 MM	4"X2"X 2 MM	40.540000	0.00	0.00	0.00	324.32
[illegible]AT010		66.000000	METRO GALVALUME 0,30		4.460000	0.00	0.00	0.00	294.36

Información Adicional	
Dirección:	CDLA EL CHOFER CALLE AMBATO Y MACHALA / PUYO
Email:	eddymich1969@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	997.45

SUBTOTAL 12%	890.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	890.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	106.87
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	997.45

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500511027001

FACTURA

No. 001-003-001325088

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3004202301050051102700120010030013250881234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/04/2023 21:29:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3004202301050051102700120010030013250881234567811

PACHECO PACHECO HUGO VICENTE

ESTACION DE SERVICIO PUYO

Dirección Matriz: AV. ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS

Dirección Sucursal: AV. ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

[redacted]gente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

Identificación 1691704528001

Fecha 30/04/2023 Placa / Matrícula: MBD7544 Guía

Direccion: PUYO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121		1785.714300	DIESEL PREMIUM		1.562500	1.08	2.64	0.00	2790.18

Información Adicional	
[redacted]dor:	JAIME JAVIER ALDANA ITURRALDE
Email:	eddymich1969@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3125.00

SUBTOTAL 12%	2790.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2790.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	334.82
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3125.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	5280.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2155.00

PLANILLA 08 - LIQUIDACIÓN DE OBRA

Pastaza GOBIERNO PROVINCIAL	**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**	bde BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

ANEXO:

CONTRATO DE OBRA Y COPIA DE DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA

COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-005-2022			
COTO	06	88-2022	PAG.01 DE 19

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA.LTDA
OBJETO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"
PRECIO:	$789.464,39 (SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 39/100) DÓLARES AMERICANOS SIN INCLUIR IVA
PLAZO:	CIENTO OCHENTA (180) DÍAS, CONTADOS DESDE LA FECHA DE NOTIFICACION QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE.
ADMINISTRADOR:	ING. GUSTAVO NAVAS
GARANTÍA:	FIEL CUMPLIMIENTO –BUEN USO DEL ANTICIPO

CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA REPRESENTADO POR EL ING. JAIME PATRICIO GUEVARA BLASCHKE, PREFECTO PROVINCIAL Y LA CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA.LTDA, PARA EL ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

COMPARECIENTES. -

En la ciudad de Puyo, a los veinte días del mes de Junio del año dos mil veinte y dos, comparecen a la suscripción del presente Contrato, por una parte, en calidad de Contratante, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, legalmente representado por el Ing. Jaime Patricio Guevara Blaschke, Prefecto Provincial; y, por otra parte, en calidad de Contratista, la Constructora EDDYMICH CIA.LTDA Las partes se obligan en virtud del presente Contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.

1.01.- Realizada la etapa preparatoria, la Máxima Autoridad del GADPPz, Ing. Jaime Patricio Guevara Blaschke, Prefecto Provincial, mediante Resolución de Aprobación de Pliegos N° 244-GADPPz-2022 de fecha 19 de Abril de 2022, resolvió en su Art. 1.- APROBAR los pliegos del proceso de Cotización de Obras

N°. COTO-GADPPz005-2022 para el "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA" por un monto referencial de USD $ 1'007.330,52 (UN MILLÓN SIETE MIL TRECIENTOS TREINTA CON 52 /100) dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA, con un plazo estimado para la ejecución del contrato de ciento ochenta (180) días, contados desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible, y una forma de pago de 40% con anticipo y el 60% por planilla mensuales por avance de obra debidamente aprobadas y legalizadas por la fiscalización y administración de contrato. Art. 2.- DISPONER la publicación de los pliegos, conjuntamente con la convocatoria en el portal de Compras Públicas. Art. 3.- ORDENAR el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en los pliegos de contratación.

1.02.- Realizada la etapa precontractual, la Máxima Autoridad del GADPPz, Ing. Jaime Guevara Blaschke, Prefecto Provincial, mediante Resolución de Adjudicación N° 342-GADPPz-2022 de fecha 06 de junio de 2022, resolvió en su Art. 1. – ADJUDICAR el proceso de Cotización de Obras código N°COTO-GADPPz005-2022 para el "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", al oferente CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA.LTDA. por un monto de USD $789.464,39 (SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 39/100) dólares Americanos sin incluir IVA, con un plazo estimado para la ejecución del contrato de ciento ochenta (180) días, contados desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible, y una forma de pago de 40% con anticipo Previo a la presentación de los Documentos Habilitantes y el 60% por planilla mensuales por avance de obra debidamente aprobadas y legalizadas por la fiscalización y administración de contrato. Artículo 2.- ENCARGAR al Jefe de Compras Públicas del GADPPz, notifique con la presente resolución a través del portal www.compraspublicas.gob.ec al oferente CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA.LTDA Artículo 3.- DESIGNAR Y NOTIFICAR en calidad de administrador de Contrato de Cotización de Obras con N° COTO-GADPPz005-2022 al Ing. Gustavo Navas, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el Art.70 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Art. 121 del Reglamento de la norma referida. Artículo 4.- PUBLICAR en el portal del SERCOP www.compraspublicas.com, la presente resolución, así como la información relevante del proceso de conformidad con el Art. 13 RGLOSNCP. Artículo 5.- DISPONGO su ejecución.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. -

2.1 Forman parte integrante del Contrato, los siguientes documentos:

a) El pliego (condiciones particulares y condiciones generales) incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.
b) Las Condiciones Generales de los contratos de Ejecución de Obras publicados y vigentes a la fecha de la convocatoria en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
c) La oferta presentada por el contratista, con todos sus documentos que la conforman.
d) La Resolución de Aprobación de Pliegos N° 244-GADPPz-2022 y Resolución de Adjudicación N° 342-GADPPz-2022.
e) Tabla de descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios.
f) La Certificación POA N° 192-OOPP-2022 de fecha 12 de Abril del 2022 elaborado por el Director de Obras Publicas Ing. Daniel Ramos;

g) La Certificación PAC N°00121 de fecha 29 de Marzo de 2022, emitida por la Loda. Mariuxi Torres, Jefa de Compras Públicas, (s), que certifica que la actividad se encuentra previsto dentro del PAC Institucional 2022;
h) La Certificación de Catalogo Electrónico N°00118 de fecha 29 de Marzo de 2022, emitida por la Ing. Cesar Cartagena, Analista de Administración 1 del GADPPz, que certifica que el servicio no se encuentra catalogado;
i) Los Pliegos COTO-GADPPz-005-2022 de fecha 06 de Abril de 2022;
j) Póliza de fiel cumplimiento N°53128 con una vigencia desde 20/06/2022 hasta 20/06/2023 ;
k) Póliza de Buen Uso del Anticipo N°43759 con una vigencia desde 20/06/2022 hasta 17/12/2022;
l) Informe de la Comisión Técnica, designada para la evaluación y calificación de las ofertas presentadas.
m) La Certificación Presupuestaria de fecha 07 de Junio de 2022, Compromiso N°755, emitida por el Tecn. José Marín Jefe de Presupuestos del GADPPz;
n) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el presente Contrato;

CLÁUSULA TERCERA: INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. –

3.1 Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal, en el contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 1) Cuando los términos están definidos y son claros, Se atenderá su tenor literal; 2) Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el Contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del Contrato; 3) En su falta o insuficiencia se aplicarán las definiciones establecidas en el Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las normas contenidas en el Titulo XIII de Libro IV de la Codificación del Código Civil. De la Interpretación de los Contratos; 4) El contexto servirá para ilustrar el sentido de Cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO. 4.1 El Contratista se obliga para con el .Contratante a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción el **"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**, comprometiéndose al efecto, a realizar dicha obra con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los Contrato de ejecución de obras, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo, sin necesidad de protocolización y respetando la normativa legal aplicada.

Obra cuyos rubros, unidades, cantidades y precios se detalla en la tabla siguiente:

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

No.	Rubro / Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio global
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7.00	476,17	3.333,19000
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3.50	405,49	1.419,21500
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M³	9.419,69	0,72	6.782,17680

4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189,90	11,34	2.153,46600
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M³	1.706,60	3,70	6.314,42000
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M³	368,64	3,94	1.452,44160
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M³	1.412,95	1,35	1.907,48250
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2,5 MM, MP-100	ML	80,00	243,32	19.465,60000
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314,88	189,47	59.660,31360
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M³	91,84	177,81	16.330,07040
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770,00	60,24	46.384,80000
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M³	17.988,24	2,38	42.812,01120
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³	4.611,60	10,16	46.853,85600
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³	2.880,87	12,94	37.278,45780
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1.412,95	0,81	1.144,48950
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863.435,52	0,22	189.955,81440
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204.755,04	0,22	45.046,10880
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127.910,63	0,22	28.140,33860
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32.340,00	0,66	21.344,40000
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23.100,00	8,05	185.955,00000
	SEÑALIZACION				
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9.800,00	0,22	2.156,00000
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875,00	5,36	4.690,00000
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1,00	332,16	332,16000
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6,00	283,40	1.700,40000
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6,00	283,40	1.700,40000
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10,00	117,23	1.172,30000
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100,00	117,23	11.723,00000
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2,00	66,74	133,48000
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2,00	145,37	290,74000
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500,00	0,28	140,00000

31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10,00	20,40	204,00000
	MEDIDAS AMBIENTALES				
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2,00	15,93	31,86000
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2,00	143,00	286,00000
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1,00	110,00	110,00000
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1,00	110,00	110,00000
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1,00	110,00	110,00000
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20,00	42,02	840,40000
				TOTAL:	**789.464,39220**

En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de primera calidad. La obra será realizada por el Contratista, utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada, tanto el Contratista como sus trabajadores y sub contratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos, de tal modo que responden hasta por culpa leve.

El contratista se obliga con la contratante a cumplir con todos los requerimientos y compromisos determinados según el nivel de transferencia de tecnología que se requiera para uno de los bienes y constan en el anexo 20 de la codificación y actualización de resoluciones emitidas por el servicio nacional de Contratación Pública.

CLÁUSULA QUINTA: PRECIO DEL CONTRATO. –

5.1 El Contratante cancelará al Contratista como precio por el objeto del presente Contrato, la cantidad de USD 789.464,39 (SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 39/100) dólares Americanos sin incluir IVA, los precios acordados en el Contrato, constituirán la única compensación al Contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o taza que tuviese que pagar, excepto el impuesto al valor agregado que será añadido al precio del contrato.

5.2 El pago se realizará con cargo a la Partida Presupuestaria N°- 05.01.D511.519.750105.000.000 OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS; Compromiso N° 755.

CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO. –

El pago del valor determinado en la cláusula anterior se realizara de la siguiente manera:

6.1 Se otorgara el 40% de anticipo Previo a la presentación de los Documentos Habilitantes y el 60% contado desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible.

6.2 Se estará a lo previsto en las Condiciones Particulares del contrato, y, además:

6.3 La contratante pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública.

6.4 Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la contratante, previa la aprobación de la fiscalización y del administrador del contrato.

6.5 Para la aprobación de las planillas préviamente la fiscalización y el contratista de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del contratista ni recepción por parte de la contratante; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto. Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

6.6 Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas:

a. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del formulario de la oferta, con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

b. Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores al período al que corresponde la planilla, el contratista preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.

c. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.

d. Por cada rubro, el contratista deberá indicar el origen de los bienes y servicios, los que deben cumplir con la previsión hecha en la oferta. La fiscalización deberá verificar esta información teniendo en cuenta las facturas entregadas por el contratista y la planilla de aportes al IESS del personal de la obra e. Con las planillas, el contratista presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

f. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la contratante y será requisito indispensable para la aprobación de la planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente.

6.7 Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La entidad contratante tiene la obligación de retener el valor de

los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del contratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la ejecución de dicho contrato.

6.8 De los pagos que deba hacer, la contratante retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

6.9 Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar a la contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍAS. –

En este contrato se rendirán la siguiente garantía:

7.1 El contratista a la firma del contrato presenta una garantía de fiel cumplimiento, con póliza de seguro N°53128, de la SEGUROS EQUINOCCIAL, de fecha 10 de Junio de 2022, con una vigencia de 20 de junio de 2022, hasta el 20 de Junio de 2023.

7.2 El contratista a la firma del contrato presenta una garantía de Buen Uso del Anticipo, con póliza de seguro N°43759, de la SEGUROS EQUINOCCIAL, de fecha 10 de Junio de 2022, con una vigencia del 20 de Junio de 2022, hasta el 17 de Diciembre de 2022.

7.3 Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el Art. 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publicas y 118 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publicas. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la contratante.

CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. –

8.1 El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es por ciento ochenta (180) días, contados a partir de la orden de inicio emitida por el administrador de contrato;

CLÁUSULA NOVENA: PRORROGAS DE PLAZO.

9.1 El Contratante, prorrogará el plazo total o los plazos parciales solo en los siguientes casos, y siempre que el Contratista así lo solicite, por escrito justificando los fundamentos de la solicitud, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud:

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en base al informe debidamente fundamentado de la fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato.

b) Cuando la contratante ordenare la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios

del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la contratante u ordenadas por ella, a través de la fiscalización, y que no se deban a causas imputables al contratista.

d) Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos.

9.2 En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que, suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la contratante, previo informe del administrador del contrato y de la fiscalización.

CLÁUSULA DÉCIMA: MULTAS. –

Se aplicará una multa del uno por mil (1x1000) sobre la diferencia del valor del contrato por ejecutarse, en los siguientes casos: Por cada día de retardo en la entrega del **ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA** acorde al cronograma presentado por el Administrador de Contrato.

Las multas se clasifican en graves, moderadas y leves:

10.1 Multas graves. - Se sancionará al Contratista con multa del uno por mil (1X1000) diario, del valor total del Contrato, en caso que incurra en las siguientes acciones:

a) Por cada día de retardo en la entrega de la obra.

b) Por abandono injustificado de la obra mayor a tres días.

c) Por sustitución del personal de manera injustificada o, en caso que la sustitución sea justificada, cuando se la haga con personal que no cumpla con los perfiles y/o requisitos constantes en la oferta.

d) Por incumplimiento del cronograma de avance físico de la obra. Los cinco últimos días laborables de cada mes; el Administrador del Contrato conjuntamente con el Fiscalizador Civil y el Contratista, verificarán el cumplimiento del cronograma físico de avance de obra aprobado.

e) Por no entregar los informes de seguimiento o cumplimiento ambiental, los cinco últimos días laborables de cada mes; el Administrador del Contrato conjuntamente con el Fiscalizador Ambiental y el Contratista, verificarán el estricto cumplimiento de la normativa ambiental.

10.2 Multas moderadas. -

Se sancionará al Contratista con multa del uno por mil (1X1000) diario, del valor total del Contrato, en caso que incurra en las siguientes acciones:

a) Por no Contar durante la ejecución de obra con parte del personal técnico y/u obreros, equipo y maquinaria ofertado.

b) Por incumplimientos de órdenes impartidas por el Administrador y/o Fiscalizador Civil o Ambiental del Contrato.

c) Por no contar en obra a disposición con el respectivo libro de obra, copia del Contrato, planos, diseños, permisos, así como documentos habilitantes ambientales, del proyecto en ejecución.

d) Por violación de normas ambientales producto de negligencia o dolo, en la ejecución del objeto del Contrato; independientemente de la acciones administrativas, civiles o penales a las que hubiere lugar en materia ambiental.

10.3 Multas leves. - Se sancionará al Contratista, con multa del uno por mil (1*1000) diario, del valor total del Contrato, en caso que incurra en las siguientes acciones:

a) Por obstaculizar intencionalmente los trabajos de otros contratistas o trabajadores del Contratante.

b) Por incumplimiento de las normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional establecidas en el Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo.

10.4 Las multas se impondrán de conformidad a lo establecido en el Art. 71 inciso segundo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: REAJUSTE DE PRECIO. –

El reajuste de precios para efectos del pago de las planillas se calculará de acuerdo con la(s) siguiente fórmula(s): La fecha de partida -sub cero-, corresponde a los treinta días anteriores de la fecha límite de presentación de las ofertas. (Incorporar la fórmula de reajuste en base a aquella establecida en los artículos 127, 128 y 129 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública). Nota: (Esta cláusula no será aplicable si las partes han convenido, según lo previsto en el pliego correspondiente, en la renuncia del reajuste de precios, caso en el cual se establecerá en su lugar una disposición específica en ese sentido).

DESCRIPCION DE SIMBOLOS Y FORMULA DE REAJUSTE

SIMBOLO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COEFICIENTE
B	MANO DE OBRA	136.194,16	0,190
C	CEMENTO PORTLAND-SACOS	19.741,56	0,028
E	EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUC. VIAL	302.289,04	0,421
F	PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO	20.381,34	0,028
G	MALLAS METÁLICAS (GAVIONES)	16.362,50	0,023
M	MADERA ASERRADA, CEPILLADA Y/O ESCUADRADA (PREPARADA)	8.567,61	0,012
P	MATERIALES PÉTREOS-TUNGURAHUA	107.527,04	0,150
Q	BETÚN PETRÓLEO (ASFALTO) (O)	70.131,60	0,098
X	VARIOS IPC TUNGURAHUA	36.297,47	0,050
		717.492,32	**1,000**

	Pr=Po(0.190 B1/Bo + 0.028 C1/Co + 0.421 E1/Eo + 0.028 F1/Fo + 0.023 G1/Go + 0.012 M1/Mo + 0.150 P1/Po + 0.098 Q1/Qo + 0.050 X1/Xo)			
EN DONDE:				
Pr =	Valor reajustado del anticipo o de la planilla.			

Po =	Valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutado a los precios unitarios contractuales descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado.
Bo =	Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, fijados por Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social: esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de la oferta que constará en el contrato.
B1 =	Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, fijados por Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social: esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigentes a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.
Co,Do,Eo...Zo =	Los precios o índices de precios de los componentes principales vigentes 30 días antes de la fecha de cierre para la presentación de las ofertas, fecha que constará en el contrato.
C1,D1,E1...Z1 =	Los precios o índices de precios de los componentes principales a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.
Xo =	Indice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de este, el índice de precios al consumidor treinta días antes de la fecha de cierre de la presentación de las ofertas, que constará en el contrato.
X1 =	Indice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de este, el índice de precios al consumidor a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.

CUADRILLA TIPO

DESCRIPCION	COST.DIRECT.	SRH	#HOR./HOM.	COEF.
OPERADOR EQUIPO PESADO C1	6.519,40	4,29	1.519,67	0,051
OPERADOR EQUIPO PESADO C2	2.914,84	4,09	712,67	0,024
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3	5,00	4,30	1,16	
CHOFER C1	61.628,73	5,62	10.965,97	0,368
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	13.108,68	4,29	3.055,64	0,103
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	8,18	4,09	2,00	
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	16.538,32	3,87	4.243,45	0,143
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	35.471,01	3,83	9.261,36	0,311
	136.194,16		**29.761,92**	**1,000**

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN. –

12.1 El Contratista queda expresamente prohibido ceder en su totalidad o parte, las obligaciones y derechos emanados del Contrato.
El Contratista podrá subcontratar la ejecución de determinados trabajos, con personas naturales o jurídicas siempre y cuando estén registradas en el R.U.P., bajo su riesgo y responsabilidad. Para ello deberá previa autorización del Contratante, presentar dicha Subcontratación, y deberá presentar la documentación pertinente, y el monto de subcontratación, misma que deberá ser con pequeñas o medianas empresas, y/o los actores de Economía Popular y Solidaria. Dicha Subcontratación no podrá superar el treinta (30%) por ciento del monto del Contrato reajustado.
12.2 Cuando exista Subcontratación, el Contratista será la única responsable por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directas o indirectamente empleados por ellos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. –

13.1 El Contratante designa al ING. GUSTAVO NAVAS, en calidad de Administrador del Contrato quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente Contrato. Solicitud fundamentada del contratista, por razones no imputables al contratista y previo informe del fiscalizador, que recomiende y justifique la suspensión solicitada; esto de acuerdo a la resolución N°06-P-GADPPZ-2019 de fecha 16 de mayo de 2019, Son obligaciones del Administrador del Contrato, a más de las que establece la ley, las Condiciones Generales o pliegos, las siguientes:

El Contratante podrá cambiar de Administrador del Contrato, para lo cual bastará cursar al Contratista la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.
Delegar a los administradores de contratos y convenios, la autorización, aprobación y notificación de suspensión y/o paralización de los trabajos y plazos, incluida la consecuente prorroga en el plazo total o plazos parciales, por decisión del contratante o solicitud fundamentada del contratista, por razones no imputables al contratista y previo informe del fiscalizador, que recomiende y justifique la suspensión solicitada; esto de acuerdo a la resolución N°06-P-GADPPZ-2019 de fecha 16 de mayo de 2019.

1) Adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados.
2) Evaluar las acciones, decisiones y medidas tomadas por fiscalización para la ejecución de la obra, con estricto cumplimiento a los programas, cronogramas, plazos y costos previstos, por ende, emitir la autorización o conformidad respectiva.
3) Autorizar previamente las obras adicionales por costo más porcentaje, aumento de cantidades de obra, y Contratos complementarios. Para este último caso solo procederán una vez suscrito el Contrato respectivo.
4) Dirimir en caso de existir diferencias de carácter técnico o económico entre el Contratista y Fiscalización.
5) Administrar las Garantías, imponer multas y sanciones a las que hubiere lugar, en coordinación con el área financiera.
6) Reportar a la Máxima Autoridad o Director Departamental respectivo, todos los aspectos operativos, técnicos y económicos o de cualquier naturaleza que pudieran afectar al cumplimiento del Contrato.
7) Emitir la Orden de Inicio de los Trabajos, por escrito y debidamente notificada al Contratista, en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de suscripción del Contrato.
8) Custodiar y hacer constar en el expediente todo hecho relevante que se presente durante la ejecución del Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - DE LA FISCALIZACIÓN. –

14.1 Será la persona con quien el Contratista, deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas.

Son obligaciones del Fiscalizador del Contrato, a más de las que establece la ley, las Condiciones Generales o pliegos, las siguientes:

1) Realizar las gestiones inherentes a la ejecución de la obra, de las cuales corresponderá al administrador del Contrato, la respectiva aprobación, en caso de existir prorrogas que modifiquen el plazo total de la ejecución, se requerirá adicionalmente la aprobación de la Máxima Autoridad.
2) Velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas legales, y de todas y cada una de las obligaciones y compromisos contractuales asumidos por el Contratista.
3) Adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y establecerá las multas y sanciones a que hubiere lugar, particular del que informará al administrador del Contrato a fin de que, de aprobar le sean aplicadas al Contratista
4) Presentar los informes que requiera el Administrador del Contrato, o las autoridades respectivas.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO. –
15.1 El Contrato termina:
De conformidad a lo previsto en el Art. 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contracción Publica y las condiciones particulares y generales del contrato.
1. Por el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.
2. Por mutuo acuerdo entre las partes.
3. Por sentencia o laudo ejecutoriados a que declare la nulidad del Contrato o la resolución del mismo ha pedido del Contratista.
4. Por declaración unilateral de terminación del Contrato, en caso de incumplimiento del Contratista.
5. Por disolución de la persona jurídica Contratista, que no se origine en decisión voluntaria de los órganos competentes de la sociedad.
6. Por causas imputables al Contratante de acuerdo a las causales constantes en el artículo 96 de la LOSNCP.
7. Si el Contratista incumple con las declaraciones que ha realizado en el Formulario de Oferta-Presentación y Compromiso.
8. En caso de que el Contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por el contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente Contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud será causal de terminación unilateral del Contrato por lo que la Máxima Autoridad de la entidad Contratante, lo declarará al Contratista incumplido, sin perjuicio a las demás acciones judiciales que hubiera lugar.
9. Si el monto total de las multas superaré el cinco (5%) por ciento del monto total del Contrato.
10. Existirá Terminación Unilateral, por las causas adicionales estipuladas en el Art. 94 de la LOSNCP.
15.2 El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del Contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA. - TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO. - La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE
16.1. Son obligaciones de la contratante las establecidas en las Condiciones Particulares del Pliego que son parte del contrato.

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. - OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
A más de las obligaciones señaladas en las Condiciones Particulares del Pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:
17.1 El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos

o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración.

17.2. El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la entidad contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la entidad contratante, tales como el administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberán tener el conocimiento suficiente para la operación y mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecutar, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante la ejecución de los trabajos, a facilitar a las personas designadas por la entidad contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución constructivos.

17.3. En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.

17.4. Corresponde al contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la contratante.

17.5. Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratista ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta, y cumplir con la participación ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada atendiendo los términos establecidos por la contratante en el estudio de desagregación tecnológica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta.

17.6. El contratista está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal especificamente aplicable.

17.7. El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

17.8. El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

17.9. Si el lugar donde se va a ejecutar la obra o se destinarán los bienes y servicios objeto de la contratación pertenece al ámbito territorial determinado en el artículo 2 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, el contratista en la ejecución del contrato contará con al menos el 70% de servicios o mano de obra de residentes de esa Circunscripción, con excepción de aquellas actividades para las que no exista personal calificado o que el bien sea de imposible manufacturación en esa Circunscripción.

17.10. El contratista se obliga a presentar al Administrador del Contrato, al inicio de la ejecución de la obra, la documentación señalada en el Formulario II, Compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual: equipo mínimo requerido; personal técnico mínimo requerido y experiencia mínima del personal técnico; cronograma de incorporación conforme cronograma valorado; y, metodología; los cuales deberán ser acorde a lo requerido por la entidad contratante en los pliegos, y a lo anunciado por el oferente en su oferta. El contratista se obliga al cumplimiento de estos parámetros de forma explícita en la ejecución contractual, y en caso de incumplimiento, la entidad contratante podrá terminar de manera anticipada y unilateral el contrato, conforme la normativa aplicable.

17.11. El ensayo de materiales de la obra será a costo del contratista y se los deberá ensayar en laboratorios que sean autorizados por la Entidad Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - OBLIGACIONES POR IMPACTOS MEDIO AMBIENTALES.

18.1 Serán obligaciones del Contratista y el Contratante las siguientes:

Serán obligaciones del Contratista:

1) Informar al Administrador, Fiscalizador Civil o Ambiental, en caso de realizar una variante o modificación en la ejecución o cierre de la obra, siempre que esta pueda generar daños o riesgos ambientales.
   Caso contrario será responsabilidad única y directa del Contratista los daños causados.
2) La gestión, tratamiento y disposición final de los desechos peligrosos generados en el desarrollo de las actividades vinculadas a la ejecución y cierre de la obra.
3) Notificar los incumplimientos de actividades mensuales contempladas conforme a los permisos ambientales, al Administrador, Fiscalizador Ambiental y Civil del Contrato.
   De no hacerlo tales incumplimientos serán responsabilidad única y directa del Contratista.
4) Cumplir con el Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del trabajo y las que se deriven del Reglamento.
5) Cumplir con las especificaciones de las normas INEN, en lo que corresponda a señalética, etiquetas, rótulos y almacenamiento de desechos.
6) Asumir y subsanar los incumplimientos de los técnicos ambientales asignados al proyecto.
7) Todo proyecto o actividad genera impacto ambiental; su mitigación en caso de impacto ambiental negativo será obligatorio conforme al principio pro natura establecido en el Art. 395 y 396 de la Constitución de la República del Ecuador;
8) Independientemente del proyecto, actividad o nivel de impacto, constituirá obligación del Contratista cumplir con las disposiciones dictadas por la Autoridad Ambiental.
9) Responsabilizarse de que los técnicos ambientales empleados por el Contratista en el proyecto:

9.1) Entreguen mensualmente los informes de monitoreo/cumplimiento ambiental.
9.2) Estén presentes en la obra durante el correspondiente porcentaje de tiempo previsto en los pliegos u oferta.
9.3) Registren sus visitas, observaciones y hallazgos en el respectivo libro de obra.
9.4) Acudan a los llamados, previa notificación con 48 horas de antelación, hechos por el Administrador o Fiscalización Civil o Ambiental, siempre que acorde al caso sea fundamental su presencia.
9.5) Entreguen los informes mensuales ambientales respectivos, y demás actuaciones correspondientes al objeto del Contrato, en los cinco últimos días laborables de cada mes.
9.6) Coordinen en casos de situaciones de emergencia, denuncias o quejas en un término no mayor a 12 horas, con el Contratista, Administrador y Fiscalización Civil o Ambiental.

Serán obligaciones directas del Contratante:

1) Entregar de ser procedente los respectivos permisos ambientales, previo inicio de la ejecución de la obra; conforme a la categorización de impacto ambiental.
2) Entregar de ser procedente los respectivos permisos ambientales que correspondan a las áreas de libre aprovechamiento y autorizaciones, previa al inicio de la ejecución de la obra.
3) Entregar de ser procedente los respectivos permisos y autorizaciones de estudios viales previos a la ejecución de la obra.
4) Atender de manera oportuna y en el plazo establecido los llamados de atención que haga la Autoridad Ambiental.
5) Entregar ante la Autoridad Ambiental, los informes correspondientes.

18.2 La obra no será recibida, sino hasta que este saneado todo asunto administrativo, civil o penal en materia ambiental.

CLÁUSULA VIGESIMA. - CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO. -

19.1. Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - VIGILANCIA Y CUSTODIA.

20.1 El Contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción definitiva de la misma, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA. - La recepción provisional.

21.1 Se realizará, a petición del Contratista, cuando a juicio de este se hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique el Contratante y solicite tal recepción, en los términos del Art. 81 de la LOSNCP, y observando el Art. 122 del RGLOSNCP.

El Contratante podrá presentar reclamos al Contratista, en el periodo que media entre la recepción provisional y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso.

La recepción definitiva. - Transcurrido seis meses desde la recepción provisional o de la declaratoria de recepción provisional presentada, el Contratista solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar en el plazo de tres (3) días, contados desde la solicitud presentada por el Contratista.

Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción del Contratante, y a costa del Contratista, si el defecto fuere de menor importancia y a juicio del Contratante puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el Acta respectiva solo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del Contratista.

Si el Contratante no hiciere ningún procedimiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del Contratista notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el Art. 81 de la LOSNCP.

Operada la recepción definitiva presunta, el Contratante tendrá el plazo de treinta días para efectuar la liquidación del Contrato.

Si no lo hiciese, el Contratista podrá presentar su liquidación a la entidad. Si no se suscribe el acta de la liquidación técnico-económica en un nuevo plazo de treinta días, el Contratista notificará judicialmente con su liquidación al Contratante.

Actas de recepción. - En cuanto al contenido de las actas de recepción provisional y definitiva, se observará lo establecido en el Art. 124 del RGLOSNCP.

Liquidación del Contrato. - La liquidación final del Contrato, se realizará en los términos previstos por el Art. 125 del RGLOSNCP.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

22.1. El contratista, no obstante, la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

23.1. El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del contratista, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. –

Las partes podrán establecer los términos específicos del convenio arbitral, para el efecto se propone el siguiente texto:

En caso de que, respecto de las divergencias o controversias suscitadas sobre el cumplimiento, interpretación y ejecución del presente contrato, no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas renuncian expresamente a la jurisdicción ordinaria, y se someten a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos previstos en la Ley de Arbitraje y Mediación de la República del Ecuador, al reglamento de funcionamiento del centro de mediación y arbitraje de (determinar el centro de mediación acordado entre las partes) y a las siguientes normas:

a) Previamente a iniciar el trámite del arbitraje, las partes someterán la controversia a mediación para lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio.

b) En el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante la mediación, las partes se someten a arbitraje administrado por el centro de arbitraje y mediación de (determinar el centro de mediación acordado entre las partes). El Tribunal estará conformado por tres árbitros principales y un alterno, y serán seleccionados de la siguiente forma: cada una de las partes, en el término de cinco días contados desde la citación de la demanda arbitral, elegirá su árbitro de la lista oficial proporcionada por el centro de arbitraje y mediación, y los dos árbitros elegidos, en el mismo término de cinco días escogerán al tercer árbitro, quien presidirá el Tribunal, y al árbitro alterno. El tercer árbitro y el árbitro alterno serán seleccionados de la lista oficial proporcionada por el centro de arbitraje y mediación, y el término para su designación se contará a partir de la fecha en que los árbitros nombrados por las partes hayan manifestado por escrito su aceptación de desempeñar el cargo. En el evento en que alguna de las partes, o los árbitros designados por éstas, no efectuaren las designaciones que les corresponden dentro del término previsto, éstas se efectuarán por sorteo, a pedido de cualquiera de las partes, conforme lo establece el inciso quinto del artículo 16 de la Ley de Arbitraje y Mediación.

c) Las partes autorizan al Tribunal Arbitral para que ordene y disponga medidas cautelares que procedan y se ajusten a la normativa procesal ecuatoriana, y para la ejecución de tales medidas; el Tribunal solicitará el auxilio de funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos que sean necesarios, sin tener que recurrir a juez ordinario alguno.

d) El laudo que expida el Tribunal Arbitral deberá fundarse en derecho y por consiguiente sujetarse al contrato, a la ley, a los principios universales del derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina.

e) Las partes se obligan a acatar el laudo arbitral que se expida.

f) Los costos y gastos arbitrales que genere el proceso arbitral serán cubiertos por el demandante.

g) El lugar del arbitraje será en la ciudad de (ciudad), en las instalaciones del centro de arbitraje y mediación de (determinar el centro de mediación acordado entre las partes) y su tramitación será confidencial.

h) Si el Tribunal Arbitral declarara que no tiene competencia para resolver la controversia, ésta se someterá al procedimiento establecido en el Código Orgánico General de Procesos, siendo competente para conocer y resolver la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la entidad contratante. Para tal efecto, el Tribunal Arbitral deberá conocer y resolver en la audiencia de sustanciación todas las excepciones previas que la parte demandada haya propuesto en su escrito de contestación a la demanda, con excepción de aquellas que se refieran a la caducidad y prescripción que serán resueltas en el laudo arbitral.

i) El contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este contrato. Si el contratista incumpliere este compromiso, la contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectivos las garantías.

j) La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato."

CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA. - TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS. –

24.1 El Contratante efectuará al Contratista las retenciones que dispongan las leyes tributarias: actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al Artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la legislación tributaria vigente.

25.1 El Contratante retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del Contrato de acuerdo al Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001.

CLÁUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES. -

26.1 Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre el Contratante y el Contratista se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y se registrarán.

DÉCIMO VIGÉSIMA OCTAVA. -LEVANTAMIENTO DEL SIGILO BANCARIO.- 26.2 Autorizo al Servicio Nacional de Contratación Pública o a los organismos de control correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales y extranjeras, que se encuentran a mi nombre; y a nombre de mi representante legal, en el caso de personas jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de asociación o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos; a fin de verificar el origen lícito de los fondos y recursos a emplearse en la ejecución del presente procedimiento de contratación pública. Así mismo, autorizo que toda la información relacionada con los pagos recibidos como contratista o sub contratista del Estado, así como mis movimientos financieros, tendrán el carácter de público y deberán ser difundidos a través de un portal de información o página web destinada para el efecto, que permitan detectar con certeza el flujo de los fondos públicos. No se podrá alegar reserva tributaria, societaria, bursátil ni bancaria sobre este tipo de información. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposición General Décima de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 61 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP; las cuentas bancarias y sus movimientos, de todas las personas naturales o jurídicas que consten como socios o accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de una persona jurídica o consorcio oferente, cuando estén relacionadas con el flujo de los recursos públicos, no estarán sujetas a sigilo bancario, tributario, societario ni bursátil. Estarán sujetas a esta disposición, inclusive las personas declaradas como beneficiarios finales, o cualquier persona que se beneficie de transacciones bancarias en el flujo de los recursos públicos.

CLÁUSULA VIGESIMA SÉPTIMA. - DOMICILIO. -

27.1 Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza.

Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: Del Contratante: Calle Francisco de Orellana y 27 de febrero, Puyo, Pastaza, Telf. (03) 2885-380, 2883-830, 2886-179.

Del Contratista: Provincia: Pastaza; Cantón: Pastaza; Parroquia; Puyo; Calle: Ambato; Numero: S/N Intersección: Machala; Referencia: Frente a las Aulas de Sindicato de Choferes de Pastaza; Teléfono: 0984787283; Correo Electrónico: edypollito@hotmail.es

Cualquier cambio en los datos de dirección, se deberán notificar tanto al Contratista como Contratante, a fin de agilizar la comunicación entre las partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES. –

28.1 Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente Contrato; suscribiéndolo en 4 ejemplares; y se someten a sus estipulaciones.

JAIME PATRICIO GUEVARA BLASCHKE

Ing. Jaime Guevara Blaschke
Prefecto del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza

CONTRATANTE

ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA.LTDA

R.U.C.: 1691704528001

CONTRATISTA

Revisado por:	Dr. Danilo Andrade S.	DANILO RAFAEL ANDRADE SANTAMARIA
Elaborado por:	Abg. Wendy Lopez	WENDY JACQUELINE LOPEZ VILLARROEL

PLANILLA 08 - LIQUIDACIÓN DE OBRA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

ANEXO:

COPIA DE DOCUMENTOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

OFICIOS ENVIADOS

CONSTRUCTORA

EDDYMICH CIA. LTDA.

Puyo, 05 de abril de 2023

Oficio No. 18-EDDYMICH-2023

INGENIERO
GUSTAVO NAVAS
ADMINISTRADO DE CONTRATO DE *"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"*

ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 03

Presente.-

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus funciones cotidianas.

En función de las distintas actividades programadas que se han venido ejecutando durante el desarrollo del proyecto ***ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA***, solicito que se otorgue una ampliación de plazo 03 de **15 días** por incidencia de lluvias intensas que paralizaron actividades programadas, para lo cual la documentación probatoria a la solicitud de prorroga se anexa al presente documento y se detalla en el mismo.

ANTECEDENTES Y ASPECTOS RELEVANTES:

- En la ciudad de Puyo, a los 20 días del mes de junio del 2022, se suscribe el contrato COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-005-2022, cuyo objeto es: "**ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500) PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",** entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza legalmente representado por el Ing. Jaime Patricio Guevara Blaschke, Prefecto Provincial; y por otra parte, en calidad de Contratista, la Constructora EDDYMICH CIA. LTDA., por un monto contractual de **$789.464,39 (SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 39/100)** dólares americanos sin incluir IVA, y con un plazo de 180 días.

- Mediante contrato ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500) PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, se designa al Ing. Gustavo Navas como Administrador de Contrato.

Recibido 05-04-2023

Mail: edypollito@hotmail.es Tel.03-2884546 Cel. 0984787283
Puyo-Pastaza-Ecuador Direc.: Obrero, Calle Ambato S/N y Machala

- Mediante ACTA DE NOTIFICACIÓN DE INICIO, en la ciudad de puyo, a los 31 días del mes de agosto de 2022, se procede a la entrega en sitio donde se ejecutarán los trabajos concernientes al Contrato suscrito con fecha 27 de julio de 2022, cuyo objeto de contratación es la **"FISCALIZACIÓN DEL ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500) PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",** por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza con su representante legal Ing. Jaime Patricio Guevara Blashke, Prefecto de Pastaza; por otro lado el Ing. Guamán Iler Omar Henry FISCALIZADOR EXTERNO, para este propósito se reúnen el Ing. Gustavo Navas, en calidad de Administrador de Contrato de Fiscalización, el Ing. Guamán Iler Omar Henry, en calidad de Fiscalizador Externo, con la finalidad de suscribir la presente Acta de inicio de plazo contractual. Conforme a la RESOLUCIÓN No. RE – SERCOP – 2021 se establece la notificación de que los dos anticipos se encuentran disponibles, para lo cual se remite esta NOTIFICACIÓN DE INICIO DE PLAZO hoy 31 de agosto de 2022 y para efectos de contabilización de plazo será a partir del día siguiente de esta notificación (1 de septiembre de 2022).

- Mediante Oficio No. 009-EDDYMICH-2023 de fecha 17 de febrero de 2023 el contratista solicita la AMPLIACIÓN DE PLAZO 01, en la cual contabiliza 40 días por causa de excedentes en ciertos rubros contractuales, incidencia de lluvias que paralizaron actividades programadas y caso fortuito o de fuerza mayor suscitados en la vía durante la ejecución de los trabajos.

- Mediante OFICIO N. 008-2023-FISC-EXT de fecha 27 de febrero de 2023 la fiscalización externa aprueba la orden de ampliación de plazo No. 1 y solicitud de reprogramación No. 3, la cual es de 40 días y cuya fecha de terminación de la obra sería el 8 de abril de 2023.

- Mediante Oficio No. 011-EDDYMICH-2023 de fecha 27 de febrero de 2023 el contratista solicita la AMPLIACIÓN DE PLAZO 02, en la cual contabiliza 10 días por causa de excedentes en ciertos rubros contractuales, incidencia de lluvias que paralizaron actividades programadas y caso fortuito o de fuerza mayor suscitados en la vía durante la ejecución de los trabajos.

- De acuerdo a la reprogramación N° 03 del cronograma valorado de trabajos vigente, en el periodo de maro de 2023, se encontraba programado los trabajos de HORMIGÓN PARA CUNETAS (F´C=180 KG/CM2), donde dicha actividad programada sufrió

paralizaciones por cuestiones climatológicas de lluvias intensas suscitadas en los días 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 21, 24, 27, 28, 31, lo cual fue registrado en el libro de obra y en un registro de estado del tiempo. La información climatológica para corroborar las lluvias en este periodo se encuentra sustentada en el Registro de Información Climatológica Aeronáutica de Precipitaciones del mes de MARZO-2023 (código: GMET-PR-001-RG-005) de la Dirección General de Aviación Civil-Aeropuerto "Rio amazonas"-Shell Mera.

ANÁLISIS:

- Que, la Norma de control Interno de la Contraloría General del Estado No. 408-27 el contratista deberá imponer la solicitud de prórroga de conformidad con las disposiciones contractuales después de conocer el hecho que demorará la ejecución y en cuanto tenga la información suficiente, aportará la documentación probatoria necesaria para que la administración pueda resolver el reclamo.

- Que, las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, en su numeral *408-25 Incidencia de lluvias* y *408-27 Prorrogas de plazo*, indican:

> *"**408-25**...Si las labores se suspenden a causa de la lluvia, se hará constar en el libro de obra o un registro la fecha en la cual se presentó esa condición, cuales trabajos se suspendieron, a qué hora y por cuanto tiempo, en qué medida fueron afectados y se expondrán las razones por las cuales no se pudo continuar. Las anotaciones serán ratificadas por la firma del Fiscalizador encargado de llevar este control, así como por la del profesional representante del contratista. Los datos así recabados se emplearán, en conjunto con el programa de ejecución, para determinar la prórroga de plazo que se autorizara por este concepto.*
>
> ***408-27**...son motivos de ampliación las siguientes causas comprobadas:*
> - *Falta de materiales de construcción o equipos a incorporar en el mercado nacional o internacional.*
> - *Periodos de lluvia que perjudiquen el avance de las obras conforme lo señalado en las Normas de Control Interno 408-25.*
> - *Cambios, trabajos extraordinarios o ampliaciones de la obra que requieran aumento de plazo."*

- La presencia de lluvias intensas provocó la suspensión de los trabajos programados de HORMIGÓN EN CUNETAS (F´C=180 KG/CM2), debido a que la presencia del agua lluvia influye en el aumento de la proporción de agua en la mezcla de hormigón no solo en el momento del mezclado, también en el transporte, la colocación, la compactación y en el acabado. Estos factores aumentan la relación agua -cemento de la mezcla, lo cual reduce la resistencia mecánica final del hormigón.

- Detalle de los **15 días** de ampliación de plazo solicitados por motivos de lluvias intensas:

FECHA DE LA INCIDENCIA EN LOS TRABAJOS	TIEMPO VALIDADO POR LA FISCALIZACIÓN		OBSERVACIONES
	HORAS	DÍAS	
2/03/2023	8	1	❖ Paralización de los trabajos por incidencia de la lluvia, NCICGE 408-25. ❖ REGISTRO INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA AERONÁUTICA PRECIPITACIÓN - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN CIVIL AEROPUERTO RIO AMAZONAS-SHELL. (MARZO-2023) ❖ REGISTRO DE ESTADO DEL TIEMPO. ❖ REGISTRO EN EL LIBRO DE OBRA
3/03/2023	8	1	
4/03/2023	8	1	
6/03/2023	8	1	
8/03/2023	8	1	
9/03/2023	8	1	
11/03/2023	8	1	
12/03/2023	8	1	
14/03/2023	8	1	
17/03/2023	8	1	
21/03/2023	8	1	
24/03/2023	8	1	
27/03/2023	8	1	
28/03/2023	8	1	
31/03/2023	8	1	
TOTAL:	**120**	**15**	***Total de días validados.***
NOTA: Se considera a la jornada diaria de trabajo con una duración de 8 horas.			

CONCLUSIONES:

Por lo expuesto, en función de la documentación presentada se considera que es factible la solicitud de **prórroga de plazo de 15 días** al contrato de COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-005-2022 ***"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"***, dicho pedido de prorroga se encuentra sustentado con fundamento en lo siguiente:

- Que, las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, en su numeral *408-25 Incidencia de lluvias* y *408-27 Prorrogas de plazo*, indican:

  *"**408-25**...Si las labores se suspenden a causa de la lluvia, se hará constar en el libro de obra o un registro la fecha en la cual se presentó esa condición, cuales trabajos se suspendieron, a qué hora y por cuanto tiempo, en qué medida fueron afectados y se expondrán las razones por las cuales no se pudo continuar. Las anotaciones serán ratificadas por la firma del Fiscalizador encargado de llevar este control, así como por la del profesional representante del contratista. Los datos así recabados se emplearán, en conjunto con el programa de ejecución, para determinar la prórroga de plazo que se autorizara por este concepto.*

  ***408-27**...son motivos de ampliación las siguientes causas comprobadas:*
  - *Falta de materiales de construcción o equipos a incorporar en el mercado nacional o internacional.*
  - *Periodos de lluvia que perjudiquen el avance de las obras conforme lo señalado en las Normas de Control Interno 408-25.*
  - *Cambios, trabajos extraordinarios o ampliaciones de la obra que requieran aumento de plazo."*

- Técnicamente en presencia de lluvias intensas es recomendable no ejecutar trabajos de hormigonado al aire libre, debido a que la presencia del agua lluvia influye en el aumento de la proporción de agua en la mezcla de hormigón no solo en el momento del mezcla, también en el transporte, la colocación, la compactación y en el acabado. Estos factores aumentan la relación agua - cemento de la mezcla, lo cual reduce la resistencia mecánica final del hormigón.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: Ángel Misael López Chávez
CONTRATISTA

ANEXO:

- ANEXO 1: REGISTRO INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA AERONÁUTICA PRECIPITACIÓN (1 HOJA).
- ANEXO 2: COPIA LIBRO DE OBRA _ DÍAS DE LLUVIA QUE PARALIZARON LOS TRABAJOS (15 HOJAS).
- ANEXO 3: REGISTRO DE ESTADO DEL TIEMPO NCICGE 408-25 (15 HOJAS).

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Dirección General de Aviación Civil	PROCEDIMIENTO DE CLIMATOLOGÍA	
	REGISTRO INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA AERONÁUTICA PRECIPITACIÓN	Código: GMET-PR-001-RG-005 Versión: 1.0 Página 1 de 1

AEROPUERTO *"Río Amazonas" - SHELL MERA* *MARZO - 2023*

Día/Hora	01 - 07	07 - 13	13 - 19	19 - 01	Suma Diaria
1	1.8	0.0	0.0	-	1.8
2	10.5	48.4	0.8	-	59.7
3	0.7	9.9	0.0	-	10.6
4	8.2	23.3	1.2	-	32.7
5	3.9	0.2	2.7	-	6.8
6	21.8	4.2	0.0	-	26.0
7	0.0	0.0	4.3	-	4.3
8	0.0	0.0	15.3	-	15.3
9	9.5	1.6	0.0	-	11.1
10	0.4	3.7	0.2	-	4.3
11	6.6	3.0	27.0	-	36.6
12	0.3	0.0	43.5	-	43.8
13	1.2	1.3	1.0	-	3.5
14	9.0	15.0	0.4	-	24.4
15	0.0	0.0	6.9	-	6.9
16	0.0	0.0	6.7	-	6.7
17	0.0	0.0	17.0	-	17.0
18	0.0	0.1	0.0	-	0.1
19	0.0	0.0	0.0	-	0.0
20	0.0	0.0	0.0	-	0.0
21	1.9	9.2	0.0	-	11.1
22	0.0	0.5	0.0	-	0.5
23	0.0	0.0	0.0	-	0.0
24	0.5	29.5	0.0	-	30.0
25	1.8	0.2	0.0	-	2.0
26	0.0	1.9	0.0	-	1.9
27	19.3	0.0	1.7	-	21.0
28	11.4	28.3	17.5	-	57.2
29	0.0	2.6	2.3	-	4.9
30	0.0	1.2	0.0	-	1.2
31	5.6	21.7	0.6	-	27.9
TOTAL	**114.4**	**205.8**	**149.1**	**0.0**	**469.3**

RESUMEN

PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS	*59.7*
FECHA MÁXIMA PRECIPITACIÓN	*2 - MARZO - 2023*
No. de días con PRECIPITACIÓN	*28*
No. de días con PRECIPITACIÓN menor que 1 mm	*2*
No. de días con PRECIPITACIÓN igual o mayor que 1 mm	*26*

TRZ = Trazas de precipitación (valores inferiores a 0,1 mm)

NOTA: ES FIEL COPIA DE LOS REGISTROS DIARIOS DE OBSERVACIONES DE SUPERFICIE QUE REPOSAN EN LA OFICINA DE CLIMATOLOGÍA DE LA DGAC.

Firmado electrónicamente por: JEFFERSON OMAR ROSERO VILLARREAL

PREPARADO POR: **Lic. Jefferson Rosero V.-Climatología DGAC**

Información solicitad por COSRTRUCTORA EDDYMICH CIA LTDA.-Prohibida su reproducción.

Dirección General de Aviación Civil
Buenos Aires Oe1-53 y Av. 10 de Agosto
Código Postal: 170402 / Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2 294-7400
www.aviacioncivil.gob.ec

República del Ecuador

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

REGISTRO DE ESTADO DEL TIEMPO

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 408-25

Si las labores se suspenden a causa de lluvia, se hara constar en el libro de obra o en un registro la fecha en la cual se presentó esa condición, cuales trabajos se suspendieron, a que hora y por cuanto tiempo, en qué medida fueron afectados y se expondrán las razones por las cuales no se pudo continuar. Las anotaciones serán ratificadas por la firma del Fiscalizador encargado de llevar este control, así como por la del profesional representante del contratista.

OBRA: ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	FECHA			N° HOJA
	DIA	MES	AÑO	
	2	03	2023	1

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

ESTADO DEL TIEMPO: Nomenclatura a utilizar: **T**=Trabajando, **P**=Paralizado

HORARIO		DESPEJADO	NUBLADO	LLUVIA DEBIL INTERMITENTE	LLUVIA DEBIL CONTINUA	LLUVIA INTENSA	OBSERVACIÓN
DESDE	HASTA						
6:00	7:00						
7:00	8:00						
x 8:00	9:00					P	
9:00	10:00					P	
10:00	11:00					P	
11:00	12:00					P	
12:00	13:00						
13:00	14:00					P	
14:00	15:00					P	
15:00	16:00					P	
16:00	17:00 x					P	
17:00	18:00						

HORAS TRABAJADAS = | HORAS PARALIZADAS = 8 | JUSTIFICADO = 8

CODIGO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES QUE SE SUSPENDEN	TERMINACION CRONOGRAMA
Rubro #9	Hormigón para cunetas ($f'c = 180\ kg/cm^2$)	

OBSERVACIONES: Por motivo de lluvia intensa se suspenden los trabajos de hormigón en cunetas, debido a que la presencia de lluvia aumenta la proporción de agua en la mezcla de hormigón, lo cual incide en el momento de la mezcla, en el transporte, colocación, compactación y en el acabado. Estos factores aumentan la relación agua-cemento de la mezcla, lo que influye en la reducción de la resistencia mecánica final del hormigón.

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZADOR

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ
CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

REGISTRO DE ESTADO DEL TIEMPO

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 408-25

Si las labores se suspenden a causa de lluvia, se hara constar en el libro de obra o en un registro la fecha en la cual se presentó esa condición, cuales trabajos se suspendieron, a que hora y por cuanto tiempo, en qué medida fueron afectados y se expondrán las razones por las cuales no se pudo continuar. Las anotaciones serán ratificadas por la firma del Fiscalizador encargado de llevar este control, así como por la del profesional representante del contratista.

OBRA: ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	FECHA			N° HOJA
	DIA	MES	AÑO	
	3	03	2023	1
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.				

ESTADO DEL TIEMPO: Nomenclatura a utilizar: **T**=Trabajando, **P**=Paralizado

HORARIO		DESPEJADO	NUBLADO	LLUVIA DEBIL INTERMITENTE	LLUVIA DEBIL CONTINUA	LLUVIA INTENSA	OBSERVACIÓN
DESDE	HASTA						
6:00	7:00						
7:00	8:00						
* 8:00	9:00					P	
9:00	10:00					P	
10:00	11:00					P	
11:00	12:00					P	
12:00	13:00						
13:00	14:00					P	
14:00	15:00					P	
15:00	16:00					P	
16:00	17:00					P	
17:00	18:00						

HORAS TRABAJADAS = | HORAS PARALIZADAS = 8 | JUSTIFICADO = 8

CODIGO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES QUE SE SUSPENDEN	TERMINACION CRONOGRAMA
Rubro #9	Hormigón para cunetas ($f'c = 180\ kg/cm^2$)	

OBSERVACIONES: Por motivo de lluvia intensa se suspenden los trabajos de hormigón en cunetas, debido a que la presencia de lluvia aumenta la proporción de agua en la mezcla de hormigón, lo cual incide en el momento de la mezcla, en el transporte, colocación, compactación y en el acabado. Estos factores aumentan la relación agua-cemento de la mezcla, lo que influye en la reducción de la resistencia mecánica final del hormigón.

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZADOR

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ
CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

REGISTRO DE ESTADO DEL TIEMPO

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 408-25

Si las labores se suspenden a causa de lluvia, se hara constar en el libro de obra o en un registro la fecha en la cual se presentó esa condición, cuales trabajos se suspendieron, a que hora y por cuanto tiempo, en qué medida fueron afectados y se expondrán las razones por las cuales no se pudo continuar. Las anotaciones serán ratificadas por la firma del Fiscalizador encargado de llevar este control, así como por la del profesional representante del contratista.

OBRA: ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	FECHA			N° HOJA
	DIA	MES	AÑO	
	4	03	2023	1
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.				

ESTADO DEL TIEMPO: Nomenclatura a utilizar: **T**=Trabajando, **P**=Paralizado

HORARIO		DESPEJADO	NUBLADO	LLUVIA DEBIL INTERMITENTE	LLUVIA DEBIL CONTINUA	LLUVIA INTENSA	OBSERVACIÓN
DESDE	HASTA						
6:00	7:00						
7:00	8:00						
8:00	9:00					P	
9:00	10:00					P	
10:00	11:00					P	
11:00	12:00					P	
12:00	13:00						
13:00	14:00					P	
14:00	15:00					P	
15:00	16:00					P	
16:00	17:00					P	
17:00	18:00						

HORAS TRABAJADAS = | HORAS PARALIZADAS = 8 | JUSTIFICADO = 8

CODIGO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES QUE SE SUSPENDEN	TERMINACION CRONOGRAMA
Rubro # 9	Hormigón para cunetas ($f'c = 180\ Kg/cm^2$)	

OBSERVACIONES: Por motivo de lluvia intensa se suspenden los trabajos de hormigón en cunetas, debido a que la presencia de lluvia aumenta la proporción de agua en la mezcla de hormigón, lo cual incide en el momento de la mezcla, en el transporte, colocación, compactación y en el curado. Estos factores aumentan la relación agua-cemento de la mezcla, lo que influye en la reducción de la resistencia mecánica final del hormigón.

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZADOR

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ
CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

REGISTRO DE ESTADO DEL TIEMPO

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 408-25

Si las labores se suspenden a causa de lluvia, se hara constar en el libro de obra o en un registro la fecha en la cual se presentó esa condición, cuales trabajos se suspendieron, a que hora y por cuanto tiempo, en qué medida fueron afectados y se expondrán las razones por las cuales no se pudo continuar. Las anotaciones serán ratificadas por la firma del Fiscalizador encargado de llevar este control, así como por la del profesional representante del contratista.

OBRA: ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	FECHA			N° HOJA
	DIA	MES	AÑO	
	6	03	2023	1
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.				

ESTADO DEL TIEMPO: Nomenclatura a utilizar: **T**=Trabajando, **P**=Paralizado

HORARIO		DESPEJADO	NUBLADO	LLUVIA DEBIL INTERMITENTE	LLUVIA DEBIL CONTINUA	LLUVIA INTENSA	OBSERVACIÓN
DESDE	HASTA						
6:00	7:00						
7:00	8:00						
8:00	9:00					P	
9:00	10:00					P	
10:00	11:00					P	
11:00	12:00					P	
12:00	13:00						
13:00	14:00					P	
14:00	15:00					P	
15:00	16:00					P	
16:00	17:00					P	
17:00	18:00						

HORAS TRABAJADAS = | HORAS PARALIZADAS = 8 | JUSTIFICADO = 8

CODIGO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES QUE SE SUSPENDEN	TERMINACION CRONOGRAMA
Rubro #9	Hormigón para cunetas ($f'c = 180\ kg/cm^2$)	

OBSERVACIONES: Por motivo de lluvia intensa se suspenden los trabajos de hormigon en cunetas, debido a que la presencia de lluvia aumenta la proporción de agua en la mezcla de hormigón, lo cual incide en el amasado de la mezcla, en el transporte, colocación, compactación y en el acabado. Estos factores aumentan la relación agua-cemento de la mezcla, lo que influye en la reducción de la resistencia mecánica final del hormigón.

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZADOR

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ
CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

REGISTRO DE ESTADO DEL TIEMPO

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 408-25

Si las labores se suspenden a causa de lluvia, se hara constar en el libro de obra o en un registro la fecha en la cual se presentó esa condición, cuales trabajos se suspendieron, a que hora y por cuanto tiempo, en qué medida fueron afectados y se expondrán las razones por las cuales no se pudo continuar. Las anotaciones serán ratificadas por la firma del Fiscalizador encargado de llevar este control, así como por la del profesional representante del contratista.

OBRA: ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	FECHA			N° HOJA
	DIA	MES	AÑO	
	8	03	2023	1

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

ESTADO DEL TIEMPO: Nomenclatura a utilizar: **T**=Trabajando, **P**=Paralizado

HORARIO		DESPEJADO	NUBLADO	LLUVIA DEBIL INTERMITENTE	LLUVIA DEBIL CONTINUA	LLUVIA INTENSA	OBSERVACIÓN
DESDE	HASTA						
6:00	7:00						
7:00	8:00						
8:00	9:00					P	
9:00	10:00					P	
10:00	11:00					P	
11:00	12:00					P	
12:00	13:00						
13:00	14:00					P	
14:00	15:00					P	
15:00	16:00					P	
16:00	17:00					P	
17:00	18:00						

HORAS TRABAJADAS = | HORAS PARALIZADAS = 8 | JUSTIFICADO = 8

CODIGO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES QUE SE SUSPENDEN	TERMINACION CRONOGRAMA
Rubro #9	Hormigón para cunetas ($f'c$ = 180 kg/cm²)	

OBSERVACIONES: Por motivos de lluvia intensa se suspenden los trabajos de hormigón en cunetas, debido a que la presencia de lluvia aumenta la proporción de agua en la mezcla de hormigón, lo cual ocurre en el momento de la mezcla, en el transporte, colocación, compactación y en el acabado. Estos factores aumentan la relación agua-cemento de la mezcla, lo que influye en la reducción de la resistencia mecánica final del hormigón.

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZADOR

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ
CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

REGISTRO DE ESTADO DEL TIEMPO

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 408-25

Si las labores se suspenden a causa de lluvia, se hara constar en el libro de obra o en un registro la fecha en la cual se presentó esa condición, cuales trabajos se suspendieron, a que hora y por cuanto tiempo, en qué medida fueron afectados y se expondrán las razones por las cuales no se pudo continuar. Las anotaciones serán ratificadas por la firma del Fiscalizador encargado de llevar este control, así como por la del profesional representante del contratista.

OBRA: ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	FECHA			N° HOJA
	DIA	MES	AÑO	
	9	03	2023	1
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.				

ESTADO DEL TIEMPO: Nomenclatura a utilizar: **T**=Trabajando, **P**=Paralizado

HORARIO		DESPEJADO	NUBLADO	LLUVIA DEBIL INTERMITENTE	LLUVIA DEBIL CONTINUA	LLUVIA INTENSA	OBSERVACIÓN
DESDE	HASTA						
6:00	7:00						
7:00	8:00						
8:00	9:00					P	
9:00	10:00					P	
10:00	11:00					P	
11:00	12:00					P	
12:00	13:00						
13:00	14:00					P	
14:00	15:00					P	
15:00	16:00					P	
16:00	17:00					P	
17:00	18:00						

HORAS TRABAJADAS = | HORAS PARALIZADAS = 8 | JUSTIFICADO = 8

CODIGO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES QUE SE SUSPENDEN	TERMINACION CRONOGRAMA
Rubro #8	Hormigón para cunetas ($f'c = 180\ Kg/cm^2$)	

OBSERVACIONES: Por motivo de lluvia intensa se suspenden los trabajos de hormigón en cunetas, debido a que la presencia de lluvia aumenta la proporción de agua en la mezcla de hormigón, lo cual incide en el momento de la mezcla, en el transporte, colocación, compactación y en el acabado. Estos factores aumentan la relación agua-cemento de la mezcla, lo que influye en la reducción de la resistencia mecánica final del hormigón.

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZADOR

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ
CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

REGISTRO DE ESTADO DEL TIEMPO

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 408-25

Si las labores se suspenden a causa de lluvia, se hara constar en el libro de obra o en un registro la fecha en la cual se presentó esa condición, cuales trabajos se suspendieron, a que hora y por cuanto tiempo, en qué medida fueron afectados y se expondrán las razones por las cuales no se pudo continuar. Las anotaciones serán ratificadas por la firma del Fiscalizador encargado de llevar este control, así como por la del profesional representante del contratista.

OBRA: ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	FECHA			N° HOJA
	DIA	MES	AÑO	
	11	03	2023	1
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.				

ESTADO DEL TIEMPO: Nomenclatura a utilizar: **T**=Trabajando, **P**=Paralizado

HORARIO		DESPEJADO	NUBLADO	LLUVIA DEBIL INTERMITENTE	LLUVIA DEBIL CONTINUA	LLUVIA INTENSA	OBSERVACIÓN
DESDE	HASTA						
6:00	7:00						
7:00	8:00						
8:00	9:00					P	
9:00	10:00					P	
10:00	11:00					P	
11:00	12:00					P	
12:00	13:00						
13:00	14:00					P	
14:00	15:00					P	
15:00	16:00					P	
16:00	17:00					P	
17:00	18:00						

HORAS TRABAJADAS = | HORAS PARALIZADAS = 8 | JUSTIFICADO = 8

CODIGO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES QUE SE SUSPENDEN	TERMINACION CRONOGRAMA
Rubro #9	Hormigón para cunetas ($f'c = 180\ kg/cm^2$)	

OBSERVACIONES: Por motivo de lluvia intensa se suspenden los trabajos de hormigón en cunetas, debido a que la presencia de lluvia aumenta la proporción de agua en la mezcla de hormigón, lo cual incide en el momento de la mezcla, en el transporte, colocación, compactación y en el acabado. Estos factores aumentan la relación agua-cemento de la mezcla, lo que influye en la reducción de la resistencia mecánica final del hormigón.

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZADOR

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ
CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

REGISTRO DE ESTADO DEL TIEMPO

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 408-25

Si las labores se suspenden a causa de lluvia, se hara constar en el libro de obra o en un registro la fecha en la cual se presentó esa condición, cuales trabajos se suspendieron, a que hora y por cuanto tiempo, en qué medida fueron afectados y se expondrán las razones por las cuales no se pudo continuar. Las anotaciones serán ratificadas por la firma del Fiscalizador encargado de llevar este control, así como por la del profesional representante del contratista.

OBRA: ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	FECHA			N° HOJA
	DIA	MES	AÑO	
	12	03	2023	1
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.				

ESTADO DEL TIEMPO: Nomenclatura a utilizar: **T**=Trabajando, **P**=Paralizado

HORARIO		DESPEJADO	NUBLADO	LLUVIA DEBIL INTERMITENTE	LLUVIA DEBIL CONTINUA	LLUVIA INTENSA	OBSERVACIÓN
DESDE	HASTA						
6:00	7:00						
7:00	8:00						
8:00	9:00					P	
9:00	10:00					P	
10:00	11:00					P	
11:00	12:00					P	
12:00	13:00						
13:00	14:00					P	
14:00	15:00					P	
15:00	16:00					P	
16:00	17:00					P	
17:00	18:00						

HORAS TRABAJADAS = | HORAS PARALIZADAS = | JUSTIFICADO =

CODIGO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES QUE SE SUSPENDEN	TERMINACION CRONOGRAMA
Rubro #9	Hormigón para cunetas ($f'c = 180\ kg/cm^2$)	

OBSERVACIONES: Por motivo de lluvia intensa se suspenden los trabajos de hormigón en cunetas, debido a que el agua lluvia aumenta la proporción de agua en la mezcla de hormigón, la cual influye no solo en el momento de la mezcla, sino también en el transporte, colocación, compactación y en el acabado. Estos factores aumentan la relación agua-cemento de la mezcla, lo cual incide en la reducción de la resistencia mecánica final del hormigón.

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZADOR

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ
CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

REGISTRO DE ESTADO DEL TIEMPO

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 408-25

Si las labores se suspenden a causa de lluvia, se hara constar en el libro de obra o en un registro la fecha en la cual se presentó esa condición, cuales trabajos se suspendieron, a que hora y por cuanto tiempo, en qué medida fueron afectados y se expondrán las razones por las cuales no se pudo continuar. Las anotaciones serán ratificadas por la firma del Fiscalizador encargado de llevar este control, así como por la del profesional representante del contratista.

OBRA: ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	FECHA			N° HOJA
	DIA	MES	AÑO	
	14	03	2023	1
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.				

ESTADO DEL TIEMPO: Nomenclatura a utilizar: **T**=Trabajando, **P**=Paralizado

HORARIO		DESPEJADO	NUBLADO	LLUVIA DEBIL INTERMITENTE	LLUVIA DEBIL CONTINUA	LLUVIA INTENSA	OBSERVACIÓN
DESDE	HASTA						
6:00	7:00						
7:00	8:00						
8:00	9:00					P	
9:00	10:00					P	
10:00	11:00					P	
11:00	12:00					P	
12:00	13:00						
13:00	14:00					P	
14:00	15:00					P	
15:00	16:00					P	
16:00	17:00					P	
17:00	18:00						

HORAS TRABAJADAS = | HORAS PARALIZADAS = 8 | JUSTIFICADO = 8

CODIGO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES QUE SE SUSPENDEN	TERMINACION CRONOGRAMA
Rubro #9	Hormigón para cunetas ($f'c$ = 180 kg/cm²)	

OBSERVACIONES: Por motivo de lluvia intensa se suspenden los trabajos de hormigón en cunetas, debido a que la presencia de lluvia aumenta la proporción de agua en la mezcla de hormigón, lo cual puede en el momento de la mezcla, en el transporte, colocación, compactación y en el acabado. Estos factores aumentan la relación agua-cemento de la mezcla, lo que influye en la reducción de la resistencia mecánica final del hormigón.

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZADOR

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ
CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

REGISTRO DE ESTADO DEL TIEMPO

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 408-25

Si las labores se suspenden a causa de lluvia, se hara constar en el libro de obra o en un registro la fecha en la cual se presentó esa condición, cuales trabajos se suspendieron, a que hora y por cuanto tiempo, en qué medida fueron afectados y se expondrán las razones por las cuales no se pudo continuar. Las anotaciones serán ratificadas por la firma del Fiscalizador encargado de llevar este control, así como por la del profesional representante del contratista.

OBRA: ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	FECHA			N° HOJA
	DIA	MES	AÑO	
	17	03	2023	1

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

ESTADO DEL TIEMPO: Nomenclatura a utilizar: **T**=Trabajando, **P**=Paralizado

HORARIO		DESPEJADO	NUBLADO	LLUVIA DEBIL INTERMITENTE	LLUVIA DEBIL CONTINUA	LLUVIA INTENSA	OBSERVACIÓN
DESDE	HASTA						
6:00	7:00						
7:00	8:00						
8:00	9:00					P	
9:00	10:00					P	
10:00	11:00					P	
11:00	12:00					P	
12:00	13:00						
13:00	14:00					P	
14:00	15:00					P	
15:00	16:00					P	
16:00	17:00					P	
17:00	18:00						

HORAS TRABAJADAS = | HORAS PARALIZADAS = 8 | JUSTIFICADO = 8

CODIGO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES QUE SE SUSPENDEN	TERMINACION CRONOGRAMA
Rubro #9	Hormigón para cunetas ($f'c = 180 kg/cm^2$)	

OBSERVACIONES: Por motivo de lluvia intensa se suspenden los trabajos de hormigón en cunetas, debido a que la presencia de lluvia aumenta la proporción de agua en la mezcla de hormigón, lo cual hacide en el momento de la mezcla, en el transporte, colocación, compactación y en el acabado.
Estos factores aumentan la relación agua-cemento de la mezcla, lo que influye en la reducción de la resistencia mecánica final del hormigón.

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZADOR

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ
CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

REGISTRO DE ESTADO DEL TIEMPO

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 408-25

Si las labores se suspenden a causa de lluvia, se hara constar en el libro de obra o en un registro la fecha en la cual se presentó esa condición, cuales trabajos se suspendieron, a que hora y por cuanto tiempo, en qué medida fueron afectados y se expondrán las razones por las cuales no se pudo continuar. Las anotaciones serán ratificadas por la firma del Fiscalizador encargado de llevar este control, así como por la del profesional representante del contratista.

OBRA: ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	FECHA			N° HOJA
	DIA	MES	AÑO	
	21	03	2023	1
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.				

ESTADO DEL TIEMPO: Nomenclatura a utilizar: **T**=Trabajando, **P**=Paralizado

HORARIO		DESPEJADO	NUBLADO	LLUVIA DEBIL INTERMITENTE	LLUVIA DEBIL CONTINUA	LLUVIA INTENSA	OBSERVACIÓN
DESDE	HASTA						
6:00	7:00						
7:00	8:00						
8:00	9:00					P	
9:00	10:00					P	
10:00	11:00					P	
11:00	12:00					P	
12:00	13:00						
13:00	14:00					P	
14:00	15:00					P	
15:00	16:00					P	
16:00	17:00					P	
17:00	18:00						

HORAS TRABAJADAS = | HORAS PARALIZADAS = 8 | JUSTIFICADO = 8

CODIGO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES QUE SE SUSPENDEN	TERMINACION CRONOGRAMA
Rubro #9	Hormigón para cunetas ($f'c = 180\ Kg/cm^2$)	

OBSERVACIONES: Por motivo de lluvia intensa se suspenden los trabajos de hormigón en cunetas, debido a que el agua lluvia aumenta la proporción de agua en la mezcla de hormigón, lo cual incide en el momento de la mezcla, en el transporte, colocación, compactación y en el acabado. Estos factores aumentan la relación agua-cemento de la mezcla, lo que influye en la reducción de la resistencia mecánica final del hormigón.

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZADOR

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ
CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

REGISTRO DE ESTADO DEL TIEMPO

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 408-25

Si las labores se suspenden a causa de lluvia, se hara constar en el libro de obra o en un registro la fecha en la cual se presentó esa condición, cuales trabajos se suspendieron, a que hora y por cuanto tiempo, en qué medida fueron afectados y se expondrán las razones por las cuales no se pudo continuar. Las anotaciones serán ratificadas por la firma del Fiscalizador encargado de llevar este control, así como por la del profesional representante del contratista.

OBRA: ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	FECHA			N° HOJA
	DIA	MES	AÑO	
	24	03	2023	1

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

ESTADO DEL TIEMPO: Nomenclatura a utilizar: **T**=Trabajando, **P**=Paralizado

HORARIO		DESPEJADO	NUBLADO	LLUVIA DEBIL INTERMITENTE	LLUVIA DEBIL CONTINUA	LLUVIA INTENSA	OBSERVACIÓN
DESDE	HASTA						
6:00	7:00						
7:00	8:00						
8:00	9:00					P	
9:00	10:00					P	
10:00	11:00					P	
11:00	12:00					P	
12:00	13:00						
13:00	14:00					P	
14:00	15:00					P	
15:00	16:00					P	
16:00	17:00					P	
17:00	18:00						

HORAS TRABAJADAS = | HORAS PARALIZADAS = 8 | JUSTIFICADO = 8

CODIGO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES QUE SE SUSPENDEN	TERMINACION CRONOGRAMA
Rubro #9	Hormigón para cunetas ($f'c = 180$ kg/cm²)	

OBSERVACIONES: Por motivo de lluvia intensa se suspenden los trabajos de hormigón en cunetas, debido a que la presencia de lluvia aumenta la proporción de agua en la mezcla de hormigón, lo cual incide en el momento de la mezcla, en el transporte, colocación, compactación y en el acabado. Estos factores aumentan la relación agua-cemento de la mezcla, lo que influye en la reducción de la resistencia mecánica final del hormigón.

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZADOR

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ
CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

REGISTRO DE ESTADO DEL TIEMPO

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 408-25

Si las labores se suspenden a causa de lluvia, se hara constar en el libro de obra o en un registro la fecha en la cual se presentó esa condición, cuales trabajos se suspendieron, a que hora y por cuanto tiempo, en qué medida fueron afectados y se expondrán las razones por las cuales no se pudo continuar. Las anotaciones serán ratificadas por la firma del Fiscalizador encargado de llevar este control, así como por la del profesional representante del contratista.

OBRA: ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	FECHA			N° HOJA
	DIA	MES	AÑO	
	27	03	2023	1

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

ESTADO DEL TIEMPO: Nomenclatura a utilizar: **T**=Trabajando, **P**=Paralizado

HORARIO		DESPEJADO	NUBLADO	LLUVIA DEBIL INTERMITENTE	LLUVIA DEBIL CONTINUA	LLUVIA INTENSA	OBSERVACIÓN
DESDE	HASTA						
6:00	7:00						
7:00	8:00						
8:00	9:00					P	
9:00	10:00					P	
10:00	11:00					P	
11:00	12:00				P		
12:00	13:00						
13:00	14:00					P	
14:00	15:00					P	
15:00	16:00				P		
16:00	17:00					P	
17:00	18:00						

HORAS TRABAJADAS = | HORAS PARALIZADAS = | JUSTIFICADO =

CODIGO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES QUE SE SUSPENDEN	TERMINACION CRONOGRAMA
Rubro #9	Hormigón para cunetas ($f'c = 180 Kg/cm^2$)	

OBSERVACIONES: Por motivo de lluvia intensa se suspenden los trabajos de hormigón en cunetas, debido a que la presencia de lluvia aumenta la proporción de agua en la mezcla de hormigón, lo cual incide en el momento de la mezclas, en el transporte, colocación, compactación y en el alisado. Estos factores aumentan la relación agua-cemento de la mezcla, lo que influye en la reducción de la resistencia mecánica final del hormigón.

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZADOR

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ
CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

REGISTRO DE ESTADO DEL TIEMPO

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 408-25

Si las labores se suspenden a causa de lluvia, se hara constar en el libro de obra o en un registro la fecha en la cual se presentó esa condición, cuales trabajos se suspendieron, a que hora y por cuanto tiempo, en qué medida fueron afectados y se expondrán las razones por las cuales no se pudo continuar. Las anotaciones serán ratificadas por la firma del Fiscalizador encargado de llevar este control, así como por la del profesional representante del contratista.

OBRA: ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	FECHA			N° HOJA
	DIA	MES	AÑO	
	28	03	2023	1
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.				

ESTADO DEL TIEMPO: Nomenclatura a utilizar: **T**=Trabajando, **P**=Paralizado

HORARIO		DESPEJADO	NUBLADO	LLUVIA DEBIL INTERMITENTE	LLUVIA DEBIL CONTINUA	LLUVIA INTENSA	OBSERVACIÓN
DESDE	HASTA						
6:00	7:00						
7:00	8:00						
8:00	9:00					P	
9:00	10:00					P	
10:00	11:00					P	
11:00	12:00					P	
12:00	13:00						
13:00	14:00					P	
14:00	15:00					P	
15:00	16:00					P	
16:00	17:00				P		
17:00	18:00						

HORAS TRABAJADAS = | HORAS PARALIZADAS = | JUSTIFICADO =

CODIGO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES QUE SE SUSPENDEN	TERMINACION CRONOGRAMA
Rubro #3	Hormigón para cunetas (f'c = 180 kg/cm²)	

OBSERVACIONES: Por motivo de lluvia intensa se suspenden los trabajos de hormigón en cunetas, debido a que la presencia de lluvia aumenta la proporción de agua en la mezcla de hormigón, lo cual incide en el momento de elaborar la mezcla, en el transporte, colocación, compactación y en el acabado. Estos factores aumentan la relación agua-cemento de la mezcla, lo que influye en la reducción de la resistencia mecánica final del hormigón.

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZADOR

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ
CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

REGISTRO DE ESTADO DEL TIEMPO

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 408-25

Si las labores se suspenden a causa de lluvia, se hara constar en el libro de obra o en un registro la fecha en la cual se presentó esa condición, cuales trabajos se suspendieron, a que hora y por cuanto tiempo, en qué medida fueron afectados y se expondrán las razones por las cuales no se pudo continuar. Las anotaciones serán ratificadas por la firma del Fiscalizador encargado de llevar este control, así como por la del profesional representante del contratista.

OBRA: ASFALTO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	FECHA			N° HOJA
	DIA	MES	AÑO	
	31	03	2023	1
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.				

ESTADO DEL TIEMPO: Nomenclatura a utilizar: **T**=Trabajando, **P**=Paralizado

HORARIO		DESPEJADO	NUBLADO	LLUVIA DEBIL INTERMITENTE	LLUVIA DEBIL CONTINUA	LLUVIA INTENSA	OBSERVACIÓN
DESDE	HASTA						
6:00	7:00						
7:00	8:00						
8:00	9:00					P	
9:00	10:00					P	
10:00	11:00					P	
11:00	12:00				P		
12:00	13:00						
13:00	14:00				P		
14:00	15:00					P	
15:00	16:00					P	
16:00	17:00					P	
17:00	18:00						

HORAS TRABAJADAS = | HORAS PARALIZADAS = | JUSTIFICADO =

CODIGO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES QUE SE SUSPENDEN	TERMINACION CRONOGRAMA
Rubro # 9	Hormigón para cunetas ($f'c = 180\ kg/cm^2$)	

OBSERVACIONES: Por motivo de lluvia intensa se suspenden los trabajos de hormigón en cunetas, debido a que la presencia de lluvia aumenta la proporción de agua en la mezcla de hormigón, lo cual incide en el momento de la mezcla, en el transporte, colocación, compactación y en el acabado. Estos factores aumentan la relación agua-cemento de la mezcla, lo que influye en la reducción de la resistencia mecánica final del hormigón.

ING. OMAR HENRY GUAMAN ILER
FISCALIZADOR

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ
CONTRATISTA

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 183

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 2/03/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Se suspenden actividades por motivo de lluvia intensa por un periodo de 8 horas, siendo la primera actividad programada hormigon para cunetas $f'c = 180$ kg/cm².

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	3
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	5
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:	2	OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:	2	OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	8	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	5	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	2
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	1
OPERADOR 1 OPC1:	3	OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELECTRICA:	
FIERRERO:		OTRO:	VIBRADOR:	2
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

Por motivo de lluvia intensa se suspenden los trabajos de hormigón en cunetas, debido a que la presencia de lluvia aumenta la proporción de agua en la mezcla de hormigon, lo cual puede en el momento del mezclado, en el transporte, colocación, compactación y el acabado. Estos factores aumentan la relación agua-cemento de la mezcla, lo que influye en la reducción de la resistencia mecánica final del hormigón.

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:			
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:	x	x	8 Horas

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA	Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR	SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 184

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. **CONTRATO:** COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ **FECHA:** 3/03/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Se suspenden actividades por motivo de lluvia intensa por un periodo de 8 horas, siendo la principal actividad programada hormigón para cunetas f'c= 180 kg/cm²

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	3
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	5
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:	2	OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:	2	OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	8	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	5	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	2
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	1
OPERADOR 1 OPC1:	3	OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	
FIERRERO:		OTRO:	VIBRADOR:	2
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

Por motivo de lluvia intensa se suspenden los trabajos de hormigón en cunetas, debido a que la presencia de lluvia aumenta la proporción de agua en la mezcla del hormigón, lo cual incide en el momento de mezclado, en el transporte, colocación, compactación y el acabado. Estos factores aumentan la relación agua-cemento de la mezcla, lo que conlleva en la reducción de la resistencia mecánica final del hormigón.

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:			
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:	X	X	8 horas

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR

SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 185

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 4/03/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Se suspenden actividades por motivo de lluvia intensa por un periodo de 8 horas, siendo la principal actividad programada hormigón para cunetas $f'c = 180\ kg/cm^2$

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	3
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	5
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:	2	OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:	2	OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	8	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	5	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	2
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	1
OPERADOR 1 OPC1:	3	OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	
FIERRERO:		OTRO:	VIBRADOR:	2
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

Por motivo de lluvia intensa se suspenden los trabajos de hormigón en cunetas, debido a que la presencia de lluvia aumenta la proporción de agua en la mezcla de hormigón, lo cual incide en el asentamiento de la mezcla, en el transporte, colocación, compactación y en el acabado. Estos factores cambian la relación agua-cemento de la mezcla, lo que influye en la reducción de la resistencia mecánica final del hormigón.

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:			
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:	X	X	8 Horas

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR

SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 187

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 6/03/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Se suspenden actividades por motivo de lluvia intensa por un periodo de 8 horas, siendo la principal actividad programada hormigón para cunetas $f'c = 180\ kg/cm^2$

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	3
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	5
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:	2	OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:	2	OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	8	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	5	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	2
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	1
OPERADOR 1 OPC1:	3	OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	
FIERRERO:		OTRO:	VIBRADOR:	2
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

Por motivo de lluvia intensa se suspenden los trabajos de hormigón en cunetas, debido a que la presencia de lluvia aumenta la proporción de agua en la mezcla de hormigón, lo cual incide en el momento del mezclado, transporte, colocación, compactación y el acabado. Estos factores aumentan la relación agua-cemento de la mezcla, lo que influye en la reducción de la resistencia mecánica final del hormigón.

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:			
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:	x	x	8 Horas.

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA	Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR	SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 189

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 8/03/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Se suspenden actividades por motivo de lluvia intensa por un periodo de 8 horas, siendo la principal actividad programada hormigón para cunetas f'c = 180 kg/cm².

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	3
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	5
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:	2	OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:	2	OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	8	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1.	5	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO.	2
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	1
OPERADOR 1 OPC1:	3	OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	
FIERRERO:		OTRO:	VIBRADOR:	2
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

En motivo de lluvia intensa se suspenden los trabajos de hormigón en cunetas, debido a que la presencia de lluvia aumenta la proporción de agua en la mezcla de hormigón, lo cual incide en el momento de la mezcla, transporte, colocación, compactación y el acabado. Estos factores aumentan la relación agua-cemento de la mezcla, lo que influye en la reducción de la resistencia mecánica final del hormigón.

CLIMA:	MAÑANA	TARDE	DURACIÓN:
SOLEADO:			
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:	X	X	8 Horas

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA	Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR	SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 190

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 9/03/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Se suspenden actividades por motivo de lluvia intensa por un periodo de 8 horas, siendo la principal actividad programada hormigón para cunetas f'c = 180 Kg/cm².

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	3
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	5
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:	2	OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:	2	OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	8	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	5	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	2
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	1
OPERADOR 1 OPC1:	3	OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	
FIERRERO:		OTRO:	VIBRADOR:	2
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

Por motivo de lluvia intensa se suspenden los trabajos de hormigón en cunetas, debido a que la presencia de lluvia aumenta la proporción de agua en el mezclado del hormigón, e incide en el transporte, colocación, compactación y en el acabado. Estos factores aumentan la relación agua-cemento de la mezcla, lo que influye en la reducción de la resistencia mecánica final del hormigón.

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:			
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:	X	X	8 Horas

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA	Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR	SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 192

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 11/03/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Se suspenden actividades por motivo de lluvia intensa por un periodo de 8 horas, siendo la principal actividad programada hormigón para cunetas f'c= 180 Kg/cm2

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	3
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	5
TOPOGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:	2	OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:	2	OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	8	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	5	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	2
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	1
OPERADOR 1 OPC1:	3	OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	
FIERRERO:		OTRO:	VIBRADOR:	2
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

Por motivo de lluvia intensa se suspenden los trabajos de hormigón en cunetas, debido a que la presencia de lluvias aumenta la proporción de agua en la mezcla de hormigón, lo cual incide en el momento de la mezcla, en el transporte, colocación, compactación y en el acabado. Estos factores aumentan la relación agua-cemento de la mezcla, lo que influye en la reducción de la resistencia mecánica final del hormigón.

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:			
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:	x	x	8 Horas.

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR

SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 193

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 12/03/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Se suspenden actividades por motivo de lluvia intensa por un periodo de 8 horas, siendo la principal actividad programada Hormigón para cunetas f'c=180 kg/cm²

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	3
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	5
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:	2	OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:	2	OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	8	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	5	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	2
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	1
OPERADOR 1 OPC1:	3	OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	
FIERRERO:		OTRO:	VIBRADOR:	2
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

Por motivo de lluvia intensa se suspenden los trabajos de hormigón en cunetas, debido a que el agua lluvia aumenta la proporción de agua en la mezcla del hormigón, lo cual influye no solo en el incremento de la mezcla, sino también en el transporte, colocación, compactación y en el acabado. Estos factores aumentan la relación agua-cemento de la mezcla, lo cual incide en la reducción de la resistencia mecánica final del hormigón.

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:			
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:	X	X	8 Horas

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA

Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR

SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 195

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 14/03/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Se suspenden actividades por motivo de lluvia intensa por un periodo de 8 horas, siendo la principal actividad programada hormigón para cunetas $f'c = 180\ kg/cm^2$

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	3
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	5
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:	2	OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:	2	OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	8	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	5	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	2
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	1
OPERADOR 1 OPC1:	3	OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	
FIERRERO:		OTRO:	VIBRADOR:	2
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

Por motivo de lluvia intensa se suspenden los trabajos de hormigón en cunetas, debido a que la presencia de lluvia aumenta la proporción de agua en la mezcla de hormigón, lo cual incide en el momento de la mezcla, en el transporte, colocación, compactación y en el curado. Estos factores aumentan la relación agua-cemento de la mezcla, lo que influye en la reducción de la resistencia mecánica final del hormigón.

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:			
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:	X	X	8 Horas

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA

Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR

SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	N° 198

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 17/03/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Se suspenden actividades por motivo de lluvia intensa por un periodo de 8 horas, siendo la principal actividad programada hormigón para cunetas $f'c = 180\ Kg/cm^2$.

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	3
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	5
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:	2	OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:	2	OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	8	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	5	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	2
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	1
OPERADOR 1 OPC1:	3	OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	
FIERRERO:		OTRO:	VIBRADOR:	2
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

Por motivo de lluvia intensa se suspenden los trabajos de hormigón en cunetas, debido a que la presencia de lluvia aumenta la proporción de agua en la mezcla de hormigón, lo cual incide en el momento de la mezcla, en el transporte, colocación, compactación y el acabado. Estos factores aumentan la relación de agua-cemento de la mezcla, lo que influye en la reducción de la resistencia mecánica final del hormigón.

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:			
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:	X	X	8 Horas

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA	Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR	SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 202

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 21/03/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Se suspenden actividades por motivo de lluvia intensa por un periodo de 8 horas, siendo la principal actividad programada hormigón para cunetas f'c = 180 Kg/cm².

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	3
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	5
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:	2	OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:	2	OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	8	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	5	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	2
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	1
OPERADOR 1 OPC1:	3	OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	
FIERRERO:		OTRO:	VIBRADOR:	2
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

Por motivo de lluvia intensa se suspenden los trabajos de hormigón en cunetas, debido a que el agua lluvia aumenta la proporción de agua en la mezcla de hormigón, lo cual incide en el momento de la mezcla, en el transporte, colocación, compactación y en el acabado. Estos factores aumentan la relación agua-cemento de la mezcla, lo que influye en la reducción de la resistencia mecánica final del hormigón.

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:			
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:	X	X	8 Horas

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA	Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR	SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	N° 205

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 24/03/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Se suspenden actividades por motivo de lluvia intensa, por un periodo de 8 horas, siendo la principal actividad programada hormigón para cunetas f'c = 180 kg/cm².

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	3
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	5
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:	2	OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:	2	OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	8	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	5	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	2
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	1
OPERADOR 1 OPC1:	3	OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	
FIERRERO:		OTRO:	VIBRADOR:	2
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

Por motivo de lluvia intensa se suspenden los trabajos de hormigón en cunetas, debido a que la presencia de lluvia aumenta la proporción de agua en la mezcla de hormigón, la cual incide en el momento de la mezcla, en el transporte, colocación, compactación y elevado. Estos factores cambian la relación agua-cemento de la mezcla, lo que influye en la reducción de la resistencia mecánica final del hormigón.

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:			
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:	x	x	8 Horas

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA

Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR

SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 208

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 27/03/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Se suspenden actividades por motivo de lluvia intensa por un periodo de 8 horas, siendo la principal actividad programada hormigón para cunetas f'c= 180 kg/cm²

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	3
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	5
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:	2	OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:	2	OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	8	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	5	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	2
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	1
OPERADOR 1 OPC1:	3	OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	
FIERRERO:		OTRO:	VIBRADOR:	2
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

Por motivo de lluvia intensa se suspenden los trabajos de hormigón en cunetas, debido a que la presencia de lluvia aumenta la proporción de agua en la mezcla de hormigón, la cual influye en el momento de la mezcla, en el transporte, colocación, compactación y el acabado. Estos factores aumentan la relación agua-cemento de la mezcla, lo que influye en la reducción de la resistencia mecánica final del hormigón.

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:			
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:	X	X	8 Horas.

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA	Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR	SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 209

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 29/03/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Se suspenden actividades por motivo de lluvia intensa por un periodo de 8 horas, siendo la principal actividad programada hormigón para cunetas f'c= 180 Kg/cm².

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	3
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	5
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:	2	OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:	2	OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	8	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	5	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	2
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	1
OPERADOR 1 OPC1:	3	OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	
FIERRERO:		OTRO:	VIBRADOR:	2
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

Por motivo de lluvia intensa se suspenden los trabajos de hormigón en cunetas, debido a que la presencia de lluvia aumenta la proporción de agua en la mezcla de hormigón, lo cual incide en el momento de elaborar la mezcla, en el transporte, colocación, compactación y el acabado. Estos factores aumentan la relación agua-cemento de la mezcla, lo que influye en la reducción de la resistencia mecánica final del hormigón.

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:			
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:	x	x	8 Horas

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATISTA	Omar Henry Guamán Iler FISCALIZADOR	SUPERVISOR

LIBRO DE OBRA

PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Nº 212

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. CONTRATO: COTO-GADPPz-005-2022

FISCALIZADOR: ING. OMAR HENRY GUAMÁN ILER

ADMINISTRADOR: ING. GUSTAVO NAVAS MANJARREZ FECHA: 31/03/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

Se suspenden actividades por motivo de lluvia intensa por un periodo de 8 horas, siendo la principal actividad programada hormigón para cunetas f'c = 180 kg/cm²

PERSONAL:			EQUIPOS:	
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	EXCAVADORA ORUGAS:	3
RESIDENTE DE OBRA:	1	OTRO:	MOTONIVELADORA:	
TÉCNICO AMBIENTAL:	1	OTRO:	CAMIÓN CISTERNA:	
TÉCNICO SSO:	1	OTRO:	VOLQUETA 10 M3	5
TOPÓGRAFO:	1	OTRO:	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO:	
MAESTRO MAYOR:	2	OTRO:	PLANTA DE ASFALTO:	
ALBAÑIL:	2	OTRO:	TERMINADORA DE ASFALTO:	
PEÓN:	8	OTRO:	ESCOBA MECÁNICA:	
SOLDADOR:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO LISO:	
CADENERO:		OTRO:	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO:	
CHOFER CHC1:	5	OTRO:	CONCRETERA 1 SACO:	2
AYUDANTE MAQ.:		OTRO:	APARATOS DE TOPOGRAFÍA:	1
OPERADOR 1 OPC1:	3	OTRO:	CAMIONETA 1 TON.:	
OPERADOR 2 OPC2:		OTRO:	SOLDADORA ELÉCTRICA:	
FIERRERO:		OTRO:	VIBRADOR:	2
PINTOR:		OTRO:	MOTOSIERRA:	
AYUDANTE:		OTRO:	HERRAMIENTA MENOR:	2
			OTROS:	

INSTRUCCIONES DE FISCALIZACIÓN:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

F. CONFORME

OBSERVACIONES:

Por motivo de lluvia intensa se suspenden los trabajos de hormigón en cunetas, debido a que la presencia de lluvia aumenta la proporción de agua en la mezcla de hormigón, lo cual puede ocurrir en el momento de la mezcla, en el transporte, en la colocación, compactación y el acabado. Estos factores aumentan la relación agua/cemento de la mezcla, lo que influye en la reducción de la resistencia mecánica final del hormigón.

CLIMA:	MAÑANA	TARDE:	DURACIÓN:
SOLEADO:			
DESPEJADO:			
NUBLADO:			
LLUVIA DÉBIL:			
LLUVIA FUERTE:	x	x	8 Horas

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR

SUPERVISOR

CONSTRUCTORA

EDDYMICH CIA. LTDA.

Puyo, 5 de abril de 2023

Oficio No. 019-EDDYMICH-2023

INGENIERO
Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO - *"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"*

ASUNTO: ENTREGA DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 07 - PERIODO MARZO DE 2023

Presente.-

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus funciones cotidianas.

Procedo a realizar la entrega de la documentación correspondiente a la **PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 07** correspondiente al periodo de marzo de 2023 para su respectiva revisión y aprobación.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: Ángel Misael López Chávez
CONTRATISTA

ANEXO:

- ANEXO DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 07

Recibido:
Omar Guamán
5/04/2023

Mail: edypollito@hotmail.es Tel.03-2884546 Cel. 0984787283
Puyo-Pastaza-Ecuador Direc.: Obrero, Calle Ambato S/N y Machala

CONSTRUCTORA

EDDYMICH CIA. LTDA.

Puyo, 14 de abril de 2023

Oficio No. 020-EDDYMICH-2023

INGENIERO
Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO - *"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"*

ASUNTO: ENTREGA DE CORRECCIONES DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 07 - PERIODO MARZO DE 2023

Presente.-

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus funciones cotidianas.

En respuesta al OFICIO N. 032-2023-FISC-EXT de fecha 14 de abril de 2023, procedo a realizar la entrega de las correcciones solicitadas de la **PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 07** correspondiente al periodo de marzo de 2023 para su respectiva revisión y aprobación.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: Ángel Misael López Chávez
CONTRATISTA

Recibido:
Omar Guamán
14/04/2024

ANEXO:

- ANEXO DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 07 (5 folders)

Mail: edypollito@hotmail.es Tel.03-2884546 Cel. 0984787283
Puyo-Pastaza-Ecuador Direc.: Obrero, Calle Ambato S/N y Machala

CONSTRUCTORA

EDDYMICH CIA. LTDA.

Puyo, 17 de abril de 2023

Oficio No. 021-EDDYMICH-2023

INGENIERO
Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO - *"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"*

ASUNTO: REPROGRAMACIÓN 04 DE CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

Presente.-

En respuesta al OFICIO N. 031-2023-FISC-EXT de fecha 14 de abril de 2023, donde solicita que en función de los días de prorroga se deberá realizar la REPROGRAMACIÓN AL CRONOGRAMA DE TRABAJOS vigente, por tal motivo se realice la reprogramación No. 4 en base a la ampliación No. 2 aprobada. Por lo antes expuesto procedo a realizar la entrega de la ***REPROGRAMACIÓN 04*** de los siguientes cronogramas para su respectiva revisión y aprobación:

- REPROGRAMACIÓN 04-CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS.
- REPROGRAMACIÓN 04-CRONOGRAMA DE EQUIPOS.
- REPROGRAMACIÓN 04-CRONOGRAMA DE PERSONAL (MANO DE OBRA).
- REPROGRAMACIÓN 04-CRONOGRAMA DE MATERIALES.
- REPROGRAMACIÓN 04-CRONOGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO.
- REPROGRAMACIÓN 04-CUADRO DE INCIDENCIA DE COMPONENTES Y GRAFICO DE PORCENTAJES DE INCIDENCIA DE COMPONENTES.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: Ángel Misael López Chávez
CONTRATISTA

Recibido:
Omar Guamán
17/04/2023

ANEXO:

- OFICIO N. 031-2023-FISC-EXT
- REPROGRAMACIÓN 02-CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS, REPROGRAMACIÓN 02-CRONOGRAMA DE EQUIPOS, REPROGRAMACIÓN 02-CRONOGRAMA DE PERSONAL (MANO DE OBRA), REPROGRAMACIÓN 02-CRONOGRAMA DE MATERIALES, REPROGRAMACIÓN 02-CRONOGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO, REPROGRAMACIÓN 02-CUADRO DE INCIDENCIA DE COMPONENTES Y GRAFICO DE PORCENTAJES DE INCIDENCIA DE COMPONENTES.

Mail: edypollito@hotmail.es Tel.03-2884546 Cel. 0984787283
Puyo-Pastaza-Ecuador Direc.: Obrero, Calle Ambato S/N y Machala

OGI Omar H. Guamán I.
Ingeniero Civil

OFICIO N. 031-2023-FISC-EXT
Pastaza, 14 de abril de 2023

Señor
Angel Misael Lopez Chavez
Representante legal - CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA.LTDA
CONTRATISTA

ASUNTO: Orden de ampliación de plazo N°2 y solicitud de Reprogramación No.4.

En referencia al OFICIO No. 18-EDDYMICH-2023 de fecha 08 de abril del 2023 donde usted, en calidad de Representante Legal de la CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA en calidad de contratista, solicita una ampliación de plazo de 10 días para el proyecto denominado "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.", me permito notificarle que su documentación ha sido analizada y su solicitud ha sido aprobada. Para lo cual emito la ORDEN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°2 aprobada por Fiscalización Externa, Administrador de contrato y el Delegado de la Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial De Pastaza.

DETALLE	DÍAS	OBSERVACION
PLAZO CONTRACTUAL	180 DÍAS	
AMPLIACIÓN DE PLAZO No.1	40 DÍAS	APROBADA
AMPLIACIÓN DE PLAZO No.2	10 DÍAS	APROBADA
TOTAL DÍAS APROBADOS	230 DÍAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	18-04-2023	

El contratista en función de los días de prorroga deberá realizar la REPROGRAMACIÓN AL CRONOGRAMA DE TRABAJOS vigente, por tal motivo solicito se realice la reprogramación No.4 en base a la ampliación N°2 aprobada.

Particular comunico para fines pertinentes.

ATENTAMENTE,

Firmado electrónicamente por:
OMAR HENRY GUAMAN ILER

Recibido:
14/04/2023
Omar Guamán

Ing. Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO

@ingenieroCivilOGI
ohgi@hotmail.es
ohgiomar@gmail.com
0987571382 / 0979894628
Calle Bolivar 1-38 y Av. Marco Aurelio Subia
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

INFORME Y ORDEN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO
- PROYECTOS -

ORDEN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°	Orden No. 2			FECHA:	06 de abril de 2023
NOMBRE DEL PROYECTO	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"				
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.		SOLICITUD Y FECHA		OFICIO N. 027-2023-FISC-EXT, de fecha 03 de abril de 2023
FECHA DE INICIO	01 de septiembre de 2022		FECHA TÉRMINO		08 de abril de 2023
PLAZO DEL CONTRATO	180 días		MONTO CONTRATADO		$ 789,464.39 USD
MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN	ITEM	DESCRIPCIÓN	DÍAS	JUSTIFICACIÓN	
	01	INCIDENCIA DE LA LLUVIA	10 días	MOTIVOS DE LLIVIAS	

CRITERIO APROBACIÓN AMPLICACIÓN	ANÁLISIS TÉCNICO	ITEM	SI	NO
	Del análisis técnico de los ítems en mención, la Unidad de Fiscalización considera procedente aprobar la ampliación de plazo solicitada.	01	X	
		02	X	
		03		
		04		
		05		

DETALLE DE LA AMPLIACIÓN	DETALLE	DÍAS	AMPLIACIONES ANTERIORES		DÍAS
	Plazo Inicial Contractual	180	Ampliación de Plazo N° 01		40
	Ampliación de Plazo Solicitada N° 01 (aprobada, nueva terminación 08-04-2023)	40	Ampliación de Plazo N° 02		10
	Ampliación de Plazo N° 0 2 Aprobada	10	Ampliación de Plazo N° ...		
	Nueva Fecha Término de Obra	18-04-2023	Ampliación de Plazo N° ...		
			TOTAL DE DÍAS:		50

SE LEGALIZA AMPLIACIÓN DE PLAZO SEGÚN CONTRATO N°	Clausula Novena: Prorrogas de plazo	
ADJUNTO: INFORME FISCALIZACIÓN N°	OFICIO N. 027-2023-FISC-EXT	FECHA: 04 de abril de 2023
ADJUNTO: INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO N°	Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-6740-M	FECHA: 06 de abril de 2023

NOTA: De conformidad con el artículo 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los fiscalizadores y Administradores de los contratos, certifican con su firma que, verificaron y garantizan por ser de su única responsabilidad, el cumplimiento de veracidad y legalidad de las motivaciones, valores autorizados, de los documentos justificativos y comprobatorios, y de las modificaciones contractuales autorizadas, garantizando que las mismas, no afectan la calidad, cantidad, avance físico y financiero, la ejecución del contrato y proyectos programados.

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILER	Firmado electrónicamente por: EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ
Ing. Omar Henry Guamán Iler REVISADO Y REQUERIDO POR: **FISCALIZADOR**	*Ing. Edwin Gustavo Navas Manjarrez* APROBADO POR: **ADMINISTRADOR**

Firmado electrónicamente por: ALVARO RENATO SOSA CASTRO

AUTORIZADO POR:
PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA Ó DELEGADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
UBICACION: PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

REPROGRAMACIÓN 04 - CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PERIODOS (MESES/SEMANAS) 1 MES 1	2	3	4	2 MES 5	6	7	8	3 MES 9	10	11	12	4 MES 13	14	15	16	5 MES 17	18	19	20	6 MES 21	22	23	24	7 MES 25	26	27	28	8 MES 29	30	31	32
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7.00	476.17	3,333.19000	95.23																															
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3.50	405.49	1,419.21500	1,419.22																															
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M³	9,419.69	0.72	6,782.17680	6,553.60				11,304.45				2,945.28								2,728.21				1,686.82											
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189.90	11.34	2,153.46600	81.65																															
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M³	1,706.60	3.70	6,314.42000					643.06												1,577.68				2,214.08				1,269.84						
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M³	368.64	3.94	1,452.44160					1,122.90												785.48				212.01											
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M³	1,412.95	1.35	1,907.48250																	1,885.14															
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80.00	243.32	19,465.60000																	5,450.37															
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314.88	189.47	59,660.31360																	41,327.20				68,542.67				41,232.46						
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M³	91.84	177.81	16,330.07040																	2,574.69				10,183.18											
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770.00	60.24	46,384.80000					4,698.72																											
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M³	17,988.24	2.38	42,812.01120	16,782.55				8,349.23				9,863.89								6,759.99				10,134.23											
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³	4,611.60	10.16	46,853.85600	18,419.17				10,969.96				9,247.63												7,083.55											
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³	2,880.87	12.94	37,278.45780													26,560.00				6,449.30				6,001.57											
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1,412.95	0.81	1,144.48950	1,120.13												24,189.43																			
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863,435.52	0.22	189,955.81440	58,950.44				29,327.55				34,647.92								23,745.14				35,597.55											
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204,755.04	0.22	45,046.10880	13,959.41				8,313.84				7,008.54												5,368.44											
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127,910.63	0.22	28,140.33860													15,804.64				3,837.68				3,571.26											
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32,340.00	0.66	21,344.40000													11,039.44				2,661.12				2,882.88											
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23,100.00	8.05	185,955.00000													96,176.89				23,184.00				25,116.00											
	SEÑALIZACION																																				
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9,800.00	0.22	2,156.00000																													2,015.33			
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDERECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875.00	5.36	4,690.00000																													4,904.40			
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1.00	332.16	332.16000																									332.16							
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6.00	283.40	1,700.40000																													850.20			
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6.00	283.40	1,700.40000																													850.20			
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10.00	117.23	1,172.30000																													117.23			
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100.00	117.23	11,723.00000																													4,806.43			
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2.00	66.74	133.48000					133.48																											
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2.00	145.37	290.74000	290.74																															
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500.00	0.28	140.00000	24.75																															
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10.00	20.40	204.00000	204.00																															
	MEDIDAS AMBIENTALES																																				
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2.00	15.93	31.86000	31.86																															
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2.00	143.00	286.00000	286.00																															
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110.00	110.00000	110.00																															

35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110.00	110.00000		110.00						
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110.00	110.00000					110.00			
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20.00	42.02	840.40000					630.30			
INVERSION MENSUAL					789,464.39220	118,328.75	74,973.19	63,713.26	173,770.40	123,706.30	178,594.24	42,834.46	13,543.79
AVANCE MENSUAL (%)						14.99	9.50	8.07	22.01	15.67	22.62	5.43	1.72
INVERSION ACUMULADA AL 100% (linea e=1p)						118,328.75	193,301.94	257,015.20	430,785.60	554,491.90	733,086.14	775,920.60	789,464.39
AVANCE ACUMULADO (%)						14.99	24.49	32.56	54.57	70.24	92.86	98.28	100.00
INVERSION ACUMULADA AL 80% (linea e=0.5p)						94,663.00000	154,641.55	205,612.16	344,628.48	443,593.52	586,468.91	620,736.48	631,571.51
AVANCE ACUMULADO (%)						11.99	19.59	26.04	43.65	56.19	74.29	78.63	80.00

PLAZO CONTRACTUAL: 180 DIAS
PLAZO-AMPLIACION 01: 40 DIAS
PLAZO-AMPLIACION 02: 10 DIAS
PLAZO TOTAL: 230 DIAS

PUYO, 17 DE ABRIL DE 2023

Firmado electrónicamente por:
ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por:
OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Guaman Iler Omar Henry
FISCALIZADOR

Firmado electrónicamente por:
EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Gustavo Navas
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO [redacted] PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA A[redacted]SA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

REPROGRAMACIÓN 04 - CRONOGRAMA DE EQUIPO

CRONOGRAMA DE EQUIPO

PERIODOS

DESCRIPCION	1 MES 1 2 3 4	2 MES 5 6 7 8	3 MES 9 10 11 12	4 MES 13 14 15 16	5 MES 17 18 19 20	6 MES 21 22 23 24	7 MES 25 26 27 28	8 MES 29 30 31 32
BODCAT		434.33			1,066.20	2,552.65		213.33
CAMION CISTERNA	507.57	302.40	254.75	574.70	139.54	318.83		
CAMIONETA 1 TON	3.00							
CARGADORA FRONTAL				2,389.46	576.11	1,654.42		
CONCRETERA 1 SACO					1,006.66	234.85	601.85	
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO				919.94	221.80	636.95		
EQUIPO TOPOGRAFICO	392.00							
ESCOBA MECANICA				418.16	100.82	289.52		
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	7,648.69	1,795.59	1,788.76		2,377.95	2,301.91		
MOTONIVELADORA	3,722.99	1,926.86	2,122.85	862.05	1,402.28	664.86		
MOTOSIERRA 7 HP	4.50						153.00	
PLT. DE ASFALTO COMPLETA				9,557.86	2,304.46	6,617.69		
RODILLO VIBRATORIO LISO	3,102.50	1,605.72	1,769.04	2,211.79	1,528.64	1,588.06		
RODILLO VIBRATORIO NEUMATICO				1,493.42	360.07	1,034.01		
SOLDADORA ELECTRICA	12.00	12.00				1.50	768.00	
TERMINADORA DE ASFALTO				3,882.88	936.19	2,688.44		
TRACTOR DE CARRIL	3,948.85	1,964.35	2,320.96		1,590.62	248.82		
VIBRADOR					79.65	101.02	324.43	
VOLQUETE	51,453.00	26,180.19	28,967.51	11,007.11	19,657.41	21,433.12	27,053.69	
HERRAMIENTA MENOR	188.64	131.00	19.14	280.30	757.35	161.37	566.04	1,268.57
PARCIAL	70,983.76	34,352.44	37,243.01	33,597.67	34,105.74	42,528.02	29,467.00	1,481.89
ACUMULADO	70,983.76	105,336.20	142,579.21	176,176.88	210,282.62	252,810.64	282,277.65	283,759.54

PLAZO TOTAL: 230 DIAS
PUYO, 17 DE ABRIL DE 2023

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Guaman Iler Omar Henry
FISCALIZADOR

Firmado electrónicamente por: EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Gustavo Navas
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

REPROGRAMACIÓN 04 - CRONOGRAMA DE MATERIALES

CRONOGRAMA DE MATERIALES

DESCRIPCION	PERIODOS																											
	1 MES				2 MES				3 MES				4 MES				5 MES				6 MES				7 MES				8 MES			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
ACEITE QUEMADO -- (GLN)																	70.67				10.20				21.15							
ADHESIVO CON LEYENDA - FOCO REFLECTIVO ALTO -- (M²)																													3,132.60			
AGREGADOS TRITURADOS -- (M3)													6,571.03				1,584.31				2,274.83				2,274.83							
AGUA -- (M3)																	0.46				0.09				0.12				0.10			
ALAMBRE DE AMARRE GALVANIZADO -- (KG)																	1.91				2.42				2.42				5.36			
ALAMBRE Nº12 -- (KG)						102.96																							913.44			
ALFAGÍA -- (U)																	1,832.18				264.50				396.75				151.56			
ANGULO 30 X 3MM -- (M)																									280.00				336.00			
ARENA -- (M3)													4,539.98				1,094.62				3,143.40											
ASFALTO AP-3 -- (KG)													30,555.27				7,367.06				21,155.92											
ASFALTO DILUIDO RC-250 -- (KG)													5,703.65				1,375.18				3,949.11											
BASE GRANULAR -- (M3)													21,183.01				5,143.38				3,404.15											
BOTAS DE CAUCHO -- (PAR)																	180.00				60.00											
CAPACITACIÓN AMBIENTAL (INCLUYE MATERIALES Y TRANSPORTE)	100.00				100.00												100.00															
CASCOS DE SEGURIDAD -- (U)																	120.00				40.00											
CEMENTO PORTLAND -- (SACO)																	10,718.23				2,297.37				3,022.85				2,703.21			
CHALECO REFLECTIVO -- (U)																	120.00				40.00											
CINTA DE POLIETILENO DEMARCATORIA (LEYENDA "PELIGRO"), 55 MI	21.22																				38.78				60.00							
CLAVOS -- (KG)																	353.41				73.16				97.24				82.85			
CONO CON PROTECCION UV 71CM INCLY CINTA REFLECTIVA -- (U)	185.00																															
CONTENEDOR DE 55 GALONES METÁLICO PARA DESECHOS PELIGRO	24.00																															
DIESEL -- (LT)													2,263.06				545.64				1,566.90											

DIESEL GENERADOR PLANTA -- (GL)				10,555.46	2,544.98	7,308.41		
ELECTRODOS -- (KG)	2.60	2.70					16.90	137.10
ESTACAS DE MADERA -- (U)	77.00							
HIERRO ESTRUCTURAL -- (KG)						4.79		
HORMIGÓN CICLOPEO 180 KG/CM2 -- (M3)						71.28	346.50	582.12
KIT ANTIDERRAMES -- (U)	260.00							
LAM.E TOOL GALV. (0.60 X 0.80) 1.1MM -- (U)		8.82						
LAM.E TOOL GALV. (1.1 X 0.60) 1.1 MM -- (U)	17.72							
LAM.E TOOL GALV. (2.44 X 1.22) 1.1MM -- (U)							2,019.77	
MADERA, PUNTALES -- (ML)					76.04	96.43	309.69	
MADERA, TABLA ENCOFRADO/ 20CM -- (U)					173.80	220.42	707.87	
MADERA,LISTONES PARA MUROS 6*6 -- (ML)					115.87	146.94	471.91	
MADERA,TABLA ENCOFRADA /20CM -- (U)					3,926.11	566.78	1,174.95	
MALLA NO12(2*1*1)TRIPLETORSION -- (U)		16,362.50						
MASCARILLA PARA GASES -- (U)					33.00		11.00	
MASCARILLAS ATRAPAPOLVO -- (U)					30.00		10.00	
MATERIAL DE RELLENO -- (M3)		513.00			150.56			
MATERIAL SUBBASE CLASE 3 -- (M3)	14,140.00	8,424.29	7,096.98		3,597.05	2,712.17		
PARES DE GUANTES -- (PAR)					45.00	15.00		
PEGAMENTO EPOXICO PARA TACHAS (KIT DOS COMPONENTES) -- (								472.50
PERFIL ESTRUCURAL ACERO LAMINADO AL FRIO A36 -- (KG)		3.60						
PERFILES Y CANALES DE ACERO -- (KG)						79.80		
PERNOS INOXIDABLES -- (U)	8.00	2.00					50.00	84.00
PETREOS, PIEDRA BOLA SELECCIO. -- (M3)		663.01						5,881.99
PETREOS, RIPIO TRITURADO -- (M3)					4,361.53	873.80	1,172.94	952.13
PETREOS,ARENA NEGRA -- (M3)					3,336.36	701.39	928.10	808.19
PINGO -- (M)					348.99	50.38	75.57	28.87
PINTURA ANTICORROSIVA -- (GLN)		2.75				3.05		
PINTURA ESMALTE -- (LT)	3.15							
PLANCHA DE TOL 1.22*2.44*1.1MM -- (U)						27.32		

SUELDA 60/11 -- (KG)						0.36		
TACHAS (CERAMICOS REFLECTIVOS) BIDIRECCIONALES Y UNIDIRECC								1,706.25
TAPONES AUDITIVOS -- (U)					45.00		15.00	
TIÑER -- (GLN)		0.39						
TRANSPORTE MEZCLA ASFALTICA -- (M3*KM)				10,752.59	2,592.51		7,444.90	
TUB. ACERO CORRUGADO D=1200MM -- (ML)					4,482.91		1,921.25	9,606.24
TUB. CUADRADO GALVANIZADO 1"*1"*1.5M -- (M)								221.36
TUBO CUAD. GALVAN. 2"*2"*2MM -- (M)	69.76	26.16					654.00	1,098.72
PARCIAL	14,908.44	26,212.18	7,096.98	92,124.04	56,466.78	51,199.16	23,485.72	28,904.59
ACUMULADO	14,908.44	41,120.62	48,217.59	140,341.64	196,808.42	248,007.58	271,493.29	300,397.87

PLAZO TOTAL: 230 DIAS
PUYO, 17 DE ABRIL DE 2023

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Guaman Iler Omar Henry
FISCALIZADOR

Firmado electrónicamente por: EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Gustavo Navas
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

REPROGRAMACIÓN 04 - CRONOGRAMA MANO DE OBRA

CRONOGRAMA DE PERSONAL (MANO DE OBRA)

DESCRIPCION	PERIODOS							
	1 MES (1 2 3 4)	2 MES (5 6 7 8)	3 MES (9 10 11 12)	4 MES (13 14 15 16)	5 MES (17 18 19 20)	6 MES (21 22 23 24)	7 MES (25 26 27 28)	8 MES (29 30 31 32)
CHOFER -- (CH C1)	17,153.52	8,739.84	9,647.91	3,894.31	6,560.38	7,133.15	8,553.15	497.54
INSPECTOR DE OBRA -- (EO B3)	0.76					1.39	2.15	
MAESTRO MAYOR -- (EO C1)	141.45	1,033.19	54.64	123.28	936.42	237.85	962.63	9,408.18
TOPÓGRAFO 2 -- (EO C1)	210.21							
PERFILERO -- (EO C2)						8.18		
ALBAÑIL/CARPINTERO -- (EO D2)	15.48	15.48			3,054.94	648.89	1,243.05	2,362.22
AYUDANTE DE MAQUINARIA -- (EO D2)	1,877.65	748.91	740.44	1,286.76	1,102.10	274.31	1,206.15	180.18
CADENEROS -- (EO D2)	568.89							
FIERRERO/PINTOR/PLOMERO -- (EO D2)						7.74		
PINTOR -- (EO D2)	15.48						387.00	603.72
PEON -- (EO E2)	192.48	1,034.43	48.78	3,111.79	9,879.86	1,813.15	6,600.18	12,664.74
OPERADOR 1 -- (OP C1)	2,049.64	817.51	808.27	635.82	1,017.70	299.44	784.32	196.69
OPERADOR 2 -- (OP C2)	507.57	262.70	289.42	918.90	384.39	60.09	585.41	
PARCIAL	22,733.12	12,652.06	11,589.47	9,970.85	22,935.80	10,484.19	20,324.04	25,913.27
ACUMULADO	22,733.12	35,385.18	46,974.65	56,945.50	79,881.30	90,365.49	110,689.53	136,602.80

PLAZO TOTAL: 230 DIAS
PUYO, 17 DE ABRIL DE 2023

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Guaman Iler Omar Henry
FISCALIZADOR

Firmado electrónicamente por: EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Gustavo Navas
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

REPROGRAMACIÓN 04 - PERSONAL TECNICO

CRONOGRAMA DE PERSONAL TECNICO

PERIODOS

DESCRIPCION	SEPT. 2022				OCT. 2022				NOV. 2022				DIC. 2022				ENERO. 2023				FEBRERO. 2023				MARZO. 2023				ABRIL. 2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
SUPERINTENDENTE DE OBRA																																
RESIDENTE DE OBRA																																
TECNICO AMBIENTAL																																
TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL																																
TOPOGRAFO																																

PLAZO TOTAL: 230 DIAS
PUYO, 17 DE ABRIL DE 2023

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Guaman Iler Omar Henry
FISCALIZADOR

Firmado electrónicamente por: EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Gustavo Navas
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA "
UBICACION: PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

CUADRO DE INCIDENCIA DE COMPONENTES

COMPONENTE	COSTO	PORCENTAJE
EQUIPOS	283,759.54	36
MANO DE OBRA	136,602.80	17
MATERIALES	300,397.87	38
TRANSPORTE	0.00	0
COSTOS INDIRECTOS	35,874.62	5
UTILIDAD	35,874.62	5
TOTAL :	789,464.39	100

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 17 DE ABRIL DE 2023
PLAZO TOTAL : 230 DIAS

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILER


Ing. Guaman Iler Omar Henry
FISCALIZADOR

Firmado electrónicamente por: EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Gustavo Navas
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"
UBICACION: PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

GRAFICO DE PORCENTAJES DE INCIDENCIA DE COMPONENTES

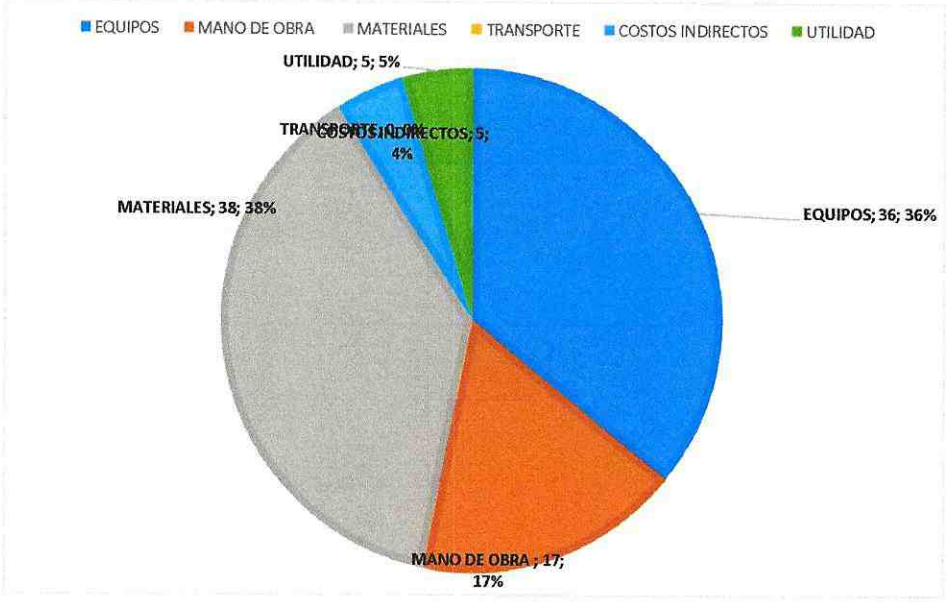

PUYO, 17 DE ABRIL DE 2023
PLAZO TOTAL : 230 DIAS

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Guaman Iler Omar Henry
FISCALIZADOR

Firmado electrónicamente por: EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Gustavo Navas
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

CONSTRUCTORA

EDDYMICH CIA. LTDA.

Puyo, 21 de abril de 2023

Oficio No. 022-EDDYMICH-2023

INGENIERO
Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO - *"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"*

ASUNTO: REPROGRAMACIÓN 05 DE CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

Presente.-

En respuesta al OFICIO N. 035-2023-FISC-EXT de fecha 21 de abril de 2023, donde solicita que en función de los días de prorroga se deberá realizar la REPROGRAMACIÓN AL CRONOGRAMA DE TRABAJOS vigente, por tal motivo se realice la reprogramación No. 5 en base a la ampliación No. 3 aprobada. Por lo antes expuesto procedo a realizar la entrega de la ***REPROGRAMACIÓN 05*** de los siguientes cronogramas para su respectiva revisión y aprobación:

- REPROGRAMACIÓN 05-CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS.
- REPROGRAMACIÓN 05-CRONOGRAMA DE EQUIPOS.
- REPROGRAMACIÓN 05-CRONOGRAMA DE PERSONAL (MANO DE OBRA).
- REPROGRAMACIÓN 05-CRONOGRAMA DE MATERIALES.
- REPROGRAMACIÓN 05-CRONOGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO.
- REPROGRAMACIÓN 05-CUADRO DE INCIDENCIA DE COMPONENTES Y GRAFICO DE PORCENTAJES DE INCIDENCIA DE COMPONENTES.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: Ángel Misael López Chávez
CONTRATISTA

Recibido:
Omar Guamán
21/04/2023

ANEXO:

- OFICIO N. 035-2023-FISC-EXT
- REPROGRAMACIÓN 05-CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS, REPROGRAMACIÓN 05-CRONOGRAMA DE EQUIPOS, REPROGRAMACIÓN 05-CRONOGRAMA DE PERSONAL (MANO DE OBRA), REPROGRAMACIÓN 05-CRONOGRAMA DE MATERIALES, REPROGRAMACIÓN 05-CRONOGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO, REPROGRAMACIÓN 05-CUADRO DE INCIDENCIA DE COMPONENTES Y GRAFICO DE PORCENTAJES DE INCIDENCIA DE COMPONENTES.

Mail: edypollito@hotmail.es Tel.03-2884546 Cel. 0984787283
Puyo-Pastaza-Ecuador Direc.: Obrero, Calle Ambato S/N y Machala

OGI Omar H. Guamán I.
Ingeniero Civil

OFICIO N. 035-2023-FISC-EXT
Pastaza, 21 de abril de 2023

Señor
Angel Misael Lopez Chavez
Representante legal - CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA.LTDA
CONTRATISTA

ASUNTO: Orden de ampliación de plazo N°2 y solicitud de Reprogramación No.4.

En referencia al Oficio No. 18-EDDYMICH-2023 de fecha 05 de abril del 2023 donde usted, en calidad de Representante Legal de la CONSTRUCTORA . EDDYMICH CIA. LTDA en calidad de contratista, solicita una tercera ampliación de plazo de 15 días para el proyecto denominado "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.", me permito notificarle que su documentación ha sido analizada y su solicitud ha sido aprobada. Para lo cual emito la ORDEN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°3 aprobada por Fiscalización Externa, Administrador de contrato y el Delegado de la Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial De Pastaza.

DETALLE	DÍAS	OBSERVACION
PLAZO CONTRACTUAL	180 DÍAS	
AMPLIACIÓN DE PLAZO No.1	40 DÍAS	APROBADA
AMPLIACIÓN DE PLAZO No.2	10 DÍAS	APROBADA
AMPLIACIÓN DE PLAZO No.3	15 DÍAS	APROBADA
TOTAL DÍAS APROBADOS	245 DÍAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	03-05-2023	

El contratista en función de los días de prorroga deberá realizar la REPROGRAMACIÓN AL CRONOGRAMA DE TRABAJOS vigente, por tal motivo solicito se realice la reprogramación No.5 en base a la ampliación N°3 aprobada.

Particular comunico para fines pertinentes.

ATENTAMENTE,

Firmado electrónicamente por:
OMAR HENRY GUAMAN ILER

Recibido:
21/04/2023
Residente de Obra

Ing. Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO

@IngenieroCivilOGI
olig@hotmail.es
olgiomar@gmail.com
0987571582 / 0979894628
Calle Bolívar 1-83 y Av. Marco Aurelio Subia
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
UBICACION: PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

REPROGRAMACIÓN 05 - CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PERIODOS (MESES/SEMANAS) 1 MES 1	2	3	4	2 MES 5	6	7	8	3 MES 9	10	11	12	4 MES 13	14	15	16	5 MES 17	18	19	20	6 MES 21	22	23	24	7 MES 25	26	27	28	8 MES 29	30	31	32	9 MES 33	34	35	36
1	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	7.00	476.17	3,333.19000	95.23																																			
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	3.50	405.49	1,419.21500	1,419.22																																			
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	M³	9,419.69	0.72	6,782.17680	6,553.60				11,304.45				2,945.28								2,728.21				1,686.82															
4	EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION	M3	189.90	11.34	2,153.46600	81.65																																			
5	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M³	1,706.60	3.70	6,314.42000					643.06												1,577.68				2,214.08				1,269.84										
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	M³	368.64	3.94	1,452.44160					1,122.90												785.48				212.01															
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M³	1,412.95	1.35	1,907.48250																	1,885.14																			
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1,20 M ,E=2.5 MM, MP-100	ML	80.00	243.32	19,465.60000																	5,450.37																			
9	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)	M3	314.88	189.47	59,660.31360																	41,327.20				68,542.67				41,232.46										
10	MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)	M³	91.84	177.81	16,330.07040																	2,574.69				10,183.18															
11	MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12	M3	770.00	60.24	46,384.80000					4,698.72																															
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA , CARGADA Y .REGADA)	M³	17,988.24	2.38	42,812.01120	16,782.55				8,349.23				9,863.89								6,759.99				10,134.23															
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³	4,611.60	10.16	46,853.85600	18,419.17				10,969.96				9,247.63												7,083.55															
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³	2,880.87	12.94	37,278.45780													26,560.00				6,449.30				6,001.57															
15	TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO	M³	1,412.95	0.81	1,144.48950	1,120.13												24,189.43																							
16	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	863,435.52	0.22	189,955.81440	58,950.44				29,327.55				34,647.92								23,745.14				35,597.55															
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	M³-KM	204,755.04	0.22	45,046.10880	13,959.41				8,313.84				7,008.54												5,368.44															
18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³-KM	127,910.63	0.22	28,140.33860													15,804.64				3,837.60				3,571.26															
19	ASFALTO RC-250 , PARA IMPRIMACIÓN	LT	32,340.00	0.66	21,344.40000													11,039.44				2,661.12				2,862.88															
20	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	M2	23,100.00	8.05	185,955.00000													96,176.89				23,184.00				25,116.00															
	SEÑALIZACION																																								
21	MARCAS EN PAVIMENTO	M	9,800.00	0.22	2,156.00000																													2,015.33							
22	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	U	875.00	5.36	4,690.00000																													4,904.40							
23	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1.00	332.16	332.16000																									332.16										
24	SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2	U	6.00	283.40	1,700.40000																													850.20							
25	SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2	U	6.00	283.40	1,700.40000																													850.20							
26	SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M2	U	10.00	117.23	1,172.30000																													117.23							
27	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M2	U	100.00	117.23	11,723.00000																													4,806.43							
28	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2.00	66.74	133.48000					133.48																															
29	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	2.00	145.37	290.74000	290.74																																			
30	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	500.00	0.28	140.00000	24.75																																			
31	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA	U	10.00	20.40	204.00000	204.00																																			
	MEDIDAS AMBIENTALES																																								
32	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	2.00	15.93	31.86000	31.86																																			
33	KIT ANTIDERRAMES	U	2.00	143.00	286.00000	286.00																																			
34	CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110.00	110.00000	110.00																																			
35	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110.00	110.00000					110.00																															
36	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	U	1.00	110.00	110.00000																	110.00																			
37	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	U	20.00	42.02	840.40000																	630.30																			

789,464.39220	118,328.75	74,973.19	63,713.26	173,770.40	123,706.30	178,594.24	42,834.46	13,543.79	0,00
INVERSION MENSUAL	14.99	9.50	8.07	22.01	15.67	22.62	5.43	1.72	0,00
AVANCE MENSUAL (%)	118,328.75	193,301.94	257,015.20	430,785.60	554,491.90	733,086.14	775,920.60	789,464.39	789,464.39
INVERSION ACUMULADA AL 100% (linea e=1p)	14.99	24.49	32.56	54.57	70.24	92.86	98.28	100.00	100.00
AVANCE ACUMULADO (%)	94,663.00000	154,641.55	205,612.16	344,628.48	443,593.52	586,468.91	620,736.48	631,571.51	631,571.51
INVERSION ACUMULADA AL 80% (linea e=0.5p)	11.99	19.59	26.04	43.65	56.19	74.29	78.63	80.00	80.00
AVANCE ACUMULADO (%)									

PLAZO CONTRACTUAL: 180 DIAS
PLAZO-AMPLIACION 01: 40 DIAS
PLAZO-AMPLIACION 02: 10 DIAS
PLAZO-AMPLIACION 03: 15 DIAS
PLAZO TOTAL: 245 DIAS

PUYO, 21 DE ABRIL DE 2023

Firmado electrónicamente por:
ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por:
OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Guaman Iler Omar Henry
FISCALIZADOR

Firmado electrónicamente por:
EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Gustavo Navas
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN P[illegible] DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA [illegible]00), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

REPROGRAMACIÓN 05 - CRONOGRAMA DE EQUIPO

CRONOGRAMA DE EQUIPO

PERIODOS

DESCRIPCION	1 MES				2 MES				3 MES				4 MES				5 MES				6 MES				7 MES				8 MES				9 MES			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
BODCAT					434.33												1,066.20				2,552.65								213.33							
CAMION CISTERNA	507.57				302.40				254.75				574.70				139.54				318.83															
CAMIONETA 1 TON	3.00																																			
CARGADORA FRONTAL													2,389.46				576.11				1,654.42															
CONCRETERA 1 SACO																	1,006.66				234.85				601.85											
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO													919.94				221.80				636.95															
EQUIPO TOPOGRAFICO	392.00																																			
ESCOBA MECANICA													418.16				100.82				289.52															
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	7,648.69				1,795.59				1,788.76								2,377.95				2,301.91															
MOTONIVELADORA	3,722.99				1,926.86				2,122.85				862.05				1,402.28				664.86															
MOTOSIERRA 7 HP	4.50																								153.00											
PLT. DE ASFALTO COMPLETA													9,557.86				2,304.46				6,617.69															
RODILLO VIBRATORIO LISO	3,102.50				1,605.72				1,769.04				2,211.79				1,528.64				1,588.06															
RODILLO VIBRATORIO NEUMATICO													1,493.42				360.07				1,034.01															
SOLDADORA ELECTRICA	12.00				12.00																1.50				768.00											
TERMINADORA DE ASFALTO													3,882.88				936.19				2,688.44															
TRACTOR DE CARRIL	3,948.85				1,964.35				2,320.96								1,590.62				248.82															
VIBRADOR																	79.65				101.02				324.43											
VOLQUETE	51,453.00				26,180.19				28,967.51				11,007.11				19,657.41				21,433.12				27,053.69											
HERRAMIENTA MENOR	188.64				131.00				19.14				280.30				757.35				161.37				566.04				1,268.57							
PARCIAL	70,983.76				34,352.44				37,243.01				33,597.67				34,105.74				42,528.02				29,467.00				1,481.89				0,00			
ACUMULADO	70,983.76				105,336.20				142,579.21				176,176.88				210,282.62				252,810.64				282,277.65				283,759.54				283,759.54			

PLAZO TOTAL: 245 DIAS
PUYO, 21 DE ABRIL DE 2023

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Guaman Iler Omar Henry
FISCALIZADOR

Firmado electrónicamente por: EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Gustavo Navas
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

REPROGRAMACIÓN 05 - CRONOGRAMA DE MATERIALES

CRONOGRAMA DE MATERIALES

PERIODOS

DESCRIPCION	1 MES				2 MES				3 MES				4 MES				5 MES				6 MES				7 MES				8 MES				9 MES			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
ACEITE QUEMADO -- (GLN)																	70.67				10.20				21.15											
ADHESIVO CON LEYENDA - FOCO REFLECTIVO ALTO -- (M²)																													3,132.60							
AGREGADOS TRITURADOS -- (M3)													6,571.03				1,584.31				2,274.83				2,274.83											
AGUA -- (M3)																	0.46				0.09				0.12				0.10							
ALAMBRE DE AMARRE GALVANIZADO -- (KG)																	1.91				2.42				2.42				5.36							
ALAMBRE Nº12 -- (KG)					102.96																								913.44							
ALFAGÍA -- (U)																	1,832.18				264.50				396.75				151.56							
ANGULO 30 X 3MM -- (M)																									280.00				336.00							
ARENA -- (M3)													4,539.98				1,094.62				3,143.40															
ASFALTO AP-3 -- (KG)													30,555.27				7,367.06				21,155.92															
ASFALTO DILUIDO RC-250 -- (KG)													5,703.65				1,375.18				3,949.11															
BASE GRANULAR -- (M3)													21,183.01				5,143.38				3,404.15															
BOTAS DE CAUCHO -- (PAR)																	180.00				60.00															
CAPACITACIÓN AMBIENTAL (INCLUYE MATERIALES Y TRANSPORTE)	100.00				100.00												100.00																			
CASCOS DE SEGURIDAD -- (U)																	120.00				40.00															
CEMENTO PORTLAND -- (SACO)																	10,718.23				2,297.37				3,022.85				2,703.21							
CHALECO REFLECTIVO -- (U)																	120.00				40.00															
CINTA DE POLIETILENO DEMARCATORIA (LEYENDA "PELIGRO"), 55 M	21.22																				38.78				60.00											
CLAVOS -- (KG)																	353.41				73.16				97.24				82.85							
CONO CON PROTECCION UV 71CM INCLY CINTA REFLECTIVA -- (U)	185.00																																			
CONTENEDOR DE 55 GALONES METÁLICO PARA DESECHOS PELIGR	24.00																																			
DIESEL -- (LT)													2,263.06				545.64				1,566.90															
DIESEL GENERADOR PLANTA -- (GL)													10,555.46				2,544.98				7,308.41															
ELECTRODOS -- (KG)	2.60				2.70																				16.90				137.10							
ESTACAS DE MADERA -- (U)	77.00																																			
HIERRO ESTRUCTURAL -- (KG)																					4.79															

HORMIGÓN CICLOPEO 180 KG/CM2 -- (M3)						71.28	346.50	582.12	
KIT ANTIDERRAMES -- (U)	260.00								
LAM.E TOOL GALV. (0.60 X 0.80) 1.1MM -- (U)		8.82							
LAM.E TOOL GALV. (1.1 X 0.60) 1.1 MM -- (U)	17.72								
LAM.E TOOL GALV. (2.44 X 1.22) 1.1MM -- (U)							2,019.77		
MADERA, PUNTALES -- (ML)					76.04	96.43	309.69		
MADERA, TABLA ENCOFRADO/ 20CM -- (U)					173.80	220.42	707.87		
MADERA,LISTONES PARA MUROS 6*6 -- (ML)					115.87	146.94	471.91		
MADERA,TABLA ENCOFRADA /20CM -- (U)					3,926.11	566.78	1,174.95		
MALLA NO12(2*1*1)TRIPLETORSION -- (U)		16,362.50							
MASCARILLA PARA GASES -- (U)					33.00		11.00		
MASCARILLAS ATRAPAPOLVO -- (U)					30.00		10.00		
MATERIAL DE RELLENO -- (M3)		513.00			150.56				
MATERIAL SUBBASE CLASE 3 -- (M3)	14,140.00	8,424.29	7,096.98		3,597.05	2,712.17			
PARES DE GUANTES -- (PAR)					45.00	15.00			
PEGAMENTO EPOXICO PARA TACHAS (KIT DOS COMPONENTES) --								472.50	
PERFIL ESTRUCURAL ACERO LAMINADO AL FRIO A36 -- (KG)		3.60							
PERFILES Y CANALES DE ACERO -- (KG)						79.80			
PERNOS INOXIDABLES -- (U)	8.00	2.00					50.00	84.00	
PETREOS, PIEDRA BOLA SELECCIO. -- (M3)		663.01						5,881.99	
PETREOS, RIPIO TRITURADO -- (M3)					4,361.53	873.80	1,172.94	952.13	
PETREOS,ARENA NEGRA -- (M3)					3,336.36	701.39	928.10	808.19	
PINGO -- (M)					348.99	50.38	75.57	28.87	
PINTURA ANTICORROSIVA -- (GLN)		2.75				3.05			
PINTURA ESMALTE -- (LT)	3.15								
PLANCHA DE TOL 1.22*2.44*1.1MM -- (U)						27.32			
SUELDA 60/11 -- (KG)						0.36			
TACHAS (CERAMICOS REFLECTIVOS) BIDIRECCIONALES Y UNIDIREC								1,706.25	
TAPONES AUDITIVOS -- (U)					45.00		15.00		
TIÑER -- (GLN)		0.39							
TRANSPORTE MEZCLA ASFALTICA -- (M3*KM)				10,752.59	2,592.51		7,444.90		
TUB. ACERO CORRUGADO D=1200MM -- (ML)					4,482.91		1,921.25	9,606.24	
TUB. CUADRADO GALVANIZADO 1"*1"*1.5M -- (M)								221.36	
TUBO CUAD. GALVAN. 2"*2"*2MM -- (M)	69.76	26.16					654.00	1,098.72	

PA[redacted]	14,908.44	26,212.18	7,096.98	92,124.04	[redacted]56,466.78	51,199.16	23,485.72	28,904.59	0,00
ACUMULADO	14,908.44	41,120.62	48,217.59	140,341.64	196,808.42	248,007.58	271,493.29	300,397.87	300,397.87

PLAZO TOTAL: 245 DIAS
PUYO, 21 DE ABRIL DE 2023

Firmado electrónicamente por:
ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por:
OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Guaman Iler Omar Henry
FISCALIZADOR

Firmado electrónicamente por:
EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Gustavo Navas
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

REPROGRAMACIÓN 05 - CRONOGRAMA MANO DE OBRA

CRONOGRAMA DE PERSONAL (MANO DE OBRA)

DESCRIPCION	PERIODOS																											
	1 MES				2 MES				3 MES				4 MES				5 MES				6 MES				7 MES				8 MES				9 MES			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
CHOFER -- (CH C1)	17,153.52				8,739.84				9,647.91				3,894.31				6,560.38				7,133.15				8,553.15				497.54							
INSPECTOR DE OBRA -- (EO B3)	0.76																				1.39				2.15											
MAESTRO MAYOR -- (EO C1)	141.45				1,033.19				54.64				123.28				936.42				237.85				962.63				9,408.18							
TOPÓGRAFO 2 -- (EO C1)	210.21																																			
PERFILERO -- (EO C2)																					8.18															
ALBAÑIL/CARPINTERO -- (EO D2)	15.48				15.48												3,054.94				648.89				1,243.05				2,362.22							
AYUDANTE DE MAQUINARIA -- (EO D2)	1,877.65				748.91				740.44				1,286.76				1,102.10				274.31				1,206.15				180.18							
CADENEROS -- (EO D2)	568.89																																			
FIERRERO/PINTOR/PLOMERO -- (EO D2)																					7.74															
PINTOR -- (EO D2)	15.48																								387.00				603.72							
PEON -- (EO E2)	192.48				1,034.43				48.78				3,111.79				9,879.86				1,813.15				6,600.18				12,664.74							
OPERADOR 1 -- (OP C1)	2,049.64				817.51				808.27				635.82				1,017.70				299.44				784.32				196.69							
OPERADOR 2 -- (OP C2)	507.57				262.70				289.42				918.90				384.39				60.09				585.41											
PARCIAL	22,733.12				12,652.06				11,589.47				9,970.85				22,935.80				10,484.19				20,324.04				25,913.27				0,00			
ACUMULADO	22,733.12				35,385.18				46,974.65				56,945.50				79,881.30				90,365.49				110,689.53				136,602.80				136,602.80			

PLAZO TOTAL: 245 DIAS
PUYO, 21 DE ABRIL DE 2023

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILLER

Ing. Guaman Iler Omar Henry
FISCALIZADOR

Firmado electrónicamente por: EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Gustavo Navas
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

REPROGRAMACIÓN 05 - PERSONAL TECNICO

CRONOGRAMA DE PERSONAL TECNICO

PERIODOS

DESCRIPCION	SEPT. 2022				OCT. 2022				NOV. 2022				DIC. 2022				ENERO. 2023				FEBRERO. 2023				MARZO. 2023				ABRIL. 2023				MAYO. 2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
SUPERINTENDENTE DE OBRA																																				
RESIDENTE DE OBRA																																				
TECNICO AMBIENTAL																																				
TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL																																				
TOPOGRAFO																																				

PLAZO TOTAL: 245 DIAS
PUYO, 21 DE ABRIL DE 2023

Firmado electrónicamente por:
ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por:
OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Guaman Iler Omar Henry
FISCALIZADOR

Firmado electrónicamente por:
EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Gustavo Navas
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA "
UBICACION: PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

CUADRO DE INCIDENCIA DE COMPONENTES

COMPONENTE	COSTO	PORCENTAJE
EQUIPOS	283,759.54	36
MANO DE OBRA	136,602.80	17
MATERIALES	300,397.87	38
TRANSPORTE	0.00	0
COSTOS INDIRECTOS	35,874.62	5
UTILIDAD	35,874.62	5
TOTAL :	789,464.39	100

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PUYO, 21 DE ABRIL DE 2023
PLAZO TOTAL : 245 DIAS

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILER


Ing. Guaman Iler Omar Henry
FISCALIZADOR

Firmado electrónicamente por: EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Gustavo Navas
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO(DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"
UBICACION: PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA

GRAFICO DE PORCENTAJES DE INCIDENCIA DE COMPONENTES

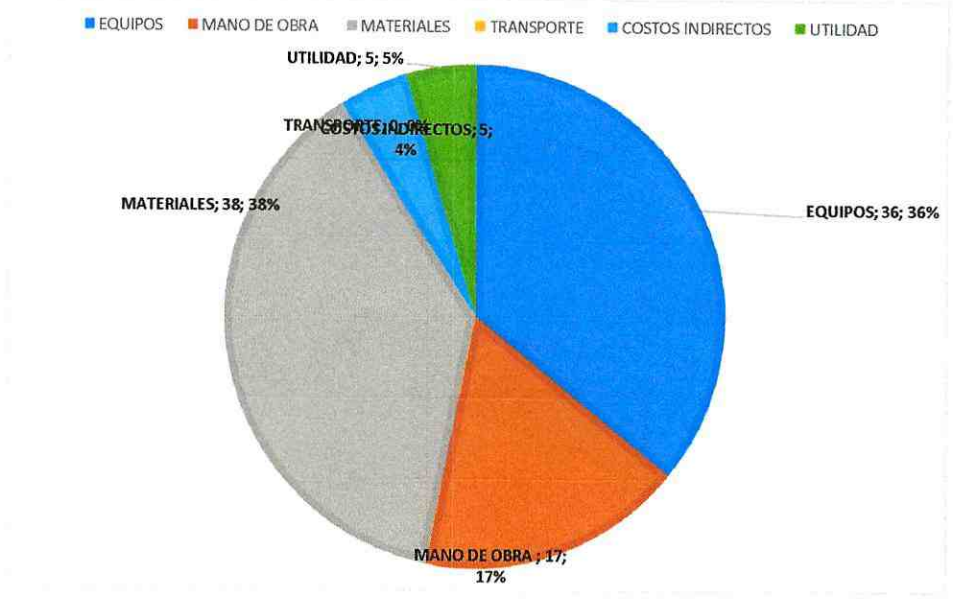

PUYO, 21 DE ABRIL DE 2023
PLAZO TOTAL : 245 DIAS

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Guaman Iler Omar Henry
FISCALIZADOR

Firmado electrónicamente por: EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ

Ing. Gustavo Navas
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

CONSTRUCTORA

EDDYMICH CIA. LTDA.

Puyo, 27 de abril de 2023

Oficio No. 023-EDDYMICH-2023

INGENIERO
Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO"

ASUNTO: Entrega del informe ambiental de cumplimiento del octavo periodo (abril)

Proyecto **"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".**

Presente. -

Reciba un cordial saludo, mediante la presente el **REPRESENTANTE LEGAL:** Ángel Misael López Chávez de la CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. (**CONTRATISTA**) hace la entrega del Informe Ambiental de Cumplimiento correspondiente a la planilla #8 periodo 01 de abril de 2023 al 30 de abril de 2023 del proyecto: "***ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".***

El informe fue realizado con base a las observaciones emitidas por el técnico ambiental de fiscalización, considerando los lineamientos indicados, siendo esta la primera versión a entregar para su respectiva revisión y aprobación.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

Recibido:
Omar Guamán
27/04/2023

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: Ángel Misael López Chávez
CONTRATISTA

Mail: edypollito@hotmail.es Tel.03-2884546 Cel. 0984787283
Puyo-Pastaza-Ecuador Direc.: Obrero, Calle Ambato S/N y Machala

OFICIOS RECIBIDOS

OGI Omar H. Guamán I.
Ingeniero Civil

OFICIO N. 031-2023-FISC-EXT
Pastaza, 14 de abril de 2023

Señor
Angel Misael Lopez Chavez
Representante legal - CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA.LTDA
CONTRATISTA

ASUNTO: Orden de ampliación de plazo N°2 y solicitud de Reprogramación No.4.

En referencia al OFICIO No. 18-EDDYMICH-2023 de fecha 08 de abril del 2023 donde usted, en calidad de Representante Legal de la CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA en calidad de contratista, solicita una ampliación de plazo de 10 días para el proyecto denominado "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.", me permito notificarle que su documentación ha sido analizada y su solicitud ha sido aprobada. Para lo cual emito la ORDEN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°2 aprobada por Fiscalización Externa, Administrador de contrato y el Delegado de la Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial De Pastaza.

DETALLE	DÍAS	OBSERVACION
PLAZO CONTRACTUAL	180 DÍAS	
AMPLIACIÓN DE PLAZO No.1	40 DÍAS	APROBADA
AMPLIACIÓN DE PLAZO No.2	10 DÍAS	APROBADA
TOTAL DÍAS APROBADOS	230 DÍAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	18-04-2023	

El contratista en función de los días de prorroga deberá realizar la REPROGRAMACIÓN AL CRONOGRAMA DE TRABAJOS vigente, por tal motivo solicito se realice la reprogramación No.4 en base a la ampliación N°2 aprobada.

Particular comunico para fines pertinentes.

ATENTAMENTE,

Firmado electrónicamente por:
OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO

Recibido
14/04/2023
Residente de Obra
Cristian Huachi

@IngenieroCivilOGI
ohgj@hotmail.es
ohgjomar@gmail.com
0987571382 / 0979894628
Calle Bolívar 1-38 y Av. Marco Aurelio Subia
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

INFORME Y ORDEN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO
- PROYECTOS -

ORDEN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°	Orden No. 2			FECHA:	06 de abril de 2023
NOMBRE DEL PROYECTO	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"				
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.		SOLICITUD Y FECHA		OFICIO N. 027-2023-FISC-EXT, de fecha 03 de abril de 2023
FECHA DE INICIO	01 de septiembre de 2022		FECHA TÉRMINO		08 de abril de 2023
PLAZO DEL CONTRATO	180 días		MONTO CONTRATADO		$ 789,464.39 USD
MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN	ITEM	DESCRIPCIÓN	DÍAS	JUSTIFICACIÓN	
	01	INCIDENCIA DE LA LLUVIA	10 días	MOTIVOS DE LLIVIAS	

CRITERIO APROBACIÓN AMPLICACIÓN	ANÁLISIS TÉCNICO	ITEM	SI	NO
	Del análisis técnico de los ítems en mención, la Unidad de Fiscalización considera procedente aprobar la ampliación de plazo solicitada.	01	X	
		02	X	
		03		
		04		
		05		

DETALLE DE LA AMPLIACIÓN	DETALLE	DÍAS	AMPLIACIONES ANTERIORES		DÍAS
	Plazo Inicial Contractual	180	Ampliación de Plazo N° 01		40
	Ampliación de Plazo Solicitada N° 01 (aprobada, nueva terminación 08-04-2023)	40	Ampliación de Plazo N° 02		10
	Ampliación de Plazo N° 0 2 Aprobada	10	Ampliación de Plazo N° ...		
	Nueva Fecha Término de Obra	18-04-2023	Ampliación de Plazo N° ...		
			TOTAL DE DÍAS:		50

SE LEGALIZA AMPLIACIÓN DE PLAZO SEGÚN CONTRATO N°	Clausula Novena: Prorrogas de plazo	
ADJUNTO: INFORME FISCALIZACIÓN N°	OFICIO N. 027-2023-FISC-EXT	FECHA: 04 de abril de 2023
ADJUNTO: INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO N°	Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-6740-M	FECHA: 06 de abril de 2023

NOTA: De conformidad con el artículo 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los fiscalizadores y Administradores de los contratos, certifican con su firma que, verificaron y garantizan por ser de su única responsabilidad, el cumplimiento de veracidad y legalidad de las motivaciones, valores autorizados, de los documentos justificativos y comprobatorios, y de las modificaciones contractuales autorizadas, garantizando que las mismas, no afectan la calidad, cantidad, avance físico y financiero, la ejecución del contrato y proyectos programados.

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILER	Firmado electrónicamente por: EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ
Ing. Omar Henry Guamán Iler REVISADO Y REQUERIDO POR: **FISCALIZADOR**	*Ing. Edwin Gustavo Navas Manjarrez* APROBADO POR: **ADMINISTRADOR**

Firmado electrónicamente por: ALVARO RENATO SOSA CASTRO

AUTORIZADO POR:
PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA Ó DELEGADO

OGI Omar H. Guamán I.
Ingeniero Civil

OFICIO N. 032-2023-FISC-EXT
Pastaza, 14 de abril de 2023

Señor
Angel Misael Lopez Chavez
Representante legal - CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA.LTDA
CONTRATISTA

ASUNTO: SOLICITUD DE CORRECCIONES EN LA PLANILLA DE AVANCE Nro.7

Presente.-

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus funciones cotidianas.

En atención al Oficio No. 019-EDDYMICH-2023 de fecha 05 de abril de 2023, donde la CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. Contratista emite la planilla de avance Nro. 7 de la obra **"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA" y la FISCALIZACION ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500) PARROQUIA TNTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**; me permito informar que la Planilla de avance Nro. 7 presenta observaciones, para lo cual solicito se realice la corrección a las siguientes observaciones:

Tablas y anexos Volumétricos.

- Verificar las fórmulas de cálculo en las hojas de resúmenes.

Anexo Fotográfico

- Adjuntar el anexo fotográfico

Es todo con respecto a los anexos volumétricos y fotográficos de la planilla; adicionalmente se solicita adjuntar la siguiente documentación:

- Adjunte Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales
- Adjunte Certificado de pago de IESS del personal operativo y/ó Facturas del personal técnico
- Adjunte Copia de la Póliza Vigente

Es todo con respecto a la planilla de Avance Nro. 7, por tal motivo solicito se realice las correcciones de manera oportuna con el fin de dar continuidad con los trámites pertinentes.

Particular se informa para fines pertinentes.

ATENTAMENTE,

Recibido
14/04/2023
Residente de Obra
Cristian Huachi

@ingenieroomarguaman
ohgi@hotmail.es
ohgiomar@gmail.com
0987571382 / 0979894628
Calle Bolivar 1-38 y Av. Marco Aurelio Subia
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

Firmado electrónicamente por:
OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO

Documentos Adjuntos:

- *Planilla de Avance No.7*

@ingenieroCivilOGI
ohgi@hotmail.es
ohgiomar@gmail.com
0987571382 / 0979894628
Calle Bolivar 1-38 y Av. Marco Aurelio Subia
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

OGI Omar H. Guamán I.
Ingeniero Civil

OFICIO N. 034-2023-FISC-EXT
Pastaza, 21 de abril de 2023

Señor
Angel Misael Lopez Chavez
Representante legal - CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA.LTDA
CONTRATISTA

ASUNTO: EMITO REPROGAMACION DE OBRA #4 APROBADA

En atención al oficio No. 021-EDDYMICH-2023 de fecha 17 de abril del 2023 donde usted, en calidad de Representante Legal de la CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA en calidad de contratista, emite la reprogramación de obra No. 04 para la obra "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.", en base a la ampliación de plazo de plazo Aprobada No.02; bajo este contexto me permito emitirle la reprogramación Aprobada por Fiscalización Externa y Administrador de contrato.

Sin otro particular pongo en su conocimiento.

ATENTAMENTE,

Firmado electrónicamente por:
OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO

Recibido
21/04/2023
Residente de Obra
Cristian Huachi

@IngenieroCivilOGI
ohgi@hotmail.es
ohgiomar@gmail.com
0987571382 / 0979894628
Calle Bolivar 1-38 y Av. Marco Aurelio Subia
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

OGI Omar H. Guamán I.
Ingeniero Civil

OFICIO N. 035-2023-FISC-EXT
Pastaza, 21 de abril de 2023

Señor
Angel Misael Lopez Chavez
Representante legal - CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA.LTDA
CONTRATISTA

ASUNTO: Orden de ampliación de plazo N°2 y solicitud de Reprogramación No.4.

En referencia al Oficio No. 18-EDDYMICH-2023 de fecha 05 de abril del 2023 donde usted, en calidad de Representante Legal de la CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA en calidad de contratista, solicita una tercera ampliación de plazo de 15 días para el proyecto denominado "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.", me permito notificarle que su documentación ha sido analizada y su solicitud ha sido aprobada. Para lo cual emito la ORDEN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°3 aprobada por Fiscalización Externa, Administrador de contrato y el Delegado de la Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial De Pastaza.

DETALLE	DÍAS	OBSERVACION
PLAZO CONTRACTUAL	180 DÍAS	
AMPLIACIÓN DE PLAZO No.1	40 DÍAS	APROBADA
AMPLIACIÓN DE PLAZO No.2	10 DÍAS	APROBADA
AMPLIACIÓN DE PLAZO No.3	15 DÍAS	APROBADA
TOTAL DÍAS APROBADOS	245 DÍAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	03-05-2023	

El contratista en función de los días de prorroga deberá realizar la REPROGRAMACIÓN AL CRONOGRAMA DE TRABAJOS vigente, por tal motivo solicito se realice la reprogramación No.5 en base a la ampliación N°3 aprobada.

Particular comunico para fines pertinentes.

ATENTAMENTE,

Firmado electrónicamente por:
OMAR HENRY GUAMAN ILER

Ing. Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO

Recibido
21/04/2023
Residente de Obra
Cristian Huachi

@IngenieroCivilOGI
ohgi@hotmail.es
ohgiomar@gmail.com
0987571382 / 0979894628
Calle Bolívar 1-38 y Av. Marco Aurelio Subía
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

INFORME Y ORDEN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO
- PROYECTOS -

ORDEN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°	Orden No. 3			FECHA:	17 de abril de 2023
NOMBRE DEL PROYECTO	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"				
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.		SOLICITUD Y FECHA		OFICIO N. 033-2023-FISC-EXT , de fecha 17 de abril de 2023
FECHA DE INICIO	01 de septiembre de 2022		FECHA TÉRMINO		03 de mayo de 2023
PLAZO DEL CONTRATO	180 días		MONTO CONTRATADO		$ 789,464.39 USD
MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN	ITEM	DESCRIPCIÓN	DÍAS	JUSTIFICACIÓN	
	01	INCIDENCIA DE LA LLUVIA	15 días	MOTIVOS DE LLIVIAS	

CRITERIO APROBACIÓN AMPLICACIÓN	ANÁLISIS TÉCNICO	ITEM	SI	NO
	Del análisis técnico de los ítems en mención, la Unidad de Fiscalización considera procedente aprobar la ampliación de plazo solicitada.	01	X	
		02	X	
		03		
		04		
		05		

DETALLE DE LA AMPLIACIÓN	DETALLE	DÍAS	AMPLIACIONES ANTERIORES		DÍAS
	Plazo Inicial Contractual	180	Ampliación de Plazo N° 01		40
	Ampliación de Plazo Solicitada N° 01 (aprobada, nueva terminación 08-04-2023)	40	Ampliación de Plazo N° 02		10
	Ampliación de Plazo N° 0 2 Aprobada	10	Ampliación de Plazo N° 03		15
	Ampliación de Plazo N° 0 3 Aprobada	15	Ampliación de Plazo N° ...		
	Nueva Fecha Término de Obra	03-05-2023	Ampliación de Plazo N° ...		
			TOTAL DE DÍAS:		65

SE LEGALIZA AMPLIACIÓN DE PLAZO SEGÚN CONTRATO N°	Clausula Novena: Prorrogas de plazo	
ADJUNTO: INFORME FISCALIZACIÓN N°	OFICIO N. 033-2023-FISC-EXT	FECHA: 17 de abril de 2023
ADJUNTO: INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO N°	Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-6788-M	FECHA: 17 de abril de 2023

NOTA: De conformidad con el artículo 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los fiscalizadores y Administradores de los contratos, certifican con su firma que, verificaron y garantizan por ser de su única responsabilidad, el cumplimiento de veracidad y legalidad de las motivaciones, valores autorizados, de los documentos justificativos y comprobatorios, y de las modificaciones contractuales autorizadas, garantizando que las mismas, no afectan la calidad, cantidad, avance físico y financiero, la ejecución del contrato y proyectos programados.

Firmado electrónicamente por: OMAR HENRY GUAMAN ILER	Firmado electrónicamente por: EDWIN GUSTAVO NAVAS MANJARREZ
Ing. Omar Henry Guamán Iler REVISADO Y REQUERIDO POR: **FISCALIZADOR**	*Ing. Edwin Gustavo Navas Manjarrez* APROBADO POR: **ADMINISTRADOR**

Firmado electrónicamente por: ALVARO RENATO SOSA CASTRO

AUTORIZADO POR:
PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA Ó DELEGADO

OGI Omar H. Guamán I.
Ingeniero Civil

OFICIO N. 038-2023-FISC-EXT
Pastaza, 28 de abril de 2023

Señor
Angel Misael Lopez Chavez
Representante legal - CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA.LTDA
CONTRATISTA

ASUNTO: EMITO REPROGAMACION DE OBRA #5 APROBADA

En atención al oficio No. 022-EDDYMICH-2023 de fecha 21 de abril del 2023 donde usted, en calidad de Representante Legal de la CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA en calidad de contratista, emite la reprogramación de obra No. 04 para la obra "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.", en base a la ampliación de plazo de plazo Aprobada No.03; bajo este contexto me permito emitirle la reprogramación Aprobada por Fiscalización Externa y Administrador de contrato.

Sin otro particular pongo en su conocimiento.

ATENTAMENTE,

Firmado electrónicamente por:
OMAR HENRY GUAMAN ILLER

Ing. Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO

Recibido:
28/04/2023
Residente de Obra.

@ingenieroCivilOGI
ohgi@hotmail.es
ohgiomar@gmail.com
0987571382 / 0979894628
Calle Bolivar 1-38 y Av. Marco Aurelio Subia
Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

PLANILLA 08 - LIQUIDACIÓN DE OBRA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO

CONSTRUCTORA

EDDYMICH CIA. LTDA.

Puyo, 27 de abril de 2023

Oficio No. 023-EDDYMICH-2023

INGENIERO
Omar Henry Guamán Iler
FISCALIZADOR EXTERNO"

ASUNTO: Entrega del informe ambiental de cumplimiento del octavo periodo (abril)

Proyecto **"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**.

Presente. -

Reciba un cordial saludo, mediante la presente el **REPRESENTANTE LEGAL:** Ángel Misael López Chávez de la CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA. (**CONTRATISTA**) hace la entrega del Informe Ambiental de Cumplimiento correspondiente a la planilla #8 periodo 01 de abril de 2023 al 30 de abril de 2023 del proyecto: "***ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNT. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".***

El informe fue realizado con base a las observaciones emitidas por el técnico ambiental de fiscalización, considerando los lineamientos indicados, siendo esta la primera versión a entregar para su respectiva revisión y aprobación.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

Recibido:
Omar Guamán
27/04/2023

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: Ángel Misael López Chávez
CONTRATISTA

Mail: edypollito@hotmail.es Tel.03-2884546 Cel. 0984787283
Puyo-Pastaza-Ecuador Direc.: Obrero, Calle Ambato S/N y Machala

INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO

Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ,

PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023

PASTAZA-ECUADOR

Mail: edypollito@hotmail.es
Puyo-Pastaza-Ecuador
Tel.03-2884546
Direc.: Obrero, Calle Ambato S/N y Machala
Cel. 0984787283

ÍNDICE

1. ANTECEDENTES 2
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 4
3. OBJETIVOS 5
a. OBJETIVO GENERAL 5
b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
4. MARCO LEGAL APLICABLE 5
6. MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CUMPLMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 7
7. ANÁLISIS A LA EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 11
8. CONCLUSIONES 12
9. RECOMENDACIONES 12
10. ANEXOS 13
ANEXO 1. VÍA ASFALTADA 13
ANEXO 2. SEÑALIZACIÓN 13
ANEXO 3. ÁREA DE DESECHOS 14
ANEXO 4. VÍAS DESPEJADAS 14
ANEXO 5. NUMERO DE EMERGENCIA 15
ANEXO 6. EXTINTOR 15
ANEXO 7. BOTIQUÍN 16
ANEXO 8. ENTREGA DE EPP 17
ANEXO 9. REUNIÓN CON LA COMUNIDAD 19
ANEXO 10. PLAN DE CONTINGENCIA 23
ANEXO 11. INFORME DE ACCIDENTES 29
ANEXO 12. PERMISO AMBIENTAL 31

1. ANTECEDENTES

1.01.- Realizada la etapa preparatoria, la Máxima Autoridad del GADPPz, Ing. Jaime Patricio Guevara Blaschke, Prefecto Provincial, mediante Resolución de Aprobación de Pliegos N° 244-GADPPz-2022 de fecha 19 de Abril de 2022, resolvió en su Art. 1.- APROBAR los pliegos del proceso de Cotización de Obras N°. COTO-GADPPz005-2022 para el "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA" por un monto referencial de USD $ 1´007.330,52 (UN MILLÓN SIETE MIL TRECIENTOS TREINTA CON 52 /100) dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA, con un plazo estimado para la ejecución del contrato de ciento ochenta (180) días, contados desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible, y una forma de pago de 40% con anticipo y el 60% por planilla mensuales por avance de obra debidamente aprobadas y legalizadas por la fiscalización y administración de contrato.
Art. 2.- DISPONER la publicación de los pliegos, conjuntamente con la convocatoria en el portal de Compras Públicas. Art. 3.- ORDENAR el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en los pliegos de contratación.
1.02.- Realizada la etapa precontractual, la Máxima Autoridad del GADPPz, Ing. Jaime Guevara Blaschke, Prefecto Provincial, mediante Resolución de Adjudicación N° 342-GADPPz-2022 de fecha 06 de junio de 2022, resolvió en su Art. 1. – ADJUDICAR el proceso de Cotización de Obras código N°COTO-GADPPz005- 2022 para el "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", al oferente CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA.LTDA. por un monto de USD $789.464,39 (SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 39/100) dólares Americanos sin incluir IVA, con un plazo estimado para la ejecución del contrato de ciento ochenta (180) días, contados desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible, y una forma de pago de 40% con anticipo Previo a la presentación de los Documentos Habilitantes y el 60% por planilla mensuales por avance de obra debidamente aprobadas y legalizadas por la fiscalización y administración de contrato. Artículo 2.- ENCARGAR al Jefe de Compras Públicas del GADPPz, notifique con la presente resolución a través del portal www.compraspublicas.gob.ec al oferente CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA.LTDA Artículo 3.- DESIGNAR Y NOTIFICAR en calidad de administrador de Contrato de Cotización de Obras con N° COTO-GADPPz005-2022 al Ing. Gustavo Navas, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el Art.70 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Art. 121 del Reglamento de la norma referida. Artículo 4.- PUBLICAR en el portal del SERCOP www.compraspublicas.com, la presente resolución, así como la información relevante del proceso de conformidad con el Art. 13 RGLOSNCP. Artículo 5.- DISPONGO su ejecución.

Memorando Nro. GADPPZ-DGA-2022-11265-M, 22 de junio del 2022, se me designa como Técnica Responsable de Monitoreo Control y Seguimiento Ambiental del proyecto "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", en referencia al Código N° COTO-GADPPz-005-2022. En este contexto me permito, solicitar se cumpla con las actividades del CERTIFICADO AMBIENTAL No. MAATE-SUIA-DZDCH-2022-CA-1057, conforme el

Plan de Manejo Ambiental (PMA) adjunto, las cuales deberán ser empleadas durante todas las fases del proyecto, esto en base al Código Orgánico de Ambiente publicado en el Registro oficial No. 983 del 12 de abril de 2017, en el capítulo IV de los instrumentos para la Regularización Ambiental art. 178.

Con fecha 27 de septiembre del 2022 se envía el oficio No. 006-EDDYMICH-2022 donde se presenta el informe ambiental No1 para la revisión respectiva parte de fiscalización externa, en el cual con oficio N. 009-2022-FISC-EXT del 04 de octubre del 2022, fiscalización externa remite la conformidad ambiental aprobada al GADPPz.

Con fecha 28 de octubre del 2022 se envía el oficio No. 010-EDDYMICH-2022donde se presenta el informe ambiental No2 para la revisión respectiva parte de fiscalización externa, en el cual con oficio N. 013-2022-FISC-EXT del 01 de noviembre del 2022, fiscalización externa remite la conformidad ambiental aprobada al GADPPz.

Con fecha 28 de noviembre del 2022 se envía el oficio No. 014-EDDYMICH-2022donde se presenta el informe ambiental No3 para la revisión respectiva parte de fiscalización externa, en el cual con oficio N. 021-2022-FISC-EXT del 01 de diciembre del 2022, fiscalización externa remite la conformidad ambiental aprobada al GADPPz

Con fecha 27 de diciembre del 2022 se envía el oficio No. 020-EDDYMICH-2022 donde se presenta el informe ambiental No4 para la revisión respectiva parte de fiscalización externa, en el cual con oficio N. 032-2022-FISC-EXT del 03 de enero del 2023, fiscalización externa remite la conformidad ambiental aprobada al GADPPz

Con fecha 30 de enero del 2023 se envía el oficio No. 005-EDDYMICH-2023 donde se presenta el informe ambiental No5 para la revisión respectiva parte de fiscalización externa, en el cual con oficio N. 007-2023-FISC-EXT del 01 de febrero del 2023, fiscalización externa remite la conformidad ambiental aprobada al GADPPz

Con fecha 27 de febrero del 2023 se envía el oficio No. 010-EDDYMICH-2023 donde se presenta el informe ambiental No6 para la revisión respectiva parte de fiscalización externa. en el cual con oficio N. 020-2023-FISC-EXT del 03 de marzo del 2023, fiscalización externa remite la conformidad ambiental aprobada al GADPPz

Con fecha 28 de marzo del 2023 se envía el oficio No. 016-EDDYMICH-2023 donde se presenta el informe ambiental No7 para la revisión respectiva parte de fiscalización externa, en el cual con oficio N. 029-2023-FISC-EXT del 04 de abril del 2023, fiscalización externa remite la conformidad ambiental aprobada al GADPPz

Con fecha 27 de abril del 2023 se envía el oficio No. 023-EDDYMICH-2023 donde se presenta el informe ambiental No8 para la revisión respectiva parte de fiscalización externa.

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ".								
UBICACIÓN:	PASTAZA-TENIENTE HUGO ORTIZ-ALISHUNGO								
CATERGORIA	FICHA AMBIENTAL								
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	Ing. Gustavo Navas								
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL INFORME:	**Desde**			-	**Hasta**			octavo informe ambiental de cumplimiento	
	01	04	2023		30	04	2023		
	D	**M**	**A**		**D**	**M**	**A**		
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:	Construcción.								
FISCALIZADOR EXTERNO:	ING. OMAR GUAMAN								
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA.LTDA								
PORCENTAJE DE AVANCE	99% APROXIMADO								
RESPONSABLES:									
NOMBRES	**ROL**								
CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA.LTDA	Contratista								
ING. ALEX DIAZ	Técnico Ambiental.								

Firmado electrónicamente por: ANGEL MISAEL LOPEZ CHAVEZ

Firmado electrónicamente por: ALEX GARY DIAZ VILLARRUEL

3. OBJETIVOS

Para la realización del presente Informe el proponente ha establecido los siguientes objetivos con la finalidad de proceder conforme a la Normativa Ambiental vigente.

a. OBJETIVO GENERAL

- Cumplir con las medidas ambientales establecidas en el plan de manejo para el proyecto "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ"

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Cumplir con las actividades del plan de manejo ambiental, autorizaciones administrativas, legislación y normativa ambiental vigente.
- Realizar los informes ambientales de cumplimiento para su posterior revisión y aprobación.

4. MARCO LEGAL APLICABLE


CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR						
Articulo	**Descripción**	**C**	**NC-**	**NC+**	**N/A**	**Observaciones**
Art. 395	La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 2. El Estado garantizará la participación y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales	X				El personal que opera en el proyecto ha recibido las capacitaciones en los temas de seguridad, salud y ambiente. En los periodos anteriores.
Art. 396	El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.	X				El proyecto opera con el permiso ambiental adecuado según su categoría. Ver anexo 12
CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 983 DE 12 ABRIL DE 2017						
Articulo	**Descripción**	**C**	**NC-**	**NC+**	**N/A**	**Observaciones**
Art. 10	De la responsabilidad ambiental. El Estado, las personas naturales y jurídicas, así como las comunas,	X				El personal que opera en el proyecto ha recibido las capacitaciones en los temas de

	comunidades, pueblos y nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de responder por los daños o impactos ambientales que hayan causado, de conformidad con las normas y los principios ambientales establecidos en este Código.					seguridad, salud y ambiente. En los periodos anteriores.
ACUERDO MINISTERIAL 061 R. O 316 DEL 04-05-2015						
Articulo	**Descripción**	**C**	**NC-**	**NC+**	**N/A**	**Observaciones**
Art. 14	De la regularización del proyecto, obra o actividad. - Los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental	X				El proyecto opera con el permiso ambiental adecuado según su categoría, Ficha Ambiental. Ver anexo 12
Art. 49	Políticas generales de la gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales. - Se establecen como políticas generales para la gestión integral de estos residuos y/o desechos y son de obligatorio cumplimiento tanto para las instituciones del Estado, en sus distintos niveles de gobierno	X				Dentro proyecto existe tachos metálicos, coloreados y etiquetados según el residuo o desecho para clasificar. Los mismos se encuentran bajo cubierta. Ver anexo 3
NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN-ISO 3864-1:2013						
Articulo	**Descripción**	**C**	**NC-**	**NC+**	**N/A**	**Observaciones**
	ISO 3864-3, Símbolos gráficos-Colores de seguridad y señales de seguridad- Parte 3: Principios de diseño para símbolos gráficos utilizados en señales de seguridad.	X				El proyecto opera con señalética, las cuales están ubicadas en a lo largo de la vía, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los transeúntes y tráfico vehicular. Ver anexo 2
NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2841 2014-03						
Articulo	**Descripción**	**C**	**NC-**	**NC+**	**N/A**	**Observaciones**
	Objeto. Esta norma establece los colores para los recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos con el fin de fomentar la separación en la fuente de generación y la recolección selectiva	X				Dentro proyecto existe tachos metálicos, coloreados y etiquetados según el residuo o desecho para clasificar. Los mismos se encuentran bajo cubierta. Ver anexo 3
DECRETO EJECUTIVO 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO						
Articulo	**Descripción**	**C**	**NC-**	**NC+**	**N/A**	**Observaciones**
Art. 11	Literal h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo acuerdo de las partes interesadas.	X				El personal que opera en el proyecto ha recibido las capacitaciones en los temas de seguridad, salud y ambiente. En los periodos anteriores.

NORMATIVA AMBIENTAL	C	NC+	NC-	N/A
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR	2	0	0	0
CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE. LEY 0 (REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO NO. 983 DE 12- ABR.-2017)	1	0	0	0
DECRETO EJECUTIVO 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO	1	0	0	0
NORMAS TÉCNICAS ECUATORIANA NTE – ISO INEN 2841	1	0	0	0
NORMAS TÉCNICAS ECUATORIANA A NTE INEN 2841: 2014	1	0	0	0
ACUERDO MINISTERIAL 061 R. O 316 DEL 04-05-2015	2	0	0	0
TOTAL	8	0	0	0

5. SÍNTESIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL

Se realizo la evaluación a la Normativa Ambiental. Se han identificado un total de ocho (8) artículos de las diferentes normativas. Con un nivel de cumplimiento para el mes de abril de 2023, de un 100% de Conformidades (Cumplimientos), un 0% se han establecidos como No Conformidades Mayores, un 0% se han establecidos como No Conformidades Menores y un 0 % de actividades que No Aplican, de acuerdo con la distribución que se muestra en el siguiente grafico estadístico.

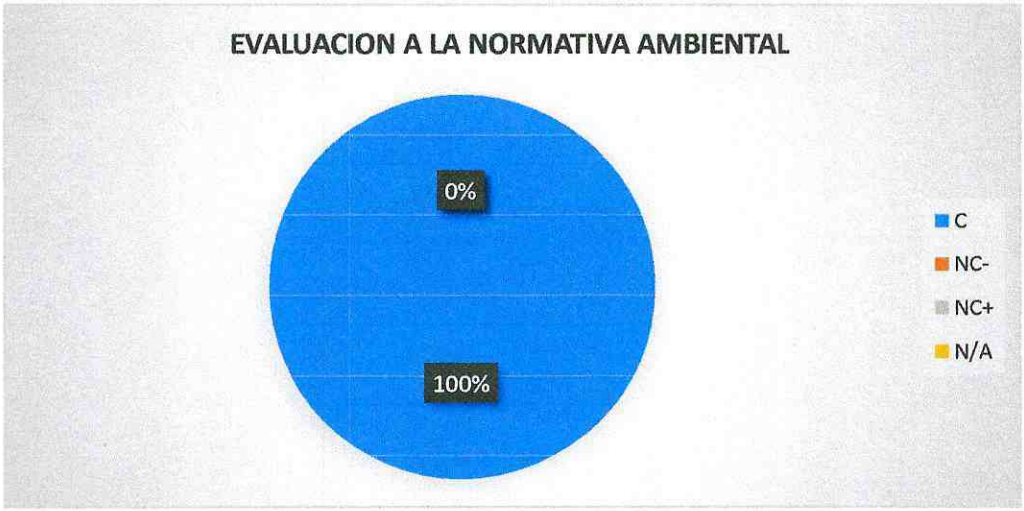

6. MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CUMPLMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

A continuación, se describe el detalle de las actividades relacionadas con el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION							
N	MEDIDA	CUMPLIMIENTO				HALLAZGO	MEDIO DE VERIFICACION
		C	NC-	NC+	N/A		
1	De generarse un exceso de polvo llevado por el aire durante la construcción, deberá humedecer la vía para evitar material particulado, optimizando el recurso agua.				X	No se genera polvo en las vías puesto que la vía se encuentra asfaltada en su totalidad.	Ver Anexo 1. Vía asfaltada
2	Se instalará señalética preventiva, informativa y ambiental una vez iniciados los trabajos en obra y durante las etapas que implique el proceso constructivo. 	X				A lo largo del proceso constructivo se mantiene con señalización durante todo el perímetro de la vía para evitar accidentes.	Ver anexo 2. Señalización
3	Está prohibida la disposición de cualquier desecho directamente sobre el suelo.	X				Está prohibido el arrojar los desechos en el suelo se tiene un área de desechos en el proyecto en el cual se deposita todos los desechos.	Ver anexo 3. Área de desechos
4	Zonificación de áreas de trabajo				X	Durante este periodo no ha existido lugares de peligro por lo tanto no se ha zonificado las áreas. Esta medida se la realizara en el caso de ser necesaria	
5	Los camiones de volteo que viajen en caminos públicos serán equipados con coberturas de lona para evitar el polvo y la caída de materiales durante su transporte.				X	No se ha utilizado volquetas durante este periodo.	
6	Los equipos y máquinas recibirán un mantenimiento regular y permanecerán en buenas condiciones de funcionamiento para evitar e impedir emisiones a la atmosfera y ruidos excesivos.				X	No se utiliza maquinaria durante este periodo. Únicamente se esta trabajando en la fundición de cunetas.	
7	Las vías por donde circula el equipo caminero deben estar despejadas y sin obstáculos.	X				Las vías se mantienen libre de obstáculos para la libre circulación.	Ver anexo 4. Vías despejadas
8	Colocación de rótulos con contactos de emergencias	X				Se ha colocado el numero único de emergencias además de las capacitaciones periódicas donde se socializa el numero en caso de emergencia.	Ver anexo 5. Numero de emergencia
9	Implementar un kit de primeros auxilios y un kit contra incendios en el área de proyecto.	X				Se mantiene un botiquín y un extintor funcionales en la bodega del proyecto el cual se encuentra en un lugar estratégico en caso de emergencia.	Ver anexo 6. Extintor Ver anexo 7. Botiquín

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS							
N	MEDIDA	CUMPLIMIENTO				HALLAZGO	MEDIO DE VERIFICACION
		C	NC-	NC+	N/A		
1	Dotación de fundas plásticas a los conductores de volquetes y maquinaria pesada para los desechos comunes.				X	Esta medida no aplica puesto que no existe maquinaria laborando, puesto que	

						únicamente se está realizando cunetas	
2	Colocación de contenedores de colores debidamente etiquetados para la clasificación de los residuos, tomando en cuenta la NTE. Clasificación general de residuos: **Contenedor azul:** vidrio, plástico, papel, cartón, entre otros **Contenedor negro:** Residuo no reciclable **Contenedor verde:** Residuo orgánico.	X				Se mantiene un área de desechos con señalización en el proyecto	Ver anexo 3. Área de desechos

PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN.

N	MEDIDA	CUMPLIMIENTO				HALLAZGO	MEDIO DE VERIFICACION
		C	NC-	NC+	N/A		
1	Capacitación al personal de trabajo sobre temas: -Medidas propuestas en el PMA -Manejo de los procedimientos de seguridad -Trabajos en altura -Protección del ambiente -Primeros Auxilios y procedimiento en caso de emergencias -Manejo de desechos peligros y no peligros.				X	Todas las capacitaciones han asido impartidas en los periodos anteriores	

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

N	MEDIDA	CUMPLIMIENTO				HALLAZGO	MEDIO DE VERIFICACION
		C	NC-	NC+	N/A		
1	Realizar una reunión previa con involucrados para darles a conocer las ventajas de la implementación del proyecto/obra o actividad.	X				Se ha realizada una reunión previa a la realización del proyecto donde se despejaron dudas e inquietudes por parte de los habitantes del área de influencia.	Ver anexo 9. Reunión con la comunidad
2	Se realiza reunión con los habitantes del área de influencia para determinar afecciones o inquietudes.	X				Se ha realizada una reunión previa a la realización del proyecto donde se despejaron dudas e inquietudes por parte de los habitantes del área de influencia.	Ver anexo 9. Reunión con la comunidad
3	Participar activamente en reuniones y procesos comunales que se realicen en el Área de influencia directa.				X	No se ha realizado reuniones por parte de la comunidad.	

PLAN DE CONTINGENCIAS

N	MEDIDA	CUMPLIMIENTO				HALLAZGO	MEDIO DE VERIFICACION
		C	NC-	NC+	N/A		
1	Elaborar un Plan de Contingencias accesible a todo el personal, en el cual se aborde la gestión de contingencias en caso de incendio, derrame, fuga, explosión, eventos naturales u otros que el operador considere que puedan darse durante la ejecución de su actividad.	X				Se ha elaborado un plan de contingencia y se ha socializado con los trabajadores del proyecto.	Ver anexo 10. Plan de contingencia
2	Se deberá contar con equipos de respuesta rápida contra incendios (Extintores) fijos y móviles.	X				Se mantiene un botiquín y un extintor funcionales en la bodega del proyecto el cual se encuentra en un lugar estratégico en caso de emergencia.	Ver anexo 6. Extintor Ver anexo 7. Botiquín
3	Cada vez que se presente un suceso inesperado se deberá elaborar un informe de incidentes o accidentes.	X				Se elaborará un informe de accidentes en el caso de ser necesario.	Ver anexo 11. Informe de accidentes
4	Señalización clara que comunique al personal y a la comunidad al tipo de riesgo al que se exponen.	X				Se mantiene señalética a lo largo del proyecto.	Ver anexo 2. Señalización

5	Entrenar al personal seleccionado para prestar primeros auxilios en caso de emergencia.				X	Todas las capacitaciones han sido impartidas en los periodos anteriores	
6	Informar al personal sobre las acciones a ejecutarse en caso de riesgos ambientales o técnicos que provoquen emergencias				X	Todas las capacitaciones han sido impartidas en los periodos anteriores	
7	Colocación de señalética preventiva	X				Se mantiene señalética a lo largo del proyecto.	Ver anexo 2. Señalización
8	Colocación de rótulos con contactos de emergencias	X				Se ha colocado el numero único de emergencias además de las capacitaciones periódicas donde se socializa el numero en caso de emergencia.	Ver anexo 5. Numero de emergencia
9	Implementar un kit de primeros auxilios y un kit contra incendios en el área de proyecto.	X				Se mantiene un botiquín y un extintor funcionales en la bodega del proyecto el cual se encuentra en un lugar estratégico en caso de emergencia.	Ver anexo 6. Extintor Ver anexo 7. Botiquín

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

N	MEDIDA	CUMPLIMIENTO				HALLAZGO	MEDIO DE VERIFICACION
		C	NC-	NC+	N/A		
1	Entrega de equipos de protección personal -Casco - Protectores de vista - Mascarilla - Guantes - Botas / Zapatos punta de acero	X				Se hace entrega de EPP a los trabajadores de acuerdo con la actividad a realizar	Ver anexo 8. Entrega de EPP
2	Se debe contar con un botiquín de primeros auxilios.	X				Se mantiene un botiquín y un extintor funcionales en la bodega del proyecto el cual se encuentra en un lugar estratégico en caso de emergencia.	Ver anexo 6. Extintor Ver anexo 7. Botiquín
3	Capacitación al personal en primeros auxilios y salud ocupacional				X	Todas las capacitaciones han sido impartidas en los periodos anteriores	

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

N	MEDIDA	CUMPLIMIENTO				HALLAZGO	MEDIO DE VERIFICACION
		C	NC-	NC+	N/A		
1	Monitoreo al cumplimiento del plan de manejo ambiental	X				Se monitorea contantemente por parte del equipo técnico.	
2	Realizar mantenimientos continuos de la maquinaria pesada	X				No se utiliza maquinaria durante este periodo. Únicamente se esta trabajando en la fundición de cunetas	

PLAN DE REHABILITACIÓN


N	MEDIDA	CUMPLIMIENTO				HALLAZGO	MEDIO DE VERIFICACION
		C	NC-	NC+	N/A		
1	Rehabilitación de áreas degradadas				X	Una vez terminado el proyecto se analizará si es necesario la rehabilitación de áreas degradadas	
2	Remoción de obstáculos en la vía				X	Una vez terminado el proyecto se retirará todos los obstáculos de la vía	
3	Reforestación y limpieza de las áreas intervenidas.				X	Una vez terminado el proyecto se analizará si es necesario la rehabilitación de áreas degradadas	

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA

N	MEDIDA	CUMPLIMIENTO				HALLAZGO	MEDIO DE VERIFICACION
		C	NC-	NC+	N/A		
1	Retiro de maquinaria, equipos y materiales				X	Una vez terminado el proyecto se retirará todas la maquinaria y equipos	
2	En caso de cierre y abandono del proyecto, obra o actividad, el operador cumplirá con lo dispuesto en el Art. 508 del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente				X	Una vez terminado el proyecto se cumplirá con lo establecidos	

7. ANÁLISIS A LA EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

ANÁLISIS AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					
PROGRAMA	NÚMERO DE MEDIDAS	CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES			
		C	NC-	NC+	N/A
PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION	9	5	0	0	4
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS	2	1	0	0	1
PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN	1	0	0	0	1
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS	3	2	0	0	1
PLAN DE CONTINGENCIAS	9	7	0	0	2
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	3	2	0	0	1
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	2	2	0	0	0
PLAN DE REHABILITACIÓN	3	0	0	0	3
PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA	2	0	0	0	2
TOTAL	34	19	0	0	15
PORCENTAJE	100%	56%	0%	0%	44%

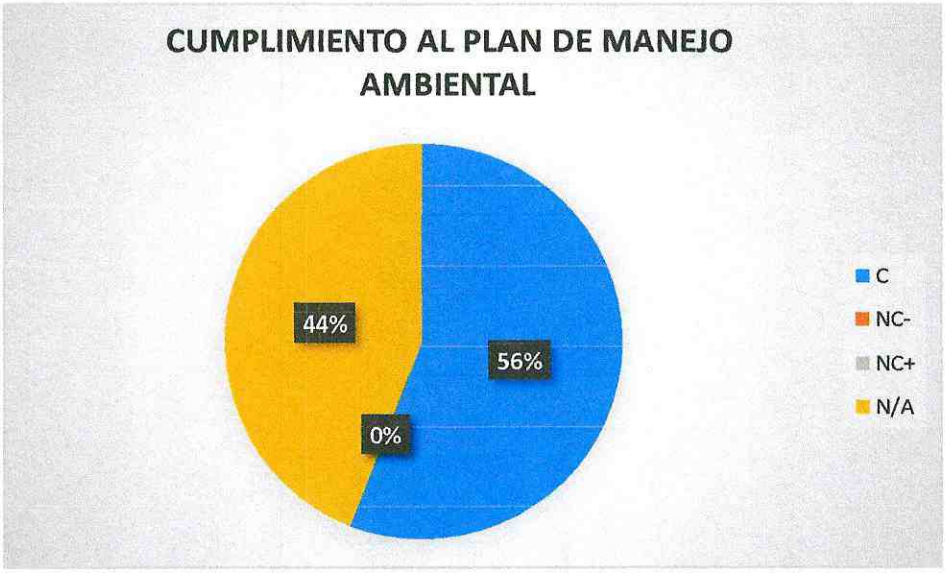

8. CONCLUSIONES

- El plan de manejo ambiental tiene un porcentaje de 56% de cumplimiento (conformidades) y un 44% de medidas que no aplican en el proyecto porque no se encuentran acorde a las actividades, es importante mencionar que no existe conformidades menores o conformidades mayores.

- Durante este periodo de evaluación no se ha ocurrido accidentes o incidentes dentro del proyecto.

- durante la ejecución del proyecto se ha evidenciado de forma correcta la aplicación de cada medida establecida en el plan de manejo ambiental.

- Durante este periodo se ha trabajado únicamente con la fundición de cunetas

9. RECOMENDACIONES

- Seguir trabajando conjuntamente para el cumplimiento de plan de manejo ambiental junto con el equipo técnico del contratista, equipo técnico de fiscalización externa y la administración del contrato.

- Seguir cumpliendo de forma correcta las medidas establecidas en el plan de manejo ambiental.

10. ANEXOS

ANEXO 1. VÍA ASFALTADA



ANEXO 2. SEÑALIZACIÓN






ANEXO 3. ÁREA DE DESECHOS



ANEXO 4. VÍAS DESPEJADAS



ANEXO 5. NUMERO DE EMERGENCIA

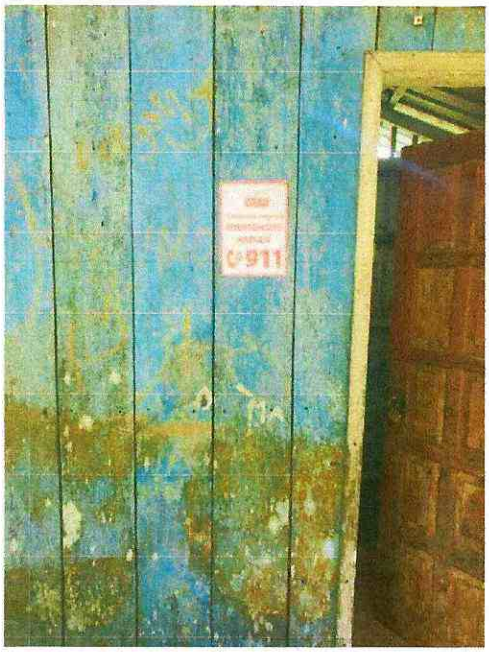

ANEXO 6. EXTINTOR



ANEXO 7. BOTIQUÍN



ANEXO 8. ENTREGA DE EPP

Entrega de Equipos de Protección Personal

Proyecto: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",

Fecha: 09 - 09 - 2023

N	Nombre y Apellido	Equipo de Protección Personal										Recibí conforme
		Botas en caucho		Traje impermeable		Casco (INEN – 146)		Chaleco reflectivo		Guantes		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Jaime Vargas	✓		✓		✓		✓		✓		
2	Israel Quieta	✓		✓		✓		✓		✓		
3	Carlos Macas	✓		✓		✓		✓		✓		
4	Blanca Nucushiva	✓		✓		✓		✓		✓		
5	Eddy Juma	✓		✓		✓		✓		✓		
6	Juan Gualinga	✓		✓		✓		✓		✓		
7	Juan Siza	✓		✓		✓		✓		✓		
9	Hugo Santi	✓		✓		✓		✓		✓		
Observaciones		El personal ocupa el EPP segun su actividad										

Firma de responsabilidad

Nombre:		Angel López (Representante Legal)	Firma:	

Entrega de Equipos de Protección Personal

Proyecto: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",

Fecha: 01 - 12 - 2022

N	Nombre y Apellido	Equipo de Protección Personal										Recibí conforme
		Botas en caucho		Traje impermeable		Casco (INEN – 146)		Chaleco reflectivo		Guantes		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Fidel Guaranda	✓		✓		✓		✓		✓		
2	Sulo Tusta	✓		✓		✓		✓		✓		
3	Alex Díaz	✓		✓		✓		✓		✓		
4	Antonio Toscano	✓		✓		✓		✓		✓		
5	Pedro Arellano	✓		✓		✓		✓		✓		
6	Cristian Huachi	✓		✓		✓		✓		✓		
7												
9												

Observaciones	El personal ocupa el EPP segun su actividad

Firma de responsabilidad

Nombre:		ANGEL LÓPEZ (Representante Legal)	Firma:	

ANEXO 9. REUNIÓN CON LA COMUNIDAD





"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"				
REGISTRO DE FIRMAS				
Nro.	**NOMBRE Y APELLIDO**	**NÚMERO DE CEDULA**	**SECTOR**	**FIRMA**
	Henry Grefa	1600437471-3	San Pablo	
	Daniel Zarate	1600298150		
	Jose Lr. Bautista	1801851790		
	Wilson Herrera	1600155531		
	Carlos Shiguango	1600744115-1	Allishungo	
	Omar Guaman	030 3341757		
	Rosa del Angucsha	1600567430	Allishungo	
	Raul Chimbo	1600155350	Allishungo	
	Edmundo Vargas	1600334740	San Pablo	
	Wilson Grefa	1600220444	San Pablo	
	Alejandro Vargas	1600468588-7	SAN PABLO	
	Jurem Bastidas	1600268481	allishungo	Jurem Bastidas
	José Bastidas	1650009441-3	allishungo	
	John Bastidas	1600959590	allishungo	

"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"				
PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL				
REGISTRO DE FIRMAS				
Nro.	**NOMBRE Y APELLIDO**	**NÚMERO DE CEDULA**	**SECTOR**	**FIRMA**
	Hilda López	1600339266	San Pablo	
	Nidia Andi	1500407760	San Pablo	
	Maria Shiguango	1600085235	" "	
	Alejandro Vargas	1600072835	" "	
	Clara Vargas	1600355476	" "	
	Cristina Grefa	1600706863	" "	
	Vanessa Garces	1501085193	"	
	Marisol Garces	1500994516	"	
	Aida Grefa	1600231359	"	
	Brian Bonilla			
	Leandra Cerda	1600695702	San Pablo	
	Elorsa Grefa	1600724528	San Pablo	
	Sandra Orquera	1600298713	San Pablo de Allishungo	
	Nakela Ahon	1600862344	San pablo	

"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALLISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"				
PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL				
REGISTRO DE FIRMAS				
Nro.	**NOMBRE Y APELLIDO**	**NÚMERO DE CEDULA**	**SECTOR**	**FIRMA**
	Eddy Pauls	1600724924	Allishungo	
	Victoria V. Nunca	1600236150	Allishungo	
	Laura Valle	1600335056	Allishungo	
	Patricio Grefa	1600744932-7	San Pablo	
	Ana Lucy	1600058949	San Pablo	
	Rosalina Carvajal	1600172150-7	Allishungo	
	Rosa Grefa	1600278915	Allishungo	
	Elvis Greco	1600690048-2	Allishungo	
	William Aguirre	1600280829	Allishungo	
	Oscar Sarmiento	1712608457	Concejal Pastaza	

CONSTRUCTORA
EDDYMICH CIA. LTDA.

PLAN DE CONTINGENCIA

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ".

PASTAZA-ECUADOR

PLAN DE CONTINGENCIA

PROYECTO: "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ".

1. GENERALIDADES

El Plan de Contingencias se presenta para hacer frente oportunamente a las contingencias ambientales, estas están referidas a la ocurrencia de efectos adversos sobre el ambiente debido a situaciones de origen natural o producto de actividades humanas, situaciones no previsibles que están en directa correlación con el potencial de riesgo y vulnerabilidad del área y del proceso productivo.

Las **operaciones de la obra** no ofrecen mayores riesgos de contingencia para el medio ambiente, sin embargo, puede considerarse como contingencias, los riesgos por derrame de hidrocarburos, incendios, sismos, etc.

2. OBJETIVOS

- Establecer las medidas de prevención, atención y control requeridas para atender eventos o siniestros, con fin de manejar eventualidades naturales y accidentes laborales que pudieran ocurrir en el área de influencia del proyecto.
- Asignar funciones y responsabilidades dentro del personal vinculado al área, que permitan generar acciones operativas prácticas, eficaces, ágiles frente a la probable ocurrencia de un evento o siniestro.
- Proporcionar la información necesaria al personal que labora en el proyecto, para que puedan responder de forma inmediata y correcta a las situaciones de emergencia.

3. ENTIDADES DE APOYO ANTE UNA CONTINGENCIA

Ante la posible ocurrencia de contingencia que por su magnitud e implicaciones no pueden ser atendidas totalmente en la ejecución del proyecto, es necesario el apoyo y participación de entidades públicas con objetivos e infraestructura diseñados para la atención de emergencias. continuación, se relacionan las entidades de apoyo para la atención de contingencias en el área de influencia.

a. Cuerpo de bomberos

En la parroquia Shell donde se encuentran ubicada y operando la ejecución del proyecto, se puede contar con la estación de bomberos la cual presta apoyo en una situación de emergencia

Tabla 1. Cuerpo de bomberos

ESTACIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO
Cuerpo de bomberos Puyo	Av. Alberto Zambrano, Km ½ vía Macas	032530372

b. Salud.

El sistema de salud de Ecuador está compuesto por dos sectores, público y privado. El sector público comprende al Ministerio de Salud Pública (MSP), y las instituciones de seguridad social Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

TABLA 2. Centros de salud

ESTACIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO
Subcentro de salud	Cabecera parroquial	032884067
IESS	Calle Cesiao Marín y Oriente	032885616

c. CRUZ ROJA

La Cruz Roja, nacida del deseo de prestar auxilio sin discriminación, a todos los heridos en el campo de batalla, se fundamenta en su capacidad internacional y nacional de prevenir y aliviar el sufrimiento humano dondequiera que se encuentre. Su propósito es proteger la vida y la salud y hacer respetar a la vida humana. Promueve la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre los pueblos.

Tabla3. Cruz roja ecuatoriana.

ESTACIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO
CRUZ ROJA	Calle: 9 de octubre, esquina del parque 12 de mayo.	03 288-5186

4. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Los recursos humanos, logísticos, físicos y económicos necesarios para atender las contingencias se enuncian a continuación:

a. Recursos humanos.

Los recursos humanos están representados por el personal capacitado y entrenado que conforma los comités y grupos mencionados anteriormente; adicionalmente se encuentra el personal perteneciente a las entidades de apoyo.

b. Recursos físicos y logísticos.

Dentro de estos recursos encontramos todos los elementos, equipos y maquinaria necesarios para afrontar una contingencia.

c. Recursos físicos y logísticos.

Dentro de estos recursos encontramos todos los elementos, equipos y maquinaria necesarios para afrontar una contingencia.

- Unidades móviles
- Celulares
- Equipos contra incendios
- Equipo de primeros auxilios

5. CAPACITACIÓN

Con el fin de asegurar un óptimo desarrollo del Plan de Contingencias se imparte capacitaciones con frecuencia en temas de seguridad y ambiente, divulgación y entrenamiento para todo el personal que labore en la arenera. Las actividades de capacitación, divulgación y entrenamiento irán dirigidas al personal directivo, profesional, técnico y obrero en la ejecución del proyecto.

a. Divulgación.


El objetivo de la divulgación del Plan de Contingencias es de informar y dar herramientas al personal que labora en la en la ejecución del proyecto para realizar las acciones que deben seguir

en el momento de afrontar una emergencia, adicionalmente se pretende comunicar las responsabilidades y la forma organizacional del Plan de Contingencias.

b. Capacitación.

Se dictan capacitaciones frecuentemente en temas de seguridad y ambiente al personal operativo y técnico que laboran dentro del proyecto,

FIGURA 1. Organigrama para la atención de emergencia.

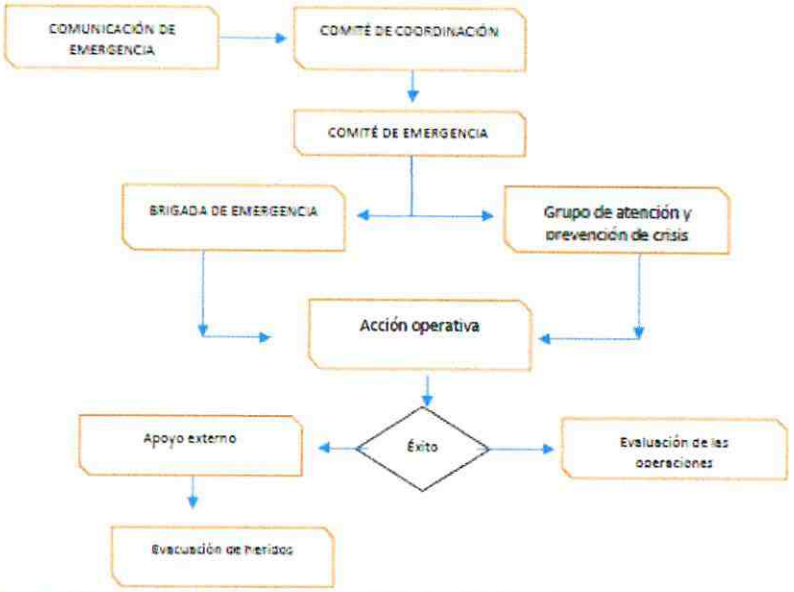

6. PLANES DE RESPUESTA A CONTINGENCIAS

En el presente numeral se describen los planes de atención de emergencias, que contienen los procedimientos y acciones particulares para atender a cada uno de los riegos en el momento de su desarrollo.

- **Procedimiento**

- Ubicar el lugar del accidente.
- Movilizar los recursos necesarios para atender los heridos.
- Identificar el personal herido.
- Retirar al personal herido a un lugar seguro para brindarles los primeros auxilios.
- Evaluar la condición del accidentado y su traslado a un centro de salud.
- Trasladar el (los) herido(s) al centro de salud más cercano a la arenera.
- Evaluar las causas del accidente y describir las lesiones.

CONTINGENCIA: ACCIDENTE DE TRABAJOS
ÁREA CRITICA
• Frentes de trabajo
MEDIDAS PREVENTIVAS

•Se debe cumplir cuidadosamente las normas de seguridad industrial. • Usar elementos de protección personal. • Realizar adecuadamente el trabajo designado a cada personal. • Implementar medidas de seguridad en la ejecución del proyecto • Colocación de advertencia y barreras en los sitios de mayor probabilidad de ocurrencia de accidentes. • Utilizar rutas de viaje y medios seguros de acceso. • Señalización clara que comunique al personal y a la comunidad al tipo de riesgo al que se exponen.

CONTINGENCIA: INCENDIO
ÁREA CRITICA
Frentes de trabajo
MEDIDAS PREVENTIVAS
• Capacitar y entrenar el personal que manipula hidrocarburos, aceites, combustibles, grasas, aceites usados. •Dar a conocer detalladamente las normas de seguridad industrial. • El tanque donde se almacena los • deberá ser de materiales apropiados y no presentar escapes. Se colocará una señal cerca del depósito de hidrocarburos donde se indique que es prohibido fumar. • Se debe dotar de equipos para control de incendios como extintores portátiles de mano o halón para las oficinas, cobijas contra fuego, mangueras y palas. • Capacitar al personal de la brigada de emergencias en el control de eventualidades de este tipo. • Dotar al personal que compone la brigada de emergencias de elemento de protección personal especial para la atención de fuego.

CONTINGENCIA: MOVIMIENTOS SISMICOS
ÁREA CRITICA
Área de influencia en la ejecución del proyecto.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE LA CONTINGENCIA
• El personal debe mantener la calma y controlar el pánico. • Detener todas las actividades que estén siendo realizadas en ese momento. • El personal deberá evacuar las áreas de trabajo inmediatamente y desplazarse a espacios abiertos para evitar ser atrapados. • Se verificará si falta personal. • Verificará el estado de las comunicaciones, de la infraestructura y del personal. • Se convocará la Brigada de Emergencias para que rescate y de primeros auxilios a los heridos; la brigada activara el procedimiento ante emergencia descrito en el numeral. • Una vez evacuados los heridos se evaluarán los daños producidos por el sismo. • Seguidamente se procederá a adecuar la zona afectada eliminando riesgo de derrumbes, escombros, etc. • Recuperar la estabilidad del lugar.

CONTINGENCIA: INUNDACIONES
ÁREA CRITICA
Área de influencia en la ejecución del proyecto

PROCEDIMIENTO EN CASO DE LA CONTINGENCIA
Si mientras se conduce se produjera en el trayecto una inundación el conductor deberá disminuir la velocidad y ubicar, en las cercanías y a la brevedad posible, un lugar donde pueda estacionar la unidad de transporte en sitio apartado de zona de ocurrencia. • Permanecer dentro de la cabina atento a la intensidad de la inundación y a la dirección de su desplazamiento las cuales podrían comprometer a la unidad de transporte. • Mantener la calma, evaluar la situación y de ser factible reubicar la posición de la unidad de transporte a otra más segura. Si la situación es crítica y se torna peligrosa para su integridad personal descender del vehículo y buscar ponerse a salvo en otra zona. • De ser el caso, comunicar el evento a las autoridades locales.

7. Firma de responsabilidad

ELABORADO POR:	Ing. Alex Díaz TECNICO AMBIENTAL	
APROBADO POR:	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA LTDA CONTRATISTA	

ANEXO 11. INFORME DE ACCIDENTES

CONSTRUCTORA
EDDYMICH CIA. LTDA.

INFORME DE ACCIDENTES /INCIDENTES

INTRODUCCION

Informe diseñado para la verificación y control de "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ". El cual se encuentra en ejecución y cumpliendo con todas las medidas ambientales y administrativas.

- **Objetivo general**

Verificar que no haya existido accidentes /incidentes dentro del proyecto "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ".

- **Objetivo especifico**

Verificar que se cumplen con las medidas de seguridad establecidas

DESARROLLO

Durante el periodo de 01 de abril al 30 de abril de 2023 se verifica y se observa que se ha adoptado diversas medidas de seguridad dentro del proyecto:
"ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500), PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ".
Con el objetivo de precautelar la salud y seguridad de todo el personal que opera en el mismo. Las siguientes medidas son realizadas por parte del contratista para el proyecto en ejecución:

1. Capacitaciones en temas de seguridad, salud y ambiente dictadas a todo el personal que labora en el proyecto.
2. Implementación de señalética preventiva, informativa y prohibitiva.
3. Vías despejadas de material de construcción.
4. Zonificación de áreas peligrosas.
5. Dotación de equipo de protección personal a cada trabajador según la actividad a desarrollar.
6. Implementación de extintor operativo en la oficina, vehiculos pesados y maquinaria que opera en el proyecto.

Mail: edypollito@hotmail.es Tel.03-2884546 Cel. 0984787283
Puyo-Pastaza-Ecuador Direc.: Obrero, Calle Ambato S/N y Machala

Mail: edypollito@hotmail.es Tel.03-2884546 Cel. 0984787283
Puyo-Pastaza-Ecuador Direc.: Obrero, Calle Ambato S/N y Machala

CONSTRUCTORA
EDDYMICH CIA. LTDA.

7. Implementación de botiquín con insumos básicos de emergencia en la oficina, vehículos pesados y maquinaria que opera en el proyecto.
8. Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos pesados y maquinaria que opera en el proyecto.
9. Dotación de maquinaria, equipos e insumos en buen estado.
10. Correcto manejo de los desechos comunes.
11. Instalaciones en buen estado.

Se verifica que todas las medidas plateadas se encuentran acorde lo que se mantiene en el proyecto.

CONCLUSIONES

Se verifico como fiscalización externa que durante el 01 de abril hasta 30 de abril de 2023 *NO HA OCURRIDO ACCIDENTES /INCIDENTES* de ningún tipo dentro del proyecto "ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO SAN PABLO DE ALISHUNGO (DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA LA ABSCISA 3+500). PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ".

ELABORADO POR:

ING. ALEX DIAZ

TECNICO AMBIENTAL

ANEXO 12. PERMISO AMBIENTAL

Gobierno del Encuentro | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

CERTIFICADO AMBIENTAL No. MAATE-SUIA-DZDCH-2022-CA-1057

DIRECCIÓN ZONAL

MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Dado en PASTAZA, 15 de diciembre de 2022

La DIRECCIÓN ZONAL, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico del Ambiente y su Reglamento, y demás normativa ambiental vigente aplicable.

CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO AMBIENTAL a favor de:

ASFALTADO CAMINO VECINAL ALLISHUNGO – SAN PABLO DE ALLISHUNGO, PARROQUIA TNTE. HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.
Otorgar el Certificado Ambiental a: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, considerando que ha registrado la información de su proyecto, obra o actividad en el Sistema Único de Información Ambiental SUIA; debiendo emplear durante todas las fases del mismo, las directrices que le apliquen dentro de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, emitida por la Autoridad Ambiental Nacional

DETALLES DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD:
DATOS TÉCNICOS:
Proyecto/Obra/Actividad:

> Actividad Principal CIIU: Obras de superficie en calles, carreteras, autopistas, puentes o túneles, asfaltado de carretera, pintura y otros tipos de marcado de carretera, instalación de barreras de emergencia, señales de tráfico y elementos similares. Incluye la construcción de pistas para aeropuertos.

Sector: Otros Sectores
Ubicación Geográfica :PASTAZA, PASTAZA, TENIENTE HUGO ORTIZ
Coordenadas geográficas (Datum WGS 84 Zona 17S): Ver Anexo

DATOS ADMINISTRATIVOS:

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica
Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía
Código postal:
Teléfono:

Gobierno del Encuentro | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Nombre del representante legal: GUEVARA BLASCHKE JAIME PATRICIO
Dirección: Km 7 Vía Puyo - Tena - Parroquia Fátima Hangares del GADPPz
Teléfono: 032885380 - 0987573972 -
Email: davidalejandroyedra@gmail.com - christianvargas900@gmail.com -
Código del Proyecto: No. MAATE-RA-2022-458537

Actividad principal CIIU: F4210.12.01

DETALLE DE RESIDUOS Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES

CÓDIGO DEL RESIDUO O DESECHO PELIGROSO Y/O ESPECIAL	NOMBRE DEL RESIDUO O DESECHO PELIGROSO Y/O ESPECIAL	CRTIB	ORIGEN DE LA GENERACIÓN
NE-42	Material adsorbente contaminado con hidrocarburos: waipes, paños, trapos, aserrín, barreras adsorbentes y otros materiales sólidos adsorbentes	T	Otro
NE-14	Desechos de asfalto con contenido de alquitrán resultante de la construcción y el mantenimiento de carreteras	T	Otro

De conformidad a lo establecido en el artículo 178 del Código Orgánico del Ambiente y el artículo 427 del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, el presente Certificado Ambiental, no es de carácter obligatorio, siendo importante observar la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, en el desarrollo de su proyecto, obra o actividad en lo que fuere aplicable.

Atentamente,

VARGAS SALAZAR GAVINO
DIRECCIÓN ZONAL
MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Yo, GUEVARA BLASCHKE JAIME PATRICIO con Cédula/RUC N° 1600191454 declaro que la información que consta en el presente certificado es de mi absoluta responsabilidad. En caso de forzar, falsificar, modificar, alterar o introducir cualquier corrección al presente documento, asumo las responsabilidades y sanciones determinadas en la ley.

Atentamente,

Sr. GUEVARA BLASCHKE JAIME PATRICIO

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica
Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía
Código postal: [illegible]
Teléfono: [illegible]
